Rad IDRD. N. 20232100131682
12/04/23

Belzcon
Construccion Propositivo
NIT:901.252.860-7

INFORME TÉCNICO No. 5
PARQUES IDRD MARZO DE 2023

IDRD | BOGOTÁ

M. 20236100197003
21/04/23

BELZCON SAS

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES



CONTRATO DE OBRA
2664 DE 2022
GRUPO 4

INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 05

PERIODO DE EJECUCIÓN:

01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023.

VERSIÓN 0
VOLUMEN 1 DE 1
ORIGINAL

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.04.28 12:23:22 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE




LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El original del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	Original
Biblioteca del Proyecto	1

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Titulo Documento	INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 5

REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre	Ing. Jorge Toncel		
	Firma			
	Fecha	30-03-2023		
RESPONSABLE REVISIÓN	Nombre	Ing. Olmer Uriel Sánchez		
	Firma			
	Fecha	30-03-2023		
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre	Ing. Jairo Guevara		
	Firma			
	Fecha	31-03-2023		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos específicos 6
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 7
3.1. LOCALIZACIÓN 7
4. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA 8
4.1. CONDICIONES CONTRATO DE OBRA 8
4.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA 9
4.3. PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA 9
5. LISTADO PARQUES PRIORIZADOS 10
6. CONDICIONES ACTUALES PARA INTERVENIR 11
7. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE 11
8. ANÁLISIS DE AVANCE CONTRATO DE OBRA 13
8.1. AVANCE FINANCIERO 13
8.2. AVANCE FÍSICO 14
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS – PERIODO MARZO 14
9.1. DIFICULTADES PRESENTADAS 18
9.2. REUNIONES EFECTUADAS 18
9.3. COMPROMISOS 19
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 20
11. CRONOGRAMA 29
12. CUADRILLAS DE TRABAJO 30
CONCLUSIONES 31

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización del proyecto. 8
Ilustración 2. Reprogramación G4 V, parque Timiza. 29

Tabla de tablas

Tabla 1. Información del contrato 9
Tabla 2. Información de pólizas Belzcon SAS 9
Tabla 3. Personal profesional Belzcon SAS 10
Tabla 4. Listado de parques priorizados 11
Tabla 5. Avance financiero 13
Tabla 6. Avance físico 14
Tabla 7. Frentes de obra iniciados el 22 de marzo. 14
Tabla 8. Recorrido de diagnóstico canchas sintéticas. 15
Tabla 10. Registro comités de obra 19
Tabla 11. Compromisos mes de marzo 19
Tabla 12. Registro fotográfico 27

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto a desarrollar pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD - GRUPO No. 4 intervenciones que en los parques se realizará a monto agotable y de conformidad con la priorización realizada por el IDRD, donde el alcance del concepto está relacionado con la revisión del cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos por el IDRD.

El grupo No. 4 se encuentra integrado por los parques de la Red de Proximidad ubicados en las localidades de Bosa, Kennedy y Tunjuelito, el cual en la ejecución puede variar en mayor o menor proporción en concordancia con las intervenciones que satisfacen las necesidades de cada parque.

El presente documento corresponde al Informe Técnico Mensual No. 05, en el cual se detallan las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 a 31 de marzo de 2023, por parte del Contratista BELZCON S.A.S, en la ejecución del Contrato No. 2664 de 2022, detallando las actividades realizadas en los aspectos técnicos, administrativos y financieros.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

- Ejecutar actividades necesarias, mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, para el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques.

2.2. Objetivos específicos

- ✓ Realizar un diagnóstico acertado de las necesidades reales de cada parque.
- ✓ Priorizar aquellos parques que requieren de una atención inmediata.
- ✓ Establecer una ruta crítica de atención, para optimizar el tiempo y las necesidades.
- ✓ Calcular y cuantificar cantidades de obra para poder generar un presupuesto acorde al contractual.
- ✓ Generar una programación que se ajuste al tiempo contractual, de acuerdo a las cantidades y presupuesto, cumpliendo con las actividades requeridas según el diagnóstico inicial.
- ✓ Realizar acta de inicio en cada parque y acta de recibo final por parte de la Interventoría y el IDRD, para que pasen a manos de la entidad y cobijados bajo su responsabilidad.
- ✓ Ejecutar las actividades constructivas priorizadas en los diagnósticos en cada uno de los parques, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Belzcon S.A.S. se regirá al presupuesto general del proyecto compuesto por el presupuesto asignado a cada uno de los parques priorizados, que incluye los costos directos e indirectos; lo anterior, con base al resultado de los diagnósticos que se realizarán a medida de la priorización por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

En cumplimiento del objeto descrito, se considera necesario el desarrollo de los siguientes capítulos que contienen las actividades pertinentes a cada uno de estos en el presupuesto, por lo tanto, efectuará los siguientes:

- Elaboración de diagnósticos de los parques priorizados por el IDRD.
- Mobiliario urbano.
- Dotación y mantenimientos.
- Señalética.
- Módulos y juegos infantiles.
- Biosaludables.
- Obras civiles complementarias.
- Reverdecimiento y paisajismo.
- Estructuras deportivas.
- Zonas duras.
- Rellenos.
- Pinturas y demarcaciones
- Asfaltos y geotextiles.
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y aparatos.

La prioridad fundamental para el IDRD, es contar con los parques en estado óptimo de uso para los efectos de garantizar el derecho que tiene la comunidad en general del goce y disfrute del tiempo libre en actividades deportivas, recreativas, culturales y de ocio en espacios al aire libre adecuados, armónicos, cómodos y placenteros; lo que realmente se merecen los usuarios.

3.1. LOCALIZACIÓN

La localización del proyecto corresponde a la zona sur occidental del Distrito Capital, integrado por los parques de la Red de Proximidad ubicados en las localidades de Bosa, Kennedy y Tunjuelito, tal y como se muestra a continuación

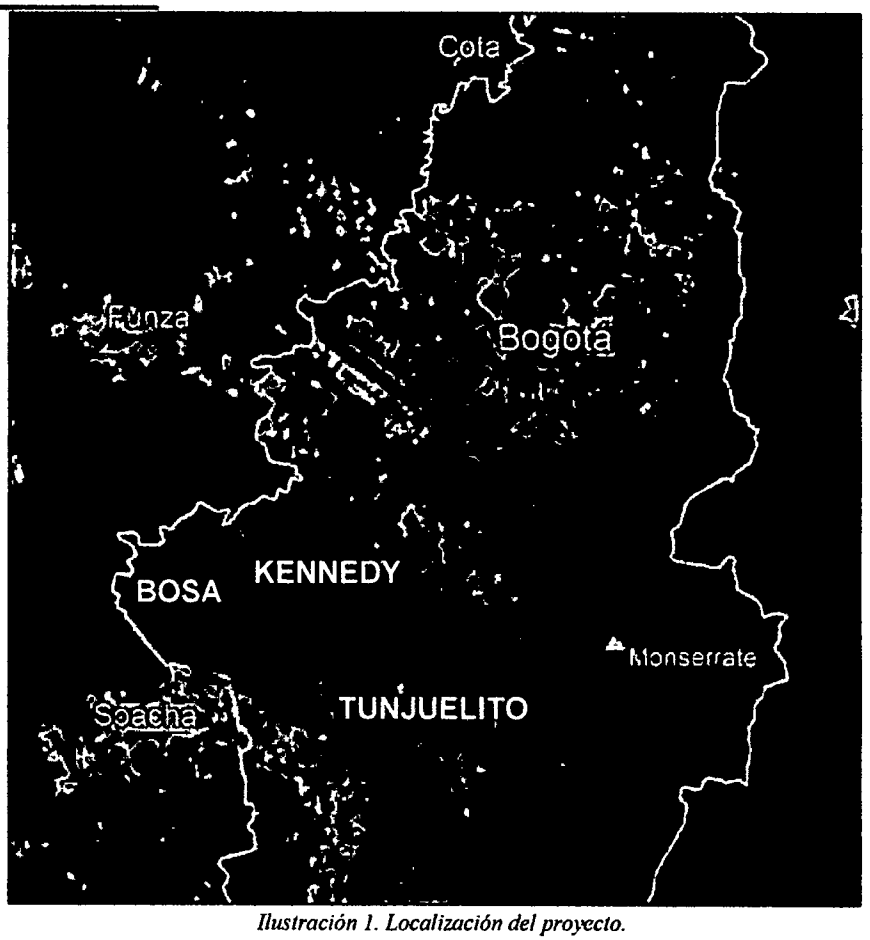


Ilustración 1. Localización del proyecto.

4. DESCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1. CONDICIONES CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información del contrato de obra No. 2664 de 2022.

Objeto	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
No. Contrato	2664 de 2022
Contratista	BELZCON S.A.S.
NIT	901.252.860-7
Representante legal	WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR

Plazo inicial	Siete (07) meses
Fecha de inicio	09 de noviembre de 2022
Fecha de finalización	08 de junio de 2023
Valor total contrato	$ 7.032.156.195,00

Tabla 1. Información del contrato

4.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN DE PÓLIZAS BELZCON S.A.S.			
ASEGURADORA	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde-Hasta)**	**VALOR**
Equidad Seguros	Cumplimiento del contrato	09/11/2022 – 08/10/2023	$2.109.646.858,50
Equidad Seguros	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09/11/2022 – 08/10/2023	$2.812.862.478,00
Equidad Seguros	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	09/11/2022 – 08/06/2026	$703.215.619,50
Equidad Seguros	Estabilidad y calidad de obra	08/06/2023 – 08/06/2025	$1.406.431.239,00
Equidad Seguros	Responsabilidad civil extracontractual	09/11/2022 – 08/06/2023	$500.000.000,00

Tabla 2. Información de pólizas Belzcon SAS

4.3. PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA

Durante el desarrollo del contrato de obra se contará con el talento humano que se relaciona a continuación:

NOMBRE	CARGO
Olmer Uriel Sánchez	Director de obra
Sebastián Rodríguez	Inspector de obra
David Ortiz sabogal	Inspector de obra
Jorge Bernardo Toncel Arévalo	Residente de Obra
Sergio Yair Salgado Andrade	Residente de Obra
Viviana Paulina García	Profesional social
Angelica María Cuervo	Profesional SST
Johanna Marcela Ricaurte	Profesional ambiental
John Portilla Hernández	Profesional en sistema de Calidad
Néstor Orlando Bautista	Profesional para Presupuesto y Programación
Rodrigo Mosquera Ibáñez	Topógrafo
Rodrigo Mosquera Garzón	Cadenero 1

Ervin Arturo Rodríguez Duarte	Cadenero 2
Daniel Orlando Cruz	Ingeniero de transito
Manuel Arsenio Moreno	Ingeniero electricista
Andrés Mauricio Tavera	Ingeniero hidráulico
Nubia Moreno Garzón	Contadora
Miguel Francisco De la Espriella	Abogado
María Camila Jojoa Hernández	Secretaria

Tabla 3. Personal profesional Belzcon SAS

5. LISTADO PARQUES PRIORIZADOS

De acuerdo a los ajustes presentados por la supervisión del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) y de los datos proporcionados por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa (FDLB) y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), el Grupo 4 a la fecha cuenta con un listado actualizado de 15 parques priorizados que se relacionan a continuación.

Las actividades indicadas en la intervención a los parques de la Red de Proximidad que se prioricen, pueden variar en mayor o menor proporción, en concordancia con las intervenciones que satisfacen las necesidades de cada parque.

No	CÓDIGO PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE
1	07-195	BOSA	URBANIZACIÓN LA ESPERANZA
2	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS
3	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO
4	07-080	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO I SECTOR
5	07-038	BOSA	DESARROLLO VILLA SUAITA
6	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA
7	08-319	KENNEDY	URBANIZACIÓN TIMIZA CÉLULA B TONOLI
8	08-025	KENNEDY	SAN ANDRÉS 2 SECTOR
9	08-013	KENNEDY	URBANIZACIÓN EL PROGRESO
10	08-522	KENNEDY	SAN ANDRÉS I SECTOR
11	08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR
12	08-014	KENNEDY	CARVAJAL

13	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LA LAGUNA
14	06-004	TUNJUELITO	EL CLARET
15	06-005	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LA LAGUNETA

Tabla 4. Listado de parques priorizados

6. CONDICIONES ACTUALES PARA INTERVENIR

Para la ejecución del contrato y la definición de los parques de la Red de Proximidad a intervenir en las localidades correspondientes al Grupo No. 4, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Requerimientos de la ciudadanía, visitas preliminares realizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) a las diferentes UPZ, filtro de parques intervenidos por las alcaldías locales y demás entidades públicas y privadas.
- Que cumplan con la titularidad del predio a favor del Distrito.
- El listado final de las UPZ preseleccionados con el tipo de intervención sugerida, así como el orden de intervención de los parques de proximidad, definidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).
- El contratista deberá verificar si algunos de los parques priorizados son o van hacer objeto de intervención por medio de otro contrato de obra celebrado por otra entidad (Fondo de Desarrollo Local o cualquier otra entidad pública del Distrito Capital o si tienen vigentes pólizas de estabilidad de obra), situación que impediría la intervención de los parques.

7. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE

De acuerdo, con lo contenido en la descripción del proyecto en el anexo técnico se tiene previsto desarrollar y atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques priorizados por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).

El Contratista deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales y demás que formen parte integral del presente proceso. El Contratista deberá garantizar el adecuado proceso de las actividades que ejecute. Las acciones estarán centradas en la realización del mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación

de la infraestructura de los parques de la red de proximidad que integran el sistema distrital de parques del IDRD, para la recuperación y consolidación de espacios.

Entre otras actividades se deben realizar:

- ✓ Mantenimiento de la infraestructura existente de equipos, redes eléctricas, redes hidráulicas y redes de aguas lluvias.
- ✓ Mantenimiento, adecuación y/o recuperación, así como el desmonte e instalación de piezas y/o partes de mobiliario urbano, juegos infantiles, módulos y estructuras deportivas.
- ✓ Mantenimientos preventivo y correctivo de canchas sintéticas y su infraestructura existente.
- ✓ Mantenimientos preventivo y correctivo de canchas (mixtas, basquetbol, futbol) y su infraestructura existente (mallas contra impacto, cerramientos perimetrales, demarcación, cambio carpeta asfáltica, marcos antivandálicos, entre otros) con el propósito de evitar o mitigar consecuencias de diferentes fallos o deterioros que puedan presentar.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de zonas duras como accesos, andenes perimetrales senderos peatonales, pisos (asfalto, tabletas o adoquín) y todas sus obras complementarias.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario (bancas, canecas, señalética entre otros) existente y suministro e instalación de este.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de zona de juegos (mobiliario, pisos de caucho, cerramientos perimetrales, módulos complemento), y suministro e instalación de este, para contar con infraestructura propicia y segura destinadas recreación, deporte y actividad física de niños niñas adolescentes.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de gimnasios al aire libre, ruta de vida, nuevas tendencias, así como suministro e instalación de estos.
- ✓ Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos entre otros) que garanticen el buen funcionamiento, evitando fallas, averías, deterioro por el uso permanente de la infraestructura.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de pistas de patinaje y pistas de atletismo.
- ✓ Solicitud ante las empresas prestadoras de servicios públicos para el correcto funcionamiento del parque si es necesario (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, CODENSA y Jardín Botánico de Bogotá - JBB, entre otros) con el fin de mejorar las condiciones de seguridad del parque a intervenir.
- ✓ Solicitud de permisos correspondientes por parte de las autoridades competentes (PMT – Secretaría Distrital de Movilidad).


Las actividades que se desarrollan en cada proceso mencionado se describen y desglosan en cada ítem contractual que hace parte del presupuesto oficial del proceso contractual y a su vez en el Análisis de Precios Unitarios (APU). De igual manera, dentro de los componentes puntuales a realizar se encuentra la intervención de las canchas sintéticas que se encuentren recibidas por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) para su administración, con posterioridad a la suscripción del(os) contrato(s) que se deriven del proceso de selección que se adelante y que necesiten de mantenimiento o adecuación o reparación o recuperación.

8. ANÁLISIS DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

8.1. AVANCE FINANCIERO

Descripción	%	Valor Inicial
Valor total contrato	100%	$7.032.156.195,00
Corte de Obra No. 1	1,47%	$103.264.441,00
Corte de Obra No. 2	6,88%	$483.621.692,00

Tabla 5. Avance financiero

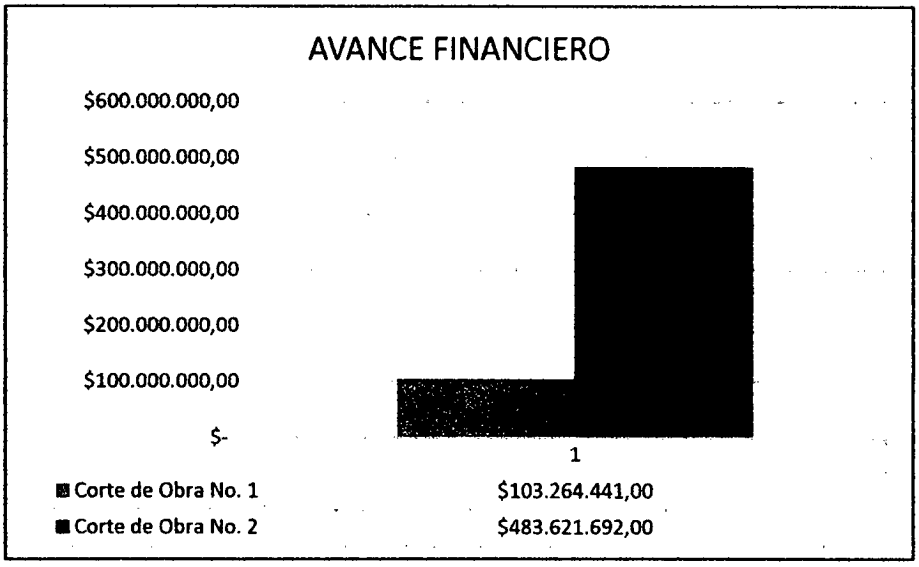

8.2. AVANCE FÍSICO

De acuerdo a la programación radicada, revisada y aprobada se tiene un avance físico con corte a 31 de marzo de 2023 como se muestra a continuación:

Descripción	%	Valor ejecutado
Avance Físico	8.35 %	$586.886.133,00

Tabla 6. Avance físico

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS – PERIODO MARZO

Teniendo en cuenta el reporte de actividades del mes anterior, se registra para el inicio del mes de marzo un total de 9 parques en intervención. Con la aprobación de los presupuestos y programación de los parques priorizados en su versión No. 10, se da inicio el día 22 de marzo de 2023 a las actividades constructivas en 6 frentes de obra simultáneos de la siguiente manera:

No	CÓDIGO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE
1	07-080	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO I SECTOR
2	07-038	BOSA	DESARROLLO VILLA SUAITA
3	08-522	KENNEDY	SAN ANDRÉS I SECTOR
4	08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR
5	08-014	KENNEDY	CARVAJAL
6	06-005	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LA LAGUNETA

Tabla 7. Frentes de obra iniciados el 22 de marzo.

Para estos frentes de obra se da inicio con actividades preliminares como lo son: Cerramientos perimetrales, demoliciones de placas y pavimento, desmonte de juegos infantiles y mobiliario como se evidencia en el registro fotográfico adjunto.

Así mismo, cabe resaltar que durante el periodo del presente informe se realizó recorrido de diagnóstico y viabilidad el día 09 de marzo en los siguientes parques.

No	CÓDIGO PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE
1	07-292	BOSA	URBANIZACIÓN CHICALÁ
2	07-321	BOSA	URBANIZACIÓN SANTIAGO DE ATALAYAS

3	07-403	BOSA	URBANIZACIÓN PORTAL DEL SOL
4	08-040	KENNEDY	CARVAJAL
5	08-127	KENNEDY	LAS AMÉRICAS OCCIDENTAL IV ETAPA
6	08-180	KENNEDY	VILLA DE LOS SAUCES
7	08-533	KENNEDY	LAS LUCES Y VILLA RICA
8	08-568	KENNEDY	LA ALEJANDRA
9	08-626	KENNEDY	LAGO TIMIZA I ETAPA
10	08-770	KENNEDY	URBANIZACIÓN PRIMAVERA
11	06-005	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LA LAGUNETA
12	06-006	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LA LAGUNA

Tabla 8. Recorrido de diagnóstico canchas sintéticas.

De acuerdo al recorrido anterior se realizó el estudio y propuesta de intervención para las canchas sintéticas presentes en los parques en mención y el día 13 de marzo se hace su respectivo envió a interventoría para su conocimiento y aprobación.

Finalmente, dando cumplimiento a la última programación aprobada, se relacionan las actividades ejecutadas en cada uno de los parques en intervención:

PARQUE DESARROLLO LLANO DE BOSA 07-072

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES		
Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	1.00
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION - MOBILIARIO URBANO		
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS		
Excavación manual con retiro suelo blando	M3	211,9
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
PRELIMINARES		
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	206,5
DEMOLICIONES Y RETIROS		
Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	262,4
Demolición carcamo equipo inclu. Cargue y retiro	ML	54
RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	109,5
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	13,7
ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES		
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	33,9
PISOS		

Suministro e instalación Geotextil T-2400**	M2	615,8
PLACAS Y ANDENES		
Placa contrapiso 0.10m 3000 psi+malla 4mm **	M2	121,1

PARQUE DESARROLLO GRAN COLOMBIANO 07-049

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TABLEROS Y REDES		
Desmonte malla protección contra impacto **	M2	66,00
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION - MOBILIARIO URBANO		
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS		
Excavación manual con retiro suelo blando	M3	42,90
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
PRELIMINARES		
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	177,60
RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	20,60
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	9,80
ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES		
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	155,70
ACABADOS		
Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	450,00
PISOS		
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	M2	241,10
PLACAS Y ANDENES		
Placa contrapiso 0.10m 3000 psi+malla 4mm **	M2	262,7
BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA		
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	M2	18,60

PARQUE BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA 08-136

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION - MOBILIARIO URBANO		
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS		
Excavación manual con retiro suelo blando	M3	185,10
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
PRELIMINARES		
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	15,10
RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	123,80
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	119,30
ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES		
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	43,00

PISOS		
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	M2	731,60
PLACAS Y ANDENES		
Placa contrapiso 0.10m 3000 psi+malla 4mm **	M2	90,00
BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA		
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	M2	15,00

PARQUE URBANIZACIÓN TIMIZA CÉLULA B TONOLI 08-319

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
PRELIMINARES		
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	116,50
DEMOLICIONES Y RETIROS		
Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	563,50
BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA		
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	M2	15,00

PARQUE URBANIZACIÓN EL PROGRESO 08-013

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION - MOBILIARIO URBANO		
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS		
Excavación manual con retiro suelo blando	M3	179,70
RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	79,20
PISOS		
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	M2	425,30
PLACAS Y ANDENES		
Placa contrapiso 0.10m 3000 psi+malla 4mm **	M2	315,90

PARQUE SAN ANDRÉS 2 SECTOR 08-025

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
RELLENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS		
Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M2	55,30
EMPRADIZACIÓN		
Empradización zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	M2	1382,70

PARQUE URBANIZACIÓN LA LAGUNA 06-003

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS		
Banca M-31 (desmonte) STPM **	UND	5,00
DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION - MOBILIARIO URBANO		
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS		
Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	M3	2,70
Excavación manual con retiro suelo blando	M3	182,10
RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	104,00
Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	96,40
PISOS		
Suministro e instalación Geotextil T-2400**	M2	587,90

PARQUE CARVAJAL 08-014

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS DEPORTIVAS		
PRELIMINARES		
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	2437,50
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	239,00

9.1. DIFICULTADES PRESENTADAS

- En los recorridos realizados en conjunto con Contratista, Interventoría y Supervisión se han realizado una serie de ajustes a las actividades inicialmente pactadas de acuerdo a la necesidad e intervención integral de los parques de acuerdo a directrices del IDRD, aunque si bien es cierto se han atendido esta solicitudes de manera oportuna y estas actividades se realizaran dentro del contrato, es importante aclarar que, estos cambios generan unos retrasos y reprocesos en cuanto a presupuesto de obra, contratación de proveedores y logística de ejecución.

9.2. REUNIONES EFECTUADAS

En este periodo se efectuaron comités de seguimiento y visitas de obra las cuales se enumeran a continuación.

ACTA No.	OBJETO DE LA REUNIÓN	FECHA
12	Acta de comité – Recorrido frentes de obra	07/03/2023
05	Acta de comité – Recorrido diagnostico	09/03/2023
13	Acta de comité – Recorrido frentes de obra	15/03/2023
14	Acta de comité -IDRD	21/03/2023
15	Acta de comité – Virtual	30/03/2023

Tabla 9. Registro comités de obra





9.3. COMPROMISOS

En conjunto con la supervisión y la interventoría se identificaron las necesidades de cada uno de los parques para el correspondiente diagnóstico, tal como se evidencia en el acta de Recorrido, se relaciona a continuación compromisos:

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Entrega de programación mantenimiento rutinario de canchas sintéticas	Contratista	07 de marzo de 2023
Entrega de programaciones parques nuevos (6)	Contratista	15 de marzo de 2023
Entrega de NP's con observaciones subsanadas en formatos Excel y PDF	Contratista	30 de marzo de 2023

Tabla 10. Compromisos mes de marzo

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

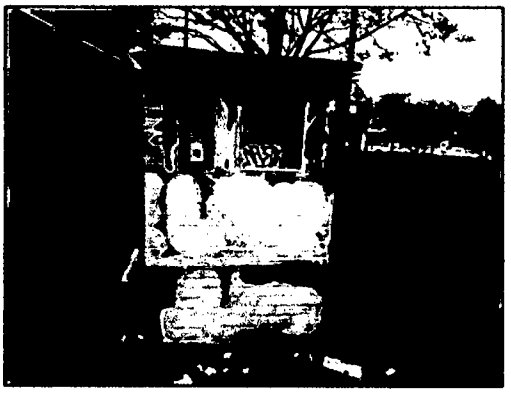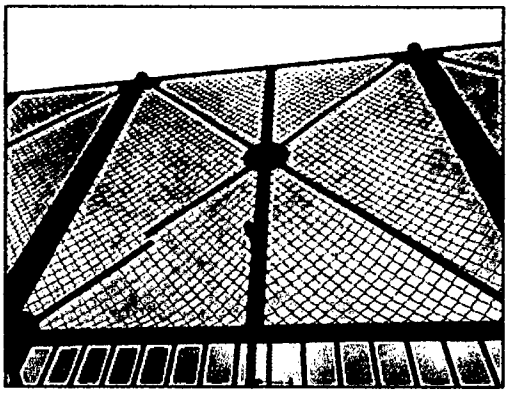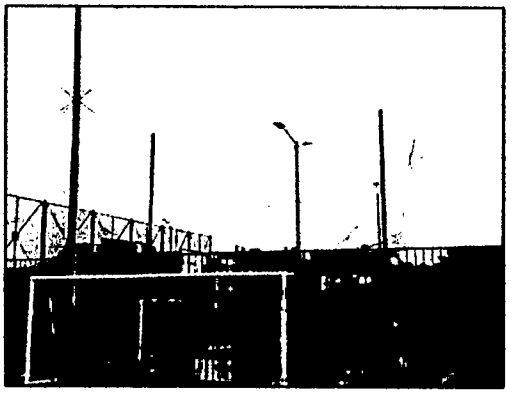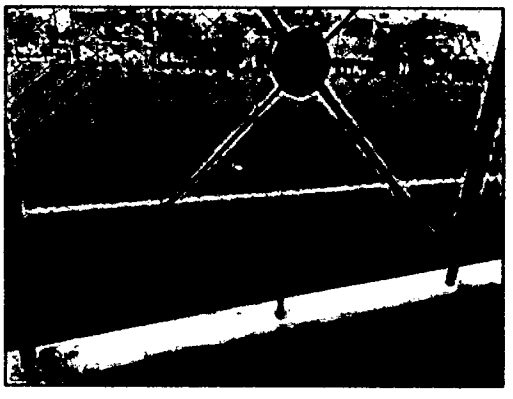RECORRIDO DE IDENTIFICACIÓN CANCHAS SINTÉTICAS	
Urbanización La Laguneta 	Urbanización Chicala 
Urbanización La Laguna 	La Alejandra 
Lago Timiza I Etapa 	Las Luces y Villa Rica 


Belzcon
Construcción Propositiva
NIT:901.252.860-7

INFORME TÉCNICO No. 5
PARQUES IDRD MARZO DE 2023


IDRD | BOGOTÁ

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE LLANO DE BOSA 07-072


Desmonte estructura de microfutbol

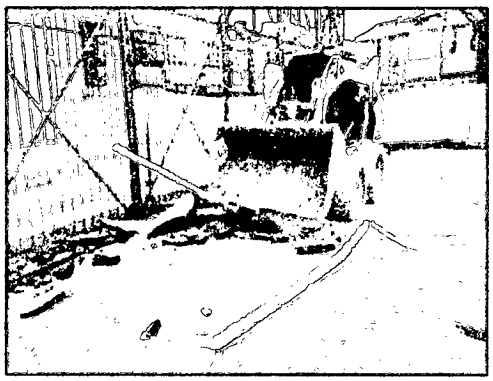


Excavación manual con retiro suelo blando

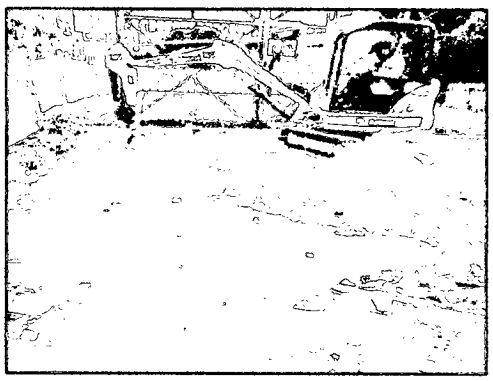


Cerramiento en lona

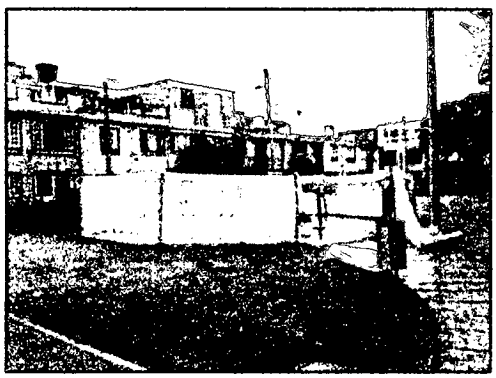

Demolicion de pavimento asfaltico

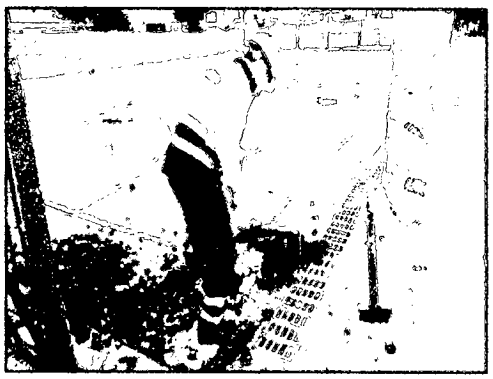

Demolicion de carcamo

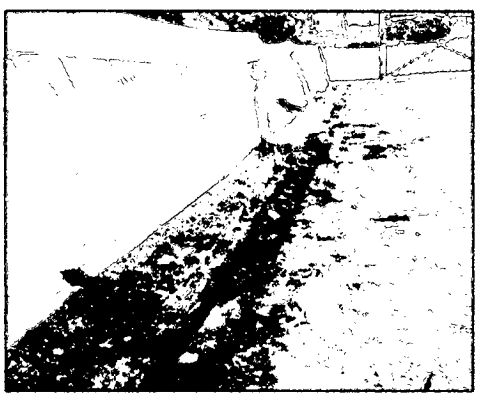

Relleno compactado subbase granular



Belzcon
Construcción Propositivo
NIT:901.252.860-7


INFORME TÉCNICO No. 5
PARQUES IDRD MARZO DE 2023

IDRD | BOGOTÁ


Relleno compacto base granular



Instalación de bordillo prefabricado A-80

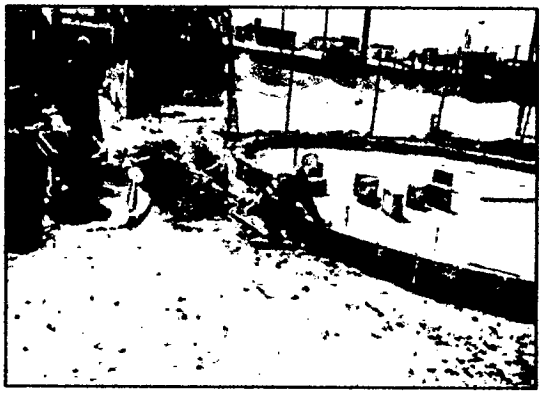

Suministro e instalación de geotextil T-2400

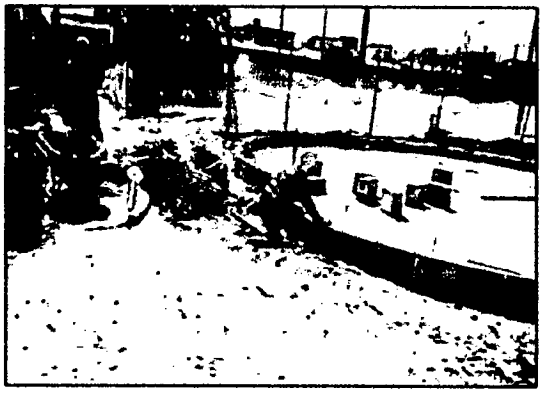


ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE GRAN COLOMBIANO 07-049


Desmonte malla protección contra impacto



Excavación manual con retiro suelo blando

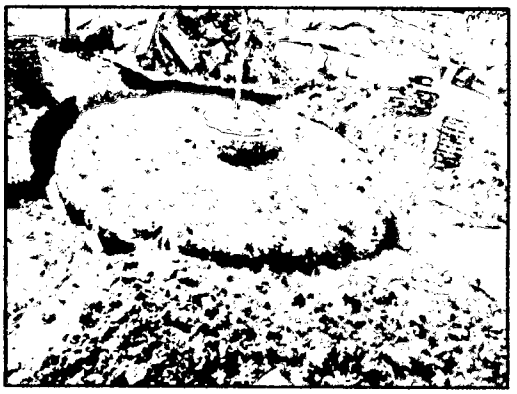

Cerramiento en lona

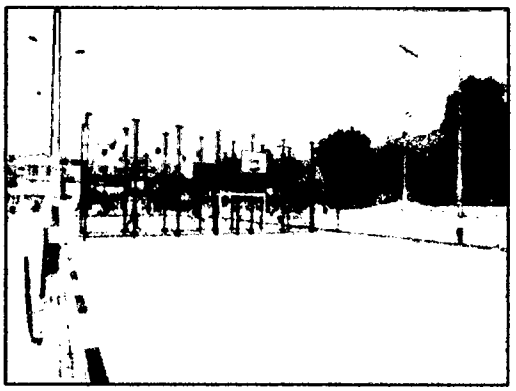


Relleno compactado en subbase granular



Relleno compactado en base granular



Instalación bordillo prefabricado A-80

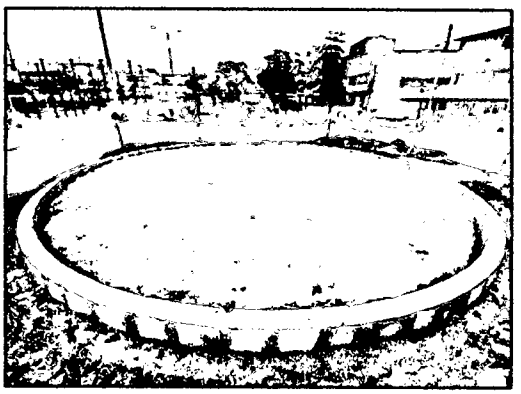


Recubrimiento sintetico - Base



Instalación geotextil T-2400



Instalación de malla contra impacto

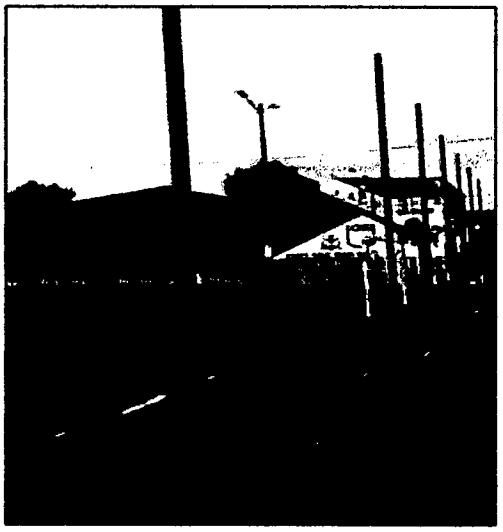

Belzcon
Construcción Propositiva
NIT:901.252.860-7

INFORME TÉCNICO No. 5
PARQUES IDRD MARZO DE 2023


IDRD | BOGOTÁ

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA 08-136


Excavación manual



Cerramiento en lona

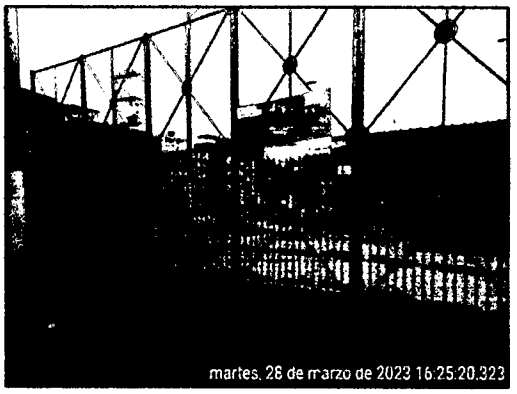


Relleno subbase granular

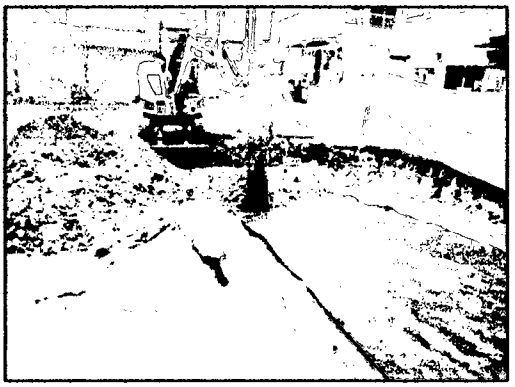

Relleno base granular



Instalacion bordillo prefabricado A-80

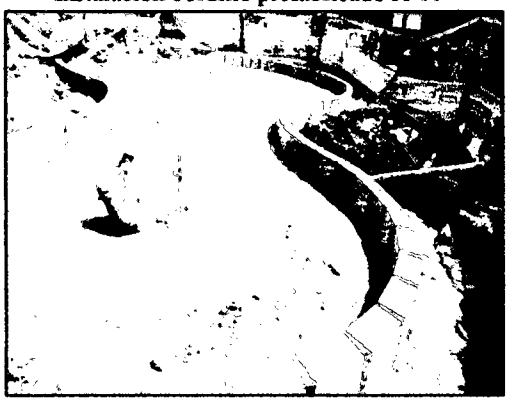

Instalacion de geotextil T-2400



ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE TIMIZA CÉLULA B TONOLI 08-319

Cerramiento en lona



Demolición pavimento asfaltico



ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE EL PROGRESO 08-013

Excavación manual



Relleno subbase granular




ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE SAN ANDRÉS 08-025

Relleno en tierra negra



Empradización



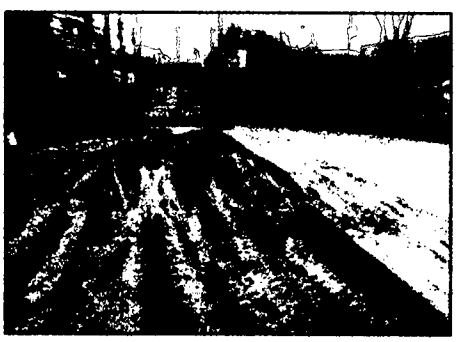
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE LA LAGUNA 06-003	
Demolición y retiro de banca m-31	Demolición placa contrapiso
	
Excavación manual	Relleno compactado subbase granular
	
Relleno compactado base granular	Instalación geotextil T-2400
	

Tabla 11. Registro fotográfico

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARQUE CARVAJAL 06-003	
Descapote manual	Cerramiento en lona
	

11. CRONOGRAMA

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité de obra #12, se realiza el envió de la reprogramación G4 v3, la cual incluye los 9 parques que se encuentran en intervención. Este documento cuenta con una cuantificación de actividades más aterrizada con sus respectivos valores equivalentes a estas necesidades. Esto con el fin de proporcionar una programación detallada y que permita darle un mayor orden y manejo a los recursos del proyecto.

Posterior a esta reprogramación y teniendo como referencia los nuevos parques priorizados en el presupuesto V10, se hace un segundo envío de la programación de los siguientes 6 parques priorizados por intervención.

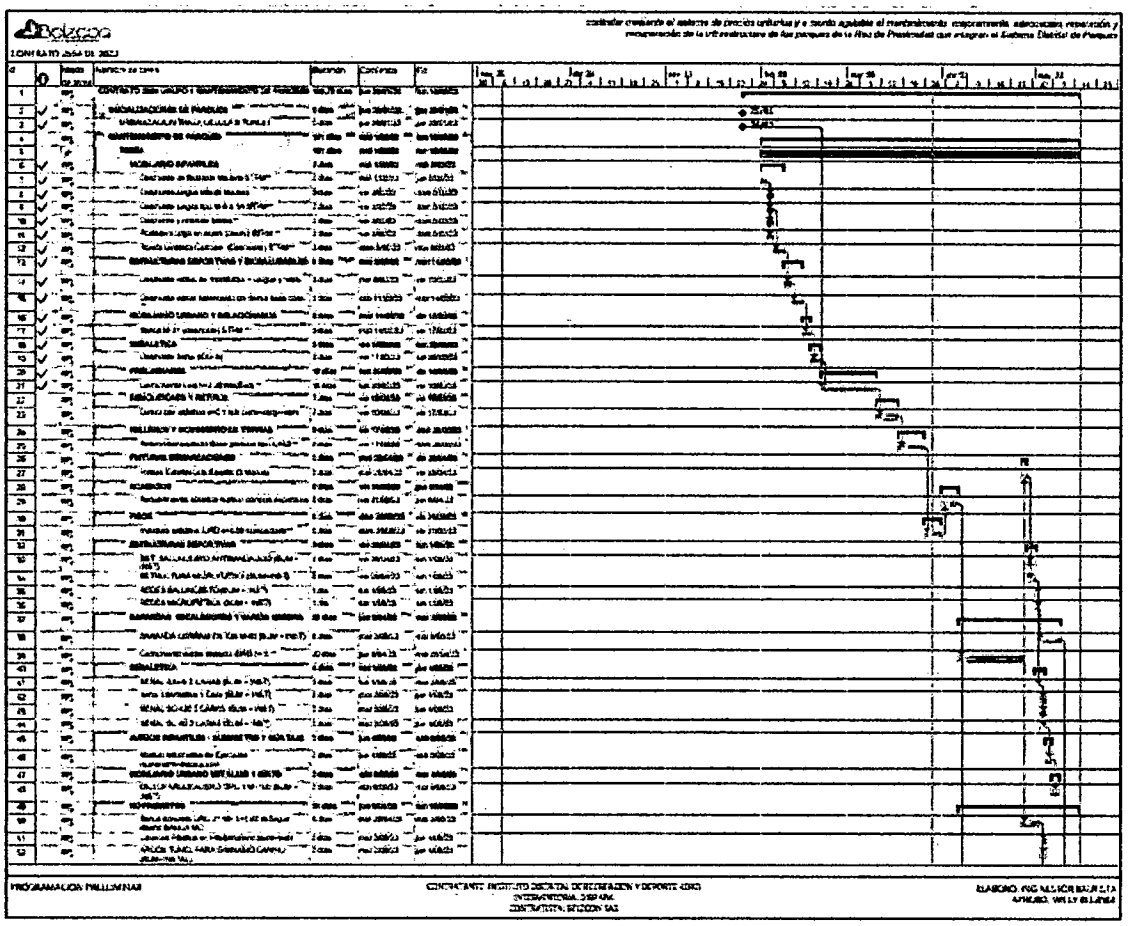


Ilustración 2. Reprogramación G4 V3, parque Timiza.

12. CUADRILLAS DE TRABAJO

Las cuadrillas ejecutaran las actividades que hacen parte del objeto del contrato y estarán conformadas generalmente por un oficial y un ayudante. Este equipo deberá estar capacitado en cada una de las labores o actividades propias a desarrollar en los diferentes frentes de trabajo, utilización adecuada de equipos, herramientas e insumos de mantenimiento y seguridad industrial, en este sentido se deben garantizar las cuadrillas técnicas para los diferentes frentes de obra, así:

- ✓ Cuadrilla de albañilería general.
- ✓ Cuadrilla de albañilería y acabados.
- ✓ Cuadrilla de instalaciones eléctricas.
- ✓ Cuadrilla de instalaciones hidráulicas y sanitarias.
- ✓ Cuadrilla de instalaciones mecánicas.
- ✓ Cuadrilla de carpintería metálica.
- ✓ Cuadrilla de carpintería en madera.
- ✓ Cuadrilla de trabajos en altura.
- ✓ Cuadrilla de mantenimiento de canchas sintéticas.
- ✓ Cuadrilla de mantenimiento de mobiliario urbano.
- ✓ Cuadrilla de mantenimiento de juegos infantiles.

CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta la entrega de información a interventoría con respecto a los presupuestos actualizados, incluyendo la intervención y/o mantenimiento pendiente de canchas sintéticas; se está a la espera que estas intervenciones sean definidas por parte del IDRD con el fin de iniciar los respectivos tramites y gestiones para dar apertura a los nuevos frentes de trabajo.

- De acuerdo a los diferentes recorridos realizados por los frentes de obra que se encuentran en intervención, se ha solicitado por parte del IDRD una serie de actividades con el fin de brindar una integralidad de intervención en cada uno de los sectores, sin embargo, es pertinente aclarar que estos cambios generan unos atrasos y reprocesos dentro de la programación y logística de las actividades constructivas.

- BELZCON SAS ha atendido todas las solicitudes y recomendaciones impartidas por la interventoría CONSORCIO DISPARK esto con el fin de dar cumplimiento a las cláusulas y especificaciones del contrato de obra

Anexo 1. Reprogramación de obra G4 V3


Belzcon

contratar mediante el sistema de precios unita
recuperación de la infraestructura d

monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y
ques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES	193,25 días	mié 9/11/22	mié 24/05/23	$ 4.133.711.316
2		ACTA DE INICIO	0 días	mié 9/11/22	mié 9/11/22	$ 0
3		DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE OBRA	76 días	mié 9/11/22	mar 24/01/23	$ 0
4		SOCIALIZACIONES DE PARQUES	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23	$ 0
14		MANTENIMIENTO DE PARQUES	110,75 días	mié 1/02/23	mié 24/05/23	$ 4.133.711.316
15		DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	107 días	mié 1/02/23	dom 21/05/23	$ 538.088.866
16	✓	MOBILIARIO INFANTILES	1 día	mié 1/02/23	jue 2/02/23	$ 993.245
18	✓	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	1 día	jue 2/02/23	vie 3/02/23	$ 118.309
20	✓	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	3 días	vie 3/02/23	lun 6/02/23	$ 976.314
24	✓	SEÑALETICA	1 día	lun 6/02/23	mar 7/02/23	$ 70.842
27		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	34 días	mar 7/02/23	mar 14/03/23	$ 14.609.887
30	✓	PRELIMINARES	35 días	mié 1/02/23	mié 8/03/23	$ 3.050.985
32		DEMOLICIONES Y RETIROS	6 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23	$ 9.748.581
36		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	6 días	mié 22/03/23	mar 28/03/23	$ 21.869.255
39		PINTURAS DEMARCACIONES	11 días	sáb 1/04/23	mié 12/04/23	$ 4.000.177
43		ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	7 días	mar 28/03/23	mar 4/04/23	$ 7.115.831
46		ACABADOS	6 días	vie 7/04/23	sáb 15/04/23	$ 41.432.409
48		PISOS	38 días	mar 14/03/23	vie 21/04/23	$ 69.617.847
52		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS	5 días	sáb 1/04/23	jue 6/04/23	$ 2.024.268
54		PLACAS Y ANDENES	8 días	vie 7/04/23	sáb 15/04/23	$ 8.600.287
56		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	6 días	sáb 15/04/23	vie 21/04/23	$ 3.586.247
60		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	6 días	mar 25/04/23	mar 2/05/23	$ 18.454.993
62		SEÑALETICA	6 días	jue 4/05/23	mié 10/05/23	$ 1.202.107
66		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	6 días	vie 28/04/23	jue 4/05/23	$ 93.538.428
70		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	3 días	mar 25/04/23	vie 28/04/23	$ 1.344.600
72		NO PREVISTOS	38 días	mié 12/04/23	dom 21/05/23	$ 113.722.587
88		AIU 29.1%	107 días	mié 1/02/23	dom 21/05/23	$ 120.802.875
89		GRAN COLOMBIANO	108 días	mié 1/02/23	lun 22/05/23	$ 886.227.651
90	✓	MOBILIARIO INFANTILES	5 días	jue 9/02/23	mar 14/02/23	$ 1.390.725
93	✓	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	6 días	mar 14/02/23	lun 20/02/23	$ 1.306.522
97	✓	TABLEROS Y REDES	2 días	lun 20/02/23	mié 22/02/23	$ 2.632.700
99	✓	SEÑALETICA	1 día	mié 22/02/23	jue 23/02/23	$ 47.678
101	✓	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	8 días	mié 1/02/23	jue 9/02/23	$ 877.504
103	✓	PRELIMINARES	8 días	jue 9/02/23	vie 17/02/23	$ 6.709.887
105	✓	DEMOLICIONES Y RETIROS	10 días	vie 17/02/23	lun 27/02/23	$ 5.269.127
109		PINTURAS DEMARCACIONES	13 días	vie 7/04/23	jue 20/04/23	$ 6.324.675
114		ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	15 días	mar 28/02/23	mié 15/03/23	$ 12.042.319
116		ACABADOS	6 días	jue 20/04/23	mié 26/04/23	$ 50.655.848
118		PISOS	6 días	lun 3/04/23	dom 9/04/23	$ 95.902.376
121		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS	3 días	mié 26/04/23	sáb 29/04/23	$ 2.393.280
123		PLACAS Y ANDENES	9 días	jue 30/03/23	sáb 8/04/23	$ 13.401.926
126		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	4 días	vie 14/04/23	mar 18/04/23	$ 400.948
129		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	29 días	sáb 8/04/23	lun 8/05/23	$ 63.574.482
132		SEÑALETICA	6 días	lun 17/04/23	sáb 22/04/23	$ 1.202.107
136		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	8 días	vie 14/04/23	sáb 22/04/23	$ 127.778.712
141		NO PREVISTOS	67 días	mié 15/03/23	lun 22/05/23	$ 294.555.219
159		AIU 29.1%	108 días	mié 1/02/23	lun 22/05/23	$ 199.761.616
160		BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	101 días	mié 1/02/23	lun 15/05/23	$ 633.224.414
161	✓	MOBILIARIO INFANTILES	6 días	mié 1/02/23	mar 7/02/23	$ 418.233
165	✓	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	4 días	mar 7/02/23	vie 10/02/23	$ 467.613
168	✓	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	2 días	sáb 11/02/23	lun 13/02/23	$ 979.716
170	✓	TABLEROS Y REDES	4 días	lun 13/02/23	vie 17/02/23	$ 976.100
172	✓	SEÑALETICA	2 días	vie 17/02/23	dom 19/02/23	$ 47.678
174	✓	HIERRO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO	4 días	dom 19/02/23	jue 23/02/23	$ 719.417
176		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	16 días	vie 3/03/23	lun 20/03/23	$ 18.446.827
179	✓	PRELIMINARES	8 días	jue 23/02/23	vie 3/03/23	$ 4.466.220

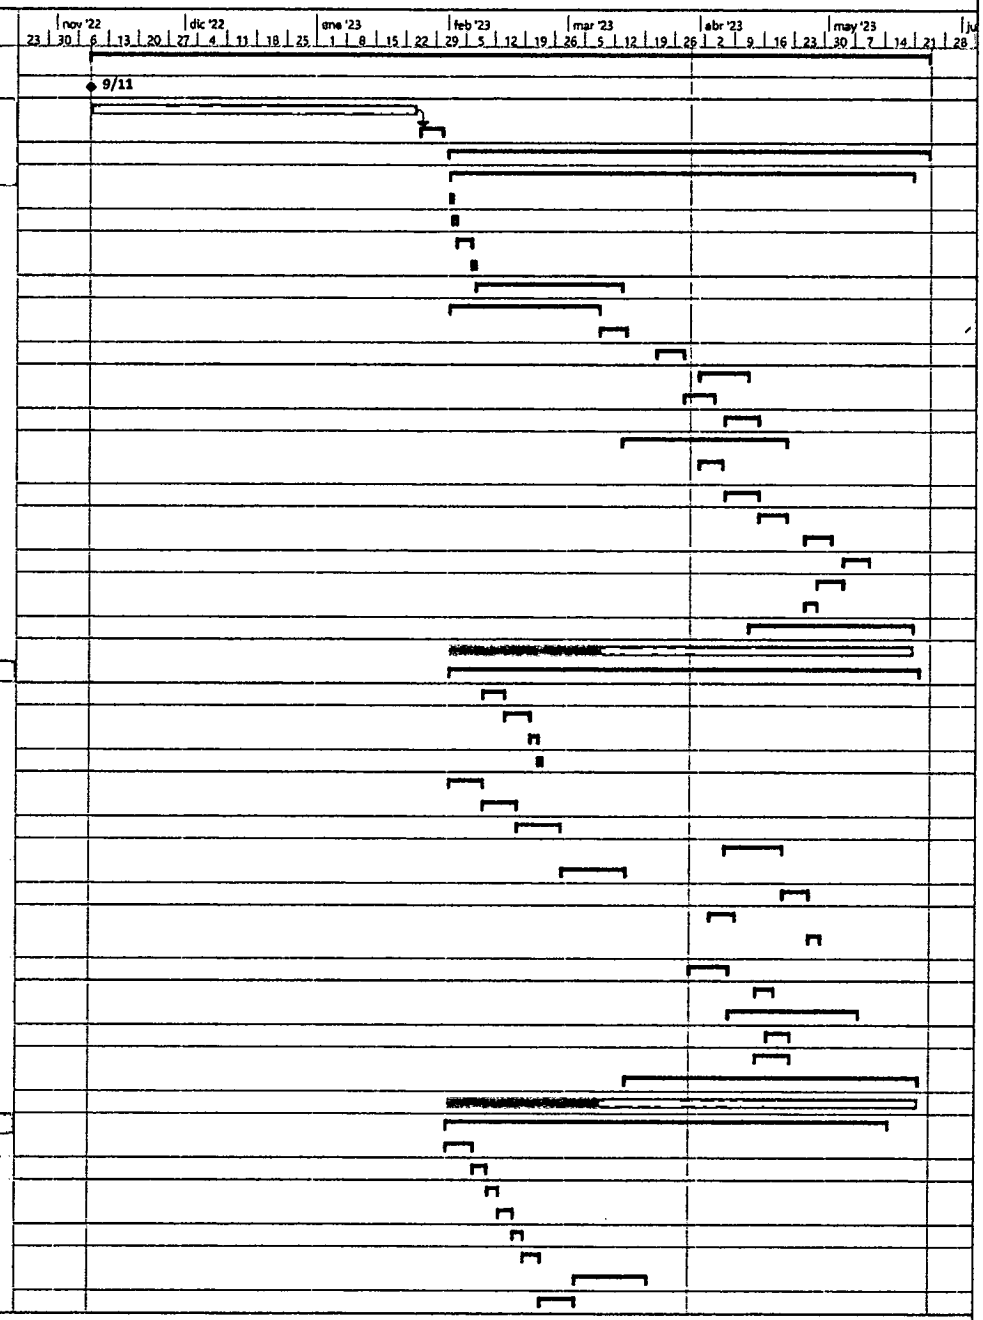

PROGRAMACION PREELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Belzcon

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
181		DEMOLICIONES Y RETIROS	6 días	mié 8/03/23	mar 14/03/23	$ 9.299.567
183		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	32 días	lun 20/03/23	vie 21/04/23	$ 29.628.871
187		PINTURAS DEMARCACIONES	8 días	jue 13/04/23	vie 21/04/23	$ 1.283.299
190		ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	5 días	mié 29/03/23	lun 3/04/23	$ 17.675.596
192		ACABADOS	4 días	dom 9/04/23	jue 13/04/23	$ 25.327.924
194		PISOS	31 días	lun 20/03/23	jue 20/04/23	$ 89.365.911
198		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS	5 días	mar 18/04/23	dom 23/04/23	$ 2.024.268
200		EMPRADIZACIÓN	4 días	vie 21/04/23	mar 25/04/23	$ 4.749.096
202		PLACAS Y ANDENES	21 días	jue 13/04/23	jue 4/05/23	$ 15.533.746
206		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	6 días	jue 4/05/23	mié 10/05/23	$ 7.586.802
211		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	21 días	lun 24/04/23	lun 15/05/23	$ 42.336.662
214		SEÑALETICA	4 días	vie 5/05/23	mar 9/05/23	$ 1.810.739
219		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	4 días	vie 5/05/23	mar 9/05/23	$ 126.071.538
223		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	2 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23	$ 896.400
225		PREFABRICADOS EN CONCRETO Y HIERRO	2 días	lun 8/05/23	mar 9/05/23	$ 2.093.940
227		NO PREVISTOS	21 días	lun 24/04/23	lun 15/05/23	$ 89.499.750
241		AIU 29.1%	101 días	mié 1/02/23	lun 15/05/23	$ 142.733.001
242		EL CLARET	46 días	jue 2/03/23	mar 18/04/23	$ 74.780.454
243		PRELIMINARES	8 días	jue 2/03/23	vie 10/03/23	$ 1.015.050
245		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	16 días	vie 10/03/23	lun 27/03/23	$ 8.660.250
247		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	2 días	lun 10/04/23	mié 12/04/23	$ 1.707.174
249		NO PREVISTOS	22 días	lun 27/03/23	mar 18/04/23	$ 46.526.476
260		AIU 29.1%	46 días	jue 2/03/23	mar 18/04/23	$ 16.851.504
261		TIMIZA	101 días	mié 1/02/23	lun 15/05/23	$ 450.593.537
262	✓	MOBILIARIO INFANTILES	7 días	mié 1/02/23	mié 8/02/23	$ 1.319.859
269	✓	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	6 días	mié 8/02/23	mar 14/02/23	$ 467.613
272	✓	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	3 días	mar 14/02/23	vie 17/02/23	$ 698.288
274	✓	SEÑALETICA	3 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23	$ 47.678
276	✓	PRELIMINARES	18 días	lun 20/02/23	vie 10/03/23	$ 3.857.190
278		DEMOLICIONES Y RETIROS	7 días	vie 10/03/23	vie 17/03/23	$ 15.219.600
280		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	8 días	vie 17/03/23	dom 26/03/23	$ 5.555.295
282		PINTURAS DEMARCACIONES	2 días	mié 26/04/23	vie 28/04/23	$ 935.199
284		ACABADOS	5 días	vie 31/03/23	jue 6/04/23	$ 50.655.848
286		PISOS	6 días	dom 26/03/23	vie 31/03/23	$ 45.377.100
288		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3 días	vie 28/04/23	lun 1/05/23	$ 11.851.065
293		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	33 días	jue 6/04/23	mar 9/05/23	$ 46.344.000
296		SEÑALETICA	4 días	lun 1/05/23	jue 4/05/23	$ 1.810.739
301		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	2 días	jue 4/05/23	sáb 6/05/23	$ 1.707.174
303		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	2 días	sáb 6/05/23	mar 9/05/23	$ 896.400
305		NO PREVISTOS	38 días	jue 6/04/23	lun 15/05/23	$ 163.089.704
321		AIU 29.1%	101 días	mié 1/02/23	lun 15/05/23	$ 101.566.785
322		LA ESPERANZA	46,13 días	jue 2/03/23	mar 18/04/23	$ 109.649.699
323		PRELIMINARES	8 días	jue 2/03/23	vie 10/03/23	$ 1.015.050
325		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	16 días	vie 10/03/23	lun 27/03/23	$ 8.660.250
327		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	2 días	lun 10/04/23	mié 12/04/23	$ 1.707.174
329		NO PREVISTOS	22 días	lun 27/03/23	mar 18/04/23	$ 46.526.476
340		AIU 29.1%	46 días	jue 2/03/23	mar 18/04/23	$ 16.851.504
341		PRELIMINARES	1 día	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1.015.050
343		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	1 día	jue 2/03/23	jue 2/03/23	$ 1.707.174
345		NO PREVISTOS	31 días	vie 3/03/23	mar 4/04/23	$ 24.225.283
354		AIU 29.1%	24 días	jue 2/03/23	dom 26/03/23	$ 7.841.729
355		SAN ANDRES	59 días	mié 15/02/23	dom 16/04/23	$ 236.744.688
356	✓	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	1 día	vie 24/02/23	vie 24/02/23	$ 226.461
358	✓	TABLEROS Y REDES	4 días	vie 24/02/23	mar 28/02/23	$ 4.272.496
360		PRELIMINARES	26 días	mié 15/02/23	lun 13/03/23	$ 13.895.783
363		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	5 días	lun 13/03/23	sáb 18/03/23	$ 4.594.257

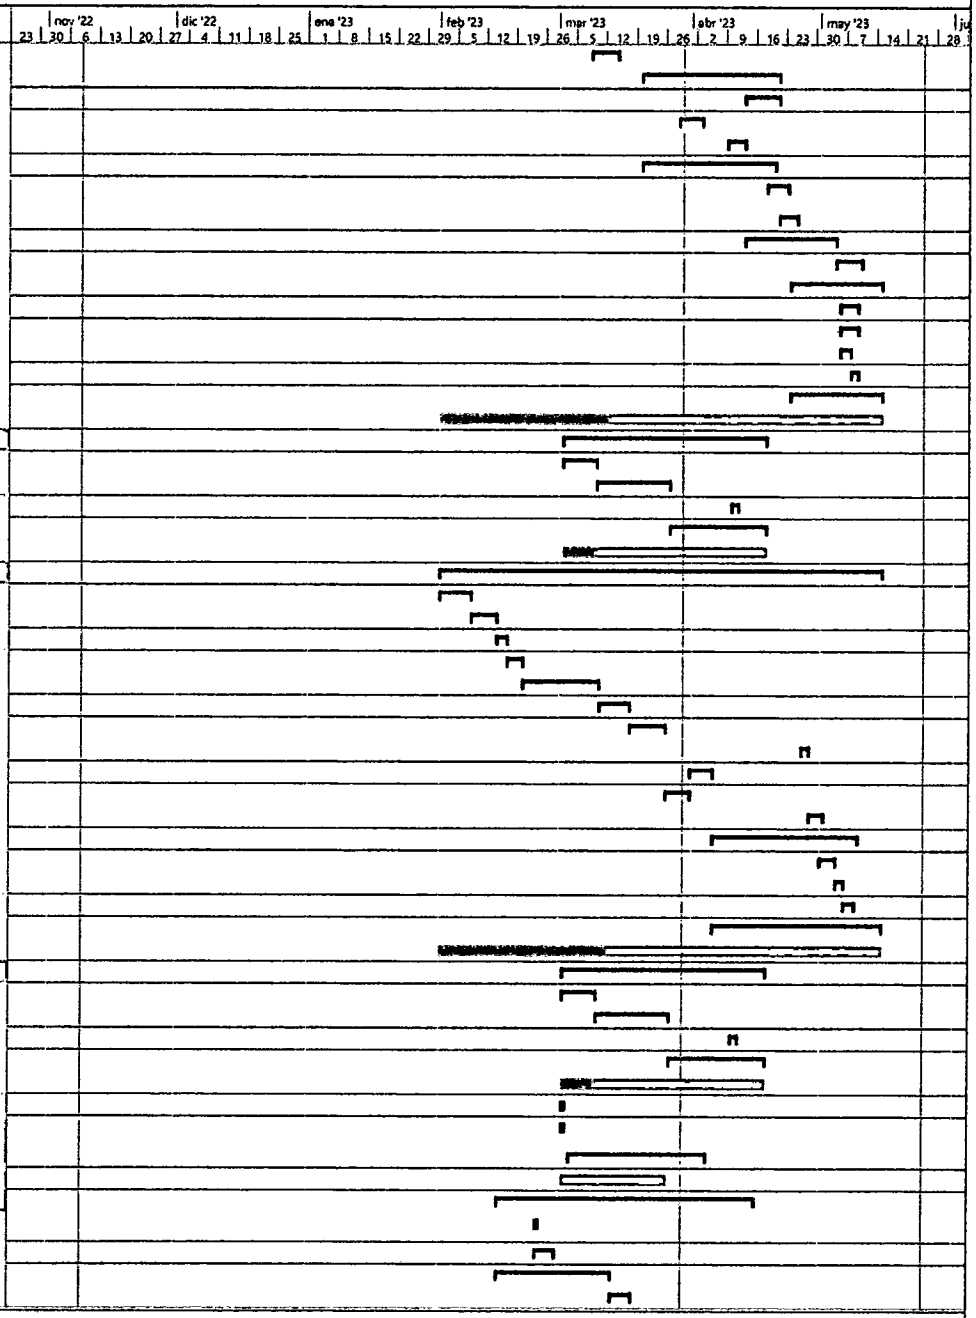


PROGRAMACION PREELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
365		EMPRADIZACIÓN	16 días	sáb 18/03/23	lun 3/04/23	$ 24.878.787
367		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2 días	lun 3/04/23	mié 5/04/23	$ 4.921.296
370		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	25 días	lun 13/03/23	vie 7/04/23	$ 75.387.500
372		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	mié 5/04/23	mié 5/04/23	$ 896.400
374		NO PREVISTOS	13 días	lun 3/04/23	dom 16/04/23	$ 54.327.977
379		AIU 29.1%	59 días	mié 15/02/23	dom 16/04/23	$ 53.363.629
380		LA LAGUNA	89 días	mié 15/02/23	lun 15/05/23	$ 221.892.496
381	✓	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	2 días	dom 19/02/23	mar 21/02/23	$ 118.303
383	✓	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	2 días	mar 21/02/23	jue 23/02/23	$ 373.716
385	✓	SEÑALETICA	2 días	jue 23/02/23	vie 24/02/23	$ 47.678
387		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	17 días	sáb 25/02/23	mar 14/03/23	$ 14.244.363
390	✓	PRELIMINARES	4 días	mié 15/02/23	dom 19/02/23	$ 1.794.609
392		DEMOLICIONES Y RETIROS	14 días	jue 2/03/23	jue 16/03/23	$ 5.852.317
395		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	16 días	mar 21/03/23	mié 5/04/23	$ 21.576.840
398		PINTURAS DEMARCACIONES	14 días	mié 19/04/23	mié 3/05/23	$ 5.136.687
403		ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	10 días	mar 14/03/23	vie 24/03/23	$ 7.498.353
405		ACABADOS	8 días	vie 14/04/23	vie 21/04/23	$ 19.126.523
407		PISOS	30 días	mar 14/03/23	jue 13/04/23	$ 22.207.173
410		INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS	4 días	vie 14/04/23	mar 18/04/23	$ 2.024.268
412		PINTURA MOBILIARIO	5 días	vie 14/04/23	mié 19/04/23	$ 847.728
414		CARPINTERIA METALICA	16 días	dom 23/04/23	mar 9/05/23	$ 2.416.881
417		PLACAS Y ANDENES	9 días	vie 14/04/23	dom 23/04/23	$ 9.231.699
420		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	6 días	mar 9/05/23	lun 15/05/23	$ 3.386.247
424		SEÑALETICA	2 días	lun 8/05/23	mar 9/05/23	$ 443.349
426		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	4 días	vie 5/05/23	mar 9/05/23	$ 2.973.635
429		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	2 días	mié 3/05/23	vie 5/05/23	$ 448.200
431		NO PREVISTOS	12 días	dom 23/04/23	vie 5/05/23	$ 52.124.711
438		AIU 29.1%	87 días	mié 15/02/23	lun 15/05/23	$ 50.016.047
439		EL PROGRESO	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	$ 984.631.514
440	✓	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	14 días	mié 15/02/23	mié 1/03/23	$ 1.757.596
448	✓	ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	4 días	dom 19/02/23	jue 23/02/23	$ 467.613
451	✓	MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS	2 días	mié 1/03/23	vie 3/03/23	$ 1.133.890
454		OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	7 días	lun 13/03/23	lun 20/03/23	$ 12.609.830
456	✓	PRELIMINARES	2 días	vie 3/03/23	dom 5/03/23	$ 3.687.341
458		DEMOLICIONES Y RETIROS	17 días	dom 5/03/23	mié 22/03/23	$ 12.065.883
463		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	12 días	mar 21/03/23	sáb 1/04/23	$ 20.293.644
466		PINTURAS DEMARCACIONES	4 días	jue 6/04/23	mar 11/04/23	$ 4.641.076
469		ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES	5 días	dom 2/04/23	jue 6/04/23	$ 8.279.050
471		ACABADOS	4 días	vie 14/04/23	mié 19/04/23	$ 47.616.497
473		PISOS	45 días	mar 21/03/23	vie 5/05/23	$ 233.346.253
477		PINTURA MOBILIARIO	3 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23	$ 1.206.740
479		CARPINTERIA METALICA	17 días	sáb 22/04/23	mar 9/05/23	$ 23.659.040
483		PLACAS Y ANDENES	10 días	jue 27/04/23	dom 7/05/23	$ 28.328.627
486		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23	$ 7.596.802
491		BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA	4 días	jue 11/05/23	lun 15/05/23	$ 8.660.250
493		SEÑALETICA	4 días	mar 16/05/23	sáb 20/05/23	$ 2.862.720
498		JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE	4 días	vie 12/05/23	mar 16/05/23	$ 41.031.568
501		MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO	1 día	jue 11/05/23	vie 12/05/23	$ 1.792.800
503		NO PREVISTOS	47 días	jue 6/04/23	mié 24/05/23	$ 301.299.793
522		AIU 29.1%	97 días	mié 15/02/23	mié 24/05/23	$ 221.842.502

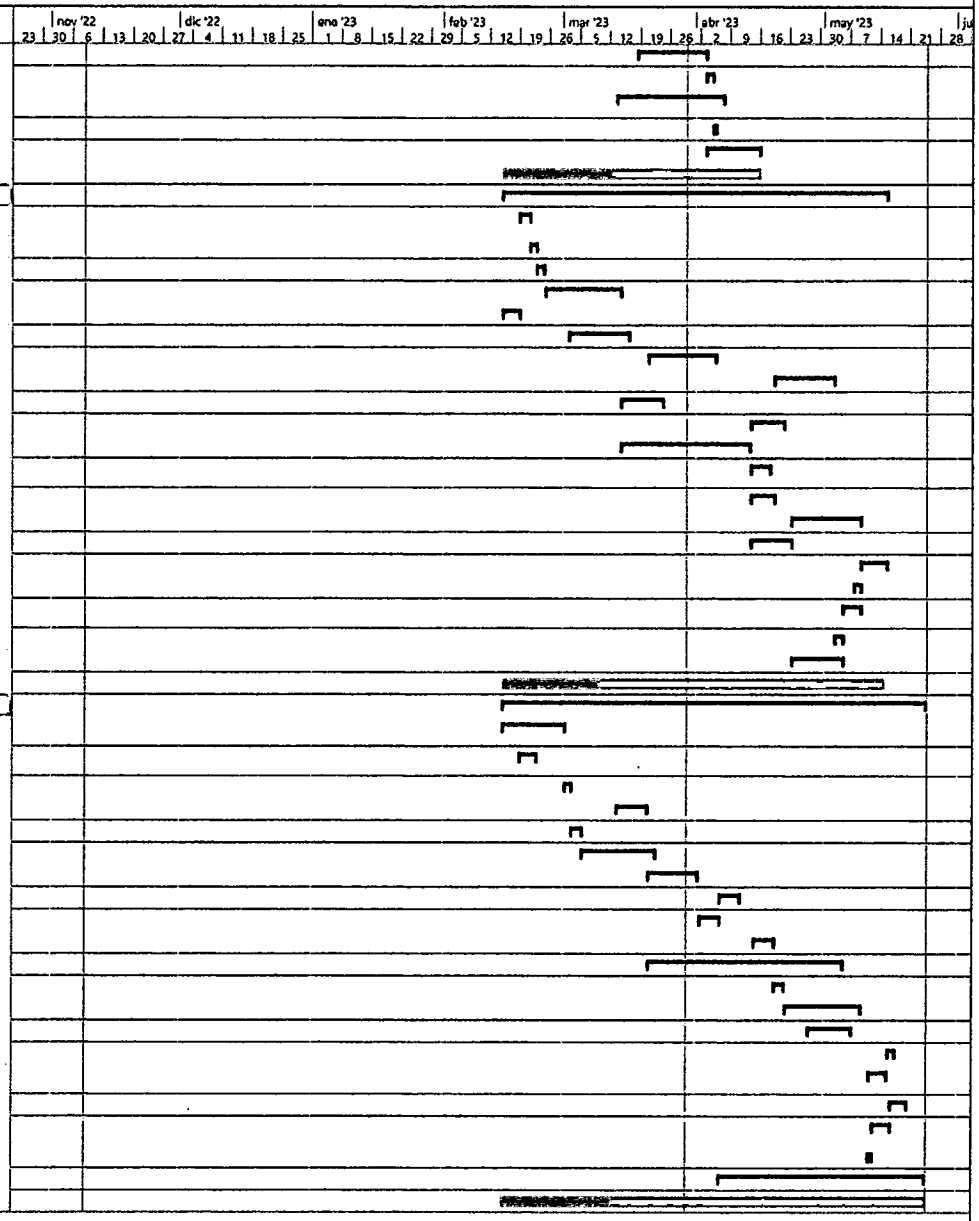

Anexo 2. Programación de obra nuevos parques priorizados


Belzcon

contratar mediante el sistema de precios unit
recuperación de la infraestructura d

monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y
ques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**86,13 días**	**lun 13/03/23**	**jue 8/06/23**
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3		PASTRANITA	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
5		**PASTRANITA**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
6		MOBILIARIO INFANTILES	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
7		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
8		ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES	4 días	vie 24/03/23	mar 28/03/23
9		Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	vie 24/03/23	dom 26/03/23
10		Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	2 días	dom 26/03/23	mar 28/03/23
11		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**2 días**	**mar 28/03/23**	**jue 30/03/23**
12		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
13		**SEÑALETICA**	**4 días**	**jue 30/03/23**	**lun 3/04/23**
14		Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
15		Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte)	2 días	sáb 1/04/23	lun 3/04/23
16		**HIERRO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO**	**2 días**	**lun 3/04/23**	**mié 5/04/23**
17		Desmonte y demolición bolardo M-60 concreto**	2 días	lun 3/04/23	mié 5/04/23
18		**PRELIMINARES**	**6 días**	**mié 5/04/23**	**mar 11/04/23**
19		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	6 días	mié 5/04/23	mar 11/04/23
20		DEMOLICIONES Y RETIROS	12 días	mar 11/04/23	lun 24/04/23
21		Demolición cercamo equipo inclu, cargue y retiro	6 días	mar 11/04/23	lun 17/04/23
22		DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)	6 días	lun 17/04/23	lun 24/04/23
23		RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	6 días	lun 24/04/23	sáb 29/04/23
24		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	lun 24/04/23	sáb 29/04/23
25		**PINTURAS DEMARCACIONES**	**14 días**	**sáb 29/04/23**	**dom 14/05/23**
26		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	4 días	mié 10/05/23	dom 14/05/23
27		Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anti**	4 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23
28		**ACABADOS**	**6 días**	**mié 3/05/23**	**mié 10/05/23**
29		Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	6 días	mié 3/05/23	mié 10/05/23
30		**PINTURA MOBILIARIO**	**4 días**	**mié 10/05/23**	**dom 14/05/23**
31		Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	4 días	mié 10/05/23	dom 14/05/23
32		**CARPINTERIA METALICA**	**15 días**	**dom 14/05/23**	**lun 29/05/23**
33		ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + Insta	5 días	dom 14/05/23	jue 18/05/23
34		Suministro+Instal. Malla Eslabonada Cal. 10 + Pint.	5 días	vie 19/05/23	mié 24/05/23
35		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,60x0,85m)**	5 días	mié 24/05/23	lun 29/05/23
36		**PLACAS Y ANDENES**	**6 días**	**mié 10/05/23**	**mar 16/05/23**
37		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	6 días	mié 10/05/23	mar 16/05/23
38		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**2 días**	**dom 28/05/23**	**mar 30/05/23**
39		EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
40		ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
41		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
42		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
43		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**6 días**	**lun 22/05/23**	**dom 28/05/23**
44		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	6 días	lun 22/05/23	dom 28/05/23
45		SEÑALETICA	4 días	mar 30/05/23	sáb 3/06/23
46		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 30/05/23	jue 1/06/23
47		Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
48		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
49		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
50		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**mar 16/05/23**	**jue 18/05/23**
51		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	2 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23
52		PREFABRICADOS EN CONCRETO Y HIERRO	4 días	jue 18/05/23	lun 22/05/23
53		BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INS)	4 días	jue 18/05/23	lun 22/05/23

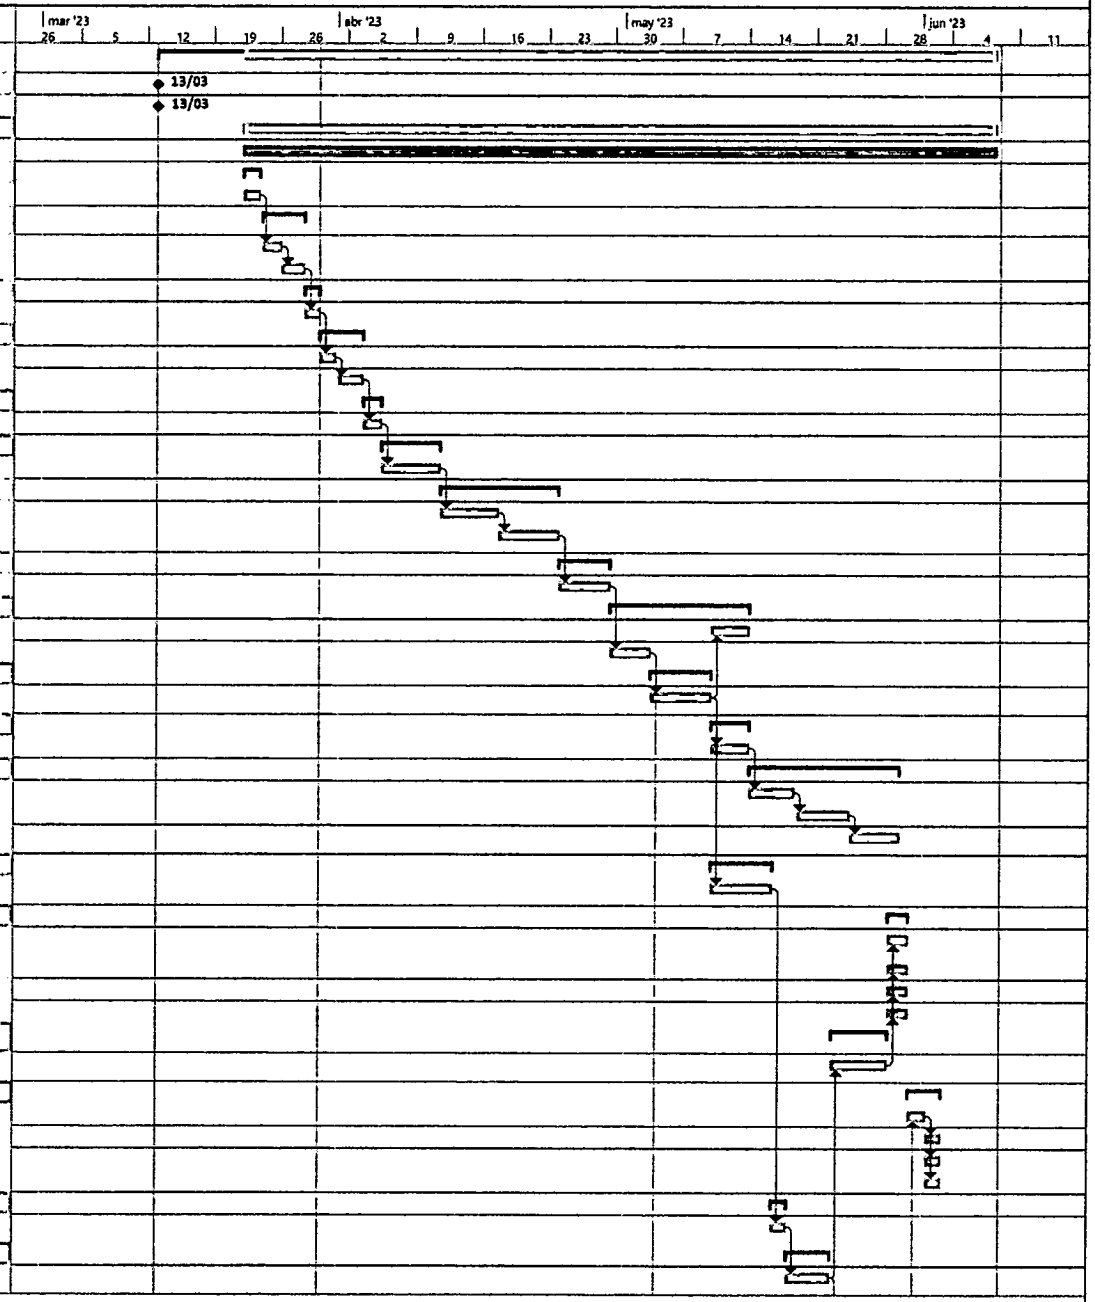

PROGRAMACION PREELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

34

98

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
54		**NO PREVISTOS**	**56 días**	**mié 3/05/23**	**jue 6/06/23**
55		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	6 días	lun 22/05/23	dom 28/05/23
56		Caneca Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
57		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
58		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUI	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
59		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANI	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
60		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (I	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
61		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
62		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
63		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	4 días	mié 3/05/23	lun 8/05/23
64		recalce en graderia sillas campin A=0.1545m2 **	8 días	lun 22/05/23	mar 30/05/23
65		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACI	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
66		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACI	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
67		JUEGO TORRE TRES DESLIZADERO PANELES I	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
68		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
69		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
70		Desmonte CerramMalla eslabonada **	3 días	mar 30/05/23	vie 2/06/23
71		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	4 días	vie 2/06/23	mar 6/06/23
72		**AIU 29,10%**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**

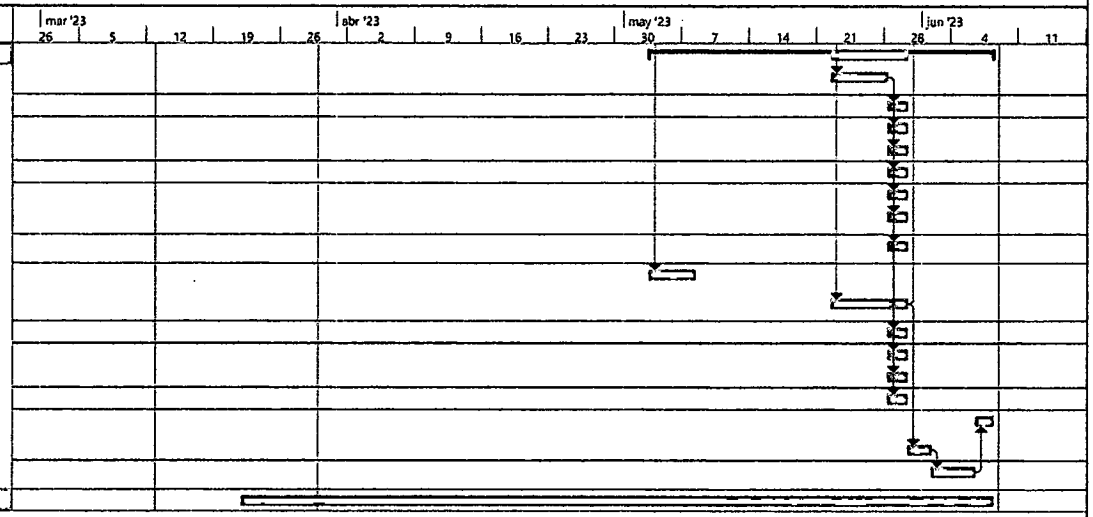


Belzcon

contratar mediante el sistema de precios unit
recuperación de la infraestructura d

monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, edecuación, reparación y
ques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**66,13 días**	**lun 13/03/23**	**jue 8/06/23**
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3		SAN ANDRES I SECTOR	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
5		**SAN ANDRES I SECTOR**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
6		**MOBILIARIO INFANTILES**	**6 días**	**mié 22/03/23**	**mar 28/03/23**
7		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
8		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	2 días	vie 24/03/23	dom 26/03/23
9		Rodadero largo en acero (desm.) STPM **	2 días	dom 26/03/23	mar 28/03/23
10		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**4 días**	**mar 28/03/23**	**vie 31/03/23**
11		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
12		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)**	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
13		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**6 días**	**mié 19/04/23**	**mar 25/04/23**
14		Excavacion manual con retiro suelo blando**	6 días	mié 19/04/23	mar 25/04/23
15		**PRELIMINARES**	**6 días**	**sáb 1/04/23**	**vie 7/04/23**
16		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	6 días	sáb 1/04/23	vie 7/04/23
17		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**12 días**	**vie 7/04/23**	**mié 19/04/23**
18		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	6 días	vie 7/04/23	jue 13/04/23
19		Demol pav asfaltico e=0,1 (sin corte+carg+retiro	6 días	jue 13/04/23	mié 19/04/23
20		**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**12 días**	**mar 25/04/23**	**lun 8/05/23**
21		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	6 días	mar 25/04/23	mar 2/05/23
22		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	mar 2/05/23	lun 8/05/23
23		**PINTURAS DEMARCACIONES**	**4 días**	**dom 28/05/23**	**jue 1/06/23**
24		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	4 días	dom 28/05/23	jue 1/06/23
25		**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**4 días**	**lun 8/05/23**	**jue 11/05/23**
26		Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAlt	4 días	lun 8/05/23	jue 11/05/23
27		**PISOS**	**8 días**	**vie 19/05/23**	**dom 28/05/23**
28		Piso Caucho reciclado 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+inst)	8 días	vie 19/05/23	dom 28/05/23
29		**PLACAS Y ANDENES**	**14 días**	**jue 11/05/23**	**vie 26/05/23**
30		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	8 días	jue 11/05/23	vie 19/05/23
31		ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	6 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23
32		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**2 días**	**jue 1/06/23**	**sáb 3/06/23**
33		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
34		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
35		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**8 días**	**vie 26/05/23**	**jue 1/06/23**
36		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	6 días	vie 26/05/23	jue 1/06/23
37		**SEÑALETICA**	**2 días**	**mar 6/06/23**	**jue 8/06/23**
38		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
39		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
40		SEÑAL SC-60 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
41		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**2 días**	**mar 6/06/23**	**jue 8/06/23**
42		Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
43		Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
44		Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
45		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**mar 6/06/23**	**jue 8/06/23**
46		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
47		**NO PREVISTOS**	**27 días**	**jue 11/05/23**	**jue 8/06/23**
48		Banca concreto GRC 21 MP L=1,93 m Segun diseño BANCA MC	5 días	jue 1/06/23	mar 6/06/23
49		Ceneca Plastica en Prolipropileno (sum+inst)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
50		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23

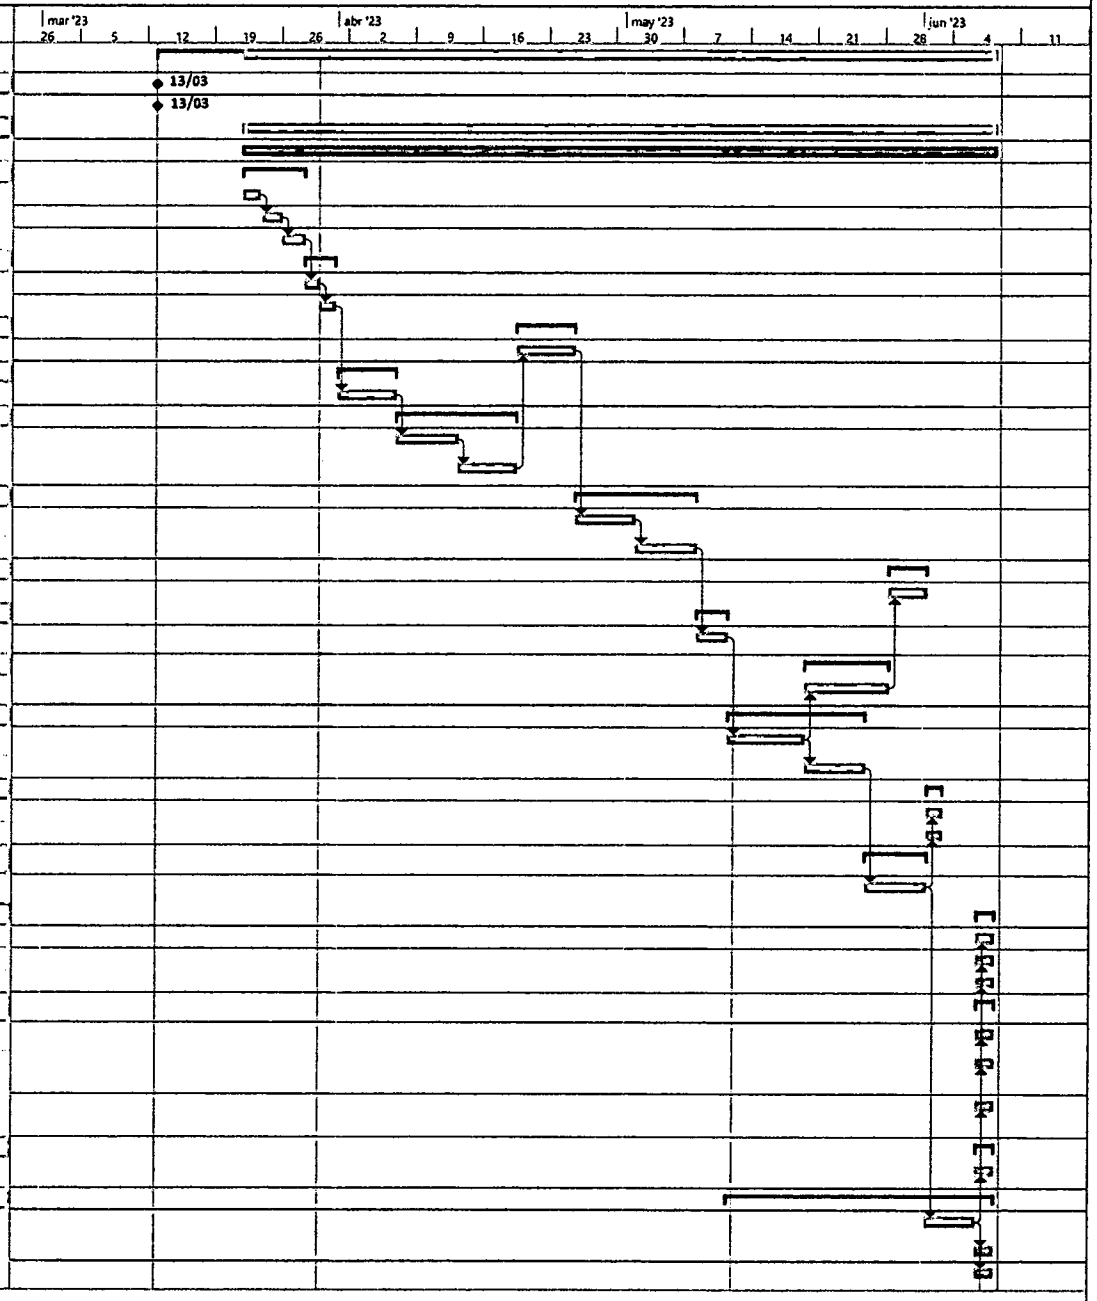


PROGRAMACION PREELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

99

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
51		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
52		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
53		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
54		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
55		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
56		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
57		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
58		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
59		Filtro frances(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800 *	4 días	jue 11/05/23	mar 16/05/23
60		AIU 29,10%	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23

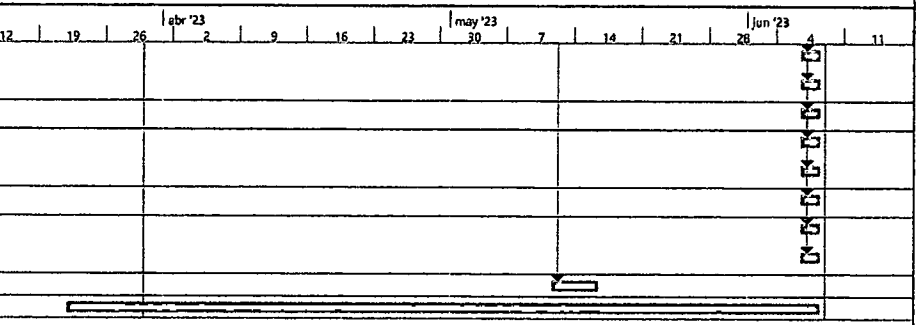


Belzcon

contratar mediante el sistema de precios unit
recuperación de la infraestructura d

monto agotable al mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y
rques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**66,13 días**	**lun 13/03/23**	**jue 8/06/23**
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3		VILLA SUAITA	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
5		VILLA SUAITA	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23
6		**MOBILIARIO INFANTILES**	**2 días**	**mié 22/03/23**	**jue 23/03/23**
7		Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
8		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**6 días**	**vie 24/03/23**	**jue 30/03/23**
9		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	vie 24/03/23	dom 26/03/23
10		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	dom 26/03/23	mar 28/03/23
11		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)**	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
12		**TABLEROS Y REDES**	**4 días**	**jue 30/03/23**	**lun 3/04/23**
13		Desmonte malla proteccion contra impacto **	4 días	jue 30/03/23	lun 3/04/23
14		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**9 días**	**jue 6/04/23**	**sáb 15/04/23**
15		Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	4 días	jue 6/04/23	lun 10/04/23
16		Excavacion manual con retiro suelo blando**	5 días	lun 10/04/23	sáb 15/04/23
17		**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 3/04/23**	**jue 6/04/23**
18		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	3 días	lun 3/04/23	jue 6/04/23
19		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**6 días**	**lun 10/04/23**	**dom 16/04/23**
20		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	2 días	vie 14/04/23	dom 16/04/23
21		Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	4 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23
22		**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**10 días**	**vie 14/04/23**	**lun 24/04/23**
23		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	5 días	vie 14/04/23	mié 19/04/23
24		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	mié 19/04/23	lun 24/04/23
25		**PINTURAS DEMARCACIONES**	**5 días**	**jue 11/05/23**	**mié 17/05/23**
26		Pintura estructura baloncesto **	2 días	jue 11/05/23	dom 14/05/23
27		Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	2 días	jue 11/05/23	dom 14/05/23
28		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	2 días	dom 14/05/23	mar 16/05/23
29		Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anti**	1 día	mar 16/05/23	mié 17/05/23
30		**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	**2 días**	**mar 25/04/23**	**mié 26/04/23**
31		Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAlt	2 días	mar 25/04/23	mié 26/04/23
32		**ACABADOS**	**4 días**	**mié 3/05/23**	**lun 8/05/23**
33		Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	4 días	mié 3/05/23	lun 8/05/23
34		**PISOS**	**26 días**	**sáb 15/04/23**	**jue 11/05/23**
35		Piso Caucho recicl 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+inst)	4 días	lun 8/05/23	jue 11/05/23
36		Suministro e Instalacion Geotextil T-2400**	4 días	sáb 15/04/23	mié 19/04/23
37		rodadura asfaltico IDRD e=0.05 compactado**	3 días	mié 26/04/23	sáb 29/04/23
38		**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS**	**2 días**	**sáb 29/04/23**	**mar 2/05/23**
39		Limpieza CercamotH=0.20M(Desm4Lad+limp-ret+rep4lad)	2 días	sáb 29/04/23	mar 2/05/23
40		**PLACAS Y ANDENES**	**2 días**	**mar 2/05/23**	**mié 3/05/23**
41		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	2 días	mar 2/05/23	mié 3/05/23
42		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**4 días**	**jue 11/05/23**	**mar 16/05/23**
43		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	jue 11/05/23	dom 14/05/23
44		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	dom 14/05/23	mar 16/05/23
45		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**7 días**	**mar 16/05/23**	**mar 23/05/23**
46		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	4 días	mar 16/05/23	vie 19/05/23
47		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	3 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23
48		**SEÑALETICA**	**2 días**	**mar 23/05/23**	**jue 25/05/23**
49		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23
50		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23
51		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23
52		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**4 días**	**mar 23/05/23**	**vie 26/05/23**

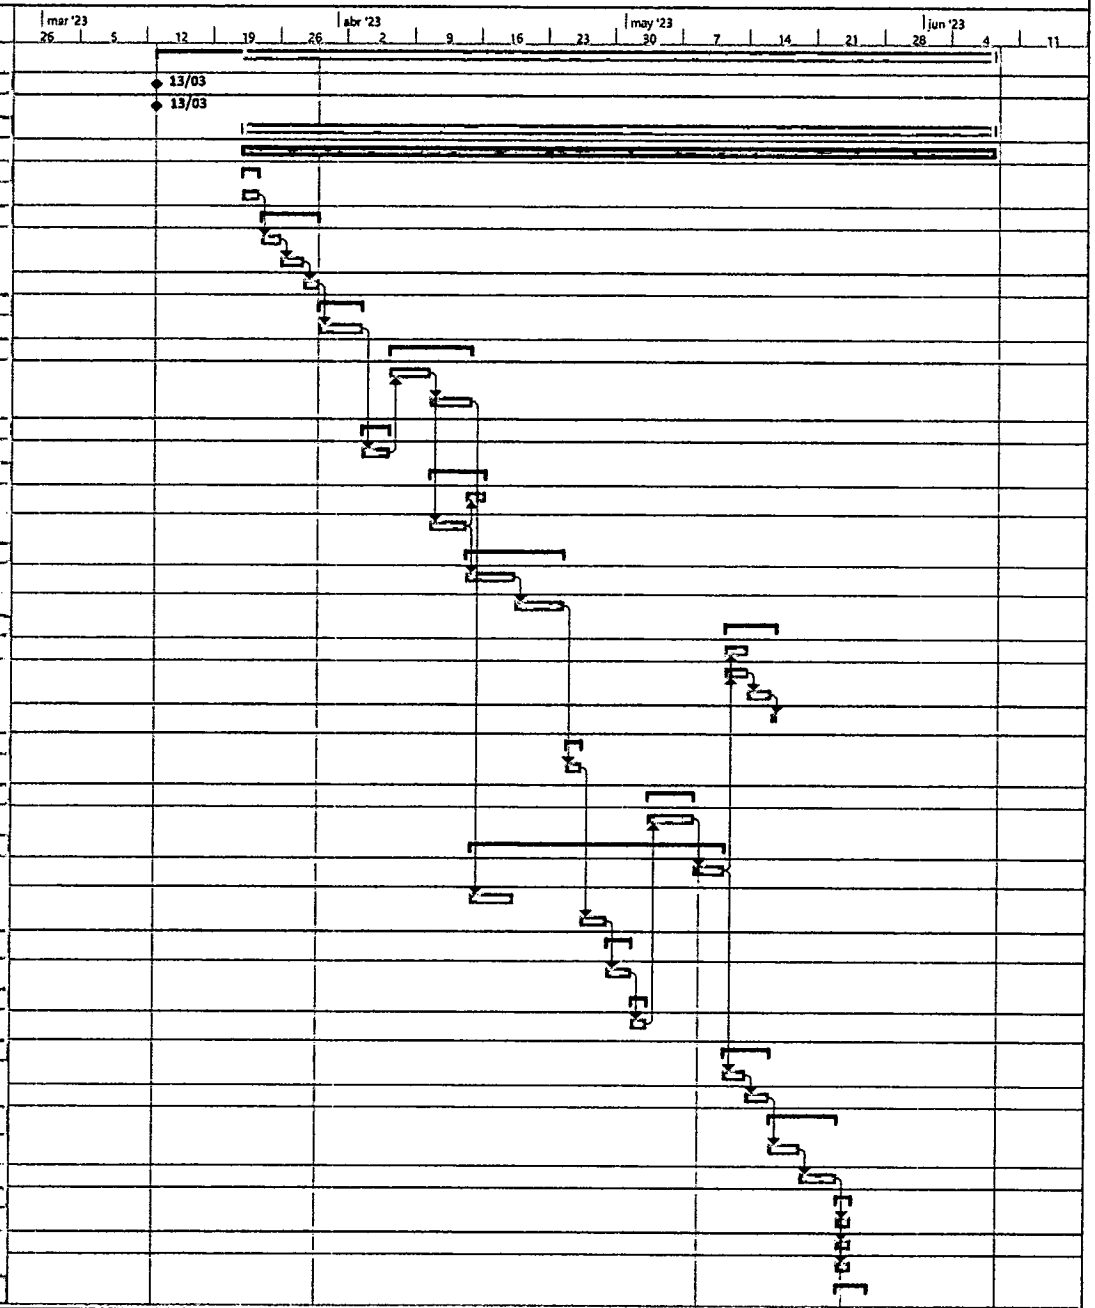


PROGRAMACION PREELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+instalacion)	2 días	mar 23/05/23	jue 25/05/23
54		Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	2 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23
55		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	2 días	sáb 27/05/23	lun 29/05/23
56		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	2 días	sáb 27/05/23	lun 29/05/23
57		**NO PREVISTOS**	31 días	lun 8/05/23	jue 8/06/23
58		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	4 días	lun 29/05/23	vie 2/06/23
59		Canaces Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	vie 2/06/23	dom 4/06/23
60		JUEGO PANEL MUSICAL PIANO EDAD 1-7 AÑOS	2 días	vie 2/06/23	dom 4/06/23
61		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	6 días	lun 8/05/23	dom 14/05/23
62		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIC	2 días	vie 2/06/23	dom 4/06/23
63		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIC	2 días	vie 2/06/23	dom 4/06/23
64		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	vie 2/06/23	dom 4/06/23
65		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	6 días	vie 2/06/23	jue 8/06/23
66		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	4 días	dom 14/05/23	jue 18/05/23
67		**AIU 29,10%**	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23

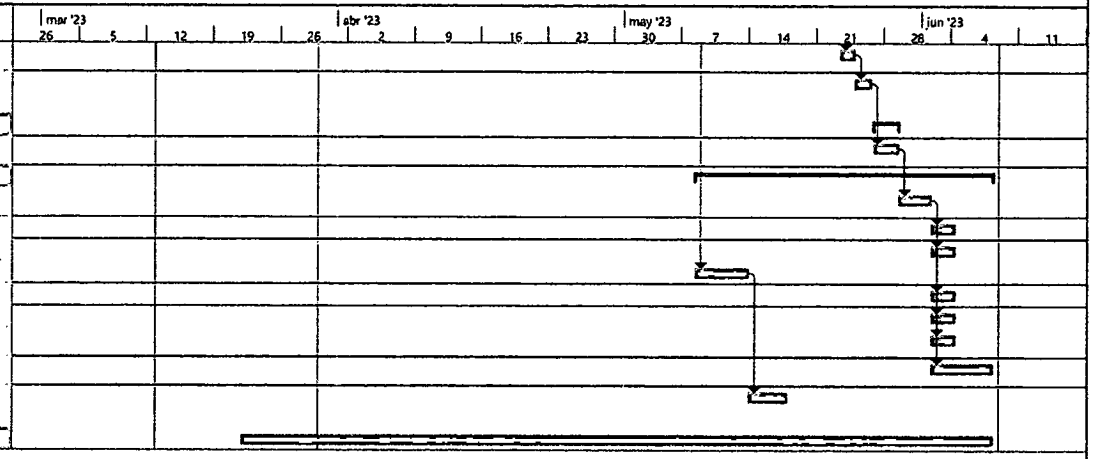

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**88,13 días**	**lun 13/03/23**	**jue 8/06/23**
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3		CARVAJAL	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
5		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
6		CARVAJAL	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23
7		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	**2 días**	**mié 22/03/23**	**jue 23/03/23**
8		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
9		**TABLEROS Y REDES**	**2 días**	**vie 24/03/23**	**dom 26/03/23**
10		Desmonte malla proteccion contra impacto **	2 días	vie 24/03/23	dom 26/03/23
11		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**8 días**	**mié 5/04/23**	**jue 13/04/23**
12		Excavacion manual con retiro suelo blando**	8 días	mié 5/04/23	jue 13/04/23
13		**PRELIMINARES**	**10 días**	**dom 26/03/23**	**mié 5/04/23**
14		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	9 días	jue 30/03/23	mié 5/04/23
15		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	4 días	dom 26/03/23	jue 30/03/23
16		**PINTURAS DEMARCACIONES**	**4 días**	**jue 13/04/23**	**lun 17/04/23**
17		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	4 días	jue 13/04/23	lun 17/04/23
18		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**4 días**	**dom 4/06/23**	**jue 8/06/23**
19		PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
20		REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
21		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**35 días**	**lun 17/04/23**	**mar 23/05/23**
22		Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	35 días	lun 17/04/23	mar 23/05/23
23		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**mié 31/05/23**	**vie 2/06/23**
24		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
25		**NO PREVISTOS**	**53 días**	**jue 13/04/23**	**mar 6/06/23**
26		Banca concreto GRC 21 MP L=1,93 m Segun diseño BANCA MC	8 días	mar 23/05/23	mié 31/05/23
27		Caneca Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
28		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
29		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
30		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
31		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
32		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
33		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
34		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
35		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
36		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
37		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	6 días	mié 31/05/23	mar 6/06/23
38		Cancha de futbol en grama con espina pescado @10	51 días	jue 13/04/23	dom 4/06/23
39		AIU 29,10%	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23

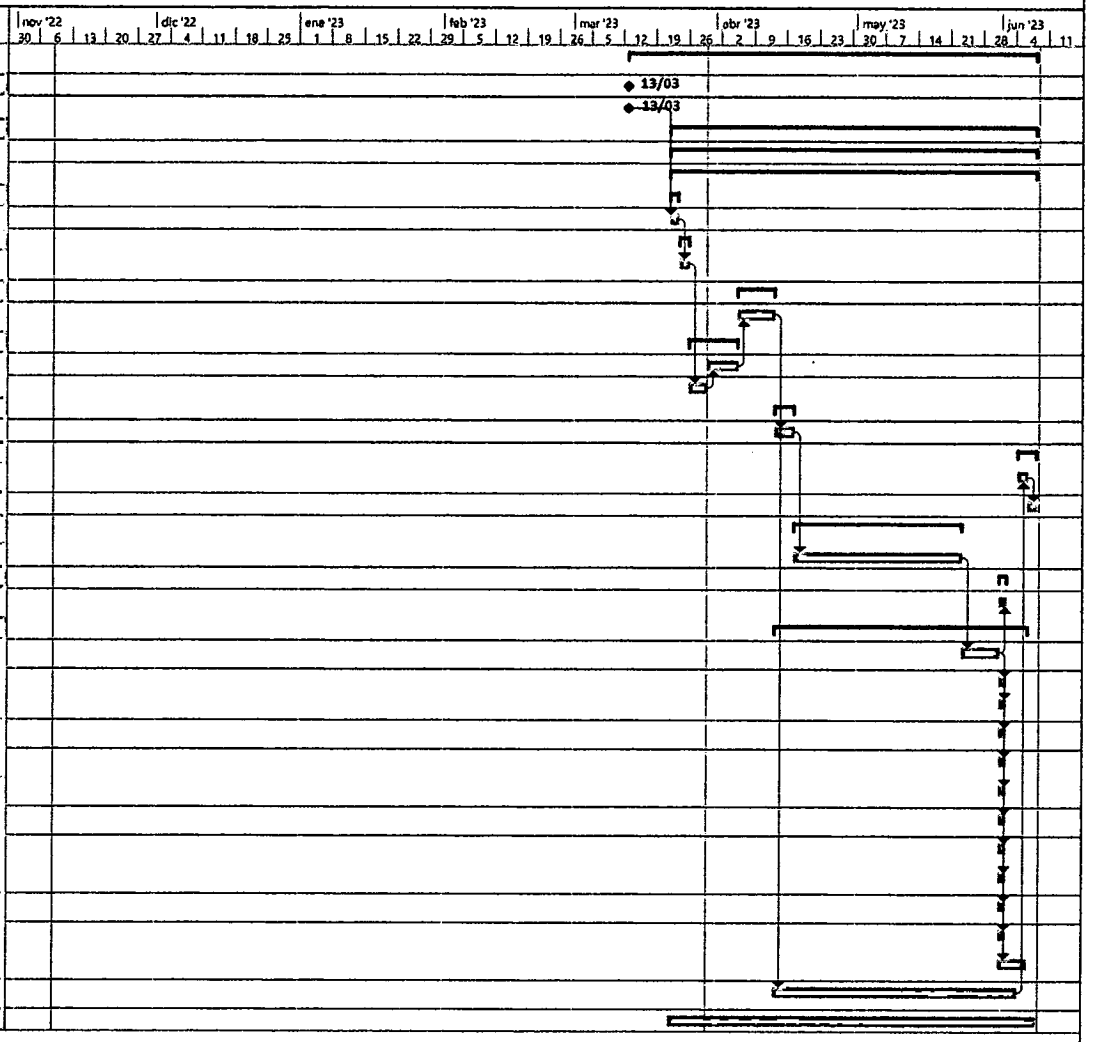


Belzcon

contratar mediante el sistema de precios unit
recuperación de la infraestructura d

monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y
rques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	83,88 días	mié 15/03/23	jue 8/06/23
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	0 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23
3		GRAN COLOMBIANO I	0 días	mié 15/03/23	mié 15/03/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23
5		**GRAN COLOMBIANO I**	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23
6		**MOBILIARIO INFANTILES**	4 días	mié 22/03/23	dom 26/03/23
7		Desmonte juego tipo M-3-STPM**	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
8		Desmonte juegos tipo M-6 o 5A-STPM**	2 días	vie 24/03/23	dom 26/03/23
9		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES**	2 días	dom 26/03/23	mar 28/03/23
10		DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	2 días	dom 26/03/23	mar 28/03/23
11		**MOBILIARIO URBANO Y RELACIONADOS**	6 días	mar 28/03/23	lun 3/04/23
12		Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
13		Banca M-31 (desmonte) STPM **	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
14		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	2 días	sáb 1/04/23	lun 3/04/23
15		**SEÑALETICA**	2 días	lun 3/04/23	mié 5/04/23
16		Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	lun 3/04/23	mié 5/04/23
17		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	4 días	sáb 15/04/23	mié 19/04/23
18		Excavacion manual con retiro suelo blando**	4 días	sáb 15/04/23	mié 19/04/23
19		**PRELIMINARES**	4 días	mié 5/04/23	dom 9/04/23
20		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	4 días	mié 5/04/23	dom 9/04/23
21		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	6 días	dom 9/04/23	sáb 15/04/23
22		Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	2 días	dom 9/04/23	mar 11/04/23
23		Demol pav estatico e=0,1 (sin corte+carg+retiro	2 días	mar 11/04/23	jue 13/04/23
24		Demolición cercamo equipo inclu. cargue y retiro	2 días	jue 13/04/23	sáb 15/04/23
25		**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	12 días	mié 19/04/23	mar 2/05/23
26		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	6 días	mié 19/04/23	mar 25/04/23
27		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	mar 25/04/23	mar 2/05/23
28		**PINTURAS DEMARCACIONES**	12 días	mié 10/05/23	lun 22/05/23
29		Pintura estructura baloncesto **	3 días	mié 10/05/23	vie 12/05/23
30		Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	3 días	vie 12/05/23	mar 16/05/23
31		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23
32		Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	3 días	vie 19/05/23	lun 22/05/23
33		**ELEMENTOS LATERALES DE ANDENES**	4 días	mar 2/05/23	vie 5/05/23
34		Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAlt	4 días	mar 2/05/23	vie 5/05/23
35		**ACABADOS**	8 días	mar 2/05/23	mié 10/05/23
36		Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	8 días	mar 2/05/23	mié 10/05/23
37		**PISOS**	8 días	mié 10/05/23	jue 18/05/23
38		Piso Caucho reciclado 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum	8 días	mié 10/05/23	jue 18/05/23
39		**PLACAS Y ANDENES**	8 días	mar 2/05/23	mié 10/05/23
40		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	8 días	mar 2/05/23	mié 10/05/23
41		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23
42		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23
43		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	jue 18/05/23	vie 19/05/23
44		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	6 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23
45		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	6 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23
46		**SEÑALETICA**	4 días	vie 26/05/23	mar 30/05/23
47		SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	vie 26/05/23	dom 28/05/23
48		SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
49		SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	2 días	dom 28/05/23	mar 30/05/23
50		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	4 días	mar 30/05/23	sáb 3/06/23
51		Modulo informativo de Ejercicios (suministro+instala	2 días	mar 30/05/23	jue 1/06/23
52		Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (su	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23

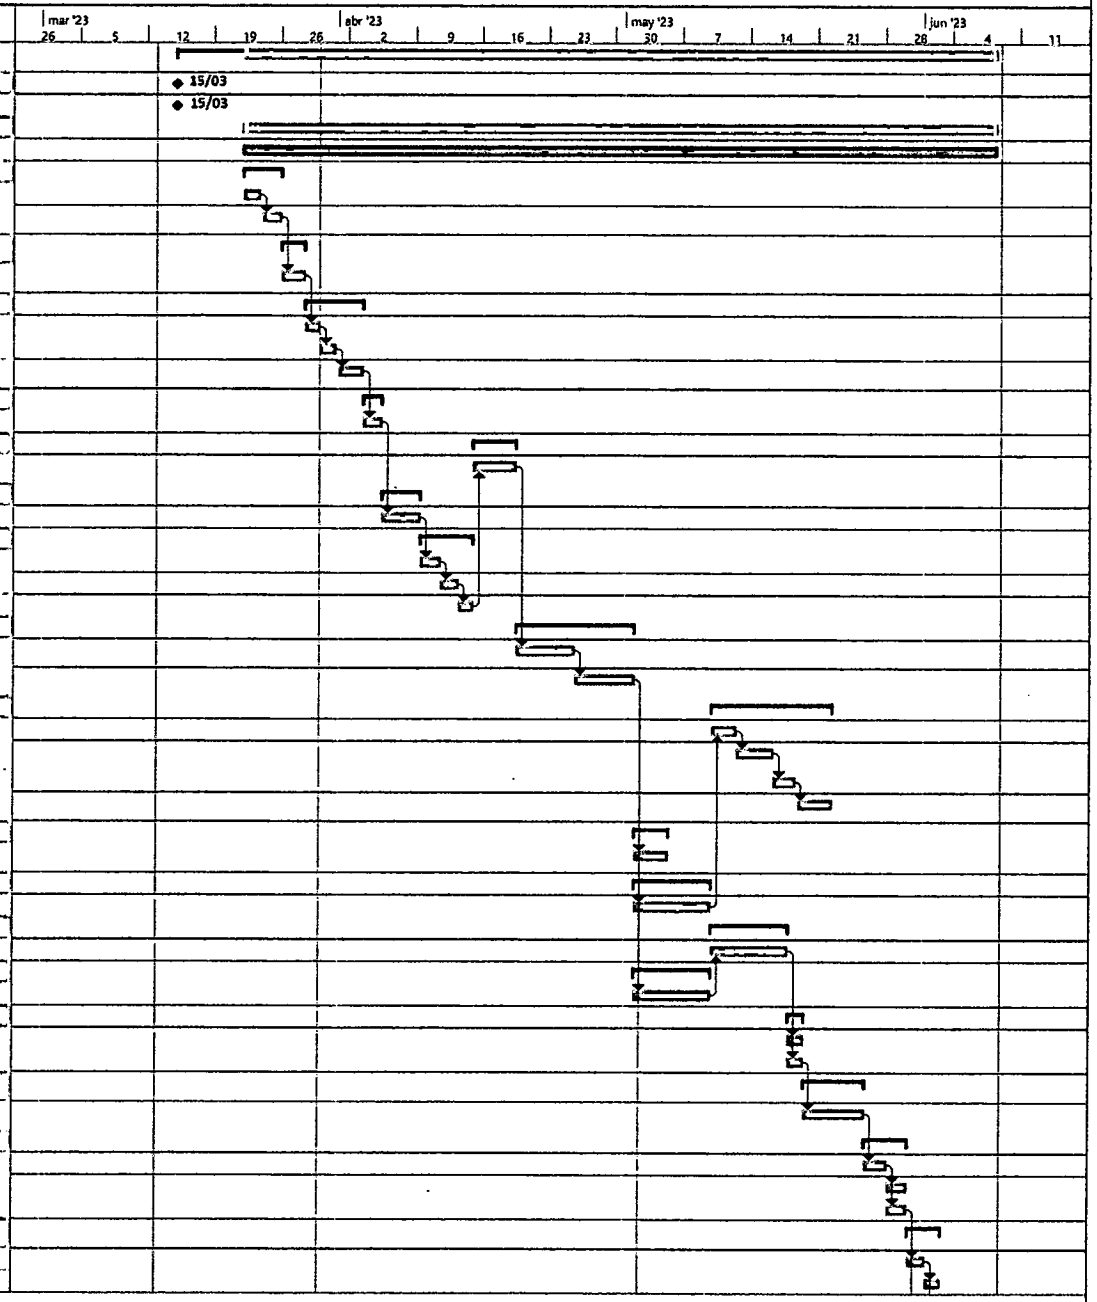

PROGRAMACION PREELIMINAR

CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS


ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Belzcon

contratar mediante el sistema de precios unit *monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura d* *rques de la Red de Proximidad que integran el Sistema Distrital de Parques*

CONTRATO 2664 DE 2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instal	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
54		Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+Instu	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
55		EJERCITADOR BRAZOS ASCENDENTE - EQUIPC	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
56		EJERCITADOR DE PIERNAS - EQUIPO INCLUYEI	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
57		EJERCITADOR PANTORRILLA Y GLUTEOS - EQL	2 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
58		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**sáb 3/06/23**	**lun 5/06/23**
59		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INS	2 días	sáb 3/06/23	lun 5/06/23
60		NO PREVISTOS	37 días	mar 2/05/23	jue 8/06/23
61		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	5 días	mar 30/05/23	dom 4/06/23
62		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+inst)	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
63		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
64		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUN	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
65		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANI	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
66		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (I	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
67		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+II	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
68		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTA	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
69		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	5 días	mar 2/05/23	sáb 6/05/23
70		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPACIONES (suministro+instalación)	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
71		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPACI	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
72		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalacion)	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
73		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD	4 días	dom 4/06/23	jue 8/06/23
74		JUEGO MUELLE DOBLE TOPE AMORTIGUANTE	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
75		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	4 días	dom 4/06/23	jue 8/06/23
76		MODULO DINO PASADIZO ROTACION PUENTE E	2 días	dom 4/06/23	mar 6/06/23
77		AIU 29,10%	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23

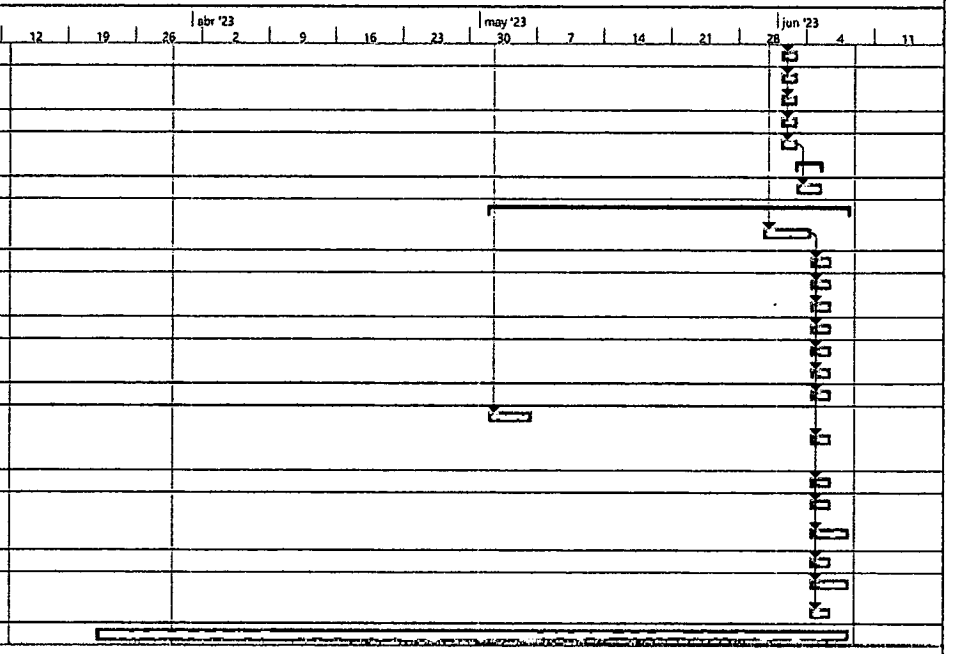


PROGRAMACION PREELIMINAR


CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -IDRD
INTERVENTORIA: DISPARK
CONTRATISTA: BELZCON SAS

ELABORO. ING NESTOR BAUTISTA
APROBO. WILLY BELZNER

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO 2664 GRUPO 4 MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**96,13 días**	**lun 13/03/23**	**jue 8/06/23**
2		**SOCIALIZACIONES DE PARQUES**	**0 días**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
3		LAGUNETA	0 días	lun 13/03/23	lun 13/03/23
4		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
5		**MANTENIMIENTO DE PARQUES**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
6		**LAGUNETA**	**77 días**	**mié 22/03/23**	**jue 8/06/23**
7		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES**	**4 días**	**mié 22/03/23**	**dom 26/03/23**
8		Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
9		Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **	2 días	vie 24/03/23	dom 26/03/23
10		**OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS**	**8 días**	**mié 5/04/23**	**jue 13/04/23**
11		Excavacion manual con retiro suelo blando**	8 días	mié 5/04/23	jue 13/04/23
12		**PRELIMINARES**	**10 días**	**dom 26/03/23**	**mié 5/04/23**
13		Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	4 días	sáb 1/04/23	mié 5/04/23
14		Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	6 días	dom 26/03/23	vie 31/03/23
15		**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**3 días**	**jue 13/04/23**	**dom 16/04/23**
16		Demol pav estatico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	3 días	jue 13/04/23	dom 16/04/23
17		**RELLENOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**8 días**	**lun 17/04/23**	**mar 25/04/23**
18		Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	4 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23
19		Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	4 días	vie 21/04/23	mar 25/04/23
20		**PINTURAS DEMARCACIONES**	**3 días**	**vie 5/05/23**	**mar 9/05/23**
21		Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	3 días	vie 5/05/23	mar 9/05/23
22		**ACABADOS**	**4 días**	**mar 2/05/23**	**vie 5/05/23**
23		Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	4 días	mar 2/05/23	vie 5/05/23
24		**PISOS**	**18 días**	**jue 13/04/23**	**mar 2/05/23**
25		Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	4 días	jue 13/04/23	lun 17/04/23
26		rodadura estatica IDRD e=0.05 compactado**	6 días	mar 25/04/23	mar 2/05/23
27		**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS**	**3 días**	**mar 9/05/23**	**jue 11/05/23**
28		caja de inspeccion 0.6*0.6 h=1.0+excav (ESPEC/IDRD)	3 días	mar 9/05/23	jue 11/05/23
29		**PLACAS Y ANDENES**	**3 días**	**jue 11/05/23**	**lun 15/05/23**
30		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	3 días	jue 11/05/23	lun 15/05/23
31		**ESTRUCTURAS DEPORTIVAS**	**4 días**	**lun 15/05/23**	**jue 18/05/23**
32		EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	2 días	lun 15/05/23	mié 17/05/23
33		ESTRUCTURA MICROFUTBOL(SUM+INST)	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
34		REDES BALONCESTO (SUM + INST)	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
35		REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
36		**BARANDAS, ESCALADORES Y VARIOS MADERA**	**9 días**	**vie 19/05/23**	**vie 26/05/23**
37		BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INS	4 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23
38		Cerramiento contra impacto IDRD h= 6 **	4 días	mar 23/05/23	vie 26/05/23
39		**JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO Y MONTAJE**	**4 días**	**sáb 27/05/23**	**mié 31/05/23**
40		Modulo Informativo de Ejercicios (suministro+ins	2 días	sáb 27/05/23	lun 29/05/23
41		Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+ins	2 días	lun 29/05/23	mié 31/05/23
42		Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+i	2 días	lun 29/05/23	mié 31/05/23
43		**MOBILIARIO URBANO METÁLICO Y MIXTO**	**2 días**	**mié 31/05/23**	**vie 2/06/23**
44		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM +	2 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
45		**NO PREVISTOS**	**12 días**	**sáb 27/05/23**	**jue 8/06/23**
46		Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun di	4 días	vie 2/06/23	mar 6/06/23
47		Canecas Plastica en Polipropileno (sum+Inst)	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
48		ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SU	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
49		AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (S	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
50		PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO C/	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
51		SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANIN	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
52		SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23

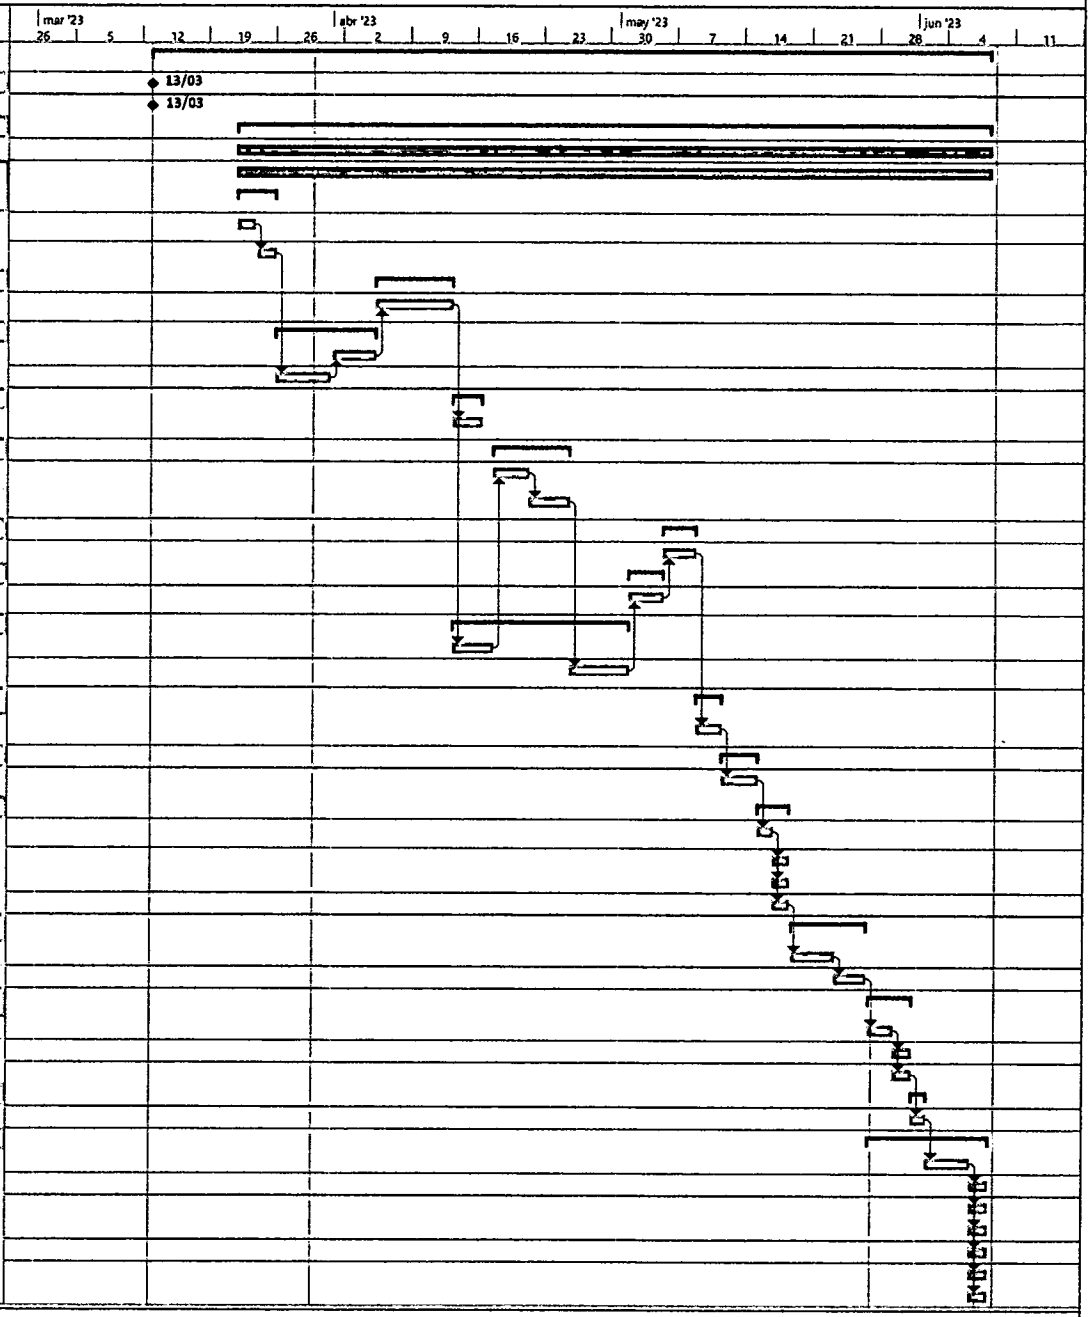

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INS	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
54		MODULO EN CONCRETO MESA DE 2 OCUPA	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
55		MODULO EN CONCRETO MESA DE 4 OCUPA	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
56		CESTA SANECAN SICILIA (suministro+instalad	2 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
57		FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCI	8 días	sáb 27/05/23	dom 4/06/23
58		AIU 29,10%	77 días	mié 22/03/23	jue 8/06/23




Belzcon
Construcción Propositiva

BELZCON SAS

INFORME AMBIENTAL N°5

CONTRATO DE OBRA No. 2664 de 2022

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

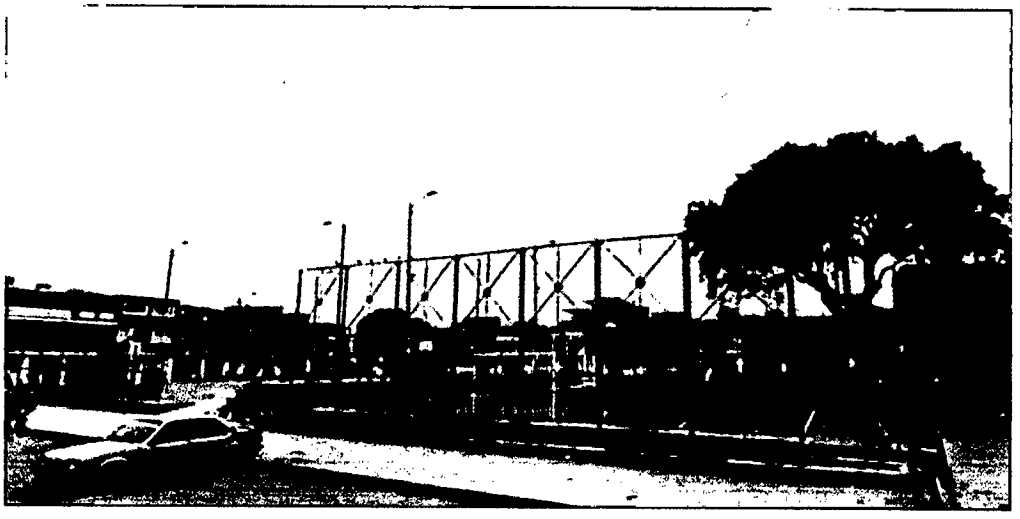

Belzcon
Construcción Propositiva

INFORME AMBIENTAL # 5 CONTRATO IDRD 2664 DE 2022

Elaborado:	Revisado:	Aprobado por:
PROFESIONAL AMBIENTAL	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

CONTROL DE VERSIONES		
VERSIÓN	**FECHA**	**DETALLE**
1	5-04-2023	Ajustes solicitados por Interventoría Ambiental mediante correo electrónico 29-03-2023

Belzcon
Construcción Propositiva

INFORME AMBIENTAL # 5

CONTRATO IDRD 2664 DE 2022

Tabla de contenido

Índice

1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVO GENERAL 4
   2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
   3.1. LOCALIZACIÓN 5
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 6
   4.1. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA EJECUTAR 7
   4.2. ORGANIGRAMA CONTRATO 2664 7
5. GESTIÓN AMBIENTAL 8
   5.1. LICENCIAS AMBIENTALES 8
   5.2. MANEJOS DE MATERIALES E INSUMOS 9
   5.3. MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES 12
   5.4. MANEJO DE RCD 13
6. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 15
7. MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 16
8. MANEJO DE FAUNA, VEGETACIÓN Y PAISAJE 16
9. CAPACITACIONES AMBIENTALES 16
10. ORDEN Y ASEO 17
11. CONCLUSIONES 19

Índice de Tablas

Tabla 1. Listado de parques aprobados por supervisión IDRD 5

Tabla 2. Información del Contrato IDRD No.2664 – 2022- Contratista.....6

Tabla 3. Información del Contrato 2928 de 2022- Interventoría. 6

Tabla 4. Listado permisos, licencias ambientales. 8

Tabla 5. Materiales usados en el mes de febrero de 2023.....11

Tabla 6. Gran consolidado RCD de obra mes febrero de 2023.....14

Tabla 7. Listado de los gestores de RCD inscritos en la jurisdicción CAR. 14

Tabla 8. Listado de volquetas. 15

Índice de Figuras

Figura 1. Organigrama 7

Índice de Anexos

Anexo 1. Certificado limpieza y disposición residuos líquidos y solidos baterías sanitarias. 10

Anexo 2.Informe RCD -SDA mes febrero de 2023.....13

Anexo 3. Formato de capacitaciones y cronograma. 16

1. INTRODUCCION

BELZCON SAS, fue contratado para llevar a cabo el contrato de obra No. 2664: "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4" para lo cual formuló el Plan de Manejo Ambiental con el fin de obtener todos los prerrequisitos que exige el IDRD.

2. OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer por medio de este informe todas las actividades realizadas durante la fase constructiva, correspondientes al componente ambiental para la ejecución del contrato de obra IDRD No. 2664 de 2022.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evidenciar las medidas de manejo ambiental para ser implementadas durante la ejecución del proyecto.
- Mostrar en cada uno de los componentes la gestión realizada desde el área ambiental.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN

Durante el mes objeto del presente informe, se adicionaron por autorización de la Supervisión Técnica del IDRD la intervención de cinco (5) nuevos parques para un total de 14:

Tabla 1. Listado de parques aprobados por supervisión IDRD

No	ID PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE	ESCALA	DIRECCION
1	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	BOLSILLO	CARRERA 80 Q CALLE 71 F SUR
2	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	BOLSILLO	CARRERA 78 B CALLE 69 C BIS SUR
3	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	VECINAL	CALLE 53 B SUR CARRERA 78 L
4	08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	VECINAL	CARRERA 74 DG 40 B SUR
5	07-195	BOSA	URBANIZACION LA ESPERANZA	BOLSILLO	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR
6	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	BOLSILLO	Dg. 52a Sur #53-97, Bogotá
7	06-004	TUNJUELITO	EL CLARET	BOLSILLO	CALLE 48 A SUR CARRERA 27
8	08-013	KENNEDY	URBANIZACION EL PROGESO	BOLSILLO	CARRERA 72 B # 43 SUR
9	08-025	KENNEDY	SAN ANDRES	VECINAL	ZONA CENTRAL DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 42C SUR Y CALLE 42F SUR CON CARRERA 60 BIS Y DIAGONAL 42C SUR
10	07-038	BOSA	DESARROLLO VILLA SUAITA	VECINAL	CARRERA 91 A BIS B CON CALLE 65 SUR – DIAGONAL 66 SUR ENTRE CARRERA 91 A Y 91 F
11	08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR	VECINAL	CARRERA 80 C CON CALLE 45 SUR
12	08-014	KENNEDY	CARVAJAL	VECINAL	CARRERA 72 N CON CALLE 35 B SUR
13	06-005	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNETA	VECINAL	DIAGINAL 51 SUR # 55 A 08
14	07-080	BOSA	DESARROLLO GRANCOLOMBIANO I SECTOR URBANIZACION CIUDADELA ROBERTO PACHON	VECINAL	AV CALLE 45 SUR AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CARRERA 88 A BIS COSTADO NORORIENTAL

Fuente: BELZCON SAS CTO IDRD 2664 DE 2022.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

A continuación, se describe toda la información de BELZCON SAS, bajo contrato de obra 2664 de 2022:

Tabla 2. Información del Contrato IDRD No.2664 – 2022- Contratista.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BELZCON SAS
NIT	901.252.860-7
DIRECCION	CALLE 105 NO. 46-26
TELEFONO	6017689259
E MAIL	correo.bzc@gmail.com
DATOS DEL PROYECTO	
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"
CONTRATO IDRD N°	2664 de 2022
FIRMA ACTA DE INICIO	09 de noviembre de 2022
PLAZO DE EJECUCION	7 meses

Fuente: BELZCON SAS. CTO IDRD 2664 de 2022

Tabla 3. Información del Contrato 2928 de 2022- Interventoría.

DATOS DE LA INTERVENTORIA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DISPARK
NIT	901.645.276-2
CONTRATO IDRD N°	2928 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES" GRUPO 4
E MAIL	dispark@ingeplan.com , disparkg4@ingeplan.co
DIRECCION	Calle 77 # 11-19/ Oficina 602
TELEFONO	3128942194


Fuente: Interventoría. Contrato IDRD 2928 de 2022.

4.1. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA EJECUTAR

De acuerdo a tabla 1. Listado de parques aprobados por supervisión IDRD, cada uno de ellos serán objeto de manteamientos (pinturas), mejoramientos (cambios de juegos infantiles), adecuaciones y reparaciones de mobiliarios, canchas y cerramientos.

4.2. ORGANIGRAMA CONTRATO 2664

Figura 1. Organigrama

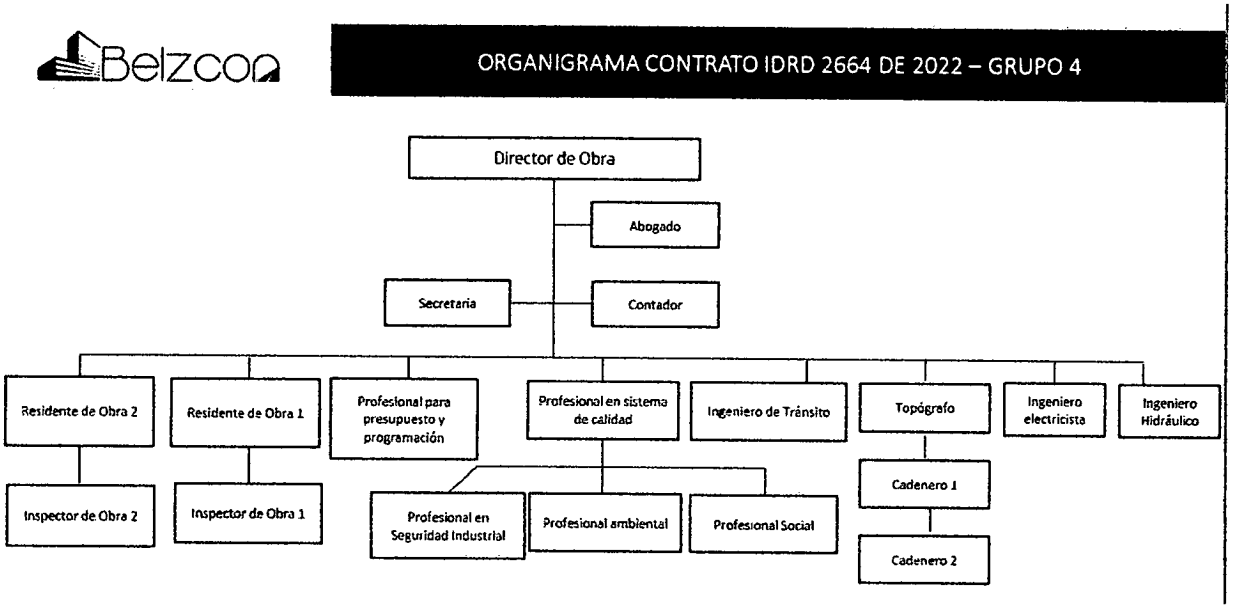

Fuente: BELZCON SAS. Cto IDRD 2664 de 2022.

5. GESTIÓN AMBIENTAL

Corresponde a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), definidos en el contrato IDRD 2664 de 2022. Con el fin de implementar los programas para la prevención, y mitigación de los impactos ambientales generados, sobre cada uno de los componentes ambientales: aire, agua, suelo y vegetación, en los parques donde se desarrolla el proyecto.

5.1. LICENCIAS AMBIENTALES

Se relaciona tabla a nivel de permisos, licencias ambientales, PMA, a nivel de proveedores durante el mes del informe:


Tabla 4. Listado permisos, licencias ambientales.

Permiso ambiental	Nombre	Material
DIRECTORIO IDU VIGENTE- REGISTRO IDU N°511- 2019, PERMISO AMBIENTAL PRONUNCIAMIENTO AUTORIDAD COMUNICADO NO. 20222074277DEL 28/09/2022 CAR. VIGENCIA HASTA EL 27-09-2023	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	RCD Y APROVECHAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE ESTOS
INSCRIPCIÓN IDU 421/2015- PLAN DE MANEJO Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA MINA LAS MANAS Y SANTA INÉS EN EL ÁREA DEL CONTRATO CONCESIÓN MINERA 8151 A NOMBRE DE LA EMPRESA HOLCIM COLOMBIA S.A (PERDIL O-O SECTOR NOR-ESTE), TUNJUELITO- BOGOTÁ	MAQUINAS AMARILLAS SAS - MARILLAS SAS	RCD
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017 MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S	RCD Y APROVECHAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE ESTOS

5.2. MANEJOS DE MATERIALES E INSUMOS

- **Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio**

Se cuenta con siete (7), frentes de obra activos con su debido cerramiento perimetral con malla combinada y postes, adicionalmente según anexo técnico del área social, no se requiere punto fijo de atención ciudadana.

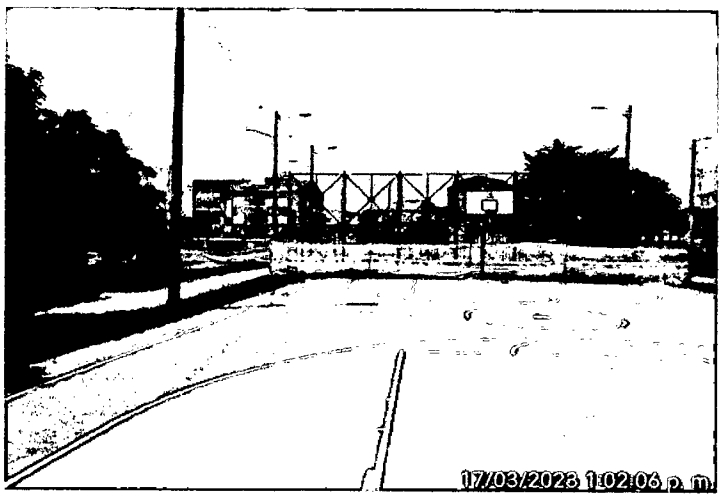

Cerramiento perimetral parque Llano del Bosa

Frentes activos parques:


1) Llano de Bosa.
2) Gran Colombiano.
3) Bertha Hernández.
4) Timiza
5) El progreso.
6) San Andrés.
7) Laguna

En los frentes de obras activos se cuenta con un (1) punto ecológico para la disposición adecuada de los residuos que se generan, a nivel de manejo y disposición -RESPEL, el proyecto por su alcance que es mantenimiento de parques, dentro de sus procesos no se generara residuos peligros, pero si se llegara a generar esta clase de residuos, se hará entrega a empresas

especializadas y autorizadas por la Autoridad Ambiental competente en la disposición final de estos.

Se efectúan jornadas de aseo a los frentes de obra con una periodicidad de dos veces por semana, para mantener en óptimas condiciones ambientales y sanitarias el proyecto.

El proyecto cuenta con tres baños portátiles de la empresa Septeclean ubicados en los parques: Timiza, el Progreso y Laguna, en aprobación y concertación con la Interventoría SST.

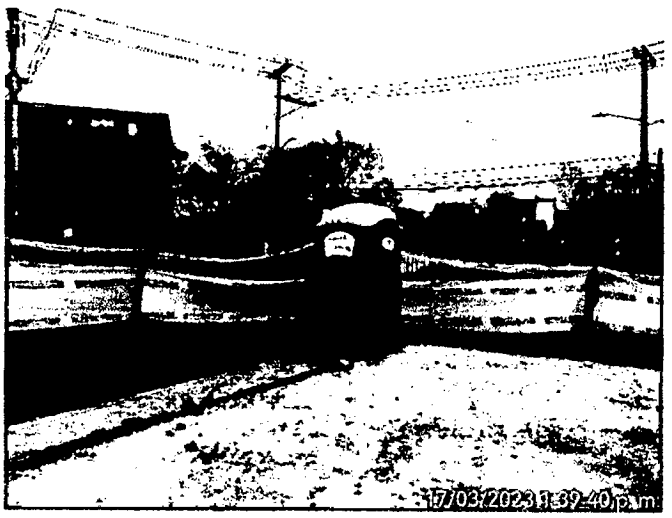

Baño portátil ubicado parque Timiza

- Los frentes de obra se encuentran dotado con botiquín de primeros auxilios y con la señalización necesaria para caso de emergencia.

- **Indicadores de Gestión**

✓ **No. Frentes de obra adecuadamente manejados/ No. Frentes de obra implementados.**

(7/7) * 100% = 100%

✓ **No. de baños requeridos/ No. baños implementados**

(3/3) *100%= 100%

Anexo 1. Certificado limpieza y disposición residuos líquidos y solidos baterías sanitarias.

F-PMA -02. Manejo de materiales de construcción

Se establecen e implementan medidas y procedimientos de manejo ambiental para minimizar los impactos ambientales ocasionados por el manejo de materiales pétreos, y diferentes materiales que se emplearán para el cumplimiento de los procesos constructivos del proyecto. A la fecha de este informe, se realizó adquisición de materiales pétreos, se ejecutó actividades de demolición de canchas de basquetbol o zonas infantiles de juegos generando RCD,



Excavaciones – Parque Bertha Hernández.



Demolición cancha basquetbol – Parque Timiza.

Demanda Ambiental

Tabla 5. Materiales usados en el mes de febrero de 2023.

Material	Cantidad m3 aproximadamente	Toneladas aproximadamente
Sub base	400	680
Base	200	340
Bordillo	13	22.1
Cemento – Argos	2	3.4
Total	**615**	**1045.5**

Nota: Certificaciones en proceso por área técnica.

Indicadores de Gestión

- ✓ No. Acopios adecuadamente manejados/ No. Acopios implementados

  (0/2) * 100% = 0%

Los acopios no se cubrieron adecuadamente.

5.3. MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES

Se establecen las medidas para el manejo adecuado de escombros (RCD), material reciclable, material reutilizable y desechos que son generados durante los procesos constructivos y de mantenimientos del proyecto, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Residuos solidos

Para el Manejo Integral de los Residuos se cuenta con un (1) punto Ecológico en los frentes de obra (parques en intervención), el cual consta de tres canecas identificadas por colores para la segregación de los residuos, los trabajadores tienen entre sus funciones, realizar la limpieza de cada frente de obra, y los residuos resultantes se dispondrán en bolsas para luego ser entregado a la empresa de Servicio público del sector, si hay residuos aprovechables se llevan a la bodega que tiene el contratista para posterior entrega al correspondiente gestor.

El código de colores que se empleara es el siguiente:

- Bolsa blanca: disposición de material reciclable por ejemplo (metal, cartón, papel, madera, señalización, malla traslucida, trozos de colombinas)
- Bolsa Verde: Residuos orgánicos (comida).
- Bolsa negra: residuos como barrido, empaques de comida.

Los residuos no reutilizables (bolsa negra y verde) son entregados a LIME- Limpieza Metropolitana SA ESP, empresa que presta los servicios de recolección de residuos, corte de césped, en los parques que son objeto de mantenimientos, los días lunes, miércoles y viernes.



Punto ecológico, parque Llano de Bosa.

5.4. MANEJO DE RCD

De acuerdo a lo que se consignó en el PMA para dar cumplimiento a la Resolución 1115 de 2012, el contratista le fue asignado el PIN Ambiental 22336 otorgado por la SDA – Secretaria de Ambiente. Durante el mes del informe marzo de 2023, se realizó la actividad demoliciones y extensión de materiales en los parques : Llanos de Bosa, Gran Colombiano, Bertha Hernández, El Progreso y Laguna.

A nivel de RCD generados están siendo entregados a las siguientes escombreras: Reciclados Industriales de Colombia SAS, Maquinas Amarillas, Cemex y el Greco las cuales se encuentra en listado IDU Vigente , CAR y SDA , la gestión de certificados y formatos de la SDA a nivel de RCD,mes de marzo serán entregados mes vencido siguiendo directrices por parte de la Supervisión Ambiental del IDRD.

Es por ello que se hace entrega de informe de RCD a nivel de formatos de la Secretaria de Ambiente mes de febrero de 2023 **Ver Anexo 1. Informe RCD mes Febrero el cual contiene:**

1. Certificado por escombreras mes de febrero 2023: Maquinas amarillas, el Greco, Reciclados industriales.
2. Licencias y permisos de escombreras.
3. Formato control de escombros mes febrero 2023.
4. Formatos SDA mes de febrero de 2023

Anexo 2.Informe RCD -SDA mes febrero de 2023.

Tabla 6. Gran consolidado RCD de obra mes febrero de 2023.

MES	ESCOMBRERA	ASFALTO (m3)	ASFALTO TONELADAS (Ton)	RCD (m3)	RCD TONELADAS (Ton)	TOTAL m3	TOTAL Ton
FEBRERO	GRECO	289	369.92	15	19.2	304	389.12
	RECICLADOS INDUSTRIALES	15	19.64	60	77.58	75	97.22
	MAQUINARIAS AMARILLAS			60	102	60	102
					GRAN TOTAL	439	588.34

Fuente: Contrato IDRD 2664 de 2022.

Tabla 7. Listado de los gestores de RCD inscritos en la jurisdicción CAR.

GESTORES - PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021			
No registro	Nombre razón social	Municipio	Predio localización
21	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA	MOSQUERA	Predio Finca Las Juntas Lote 10/ Vereda San José
237	CEMEX	BOGOTA	Reversa la Fiscala
421	MAQUINAS AMARILLAS	BOGOTA	Tunjuelito – Mina las Manas
467	GRANULARES RECICLADOS DE COLOMBIA EL GRECO	COTA	Cota- Puente de Guadua vereda Grande

6. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Mediante este programa se establecen las medidas de manejo que permitan controlar y mitigar la generación de emisiones atmosféricas como son gases y material particulado al igual que la generación de ruido.

Medidas de manejo

- ✓ Para el control de las emisiones atmosféricas se mantiene en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento la maquinaria.
- ✓ Las volquetas de la obra, una vez cargadas se carpan para evitar la dispersión de material particulado a la atmósfera e impedir derrames de material durante los recorridos de las volquetas.
- ✓ La velocidad de las volquetas y maquinaria no supera los 20km /hr con el fin de disminuir las emisiones fugitivas en el área de influencia directa. Todos los vehículos cuentan con la alarma de reversa.
- ✓ Durante el periodo se emplearon los siguientes vehículos para transporte de RCD´S:

Tabla 8. Listado de volquetas.

#	Placa de volqueta	Pin ambiental - SDA
1	USC504	21848
2	SPV659	4034
3	SOP192	13319

7. MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Mediante este programa se establecen las medidas mínimas que se deben seguir para el adecuado manejo de aguas superficiales y redes de alcantarillado. En el desarrollo de la obra en el mantenimiento a los parques no se ha intervenido zonas de drenaje o cárcamos.

8. MANEJO DE FAUNA, VEGETACIÓN Y PAISAJE

Este programa tiene como fin establecer las acciones para el manejo de la vegetación que podría ser afectada por las obras del proyecto de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación. Durante el presente informe las zonas de intervención y actividades de mantenimiento se encuentran bastante alejados de individuos arbóreos.

En el parque Llano de Bosa se encuentra todavía el palomar instalado por la comunidad y solicitado por esta misma que se retire, a la fecha de este informe el subcontratistas se encuentra en proceso de adquisición de andamios certificados y personal con permiso en trabajo de alturas.

9. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante el presente informe se efectuó capacitación al personal de obra en el mes de marzo de 2023 abordando el siguiente tema:

- Componente B2: Manejo de Materiales de Construcción.








Anexo 3. Formato de capacitaciones y cronograma.

10. ORDEN Y ASEO

En los frentes de obra, se realiza jornadas de orden y aseo según lo establecido en el PMA, a la fecha del informe, las zonas o parques objeto de mantenimiento se encuentran debidamente encerrados:

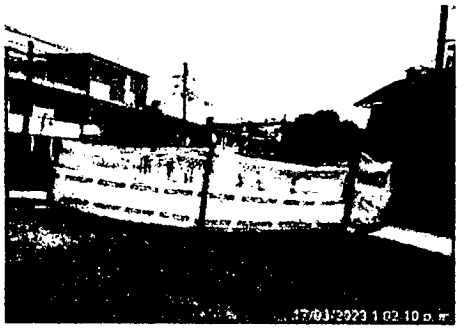	
Jornada de aseo y limpieza de campamento fijo de obra.	Barrido y limpieza de senderos peatonales.
	

Belzcon
Construcción Propositiva

INFORME AMBIENTAL # 5

CONTRATO IDRD 2664 DE 2022

Mantenimiento de cerramiento por vandalismo en la zona.	Recolección de escombros
	
Acopio de materiales pétreos dentro de obra protegiendo material y cubriendo este con plástico.	Acopio temporal de materiales a dos cintas. La comunidad o personas ajenas de esta vandaliza o daña los cerramientos de obra. El material se encuentra por fuera por razones de espacio tan reducidos y procesos constructivos de excavación e instalación de otros materiales.
	

Limpieza de zonas verdes por RCD.	Mantenimiento de vallas informativas en cada uno de los parques. En zonas que son de propiedad del IDRD.

11. CONCLUSIONES

- El proyecto cuenta con PIN Ambiental 22336.
- Se da inicio de implementación de PMA por componente de acuerdo avance de obras de mantenimiento.
- Se realiza entrega de certificados de disposición adecuada de RCD a escombreras certificadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Competente mes de febrero de 2023.
- La capacitación ambiental concientiza y educa a subcontratista para el buen manejo ambiental en obra.
- Siguiendo directrices por la Supervisión Ambiental de IDRD los certificados a nivel de gestión de RCD se entregarán mes vencidos, ya que el corte de obra de este contrato se da inicio el día 20 de cada mes y para evitar traslapos y confusiones con la entidad SDA – Secretaria de Ambiente, las certificaciones de RCD y materiales serán de carácter mensual.

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES

CONTRATO DE OBRA No IDRD 2664-2022





INFORME SOCIAL No. 5

VERSIÓN 2

BELZCON S.A.S.

BOGOTÁ, MARZO DE 2023

BOGOTÁ nstituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO NO. 2664 DE 2022	INFORME SOCIAL No. 5	Belzcon Construcción Propositiva
	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	21-03-2023	Documento original	217
2	31-03-2023	Ajustes según comunicado DPK-2928-G4-087-2023	241

CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por:	Revisado Por:
T.S. Viviana Paulina García Mancipe T.P. 116635212-R	Ing. Olmer Sánchez Castro T.P. 2520279919 CND
Residente Social Contratista	Director de Obra Contratista

Validado Por:	Aprobado Por:
T.S. Marcela Marín T.P. 238505223-1	Ing. Jairo Guevara Rincón T.P. 25202-29798 CND
Residente Social de Interventoría	Director de Interventoría

Revisado Por	Aprobado por:
Ps. Luz Legarda	Arq. Liliana Barbosa
Apoyo a la Supervisión del Componente Social	Supervisión Área Técnica

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCIÓN 6

2. ALCANCE 7

3. MARCO JURIDICO 8

4.OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTION SOCIAL 11

4.1. Objetivo General 11

4.2. Objetivos Específicos 11

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 12

6. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 13

7. UBICACIÓN DEL PROYECTO 15

8. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL 18

8.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 18

a. Reunión de Inicio 18

b. Reunión de Finalización de La Obra 21

c. Reuniones adicionales y/o extraordinarias 22

d. Volantes de Información 23

e. Valla Informativa 23

f. Convocatorias 24

8.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 25

8.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 27

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre 28

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes 28

8.4 PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL Y COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 29

a. Comités de Participación Ciudadana 29

b. Capacitación Comité de Participación Ciudadana 29

8.5 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 30

Contratación de mano de obra no calificada y población vulnerable: 30

8.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL 33

Entrega pedagógica uso, mantenimiento y conservación: 34

Aplicación, tabulación y análisis de encuestas de satisfacción: 34

Talleres de prevención violencia de género: 34

9. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 36

a. Evaluación 36

b. Seguimiento 37

c. Informe Mensual 36

d. Informe Final 37

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Marco Jurídico 8

Tabla 2. Información del Contrato 13

Tabla 3. Parques Incluidos en el Contrato 15

Tabla 4. Parques priorizados marzo 2023 16

Tabla 5. Reuniones de inicio 19

Tabla 6. Indicador de cumplimiento Reunión de Inicio 21

Tabla 7. Indicador de cumplimiento de Reunión de Finalización 21

Tabla 8. Reuniones adicionales 22

Tabla 9. Indicador de cumplimiento de Reunión Extraordinaria 22

Tabla 10. Volantes de Convocatoria 24

Tabla 11. Indicador de cumplimiento de Convocatoria 25

Tabla 12. Información atención a la comunidad 26

Tabla 13. Atenciones Ciudadanas 26

Tabla 14. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano 27

Tabla 17. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas 28

Tabla 18 Indicador de cumplimiento Participación y Atención Ciudadana 29

Tabla 19. Listado de personal vinculado 30

Tabla 20. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra 33

Tabla 21. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental 34

Tabla 22. Trazabilidad Informes Mensuales 36

Tabla 23. Trazabilidad Plan de Gestión Social 37

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Trazabilidad programación y presentaciones de reuniones de inicio 19
Anexo 2. Soportes reuniones de inicio 20
Anexo 3. Soportes reuniones adicionales 22
Anexo 4. Volantes y soportes de entrega 25
Anexo 5. Soportes de atenciones ciudadanas recepcionadas en el mes 27
Anexo 6. Consolidado y planillas de inscripción comités de participación 29
Anexo 7. Soportes de gestión de contratación 32
Anexo 8. Copia de correspondencia enviada y recibida 37

1. INTRODUCIÓN

El presente documento de gestión, describe las actividades desarrolladas por parte del componente social, presentando de manera especifica la implementación de actividades del componente desde una perspectiva de responsabilidad social, en cumplimiento del contrato No. 2664 de 2022, cuyo objeto es CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.

Este Informe de Gestión Social, presenta el desarrollo de los siete programas principales de acción ejecutados por Belzcon S.A.S. apoyados en el anexo técnico. Su objetivo principal consiste reportar el cumplimiento de lo propuesto en el Plan de Gestión Social, encaminado a prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se pudiesen generar por las obras de manera oportuna y eficiente.

Desde esta perspectiva, el presente informe reporta la implementación de los siguientes programas para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2023:

- Programa de Información y Divulgación
- Programa de Atención a la Comunidad
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas
- Programa de Participación y Control Social
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra
- Programa de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental
- Programa de Evaluación y Seguimiento

2. ALCANCE

El presente informe consolida las acciones adelantadas desde el componente social para garantizar el cumplimiento en lo propuesto desde esta área en el Plan de Gestión, para garantizar la participación ciudadana de las comunidades del área de influencia directa del proyecto. Cabe destacar que el alcance en las actividades a desarrollar desde el componente social, corresponden de manera estricta al desarrollo de las actividades de mantenimiento que se ejecutan en cada uno de los parques priorizados, con base en el diagnóstico avalado por la interventoría y el IDRD.

3. MARCO JURIDICO

La Carta Magna de Colombia, plantea mecanismos de participación ciudadana para involucrar a las comunidades en la construcción de normatividad, toma de decisiones, rendición de cuentas, y acciones respecto a la afectación de su vida económica, política, administrativa y cultural, es por eso que con el fin de involucrar a las comunidades en el marco del bien colectivo y defensa de los intereses comunes (Ley 99 de 1993 Títulos X y XI, Artículos 69 al 76 y la Ley 134 de 1993) se han generado espacios para permitir relaciones cercanas entre la sociedad y el estado, siendo los ciudadanos interlocutores legítimos para proteger el patrimonio, los derechos comunes y particulares, el espacio, el entorno, la integridad y conservación del medio ambiente.

Tabla 1 Marco Jurídico

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Constitución Política de Colombia de 1991 - Asamblea Nacional Constituyente	Los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política establecen en el marco del Estado Social Derecho sus principios democráticos, participativos y pluralistas, con prevalencia en el interés general y por tanto la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan a fin de garantizar el cumplimiento y efectividad de los principios, derechos y deberes sociales y del Estado consagrados en la Carta Constitucional. En relación con los derechos colectivos y del ambiente los Artículos 78 y 79 señalan que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen, así como la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos, a fin de garantizar el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano. Artículo 80: Señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo, su sostenibilidad, su conservación, su restauración o sustitución.

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
	Artículos 7 y 330 (Parágrafo), indican que la participación ciudadana, entendida como premisa fundamental de índole constitucional, se perfecciona y desarrolla mediante los mecanismos de participación allí establecidos, tales como: Derecho de Petición (Art. 23), Acción de Tutela (Art. 86), Acción de Cumplimiento (Art. 87), Acciones Populares y de Grupo (Art. 88). Artículo 90: establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños jurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
Ley 134 de 1994 Congreso de Colombia	Normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Ley 1955 de 2019	"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad."
Acuerdo 761 de 2020	"Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"
Ley 134 de 1994	"Por lo cual se establecen los mecanismos de participación ciudadana"
Ley 1755 de 2015	"Por medio del cual se regula el Derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Ley 1757 de 2015	Por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
Decreto 263 de 2003	Por el cual reglamentaran los artículos 6° y 10° del Acuerdo Distrital 078 de 2002 que dicto normas para la administración y Sostenibilidad del sistema Distrital de Parques" señala el objetivo de los comités locales de control social de los parques metropolitanos, zonales y vecinales del sistema distrital de parques."

REGULACIÓN NORMATIVA	CONTENIDO ESPECÍFICO
Decreto Distrital 215 de 2005	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" Modificado por el art.23, Decreto Distrital 527 de 2014.
Decreto 308 de 2006	"Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital". Título III Política de Gestión para la sostenibilidad, Capitulo II Estrategia de Gestión Social".
Decreto 448 de 2007	"Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana".
Decreto 371 de 2010	Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y Organismos del Distrito Capital".
Decreto Distrital 503 de 2011	"Por la cual se adopta la política pública de participación incidente para el Distrito Capital".
Decreto 483 de 2018	"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015," Por medio del cual se adopta la Política pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 557 de 2018	"Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá D.C – DRAFE y se dictan otras medidas".
Decreto 197 de 2014	"Por medio del cual se adopta la Política Publica Distrital de servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C"
Directiva 001 2017	Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad
Decreto 332 de 2020	Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital

4.OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTION SOCIAL

4.1. Objetivo General

Describir las actividades realizadas por BELZCON S.A.S., encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de gestión social para el desarrollo del contrato de obra 2664-2022, según las disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los criterios de calidad, oportunidad y veracidad, así como la presentación de los resultados de la ejecución, para el quinto mes comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2023.

4.2. Objetivos Específicos

- Presentar el avance en el desarrollo de las actividades sociales por parte de BELZCON S.A.S., dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Social.
- Evidenciar los procesos de ejecución y seguimiento adelantados desde el contratista, en cumplimiento de cada uno de los programas establecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD para la ejecución de obras de infraestructura urbana.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 2664 de 2022 se firmó entre Belzcon S.A.S. y el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, con acta de inicio del 9 de noviembre de 2022 y pretende beneficiar a los habitantes de tres localidades del distrito capital, a saber: Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una población aproximada de 2.040.946 personas.

Pretende atender de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas, de los parques de la Red de Proximidad del Sistema Distrital de Parques del IDRD del grupo 4, a monto agotable.

6. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se menciona la identificación del proyecto, así como los responsables de su ejecución:

Tabla 2. Información del Contrato

CONTRATANTE **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**	
Supervisión Técnica:	Arq. Liliana Barbosa
Coordinadora Social:	Luz Dary Legarda
INTERVENTORÍA **Contrato IDRD - 2928 - 2022**	
Interventoría:	Consorcio Dispark
Director de Intervetoría:	Jairo Guevara
Residente Social:	Marcela Marín
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE / FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES" Grupo No. 4
Duración del contrato:	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del proyecto:	9 de noviembre de 2022
Fecha de Terminación:	8 de julio de 2023
CONTRATISTA **Contrato IDRD – 2664 - 2022**	

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO NO. 2664 DE 2022	INFORME SOCIAL No. 5	Belzcon Construcción Propositiva
	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		

Contratista:	BELZCON S.A.S.
Director de Obra:	Olmer Sanchez
Residente Social:	Viviana Paulina García Mancipe
Objeto:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES
Duración del contrato:	Siete (7) meses
Fecha de inicio del proyecto:	9 de noviembre de 2022
Fecha de Terminación:	8 de junio de 2023

7. UBICACIÓN DEL PROYECTO

De conformidad con la priorización entregada por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, a continuación, se presenta el listado de parques objeto de intervención definido para el presente corte:

Tabla 3. Parques Incluidos en el Contrato

ID PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE	ESCALA	DIRECCION	UPZ
06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	BOLSILLO	Dg. 52a Sur #53-97, Bogotá	VENECIA
06-004	TUNJUELITO	EL CLARET	BOLSILLO	CALLE 48 A SUR CARRERA 27	VENECIA
08-804	KENNEDY	URBANIZACION PREDIO CARBOQUIMICA CESION PARQUE	BOLSILLO	CALLE 44 SUR TRANSV 68 B	CARVAJAL
08-014	KENNEDY	CARVAJAL	BOLSILLO	CARRERA 72 Q CALLE 37 SUR	CARVAJAL
08-202	KENNEDY	URBANIZACION CARIMAGUA PRIMER SECTOR	BOLSILLO	CARRERA 72 J CALLE 38 D SUR	CARVAJAL
08-397	KENNEDY	URBANIZACION CARIMAGUA PRIMER SECTOR	BOLSILLO	CALLE 38 B BIS SUR CARRERA 72 I	CARVAJAL
08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	VECINAL	CARRERA 74 DG 40 B SUR	TIMIZA
08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR	VECINAL	AV PRIMERA DE MAYO CALLE 48 A SUR	TIMIZA
08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	VECINAL	CALLE 53 B SUR CARRERA 78 L	TIMIZA
07-150	BOSA	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	BOLSILLO	TV. 78I & CLL. 69 Sur	BOSA CENTRAL
7-050	BOSA	DESARROLLO PIAMONTE I	BOLSILLO	CRA. 78B & CLL. 69 C BIS	BOSA CENTRAL
07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	BOLSILLO	CARRERA 78 B CALLE 69 C BIS SUR	BOSA CENTRAL
07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	BOLSILLO	CARRERA 80 Q CALLE 71 F SUR	BOSA CENTRAL
07-195	BOSA	URBANIZACION LA ESPERANZA	BOLSILLO	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR	BOSA CENTRAL

NOTA: Si bien estos parques corresponden al listado inicial propuesto para el presente contrato, durante el mes objeto del presente informe, se adicionaron autorizó la intervención de cinco (5) nuevos parques, como se muestra a continuación:

Tabla 4. Parques priorizados marzo 2023

No	ID PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE	ESCALA	DIRECCION
1	07-049	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	BOLSILLO	CARRERA 80 Q CALLE 71 F SUR
2	07-072	BOSA	DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO	BOLSILLO	CARRERA 78 B CALLE 69 C BIS SUR
3	08-136	KENNEDY	BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	VECINAL	CALLE 53 B SUR CARRERA 78 L
4	08-319	KENNEDY	URBANIZACION TIMIZA CELULA B TONOLI	VECINAL	CARRERA 74 DG 40 B SUR
5	07-195	BOSA	URBANIZACION LA ESPERANZA	BOLSILLO	CARRERA 78 C DIAG 78 BIS SUR
6	06-003	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNA	BOLSILLO	Dg. 52a Sur #53-97, Bogotá
7	06-004	TUNJUELITO	EL CLARET	BOLSILLO	CALLE 48 A SUR CARRERA 27
8	08-013	KENNEDY	URBANIZACION EL PROGESO	BOLSILLO	CARRERA 72 B # 43 SUR
9	08-025	KENNEDY	SAN ANDRES	VECINAL	ZONA CENTRAL DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE 42C SUR Y CALLE 42F SUR CON CARRERA 60 BIS Y DIAGONAL 42C SUR
10	07-038	BOSA	DESARROLLO VILLA SUAITA	VECINAL	CARRERA 91 A BIS B CON CALLE 65 SUR – DIAGONAL 66 SUR ENTRE CARRERA 91 A Y 91 F
11	08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR	VECINAL	CARRERA 80 C CON CALLE 45 SUR

12	08-014	KENNEDY	CARVAJAL	VECINAL	CARRERA 72 N CON CALLE 35 B SUR
13	06-005	TUNJUELITO	URBANIZACION LA LAGUNETA	VECINAL	DIAGINAL 51 SUR # 55 A 08
14	07-080	BOSA	DESARROLLO GRANCOLOMBIANO I SECTOR URBANIZACION CIUDADELA ROBERTO PACHON	VECINAL	AV CALLE 45 SUR AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CARRERA 88 A BIS COSTADO NORORIENTAL

8. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se presenta el desarrollo de la gestión social durante el quinto mes de ejecución de contrato a partir de los programas de información y divulgación, atención a la comunidad, acompañamiento a las actividades técnicas de la obra, control social- comités de participación, contratación de mano de obra no calificada y sostenibilidad social, económica y ambiental.

8.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

A continuación, se presenta lo adelantado el presente mes.

a. Reunión de Inicio

Durante el mes de marzo se celebraron 5 reuniones de inicio, en los nuevos parques autorizados por el IDRD para actividades de mantenimiento: Carvajal, Urbanización La Laguneta, Desarrollo Villa Suaita, Pastranita II Sector y Desarrollo Grancolombiano I Sector Urbanización Ciudadela Roberto Pachón. A continuación, se presenta la trazabilidad para la celebración de las reuniones:

- El día 2 de marzo de 2023 la interventoría remitió el listado de parques priorizado para la fase II de ejecución.
- El día 6 de marzo de 2023, se remitió a interventoría la programación para las reuniones de inicio.
- El día 8 de marzo de 2023 se recibe solicitud de reprogramación de reunión de inicio del parque Desarrollo Grancolombiano I Sector Urbanización Ciudadela Roberto Pachón por parte de interventoría, atendiendo solicitud del IDRD.
- El día 8 de marzo de 2023 se remite reprogramación atendiendo la solicitud.

- El día 10 de marzo de 2023 se remiten las presentaciones para las reuniones de inicio, para revisión y comentarios.
- El día 10 de marzo de 2023 de reciben observaciones de la profesional social de interventoría, estas se atienden y se remiten el mismo día.
- El día 11 de marzo de 2023 se reciben observaciones de las áreas técnica y social del IDRD.
- El día 12 de marzo de 2023 se da respuesta a las observaciones por parte del contratista.
- El día 12 de marzo de 2023 se recibe correo por parte de la interventoría indicando un error en las observaciones emitidas por la entidad referente al parque Pastranita.
- El día 12 de marzo de 2023, se ajusta la presentación del parque Pastranita y se reenvían nuevamente todas las presentaciones.
- El día 12 de marzo de 2023 se recibe aval por parte de la entidad para proceder con la impresión de las presentaciones para las reuniones de inicio.
- El día 12 de marzo de 2023 la interventoría reitera aval sobre las presentaciones.

Anexo 1. Trazabilidad programación y presentaciones de reuniones de inicio

Con base en esta aprobación, el día 13 de marzo de 2023 se celebran las reuniones de inicio correspondientes a los parques Carvajal, Urbanización La Laguneta, Desarrollo Villa Suaita, Pastranita II Sector.

De acuerdo a la reprogramación solicitada, la reunión de Desarrollo Grancolombiano I Sector Urbanización Ciudadela Roberto Pachón se celebró el día 15 de marzo de 2023.

Tabla 5. Reuniones de inicio

PARQUE	CÓDIGO	LOCALIDAD	FECHA REUNION	HORA
DESARROLLO VILLA SUAITA	07-038	BOSA	13/03/2023	9:30 a.m. - 10:30 a.m.

PASTRANITA II SECTOR	08-045	KENNEDY	13/03/2023	11:00 a.m. - 12:00 m
CARVAJAL	08-014	KENNEDY	13/03/2023	1:00 p.m. - 2:00 p.m.
URBANIZACION LA LAGUNETA	06-005	TUNJUELITO	13/03/2023	3:00 p.m. - 4:00 p.m.
DESARROLLO GRANCOLOMBIANO I SECTOR URBANIZACION CIUDADELA ROBERTO PACHON	07-080	BOSA	15/03/2023	2:00p. m. - 3:00 a.m.

Anexo 2. Soportes reuniones de inicio

Ilustración 1. Reuniones de inicio



Reunión de inicio Pastranita – Reunión de inicio Carvajal



Reunión de inicio La Laguneta – Reunión de inicio Gran Colombiano I



Reunión de inicio Villa Suaita

Tabla 6. Indicador de cumplimiento Reunión de Inicio

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de Reuniones de inicio celebradas 12 Número de Reunión de inicio programadas 12	100%

b. Reunión de Finalización de La Obra

Teniendo en cuenta que para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de socializaciones de inicio en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han programado reuniones de finalización.

Tabla 7. Indicador de cumplimiento de Reunión de Finalización

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de Reuniones de finalización celebradas Número de Reuniones de finalización programadas	N/A

c. Reuniones adicionales y/o extraordinarias

Durante el presente periodo, se celebraron dos reuniones adicionales con las comunidades de los parques La Laguna y Gran Colombiano II Sector Naranjos, en los que se le socializó a los asistentes sobre el avance de las obras realizadas por el contratista.

Tabla 8. Reuniones adicionales

PARQUE	CÓDIGO	LOCALIDAD	FECHA REUNION	HORA
LA LAGUNA	06-003	TUNJUELITO	07/03/2023	7:00 a.m. - 08:30 a.m.
DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	07-049	BOSA	15/03/2023	3:30 p.m. - 4:40 p.m.

Anexo 3. Soportes reuniones adicionales

Ilustración 2. Reuniones adicionales



Reunión de avance Gran Colombiano II – Reunión de avance La Laguna

Tabla 9. Indicador de cumplimiento de Reunión Extraordinaria

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de Reuniones adicionales celebradas 2 / Número de Reuniones adicionales programadas 2	100%

d. Volantes de Información

Durante el presente periodo, no se distribuyeron volantes informativos.

e. Valla Informativa

Durante el presente periodo, se mantuvieron instaladas las vallas informativas en los parques objeto de intervención del presente contrato de obra. Sin embargo, hacia la mitad del periodo, el pendón correspondiente al parque San Andrés fue hurtado. El contratista gestionó la reposición del pendón.

Ilustración 3. Pendones informativos




Pendón La Laguna – Pendón San Andrés II



Pendón El Progreso – Pendón Timiza Tonolí





Pendón Bertha Hernández – Pendón llano de Bosa



Pendón Gran Colombiano II

f. Convocatorias

Durante el presente periodo se adelantó la convocatoria a las reuniones de inicio de obra de los parques correspondientes a la segunda fase de ejecución, así como a las dos reuniones adicionales:

Tabla 10. Volantes de Convocatoria

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GRUPO 4					
CONVOCATORIAS					
No.	CÓDIGO	LOCALIDAD	PARQUE	FECHA	TOTAL CONVOCADOS
1	06-004	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LA LAGUNA	02/03/2023	9
2	07-080	BOSA	DESARROLLO GRAN COLOMBIANO I SECTOR	10/03/2023	32
3	07-038	BOSA	DESARROLLO VILLA SUAITA	10/03/2023	21

4	08-014	KENNEDY	CARVAJAL	10/03/2023	32
5	06-005	TUNJUELITO	URBABINZACIÓN LA LAGUNETA	10/03/2023	37
6	07-049	BOSA	DESARROLLOGRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS	11/03/2023	19
7	08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR	11/03/2023	24
TOTAL					174

NOTA: Se aclara que la convocatoria correspondiente a la reunión adicional del parque La Laguna, se realizó de manera informal predio a predio en el área de influencia directa del proyecto por solicitud de la entidad, por lo que no se presenta volante de convocatoria.

Anexo 4. Volantes y soportes de entrega

Tabla 11. Indicador de cumplimiento de Convocatoria

INDICADOR	RESPONSABLE
Número de volantes informativos entregados / Número de volantes informativos requeridos	N/A
Número de vallas informativas instaladas 7 / Número de vallas informativas requeridas 7	100%
Número de volantes de convocatoria entregados 174 / Número de volantes de convocatoria requeridos 174	100%

8.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

A continuación se presentan los canales de atención propuestos por el contratista para la atención virtual a la comunidad.

Tabla 12. Información atención a la comunidad

LINEAS DE ATENCION AL CIUDADANO		
No. telefónico	**Correo electrónico**	**Horarios de atención**
3213897064	gestionsocial2664.22@gmail.com	Lunes, Miércoles y Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esta información fue incluida en las piezas de convocatoria elaboradas durante el presente periodo, así como en las reuniones de inicio a socializar con las comunidades de los parques priorizados para ejecución. A la fecha de corte del presente informe, se recibieron cuatro PQRS relacionadas en la tabla siguiente:

Tabla 13. Atenciones Ciudadanas

No.	FECHA	ASUNTO	TRÁMITE	ESTADO
1	06-02-2023	La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Gran Colombiano solicita los planos de las obras a ejecutar, así como las actas de las reuniones celebradas con la comunidad.	En reunión de carácter extraordinario celebrada el día 6 de febrero de 2023 se hace entrega de copia de los planos requeridos. Por medio del correo electrónico se remitieron nuevamente los planos, así como el acta de la reunión de inicio.	Cerrada por correo electrónico.
2	06-02-2023	La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Llano de Bosa solicitó el cambio en la ubicación del gimnasio canino propuesto para el parque.	En comité de seguimiento al contrato se eleva la solicitud al área técnica del IDRD. Tras revisar en terreno se avala la solicitud.	Cerrada por correo electrónico.
3	01/03/2023	La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, solicita la aclaración de algunas inquietudes relacionadas con la intervención del parque de este sector (ubicación de las intervenciones, presupuesto destinado para las obras, tiempo de ejecución de las mismas y actividades a realizar)	Se proyecta respuesta con base en la información del área técnica y se da alcance a la solicitud de la peticionaria.	Cerrada por correo electrónico.
4	28/03/2023	La comunidad residente en el área de influencia directa del	Se da traslado a la solicitud manifestada por la	En seguimiento

		parque San Andrés II manifiesta su inconformidad por la habilitación de un campo de futbol en la zona verde del parque.	comunidad a la interventoría y al componente técnico, a fin de que sea tratado en comité de seguimiento.	
5	29/03/2023	El señor Diego Sánchez solicita material residuo de excavación para la adecuación de la Huerta Colectivo Lupines, cercana al parque Timiza - Tinoli	Se da traslado al área ambiental. Se solicita la certificación de pertenencia del área en la que se dispondrá el material. El peticionario indica que se está ala espera de certificación por parte del Jardín Botánico.	En seguimiento
6	29/03/2023	La Junta de Acción Comunal de Pastranita se comunica con la línea de atención al ciudadano, manifestando que no se hizo presencia por parte de sus representantes en la reunión de inicio de mantenimiento en el parque y solicita información del proyecto.	Se informa sobre las generalidades del contrato, objeto, plazo de ejecución y actividades proyectadas. Se remite vía WhatsApp la presentación socializada en la reunión con comunidad.	Cerrada

Anexo 5. Soportes de atenciones ciudadanas recepcionadas en el mes

Tabla 14. Indicadores de cumplimiento Atención al Ciudadano

INDICADOR	*CUMPLIMIENTO*
Canales de atención ciudadana habilitados 2 / Canales de atención ciudadana requeridos 2	100%
Número de PQRS atendidas 6 / Número de PQRS Recibidas 6	100%
Número de PQRS cerradas 4 / Número de PQRS Recibidas 6	67%

8.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación se presentan las actividades desarrolladas durante el presente periodo.

a. Levantamiento de Actas de Vecindad de Inicio y Cierre

Durante el presente periodo no se levantaron actas de vecindad. Esta pendiente la entrega de copias de actas de vecindad a los propietarios de los predios, sin embargo, las actas de vecindad radicadas ante la interventoría no han sido devueltas con firmas de aprobación, por lo que esta actividad se realizará el siguiente periodo.

b. Levantamiento actas de inspección preliminar e inventario de elementos existentes

Durante el presente periodo, no se adelantaron actas preliminares.

Tabla 15. Indicador de cumplimiento Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de actas de inicio levantadas / Número de actas de inicio requeridas	N/A
Número de actas de cierre levantadas / Número de cierre requeridas	N/A
Número de actas de inspección preliminar levantadas / Número de actas de inspección preliminar registradas	N/A
Número de actas de desmonte de mobiliario levantadas / Número de actas de desmonte de mobiliario requeridas	N/A

8.4 PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL Y COMITES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el presente periodo.

a. Comités de Participación Ciudadana

Para el presente periodo se conformaron comités de participación ciudadana en los 5 parques autorizados para inicio de intervención.

Anexo 6. Consolidado y planillas de inscripción comités de participación

Por otro lado, durante el presente periodo se celebraron 2 reuniones adicionales de avance; la primera tuvo lugar en el parque La Laguna y contó con la asistencia de una de las integrantes del comité de participación ciudadana. La segunda se celebró en el Parque Desarrollo Gran Colombiano II Sector Naranjos, y a esta asistieron 5 personas pertenecientes al comité de participación ciudadana conformado en este parque. En las planillas de asistencia a las reuniones incluidas en el anexo 3 se evidencia esta información.

b. Capacitación Comité de Participación Ciudadana

Durante el presente periodo no se realizaron capacitaciones con los comités.

Tabla 16 Indicador de cumplimiento Participación y Atención Ciudadana

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de comités de participación conformados 5 / Número de comités de participación requeridos 5	100%
Número de comités de participación capacitados	N/A

Número de comités de participación conformados	

8.5 PROGRAMA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

A continuación se presentan las actividades desarrolladas durante el presente periodo.

Contratación de mano de obra no calificada y población vulnerable:

Durante el presente periodo se iniciaron las labores se contratación de personal de obra, para desarrollar las actividades de obra en cada uno de los parques priorizados.

A continuación, se relaciona el personal vinculado con el proyecto durante el presente periodo:

Tabla 17. Listado de personal vinculado

	EMPRESA	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	OBSERVACIONES
1	BELZCON	BAUTISTA CASTELLANOS NESTOR ORLANDO	80.190.955	ING PRESUPUESTO Y CONTROL	ADULTO
2	BELZCON	CIPRIAN CASALLAS GINA PAOLA	1.012.429.637	INSPECTORA DE OBRA	MUJER - JOVEN
3	BELZCON	GARCIA MANCIPE VIVIANA PAULINA	52.990.836	PROFESIONAL SOCIAL	MUJER - ADULTA
4	BELZCON	ORTIZ SABOGAL DAVID ORLANDO	1.012.423.111	INSPECTOR DE OBRA	JOVEN

5	BELZCON	RICAURTE RODRIGUEZ JHONNA MARCELA	52.834.631	PROFESIONAL AMBIENTAL	MUJER - ADULTA
6	BELZCON	CUERVO GIL ANGÉLICA MARÍA	52.901.081	PROFESIONAL SST	MUJER - ADULTA
7	INDEPENDIENTE	CRUZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO	1.016.027.868	ESP. TRANSITO	ADULTO
8	INDEPENDIENTE	PORTILLA HERNANDEZ JONH EDILBERTO	94.532.542	PROFESIONAL DE CALIDAD	ADULTO
9	BELZCON	RODRIGUEZ LLANOS JUAN SEBASTIAN	1.030.661.956	INSP. TECNICO	JOVEN
10	BELZCON	TONCEL ARÉVALO JORGE BERNARDO	1.081.818.022	RESIDENTE DE OBRA	ADULTO
11	HA CIVIL	AREVALO FUENTES ANGEL	3.166.907	AYUDANTE	ADULTO
12	HA CIVIL	GUTIERREZ GAMBA OSWALDO	9.497. 790	MAESTRO DE OBRA	ADULTO
13	HA CIVIL	HUERTAS PEDREROS CARLOS JULIO	4.290.921	OFICIAL	ADULTO
14	HA CIVIL	LOZANO MENDOZA ANDERSON ANTONIO	1.024.545.246	BOAL	ADULTO
15	HA CIVIL	NOGUERA JIMENEZ UVER	1.058.787.117	OPERARDOR MINI	ADULTO
16	HA CIVIL	HUERTAS PEDREROS BELARMINO	79. 708. 620	AYUDANTE	ADULTO
17	HA CIVIL	PABON MARTINEZ JOSE ALQUIMEDES	74.339.476	OFICIAL	ADULTO
18	HA CIVIL	VANEGAS GUTIERREZ ELISEO	7.331.961	AYUDANTE	ADULTO

19	HA CIVIL	HUERTAS SANCHEZ ALEXANDER	1.112.337.847	CONTRATISTA	ADULTO
20	HA CIVIL	TAMAYO MENDEZ LUIS DAVID	1.010.244.047	AYUDANTE	ADULTO
21	HA CIVIL	OCAMPO QUIÑONES OSCAR DUVAN	1.087.205. 329	AYUDANTE	ADULTO
22	HA CIVIL	LOPEZ CASTRO RAMON	19.471.239	OFICIAL	ADULTO
23	HA CIVIL	PAMPLONA VELA JHON FREDY	1.024.512.562	AYUDANTE	JOVEN
24	BELZCON	SALGADO ANDRADE SERGIO YAIR	1.075.654.567	RESIDENTE DE OBRA	ADULTO
25	HA CIVIL	VARGAS MAURO	80.423.491	OPERADOR RETRO	ADULTO
26	HA CIVIL	ROMERO ESPITIA NEVARDO	4.921.107	AYUDANTE	JOVEN
27	HA CIVIL	RAMIREZ MARTIN ANTONIO	1.031.159.117	AYUDANTE	ADULTO
28	BELZCON	OMER URIEL SANCHEZ CASTRO	79.279.044	DIRECTOR DE OBRA	ADULTO
29	HA CIVIL	VERA ISRAEL		AYUDANTE	ADULTO
30	HA CIVIL	DOURAL JESUS		AYUDANTE	ADULTO
31	DFL	LUKE ALEJANDRO		AYUDANTE	ADULTO
32	DFL	VELOZA FABIAN		AYUDANTE	JOVEN

Igualmente se reporta que durante el presente periodo se dio trámite para contratación de personal vulnerable a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Anexo 7. Soportes de gestión de contratación

Tabla 18. Indicador de cumplimiento Contratación de Mano de Obra

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de mujeres contratadas 4 / Número de personas contratadas 32	12.5%
Número de población vulnerable contratada / Número de personas contratadas	N/A
Número de personas no calificadas de las localidades contratadas 6 / Número de personas no calificadas contratadas 32	19%
Número de jóvenes contratados 6 / Número de personas contratadas 32	19%
Número de adultos contratados 26 / Número de personas contratadas 32	8.1%

8.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

A continuación se presentan las actividades desarrolladas durante el presente periodo.

Entrega de plegables de sostenibilidad:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de obra en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han distribuido plegables de sostenibilidad.

Aplicación de Encuestas de Satisfacción:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de obra en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han aplicado encuestas de satisfacción.

Entrega pedagógica uso, mantenimiento y conservación:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de obra en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se ha hecho entrega de elementos de pedagogía.

Aplicación, tabulación y análisis de encuestas de satisfacción:

Teniendo en cuenta que, para la fecha de corte del presente informe, se adelantan labores de obra en los parques priorizados por parte del IDRD, aun no se han aplicado encuestas de satisfacción, por lo tanto no se requiere la tabulación y análisis de resultados del ejercicio.

Talleres de prevención violencia de género:

Para la fecha de corte del presente informe, no se han celebrado talleres de prevención.

Tabla 19. Indicador de cumplimiento Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Número de plegables entregados / Número de plegables requeridos	N/A

Número de capacitaciones celebradas Número de capacitaciones requeridas	N/A
Número de encuestas aplicadas Número de encuestas requeridas	N/A

9. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

De acuerdo al Plan de Gestión Social del IDRD, este programa contempla lo siguiente:

a. Evaluación

Dentro del presente documento se evidencia la aplicación de los indicadores de cumplimiento propuestos para la evaluación del Plan de Gestión Social.

b. Informe Mensual

En cumplimiento de lo requerido por parte del IDRD, el contratista hizo entrega del informe de gestión social, como se muestra a continuación:

Tabla 20. Trazabilidad Informes Mensuales

INFORME MENSUAL	RADICACIÓN BELZCON	RESPUESTA INTERVENTORIA	ESTADO
1	BEL-PGC-ADM-016-22	DPK-2928-G4-011-2022	Observado
1	BEL-PGC-ADM-039-22	Correo electrónico	Aprobado
2	BEL-PGC-ADM-055-22	DPK-2928-G4-025-2022	Observado
2	BEL-PGC-ADM-068-22		Aprobado
3	BEL-PGC-ADM-070-22	DPK-2928-G4-038-2022	Observado
3	BEL-PGC-ADM-091-22		Aprobado
4	BEL-PGC-ADM-108-22	DPK-2928-G4-069-2023	Observado

4	BEL-PGC-ADM-115-22		Aprobado

Anexo 8. Copia de correspondencia enviada y recibida

c. Informe Final

Este informe será entregado una vez termine la ejecución del contrato de obra.

d. Productos Entregables

En cumplimiento de lo requerido por parte del IDRD, el contratista hizo entrega del Plan de Gestión Social atendiendo ajustes requeridos por la entidad mediante correo electrónico, como se muestra a continuación:

Tabla 21. Trazabilidad Plan de Gestión Social

DOCUMENTO	RADICACIÓN BELZCON	RESPUESTA INTERVENTORIA	ESTADO
Plan de Gestión Social	BEL-PGC-ADM-017-22	DPK-2928-G4-008-2022	Observado
	BEL-PGC-ADM-025-22	Correo electrónico	Aprobado
	BEL-PGC-ADM-066-22		Aprobado

e. Seguimiento

Para la fecha de corte del presente informe, el contratista asistió a los comités de seguimiento a la gestión social.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Programa de Información y Divulgación: Se celebraron reuniones de inicio en los 5 parques autorizados para la segunda fase de ejecución de mantenimientos: Carvajal, Urbanización La Laguneta, Desarrollo Villa Suaita, Pastranita II Sector y Desarrollo Grancolombiano I Sector Urbanización Ciudadela Roberto Pachón. Se celebraron reuniones adicionales para presentar el avance de las obras en los parques Gran Colombiano II Sector Naranjos y en Urbanización La Laguna. Para las reuniones anteriormente mencionadas, se realizó convocatoria por medio de volantes informativos a excepción del parque La Laguna, en donde se realizó convocatoria informal por directriz de la entidad contratante.
- Programa de Atención a la Comunidad: Se recepcionó una consulta ciudadana, la cual fue atendida y cerrada durante el presente periodo.
- Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas: Se está a la espera de la devolución de las actas de vecindad radicadas ante la interventoría para la entrega de copias a los propietarios de los predios.
- Programa de Control Social y Participación Ciudadana: Se cuenta con la presencia de miembros de los comités de participación en las reuniones adicionales celebradas en los parques Urbanización La Laguna y Desarrollo Gran Colombiano II Sector Naranjos.
- Programa de Apoyo a la Contratación de Mano de Obra No Calificada: Se adelanta la contratación de personal en la medida que se ejecutan las actividades de obra por parte del contratista.
- Programa de Sostenibilidad, Económica y Ambiental: Vincular a la comunidad beneficiaria del proyecto desde el inicio de las obras a través de las convocatorias a las reuniones de inicio, facilita la apropiación de los espacios recreo deportivos.
- Programa de Evaluación y Seguimiento: El registro oportuno, ordenado y sistemático de las actividades desarrolladas desde el componente social, evidencia no solamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Belzcon S.A.S., sino también

evidencia la intencionalidad del IDRD de mantener relaciones de comunicación abierta y efectivas con las comunidades del área de influencia de los parques de la ciudad.

BOGOTÁ nstituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO NO. 2664 DE 2022	INFORME SOCIAL No. 5	Belzcon Construcción Propositiva
	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES		

Anexo No. 1

Trazabilidad programación y presentaciones de reuniones de inicio

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

Reuniones de socialización de inicio

Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com> 2 de marzo de 2023, 12:41
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>, idrd2664.bzc@gmail.com, Dispark <dispark@ingeplan.co>, Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, correo.bzc@gmail.com
Cc: claudia.corredor@idrd.gov.co, luz.legarda@idrd.gov.co

Cordial saludo

Respetada Paulina, envío listado de parques nuevos adjudicados al grupo # 4 el día 28 de febrero/2023 en el comité de obra, por favor presentar programación correspondiente para la realización de actividades de reunión de socialización de inicio de mantenimientos (volantes, divulgación de la información y presentaciones para cada parque).

No	ID PARQUE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PARQUE
10	08-045	KENNEDY	PASTRANITA II SECTOR
11	08-014	KENNEDY	CARVAJAL
12	06-005	TUNJUELITO	URBANIZACIÓN LAGUNETA
13	08-522	KENNEDY	SAN ANDRES 1 SECTOR
14	07-080	BOSA	GRAN COLOMBIANO 1 SECTOR
15	07-038	BOSA	VILLA SUAITA

Nota: estas reuniones de socialización de inicio con las diferentes comunidades no pueden pasar del día 11 de marzo/2023.

Atentamente.

Marcela Marín Díaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

801 16

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

Reuniones de socialización de inicio

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Para: Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>

6 de marzo de 2023, 14:25

Cordial saludo Marcela,

Adjunto remitimos la programación para la segunda fase de ejecución de parques correspondientes a grupo 4.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

[El texto citado está oculto]

—
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

PROGRAMACION REUNIONES DE INICIO 2 FASE.xlsx
11K

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

Instrucción para reuniones parques Gran Colombiano

Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com> 8 de marzo de 2023, 7:43
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Cc: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>

Cordial saludo

Respetada Paulina, según instrucciones de la supervisión del contrato (IDRD) Nro. 2664 de 2022 cuyo objeto es "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la red de proximidad que integran el sistema distrital de parques", grupo No. 4.

Se requiere reprogramar la reunión de socialización de inicio del Parque Gran Colombia 1er sector Cód. 07-080 para el día miércoles 15 de marzo a las 2:00 pm, asimismo, programar reunión de avance en el parque Gran Colombiano sector Naranjos Cód. 07-049 promediando la hora de finalización de la reunión anterior.

atentamente.
Marcela Marín Díaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

Instrucción para reuniones parques Gran Colombiano

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 8 de marzo de 2023, 12:19
Para: Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>, Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada desde la supervisión del contrato, adjunto remitimos la reprogramación solicitada, y los volantes de convocatoria ajustados.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

7 adjuntos

- **24. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO VILLA SUAITA.pptx** 881K
- **27. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO LA LAGUNETA.pptx** 619K
- **23. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO GRAN COLOMBIANO I SECTOR.pptx** 929K
- **25. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO PASTRANITA II.pptx** 792K
- **26. CONVOCATORIA REUNION DE INICIO CARVAJAL.pptx** 1496K
- **28. CONVOCATORIA REUNION DE AVANCE GRAN COLOMBIANO II SECTOR.pptx** 826K
- **PROGRAMACION REUNIONES DE INICIO 2 FASE.xlsx** 11K

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 11:20
Para: Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>, Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>
Cc: liliana.barbosa@idrd.gov.co, angelica.romero@idrd.gov.co

Cordial saludo,

Adjunto remitimos para su conocimiento y comentarios, las presentaciones de las reuniones de inicio de los siguientes parques:

- Pastranita II Sector
- Carvajal
- Desarrollo Gran Colombiano I Sector
- La Laguneta
- Villa Suaita

Atentamente,

–
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.

5 adjuntos

Presentacion reunión de inicio de obra Pastranita.pptx
2114K

Presentacion reunión de inicio de obra Villa Suaita.pptx
2454K

Presentacion reunión de inicio de obra La Laguneta.pptx
2698K

Presentacion reunión de inicio de obra Gran Colombiano I.pptx
2030K

Presentacion reunión de inicio de obra Carvajal.pptx
3441K

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 16:02
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Cc: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, Dispark <dispark@ingeplan.co>

Cordial saludo

Respetada Paulina, surgen las siguientes observaciones:
1. A nivel general en las presentaciones, incluir código de parque en la primera diapositiva.
2. En la presentación del parque Laguneta, verificar en las diapositivas 4 y 5 ajustar el nombre del parque, al igual, modificar en la diapositiva 5 del componente técnico el primer punto "Construcción de cancha múltiple y mantenimiento de arcos"

Atentamente.

Marcela Marín Díaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

[El texto citado está oculto]

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 10 de marzo de 2023, 17:03
Para: Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>
Cc: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, Dispark <dispark@ingeplan.co>, idrd2664.bzc@gmail.com

Cordial saludo,

Adjunto se remiten las presentaciones para las reuniones de inicio, atendiendo los ajustes solicitados.

Atentamente,
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

- **Presentacion reunión de inicio de obra Carvajal.pptx** 3441K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Gran Colombiano I.pptx** 2030K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Villa Suaita.pptx** 2454K
- **Presentacion reunión de inicio de obra La Laguneta.pptx** 2698K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Pastranita.pptx** 2114K

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com> 11 de marzo de 2023, 19:20
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>, idrd2664.bzc@gmail.com, correo.bzc@gmail.com
Cc: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, Dispark <dispark@ingeplan.co>

Cordial saludo

Estimada Paulina, por favor proceder con los ajustes requeridos por la supervisión del contrato (IDRD)

Componente técnico:
1.Para todas las presentaciones Javier Suárez es el Supervisor del Contrato de Obra e Interventoría quitar que es el supervisor del área técnica.

2. Presentación Carvajal.
Se encuentra conforme ajustarle el tema del supervisor del cto.Idrd.

3. Presentación Gran Colombiano. *Pintura táctica cancha múltiple *Intervención zona infantil con mobiliario nuevo y piso en caucho *Quitar lo de las fachadas verdes. *Quitar lo del mobiliario en mal estado.
*Quitar lo de construcción de cancha nueva.

4. Presentación Parque Villa Suaita. *Quitar reemplazo de carpeta asfaltico solo poner intervencion con pintura tactica canchas. *Quitar lo de la construcción de fachadaa verdes.
*Quitar la foto del juego de madera y poner la de la zona de juegos que esta conformada y en mal estado.

5. Presentacion la Laguneta.
*Quitar reemplazo de juegos hurtados no mencionar este tema *Revisar si los arcos de microfutbol y tablero contraimpacto estan en buen estado y solo requieren actividades de mantenimiento o si estan en mal estado realizar el reemplazo de los mismos.

6.Presentacion Carvajal.
*Solo es un juego para remplazo e intervención zona de piso con caucho.
*Poner mantenimiento de gradas *Mantenimiento arco microfutbol y tablero contraimpacto si estan en buen estado

En todas las presentaciones indicar que se ubicara señalética y mobiliario urbano como bancas y canecas.

Componente social:

* debajo de los datos del IDRD, colocar apoyo a la supervisión del contrato Liliana Paola Barbosa Barrera.

*En Punto virtual de atención al ciudadano cambiar por: atención virtual al ciudadano. Ya habíamos dicho que punto no suena bien.

Por favor verificar, ajustar y enviar lo más pronto posible.

Atentamente.

Marcela Marín Díaz
Profesional Social
Interventoría Consorcio Dispark

---------- Forwarded message ---------
De: **Claudia Milena Corredor Mahecha** <claudia.corredor@idrd.gov.co>
Date: sáb, 11 mar 2023 a la(s) 18:56
Subject: Fwd: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4
To: <social.disparkg4@gmail.com>

Buenas tardes Marcela.

Solo dos observaciones más:
* en los datos del IDRD, colocar debajo de los datos de Javier, apoyo a la supervisión del contrato Liliana Paola Barbosa Barrera.

*En Punto virtual de atención al ciudadano cambiar por: atención virtual al ciudadano. Ya habíamos dicho que punto no suena bien.

Gracias.

---------- Forwarded message ---------
De: **Claudia Milena Corredor Mahecha** <claudia.corredor@idrd.gov.co>
Date: sáb, 11 de mar. de 2023 6:48 p. m.
Subject: Fwd: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4
To: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: Luz Dary Legarda Mena <luz.legarda@idrd.gov.co>, Liliana Paola Barbosa Barrera <liliana.barbosa@idrd.gov.co>

Buenas tardes Marcela.

Solo dos observaciones más:
* debajo de los datos del IDRD, colocar apoyo a la supervisión del contrato Liliana Paola Barbosa Barrera.

*En Punto virtual de atención al ciudadano cambiar por: atención virtual al ciudadano. Ya habíamos dicho que punto no suena bien.

Gracias.

---------- Forwarded message ---------
De: **Luz Dary Legarda Mena** <luz.legarda@idrd.gov.co>
Date: sáb, 11 de mar. de 2023 5:36 p. m.
Subject: Fwd: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4
To: Dispark <dispark@ingeplan.co>
Cc: Claudia Milena Corredor Mahecha <claudia.corredor@idrd.gov.co>, Liliana Paola Barbosa Barrera <liliana.barbosa@idrd.gov.co>, Angelica Maria Romero Hernandez <angelica.romero@idrd.gov.co>

9/11

18

Cordial saludo, conforme al envio de las presentaciones para las reuniones sociales del grupo 4 cto. 2664-2022 para revisión y validación adjunto envio las observaciones correspondientes para que sean ajustadas para la aprobación correspondiente.

1.Para todas las presentaciones Javier Suárez es el Supervisor del Contrato de Obra e Interventoria quitar que es el supervisor del área tecnica.

2. Presentación Carvajal.
Se encuentra conforme ajustarle el tema del supervisor del cto.Idrd.

3. Presentación Gran Colombiano. *Pintura tactica cancha múltiple *Intervención zona infantil con mobiliario nuevo y piso en caucho *Quitar lo de las fachadas verdes. *Quitar lo del mobiliario en mal estado.
*Quitar lo de construcción de cancha nueva.

4. Presentación Parque Villa Suaita. *Quitar reemplazo de carpeta asfaltico solo poner intervencion con pintura tactica canchas. *Quitar lo de la construcción de fachadaa verdes.
*Quitar la foto del juego de madera y poner la de la zona de juegos que esta conformada y en mal estado.

5. Presentacion la Laguneta.
*Quitar reemplazo de juegos hurtados no mencionar este tema *Revisar si los arcos de microfutbol y tablero contraimpacto estan en buen estado y solo requieren actividades de mantenimiento o si estan en mal estado realizar el reemplazo de los mismos.

6.Presentacion Carvajal.
*Solo es un juego para remplazo e intervención zona de piso con caucho.
*Poner mantenimiento de gradas *Mantenimiento arco microfutbol y tablero contraimpacto si estan en buen estado

En todas las presentaciones indicar que se ubicara señaletica y mobiliario urbano como bancas y canecas.
Gracias
Quedamos atentas.

El vie., 10 mar. 2023, 5:46 p. m., Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com> escribió:

> Cordial saludo
>
> Respetadas, adjunto envío presentaciones de reunión de socialización de inicio del grupo 4 para su revisión y aprobación.
>
> Atentamente
>
> **Marcela Marín Díaz**
> **Profesional Social**
> **Interventoría Consorcio Dispark**
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Paulina García** <gestionsocial2664.22@gmail.com>
> Date: vie, 10 mar 2023 a la(s) 17:04


411


19

Subject: Re: PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4
To: Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>

[El texto citado está oculto]


[El texto citado está oculto]

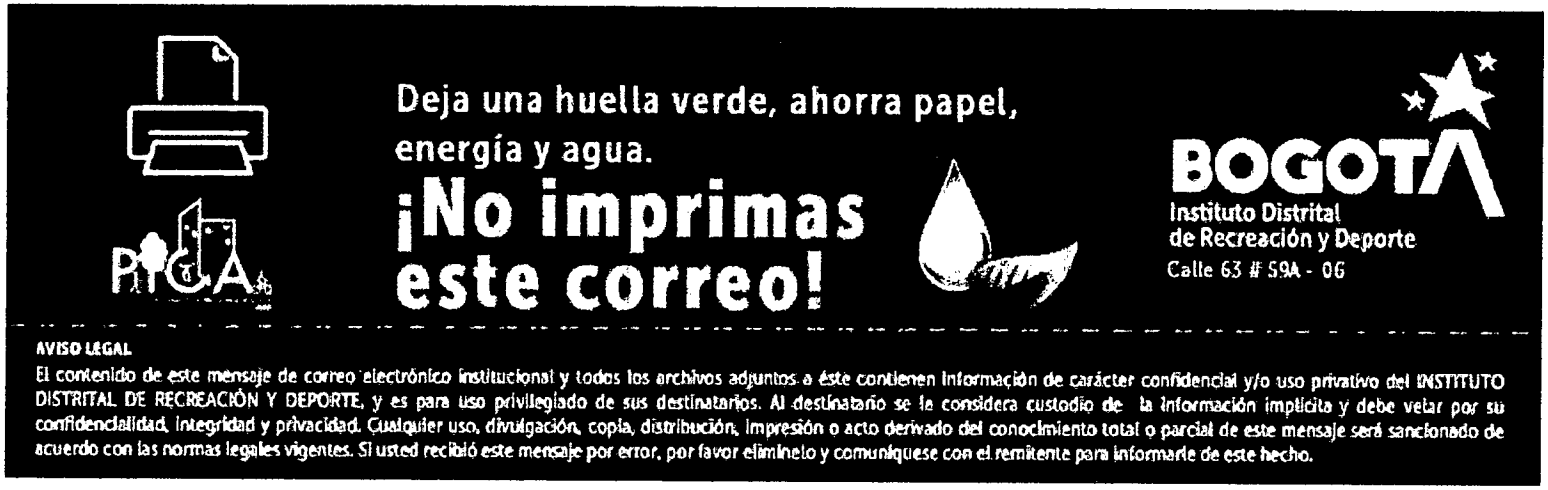

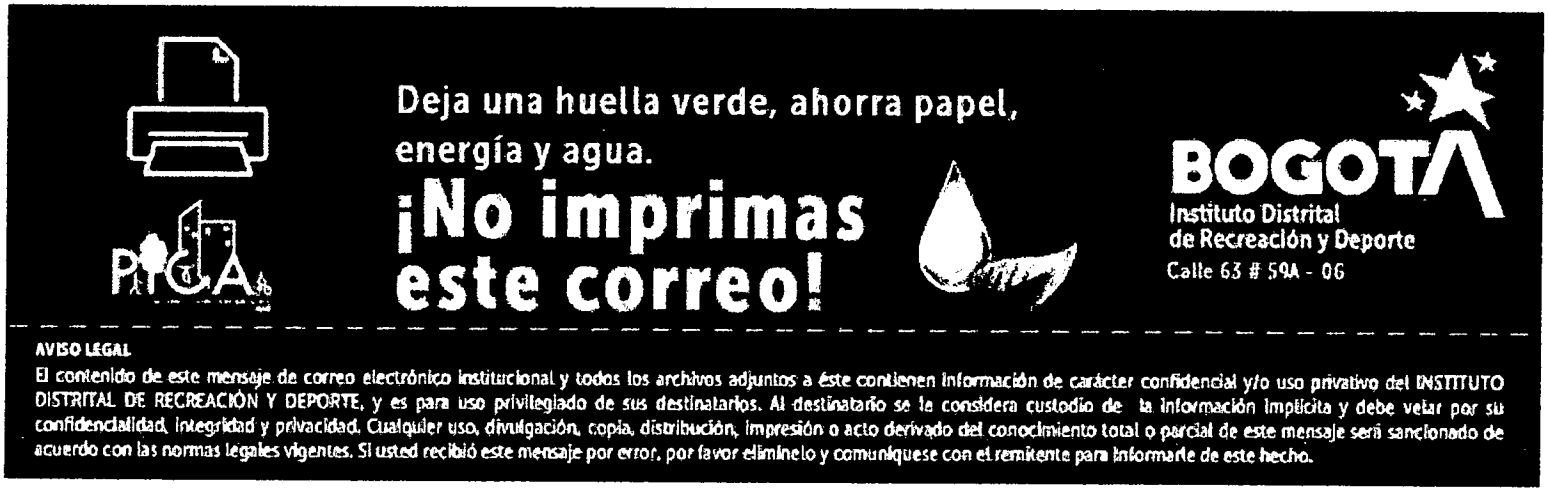

911

118



Deja una huella verde, ahorra papel, energía y agua.

¡No imprimas este correo!



BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06

AVISO LEGAL

El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 12 de marzo de 2023, 9:48
Para: Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>
Cc: idrd2664.bzc@gmail.com, Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, Dispark <dispark@ingeplan.co>, angelica.romero@idrd.gov.co, liliana.barbosa@idrd.gov.co, luz.legarda@idrd.gov.co

Cordial saludo,

Adjunto se remiten las presentaciones de reuniones de inicio, atendiendo las observaciones de la supervisión.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

- **Presentacion reunión de inicio de obra Carvajal.pptx** 3441K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Gran Colombiano I.pptx** 2030K
- **Presentacion reunión de inicio de obra La Laguneta.pptx** 2698K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Villa Suaita.pptx** 2331K
- **Presentacion reunión de inicio de obra Pastranita.pptx** 2114K

121

122

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com> 12 de marzo de 2023, 11:44
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>
Cc: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, liliana.barbosa@idrd.gov.co, angelica.romero@idrd.gov.co

Cordial saludo

Paulina, por favor tomar las observaciones del numeral 6 del correo de ajustes enviado el día de ayer y modificar componente técnico en la presentación del Parque Pastranita.

Atentamente.
[El texto citado está oculto]

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> 12 de marzo de 2023, 19:03
Para: Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>
Cc: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, liliana.barbosa@idrd.gov.co, angelica.romero@idrd.gov.co

Cordial saludo,

Adjunto se envía lo solicitado.

Atentamente

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

Presentacion reunión de inicio de obra Carvajal.pptx
3441K

Presentacion reunión de inicio de obra Gran Colombiano I.pptx
2030K

Presentacion reunión de inicio de obra Villa Suaita.pptx
2331K

Presentacion reunión de inicio de obra Pastranita.pptx
2114K

Presentacion reunión de inicio de obra La Laguneta.pptx
2698K

122

Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Liliana Paola Barbosa Barrera <liliana.barbosa@idrd.gov.co> 12 de marzo de 2023, 19:31
Para: Luz Dary Legarda Mena <luz.legarda@idrd.gov.co>, Claudia Milena Corredor Mahecha <claudia.corredor@idrd.gov.co>, Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com>
Cc: Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, Angelica Maria Romero Hernandez <angelica.romero@idrd.gov.co>, Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

Buenas noches saludos a todos,

Conforme a la revisión de las presentaciones de las reuniones sociales para dia de mañana 13 marzo 2023 del g4 cto 2664-2022 Beltzcon Sas, la información se encuentra validada de mi parte y pueden proceder a imprimir.

Cordialmente,

Arq. Liliana Barbosa
Apoyo a la supervision cto 2928-2022
3203409620

El dom., 12 mar. 2023, 7:04 p. m., Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> escribió:

> Cordial saludo,
>
> Adjunto se envía lo solicitado.
>
> Atentamente

El dom, 12 mar 2023 a las 11:44, Social grupo 4 (<social.disparkg4@gmail.com>) escribió:

> > Cordial saludo
> >
> > Paulina, por favor tomar las observaciones del numeral 6 del correo de ajustes enviado el dia de ayer y modificar componente técnico en la presentación del Parque Pastranita.
> >
> > Atentamente.
> >
> > El vie, 10 de mar de 2023, 11:21 a. m., Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com> escribió:
> >
> > > Cordial saludo,
> > >
> > > Adjunto remitimos para su conocimiento y comentarios, las presentaciones de las reuniones de inicio de los siguientes parques:

123

125

- Pastranita II Sector
- Carvajal
- Desarrollo Gran Colombiano I Sector
- La Laguneta
- Villa Suaita

Atentamente,

--
Paulina García M.
Profesional Social
Belzcon S.A.S.



Gmail

Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>

PRESENTACIONES REUNIONES DE INICIO 2 FASE GRUPO 4

Social grupo 4 <social.disparkg4@gmail.com> 12 de marzo de 2023, 19:37
Para: Paulina García <gestionsocial2664.22@gmail.com>, idrd2664.bzc@gmail.com, correo.bzc@gmail.com
Cc: Luz Dary Legarda Mena <luz.legarda@idrd.gov.co>, Claudia Milena Corredor Mahecha <claudia.corredor@idrd.gov.co>, Dispark G4 <disparkg4@ingeplan.co>, Dispark <dispark@ingeplan.co>

Cordial saludo

Respetada Paulina se da aprobación por parte de la Interventoría e IDRD a las diferentes presentaciones para las reuniones del día de mañana, por favor proceder con las impresiones.

Atentamente.
[El texto citado está oculto]

Anexo No. 2

Soportes reuniones de inicio

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

ONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL
NTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN
SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

DURACIÓN DEL CONTRATO	**Siete (7) meses**
FECHA DE INICIO	**9 de noviembre de 2022**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**8 de junio de 2023**

Belzcon
cción Propositiva

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

127

129



REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

PARQUE DESARROLLO VILLA SUAITA

07-038

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Belzcon
ción Propositivo

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

128

120



AGENDA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Saludo y Bienvenida

Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría

Generalidades del contrato

Localización del proyecto

Componentes:

- Componente Técnico
- Componente Ambiental
- Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
- Componente Social

Intervención de la comunidad.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

129

121



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisor del Contrato de Obra e Interventoría	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente técnico	Liliana Paola Barbosa Barrera
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

130

131

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Olmer Sánchez
Residente de obra	Sergio Salgado
Especialista Social	Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte



DESARROLLO VILLA SUAITA 07-038	CARRERA 91 A BIS B CON CALLE 65 SUR – DIAGONAL 66 SUR ENTRE CARRERA 91 A Y 91 F	LOCALIDAD: BOSA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

COMPONENTE TÉCNICO


VILLA SUAITA
smonte de juegos y mobiliario urbano
emplazo de mallas contra impacto
ntenimiento de cancha e intervención con tura táctica
tación e instalación de juegos infantiles ›ortados
tación e instalación de mobiliario urbano
ntenimiento a biosaludables



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte


COMPONENTE AMBIENTAL

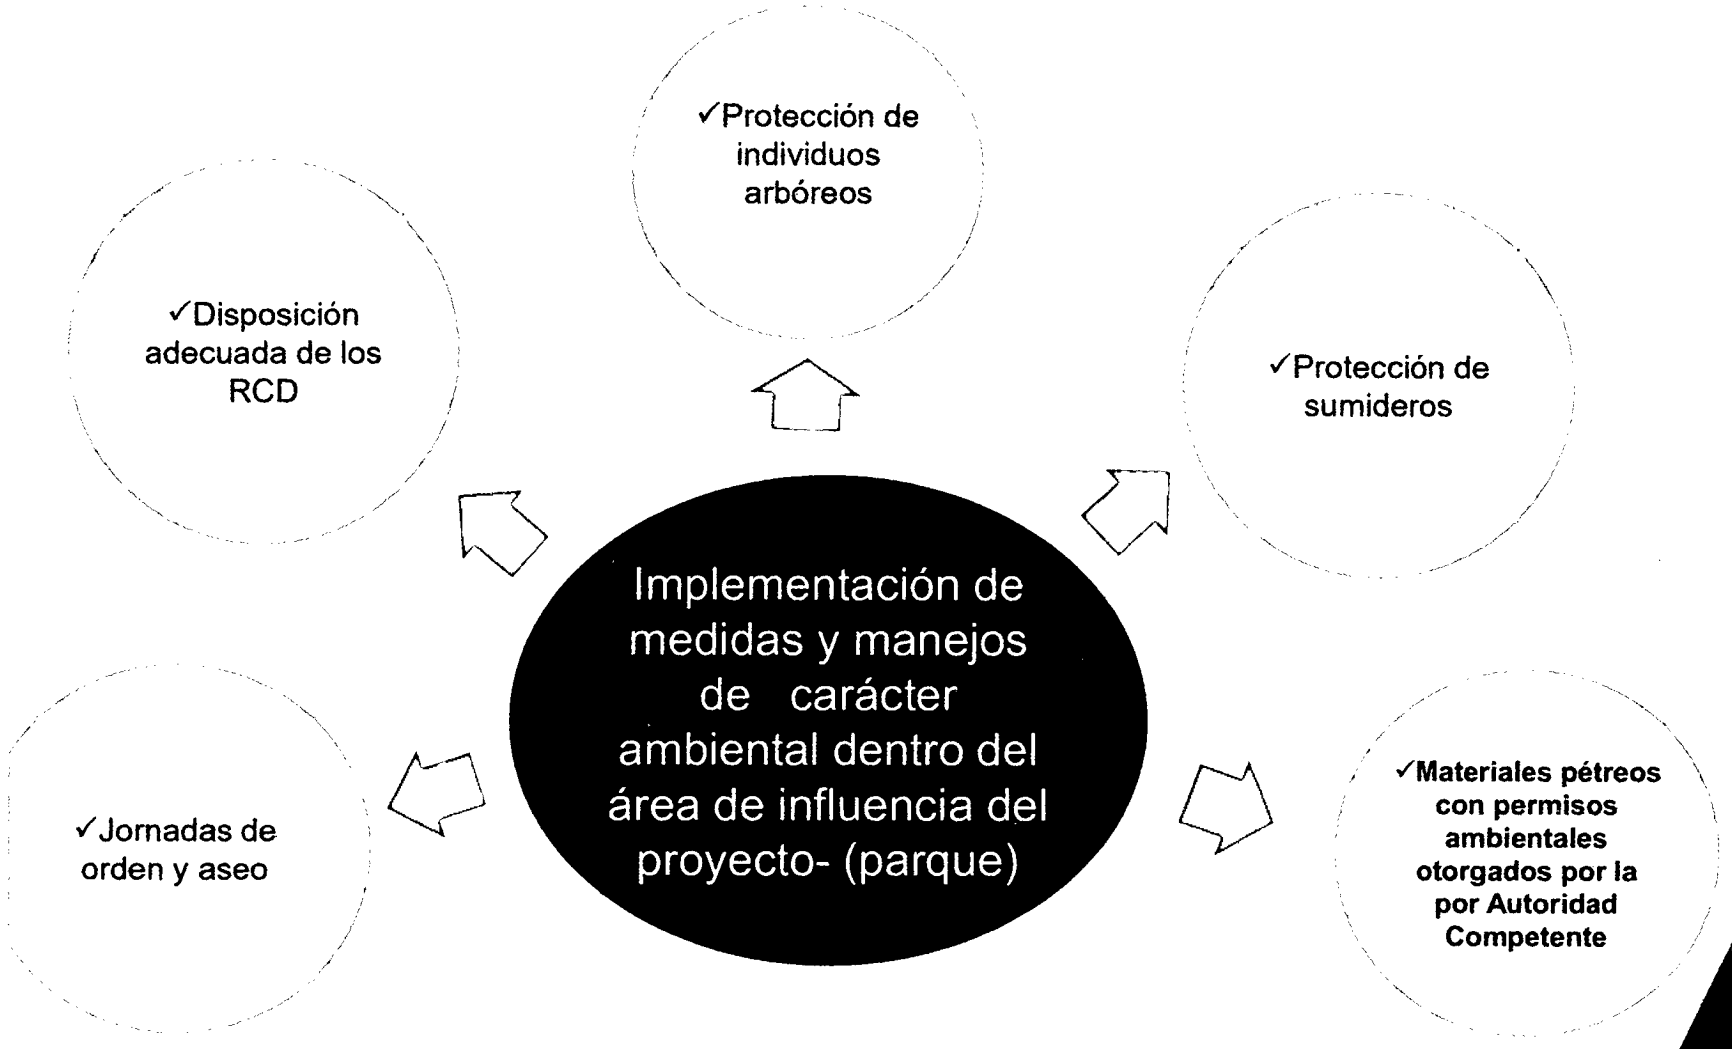

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

COMPONENTE SST

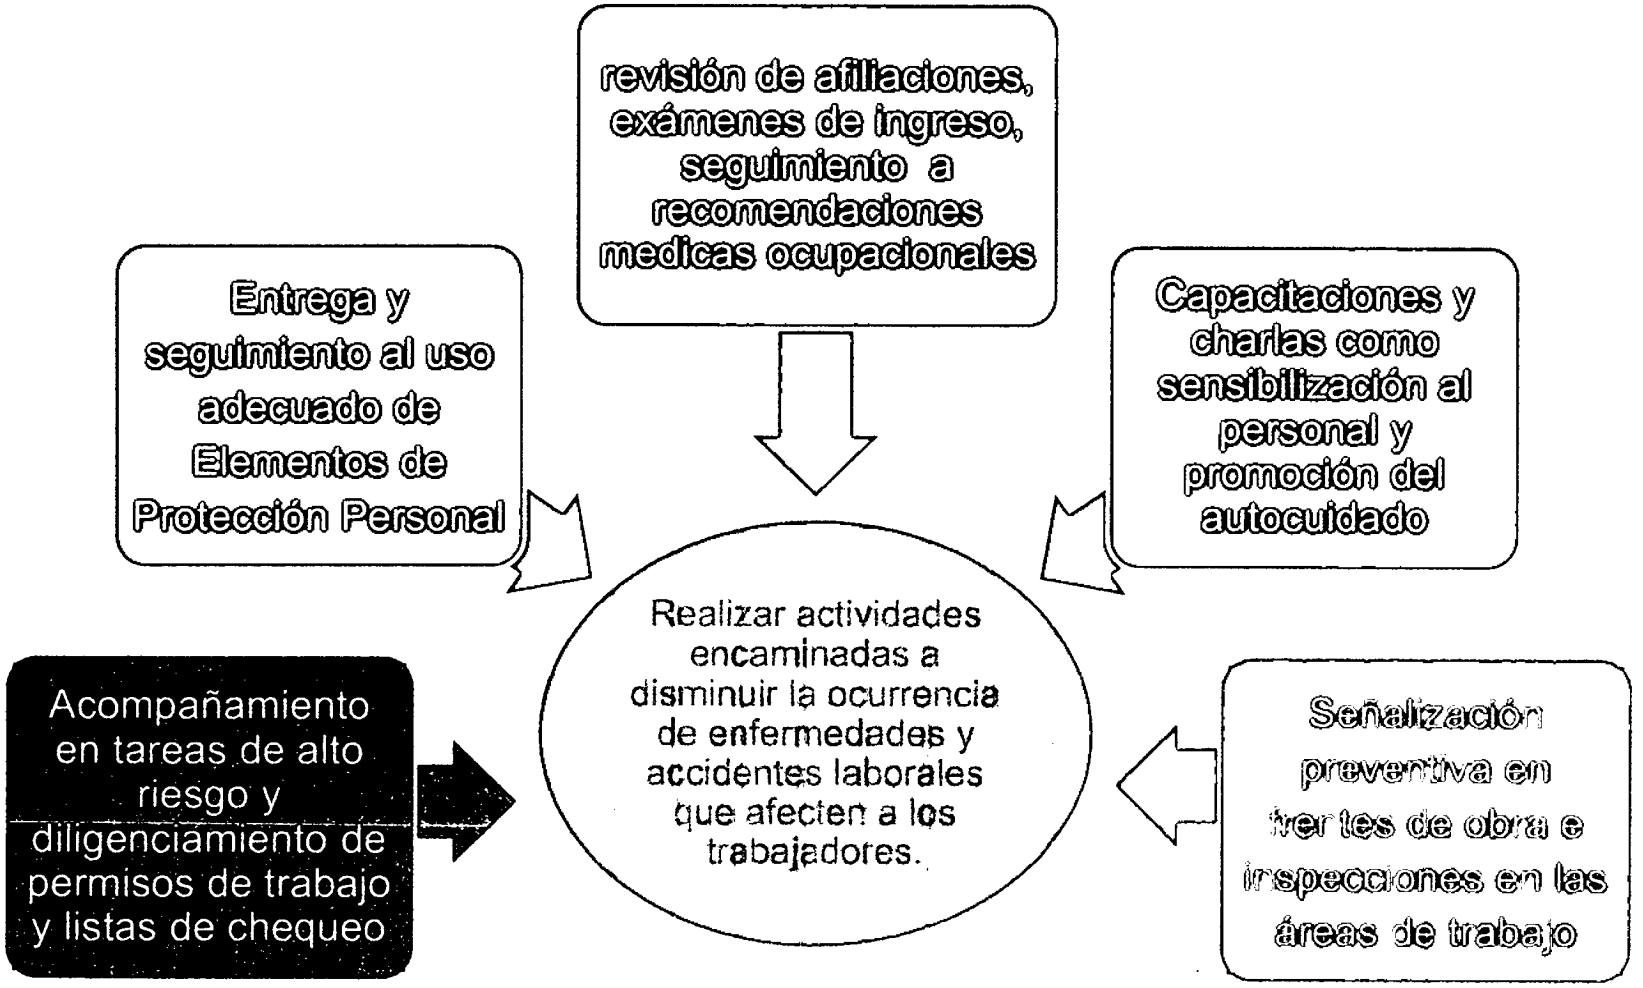


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte





COMPONENTE SOCIAL

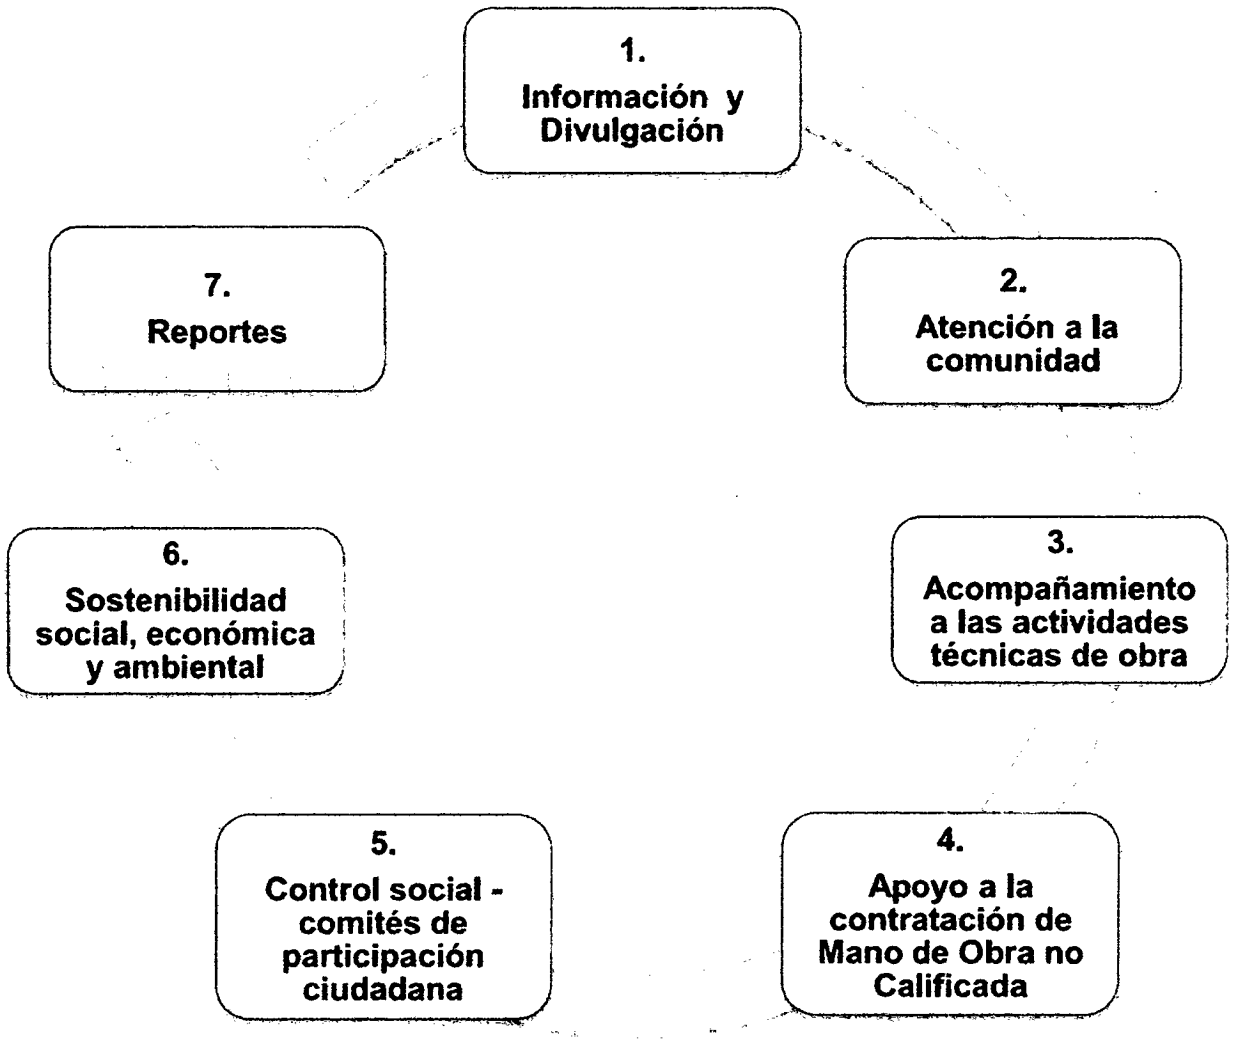

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

137



COMPONENTE SOCIAL

ención a la Comunidad:

aulina García Mancipe
ofesional Social Contratista


ención virtual al ciudadano

a y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

léfono: 3213897064

orreo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com

arcela Marín – Línea Whatsapp 3102418377
ofesional Social Interventoría



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

138


139




INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA

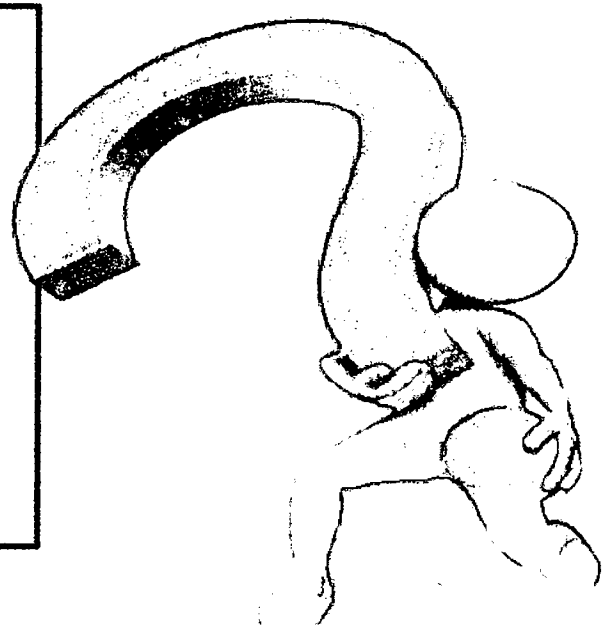

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

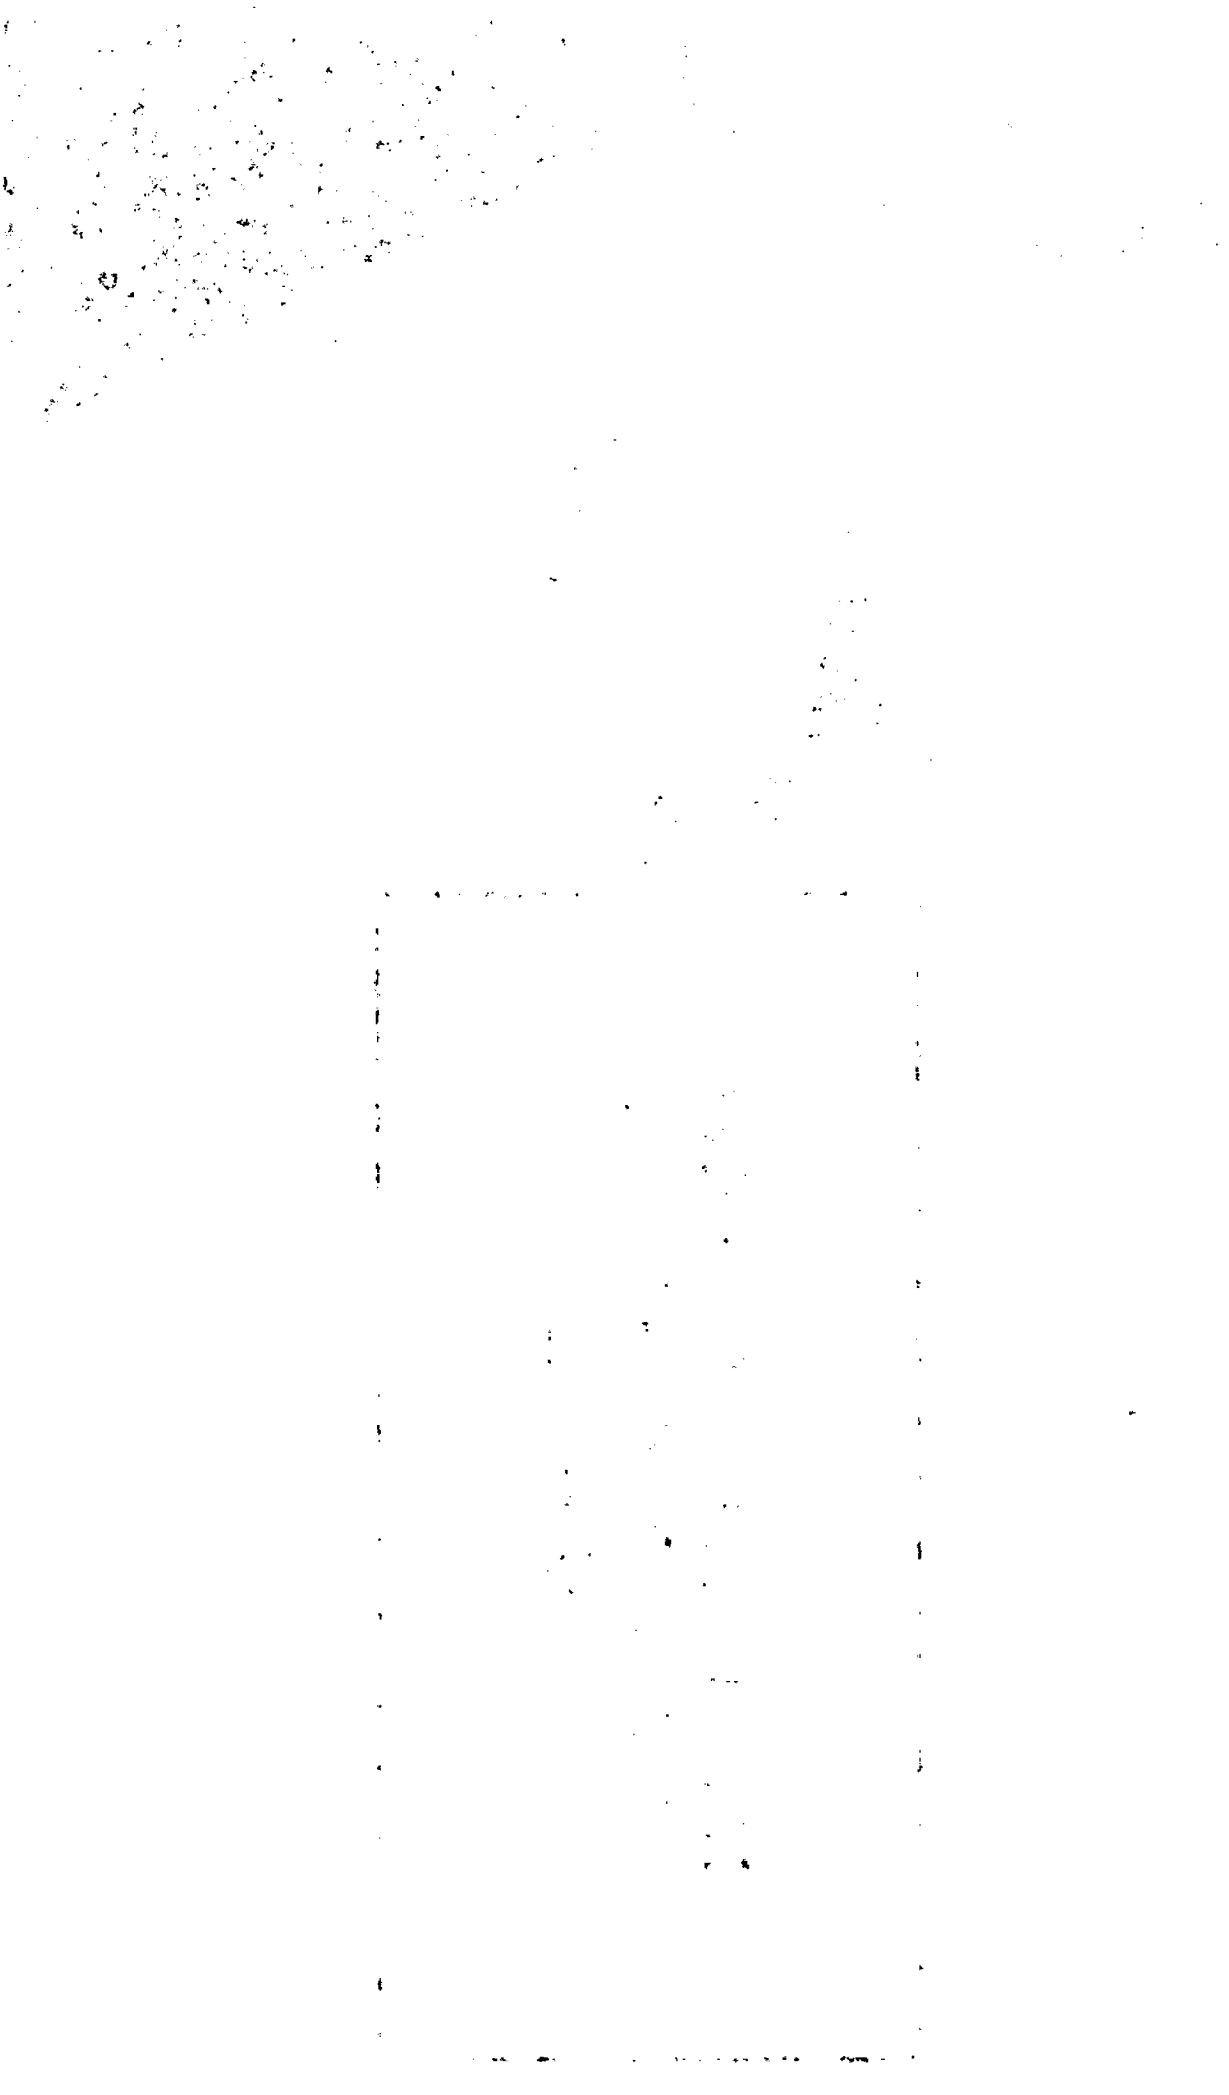

!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte



BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - Parque Desarrollo Villa Suaita	DD	MM	AA
ACTA No. 1		13	03	2023

LUGAR: Parque Desarrollo Villa Suaita **HORA DE INICIO:** 9:45 a. m. **HORA FIN:** 10:30 a. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Liliana Barbosa	Supervisora del Contrato	IDRD
Olmer Sanchez	Inspector de Obra	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Profesional Social	Belzcon S.A.S.
Cristian Barahona	Residente de Interventoría	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Profesional Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación IDRD, Contratista e Interventoría.	5. Presentación componentes que intervienen en el proyecto.
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de mantenimiento para el Parque Desarrollo Villa Suaita.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la representante de la subdirección de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Dispark, realiza su presentación el Residente Técnico de la Interventoría, el señor Cristian Barahona, seguida de la profesional social para la Interventoría, la señora Marcela Marín. Se procede a dar la palabra a los profesionales del contratista; en primer lugar se presenta el ingeniero Olmer Sanchez, Director de Obra y la profesional social Paulina Garcia Mancipe, en representación del contratista Belzcon S.A.S.

Hacen su presentación un líder social de la localidad y una Concejal manifestando su intención de acompañar el desarrollo del proyecto e insta a la comunidad a hacer buen uso de los espacios del parque.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022, que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y terminaran el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el Parque Desarrollo Villa Suaita, identificado con el código 07-038, el cual se encuentra localizado en la Carrera 91 A Bis B con Calle 65 Sur – Diagonal 66 Sur entre Carrera 91 A y 91 F.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, existen varias áreas del parque que presentan deterioro, por lo cual el contratista propuso el mejoramiento de las siguientes áreas las cuales fueron aprobadas por la Interventoria y el IDRD: el desmonte de juegos y mobiliario urbano, el remplazo de las mallas contra impacto, mantenimiento de cancha e intervención con pintura táctica, dotación e instalación de juegos infantiles importados, instalación de mobiliario urbano y mantenimiento de biosaludables.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la presentación de las áreas de apoyo que intervendrán para mitigar el impacto de la ejecución de las obras sobre la comunidad usuaria del parque.

Desde el componente ambiental se manciona que se hará disposición adecuada de los residuos de contrucción y demolición (RCD), que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon S.A.S estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán cametizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.

Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados poir Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.
A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la Interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto. Se indica a la comunidad que en el prque se instalará un pendón con los datos generales del contrato y las líneas de atención.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Las intervenciones por parte de la comunidad se enfocaron en los siguientes puntos e inquietudes:

1. La comunidad solicita a los representantes de la policía que hacen presencia en la reunión, informar cómo se manejará la seguridad una vez inicien las obras en el parque.
En atención a la pregunta, desde el contratista se indica que se instalará un cerraniento con malla traslúcida que permitela visibilidad de las áreas encerradas y no se pretende cerrar todo el parque. Por parte de la policía se invita al contratista a hacer coordinación con la policiía del cuadrante para organizar el patrullaje. Esta solicitud igualmente se puede realizar por parte de la Junta De Acción Comunal o de parte de un particular.

2. A qué altura quedará la malla contra impactos?
Se indica que la malla quedará a 5 mts de altura.

3. La comunidad solicita la reubicación de las canecas para evitar la disposición de residuos frente a los predios.
Se revisará la solicitud para evitar afectar a los residentes del sector, aunque es claro que el parque no se puede dejar sin canecas y que el tema de la disposición de residuos corresponde a la cultura ciudadana. La comunidad solicita un contenedor de basura, porlo que se aclar que esto está fuera del alcance del contrato.

4. La comunidad solicita la intervención de la vía aledaña al parquie.
Se aclara que el alcance del contrato llega hasta el límite del área del parque y que no contempla la intervención de malla vial.

5. La comunidad desea saber para que edades se instalarán los juegos infantiles.
Se informa que aunque se tienen algunas proyecciones, lo que se espera que es que todas las áreas sean incluyentes para ampliar el beneficio de las obras sobre la comunidad.

6. Se mantendrá el uso actual de las canchas?
Se informa a los asistentes que se planea acondicionar canchas múltiples, por lo que tambien se podría habilitar la cancha para voleiball. El objeto es mejorarlas dos canchas ubicadas en el parque.

7. Cuánto tardarán las obras?
Se espera iniciar las labores preliminares de obra para dar inicio a las obras prontop y terminar para el 8 de junio de 2023.

8. Se plantarán más árboles?
El contrato comprende la protección de los árboles existentes pero no se plantarán nuevos. Esta solicitud se debe hacer ante el Jardín Botánico o a la Secretaría de Ambiente, quienes tienen en cuenta las consideraciones especiales del entorno por tratarse de una ronda de rio.

Se reeitera la invitación a conformar el comité de participación y se da cierre a la reunión.

144

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN**

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					

Siendo las 10:30 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**		
NOMBRE	Paulina García M.	**NOMBRE**		
CARGO	Profesional Social	**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina Garcia Mancipe

BOGOTÁ

ENTO: Reunión Socialización de Inicio

RA INICIAL 9:30am HORA FINAL 10:30 am

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

FECHA: 13 - 03 - 2023

LUGAR Parque Villa de Suita

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Aurora Manrero.	76		X		Y.			X	Vecina.	No utiliza.	4 2404 61.	
Victor Julio Clavijo	73 A	X				X		X	Vecino	No utiliza	9290461	
Alfonso Gonzalez	72	X				X		X	Vecino	alfonzogonzalez90@gmail.com	3105796622	
Maria Leonor Castillo	74		X			X		X	Vecina.	No utiliza	3133333103	
Claudia Patricia Vargas	52		X			X		X	Vecina	No utiliza	3194706905	
Jazmín Buritica	37		X			X		X	Vecina	No utiliza	3508205965	
Elevira Díaz	63		X		X			X	Vecina	No tiene	3102828191	
Dora. Alicia Tequia	63		X			X		X	J. A. C.	No se acuerda	3105596940	
Ana Cecilia Ramos	59		X			X		X	Organización Social Otros practicas	ancerra3@gmail.com	3183994962	
Doris Figueredo	61		X			X		X	Vecina	dorisfigueredo@gmail.com	3146276316	
Maria Esperanza Cortés	52		X			X		X	J. A. C	doty619@hotmail.com	3119222033	
Camilo Perez	68	X				X		X	comunidad	No utiliza	3156919946	
César Peña	57	X				X		X	Comunidad	adribel@gmail.com	3212568392	
Fernando López Avila	66	X							Comunidad	fernandolopezavila@hotmail.com	3115158914	
Yenny Ortiz	48		X			X		X	Presidenta de J. A. C.	yennyortiz1010@gmail.com	3112531018	
Lorena Quiroga	40		X			X		X	Secretaria J. A. C.	lorenaqs@gmail.com	3127825419	
Damaris Cardoso	63		X			X		X	comunidad	No utiliza	3133982466	
Elizabeth Betancourt.	43		X.			X		X	comunidad	Elizabethbetancourtlopez@gmail.	3024639925	
Alexander Romero Rojas	42	X				X		X	comunidad	alexanderromerorojas@gmail.	300 650 9923	
Liliana T. Barbosa	44		X			X		X	Prof. IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3203409620	
[redacted]	42	X				X		X	(INTER).	[redacted]	3330745	
Oliver Sanchez Cortes	60	X				X		X	Contratista Ora.	oscardiaz.412@gmail.com	323669112	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD. https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS V.1

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

Reunión socialización de. IDRD FECHA: 13- 03- 2023.

HORA INICIAL 9:30am HORA FINAL 10:30am LUGAR Parque Villa Suaita

NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Estella Huertas			X			X		X	comunidad	No utiliza	3125612512	
Ruth Borda			X			X		X	comunidad	borduth@gmail.com	3025253056	

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

La suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS. V.1

Powered by CamScanner

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

PARQUE PASTRANITA II SECTOR

08-045

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Belzcon
ción Propositiva

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

961

197

AGENDA

Saludo y Bienvenida

Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría

Generalidades del contrato

Localización del proyecto

Componentes:

- Componente Técnico
- Componente Ambiental
- Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
- Componente Social

Intervención de la comunidad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

147

15



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisor del Contrato de Obra e Interventoría	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente técnico	Liliana Paola Barbosa Barrera
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ



CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Olmer Sánchez
Residente de obra	Sergio Salgado
Especialista Social	Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

ONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL
NTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN
SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

DURACIÓN DEL CONTRATO	**Siete (7) meses**
FECHA DE INICIO	**9 de noviembre de 2022**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**8 de junio de 2023**

Belzcon
ción Propositiva

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ


BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

151

151



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

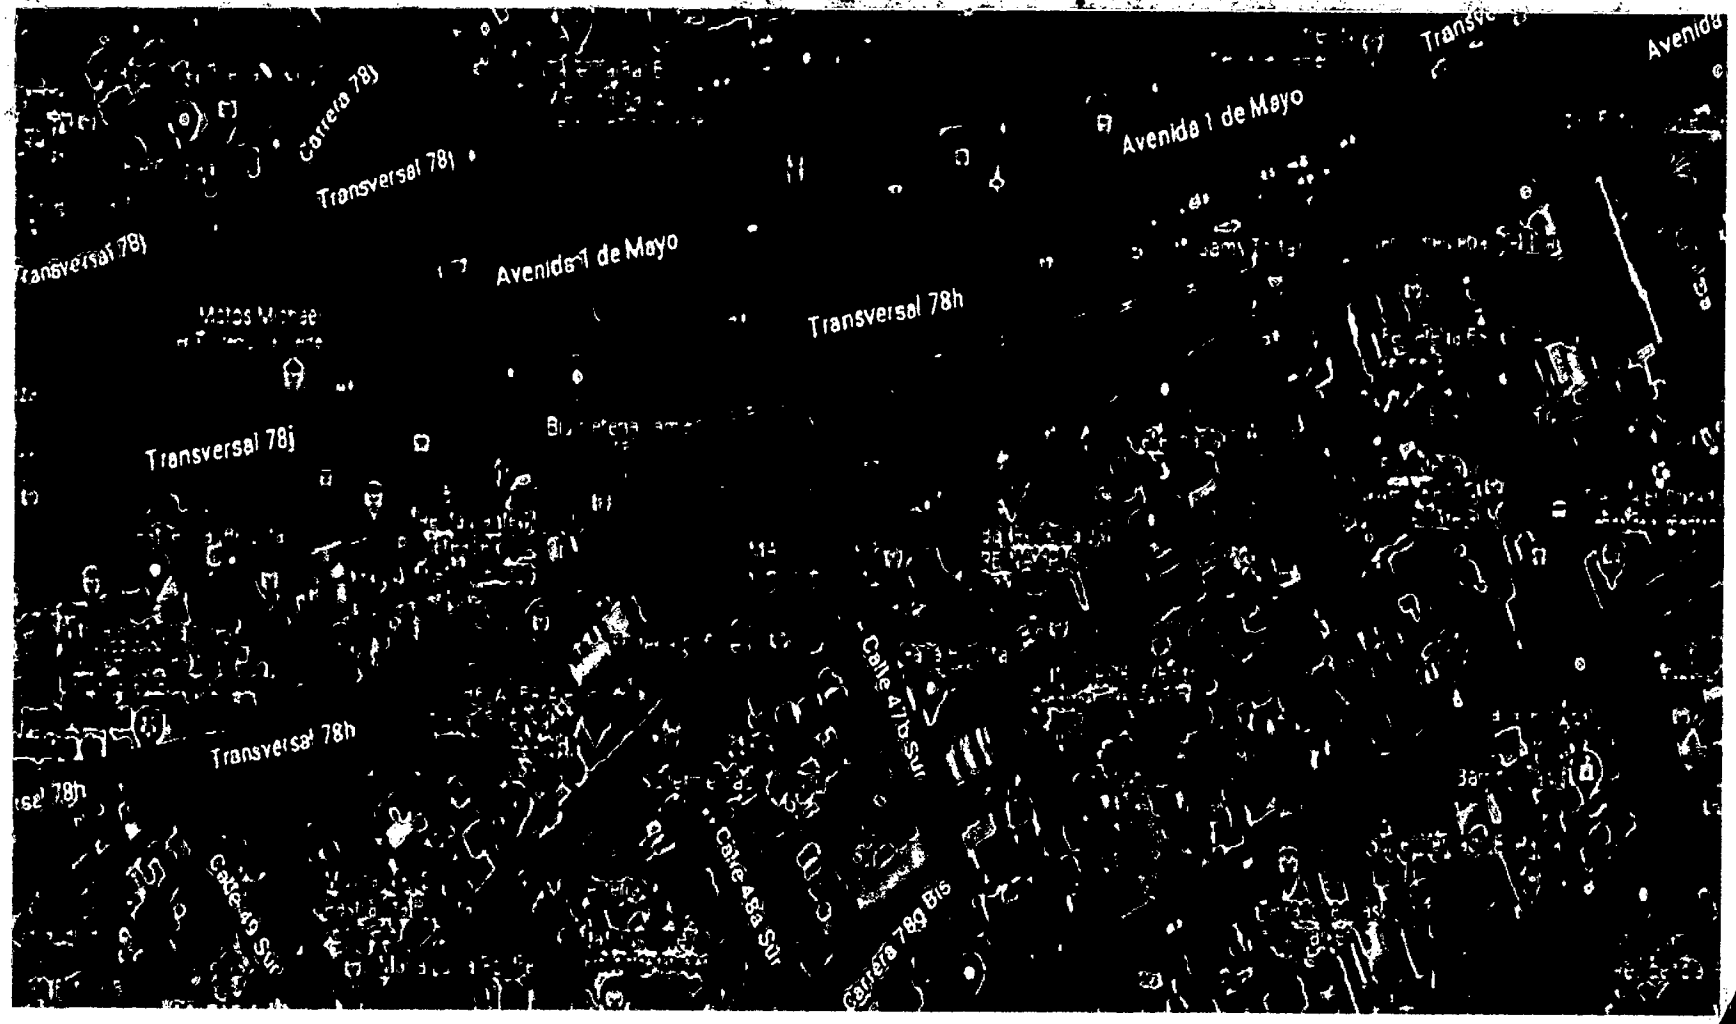

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte





PASTRANITA II SECTOR 08-045	**CARRERA 80 C CON CALLE 45 SUR**	**LOCALIDAD: KENNEDY**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

152



COMPONENTE TÉCNICO


PASTRANITA II SECTOR
emplazo de juego infantil y mejoramiento piso en caucho
antenimiento de gradas
ntura táctica de cancha múltiple
antenimiento de arcos y tablero
otación e instalación de gimnasio canino
stalación de bancas, canecas y señalética
antenimiento a biosaludables



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

COMPONENTE AMBIENTAL

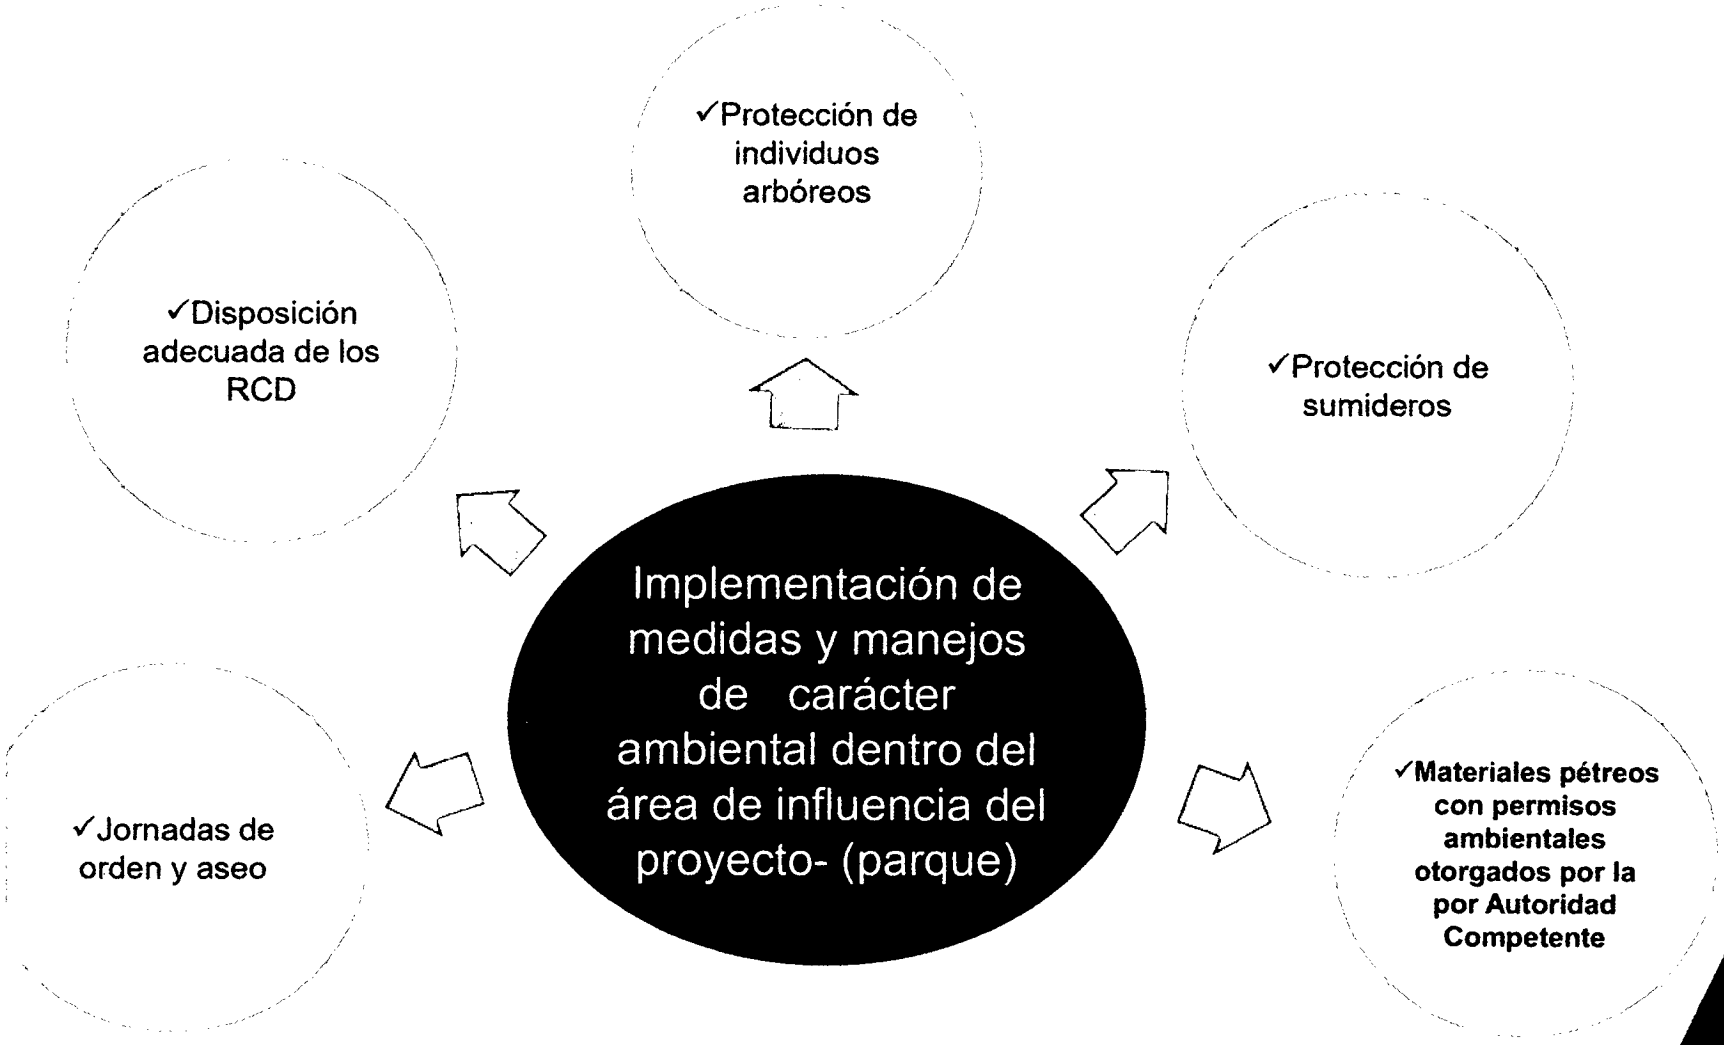


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

154

COMPONENTE SST

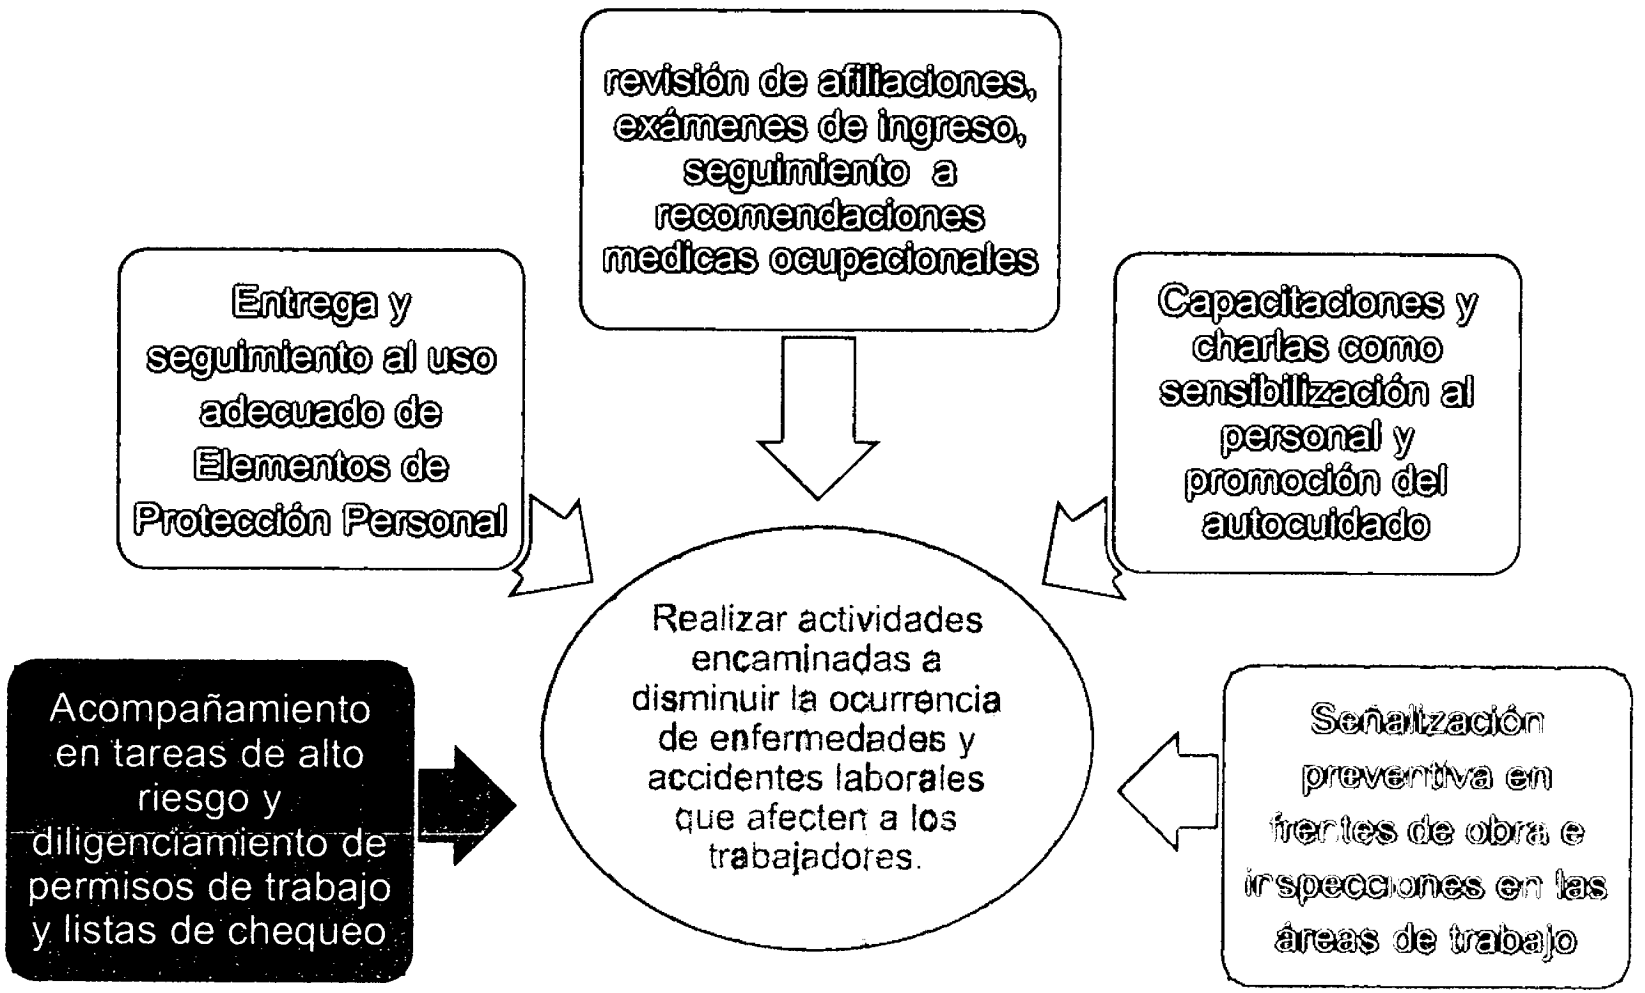


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte




COMPONENTE SOCIAL

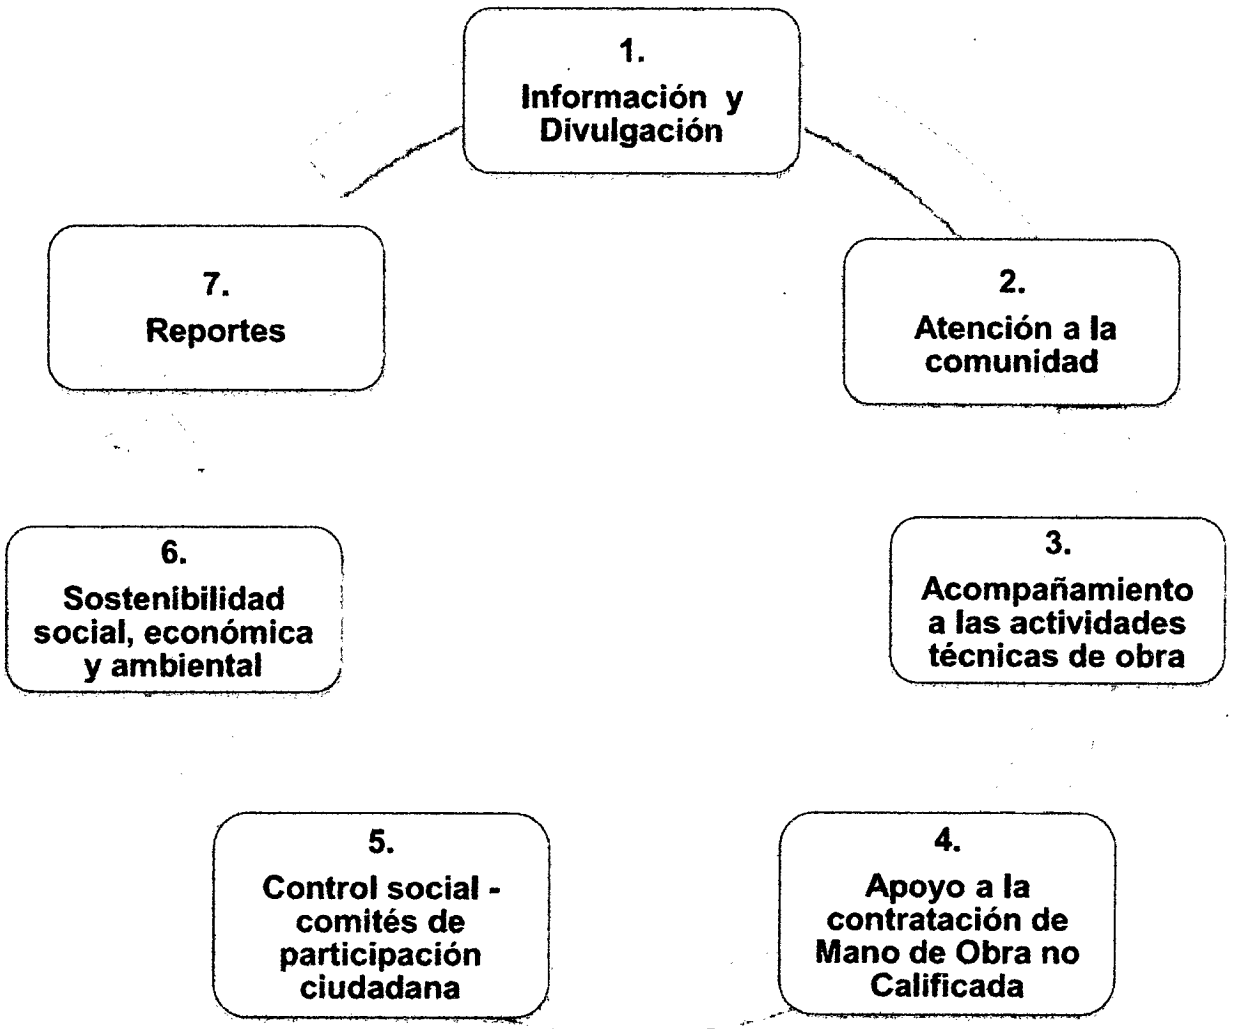

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

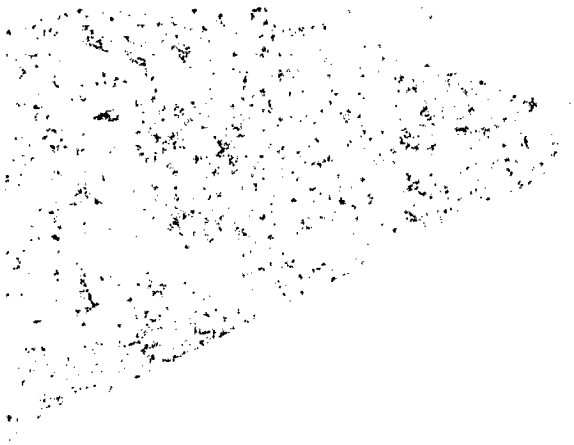

COMPONENTE SOCIAL

ención a la Comunidad:

aulina García Mancipe

ofesional Social Contratista

ención virtual al ciudadano


a y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

léfono: 3213897064

orreo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com

arcela Marín – Línea Whatsapp 3102418377

ofesional Social Interventoría



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte




INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA

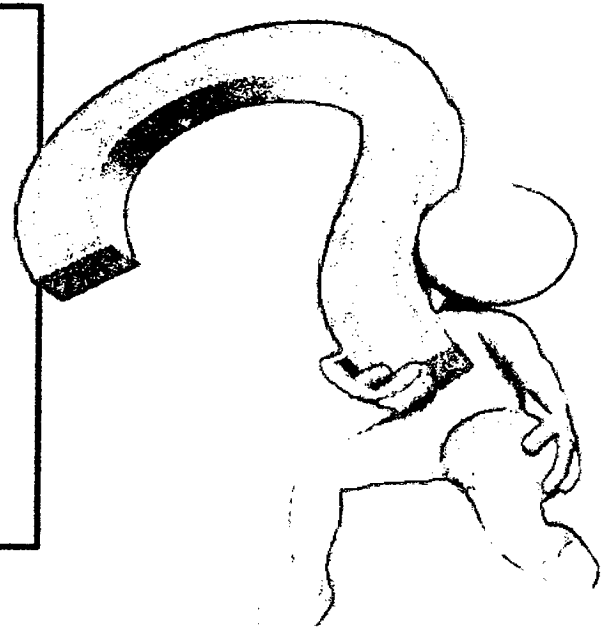

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

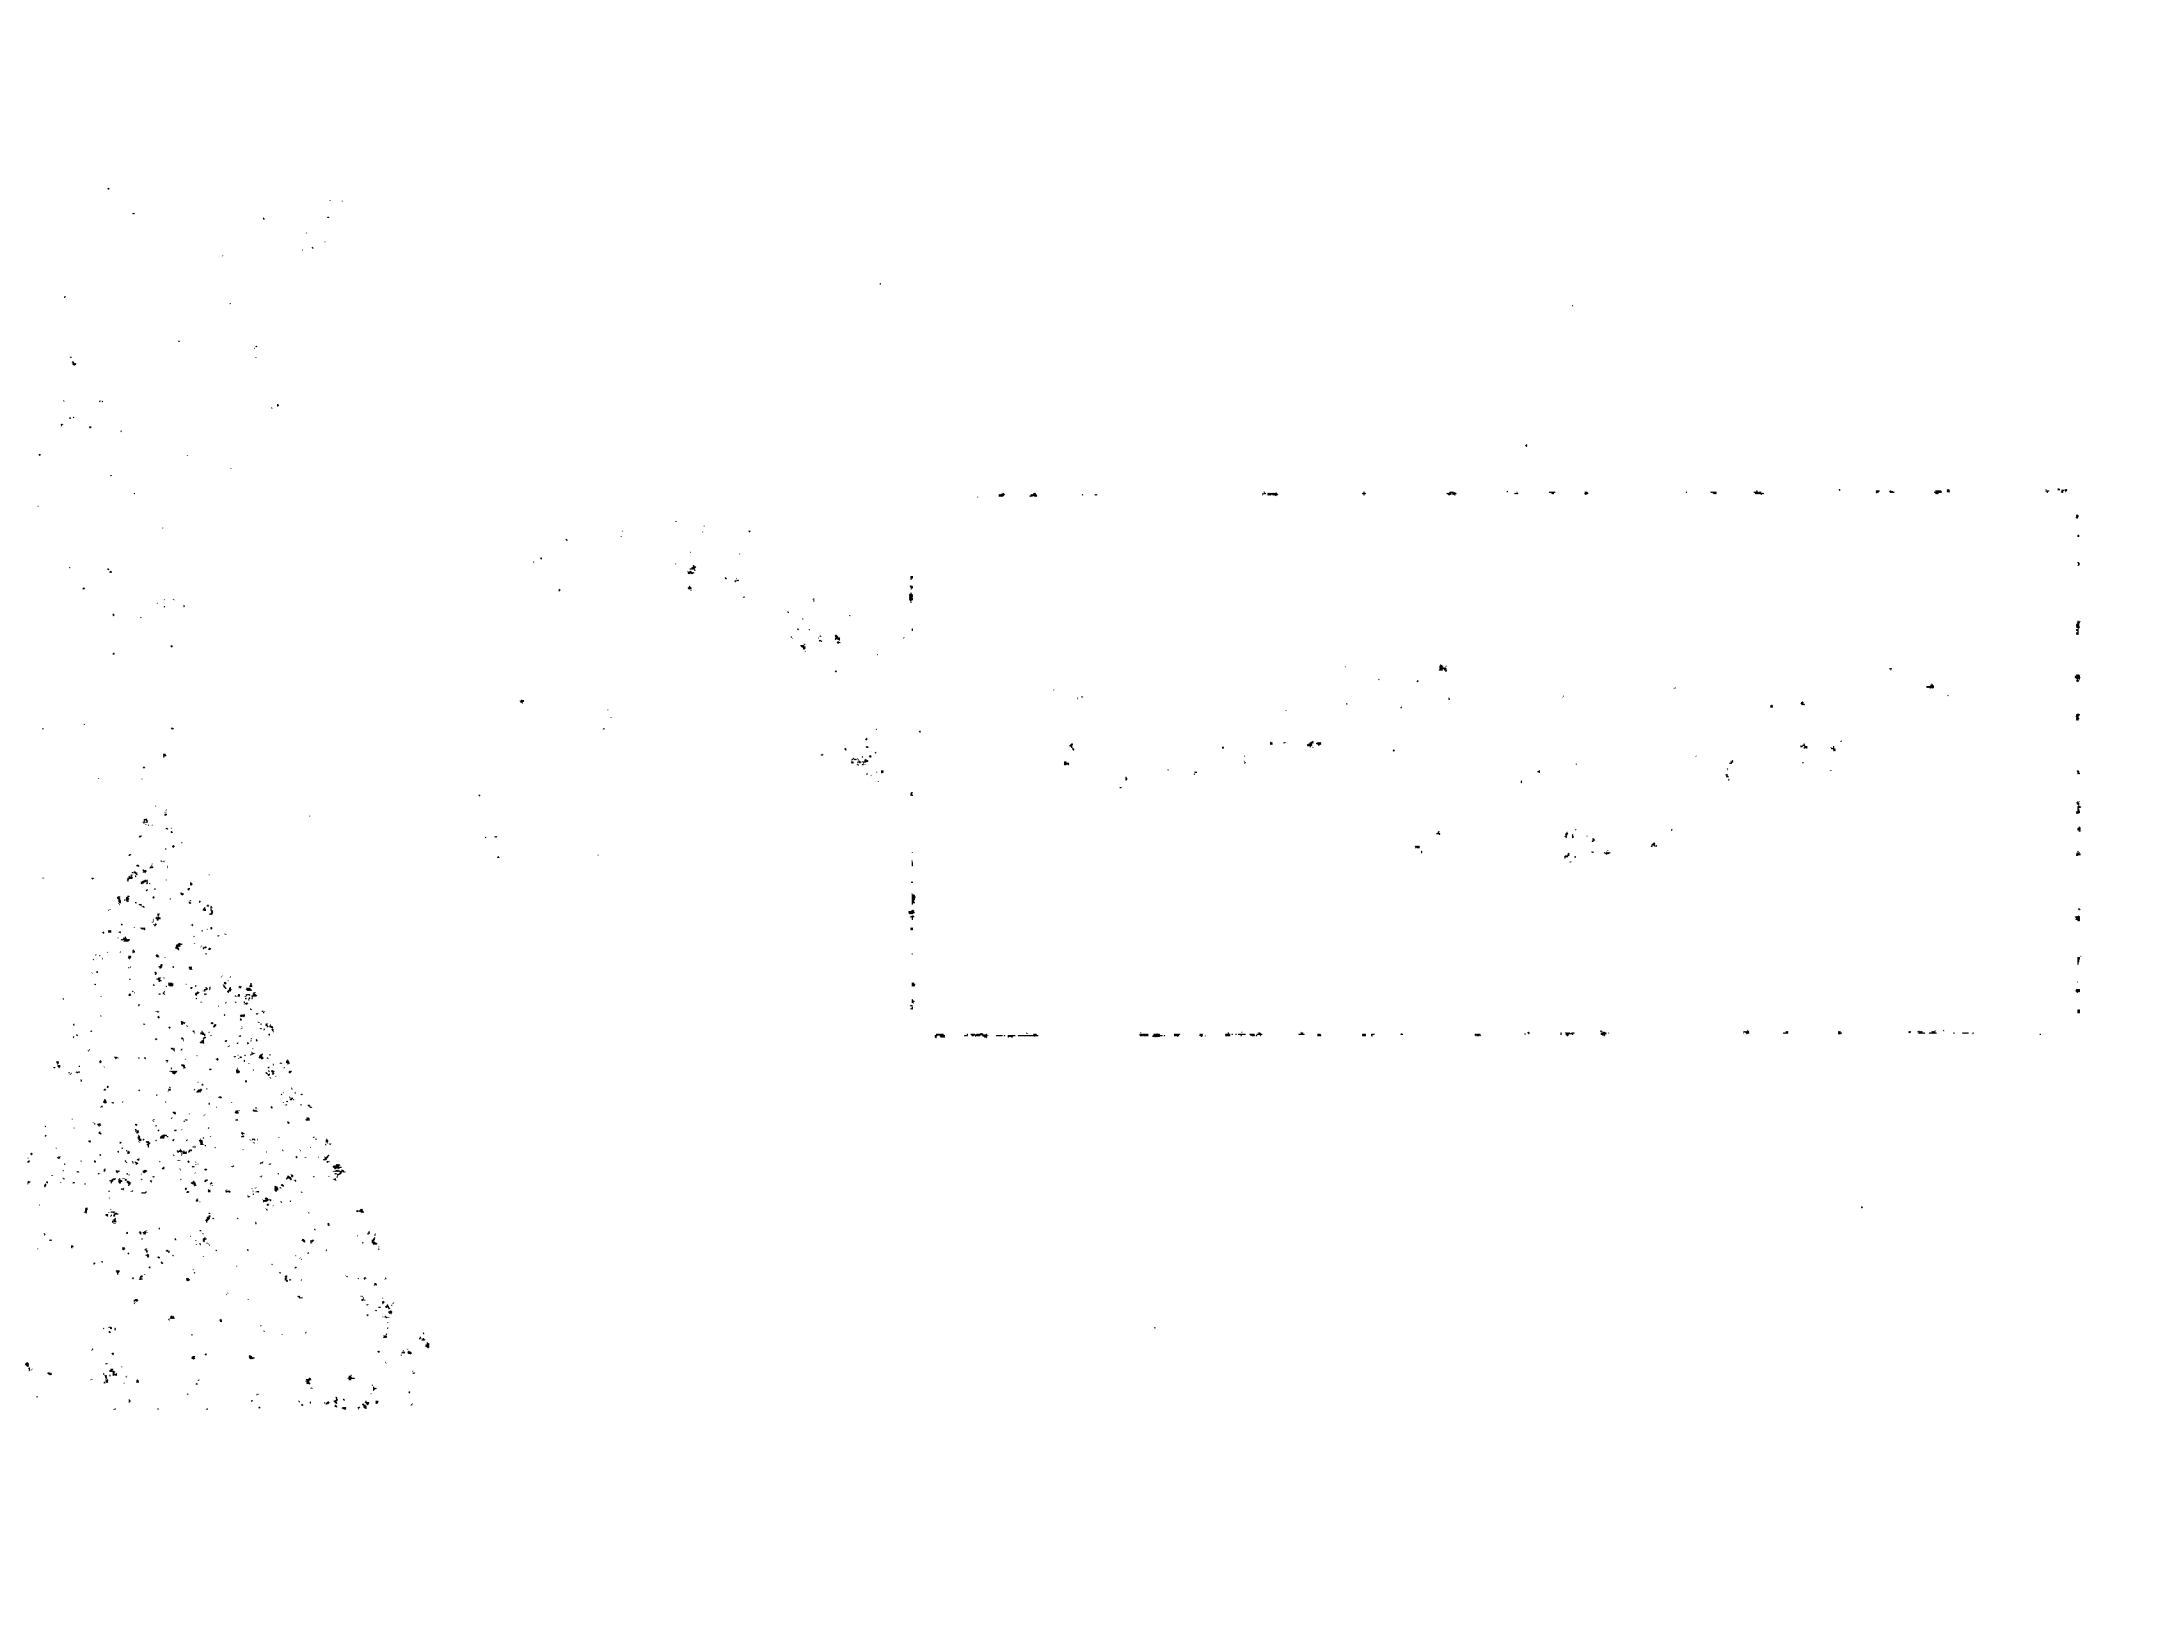

!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de inicio - Parque Pastranita II Sector	DD	MM	AA
ACTA No. 1		13	03	2023

LUGAR:	Parque Pastranita II Sector	HORA DE INICIO:	11::00 a. m.	HORA FIN:	12:00 m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Liliana Barbosa	Supervisora del Contrato	IDRD
Olmer Sanchez	Inspector de Obra	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Especialista Social	Belzcon S.A.S.
Cristian Barahona	Residente de Interventoría	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Especialista Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación IDRD, Contratista e Interventoría.	5. Presentación componentes que intervienen en el proyecto.
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de mantenimiento para el Parque Pastranita II Sector.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la representante de la subdirección de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Dispark, realiza su presentación el Residente Técnico de la Interventoría, el Ingeniero Cristian Barahona, seguida de la profesional social para la Interventoría, la señora Marcela Marín. Se procede a dar la palabra a los profesionales del contratista; en primer lugar se presenta el ingeniero Olmer Sanchez, Director de Obra y la profesional social Paulina Garcia Mancipe, en representación del contratista Belzcon S.A.S.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022, que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y terminaran el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el Parque Patranita II Sector, identificado con el código 08-045, el cual se encuentra localizado en la Carrera 80 C con Calle 45 Sur.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, existen varias áreas del parque que presentan deterioro, por lo cual el contratista propuso el mejoramiento de las siguientes áreas las cuales fueron aprobadas por la Interventoria y el IDRD: remplazo de juego infantil y mejoramiento de piso en caucho, mantenimiento de gradas, pintura táctica de cancha múltiple, mantenimiento de arcos y tablero, dotación e instalación de gimnasio canino, instalación de canecas, bancas y señalética y mantenimiento de biosaludables. Se revisará igualmente la iluminación de las canchas para ver si se requiere el reemplazo de luminarias.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la presentación de las áreas de apoyo que intervendrán para mitigar el impacto de la ejecución de las obras sobre la comunidad usuaria del parque.

Desde el componente ambiental se manciona que se hará disposición adecuada de los residuos de contrucción y demolición (RCD), que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon S.A.S estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán cametizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.

Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados polr Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.
A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto. Se indica a la comunidad que en el prque se instalará un pendón con los datos generales del contrato y las líneas de atención.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Las intervenciones por parte de la comunidad se enfocaron en los siguientes puntos e inquietudes:

1. La comunidad pregunta si se va a cambiar el juego infantil.
Se indica que si se cambiará. El que existe se puede instalar en la zona verde y seinstalará uno nuevo.

2. La comunidad solicita revisar la ubicación de las máquinas biosaludables, pues hay una que puede generar riesgos para el paso de peatones.

3. Se intervendrá la carpeta asfáltica de las canchas?
Se revisará el estado de la misma, si se encuehtra que está afectada se reemplazará, de lo contrario, se pintará únicamente. Se revisará tambien la posibilidad de acondicionarla para voleiball, pero lo primordial es revisar el manejo de aguas en la superficie y si es necesario, se reconformarán los sumideros.

4. Se contratarán mujeres para trabajar en el parque?
Si, se deben hacer llegar las hojas de vida al correo electrónico del área social o al whatsapp de la línea de atención al ciudadano. No hay inconvenientes frente a la edad de las personas que deseen vincularse con el proyecto.

5. La comunidad solicita dejar altala malla contra impactos.
Se indica que las mallas noserán retiradas. Se revisará si se puede prolongar el paral con instalación de mallas de nailon para ampliar el área de protección sobre los predios del área de ifluencia directa.

6. Cuándo de iniciarán las obras?
Seexplica que primero se adelantarán las actividades preliminares y que una vez estas sean surtidas, se dará inicio a la obra.

Se reitera la invitación a conformar el comité de participación ciudadana y se da cierre a la reunión.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					

Siendo las 12:00 m se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA	Paulina García M.	**FIRMA**		
NOMBRE	Paulina García M.	**NOMBRE**		
CARGO	Profesional Social	**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina Garcia Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

Reunión Socialización de Inicio — FECHA: 13 - 03 - 2023

AL 11:00am HORA FINAL 11:45 — LUGAR Parque Pastranita

NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Rosa Ucla	52		X			X		X	Vicepresidenta J.A.C.	No se acuerda	3123396554	Rosa Ucla
olfo E Oparuyo	59		X			X			tesorero	tesorero barrio grupo 640@gmail.co	3106753587	Holfo E.
A. Rocio Feliciano	42		X			X		X	Presidenta	alba.roxxio@gmail.com	3142140020	Rocio Feliciano.
ia Alicia Poveda	64		X			X		X	comunidad	NO utiliza	3209703405	
stadio Susa Castro 6	65	X				X		X	comunidad	No utiliza	3228339977	
ber Emilio Garzón	35	X				X		X	comunidad	No utiliza	3165511243	
tricia Salamanca	59		X			X		X	comunidad	No utiliza	3115470186	
ora Elsy Espinosa	70		X			X		X	comunidad	No utiliza	2493136	
chael Randy	49	X				X		X	comunidad	No.lopez6622@GMAIL.COM	3138663483	
nnyfer Celys	29		X			X		X	comunidad	jenni-ferpa@hotmail.com	3245298855	Jennifer Celys.
nibal Chávez	50	X				X		X	comunidad	peturdoa@gmail.com	3506962022	Anibal
melda Ospina	52		X			X		X	comunidad	No utiliza	6500087 6202337	Esmelda
ura Gladys Bonilla	61		X			X		X	comunidad	No utiliza	3202606691	Maria Gladys
Suárez Castro	60	X				X		X	Belzeon Sas	o.sanchez.ibz@gmail.com	3213669117	
STHY BARAHONA	42	X				X		X	INTERVENT.	dsparkg9@ingepon.co	3232059081	
arcela Marín Díaz			X			X		X	Interventoria	dsparkg9@ingepon.co	3102416377	
aro Caicedo	62	X				X		X	comunidad	No utiliza	3192169172	
z Marina Osorio	64		X		X			X	Comunidad	luzm.oso@hotmail.C	3143844302	
cira Aguirre Ramirez	70		X			X		X	comunidad	No utiliza	3132916802	
[illegible] P. Barbosa	44		X			X		X	Prof. IDRD.	liana.barbosa@idrd.gov.co	3204169620	

NOTA: los grupos étnicos son: indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

scripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

Powered by CamScanner

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

PARQUE CARVAJAL

08-014

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Belzcon
cción Propositiva

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

691



AGENDA

Saludo y Bienvenida

Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría

Generalidades del contrato

Localización del proyecto

Componentes:

- Componente Técnico
- Componente Ambiental
- Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
- Componente Social

Intervención de la comunidad.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

591

165

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisor del Contrato de Obra e Interventoría	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente técnico	Liliana Paola Barbosa Barrera
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

991

191



CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Olmer Sánchez
Residente de obra	Sergio Salgado
Especialista Social	Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

ONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL
NTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN
SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

DURACIÓN DEL CONTRATO	**Siete (7) meses**
FECHA DE INICIO	**9 de noviembre de 2022**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**8 de junio de 2023**

Belzcon
cción Propositiva

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

89

69




LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte



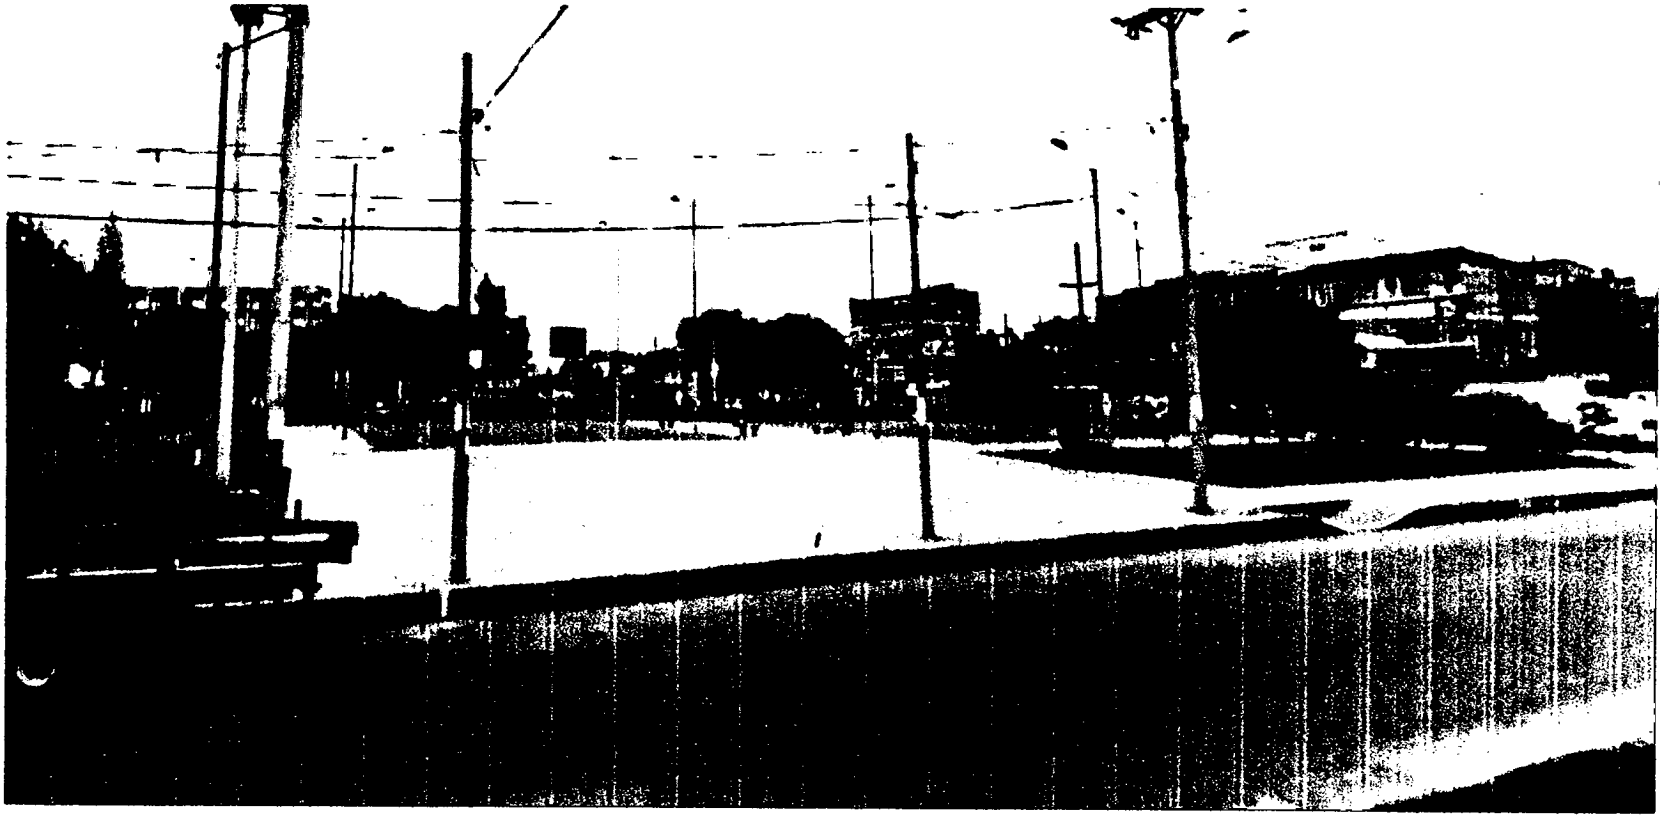

CARVAJAL **08-014**	**CARRERA 72 N CON CALLE 35 B SUR**	**LOCALIDAD: KENNEDY**


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

COMPONENTE TÉCNICO

CARVAJAL

- smonte de mobiliario urbano e instalación
)ancas y canecas nuevas
- ntenimiento de cerramiento contra
  acto
- :ación e instalación de gimnasio canino
- ntenimiento de cancha de futbol
- talación de señalética

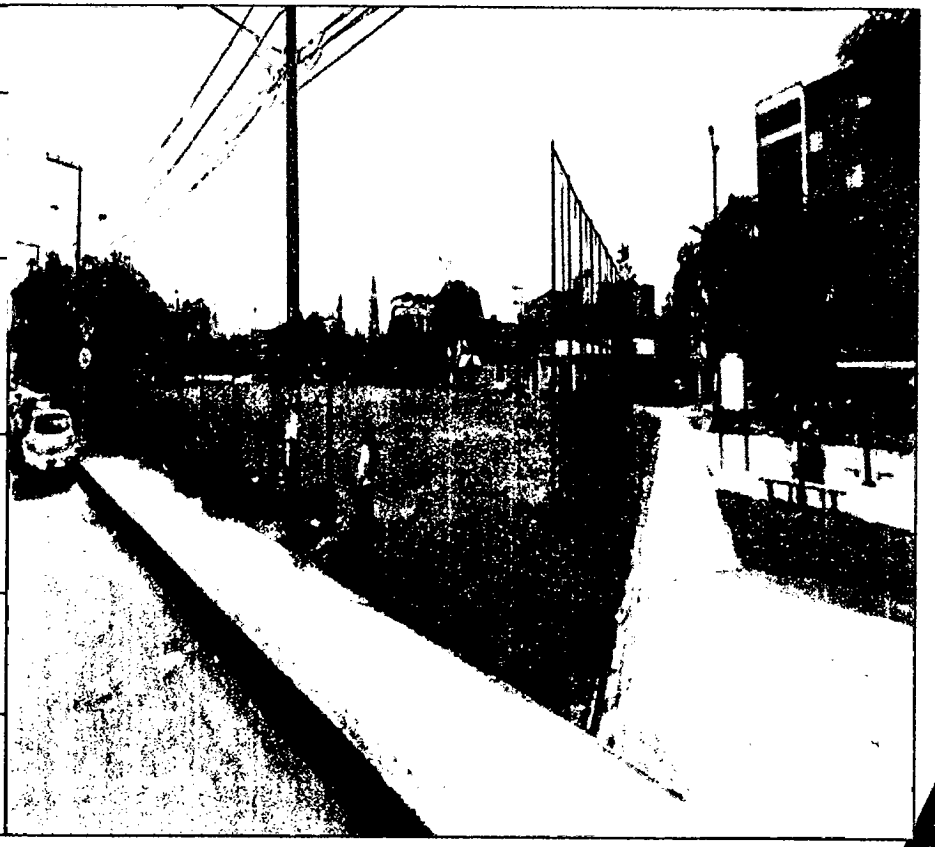


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte



COMPONENTE AMBIENTAL

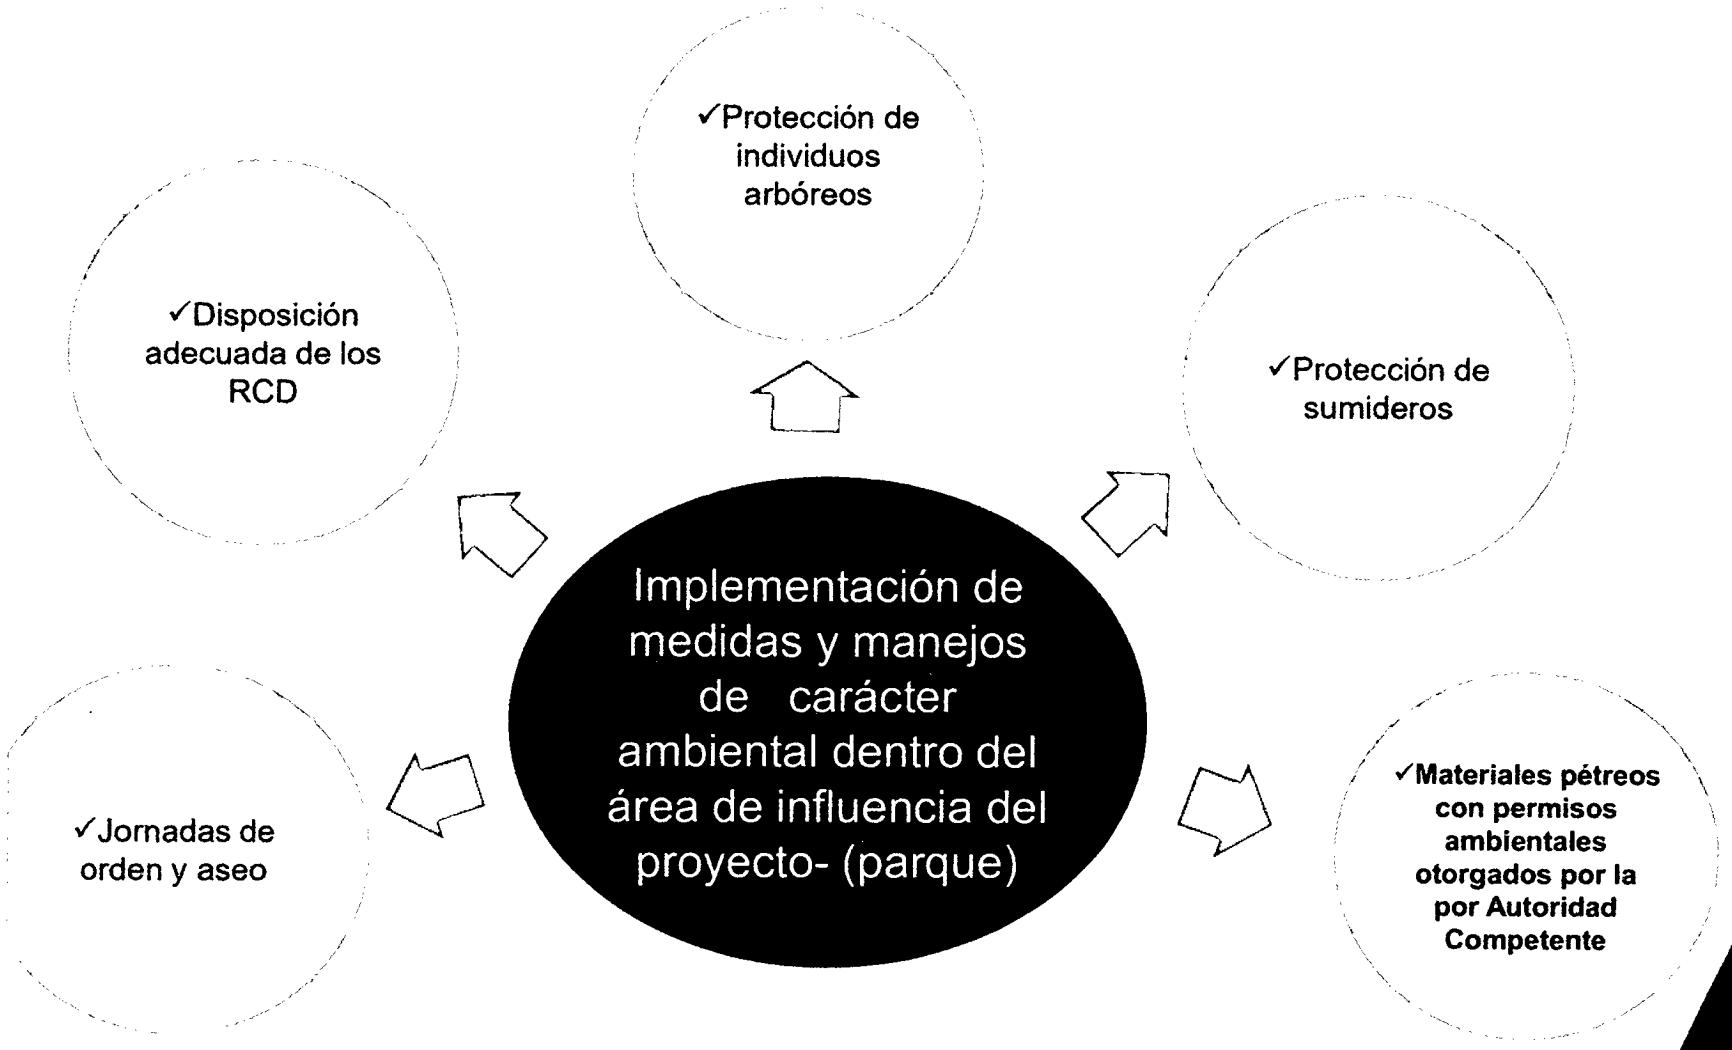


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

172

COMPONENTE SST

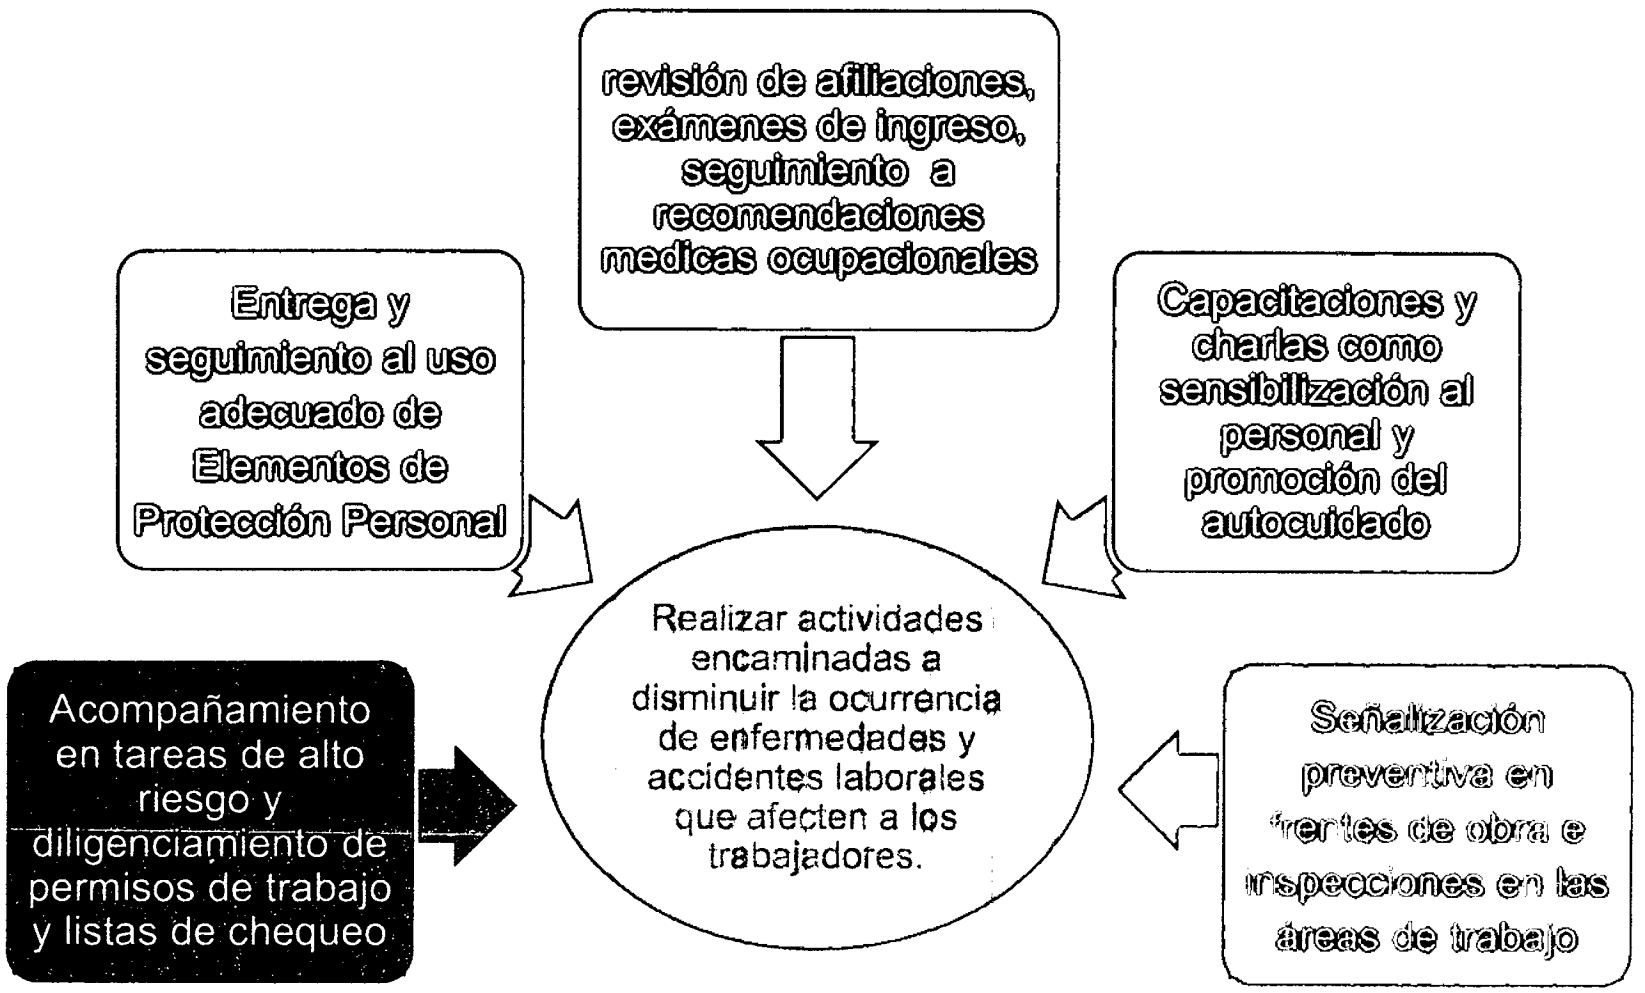


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte





COMPONENTE SOCIAL

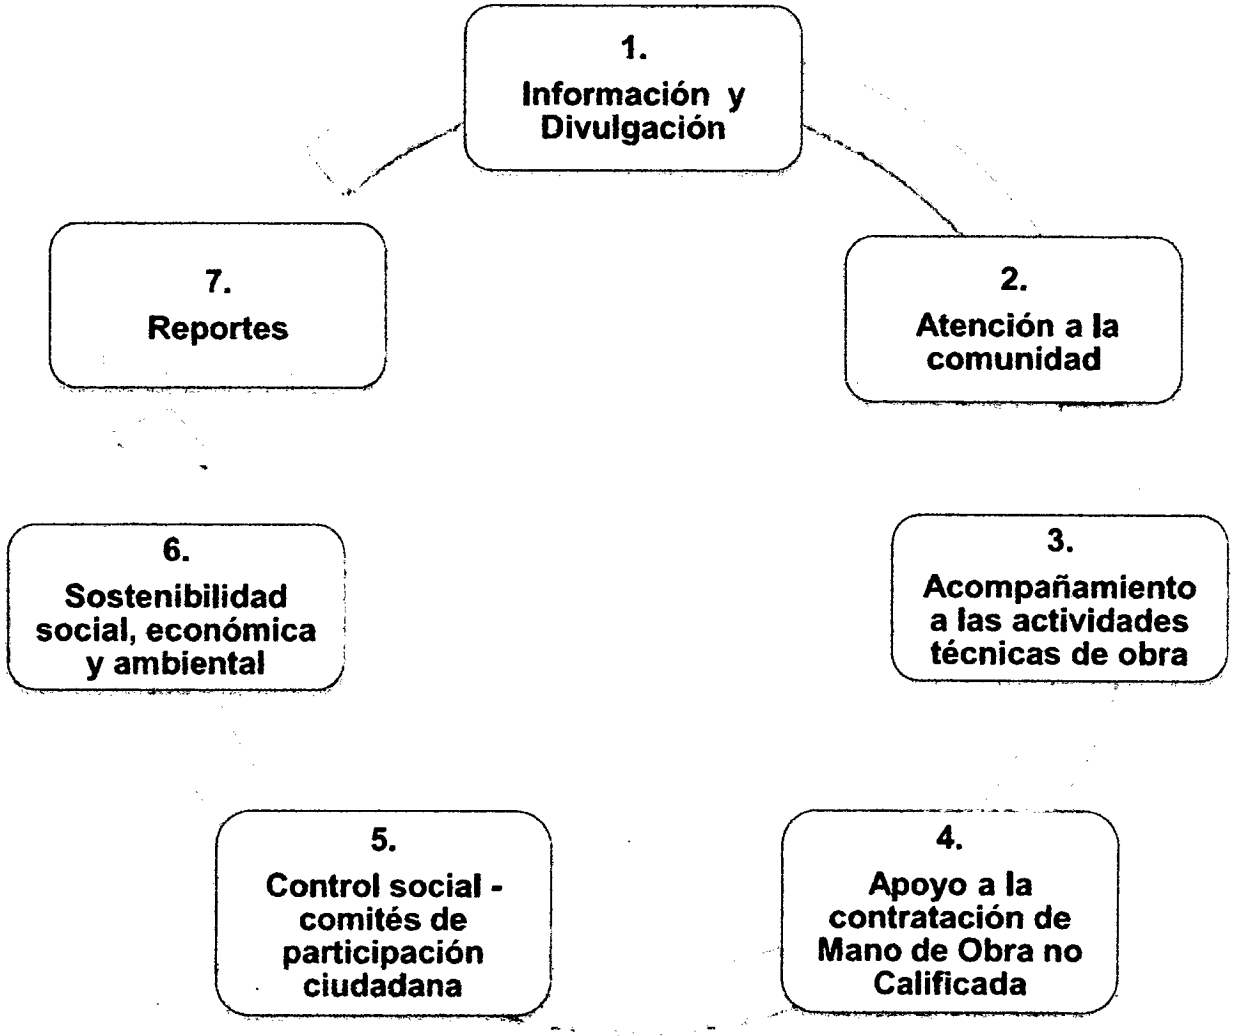

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

COMPONENTE SOCIAL

ención a la Comunidad:

aulina García Mancipe

ofesional Social Contratista

ención virtual al ciudadano


a y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

léfono: 3213897064

orreo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com

arcela Marín – Línea Whatsapp 3102418377

ofesional Social Interventoría



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte



INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA

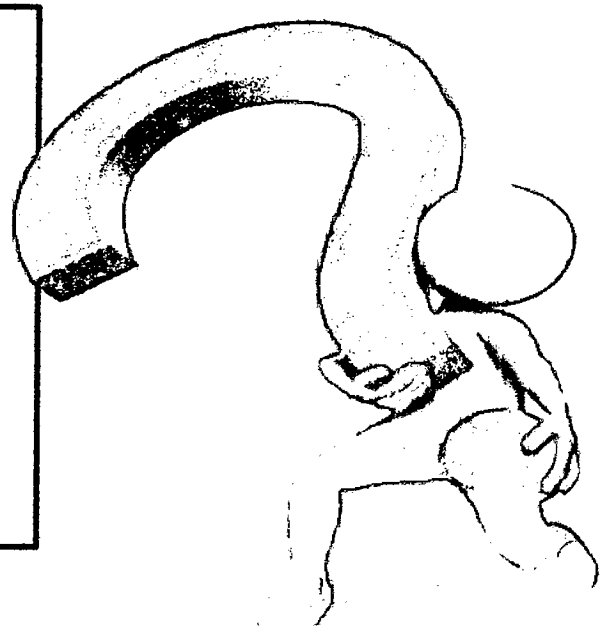

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Reunión de Inicio - Parque Carvajal	DD	MM	AA
ACTA No. 1		13	03	2023

LUGAR:	Parque Carvajal	HORA DE INICIO:	1:20 p. m.	HORA FIN:	2:30 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Liliana Barbosa	Supervisora del Contrato	IDRD
Olmer Sanchez	Inspector de Obra	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Profesional Social	Belzcon S.A.S.
Cristian Barahona	Residente de Interventoría	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Profesional Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación IDRD, Contratista e Interventoría.	5. Presentación componentes que intervienen en el proyecto.
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de mantenimiento para el Parque Carvajal.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2. Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar y como entidad contratante se presenta la representante de la subdirección de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. A continuación se realiza la presentación de la Interventoria a cargo del Consorcio Dispark, realiza su presentación el Residente Técnico de la Interventoría, el ingeniero Cristian Barahona, seguida de la profesional social para la Interventoría, la señora Marcela Marín. Se procede a dar la palabra a los profesionales del contratista; en primer lugar se presenta el ingeniero Olmer Sanchez, Director de Obra y la profesional social Paulina Garcia Mancipe, en representación del contratista Belzcon S.A.S.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022, que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y terminaran el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el día de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.

4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo el polígono que compone el Parque Carvajal, identificado con el código 08-014, el cual se encuentra localizado en la Carrera 72 N con Calle 358 B Sur.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, existen varias áreas del parque que presentan deterioro, por lo cual el contratista propuso el mejoramiento de las siguientes áreas las cuales fueron aprobadas por la Interventoria y el IDRD: desmonte de mobiliario urbano e instalación de bancas y canecas, mantenimiento del cerramiento contra impacto, dotación e instalación de gimnasio canino, mantenimiento de cancha de futbol, instalación de señalética.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la presentación de las áreas de apoyo que intervendrán para mitigar el impacto de la ejecución de las obras sobre la comunidad usuaria del parque.

Desde el componente ambiental se manciona que se hará disposición adecuada de los residuos de contrucción y demolición (RCD), que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon S.A.S estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán cametizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.

Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados polr Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.
A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la Interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto. Se indica a la comunidad que en el prque se instalará un pendón con los datos generales del contrato y las líneas de atención.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Las intervenciones por parte de la comunidad se enfocaron en los siguientes puntos e inquietudes:

1. la comunidad solicita instalar señalética para prevenir el desaseo causado por lospropietarios de mascotas.
Se indica que se instalará señalética, pero que el buen uso de las zonas verdes del parque corresponde a la cultura ciudadana y no puede ser regulada por el contratista.

2. Uno delos asistentes solicita la adecuación de baños, graderías y camerinos.
Se explica quepor tratarse de un contrato de mantenimiento, se mejorarán las áreas que ya existen, no se construirá nada nuevo en el parque.

3. Cuál será la duración de la obra?
Se iniciarán las actividades de preliminares y posterior a esto se dará inicio a las actividades constructivas.

4. La comunida aclara que el nombre del barrio es Carvajal III sector.

5. Se solicita la instalación de mallas contra impacto en la cancha de basquetbol y la reparación de las existentes enla cancha de futbol.
Se indica que se repararán las mallas existentes.

6. Se levantará el cesped de la cancha?
Se revisará segúnlas necesidades de nivelación de la cancha, que acciones se adelantarán.

7. Se invita a la comunidad a identificar y reportar las áreas en las que se presentan problemas de iluminación para reemplazar las bombillas averiadas.

8. Hay posibilidades de ampliar el plazo de ejecución?
No se tiene contempladopor el momento la ampliación delplazo, pero de requerirse se le informará al comité departicipación ciudadana.


9. Una de las asistentes solicita la revisión de un pino ubicado frente a su predio. Se indica que el área de intervención está supeditada a los límites del parque, pero que se invitará a algún representante de la alcaldía para dar atención a losrequerimientos que se encuentran fuera del alcance del contrato.

Se reitera la invitación a conformar el comité de participación y se da cierre a la reunión.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN**

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					

Siendo las 2:30 p.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**		
NOMBRE	Paulina García M.	**NOMBRE**		
CARGO	Profesional Social	**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina Garcia Mancipe

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

'O: Reunion Socialización de Inicio FECHA: 13 - 03 - 2023

INICIAL 1:30pm HORA FINAL 2:30.pm. LUGAR Parque Camajal

NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Rocío Anza	43		X			X		X	Comunidad	rocioanzazoe@gmail.com	3106953725	Rocío Anza
Andrés Neuta	37	X				X	X		Comunidad	andresneuta2929@gmail.com	3163590029	Andres Neuta
Cecilia Hurtado	66		X		X			X	Comunidad	No utiliza	3232131083	Cecilia Hurtado
Pedro Alfonzo Bustos	61	X				X		X	comunidad	pedrobustos1921@gmail.com	3124965223	
Ester Julia Avila Téllez	68		X			X		X	J. A. C.	esteravilaes@hotmail.com	3115152810	
Germán Barrera	65	X				X		X	J. A. C	maderasporfin@hotmail.com	3015639771	
Miguel Ángel Blanco	50	X				X		X	Comunidad	bene1972@ymail.com	3112465 1	
Edgar Orjuela	65	X			X			X	Presidente J. A. C.	acabadosorjuela@hotmail.com	3193255441	
[illegible]	42	X				X		X	[illegible]	[illegible]	3752299	
Marcela Marin Diaz			X			X		X	Interventoria	social.disparkyg@gmail.com	3102416577	
Oliver Sanchez C.	60	X				X		X	Belzcon Sas	osanchez.bcz@gmail.com	3213169112	
Liliana P. Barbosa	44		X			X		X	Prof IDRD	liliana.barbosa@gmail.com	3203409620	
Trinidad Mercedes Zapa	41		X			X		X	Asocial	tmzapa@gmail.com	3166179161	
Paulina Garcia	40		X			X		X	Belzcon	gpaulina2664@gmail.com	3135477264	

n la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

NOTA: los grupos étnicos son: Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS, V.1

Powered by CamScanner

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

PARQUE URBANIZACION LA LAGUNETA

06-005

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Belzcon
ción Propositivo

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

182

183



AGENDA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Saludo y Bienvenida

Presentación del Instituto de Recreación y Deporte, Contratista e Interventoría

Generalidades del contrato

Localización del proyecto

Componentes:

- Componente Técnico
- Componente Ambiental
- Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
- Componente Social

ntervención de la comunidad.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

183

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Supervisor del Contrato de Obra e Interventoría	Javier Orlando Suarez
Apoyo a la supervisión componente técnico	Liliana Paola Barbosa Barrera
Apoyo a la supervisión componente social	Luz Dary Legarda Claudia Corredor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

181

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.

Director de Obra	Olmer Sánchez
Residente de obra	Sergio Salgado
Especialista Social	Paulina García

INTERVENTORÍA CONSORCIO DISPARK

Director de Interventoría	Jairo Guevara
Residente de Interventoría	Cristian Barahona
Especialista Social	Marcela Marín

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NERALIDADES DEL CONTRATO No. 2664 - 2022

)NTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL
NTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN
SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES"

DURACIÓN DEL CONTRATO	**Siete (7) meses**
FECHA DE INICIO	**9 de noviembre de 2022**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**8 de junio de 2023**

Belzcon
ción Propositiva


INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

181

181

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

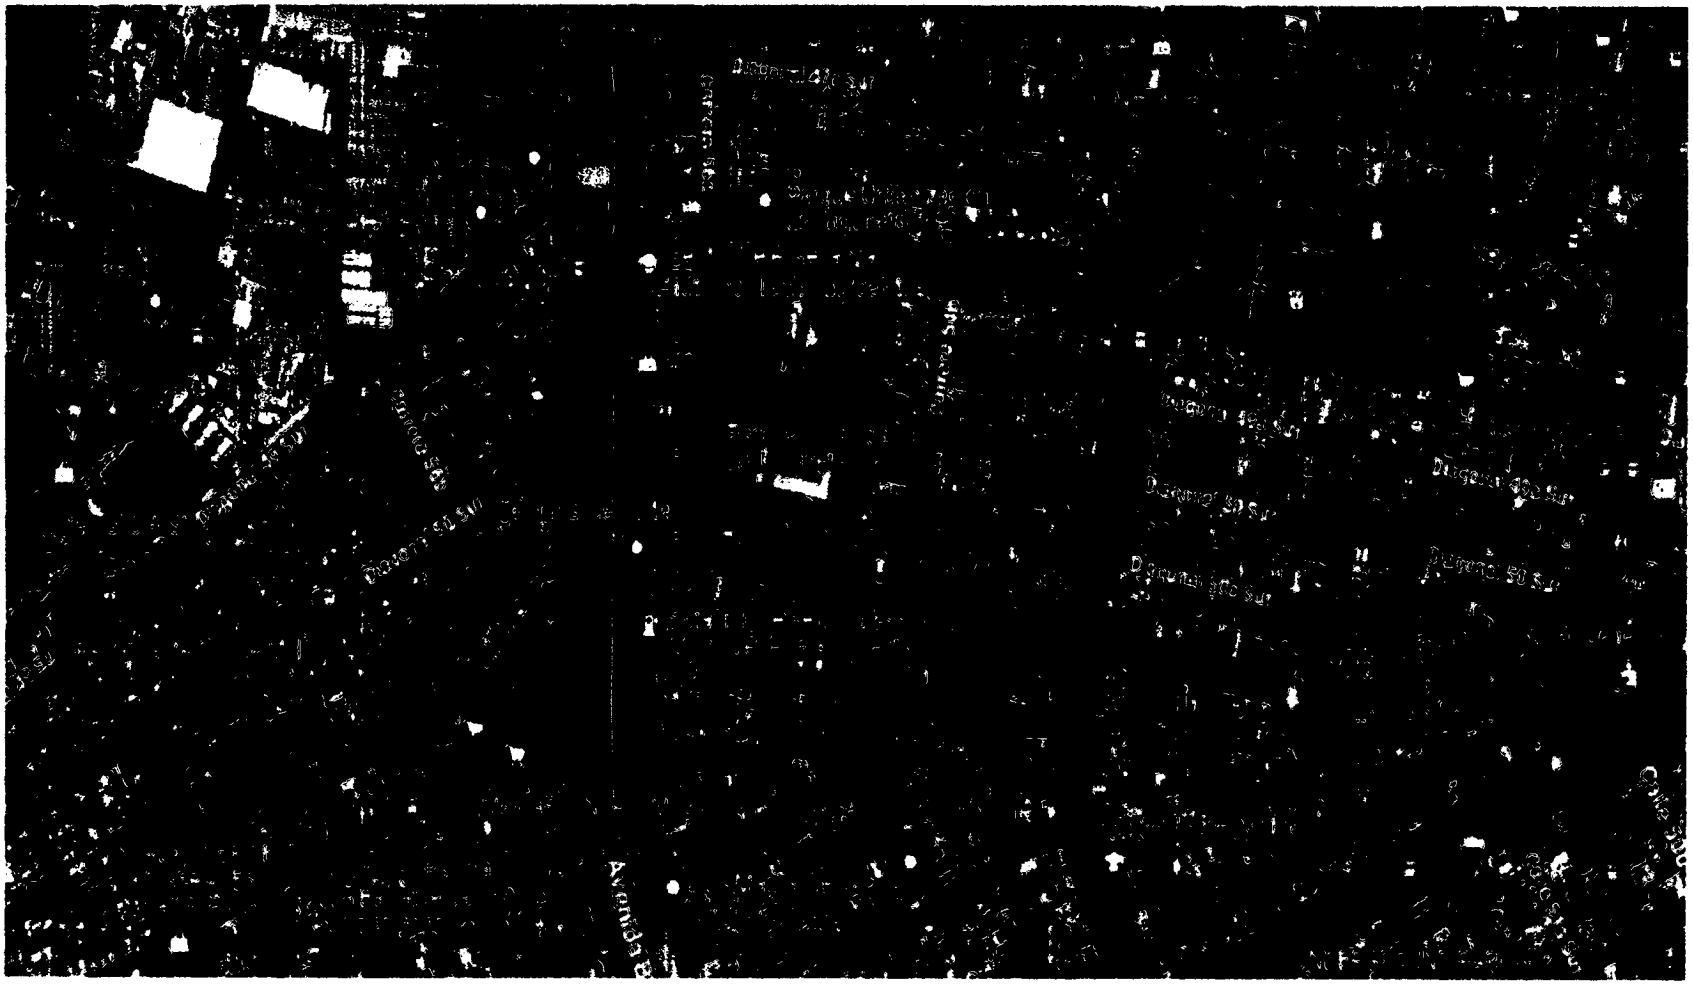

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

631





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RBANIZACION LA LAGUNETA 06-005	DIAGINAL 51 SUR # 55 A 08	LOCALIDAD: TUNJUELITO

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

881



COMPONENTE TÉCNICO


LA LAGUNETA
onstrucción de cancha múltiple
stalación de bancas y canecas
stalación de cerramiento contra impactos
stalación de señalética



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

COMPONENTE AMBIENTAL

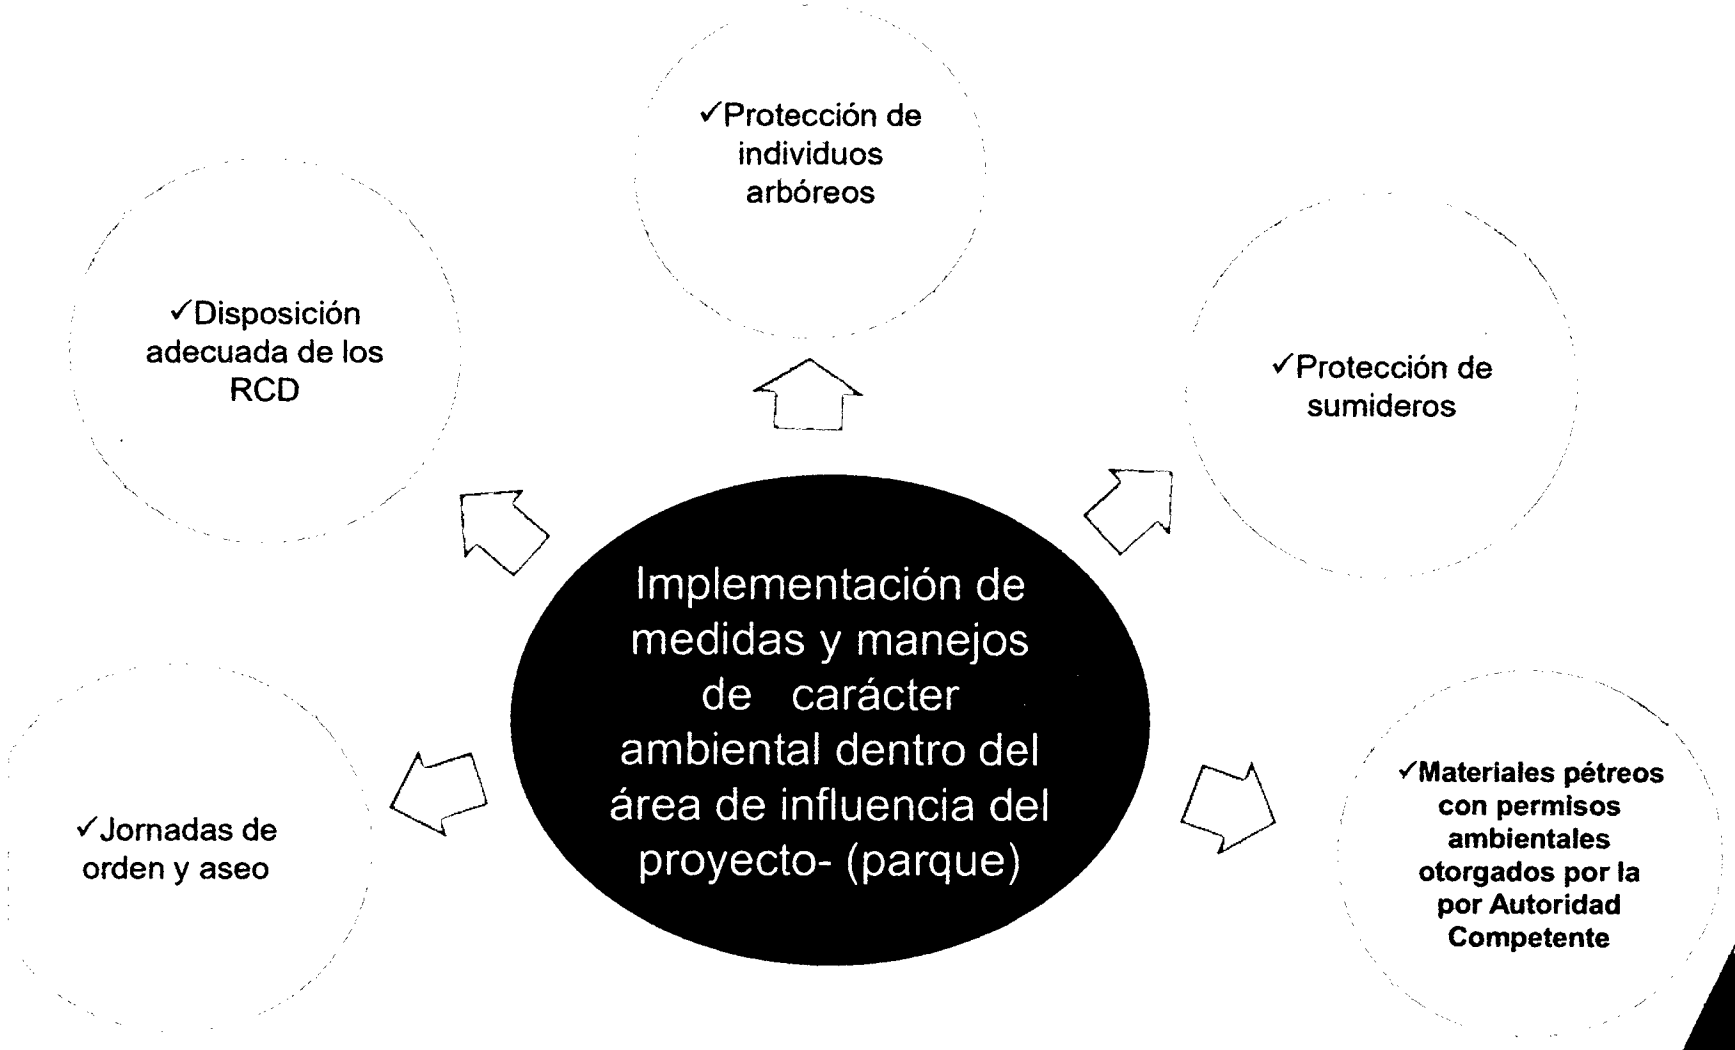


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

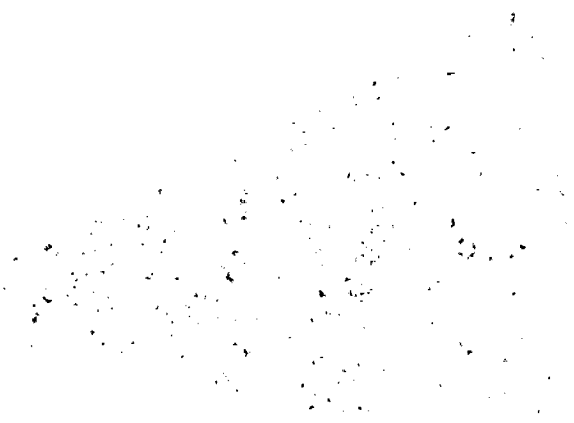

COMPONENTE SST

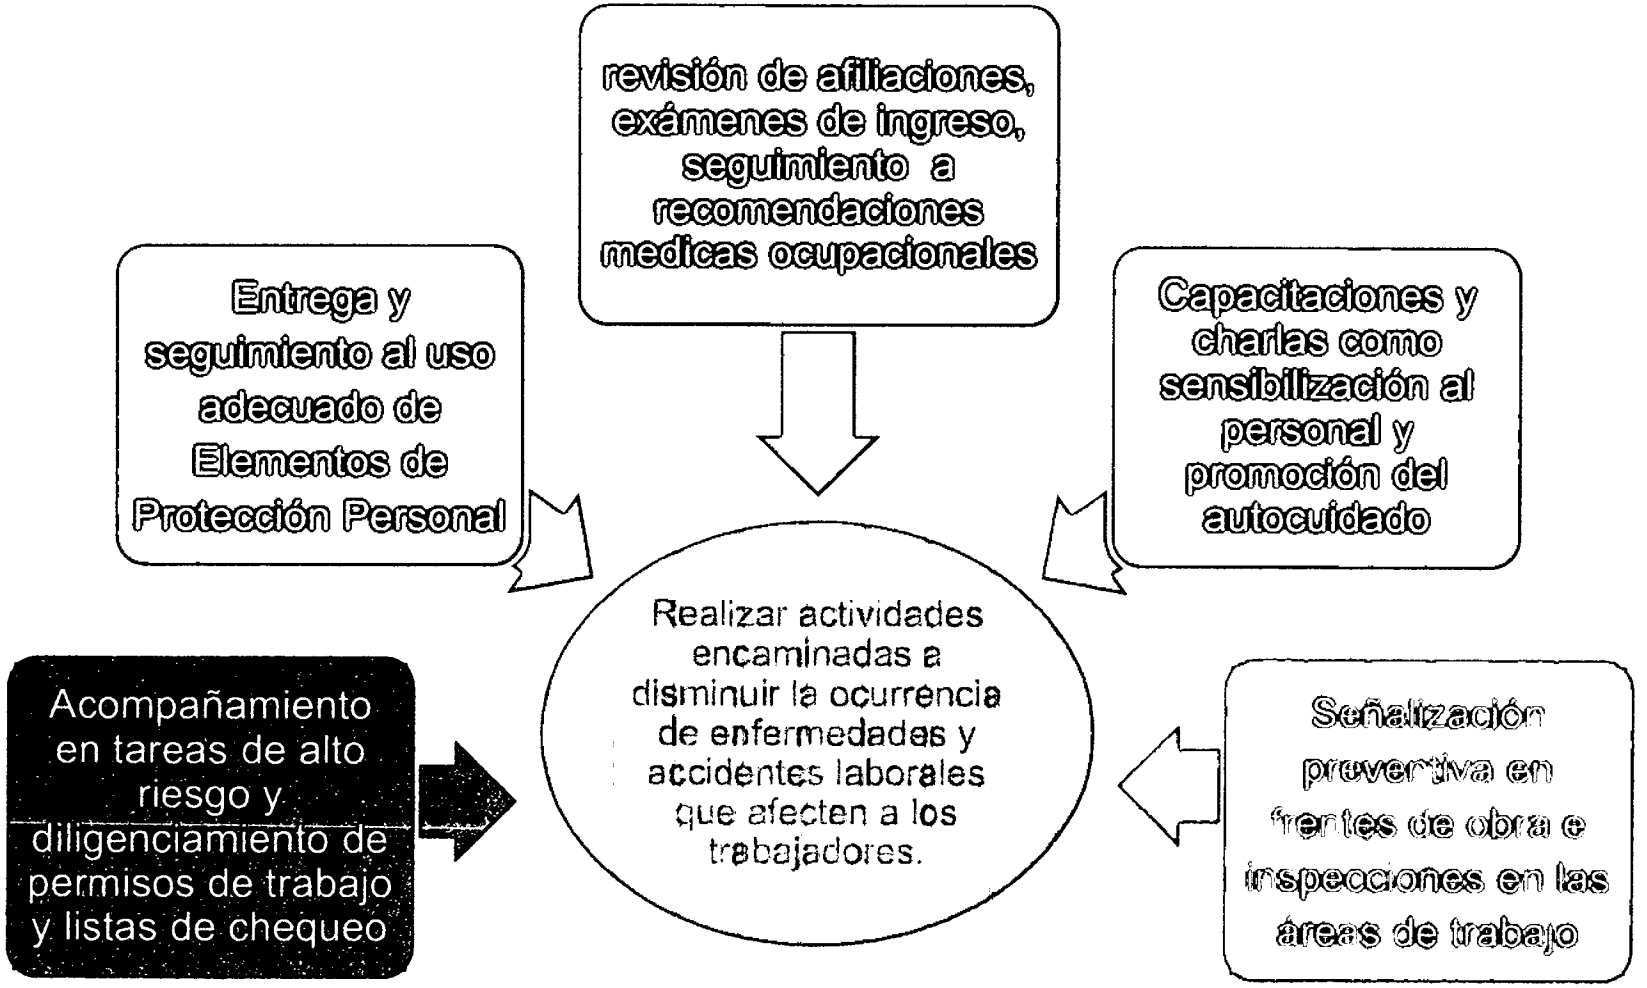

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte


191

191





COMPONENTE SOCIAL

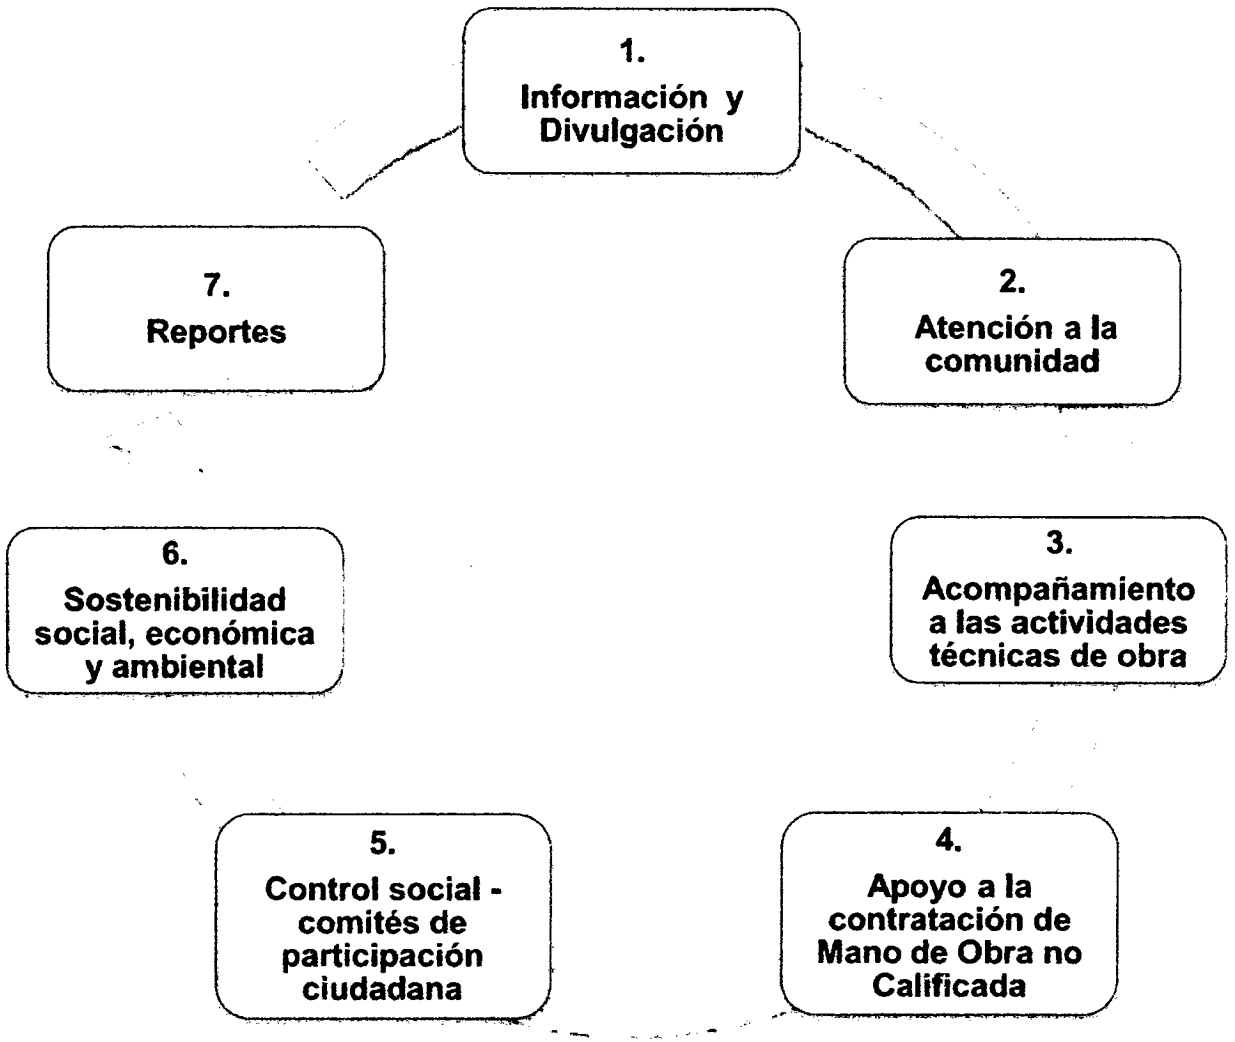

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

COMPONENTE SOCIAL

ención a la Comunidad:

aulina García Mancipe

ofesional Social Contratista

ención virtual al ciudadano


a y horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

léfono: 3213897064

orreo electrónico: gestionsocial2664.22@gmail.com

arcela Marín – Línea Whatsapp 3102418377

ofesional Social Interventoría



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte


193



INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RECUERDE CONSIGNAR SUS DATOS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA

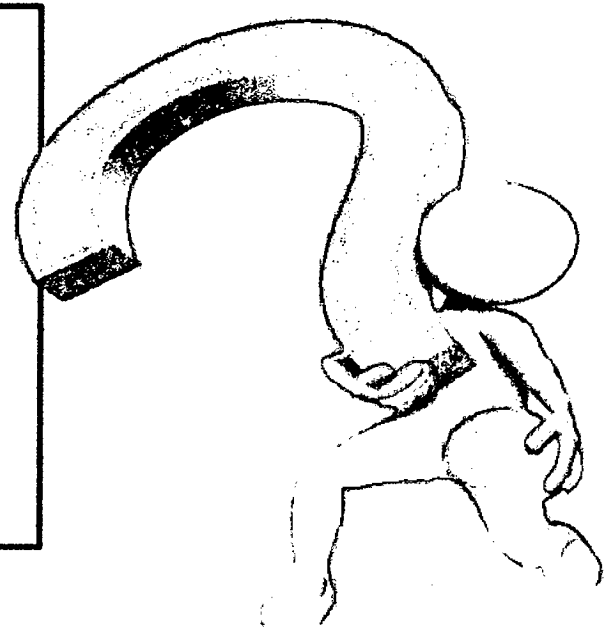

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

194



!!!GRACIAS POR SU ASISTENCIA¡¡

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte



BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.		DD	MM	AA
ACTA No. 1	**COMITÉ/REUNIÓN:** Reunión de inicio - Parque Urbanización La Laguneta	13	03	2023

LUGAR: Parque Urbanización La Laguneta **HORA DE INICIO:** 3:00 p. m. **HORA FIN:** 3:40 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Liliana Paola Barbosa Barrera	Representante	Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)
Olmer Sánchez	Director de Obra	Belzcon S.A.S.
Paulina García	Profesional Social	Belzcon S.A.S.
Cristian Barahona	Residente de Interventoría	Consorcio Dispark
Marcela Marín	Profesional Social	Consorcio Dispark

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Bienvenida	4. Localización del proyecto
2. Presentación IDRD, Contratista e Interventoría.	5. Presentación componentes que intervienen en el proyecto.
3. Generalidades del Contrato	6. Intervención de la comunidad

TEMAS TRATADOS

1. Se da inicio a la reunión de socialización de inicio de mantenimiento para el Parque Urbanización La Laguneta.

Se procede a dar lectura a la agenda la cual contiene los siguientes puntos: saludo y bienvenida, presentación de las partes que intervienen en la ejecución del contrato de obra, generalidades del contrato, localización del proyecto, componentes que intervienen en la ejecución del proyecto (técnico ambiental seguridad y salud en el trabajo y componente social) e intervención de la comunidad.

2.Se procede a dar inicio a la presentación de las partes que intervienen en el proyecto. En primer lugar, se presenta a nombre del contratista Belzcon S.A.S, la Residente social Paulina García Mancipe, la cual presenta y da la palabra a la Arquitecta Liliana Barbosa supervisora del área técnica de la subdirección de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. A continuación se realiza la presentación de la interventoria a cargo del Consorcio Dispark, quien tiene como residente al ingeniero Cristian Barahona, seguida de la residente social Marcela Marín. Por parte del contratista se presenta el diretor de obra, el ingeniero Olmer Sanchez.

3. En cuánto a las generalidades del contrato se informa a la comunidad sobre el desarrollo del contrato IDRD 2664 de 2022, que tiene como objeto realizar acciones de mantenimiento en diferentes parques ubicados en las localidades Tunjuelito, Bosa y Kennedy, teniendo una un plazo de ejecución de siete meses los cuales iniciaron el día 9 de noviembre de 2022 y terminaran el día 8 de junio de 2023. Se explica a los asistentes que una vez firmada el acta de inicio del proyecto se procedió a adelantar actividades de reconocimiento y diagnóstico de los parques priorizados, con el fin de determinar sus condiciones actuales y proponer las actividades de mantenimiento a desarrollar, las cuales fueron revisadas y avaladas por Interventoria y en IDRD y que con base en estas aprobaciones se da inicio a las actividades de obra, razón por la cual el dia de hoy se realiza el primer acercamiento con la comunidad informando del inicio de ejecución de actividades en campo.
4. Se realiza la presentación de la localización del proyecto, reconociendo la área que compone el Parque Urbanización La Laguneta identificado con código 06-005, el cual se encuentra localizado en la Diagonal 51 sur # 55a-08.

A continuación se da paso al componente técnico quien realiza la presentación de las actividades a ejecutar en este parque.

5. Se inicia informando que de acuerdo al diagnóstico elaborado, existen varias áreas del parque que presentan deterioro, por lo cual el contratista propuso el mejoramiento de las siguientes áreas las cuales fueron aprobadas por la Interventoria y el IDRD: en primer lugar se habla de la construcción de una cancha múltiple, así como el reemplazo de bancas y canecas que se encuentran deterioradas. En segundo lugar se habla de la instalación del cerramiento contra impactos y finalmente se indica sobre el montaje de las respectivas señaléticas.

TEMAS TRATADOS

Se realiza la presentación de las áreas de apoyo que intervendrán para mitigar el impacto de la ejecución de las obras sobre la comunidad usuaria del parque.

Desde el componente ambiental se manciona que se hará disposición adecuada de los residuos de contrucción y demolición (RCD), que se protegerán los sumideros ubicados en el área de influencia y se realizará la protección de los individuos arbóreos ubicados en el parque. Se realizarán jornadas de aseo para mantener el área intervención en óptimas condiciones. Lo que se busca es evitar que las demás áreas del que no serán intervenidas, cuenten con material disperso que pueda entorpecer el uso libre de las demás áreas del parque.

Desde el componente de seguridad y salud en el trabajo se habla de la entrega y seguimiento al uso adecuado elementos de protección personal. Se informa que todo el personal que laboren con Belzcon S.A.S estará identificado con sus correspondientes overoles o chalecos y estarán cametizados y que de acuerdo a las actividades de obra, no se tiene proyectado el ingreso de personal a las viviendas. Esto con el fin de generar condiciones de seguridad y confianza con la comunidad. Se adelantará el acompañamiento en las tareas que se realicen diariamente para minimizar el riesgo de incidentes o accidentes. El personal que labora en el proyecto contará con sus afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Se realizarán charlas y capacitaciones al personal de obra para la promoción del autocuidado y se instalará señalización preventiva en las áreas de obra, para indicar a la comunidad que no debe ingresar a las áreas que se encuentren delimitadas con polisombra. Como recomendación, se pide a la comunidad abstenerse de abrir créditos a los trabajadores de obra por alimentos o materiales, pues Belzcon S.A.S. no será responsable por las deudas que queden sin cancelar una vez el personal se retire del área. Igualmente se solicita la comunidad no establecer contratos para realizar actividades al interior de los predios con el personal de obra, pues en caso tal de qué se generen afectaciones por estas actividades, el contratista no se hará responsable de este tipo de situaciones.

Finalmente, el componente social se indica los programas que se ejecutarán con el fin de establecer enlaces entre la comunidad y la entidad. Desde el programa de información y divulgación se indica que se realizarán reuniones a fin de informar a la comunidad sobre el inicio y finalización de las actividades de obra. Toda actividad que se realice desde el proyecto será informada a la comunidad por medio de volantes informativos distribuidos predio a predio. Desde el programa de atención a la ciudadanía se habla de los canales habilitados potr Belzcon S.A.S. para la atención de inquietudes reclamaciones quejas o peticiones que se deriven de la ejecución del proyecto. Por el programa de acompañamiento actividades técnicas se informa que se realizará el levantamiento de actas preliminares en caso de ser necesario, en las que se determinen las condiciones actuales del parque, con el fin de contar con un registro inicial del área intervenir. Igualmente se realizará un registro de las vías y espacio público aledaño y de presentarse alguna afectación a los mismos este servirá como soporte comparativo para establecer la responsabilidad del contratista. Para el levantamiento de estos registros se requerirá el acompañamiento de la junta de acción comunal o líderes del sector. Desde el programa de control y participación ciudadana se invita a los participantes a la reunión de inicio, a conformar un comité social de control y participación, con el cual se desarrollarán reuniones periódicas en las que se informará sobre el avance del proyecto, a fin de qué esta información sea multiplicada a la comunidad por medio de sus líderes. Se solicita a las personas interesadas en participar, que finalizando la reunión se acerquen al equipo de gestión social con el fin de brindar sus datos para la inscripción. Desde el programa de sostenibilidad social económica y ambiental el contratista realizará la entrega de herramientas que sirvan a la comunidad para el cuidado de los elementos entregados con el fin de prolongar su vida útil y poder disfrutar de estos espacios por más tiempo. Finalmente se solicita la comunidad su colaboración con el componente social en cuanto a la firma de registros en campo de las diferentes actividades que se desarrollan, dado que estas sirven como soporte para evidenciar los diferentes ejercicios adelantados con la comunidad beneficiaria del proyecto.
A continuación se socializan las líneas de atención al ciudadano: en primer lugar la línea telefónica número 321-389-7064 y el correo electrónico gestionsocial2664.22@gmail.com, los cuales corresponden a las líneas de atención dispuestas por el contratista para la atención de la comunidad. Por parte de la Interventoria, la profesional Marcela Marín cuenta con la línea de atención 310 241 8377, a la cual también se podrá comunicar la comunidad para reportar sus inquietudes frente a la ejecución del proyecto.

Del mismo modo, las especialistas sociales tanto del contratista como de la interventoría, informan que en el parque será instalado un pendón en donde se dispondrá la información correspondiente a las líneas de atención para canalizar las inquietudes de la comunidad.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Las intervenciones por parte de la comunidad se enfocaron en los siguientes puntos e inquietudes:

1. La comunidad manifiesta si habrá seguridad en el parque durante la ejecución de las obras?
Se le indica por parte de la profesional social del contratista que el parque no tendrá seguridad en ese sentido a excepción de que se dejé maquinaria en horas de la noche.

2. Una de la participantes consulta sobre si se modificará o se organizará el exterior del parque?
Frente a la inquietud, la arquitecta Liliana Barbosa del IDRD, explica que dentro de las especificaciones técnicas del contrato no se encuentra ese ítem solicitado, además de no ser competencia del IDRD, por lo que instó a la comunidad a realizar las gestiones pertienentes ante las dependencias encargadas para la respectiva proyección y ejecución de dichas adecuaciones.


Se solicita a la comunidad reportar sobre el estado de las luminarias de las canchas sintéticas, las cuales fueron robadas y recuperadas.

Se finalizó encuentro dando las gracias a todos los participantes y relterando la invtación a conformar el comité de participación.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN**
N/A	N/A	N/A

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**		
Observaciones					
Ninguna					

Siendo las ____03:40 pm_____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**		
NOMBRE	Paulina García M.	**NOMBRE**		
CARGO	Residente Social	**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Paulina Garcia

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

TO: Reunión Socialización Reunión Inicio FECHA: 13 - 03 - 2023

L INICIAL 3:00 pm HORA FINAL _____ LUGAR Parque La Laguneta

NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Democrito Diaz	78	X			X			X	Comunidad		3005668923	
Mercedes Angel	74		X			X		X	Comunidad	No utiliza	3133209801	
Rita Gordillo	62		X			X		X	Comunidad	rita.gordillo@yahoo.com	3153902224	
Susana Zamora Pulido	73		X		X			X	Comunidad	susanazamorap1950@gmail.com	3156972305	
Laura Amaya	29		X			X		X	Comunidad	lauramag19@gmail.com	3163265680	
Rachel Garcia	39	X				X			Ad. JAC.		3156918190	
Trinidad Mercedes Zono T	41		X			X		X	Apoyo social	trozorro@gmail.com	3166191854	
[illegible]	42	X				X		X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Marcela Marin Diaz			X			X		X	Interventoria	social.disparkg42@gmail.com	3102418379	
Liliana P. Barbosa	44		X			X		X	Profesional IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3203409620	
Oliver Sanchez	60	X				X		X	Portero Sur	osanchez.bye@gmail.com	3213665112	
Paulina Garcia	40		X			X		X	Parkson	[illegible]	[illegible]	

n la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS. V.1

Powered by CamScanner

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE MANTENIMIENTO

ıRQUE DESARROLLO GRAN COLOMBIANO 1 SECTOR URBANIZACION CIUDADELA ROBERTO PACHON

07-080

IDRD
Subdirección Técnica de Parques

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Belzcon
ción Propositiva

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

202

19

