
"CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"

CONSORCIO GAMER SOACHA

INFORME TÉCNICO N° 04
16 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 ENERO 2023

CUADRO DE CONTROL REVISIONES

ÀREA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
		Técnica	Interventoría
Cargo	Arq. Área técnica	Director de Obra	Director de Interventoría
Nombre	Arq. Nubia Rivera	Ing. Milton Rivera	Ing. Edgar Uribe
Firma			

CONTROL DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00		Versión inicial
		Versión final

220

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO DE CONTROL REVISIONES 1

1. INTRODUCCION 3

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 4

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022 4
2.2 GENERALIDADES 5
3. OBJETIVOS 6

4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 6

2.1 LOCALIZACIÓN 6
5. COMPONENETE ADMINISTRATIVO 8

6. POLIZAS DEL CONTRATO 8

7. CAPITULO FINANCIERO 10

8. VIAS ASIGNADAS 11

9. ACTIVIDADES REALIZADAS 13

9. CORRESPONDENCIA ENVIADA 36

10. CONCLUSIONES 40

11. ANEXOS 41

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 .Localizacion 4
Ilustración 2.Localizacion general 6
Ilustración 3. Localización Cazuca 6

1. INTRODUCCION

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales de un país y refleja el estado del Progreso de una sociedad; visto así, como un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos.

El trabajo tiene una función constructora de individualidad para su desenvolvimiento físico, social, cultural y se relaciona estrechamente con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la salud, circunstancia que lleva a la pérdida de la capacidad laboral y por tanto repercute también en el desarrollo socioeconómico de un país.

La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores, quiénes con su compromiso de gestión de autocuidado en salud y de y con el firme apoyo de la organización actuarán contra los peligros y riesgos laborales en busca de prevención de incidentes, accidentes y de enfermedades de en el ámbito laboral.

El consorcio Gamer Soacha, reconoce el talento humano como su recurso más valioso, entendiendo que la seguridad y la salud en el trabajo es una condición necesaria, para el bienestar de sus trabajadores y la productividad. Por lo tanto realizará acciones para promover preservar y mejorar las condiciones del ambiente laboral la salud de los trabajadores de las personas que intervienen en la ejecución de los procesos productivos

2. INFORMACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 024-2022

El contrato de obra 024-2022 celebrado entre la empresa pública de municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E y El consorcio Gamer Soacha se deriva del contrato interadministrativo 3443-2021, a continuación información relevante del contrato obra.

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO GAMER SOACHA**
NO. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**3443-2021**
TIPO DE PROCESO	DE OBRA PÚBLICA
NO. CONTRATO	024 DE 2022
OBJETO:	"CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LAS VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	NIT 901.537.901-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO RIVERA RODRIGUEZ 79.947.081
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATÓ	04 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO 2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES 11 meses
PRÓRROGA	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO 2023 31 Mayo 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

23

	OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.506.567.898,67) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS, GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN A LA CELEBRACION,EJECICIÓN.
VALOR ADICIÓN	No Aplica
MODIFICATORIO 1	MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO DEBIDO A INCLUCION DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS	11 DE OCTUBRE DE 2022

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

2.2 GENERALIDADES

El proyecto de obra está ubicado en el municipio de Soacha en la Comuna 4-Casuca donde gran parte de las vías de esta comuna están sin pavimentar y se accede desde el norte Quintanares (calle 48) y La Zona Industrial de Cazucá (calle 56), por el oeste por Terreros (Avenida Terreros) y por el oriente desde la localidad bogotana de Ciudad Bolívar a través de la frontera entre los barrios Balcanes-La Estancia (intersección calle 61 Soacha con la calle 59 Sur Bogotá), Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro-El Espino (Calles 60 y 61 Soacha/Carrera 77C Bogotá) finalizando en el barrio Santo Domingo y Los Robles-Caracolí (Calle 41 y 42 Soacha/Calles 76A y 77 Sur Bogotá).

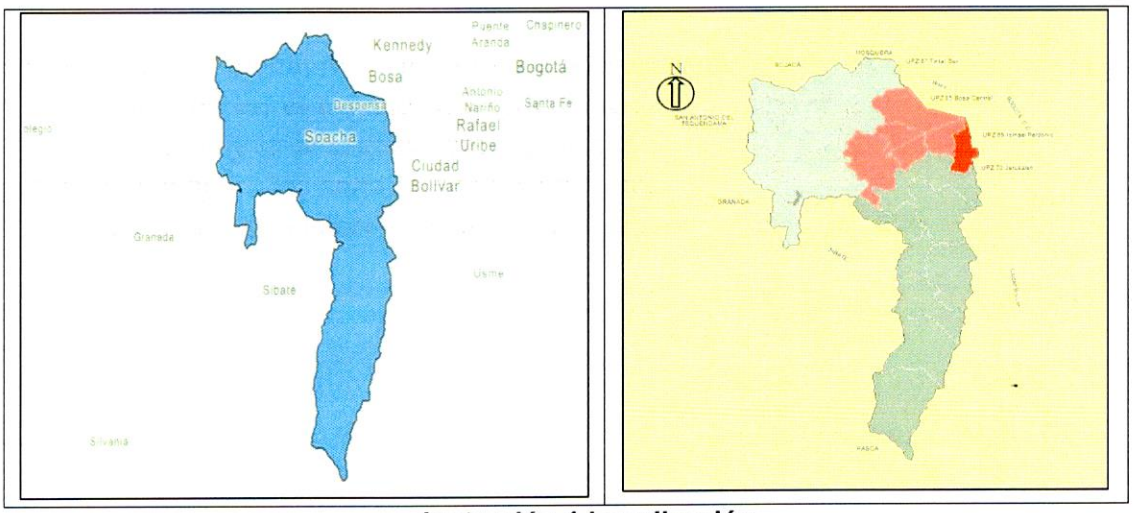


Ilustración 1.Localización

Fuente: https://ider.cundinamarca.gov.co/maps/a0a93737419a4789a38e87d898bc263f

224

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de obra 024 del 4 de Mayo de 2022 que es " **CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"** donde se describen la ejecución de las actividades de rehabilitación del proyecto a ejecutar, estas actividades se determinan mediante la evaluación del estado actual de la vía a intervenir, basados en los diagnósticos y diseños entregados por Epuxua y la secretaría de infraestructura de la Alcaldía del municipio de Soacha.

En el presente Informe Técnico No 04, durante al periodo comprendido entre 16 de diciembre de 2022 al 30 de enero 2023, se resume la información relevante al avance en el periodo en reporte y a la vez se da alcance como soporte del acta N° 4 del contrato de obra 024-2022, la Información general del proyecto (la localización y descripción de las obras), las actividades ejecutadas por el CONSORCIO GAMER SOACHA, el personal, certificados de calidad de los materiales, consolidación del avance físico y financiero del contrato de obra CTO 024-2022.

3. OBJETIVOS

Informar sobre las diferentes actividades adelantadas por el consorcio Gamer Soacha desarrolló en el período de diciembre a enero relevantes a la ejecución del contrato 024 de 2022 cuyo objeto "Construcción rehabilitación de las vías de obras de urbanismo en diferentes sectores del municipio de Soacha Cundinamarca".


4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El área en el que se desarrollara el **CONTRATO DE OBRA No 024-2022**, ejecutado por el **CONSORCIO GAMER SOACHA** que tiene por objeto "**CONSTRUCCION REHABILITACIÓN DE LA VIAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA".** El proyecto se encuentra localizado en el Municipio Soacha que es el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² (kilómetros cuadrados), y su población es de 660 179 (2018).2 Su área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo forman parte dos municipios: Soacha y Sibaté.



Lustración 2.Localización General

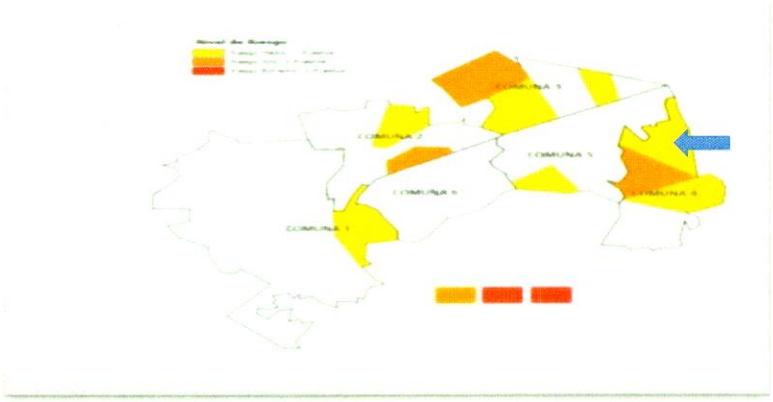

Lustración 3.Localización Cazuca
CAZUCA COMUNA 4.

BARRIÓ SANTO DOMINGO

Fuente: Google

La Comuna 4 de Soacha, es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del asentamiento popular y orográfico, Altos de Cazucá. Tienen 69 350 habitantes, es una zona de extrema vulnerabilidad social y cuenta con las siguientes vías de acceso.

Vías de Acceso a la comuna 4 - Cazuca

- Calle 48 (Cazucá)
- Transversal 9 este - Carrera 1 (Julio Rincón - Cazucá)

- Avenida Terreros (Calle 38)
- Calles 41 y 42 (El Oasis - Los Robles - Caracolí)
- Transversal 33 Este / Diagonal 40 I (Los Pinos - Rincón del Lago - La Isla)
- Carrera 39 Este.

5. COMPONENETE ADMINISTRATIVO

En el presente informe se presenta la descripción de las actividades constructivas, administrativas y presupuestales, lo cual se desarrolló a cabalidad para la entidad contratante que es la Epuxua Avanza E.I.C.E la empresa pública del municipio de Soacha.

Dando claridad que el contrato en mención se le dio inicio el 01 de agosto del 2022 y a su vez dando alcance a lo requerido contractualmente para el buen desarrollo y ejecución del contrato, se cuenta con el personal administrativo cumpliendo con lo requerido contractualmente.

Tabla 1. Personal CTO 024-2022

PERSONAL CONTRATO DE OBRA No 024 DE 2022 CONSORCIO GAMER SOACHA.

NOMBRE	*CARGO*	*DEDICACIÓN*	*CORREO ELECTRÓNICO*
MILTON EDUARDO RIVERA RINCON.	*DIRECTOR DE OBRA*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
ILMER ENRIQUE POLO CARMONA	*RESIDENTE DE OBRA*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
NUBIA CONSUELO RIVERA RINCON	*INSPECTOR 1*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
SERGIO DARIO TORRES RIVERA	*INSPECTOR 2*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
DEICY LORENA BELLO RIVERA	*PROFESIONAL HSEQ*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*
CATHERINE MUÑOZ MANCIPE	*TOPOGRAFO*	*100 %*	*consorciogamer024@gmail.com*

6. POLIZAS DEL CONTRATO

A la fecha contamos con las siguientes pólizas del contrato, verificadas por la interventoría Cocosering SAS y aprobadas por la empresa pública del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E.

Tabla 2. Pólizas

Anexo 0 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	02/05/2022	02/11/2022

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	02/05/2022	02/11/2027
Coberturas	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	02/05/2022	02/05/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.		$450.656.789,87	02/05/2022	02/11/2025
	Estabilidad de la obra.		$1.351.970.369,60	02/11/2022	02/11/2027

Anexo 2 (Póliza de responsabilidad civil extracontractual y Póliza de cumplimiento)

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-40-101008792	Seguros del estado S.A	$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023
Coberturas	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		$901.313.579,73	01/08/2022	01/02/2023

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales	62-45-101021351	Seguros del estado S.A	$2.703.940.739,2	01/08/2022	02/02/2028
	Cumplimiento del contrato		$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023

Coberturas	Cumplimiento del contrato	$901.313.579,73	01/08/2022	01/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$450.656.789,87	01/08/2022	01/02/2026
	Estabilidad de la obra.	$1.351.970.369,60	01/02/2023	02/11/2028

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

7. CAPITULO FINANCIERO

El valor del contrato es CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE SENTAVOS (4.506.567.898,67) MCTE INCLUIDO IVA , COSTOS , GASTOS Y DEMAS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN CON OCASIÓN DE LA CELEBRACION EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO .

Tabla 3. Avance de financiero

AVANCE FINANCIERO CONTARTO DE OBRA024-2022	
Valor total del contrato de Obra	$ 4.506.567.898,67
Acta por cobrar No. 1	$ 649.376.068,00
Acta por cobrar No. 2	$ 727.213.483,00
Acta por cobrar No. 3	$ 1.003.532.431,00
Acta por cobrar No. 4	$ 451.030.346
Saldo Actual	$ 1.675.415.530,67
Avance ejecutado financiero	62,82%

8. VIAS ASIGNADAS

El municipio de Soacha se presenta un déficit alto en infraestructura vial, siendo esta una de las principales problemáticas en la Comuna 4 Cazuca.

Con relación a la movilidad vehicular en el municipio no existe conexión directa entre las diferentes comunas a excepción del trazado de la denominada Autopista sur, siendo esta también un inconveniente en la comunicación entre los sectores o las comunas ubicadas en el norte y el sur. La mayoría de las vías locales no tienen continuidad y solamente tienen conexión con la Autopista por cuatro vías. En los barrios ubicados en Altos de Cazucá, no es posible identificar corredores viales específicos, teniendo en cuenta la crítica topografía de la zona.

- **Inventario de vías Comuna 4.**

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura vial existente en la comuna 4 Cazuca se relacionan a continuación las vías en intervención asignadas desde la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E y La Secretaría de infraestructura:

Los sistemas implementados en las vías durante este periodo en reporte son ejecutados con base y lineamiento de la empresa Pública Epuxua Avanza E.I.C.E y los diseños son entregados por la secretaría de infraestructura previa aprobación y aceptación de los interesados, Epuxua en calidad de gerenciamiento del contrato, el contratista de obra en calidad de ejecutor e interventoría en calidad de supervisor mancomunada con la empresa pública del municipio Soacha Epuxua.

A corte del acta N° 4 en reporte, se relaciona las vías en intervención.

Tabla 4. Vías en intervención

VIAS ENTREGADAS EN SANTO DOMINGO	
1	KRA 32A ESTE CALLE 59 Y CALLE 54
2	KRA 32A ESTE CALLE 54 Y CALLE 53
3	KRA 32A ESTE CALLE 53 Y CALLE 50
4	KRA 32A ESTE CALLE 50 Y CALLE 48
5	KRA 32A ESTE CALLE 48 Y CALLE 44
6	CALLE 53 KRA 32A ESTE Y KRA 32 ESTE
7	KRA 32 ESTE CALLE 53 Y CALLE 54
8	CALLE 50 KRA 32A ESTE Y KRA 31 ESTE
9	CALLE 48 KRA 32A ESTE Y KRA 32 ESTE
10	CALLE 48 KRA 32 ESTE Y KRA 31 ESTE
11	TRANSV 35 ESTE DG 44B Y DG 44A
12	TRANSV 35 ESTE DG 44A Y DG 43J
13	DG 44A TRANSV 35 ESTE Y KRA 37 ESTE
14	KRA 37 ESTE DG 43J Y DG 44A

15	KRA 37 ESTE DG 44A Y DG 44B
16	TRANS 34 ESTE DG 44A Y DG 44B
17	TRANS 34 ESTE DG 44A Y DG 43J
18	DG 44A TRANS 34 ESTE Y KRA 33A ESTE
19	KRA 28 ESTE CALLE 56A Y CALLE 59
20	KRA 32 ESTE CALLE 44 Y CALLE 48
VIAS PARA ASFALTO EN SANTO DOMINGO	
21	KRA 33A ESTE DG 43J Y DG 44A
22	KRA 33A ESTE DG 44A Y TRANSV 34 ESTE
23	KRA 33A ESTE TRANSV 34 ESTE TRANSV 35 ESTE
24	KRA 33A ESTE TRANSV 34 ESTE Y CALLE 59
25	KRA 33 ESTE CALLE 43J Y CALLE 44
26	KRA 33 ESTE CALLE 44 Y CALLE 53
27	KRA 33 ESTE CALLE 53 Y CALLE 59
VIAS ENTREGADAS EN LUIS CARLOS GALAN II	
21	CALLE 48 KRA 30 ESTE Y KRA 31 ESTE
22	KRA 30 ESTE CALLE 44 Y CALLE 48
23	KRA 30 ESTE CALLE 48 Y CALLE 53
24	CALLE 53 KRA 30 ESTE Y KRA 29 ESTE
25	KRA 30 ESTE CALLE 44 Y CALLE 43F
26	KRA 30 ESTE CALLE 44 Y CALLE 43F
27	CALLE 43F KRA 30 ESTE Y KRA 28 ESTE
28	CALLE 43F KRA 28 ESTE Y KRA 27F ESTE
29	CALLE 43F KRA 27F ESTE Y KRA 27D ESTE
30	CALLE 43F KRA 27D ESTE Y KRA 27B ESTE
31	KRA 28 ESTE CALLE 43F
32	KRA 27F ESTE CALLE 44 Y CALLE 43F
33	KRA 27F ESTE CALLE 43F Y CALLE 43D
34	KRA 27F ESTE CALLE 43D Y CALLE 43C
35	KRA 27F ESTE CALLE 43C Y CALLE 43B
36	CALLE 43C KRA 27F ESTE Y KRA 27D ESTE
37	CALLE 43D KRA 27F ESTE Y KRA 27D ESTE
38	KRA 27D ESTE CALLE 43D Y CALLE 43F
39	KRA 27D ESTE CALLE 43F Y CALLE 44
40	KRA 27 ESTE CALLE 43D Y CALLE 43F
41	CALLE 43D KRA 27 ESTE
42	KRA 27D ESTE CALLE 44 Y CALLE 50
43	CALLE 51 KRA 27D ESTE Y KRA 27 ESTE
44	KRA 27 ESTE CALLE 53 Y CALLE 51
VIAS ENTREGADAS EN VILLAS DE CASA LOMA	

40	KRA 17 ESTE CALLE 60A Y CALLE 61
41	KRA 17A ESTE CALLE 60A Y CALLE 61
42	KRA 17B ESTE CALLE 60A Y CALLE 61
VIAS EN LUIS CARLOS GALAN 1	
6	CALLE 56B Y KRAS 27 Y 27A ESTE
7	KRA 24B ESTE CALLE 59 Y CALLE 60
8	KRA 26A ESTE CALLE 59 Y CALLE 61
9	KRA 26B ESTE CALLE 59 Y CALLE 56A
10	KRA 26C ESTE CALLE 56A Y CALLE 57
11	KRA 26C ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
12	KRA 27A ESTE CALLE 56A Y CALLE 57
13	KRA 27A ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
14	KRA 24B ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
15	KRA 26C ESTE CALLE 53 Y CALLE 53A
16	KRA 26C ESTE CALLE 53A Y CALLE 55
17	KRA 26A ESTE CALLE 56B Y CALLE 58
18	KRA 26A ESTE CALLE 58 Y CALLE 59
19	CALLE 56B KRAS 26 ESTE Y 26A ESTE
20	KRA 26 ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
21	CALLE 57 KRAS 26C ESTE Y 26B ESTE
22	CALLE 58 KRAS 26A ESTE Y 26B ESTE
23	KRA 26 ESTE CALLE 59 Y CALLE 61
24	KRA 25 ESTE CALLE 59 Y CALLE 61
25	KRA 25 ESTE CALLE 57 Y CALLE 59
26	KRA 24 ESTE CALLE 59 Y CALLE 60
27	KRA 24 ESTE CALLE 60 Y CALLE 61
28	KRA 24 ESTE CALLE 59 Y CALLE 58A
29	KRA 24 ESTE CALLE 58A Y CALLE 58
30	KRA 24 ESTE CALLE 58 Y CALLE 57
31	CALLE 56A KRAS 27 ESTE Y 26C ESTE
32	CALLE 56A KRAS 26C ESTE Y 26B ESTE
33	CALLE 56A KRAS 26B ESTE Y 26 ESTE
34	CALLE 53A KRAS 26C ESTE Y 26 ESTE

Fuente: COCOSERIN SAS

9. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha realizado la intervención de las vías que han sido entregadas por la entidad en cuanto a Topografía y Diseños de las mismas. Se hace la salvedad que siendo este un contrato monto agotable su porcentaje de ejecución va relacionado

directamente con las vías u obras entregadas e intervenidas en la Comuna 4, priorizadas por la empresa Epuxua Avanza E.I.C.E.

Durante el periodo del presente informe se realizó actividades constructivas en los barrios Santo Domingo, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán I y Villas de Casa Loma, relacionadas a continuación con las respectivas vías intervenidas


- CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 61 Y CALLE 59.
- CRA 24B ESTE ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59.
- CRA 26C ESTE ENTRE CALLES 53A Y CALLE 55.
- CRA 26 A ESTE ENTRE CALLE 56B Y CALLE 59.
- CRA 26B ESTE ENTRE CALLE 56A Y CALLE 59.
- EXCAVACION CALLE 56B KRA 26A ESTE Y KRA 26 ESTE.
- EXCAVACION CALLE 56B KRA 27 ESTE Y KRA 27A ESTE.
- EXCAVACION CALLE 57 KRA 26C ESTE Y KRA 26B ESTE.
- EXCAVACION CALLE 58 KRA 26B ESTE Y KRA 26A ESTE.
- EXCAVACION CALLE 53A KRA 26C ESTE Y KRA 26 ESTE.
- EXCAVACION CALLE 56A KRA 26 ESTE Y KRA 27 ESTE.
- EXCAVACION KRA 24 ESTE CALLE 56A Y CALLE 59.
- EXCAVACION KRA 24 ESTE CALLE 59 Y CALLE 61.
- EXCAVACION KRA 24B ESTE CALLE 59 Y CALLE 60.
- EXCAVACION KRA 25 ESTE CALLE 57 Y CALLE 59.
- EXCAVACION KRA 25 ESTE CALLE 59 Y CALLE 61.
- EXCAVACION KRA 25 ESTE CALLE 59 Y CALLE 61.
- EXCAVACION KRA 26A ESTE CALLE 56B Y CALLE 59.
- EXCAVACION KRA 26A ESTE CALLE 59 Y CALLE 61.
- EXCAVACION KRA 26B ESTE CALLE 56A Y CALLE 59.
- EXCAVACION KRA 26C ESTE CALLE 56A Y CALLE 59.
- EXCAVACION KRA 27A ESTE CALLE 56A Y CALLE 59.
- EXCAVACION KRA 24B ESTE CALLE 57 Y CALLE 59.
- EXCAVACION KRA 26 ESTE CALLE 59 Y CALLE 57.
- EXCAVACION KRA 26C ESTE CALLES 53 A 55.

ACTIVIDADES DE OBRA EN REPORTE DEL ACTA N° 4

- Localización y replanteo de vías


1. CALLE 53A 26C-26.
2. CALLE 55 CRA 26C-27.
3. CALLE 55 ENTRE 26 -26C.
4. CALLE 56A ENTRE 27-26.
5. CALLE 26C ENTRE 55-56 A.
6. CALLE 56B ENTRE 25AA 26.
7. CALLE 26 ESTE ENTRE 59 51.
8. CALLE 58B CRA 26B -26 A.
9. CALLE 26B ESTE 59-61.
10. CALLE 26A ENTRE 59.-51.

11. CRA 27CON CALLE 53- 51.
12. CALLE 51 ENTRE 27D 27.
13. CRA 27D ENTRE 50-44.
14. CRA 24B ENTRE 57-59.
15. CALLE 57 CRA 26- CRA 26B

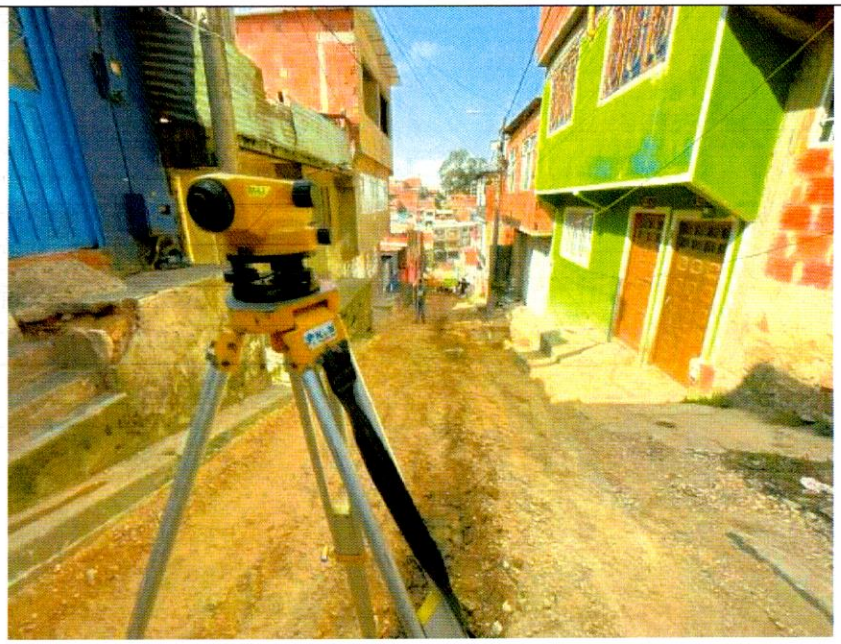


CALLE 53A 26C-26.



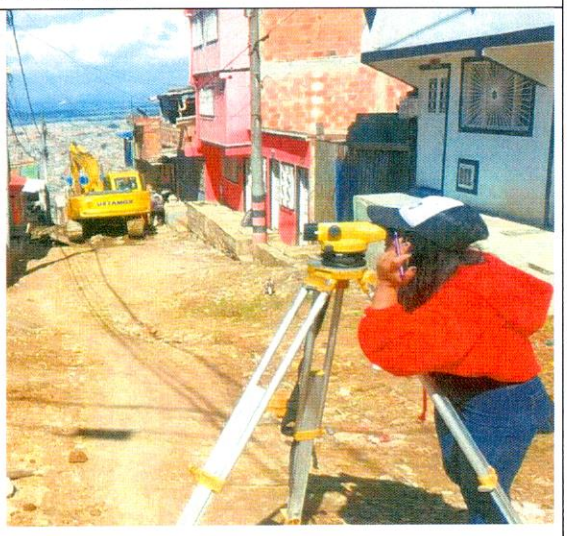

CALLE 55 CRA 26C-27

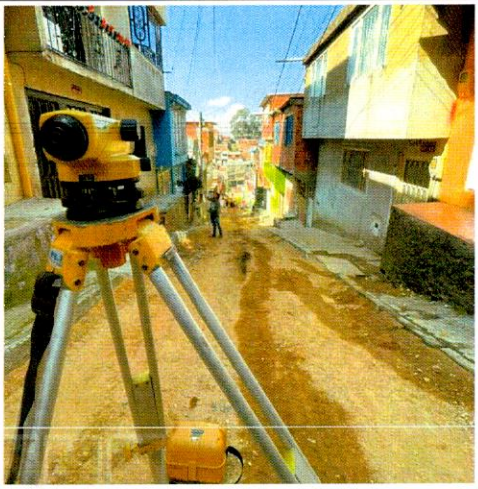


CALLE 55 ENTRE 26 -26C




CALLE 56A ENTRE 27-26




CALLE 26C ENTRE 55-56 A

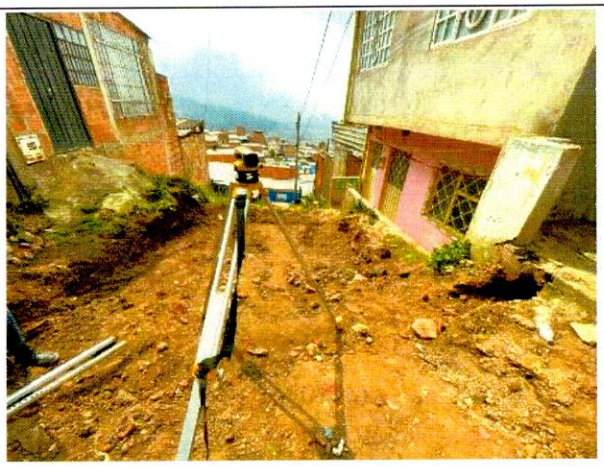


CALLE 56B ENTRE 25AA 26

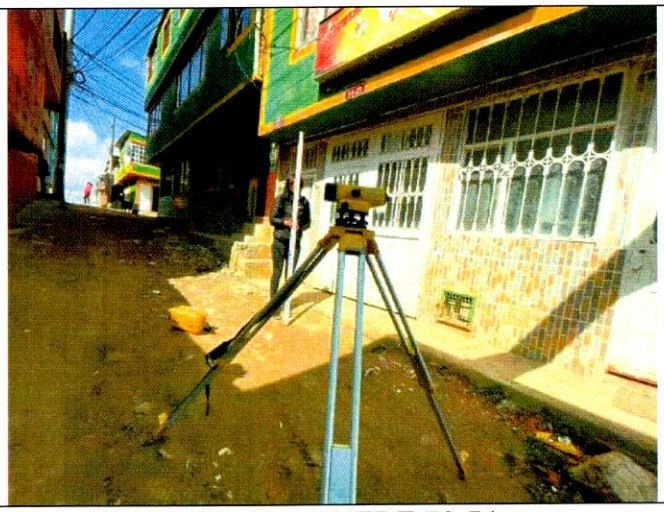


CALLE 26 ESTE ENTRE 59 51

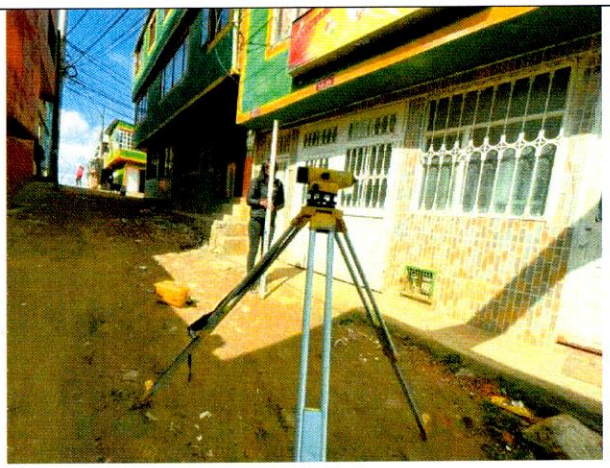


CALLE 58B CRA 26B -26 A

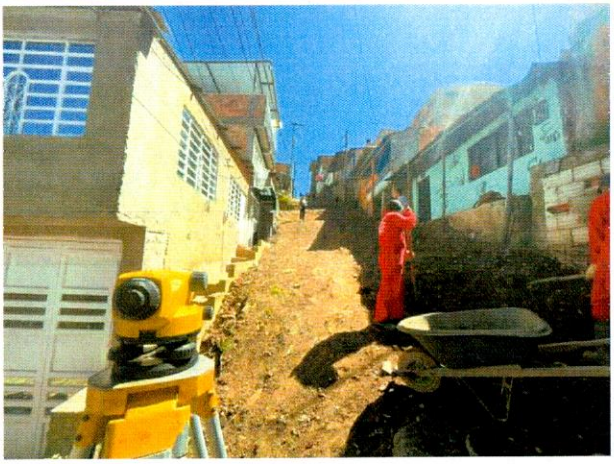


CALLE 26B ESTE 59-61

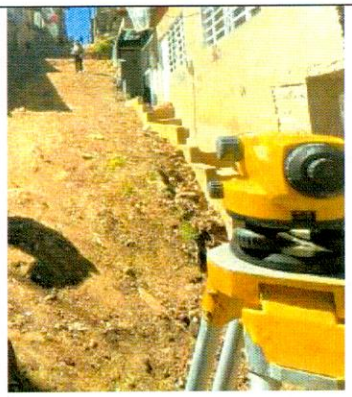

CALLE 51 ENTRE 27D 27

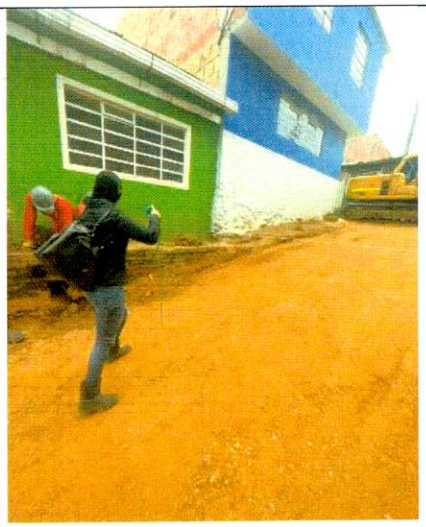

CRA 27D ENTRE 50-44

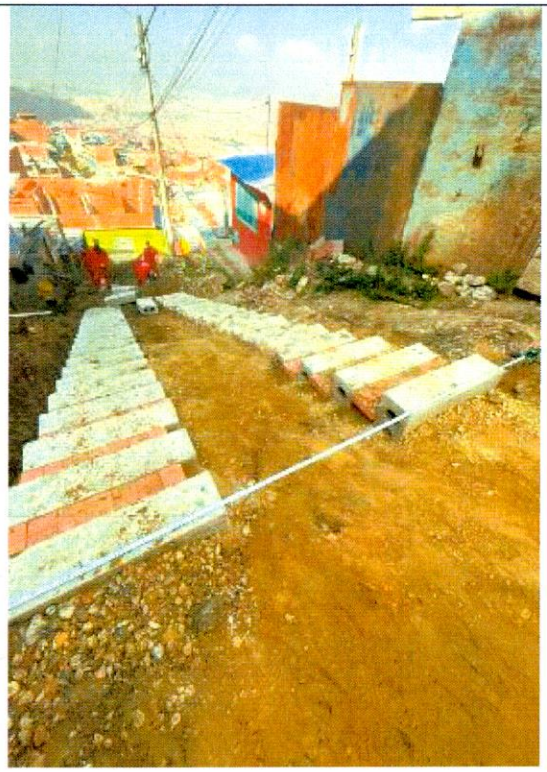

CRA 24B ENTRE 57-59



CALLE 57 CRA 26- CRA 26B

- Excavaciones manuales en las cuadras de las siguientes:


1. CALLE 53A 26C-26.
2. CALLE 55 CRA 26C-27.

3. CALLE 55 ENTRE 26 -26C.
4. CALLE 56A ENTRE CRA 26B -27.
5. CRA 26C ENTRE 55 56 A.
6. CALLE 56 B ENTRE CRA 26A 26.
7. CRA 26 E ENTRE 59-61.
8. CALLE 58 CRA 26B -26A E.
9. CRA 26BESTE ENTRE CLLE59-61.
10. CRA 26A E ENTRE 59-61.
11. CALLE 27 CON 53-51.
12. CRA 27 D ESTE ENTRE 50-54.
13. CRA 57 ENTRE 26C -26B.




CALLE 53A 26C-26



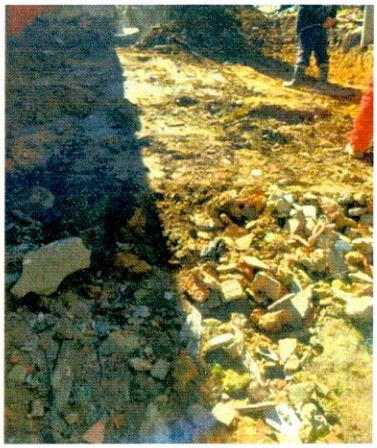

CALLE 55 CRA 26C-27.



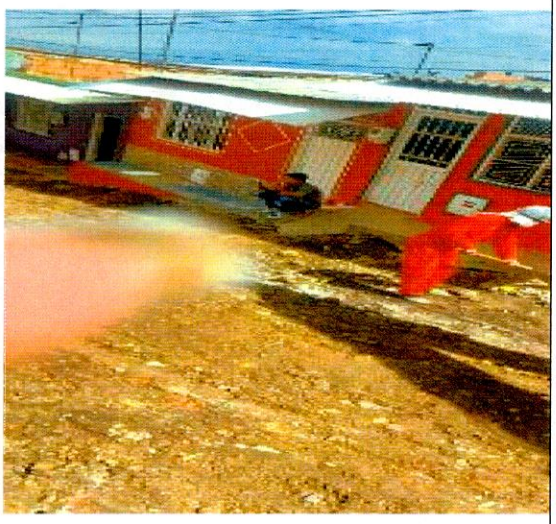

CALLE 55 ENTRE 26 -26C



CALLE 56A ENTRE CRA 26B -27



CRA 26C ENTRE 55 56 A



CALLE 56 B ENTRE CRA 26A 26



CRA 26 E ENTRE 59-61



CALLE 58 CRA 26B -26A E







CRA 26BESTE ENTRE CLLE59-61



CRA 26A E ENTRE 59-61

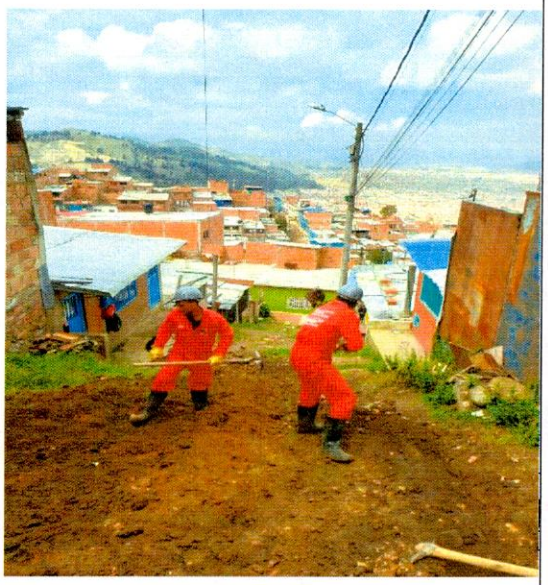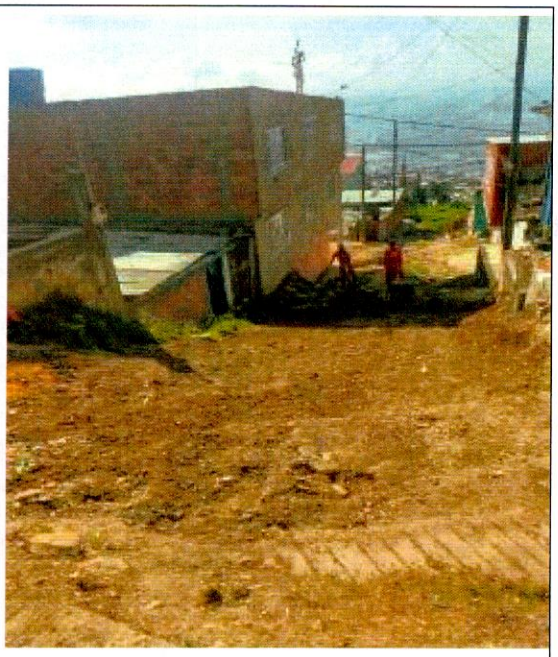
	
CALLE 27 CON 53-51.	

- Fundida de las cunetas en las siguientes cuadras:



1. CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44.
2. CRA 28 ESTE ENTRE CALLE 43F.
3. CARRERA 27 F ENTRE 43F -44.
4. CRA 17 A ENTRE 60-61.
5. CRA 17B ENTRE 60-61.
6. CRA 43F,



CARRERA 30 ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44

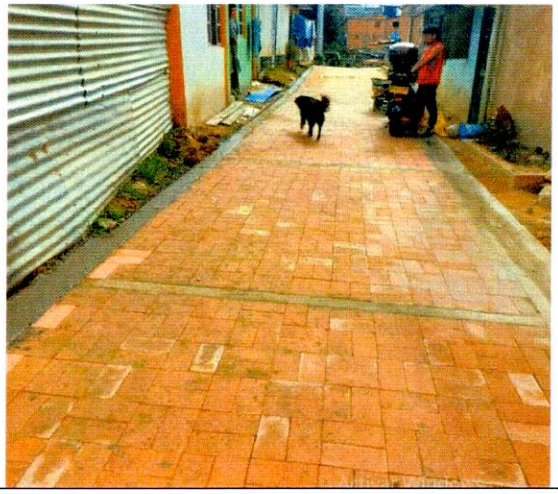


CRA 28 ESTE ENTRE CALLE 43F

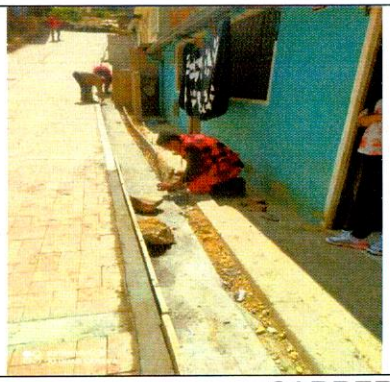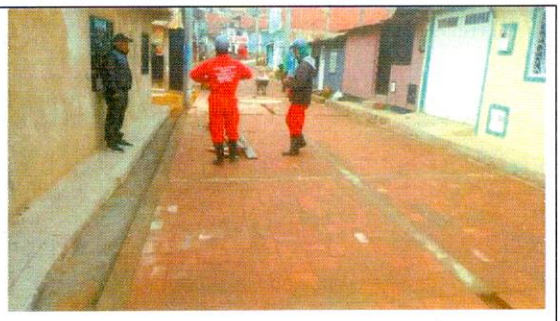	
CARRERA 27 F ENTRE 43F -44.	
CRA 43F	


- Mejoramiento de la subrasante las siguientes vías:


1. CALLE 53A 26C-26.
2. CALLE 55 CRA 26C-27.
3. CALLE 55 ENTRE 26 -26C.
4. CALLE 56A ENTRE 27-26.
5. CALLE 26C ENTRE 55-56 A.
6. CALLE 56B ENTRE 25AA 26.
7. CALLE 26 ESTE ENTRE 59 51.
8. CALLE 58B CRA 26B -26 A.
9. CALLE 26B ESTE 59-61.
10. CALLE 26A ENTRE 59.-51.
11. CRA 27CON CALLE 53 51.
12. CALLE 51 ENTRE 27D 27.
13. CRA 27D ENTRE 50-44.
14. CRA 24B ENTRE 57-59.
15. CALLE 57 CRA 26- CRA 26B.

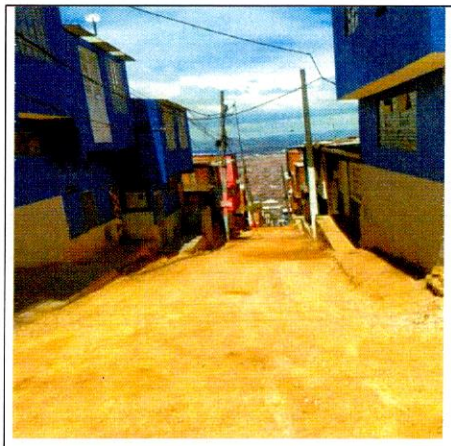



CALLE 53A 26C-26

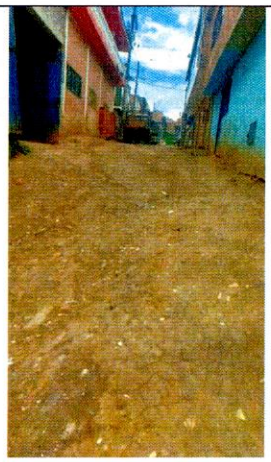

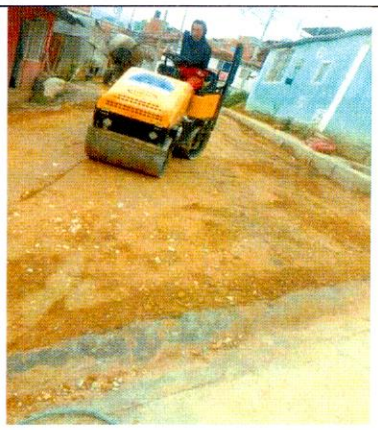


CALLE 55 CRA 26C-27






CALLE 55 ENTRE 26 -26C




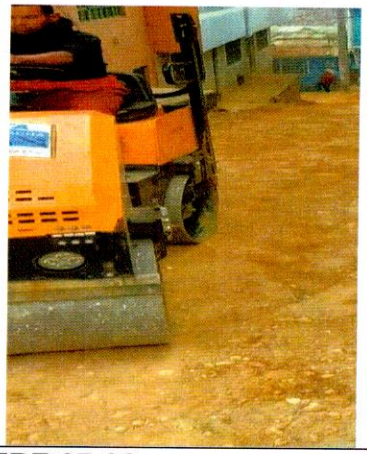

CALLE 56A ENTRE 27-26

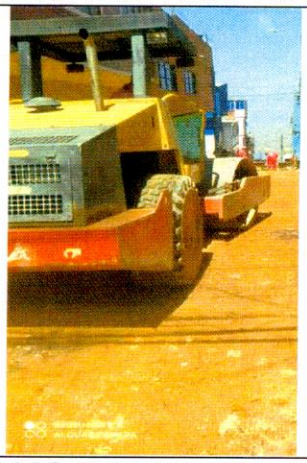

CALLE 26C ENTRE 55-56 A

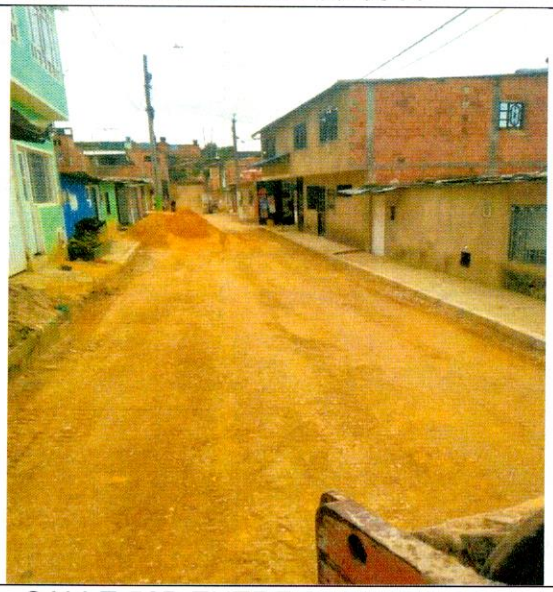

CALLE 56B ENTRE 25AA 26.

247



CALLE 26 ESTE ENTRE 59 51




CALLE 58B CRA 26B -26 A




CALLE 26B ESTE 59-61.




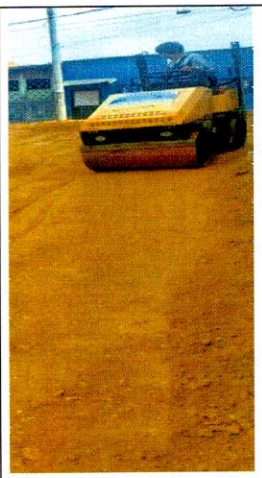

CALLE 26A ENTRE 59.-51

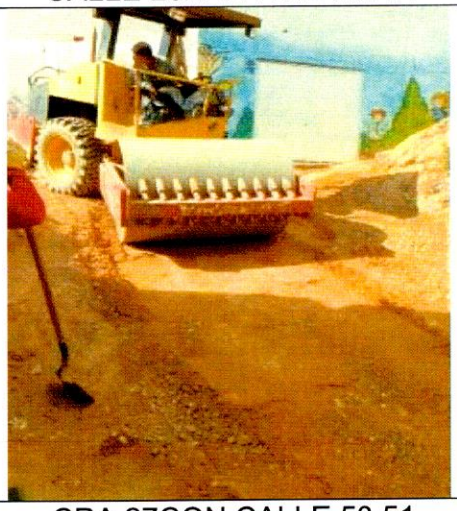


CRA 27CON CALLE 53 51

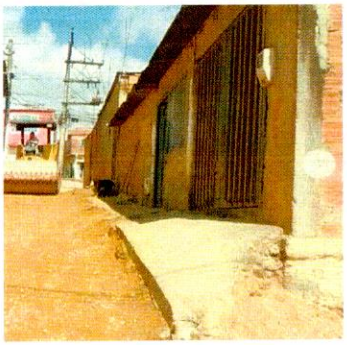





CALLE 51 ENTRE 27D 27

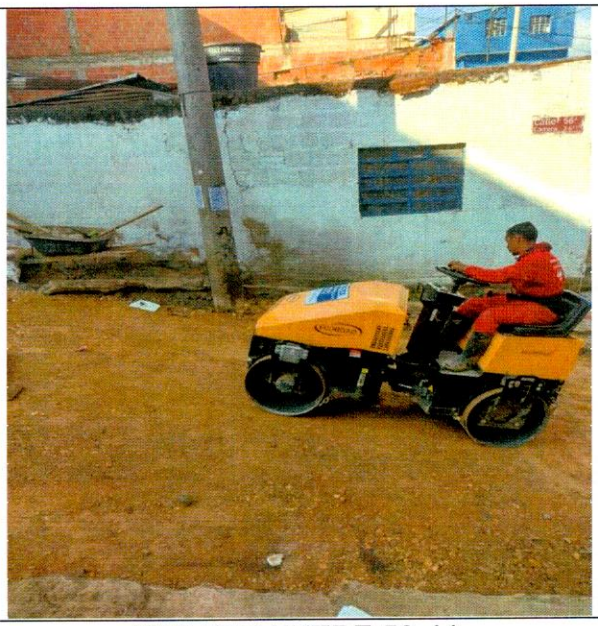

CRA 27D ENTRE 50-44.

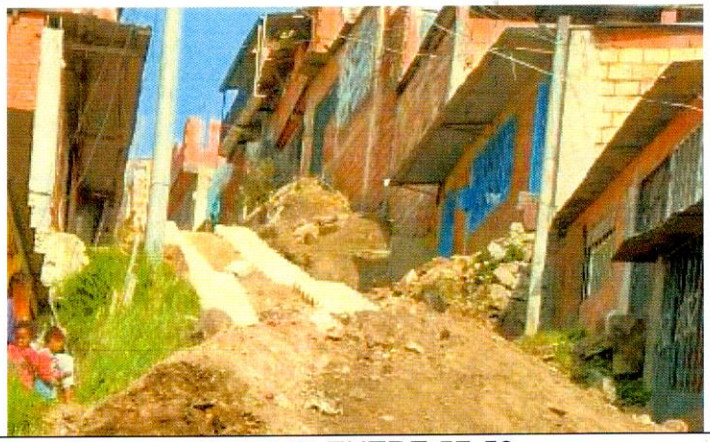

CRA 24B ENTRE 57-59.

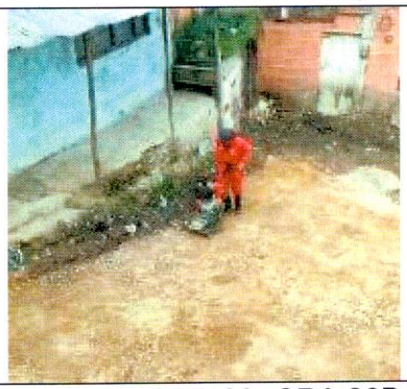

CALLE 57 CRA 26- CRA 26B.

- Fundidas de cintas

1. CARRERA CARRERA 30 3NTRE 48 44
2. CALLE 48 CRA 30-31E.
3. CARRERA 27 F ENTRE 43F 44






CARRERA CARRERA 30 ENTRE 48 44



CALLE 48 CON CRA 30 -31



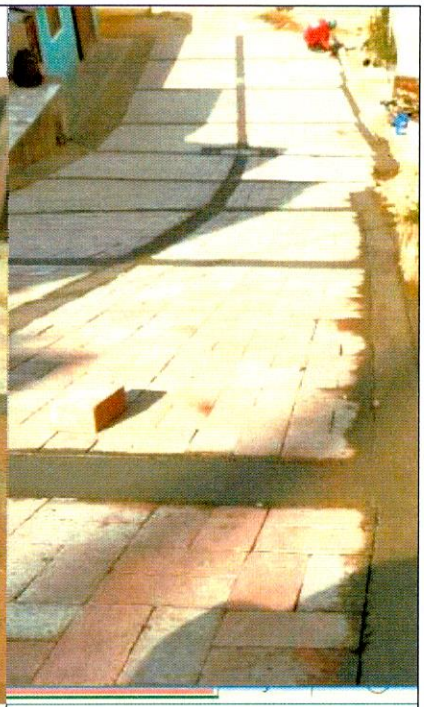

CRA 27 F ENTRE 47F 44


- Reparación de acometidas

1. CALLE 53 ENTRE CALE 26 26C
2. CALLE 55 26-26C
3. CALLE 56 ENTRE 26 27





CALLE 53 ENTRE CALE 26 26C

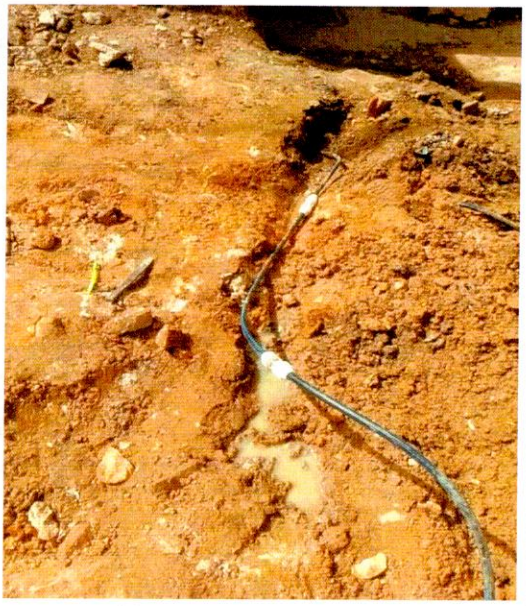



CALLE 55 26-26C





CALLE 56 A ENTRE 26- 27

- Nivelación de pozos

1. CALLE 26C ENTRE 53-53 A 3 POZOS.
2. CALLE 53 ENTRE 26C-26 2 POZOS.
3. CALLE 55 ENTR 6 -26C 3 POZOS.






CALLE 26C ENTRE 53-53 A 3 POZOS





CALLE 53 ENTRE 26C-26 2 POZOS.

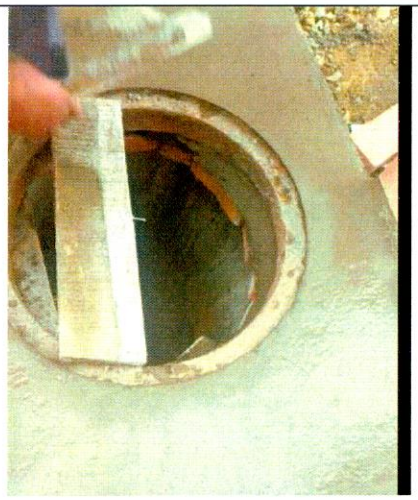	
CALLE 55 ENTR 6 -26C 3 POZOS.	

Según la fecha de la presenta acta se llevaron a cabo los siguientes comités técnicos:

Tabla 7. Comités

COMITÉ N.	FECHA
15	06/01/2023
16	13/01/2023
17	19/01/2023
18	27/01/2023

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

9. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el presente informe se radico la siguiente correspondencia:

Tabla 8. Correspondencia Enviada

CONTRATO INT. N° 025 2022				
No CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÒN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CORREO ELECTRÓNICO.	16- 12- 2022	COCOSERING SAS-	ACTAS DE COMITE 11, 12 Y 13	EPUXUA
CON-GAMER024-035-2022- correo Electrónico.	16- 12- 2022	COCOSERING SAS-	ENTREGA CARTERAS ACTA No 3	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER024-036-2022- correo Electrónico.	16- 12- 2022	COCOSERING SAS-	ENTREGA LABORATORIO MES DE NOVIEMBRE.	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER024-037-2022.- correo Electrónico.	22- 12- 2022	COCOSERING SAS-	NP 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO 40X30 Excav+geoNT1800+tubo 65mm.	CONSORCIO GAMER SOACHA
CORREO ELECTRÓNICO.	22- 12- 2022	COCOSERING SAS- CONSORCIO GAMER SOACHA	Diseño vía para epuxua	EPUXUA
CON-GAMER024-038-2022.- correo Electrónico.	23- 12- 2022	COCOSERING SAS-	RESPUESTA A COMUNICACIÓN DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON ASUNTO “Respuesta oficio CON-GAMER024-030-2022”.	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-39-2022	04-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE 5 AROS Y TAPAS DE POZOS.	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-39-2022	06-01-2023	COCOSERING SAS	RESPUESTA A COMUNICACIÓN DL 13 DE DICIEMBRE	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-40-2022	06-01-2023	COCOSERING SAS	NP 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO 40X30 Excav+geoNT1800+tubo 65mm.	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-43-2022	06-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE CRONOGRAMA	CONSORCIO GAMER SOACHA

256

CONTRATO INT. N° 025 2022				
No CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÒN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CON-GAMER 024-40-2022	11-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES COT 024	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-44-2022	11-01-2023	COCOSERING SAS	SOLICITU DE PRORROGA	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-44-2022	12-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE VIAS	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-46-2022	12-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE CRONOGRAMA	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-47-2022	19-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE VIAS COMUNA 4	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-48-2022	19-01-2023	COCOSERING SAS	ANEXO INFORMACION A SOLICITUD DE PRORROGA 1	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-49-2022	19-01-2023	COCOSERING SAS	SOLICITUD DE VISITA DE CARÁCTER URGENTE DE LA VÍA CLL 50 ENTRE CRA 32 Y 31 EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-003-2023	19-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA ESPECIFICACIONES TECNICAS NP.	CONSORCIO GAMER SOACHA
SIN NUMERO	23-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES COT 024	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-005-2023	27-01-2023	COCOSERING SAS	OBSERVACION DISEÑO PLACA HUELLA	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-004-2023	27-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA NP 19 Y 20	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-006-2023	27-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE VIAS Y LABORATORIOS	CONSORCIO GAMER SOACHA
CON-GAMER 024-007-2023	30-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE DISEÑO MURO	CONSORCIO GAMER SOACHA

CONTRATO INT. N° 025 2022				
No CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÒN	ENTIDAD Y/O DIRIGIDO	ASUNTO	ENVIADO POR
CON-GAMER 024-007-2023	30-01-2023	COCOSERING SAS	ENTREGA DE DISEÑO VIA	CONSORCIO GAMER SOACHA

Fuente: Consorcio Gamer Soacha

10. CONCLUSIONES

- Las vías intervenidas son priorizadas por el municipio así mismo se emplean métodos y recursos, previamente determinados en los documentos contractuales.

- La ejecución de las vías asignadas se ha desarrollado con lo especificado en los comités y visitas de obra por parte de la Epuxua y la supervisión de la Alcaldía.

- Es válido aclarar que el factor climático es ajeno e imposible de predecir por el Consorcio Gamer Soacha, debido a esto, se han presentado reprocesos que han llevado a la ejecución de actividades como re nivelaciones para el mejoramiento de las subrasantes por ende se extiende un informe de las afectaciones climáticas soportando estos ítems de la presente acta.

11. ANEXOS

Certificado de Aportes del mes en reporte y planillas
Actas de comité técnicos
Certificados de materiales
Reporte de afectaciones por lluvia
Relación de material para disposición final
RUT
RIT
Acta N°4.



Milton Eduardo Rivera Rincón
R.L Consorcio Gamer Soacha

ANEXOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICADOS DE APORTES-PLANILLAS

CONSORCIO GAMER SOACHA

CERTIFICACION JURAMENTADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Bogotá, febrero 6 de 2.023

Yo, **MILTON EDUARDO RIVERA RINCON,** identificado con la cedula de ciudadanía No. **79.205.702** de **Soacha**, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO GAMER SOACHA** identificado con **NIT. No.901.587.366-8;** y yo **ADRIANA BONILLA en** mi calidad de Contadora, certificamos, que se han venido pagando oportunamente las Obligaciones Laborales, durante los últimos seis (6) meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en **BOGOTA**, a los **seis (6)** días del mes de **FEBRERO** de 2023.

MILTON EDUARDO RIVERA RINCON
C. C. No.79.205.702
Representante Legal

ADRIANA BONILLA
TP 55341-T
Contadora

23

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 2 B 6 A 1 3 8 0 B 0 1 B 9 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA BONILLA BERNAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51920908 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 55341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **51.920.908**


BONILLA BERNAL

APELLIDOS

ADRIANA

NOMBRES

FIRMA

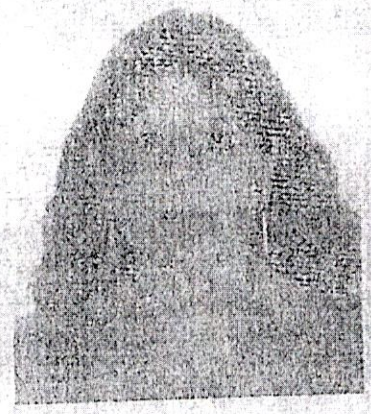



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-DIC-1968**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00909962-F-0051920908-20170606 0055630499A 2 9910019145

25

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

CONSORCIO GAMER SOACHA

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EL CAMBIO AVANZA

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 06 de enero 2023.
FECHA: 06 Enero 2023	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria.	NUMERO DE COMITE: 15
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del acta anterior.
2.	Porcentaje de ejecución.
3.	Otros.
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia el comite a las 8:00 am con la verificación de los compromisos del acta anterior

Se solicita la presentación de los compromisos anteriores. en el menor tiempo posible.

El Ing. Yate realiza observaciones al proceso constructivo de las placa huellas. por la instalacion de las mallas de refuerzo de las mismas.

Se realiza la validación de las vias entregadas y la arq. Nubia informa que va a solicitar la topografia y Diseños de las vias entregada el dia 23 de diciembre, se han encontrado inconvenientes por las pendientes de vias por lo cual se validara la facilidad de intervensión de las

mismas.

Se requiere un cronograma de las vías nuevas a intervenir y se solicita la proyección presupuestal de las mismas para la justificación de la prorroga.

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Ing Alejandra Yate	Dirección Equipamt	317-8421556	
Ing Juan Pablo Cano	Epuxua	3124821154	
EDGAR URIBE	COCOSERVING INTERVENTORIA	3108032525	
Nubia Rueda	Contratista	3102935197	
Jaera Afuentes F	Residente de Interventoria.	3105709036	
Olga Stella Respecto	Interventoria	3134699929	

29

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:
La Interventoria se compromete a hacer entrega de las observaciones de los Np presentados	Interventoria.	

270

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua.	HORA DE INICIO: 10:24 am.
FECHA: 13 de enero de 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria.	NUMERO DE ACTA: 16

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificacion del acta anterior.
2.	Verificacion de actividades en ejecucion.
3.	Validacion de vias entregadas.
4.	Otros.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia comite a las 10:24 am. con la validacion del acta anterior donde se informa que se envio una solicitud para visitas técnicas en las vias: Villa Sandra, Villa esperanza, Cra ciudadela Sucre, Cra 9 el silo. a lo cual el Ing. Alejandro Yate informa que no tiene conocimiento de la solicitud pero que se pueden realizar las visitas al finalizar el comite, el Ing Milton solicita la entrega de la Topografia de la Cra 9. ya que a la fecha no se ha recibido. Se inicia la validación de las vías entregadas el día 23 de diciembre exponiendo la interventoria que se hicieran entregas en las cartas galan II y que son continuas a vias ya intervenidas con mejoramiento de sub base., lo cúal a su intervencion de las nuevas vías se vera afectado el material ya instalado. Se solicita al contratista que via que se entrege debe tener un

http://www.alcaldiadesoacha.gov.co/

presupuesto antes del inicio de intervención.

El Ing Jhon Mario informare informando que el proyecto se ha dado con el fin de mejoramiento de la calidad de vida por lo cual el requiere que se validen las nuevas vias a intervenir porque en la mayoria de vías deben intervenirse con mejoramiento de Subrasante con Subbase para instalación de adoquin en el mayor número de cuadras.

Se da Claridad de que se va a dar unos tiempos para que la comunidad genere la instalación de adoquin. esto va a quedar dentro de las actas de entrega a la comunidad.

Se va a realizar una entrega de las vías de mejoramiento sustentadas en los laboratorios y un informe a la gerencia y a infraestructura.

Se realizará visita el dia de hoy y mañana 14 de enero del 2023. para entrega de las vías nuevas a intervenir.

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Juan Pablo Cano	Epoxoa	3124821154	
Milton Rivera	Contratista	3153467636	
Alejandro Yate L.	Director Equipam	313-3421551	
EDGAR EDUARDO LOPEZ	INTERVENTORIA CONSULTING	3108032545	
Lorena Cifuentes	R. Interventoria	3105209036	
Olga Cespedes	Interventoria	3134699929	
John Jairo Vargas	Sec Infraestructura	3033131348	
Nubia Rueda	Contratista	3102935A1	

XUÁ	EPUXUA AVANZA I.E.C.E.
	ACTA DE COMITÉ TECNICO

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EL CAMBIO AVANZA
	FORMATO COMITÉ	

LUGAR DE REUNIÓN: Epuxua	HORA DE INICIO: 7:30 am.
FECHA: 19 de enero 2023.	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Interventoria.	NUMERO DE COMITE:
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	

AGENDA PROPUESTA	
1.	Estado actual del contrato
2.	Vias entregadas 16 y 17 enero de 2023
3	Sistemas ipanos de adoquin comuna 4
4.	Sistemas de escaleras de adoquin comuna 4.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Comite extraordinario Nº1.

- Se inicia comite con resumen de la ejecucion del contrato, donde se aclara que el contrato esta al 40% en tiempo.

En la entrega realizada por la entidad de las vias el dia 23 de diciembre se presentan vias sin adoquin a la fecha, vias donde ya se estan ejecutando trabajos. En las vias entregadas el 16 de enero de igual manera hay vias que no cuentan con adoquin a la fecha.

- Se hace revision de los sistemas constructivos en adoquin y concreto con material reciclado y con bordillo de confinamiento.
- Se habla sobre la utilizacion de mixto reciclado, el contratista se encargara del diseño de la mezcla para un concreto de 3000 PSI. y presentacion de un nuevo APU teniendo en cuenta este concreto.

- Se hace revision del diseño de escalera en adoquin, el contratista propone seguir utilizando el sistema utilizado en la Tran 35 diagonal, con bordillo A-80 para las huellas y muros ciclopeos para el confinamiento lateral.
- El contratista se compromete con la entrega del presupuesto en un caso especial en la cll 53 con cra 26 y cra 26c de un muro lateral para el Confinamiento de la via.
- Se encuentran danos en la subbase instalada desde el 15 de diciembre donde la comunidad no ha iniciado la instalacion del adoquin, se aclara que la subbase en estos momentos tiene problemas de socavacion por las lluvias.
- Se expone el nuevo sistema para placa huellas en las vias donde se requiera y en vias de pendientes altas, el contratista expone el tema de que para las vias en adoquin las garantias deben ser revisadas ya que el contratista no tiene la responsabilidad en la instalacion.
  Se aclara que para el cambio de sistema se debe actualizar la ficha tecnica, y actualizar el anexo tecnico.
  Para el diseño propuesto se pide la revision de la viga canta donde se solicita que esta cruce de cuneta a cuneta y que el confinamiento de la via se realice en bordillo.
- En el nuevo sistema de placa huella el contratista se hara cargo de los concretos y el adoquin seguira a cargo de la comunidad.
- El contratista hara entrega de vias en subbase con pozos nivelados, laboratorios y via nivelada, para el acta de entrega de cada via.

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Ing. Alejandro Yate	Dirección Epuxua	313-842-1556	
Ing. Milton Rivera	Contratista	315-3467656	
Fernando Quiroz	Contratista.	321 275 92 55	
Juan Pablo Cano	Epoxua	3124821154	
EDGAR E. DIAZ	COCOSERING INTERVENTORIA	3100032525	
Lorena Cifuentes	R. Interventoria	3105709036	
Nubia R.	Contratista	3102935197	
Olga Stella Cespedes	(Cocoserv) Interv.	3134699929	

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:

CERTIFICADOS DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 473-2-92-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA CARRERA 17A este
SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 168
TIPO . SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO : 6-dic-22
FECHA ENTREGA: 7-dic-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°		6					
Capa		ULTIMA					
Profundidad	m	0,15					
Abscisa		K0+065					
Sector		VIA					
Margen		DER					
Peso frasco y arena inicial	gr	6304					
Peso frasco y arena restante	gr	2700					
Peso arena total usada	gr	3604					
Constante del cono	gr	1636					
Peso arena en el hueco	gr	1968					
Densidad de la arena	gr/cm^3	1,360					
Volumen del hueco	gr	1447					
Peso material extraido humedo	gr	3416					
Humedad	%	7,5					
Peso material extraido seco	gr	3178					
Densidad del material	gr/cm^3	2,196					
Densidad max. laboratorio	gr/cm^3	2,063					
Humedad óptima laboratorio	%	8,1					
Compactación en el terreno	%	**106,4**					
Compactación especificada	%	**95,0**					

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 473-2-92-2022




Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA CARRERA 17B este
SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 168
TIPO . SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO : 6-dic-22
FECHA ENTREGA: 7-dic-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°		7					
Capa		ULTIMA					
Profundidad	m	0,15					
Abscisa		K0+040					
Sector		VIA					
Margen		IZQ					
Peso frasco y arena inicial	gr	6300					
Peso frasco y arena restante	gr	2708					
Peso arena total usada	gr	3592					
Constante del cono	gr	1636					
Peso arena en el hueco	gr	1956					
Densidad de la arena	gr/cm^3	1,360					
Volumen del hueco	gr	1438					
Peso material extraído húmedo	gr	3250					
Humedad	%	8,0					
Peso material extraído seco	gr	3009					
Densidad del material	gr/cm^3	2,092					
Densidad max. laboratorio	gr/cm^3	2,063					
Humedad óptima laboratorio	%	8,1					
Compactación en el terreno	%	**101,4**					
Compactación especificada	%	**95,0**					

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

281

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 473-2-92-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA CARRERA 27f este 43-44
SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 168
TIPO . SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO : 6-dic-22
FECHA ENTREGA: 7-dic-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°		8	9				
Capa		ULTIMA	ULTIMA				
Profundidad	m	0,15	0,15				
Abscisa		K0+042	K0+073				
Sector		VIA	VIA				
Margen		EJE	EJE				
Peso frasco y arena inicial	gr	5923	6013				
Peso frasco y arena restante	gr	2392	2590				
Peso arena total usada	gr	3531	3423				
Constante del cono	gr	1636	1636				
Peso arena en el hueco	gr	1895	1787				
Densidad de la arena	gr/cm^3	1,360	1,360				
Volumen del hueco	gr	1393	1314				
Peso material extraido humedo	gr	3131	2827				
Humedad	%	7,5	7,0				
Peso material extraido seco	gr	2913	2642				
Densidad del material	gr/cm^3	2,090	2,011				
Densidad max. laboratorio	gr/cm^3	2,063	2,063				
Humedad optima laboratorio	%	8,1	15,0				
Compactación en el terreno	%	**101,3**	**97,5**				
Compactación especificada	%	**95,0**	**95,0**				

OBSERVACIONES:

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

282

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 477-2-93-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA CARRERA 27 D este
SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 172
TIPO . SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO : 12-dic-22
FECHA ENTREGA: 13-dic-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°		10	11				
Capa		ULTIMA	ULTIMA				
Profundidad	m	0,15	0,15				
Abscisa		K0+048	K0+078				
Sector		VIA	VIA				
Margen		EJE	DER				
Peso frasco y arena inicial	gr	6461	6300				
Peso frasco y arena restante	gr	2760	2502				
Peso arena total usada	gr	3701	3798				
Constante del cono	gr	1636	1636				
Peso arena en el hueco	gr	2065	2162				
Densidad de la arena	gr/cm^3	1,360	1,360				
Volumen del hueco	gr	1518	1590				
Peso material extraido húmedo	gr	3347	3649				
Humedad	%	11,0	12,0				
Peso material extraido seco	gr	3015	3258				
Densidad del material	gr/cm^3	1,986	2,049				
Densidad max. laboratorio	gr/cm^3	2,063	2,063				
Humedad óptima laboratorio	%	8,1	15,0				
Compactación en el terreno	%	**96,3**	**99,3**				
Compactación especificada	%	**95,0**	**95,0**				

OBSERVACIONES: cra 27d 43d-43f , cra 27d entre 43f-44

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

283

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos - Concretos
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No. 480-2-94-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022
SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA
SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA
DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo

OSC: 175
TIPO . SUBBASE TPO C
FECHA DE ENSAYO : 13-dic-22
FECHA ENTREGA: 14-dic-22
CAPA: ULTIMA

Densidad N°		12	13	14	15	16	
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	
Profundidad	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Abscisa		K0+015	K0+080	K0+000	K0+015	K0+015	
Sector		VIA	VIA	VIA	SBG	SBG	
Margen		EJE	DER	DER	EJE	EJE	
Peso frasco y arena inicial	gr	6200	5929	5733	5664	6096	
Peso frasco y arena restante	gr	2737	2392	2187	1984	2552	
Peso arena total usada	gr	3463	3537	3546	3680	3544	
Constante del cono	gr	1636	1636	1636	1636	1636	
Peso arena en el hueco	gr	1827	1901	1910	2044	1908	
Densidad de la arena	gr/cm^3	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
Volumen del hueco	gr	1343	1398	1404	1503	1403	
Peso material extraído húmedo	gr	2910	3070	3078	3282	3174	
Humedad	%	8,5	8,2	7,5	8,0	8,2	
Peso material extraído seco	gr	2682	2837	2863	3039	2933	
Densidad del material	gr/cm^3	1,996	2,030	2,039	2,022	2,091	
Densidad max. laboratorio	gr/cm^3	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	
Humedad óptima laboratorio	%	8,1	15,0	8,1	8,1	8,1	
Compactación en el terreno	%	**96,8**	**98,4**	**98,8**	**98,0**	**101,4**	
Compactación especificada	%	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	

OBSERVACIONES: **DENSIDAD N° 12** CARRERA 26B CALLE 56B **DENSIDAD N° 13** CARRERA 26A CALLE 58
DENSI DAD N° 14 INTERSECCION CARRERA 56B CARRERA 26A DENSIDAD N° 15CALLE 57 CON CARRERA 26B ESTE
DENSI DAD N° 16 CARRERA 26C CALLE 53

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

284

Análisis de Materiales e Ingeniería Civil S.A.S
Laboratorio de Suelos - Pavimentos – Concretos.
NIT – 900.260.470 -8

DENSIDAD DE CAMPO METODO DEL CONO Y ARENA

NORMA(S) APLICADA(S) :

INV. E - 161

ORDEN No.

480-2-94-2022

Página 1 de 1

PROYECTO: CONTRATO 024 2022 — OSC: 175

SITIO: COMUNA 4 SOACHA CAZUCA — TIPO . SUBBASE TPO C

SOLICITANTE : CONSORCIO GAMER SOACHA — FECHA DE ENSAYO : 13-dic-22

DESCRIPCION : Grava limo arcilloso amarillo — FECHA ENTREGA: 14-dic-22




CAPA: ULTIMA

Densidad N°		17	18	19	20	21	
Capa		ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	ULTIMA	
Profundidad	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Abscisa		K0+017	K0+075	K0+016	K0+015	K0+015	
Sector		VIA	VIA	VIA	SBG	SBG	
Margen		EJE	DER	DER	EJE	EJE	
Peso frasco y arena inicial	gr	5500	5450	5431	5370	5350	
Peso frasco y arena restante	gr	1764	1822	1933	1981	1852	
Peso arena total usada	gr	3736	3628	3498	3389	3498	
Constante del cono	gr	1636	1636	1636	1636	1636	
Peso arena en el hueco	gr	2100	1992	1862	1753	1862	
Densidad de la arena	gr/cm^3	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
Volumen del hueco	gr	1544	1465	1369	1289	1369	
Peso material extraído húmedo	gr	3333	3298	2888	2857	2984	
Humedad	%	8,0	8,5	7,5	8,0	8,3	
Peso material extraído seco	gr	3086	3040	2687	2645	2755	
Densidad del material	gr/cm^3	1,999	2,075	1,962	2,052	2,012	
Densidad max. laboratorio	gr/cm^3	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	
Humedad óptima laboratorio	%	8,1	15,0	8,1	8,1	8,1	
Compactación en el terreno	%	**96,9**	**100,6**	**95,1**	**99,5**	**97,6**	
Compactación especificada	%	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	

OBSERVACIONES: **DENSIDAD N° 17** CALLE 24B CALLE 59**DENSIDAD N° 18** CALLE 24B CALLE 57

DENSI DAD N° 19 CALLE 43C CON CARRERA 27 DENSI DAD N° 20 CALLE 28-43F

DENSIDAD N° 21 CARRERA 26C este CALLE 53A

ELABORO	CESAR CORTES	REVISO	ANGEL CASTRO	APROBO	ANGEL CASTRO
CARGO	TECNICO LAB	CARGO	JEFE DE LAB	CARGO	JEFE DE LAB
FIRMA		FIRMA		FIRMA	

285

INFORME
FACTOR CLIMATICO

CONSORCIO GAMER SOACHA

CONSORCIO GAMER SOACHA

Contrato 024 del 2022 enero del 2023

Informe Técnico de Lluvia y su Impacto en el Material de Subbase

Introducción:

Las lluvias presentadas en las semanasdel 15 DICIEMBRE a principios de enero de 2023 reflejaron un impacto significativo en el material de subbase en las vias del **barrio Luis Carlos Galan II**. Los efectos de la lluvia incluyen socavación, erosión, arrastre de finos y pérdida de material por el agua, generando la necesidad de reacondicionar el material de subbase.

Análisis:

Debido a la accion de las corrientes de agua que fluyen a lo largo de las superficies de la via, se genera **socavación** en la superficie de la subbase, esto evidenciado en la perdida de material (en su mayoria material fino) generando zanjas y exponiendo el material grueso. Otro de los factores mas significativos en la subbase, fue la **erosión** generada por el impacto del agua lluvia de las casas hacia la superficie, debiliando la subbase hasta que el constante impacto rompe la estabilidad del material, generando asi que la subbase pierda su densidad y empiece a **saturarse** por la filtración del agua. Se ha solicitado por parte del contratista la canalizacipon de las aguas lluvias, en las vias afectadas se ha echo caso omiso a esta petición.

Las vias afectadas por estos fenomenos fueron:

Cra 24b cll 59 a Cll 61





Nivelación 6/12/2022 | Afectaciónes | Reparaciones

1. Retiro de material afectado: Se extrae el material de subbase saturado y que ha sido socavado o erosionado debido a las lluvias. Entre (e= 0,05 cm)
2. Renivelación: Se rellena y nivela la subbase con material nuevo para asegurar que la superficie sea uniforme y esté a la altura correcta.
3. Compactación: Se asegurar que el material de subbase esté uniformemente compactado y que la superficie sea estable.
4. Pruebas: Se realizan pruebas en la superficie para determinar la densidad y resistencia del material de subbase.

Cra 26b cll 56a a Cll 59








Nivelación Afectaciónes Reparaciones

1. Retiro de material afectado: Se extrae el material de subbase saturado y que ha sido socavado o erosionado debido a las lluvias. (e=0,07 cm)
2. Renivelación: Se rellena y nivela la subbase con material nuevo para asegurar que la superficie sea uniforme y esté a la altura correcta.
3. Compactación: Se asegurar que el material de subbase esté uniformemente compactado y que la superficie sea estable.
4. Pruebas: Se realizan pruebas en la superficie para determinar la densidad y resistencia del material de subbase.

Cra24 b Cll 58 a Cll 59



Nivelación Afectaciónes Reparaciones

1. Retiro de material afectado: Se extrae el material de subbase saturado y que ha sido socavado o erosionado debido a las lluvias. (e=0,05 cm)
2. Renivelación: Se rellena y nivela la subbase con material nuevo para asegurar que la superficie sea uniforme y esté a la altura correcta.
3. Compactación: Se asegurar que el material de subbase esté uniformemente compactado y que la superficie sea estable.
4. Pruebas: Se realizan pruebas en la superficie para determinar la densidad y resistencia del material de subbase.

Cra 26a Cll 57b a Cll 59



Nivelación Afectaciónes Reparaciones

1. Retiro de material afectado: Se extrae el material de subbase saturado y que ha sido socavado o erosionado debido a las lluvias. (e= cm)
2. Renivelación: Se rellena y nivela la subbase con material nuevo para asegurar que la superficie sea uniforme y esté a la altura correcta.
3. Compactación: Se asegurar que el material de subbase esté uniformemente compactado y que la superficie sea estable.
4. Pruebas: Se realizan pruebas en la superficie para determinar la densidad y resistencia del material de subbase.

288

Cra 26c Cll 53 a Cll 55






Nivelación Afectaciónes Reparaciones

1. Retiro de material afectado: Se extrae el material de subbase saturado y que ha sido socavado o erosionado debido a las lluvias. (e= 0,07cm)
2. Renivelación: Se rellena y nivela la subbase con material nuevo para asegurar que la superficie sea uniforme y esté a la altura correcta.
3. Compactación: Se asegurar que el material de subbase esté uniformemente compactado y que la superficie sea estable.
4. Pruebas: Se realizan pruebas en la superficie para determinar la densidad y resistencia del material de subbase.

Cra 27 entre Cll 43d a Cll 43f





Nivelación Afectaciónes Reparaciones

1. Retiro de material afectado: Se extrae el material de subbase saturado y que ha sido socavado o erosionado debido a las lluvias. (e=0,07 cm)
2. Renivelación: Se rellena y nivela la subbase con material nuevo para asegurar que la superficie sea uniforme y esté a la altura correcta.
3. Compactación: Se asegurar que el material de subbase esté uniformemente compactado y que la superficie sea estable.
4. Pruebas: Se realizan pruebas en la superficie para determinar la densidad y resistencia del material de subbase.

Cra 27d entre Cll 43f a Cll 44






Nivelación Afectaciónes Reparaciones

1. Retiro de material afectado: Se extrae el material de subbase saturado y que ha sido socavado o erosionado debido a las lluvias. (e= 0,05cm)
2. Renivelación: Se rellena y nivela la subbase con material nuevo para asegurar que la superficie sea uniforme y esté a la altura correcta.
3. Compactación: Se asegurar que el material de subbase esté uniformemente compactado y que la superficie sea estable.
4. Pruebas: Se realizan pruebas en la superficie para determinar la densidad y resistencia del material de subbase.

29

CONSORCIO GAMER SOACHA	
Contrato 024 del 2022	enero del 2023

Conclusión:
Ante los efectos negativos generados por la lluvia en el material de subbase, se llevó a cabo una solución eficaz para garantizar su estabilidad y durabilidad. Se realizó el levantamiento del material afectado, se eliminó el material que ya no tenía presencia de finos o se encontraba saturado, se llevó a cabo la renivelación de subbase, que se encontraba por debajo del nivel requerido, se agregó más material de subbase y finalmente se compactó. De esta manera, se logró resolver los problemas generados por la lluvia en el material y garantizar la estabilidad de la estructura.



FIRMA INFORME

290

CodigoEstacio	NombreEstaci	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativ	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspens	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSe	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	1/11/2022 0:00		5	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	2/11/2022 0:00	3.1		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	5/11/2022 0:00	0.3		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	6/11/2022 0:00	7.7		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	7/11/2022 0:00	3.6		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	8/11/2022 0:00	1.2		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	9/11/2022 0:00		11	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	10/11/2022 0:00	1.6		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	11/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	12/11/2022 0:00	5.6		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	13/11/2022 0:00		1	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	14/11/2022 0:00	26.5		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	15/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	16/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	17/11/2022 0:00	17.4		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	18/11/2022 0:00		10	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	19/11/2022 0:00	2.2		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	20/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	21/11/2022 0:00	0.5		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	22/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	23/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	24/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	25/11/2022 0:00	2.5		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	26/11/2022 0:00	4.4		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	27/11/2022 0:00	4.5		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	28/11/2022 0:00		5	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	29/11/2022 0:00	7.2		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	30/11/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	1/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	2/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	3/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	4/12/2022 0:00	2.9		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	5/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	7/12/2022 0:00	13.8		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	8/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	9/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	10/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	11/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	12/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	13/12/2022 0:00	0.7		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	14/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	15/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	16/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	17/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	18/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	19/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	20/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	21/12/2022 0:00	1.2		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	22/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	23/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	24/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	25/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	26/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	27/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	28/12/2022 0:00		0	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	29/12/2022 0:00		1	50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	30/12/2022 0:00	0.9		50	900
21205720	SAN JORGE GI	4.505.750	-7.418.927.778		2900	ClimÃ¡tica Or	INSTITUTO DE	Area Operativ	Cundinamarca	Soacha		15/04/1960 0:00		PRECIPITACIO	PTPM_CON	DÃ-a pluviom	Diaria	31/12/2022 0:00	0.9		50	900

291

DISPOSICION FINAL DE MATERIALES

CONSORCIO GAMER SOACHA

CARGUES NOVIEMBRE A DICIEMBRE 14

CONTRATO	UBICACIÓN OBRA	N°de RECIBO	METROS ^{3}
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1107	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1106	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8263	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8267	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8262	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7381	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8277	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	8264	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	8375	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	8265	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	8273	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	8271	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8268	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2023	Comuna 4 Soacha	8258	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2024	Comuna 4 Soacha	8259	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8274	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8272	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7384	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	1110	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8270	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7383	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8275	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8276	7

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8277	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8283	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8282	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8278	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8279	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8280	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8281	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8285	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8284	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8317	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8313	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8312	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8321	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8316	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8311	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8315	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	7385	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8314	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8318	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8322	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8320	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8323	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8354	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8355	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8375	7

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8319	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8374	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8326	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8325	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8330	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8329	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8327	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8328	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8324	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8356	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8357	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	859	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8365	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8390	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	28393	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8360	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8358	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8392	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8389	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8362	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8361	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8392	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8364	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8377	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8368	7

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8379	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8378	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8387	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8368	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8363	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8381	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8380	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8367	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8369	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8383	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8382	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8372	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8366	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8384	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8371	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8373	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8370	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	8385	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45021	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45022	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45023	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45024	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45025	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45026	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45027	7

7

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45028	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45029	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45030	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45031	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45032	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45033	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45034	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45035	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45036	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45037	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45038	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45039	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45040	7
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45041	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45042	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45043	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45044	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45045	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45046	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45047	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45048	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45049	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45050	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45051	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45052	15

Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45053	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45054	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45055	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45056	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45057	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45058	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45059	15
Consorcio Gamer Soacha 024-2022	Comuna 4 Soacha	45110	15
			1397
		M/K	15
			20955

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA D M A

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08365

CLIENTE	Consorcio Cames Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Carrera 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO K40 772	M3 15
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Gustavo Reyes • Tel. 51 673 765-4 • Cel. 317 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA D M A

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08359

CLIENTE	Consorcio Cames Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Carrera 4 Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposi Final de Escombro

Impreso por: IMPRESORES • Gustavo Reyes • Tel. 51 673 765-4 • Cel. 317 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA D M A

REMISIÓN EF 08360

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cra. 51 B No. 73-65-4 • Tel. 312 321 1626

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08393

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cra. 51 B No. 73-65-4 • Tel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA D M A

REMISIÓN EF 08390

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP

Impreso por IMPRESORES • Cra. 51 B No. 73-65-4 • Tel. 312 321 1626

300

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 13 DIC 23

REMISIÓN: EF 08392

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Cam... Soacha
OBRA	Canal U4 - 202...
DIRECCION	Canal U4 Soacha
MATERIAL	Escombros
PLACA VEHICULO WGZ 292	M3 2
CONDUCTOR	Hilario
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de D...

Impreso por: IMPRESORES • Castilla Reyes • Tel: 51 873 765 4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 13/01/2023

REMISIÓN: EF 08358

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Cam... Soacha
OBRA	Canal U4 - 202...
DIRECCION	Canal U4 Soacha
MATERIAL	Escombros
PLACA VEHICULO WGZ 292	M3 15
CONDUCTOR Hilario	
DESPACHADO POR: Leonardo Devia	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. E... Servicio de Disposi... Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Castilla Reyes • Tel: 51 873 765 4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 14/01/23

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08362

CLIENTE	Consorcio Centro Soacha
OBRA	Contrato 034-2022
DIRECCION	Consorcio Centro Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO WGZ 292	15 M3
CONDUCTOR Hilario	
DESPACHADO POR: Leonardo	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Tel.: 57 (1) 785-4 • Cel.: 312 221 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 14/01/23

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08389

CLIENTE	Consorcio Centro Soacha
OBRA	Contrato 034-2022
DIRECCION	Consorcio Centro Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO BMK 397	7 M3
CONDUCTOR Alvaro	
DESPACHADO POR: Leonardo Bonilla	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Tel.: 57 (1) 785-4 • Cel.: 317 321 1626

302

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA D M A

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08361

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Cauca Soacha
OBRA	Contrato Cyclopea
DIRECCION	Cauca y Soacha
MATERIAL	Escombros
PLACA VEHICULO	M3 15
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impresa por: IMPRESORES • Gráfica Reyes • Tel: 51 873 765 4 • Cel: 317 721 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

REMISIÓN EF 08391

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cra 69c No. 51 B 73 78 5-4 • Cel. 312 321 1676

304

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alfico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA D M A

REMISIÓN EF 08377

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cúcuta Norte • tel. 5187376-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alfico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA D M A

REMISIÓN EF 08364

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	M3
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cúcuta Norte • tel. 5187376-4 • Cel. 312 321 1626

92

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldia Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA 20/12/18

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08378

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	ESCOMBRO
PLACA VEHICULO BAK 571	7 M3
CONDUCTOR Alberto	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion
Final de Escombros

Impresos por IMPRESORES • Godino Reyes • Nit. 51.813.785-4 • Cel. 312 221 1826

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldia Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA 20/12/18

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08379

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	ESCOMBRO
PLACA VEHICULO BAK 571	7 M3
CONDUCTOR Alberto	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion
Final de Escombros

Impresos por IMPRESORES • Godino Reyes • Nit. 51.813.785-4 • Cel. 312 221 1826

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldia Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA 20/11/24

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08386

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3 2
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impresos por: IMPRESORES • Carolina Reyes • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 321 1526

307

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08387

FECHA 21 11 23

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	**M3** 2
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	**RECIBIDO POR:** MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Calle 6 Bogotá • Tel. 571 873 785 4 • Cel. 312 321 1626

308

UND DE ADOQUIN

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

REMISIÓN EF 08368

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESOVES • Cra 51 B 73 78S 4 • Cel. 317 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

REMISIÓN EF 08363

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESOVES • Cra 51 B 73 78S 4 • Cel. 317 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

REMISIÓN EF 08381

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion
Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra. 53 No. 80 B-73 Int. 4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

REMISIÓN EF 08380

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion
Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra. 53 No. 80 B-73 Int. 4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA D M A

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08367

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Ciudad Bolívar • Tel: 51 873 765 4 • Cel. 312 371 1426

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA D M A

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08369

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	M3
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Ciudad Bolívar • Tel: 51 873 765 4 • Cel. 312 371 1426

311

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolucion
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08383

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cristina Reyes • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 231 1526

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08382

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cristina Reyes • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 231 1526

312

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA D M A

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08372

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3 15
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cadena Reyes • Nit. 51.873.765-4 • Cel. 313 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA D M A

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08366

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3 15
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cadena Reyes • Nit. 51.873.765-4 • Cel. 313 321 1626

37

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 6 M A

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08384

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cristina Reyes • Rif. 51 873 785-4 • Cel.: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA D M A

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08371

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Impreso por IMPRESORES • Cristina Reyes • Rif. 51 873 785-4 • Cel.: 312 321 1626

314

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA
D M A

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08373

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Carrera Reyes • Nit: 51.873.785-4 • Cel.: 312 321 1426

315

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08370

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Globo Rayo • Tel: 51 873 785 4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08385

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP. Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Globo Rayo • Tel: 51 873 785 4 • Cel. 312 321 1626

316

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT 900.877.671-0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1107

VOLQUETA SENCILLA | Placa No. WGT-292 | Fecha 6 12 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
Fundación Semilleros de Emprendimiento
NIT 900.877.671-0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1106

VOLQUETA SENCILLA | Placa No. WGT-291 | Fecha 6 12 2022

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 14 10 22

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08263

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

IMPRESORES • Cra 51 B 73-55 • Tel. 51 873 785-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08267

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

IMPRESORES • Cra 51 B 73-55 • Tel. 51 873 785-4 • Cel. 312 321 1626

317

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08262

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ES.
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 69 No. 51B-73 • Tel. 785 4 • Cel. 312 571 1826

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 07381

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 69 No. 51B-73 • Tel. 785 4 • Cel. 312 571 1826

318

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08266

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristino Reyes • Nit 51.873.765-4 • Cel. 312 321 1625

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08264

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristino Reyes • Nit 51.873.765-4 • Cel. 312 321 1625

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico, Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08376

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

IMPRESORES • Calzina Evans • Nit. 51.873.765-4 • Cel. 312 321 1676
Impreso por

320

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 21 12 16

REMISIÓN: EF 08265

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Ingreso por IMPRESORES • Cra. 51 B No. 73-65 A • Tel.: 51 87 765 4 • Cel.: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 13 12 16

REMISIÓN: EF 08273

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Comer Soacha
OBRA	Contrato 024-2016
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavadora
PLACA VEHICULO	KYO 783
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR: Leonardo Duque	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Ingreso por IMPRESORES • Cra. 51 B No. 73-65 A • Tel.: 51 87 765 4 • Cel.: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08271

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impresos por: IMPRESORES • Calima Reyes • Nit: 51.873.765-4 • Cel: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08268

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impresos por: IMPRESORES • Calima Reyes • Nit: 51.873.765-4 • Cel: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08269

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion
Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Ciudad Bolívar • NIT. 51.873.165-4 • Cel. 312 371 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición
Final de Escombros

Escombrera Municipal
El Altico. Resolución
Alcaldía Municipal de
Soacha 1202 del
21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 07382

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion
Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Ciudad Bolívar • NIT. 51.873.165-4 • Cel. 312 371 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 13 12 17

REMISIÓN EF 08258

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Gestión Rápida • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 13 12 17

REMISIÓN EF 08259

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Gestión Rápida • Nit. 51.873.785-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 14 12 22

REMISIÓN EF 08274

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Global Repro • Tel.: 571 673 765-4 • Cel.: 312 821 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 14 12 22

REMISIÓN EF 08272

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Global Repro • Tel.: 571 673 765-4 • Cel.: 312 821 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolucion Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 14 12 22

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 07384

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	SOACHO
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cristina Reyes • cel. 3103 786 4 • tel. 312 321 1627

FUNDACION SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO
NIT. 900.877.671 - 0
Proyecto de adecuación y Restauración de Suelos
Resolución CAR DGEN No 20207100963 de 18 SEPT.2020

CONTRATISTA

Nº B 1110

VOLQUETA SENCILLA

Placa No. BHC 599

Fecha 14 12 22

Celular: 313 352 6600 - 3138771274
3106135580
fusemillerosdeemprendimiento@gmail.com

36

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08270

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Imprime: [illegible] IMPRESORES • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 07383

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Imprime: [illegible] IMPRESORES • Cel. 312 321 1626

327

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

REMISIÓN EF 08275

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Cristian Rivera • Tel. 518 73 765-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA

REMISIÓN EF 08276

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposici
Final de Escom

Impreso por IMPRESORES • Cristian Rivera • Tel. 518 73 765-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 8 [illegible]

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08277

CLIENTE	Consorcio Sabana Cacho
OBRA	Contrato 024-2024
DIRECCION	Carrera 4 Cacho
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3 2
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 10a No. 51-83 Of. 705-4 • Tel. 312 371 1625

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 8 [illegible]

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08283

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 10a No. 51-83 Of. 705-4 • Tel. 312 371 1625

329

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 16 12 22

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08282

CLIENTE	Consorcio Cami... Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Carrera 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Terreno
PLACA VEHICULO K40 778	M3
CONDUCTOR	Hecto...
DESPACHADO POR: Leonardo Dena	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • NIT. 51.823.785-4 • Cel. 312 221 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 16 12 22

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08278

CLIENTE	Consorcio Cami... Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Carrera 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Terreno
PLACA VEHICULO W67 292	M3
CONDUCTOR Hilario R	
DESPACHADO POR: Leonardo Dena	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • NIT. 51.823.785-4 • Cel. 312 221 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 16 12 22

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08279

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Constructor Soacha

OBRA Contrato 1202

DIRECCION Carrera 4 Soacha

MATERIAL Escombros

PLACA VEHICULO WGZ 292. M3 2

CONDUCTOR Hilario R.

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 51 No. 73-75 A • Tel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08280

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Escombros

PLACA VEHICULO M3 2

CONDUCTOR

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 51 No. 73-75 A • Tel. 312 321 1626

22

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08284

FECHA 16 12 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Ceramic Center Soacha
OBRA	Capitulo 024-2022
DIRECCION	Terreno Soacha
MATERIAL	Escombro
PLACA VEHICULO	K40 372 — 7 M3
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR:	Fernando Bonilla
RECIBIDO POR:	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Gustavo Reyes • Tel.: 51 873 765-4 • Cel.: 317 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08317

FECHA 19 12 22

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Ceramic Center Soacha
OBRA	Capitulo 024-2022
DIRECCION	Terreno Soacha
MATERIAL	Escombro
PLACA VEHICULO	K40 372 — 7 M3
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR:	Fernando Bonilla
RECIBIDO POR:	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por IMPRESORES • Gustavo Reyes • Tel.: 51 873 765-4 • Cel.: 317 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08281

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 69 Nro. 51-873 Of. 4 • Cel. 312 321 1676

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08285

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 69 Nro. 51-873 Of. 4 • Cel. 312 321 1676

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alfico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 19 12 22

REMISIÓN: EF 08313

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Comercio Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	UCZ 292 — M3: 15
CONDUCTOR	Hilario [illegible]
DESPACHADO POR:	Leonardo Devia
RECIBIDO POR:	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Nit: 51.873.785-4 • Cel: 312 291 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alfico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 19 12 22

REMISIÓN: EF 08312

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Comercio Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	UCZ 292 — M3: 15
CONDUCTOR	Hilario [illegible]
DESPACHADO POR:	Leonardo Devia
RECIBIDO POR:	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Nit: 51.873.785-4 • Cel: 312 321 1625

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 14 12 22

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08321

CLIENTE	Consorcio Ganter Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Terreno M3
PLACA VEHICULO	BAR 799
CONDUCTOR	Marco R
DESPACHADO POR:	Leonardo Davila

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 94 Bis • No. 51 B 73 78 5-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA 14 12 22

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN EF 08316

CLIENTE	Consorcio Ganter Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Comuna 4 Soacha
MATERIAL	Excavación Terreno M3
PLACA VEHICULO	KIO 22
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR:	Leonardo Davila

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 94 Bis • No. 51 B 73 78 5-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolucion Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08311

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Gelmo Reyes • Tel: 513 873 785-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08315

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Gelmo Reyes • Tel: 513 873 785-4 • Cel. 312 321 1626

25

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: D M A

REMISIÓN EF 07385

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Tel.: 51.873.705-4 • Cel.: 312 321 1656

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: D M A

REMISIÓN EF 08314

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Tel.: 51.873.705-4 • Cel.: 312 321 1656

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 20 12 28

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08318

CLIENTE	Consorcio Canal Soacha
OBRA	Contrato 024-2017
DIRECCION	Canal A Soacha
MATERIAL	Excavacion M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Gabriel Reyes • Nit. 51.973.785-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 20 12 28

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08322

CLIENTE	Consorcio Canal Soacha
OBRA	Contrato 024-2017
DIRECCION	Canal A Soacha
MATERIAL	Excavacion M3
PLACA VEHICULO	BPK 599
CONDUCTOR	Hector
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Gabriel Reyes • Nit. 51.973.785-4 • Cel. 312 321 1626

338

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 22 12 22

REMISIÓN: EF 08354

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 69 # 63 - 85 • Tel. 51 873 705-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 22 12 22

REMISIÓN: EF 08355

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Cra 69 # 63 - 85 • Tel. 51 873 705-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 24 04 22

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08375

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Canal Soacha
OBRA	Contrato 034-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Escombro
PLACA VEHICULO	M3 2
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: INPRESORES • Cra 5 Este No. 51-03 • Tel: 5103785-4 • Cel: 312 321 1426

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 22 04 22

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08319

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Canal Soacha
OBRA	Contrato 034-2022
DIRECCION	Carrera 4 Soacha
MATERIAL	Escombro
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR: Eduardo Neira	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: INPRESORES • Cra 5 Este No. 51-03 • Tel: 5103785-4 • Cel: 312 321 1426

340

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 22 | 02 | 22

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08374

CLIENTE	Consorcio Cantera Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Gráficos Reyes • Tel.: 51 873 765-4 • Cel.: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 17 | 02 | 22

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08326

CLIENTE	Consorcio Cantera Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Gráficos Reyes • Tel.: 51 873 765-4 • Cel.: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08325

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Galan Reyes • Nit. 51.823.285-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08330

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Galan Reyes • Nit. 51.823.285-4 • Cel. 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 7 | M | 22

REMISIÓN: EF 08329

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Cemex Soacha
OBRA	Calzada Occ. Vía Canoas y Soacha
DIRECCION	
MATERIAL	Excavación en Terreno
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	Leonardo Ochoa
RECIBIDO POR:	MAGIR S.A.S. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Calibar Reyes • Nit. 51.873.765-4 • Cel. 312 207 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 7 | M | 22

REMISIÓN: EF 08327

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Cemex Soacha
OBRA	Calzada Occ. Vía Canoas y Soacha
DIRECCION	
MATERIAL	Excavación en Terreno
PLACA VEHICULO	M3
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	Leonardo Ochoa
RECIBIDO POR:	MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final de Escombros

Impreso por: IMPRESORES • Calibar Reyes • Nit. 51.873.765-4 • Cel. 312 207 1626

3 3

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08328

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Imprime por: IMPRESORES • Gislaine Reyes • Nit: 51.873.765-4 • Cel: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA

ORDEN CLIENTE No.

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

REMISIÓN EF 08324

CLIENTE	
OBRA	
DIRECCION	
MATERIAL	M3
PLACA VEHICULO	
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Imprime por: IMPRESORES • Gislaine Reyes • Nit: 51.873.765-4 • Cel: 312 321 1626

344

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 23 | 12 | 22

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08356

CLIENTE	Consorcio Bavia Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3 15
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición Final MS EFE

Impreso por: IMPRESORES • Cristino Reyes • Nit: 51.873.705-4 • Cel.: 312 321 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

CEL.: 321 206 0710
TEL: 721 1555

FECHA: 23 | 12 | 22

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 08357

CLIENTE	Consorcio Bavia Soacha
OBRA	Contrato 024-2022
DIRECCION	Soacha
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	M3 15
CONDUCTOR	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposición

Impreso por: IMPRESORES • Cristino Reyes • Nit: 51.873.705-4 • Cel.: 312 321 1626

345

RUT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

346

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14855262869

(415)7707212489984(8020) 000001485526286 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 7 3 6 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO GAMER SOACHA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 44 C 45 53 IN 2 AP 601

42. Correo electrónico gameving.sas1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 3 4 1 0 4 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 26 / 09 : 21: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre RINCON ACOSTA DANIELA
985. Cargo Representante legal Certificado

342

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

RIT.

CONSORCIO GAMER SOACHA

348

SOACHA GOBIERNO MUNICIPAL | Secretaría de Hacienda | Dirección de Impuestos Municipales

Código 01

FORMULARIO UNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

FORMULARIO No. 2210010565

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

A. OPCION DE USO

1. Inscripción [X] 2. Novedades [ ] 3. Cese de Actividades [ ]

1.1 Sujeto Pasivo ICAT [ ] 1.2 Agente de retención [X] 1.3 Impuesto Publicidad Exterior Visual [ ]

1.4 Impuesto Delineación Urbana [ ] 1.5 Otro [ ] Cual? _____

B. ES UTED PRESTADOR DE SERVICIOS AUXILIARES, TECNICOS, TECNÓLOGOS O PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL MUNICIPIO? SI [ ] NO [ ]

2. Nombre de la Entidad

3. Dirección de la entidad | 4. Número de contrato | 5. Fecha del Contrato Día Mes Año

C. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

6. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [X] CE [ ] No. 901587366 DV 8

7. Naturaleza Jurídica: Persona Natural [ ] Persona Jurídica [X] Sociedad de hecho [ ]

8. Régimen Tributario: Régimen Preferencial [ ] Régimen Común [X] Regimen Simple de Tributación [ ] Gran contribuyente [ ]

9. Nombres y apellidos o Razon Social: CONSORCIO GAMER SOACHA

10. Numero de Registro Mercantil: Ciudad BOGOTA No. Matricula 0 0 0 0

11. Fecha de matricula: Día 0 1 Mes 0 8 Año 2 0 2 2

12. Estado del registro mercantil: Inscripción [ ] Renovación [ ]

13. Dirección de notificación judicial: CRA 7 20 49

14. Departamento: CUNDINAMARCA 15. Municipio: SOACHA

16. Dirección comercial

17. Municipio: SOACHA 18. Barrio: CENTRO

17. Teléfono fijo o movil: 3158369463 18. Teléfono alterno: 3183980098 19. Correo Electrónico: CONTABILIDADGRUPOICA@GMAIL.COM

C. ¿USTED TIENE ESTABLECIMIENTO UBICADO EN SOACHA? SI [ ] NO [ ]

20. Nombre del Establecimiento Comercial

21. Direccion del Establecimiento Comercial: CRA 7 20 49 | 22. Barrio | 23. Comuna

24. Numero de Registro Mercantil del Establecimiento: Ciudad No. Matricula

25. Fecha de Matricula del Establecimiento: Día 3 1 Mes 0 8 Año 2 0 2 2

26. Estado del Registro Mercantil: Inscripcion [ ] Renovacion [ ]

D. ACTIVIDAD ECONÓMICA

27. Tipo de actividad: Industrial [ ] Comercial [ ] Servicios [X] Financiera [ ]

28. Fecha de Inicio de Actividades en el Municipio de Soacha: Día 0 1 Mes 0 8 Año 2 0 2 2

29. Código y descripción de la Actividad Económica (Código CIIU que aparece en el RUT)

Código Act. Principal 4 2 9 0 Descripción: Construcción de otras obras de ingeniería civil.

E. REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR PÚBLICO

30. Nombres y Apellidos	31. Tipo y Número de Identificación	32. CR	33. No. Tarjeta Profesional
1. MILTON EDUARDO RIVERA RINCON	1. CC: 79205702	1. 1	1.
2. ADRIANA BONILLA BERNAL	2. CC: 51920908	2. 2	2. 55341-T

F. NOVEDADES (TRASPASO - CAMBIO RAZON SOCIAL - CAMBIO DIRECCCION - CAMBIO REGIMEN - ACTUALIZACION DE DATOS)

34. Traspaso [ ] 35. Cambio razon Social [ ] 36. Cambio de dirección [ ] 37. Cambio de Régimen [ ] 38. Otros [ ] Cual? _____

39. Nombres y Apellidos del Nuevo Propietario

40. Tipo de Documento: CC [ ] NIT [ ] CE [ ] No. _____ DV __

41. Nombre Razón social

42. Numero de Registro Mercantil: Ciudad No. Matricula

43. Fecha de Matricula: Día Mes Año

44. Cambio de Regimen: Regimen Preferencial [ ] Regimen Comun [ ] Regimen Simple de tributacion [ ] Gran Contribuyente [ ]

45. Nueva Dirección | 46. Barrio | 47. Comuna | 48. Teléfono

49. Si selecciono la casilla 38 diligencie este campo la información a actualizar

G. CESE DE ACTIVIDADES

50. Causal: Fusión [ ] Escisión [ ] Liquidación [ ] Cese de actividades [ ] Clausura del establecimiento [ ] Otro [ ] Cual? _____

51. Numero de la cancelación del Establecimiento ante la Cámara de Comercio: Ciudad No. Matricula

52. Fecha de Clausura del Establecimiento o servicios prestados en el Municipio de Soacha: Día Mes Año

H. FIRMAS

La información consignada en este formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la verdad, por lo tanto indicar falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

53. Contribuyente o representante legal

Nombre

CC [ ] CE [ ] OTRO [ ] No. [ ]

SIN PERJUICIO DE LAS VERIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES REALICE:

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENE COSTO ALGUNO

¡El pago oportuno de sus impuestos genera Bienestar para todos!

EL CAMBIO AVANZA

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código postal: 250051
Pbx: 7326900 - 7328072
Soacha - Cundinamarca
www.alcaldiasoacha.gov.co

ORIGINAL DIRECCION DE IMPUESTOS

349
