Fecha : 2023-04-24 12:30:46
Folios: #1
Anexos: OFICIO CIM 046-2023 INFORME MENSUAL 6 COP 543-2022-176 FOLIOS

Alcaldía de Madrid
NIT
899999325

Madrid - Cundinamarca, 21 de Abril de 2023

Ingeniero:
HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZALEZ
Secretario de infraestructura y servicios públicos
Alcaldía Madrid – Cundinamarca
Calle 5 No 4 - 74

CIM 046-2023

REFERENCIA: INFORME MENSUAL No 6 DEL CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA".

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente me permito remitir el informe mensual No 6 que corresponde al periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2022 del contrato de obra 543 – 2022, con sus respectivos anexos

Lo anterior para fines pertinentes.

Cordialmente,

Cordialmente,

ZULAY YADIRA VASQUES PINO
R/L UNIÓN TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022
NIT: 901.580.791-3

FOLIOS 176

UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVO MADRID 2022
ut.interpolideportivosmadrid22@gmail.com
calle 8 No 10 – 02 oficina 79
321-2709494

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Bogotá, 17 de Abril de 2023

Señores

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO
UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022
Representante Legal.
Centro Comercial Bolivar OF. A10
Cucuta – Norte de Santander

ASUNTO: GCS-MAD-CO-543-042, INFORME MENSUAL No. 6 – NOVIEMBRE

REFERENCIA: CONTRATO No 543 de 2022, "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remite el informe de obra mensual No. 6 correspondiente al mes de noviembre con su respectiva revisión y aval, el cual contiene el informe de obra, SST y gestión de residuos de demolición y construcción RCD con sus respectivos anexos

Agradezco la atención prestada, quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
C. C. No. 1.126.001.358 de Londres (ING)
Tarjeta Profesional No.25202-252504 CND
NIT: 900.653.937-2

Recibí
17 · ABRIL

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

INFORME TECNICO No. 6 – MES DE NOVIEMBRE 2022

MADRID, CUNDINAMARCA


2023

Powered by CamScanner

INFORME TECNICO No. 6

PERIODO: NOVIEMBRE 01 DE 2022 – NOVIEMBRE 30 DE 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"

Elaboró: DIANA MARIA OLAYA ORTIZ	**Revisó:** DANIEL CAMILO PRADA MILLAN	**Revisó y aprobó:** JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Cargo: Ing. Auxiliar	**Cargo:** Ing. Residente	**Cargo:** Representante Legal
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:** 
Fecha: 07/12/22	**Fecha:** 13/12/22	**Fecha:** 13/12/22

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. LOCALIZACIÓN 4
4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA 5
5. INFORME TECNICO 5
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 5
5.2. RESUMEN DE OBRA 8
5.2.1. Valor de Actividades por Frentes 8
5.2.2. Porcentaje por Frentes 9
5.3. REGISTRO PERSONAL 10
5.3.1. PERSONAL 10
5.4. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO 12
5.5. MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA Y DISEÑOS 12
5.6. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 12
5.7. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA 12
5.8. REPORTE MULTAS Y SANCIONES 12
5.9. POLIZAS DEL CONTRATISTA 13
5.10. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO 13
5.11. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 13
5.12. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 14
5.13. AFECTACIONES 14
5.13.1. CONDICIONES CLIMATICAS 14
5.13.2. VANDALISMO 16
5.14. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 16
6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS 17
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 17
7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN 17
7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS 22
7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA 29
7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS 34
8. CONCLUSIÓN 37

Powered by CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Madrid - Cundinamarca, concluyo contratar a GCS CONTRUCCIONES S.A.S para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato No 543 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**

El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y consigna todas las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, cumpliendo con los aspectos técnicos y contractuales.

2. OBJETIVO

Generar un informe de rendición de cuentas del contrato de obra No. 543 de 2022, dando cumplimiento a las condiciones generales establecidas en el contrato según los requerimientos y observaciones realizadas por parte de la Interventoría y Supervisión.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**



Coordenadas 4°43'50"N 74°15'50"O

Powered by CamScanner

4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	CO- 543 - 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MADRID (CUNDINAMARCA) NIT 899.999.325-8
CONTRATISTA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
DIRECCIÓN	Calle 134 # 13-66
TELÉFONO	275 94 30
CORREO ELECTRÓNICO	gcs.construcciones@hotmail.com
ACTA DE INICIO OBRA	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.404.922.142,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

5. INFORME TECNICO

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el transcurso de este mes se llevaron a cabo las siguientes actividades:

A. Frente polideportivo del barrio Escallón:

Inicio de actividades: **16 de junio 2022**

- Relleno con Recebo B-200

Powered by CamScanner

- Corte, Figuración y amarre de acero para los elementos estructurales
  - zona critica:
    - Columnas (muro de cerramiento y graderías)
    - Vigas de cimentación (muro de cerramiento y graderías)
    - Vigas aéreas (graderías)
    - Vigas inclinadas (graderías)
  - Huella y contrahuella para las graderías
- Encofrar y fundir concreto para columnas y vigas
    - Muro de cerramiento
    - Graderías
- Mampostería en bloque de concreto para graderías
- Retiro de sobrantes
- Fundir concreto para placa de la gradería

B. Frente polideportivo del barrio San Luis:

Inicio de actividades: **22 de junio 2022**

- Corte, Figuración y amarre de acero:
    - Zapatas para la estructura de la cubierta
    - Vigas de enlace y cimentación para la estructura de la cubierta
- Excavación manual
    - Continuar excavación para la cimentación de la estructura de la cubierta
- Fundición concreto ciclópeo para cimentación estructura de la cubierta
- Retiro de escombros
- Mampostería en bloque de concreto prefabricado para los muros de la tarima
- Cajas de inspección sanitarias
- Instalación red sanitaria y red hidráulica para los baños
- Fundición de concreto para zapatas de la estructura de la cubierta
- Fundir base en concreto pobre para vigas de enlace y cimentación de la estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

- Encofrar y fundir concreto para vigas de enlace y cimentación de la estructura de la cubierta
- Fundir placa base de la tarima
- Encofrar y fundir concreto para pedestales de la cimentación estructura de la cubierta
- Relleno B-200 para cimentación estructura cubierta

C. Frente polideportivo del barrio La Magnolia:

Inicio de actividades: **20 Julio 2022**

- Excavación manual para sardinel parque infantil
- Corte, Figuración y amarre de acero
- Relleno con recebo B-200
- Retiro de material
- Mampostería en bloque de concreto prefabricado
- Descapote manual parque infantil
- Demolición escaleras y rampa de acceso parque infantil
- Fundición de sardinel parque infantil
- Fundir concreto para escaleras y rampa de acceso parque infantil

D. Frente polideportivo barrio San Carlos

Inicio de actividades: **12 agosto 2022**

- Corte figuración y amarre de acero
    - Columnas muro de cerramiento
- Demolición placa de piso
- Relleno con recebo B-200
- Encofrar y fundir concreto para columnas del muro de cerramiento
- Retiro de escombros
- Descapote manual zona parque infantil

Powered by CamScanner

5.2. RESUMEN DE OBRA

5.2.1. Valor de Actividades por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 806.875.792,00
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.428.004.293,00
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.398.078.270,00
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 771.963.787,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 4.404.922.142,00**

5.2.1.1. Valor de Actividades Ejecutadas por frente en el periodo del presente informe

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 116.758.731,66
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 142.670.005,92
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 119.329.491,43
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 52.320.386,98

5.2.1.2. Valor de Actividades Ejecutadas por frente acumulado

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 258.343.910,42
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 594.927.329,44
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 406.209.551,82
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 281.289.367,80

5.2.1.3. Valor de Actividades Ejecutadas General del proyecto

VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	**$ 431.078.615,98**
VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	**$ 1.540.770.159,47**

Powered by CamScanner

5.2.2. Porcentaje por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	18,32%
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	32,42%
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	31,74%
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	17,53%
	% TOTAL DEL PROYECTO	**100%**

5.2.2.1. Porcentaje Ejecución por Frentes en el periodo del presente informe

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	14,47%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	9,99%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	8,54%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	6,78%

5.2.2.2. Porcentaje Ejecución por Frentes acumulado

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	32,02%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	41,66%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	29,05%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	36,44%

5.2.2.3. Porcentaje Ejecución General del Proyecto

PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	9,79%
PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	34,98%

Powered by CamScanner

5.3. REGISTRO PERSONAL

El personal vinculado a la obra contó con la entrega de los elementos de protección de seguridad industrial, además contaron con la afiliación, pagos de seguridad social y parafiscales, salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensión (AFP), caja de compensación, SENA e ICBF.

5.3.1. PERSONAL

El personal del contratista – GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, en obra en el periodo del presente informe, está compuesto por:

- Director de Obra: Javier Antonio González Arenas
- Ingeniero Residente de Obra: Daniel Camilo Prada Millán
- Asesor eléctrico: Carlos Julio Acevedo Ferreiro
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo: Daniel Mauricio Oler Restrepo
- Topógrafo: Leonel Eduardo López Duran
- Coordinador de Obra: José Lamus Rodríguez
- Asesor Estructural: Nicolas Alfonso Correa Duarte

ID		CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO
ING	1	ING. Auxiliar	Diana Maria Olaya Ortiz	1.073.176.550	Activo
PSS	1	ING. SISO Auxiliar	Etna Daniela Mora Salinas	1.007.569.303	Activo
MS	2	Maestro	José Omar Ortega Ortega	13.644.481	Activo
MS	3	Maestro	Derlen Fabián Becerra	1.102.717.527	Activo
OF	2	Oficial	Luis Camaro Cantillo	4.740.593	Retirado
OF		Oficial / Maestro	Luis Alfredo Palomino Pertuz	1.064.116.331	Activo
OF	4	Oficial	Wilman Lima Palomino	79.991.959	Activo
OF	5	Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	Activo
OF	6	Oficial	José Stiven Chávez Sanchez	1.069.926.042	Activo
OF	7	Oficial	Carlos Santana Obregón	1.051.737.892	Activo
OF	8	Oficial	Dagoberto Mora Téllez	9.167.984	Retirado

Powered by CamScanner

AY	2	Ayudante	José Guillermo Rubio Chivata	6.761.189	Activo
AY	3	Ayudante	Fredi Alonso Navarro Baquero	1.073.239.511	Retirado
AY	5	Ayudante	Oscar Daniel Torres Vanegas	1.070.970.219	Activo
AY	7	Ayudante	Daniel Enrique Arias Figueroa	1.081.797.879	Activo
AY	11	Ayudante	José Mauricio Contador Echeverria	1.095.571	Activo
AY	17	Ayudante	Pablo Emiro Bermon Rojas	5.414.671	Activo
AY	33	Ayudante	Marcelino Bouriyu Machado	5.184.210	Retirado
AY	37	Ayudante	Barón Martinez Epinayu	17.945.714	Activo
AY	41	Ayudante	Cristhian José Rivas Carrasquero	27.164.347	Retirado
AY	45	Ayudante	Adalberto Omas Blanco	1.065.828.837	Retirado
AY	46	Ayudante	Andres Antonio Ipuana	1.124.077.746	Activo
AY	49	Ayudante	Juan David Quintero Cespedes	1.105.784.091	Retirado
AY	50	Ayudante	Ángel Miguel Lima Palomino	1.063.484.703	Activo
AY	54	Ayudante	Julio Cesar Delgado Castro	1.065.667.422	Activo
AY	55	Ayudante	William Andres Lima Mejía	1.192.771.091	Activo
AY	61	Ayudante	Dairon Hernández	1.073.171.132	Activo
AY	68	Ayudante	Alfredo José Epieyu Epinayu	1.124.540.026	Activo
AY	69	Ayudante	Samuel Rocha Villalba	1.002.423.265	Activo
AY	70	Ayudante	Nelson Rocha Obregón	73.584.580	Activo
AY	71	Ayudante	Esteban Santana Villalba	1.002.426.760	Activo
AY	72	Ayudante	José David Acevedo Diaz	1.073.169.486	Retirado
AY	76	Ayudante	Orlando Diaz Cuellar	94.322.911	Retirado
AY	77	Ayudante	Cristian David Ospina	1.073.166.763	Retirado
AY	78	Ayudante	Brayan Fabian Martinez	1.003.616.842	Retirado
AY	79	Ayudante	Vicente Epieyu Epieyu	1.192.726.939	Activo
AY	80	Ayudante	Jhon Jairo Chávez Rodríguez	1.075.629.705	Activo

Notas: En el transcurso del mes de noviembre, se presentó la incorporación de personal nuevo, así como el retiro de varios empleados; en la tabla anterior se relaciona el estado actual del personal (31/11/2022).

Powered by CamScanner

5.4. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación, se encuentra el listado de maquinaria y equipo empleado que se encuentran en obra y en los diferentes frentes a desarrollar:

Cantidad	Descripción
1	Retroexcavadora
1	Minicargador – Bobcat
5	Volqueta capacidad mayor 6 m3
2	Pulidora 9"
3	Pulidora 4 1/2"
-	Herramienta menor
2	Demoledor manual
2	Andamio

5.5. MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA Y DISEÑOS

Esta información se encuentra reposada en la primera cuenta de cobro allegada a la supervisión, además, el contratista se encuentra realizando balance con relación a las cantidades contractuales de cada actividad con el fin de radicar próximamente un modificatorio.

5.6. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Los ensayos realizados, así como los resultados de estos mismos, fueron anexados en la primera cuenta de cobro.

5.7. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra durante el periodo de ejecución del presente informe. (ANEXO No. 1)

5.8. REPORTE MULTAS Y SANCIONES

No se reportaron multas ni se adelantaron procesos de sanciones durante el periodo del presente informe.

Powered by CamScanner

5.9. POLIZAS DEL CONTRATISTA

Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma del SECOP

5.10. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO

- El contratista cuenta con una oficina en el barrio Escallón (Carrera 10° # 15-29), de igual manera se está almacenando el material, herramientas de construcción y demás elementos en bodega, que se encuentra ubicada en el mismo barrio, en el predio colindante (parqueadero). Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.
- En el polideportivo del barrio San Luis, se construyó un campamento en el interior de la obra, además, se cuenta con el alquiler del salón comunal del barrio San Luis, donde se guarda material y herramientas de la obra.

- En el polideportivo del barrio La Magnolia, se cuenta con el cuarto eléctrico y se alquiló un container para el almacenamiento de materiales y equipo. Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.
- En el polideportivo San Carlos, el contratista cuenta con el alquiler de dos (2) bodegas ubicadas en el frente del polideportivo (Carrera 21 6B Sur), para el almacenamiento de equipo y herramientas. Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.

5.11. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Todo el material generado por las actividades como excavación o demolición en los diferentes frentes de trabajo es apilado en puntos estratégicos dentro de las obras para posteriormente ser retirado implementando volquetas, retroexcavadora y bodcat hacia botaderos certificados. Estos certificados se anexan trimestralmente en el informe ambiental.

5.12. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

Frente polideportivo Escallón:

Se evidencia la presencia de un cuerpo de agua colindante con el cerramiento del

Powered by CamScanner

polideportivo por la parte posterior y a la medianía con el predio correspondiente con el parqueadero, el cual, afecta considerablemente la ejecución de las actividades debido a la constante presencia de agua en el terreno a trabajar; esto se contrarresto con la implementación de una motobomba con el fin de poder continuar con las actividades. Además, en el periodo del presente informe se siguen presentando inconvenientes debido a este cuerpo de agua que colinda con el terreno del polideportivo y a las condiciones climáticas, lo que generan retrasos en las actividades desarrolladas en el transcurso de este mes.

Frente polideportivo San Luis:

En el área de influencia de este frente, no se presenta ningún paso o cuerpo de agua; pero si se genera inconvenientes en tiempos de lluvia, debido a que el polideportivo no cuenta con cubierta, lo que genera empozamiento de agua y afectaciones a las condiciones del terreno.

Frente polideportivo La Magnolia:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

Frente polideportivo San Carlos:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

5.13. AFECTACIONES

5.13.1. CONDICIONES CLIMATICAS

En el transcurso del sexto mes de ejecución del proyecto, se presentaron inconvenientes por las condiciones climáticas (lluvia) en diversos días de trabajo en todos los frentes de los polideportivos. (Anexo No. 2)

Frente Polideportivo Escallón:

- Dificultad para el trabajo y retraso en el desarrollo de las actividades por parte del personal con relación a las actividades correspondientes a la cimentación:

Powered by CamScanner

1. Excavación, 2. Concreto ciclópeo, 3. Concreto para zapatas y columnas (pedestales) y 4. Relleno con recebo B-200, ya que, para poder continuar con estas labores, se debía retirar inicialmente el agua empozada.

- Detención de actividades, ya que algunos días se presentó abundante lluvia y no se cuenta con cubierta en el área de trabajo (muro de cerramiento – gradería) por lo cual se frenan las actividades que se estaban desarrollando por la seguridad y salud de los trabajadores.

Frente Polideportivo San Luis:

- Debido a que este polideportivo no cuenta con cubierta, las labores se interrumpen cuando se presenta precipitación, por lo cual, se debe detener toda actividad que se esté desarrollando.

- Se evidencia empozamiento de abundante agua en las excavaciones para la cimentación de la estructura de la cubierta, producto de las condiciones climáticas y nivel freático del terreno.

Frente Polideportivo La Magnolia:

- En el periodo del presente informe, para este frente se reporta empozamiento de agua en las excavaciones posterior a las precipitaciones presentadas en el transcurso de este mes.

Frente Polideportivo San Carlos:

- Para este frente se reporta empozamiento de agua en las excavaciones posterior a las precipitaciones presentadas.

Debido a que, tanto en el transcurso de este sexto mes como en los anteriores desde que se dio inicio a las labores en cada frente se han presentado inconvenientes con el factor climático, se evidencian retrasos en las actividades y a su vez se reportan retrasos en los porcentajes de avance de acuerdo con lo programado para cada frente de trabajo.

Powered by CamScanner

5.13.2. VANDALISMO

Frente Polideportivo Escallón:

En el periodo del presente informe no se reporta el hurto de material y herramientas de la obra. El contratista cuenta con celador en el horario nocturno con el fin de evitar estas acciones.

Frente Polideportivo San Luis:

En el periodo del presente informe, no se reporta inconvenientes por hurto de materiales y herramientas, ya que estas se guardan en almacén (salón comunal) al finalizar jornada laboral diariamente.

Frente Polideportivo Magnolia:

En el periodo del presente informe no se reporta perdida de materiales o herramientas de la obra. Para este frente se cuenta con personal de celaduría para el horario nocturno.

Frente Polideportivo San Carlos:

En el periodo del presente informe no se reporta ningún inconveniente relacionado con el hurto de materiales o herramientas de la obra. Para este frente, se cuenta con personal de celaduría con el fin de prevenir el hurto de acero de la obra.

5.14. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Las modificaciones en los diseños de los polideportivos presentados a interventoria y supervisión, se encuentran aprobados:

Frente polideportivo Escallón:

- Ubicación de las graderías: A borde con las columnas de la cubierta
- Ubicación de la placa de piso: Centrada con relación a la cubierta

Powered by CamScanner

Frente polideportivo San Luis:

- Niveles de la tarima: Nivel 0 = -0,4m por temas de seguridad con relación a la altura.

El contratista se encuentra realizando modificaciones de diseños, para aprobación de interventoría:

Frente polideportivo Magnolia:

- Diseño de baños, no contemplados inicialmente

Frente polideportivo San Luis:

- Diseño de la cubierta del polideportivo

6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS

En el periodo del presente informe No se registran inspecciones de obra en los diferentes frentes de trabajo.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

Relleno con recebo B-200 debidamente compactado



Powered by CamScanner



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Corte, figuración y amarre de acero



encofrar y fundir concreto para columnas y vigas



Powered by CamScanner



Mampostería en bloque de concreto para las graderías



Retiro de sobrantes




Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Fundir concreto para placa de las graderías





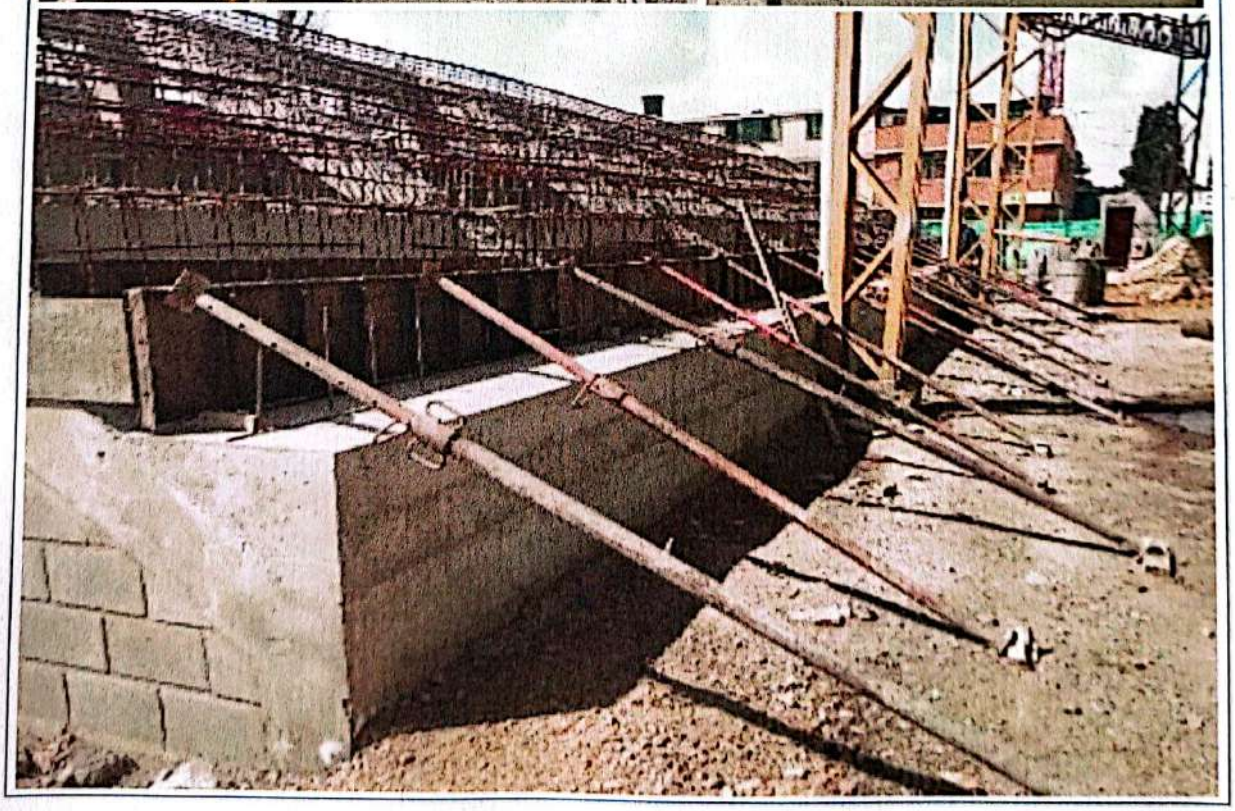

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS

Corte, figuración y amarre de acero









Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Excavación




Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Demolición cimiento enterrado





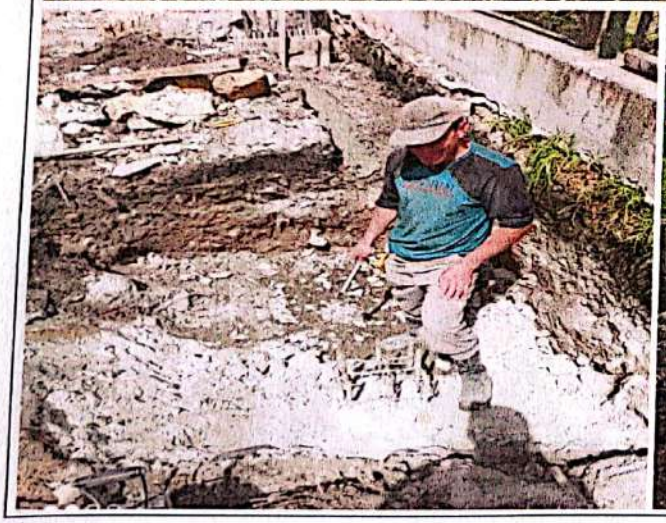


Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Fundición concreto ciclopeo y concreto para zapatas para estructura de la cubierta





Retiro de escombros




Mamposteria en bloque de concreto prefabricado




Powered by CamScanner



Cajas de inspección sanitarias





Powered by CamScanner

Instalación red sanitaria y red hidraulica



Fundición base en concreto pobre y fundicipon de vigas de cimentación y enlace de la estructura de la cubierta



Powered by CamScanner

Refuerzo en malla electrosoldada y placa base en concreto para los baños






Fundición de concreto para pedestales de cimentación estructura de la cubierta





Powered by CamScanner

Relleno con recebo B-200



7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA

Excavación manual



Powered by CamScanner

Corte, Figuración y amarre de acero



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Relleno con recebo B-200







Demolición rampa y escaleras acceso parque infantil




Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Retiro de sobrantes





Mamposteria en bloque de concreto prefabricado





Descapote manual





Powered by CamScanner

Fundir concreto para sardinel





Fundir concreto para escaleras y rampa acceso parque infantil







Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS

Fundición de concreto para columnas








Corte, figuración y amarre de acero




Powered by CamScanner

Relleno con recebo B-200




Demolición sección placa de piso






Retiro de sobrantes




Powered by CamScanner

Descapote manual zona urbana

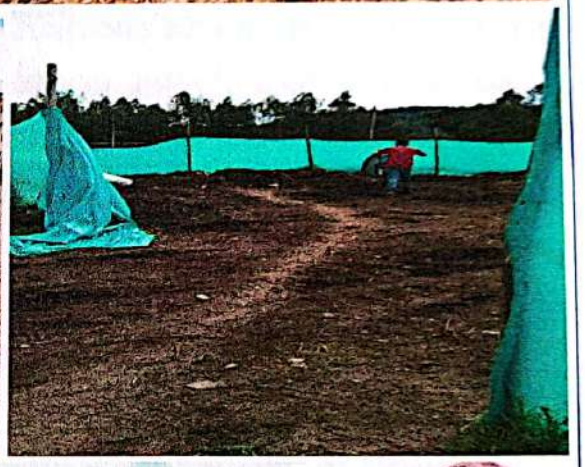


Powered by CamScanner

8. CONCLUSIÓN

Se concluye que el proyecto referente al contrato de obra No. 543 de 2022 que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".** suscrito entre la Alcaldía de Madrid (CUNDINAMARCA) y GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, presento el avance de ejecución de las actividades contratadas respecto al mes seis (6) y las obras que a su vez fueron ejecutadas de conformidad con la interventoría y la supervisión por parte del municipio.

Se continúan actividades de acuerdo a programación y avance de acuerdo al debido proceso constructivo para cada frente de trabajo, para lo cual se evidencia un retraso en el desarrollo de las mimas producto de los inconvenientes presentados en los meses anteriores con relación a las condiciones climáticas (abundante lluvia).

Powered by CamScanner

ANEXO 1.
BITACORA

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

572 - 2022.

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

OBRA:
CONSTRUCCION: OBRA NUEVA- ADECUACION- CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO SAN CARLOS

FECHA INICIO
12 AGO 2022

01 Noviembre 2022

Estado del Clima
Nublado / Presencia de lluvia

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor

Actividades de obra:
1. Demolicion placa de piso.
2. Excavacion manual.
3. Acopio de material

02 de Noviembre 2022

Estado del Clima
Nublado / Tarde bastante lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
oficial de obra
Maestro de obra.
Ayudantes de obra (3)

Actividades de obra:
1. Corte, Figuracion y amarre de acero.
2 Demolicion de placa de piso y acopio de material

Powered by CamScanner

03 Noviembre 2022
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra
Ayudantes de obra • (3)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora
Actividades de obra:
1. Corte, Figuracion y amarre de acero.
2. Encofrar y fundir columnas de cerramiento.
3. Relleno con recebo B-200.

Estado del Clima:
Nublado
Poco Soleado

04 Noviembre 2022
Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (2)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora.
Actividades de obra:
1. Encofrar y fundir concreto para columnas de cerramiento.
2. Amarre de acero.

Estado del Clima
Nublado

05 Noviembre 2022 Estado del Clima: Nublado / Poco Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipos
Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra:
1. Desencofrar y encofrar columnas de cerramiento y viga de cimentacion.
2. Fundir concreto para viga de cimentacion y columnas de cerramiento.
3. Amarrar acero.

D M

08 Noviembre 2022 Estado del clima
Personal en obra: Nublado
Residente de obra.
Residente de interventoria.
oficial de obra. Maestro de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Desencofrar y Encofrar columnas.
2. Amarrar acero
3. Fundir Concreto para columnas

D M

Powered by CamScanner

09 Noviembre 2022 Estado del clima Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra:
1. Amarrar acero.
2. Relleno con recebo B-200
3. Desencofrar y Encofrar columnas
4. Fundir concreto para columnas.

DM

10 Noviembre 2022 Estado del Clima
Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Amarrar acero.
2. Desencofrar y encofrar columnas
3. Fundir concreto para columnas
4. Relleno con recebo B-200 debidamente compactado.

DM

Powered by CamScanner

11 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado / Poco Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra:
1. Desencofrar y encofrar columnas de cerramiento
2. Relleno con recebo B-200.
3. Fundir base en concreto pobre.
4. amarrar acero.
5. Encofrar y Fundir concreto para viga

12. Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado con presencia de lluvia

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra:
1. Desencofrar y encofrar columnas
2. Amarrar acero
3. Fundir concreto para columnas

Powered by CamScanner

15 Noviembre 2022 Estado del clima:
Nublado / Poco Soleado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
oficial de obra
Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo B-200.
2. Desencofrar y encofrar columnas de cerramiento.
3. Amarrar acero.
4. Fundir concreto para columnas.

DMV

16 Noviembre 2022 Estado del clima:
Nublado con presencia de lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo B-200.
2. Amarra acero.
3. Desencofrar y encofrar columnas de cerramiento
4. Fundir concreto para columnas.

DMV

Powered by CamScanner

17 Noviembre 2022

Estado del clima: Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo B-200.
2. Amarre de acero.
3. Desencofrar y encofrar columnas
4. Fundir concreto para columnas

18 Noviembre 2022

Estado del clima: Nublado Poco Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria:
Maestro de obra.
Oficial de obra.
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor.

Actividades de obra:
1. Descapote manual
2. Acopio de material.
3. Desencofrar columnas de cerramiento.
4. Relleno con recebo B-200

Powered by CamScanner

14 Noviembre 2022 — Estado del dora: Nublado

Personal en dora
- Residente de dora
- Residente de interventoria
- Maestro de dora — Operario Bobcat
- Oficial de dora — operarios Volquetas
- Ayudantes de dora (3)

Maquinaria y Equipo
Volquetas Bobcat Herramienta menor.

Actividades de dora
1. Descapote manual.
2. Acopio de material
3. Retiro de escombros

21 Noviembre 2022 — Estado del clima: parcialmente nubl

Personal en dora:
- Residente de dora.
- Residente de interventoria.
- Oficial de dora.
- Ayudantes de dora (2)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. Mezcladora.

Actividades de dora:
1. Descapotar y Encofrar columnas
2. Amarrar acero.
3. Fundir concreto para columnas de cerramien

Powered by CamScanner

22 Noviembre 2022

Estado del clima:
Soleado
Poco Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
oficial de obra
Ayudantes de obra (1)

operario Bobcat
operarios volquetas

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor

Bobcat Volquetas

Actividades de obra:
1. Retiro de escombros
2. Descapote manual
3. Acopio de material

23 Noviembre 2022

Estado del clima
Parcialmente nublado
Tarde Lluviosa.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
oficial de obra
Ayudantes de obra (2)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor.

Actividades de obra:
1. Descapote manual
2. Acopio de material

Powered by CamScanner

24 Noviembre 2022

Estado del clima: Nublado con presencia de lluvia

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Oficial de obra.
Ayudantes de obra. (1)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor.
Actividades de obra:
1. Descapote manual
2. Excavacion manual
3. Acopio de material.

DMA

25 Noviembre 2022

Estado del clima: Soleado / Poco Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra:
Residente de interventoria.
oficial de obra.
Ayudantes de obra. (2)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor.
Actividades de obra:
1. Descapote manual
2. Acopio de material.

Nota: En el horario de la tarde, todo el personal del frente del polideportivo San Carlos se transporta al frente del polideportivo San Luis; debido a la falta de materia para continuar labores en este frente.

DMA

26 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Nublado

28 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Parcialmente Nublado

29 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Nublado.

30 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Soleado / Poco Nublado

01 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Parcialmente nublado
Poco Soleado

02 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Parcialmente Nublado
Tarde Lluviosa.

03 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Poco Soleado y
Parcialmente nublado

Powered by CamScanner

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO.

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLÓN.

FECHA INICIO:

16 JUN 2022

impulsado por CamScanner

Powered by CamScanner

52

31 Octubre 2022

Estado del Clima
Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficiales de obra (2)
Ayudantes de obra. (8)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor
Mezcladora
Actividades de obra:
1. Excavacion manual para red hidraulica de la tarima
2. instalacion tuberia hidraulica
3. Fundicion de concreto ciclopeo.

01 Noviembre 2022

Estado del Clima
Nublado
Poco Soleado

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficiales de obra (2)
Ayudantes de obra (8)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor
Mezcladora
Actividades de obra:
1. Excavacion manual para cimentacion estructura de la cubierta.
2. Fundicion base en concreto pobre.
3. Fundicion Concreto Ciclopeo

Powered by CamScanner

02 Noviembre 2022

Estado del Clima
Nublado
Poco Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficiales de obra (2)
Ayudantes de obra (8)
Director de obra.

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra
1 Excavacion manual
2. Muro en blogue de concreto para paredes de la tarima
3. Fundicion de concreto ciclopeo

03 Noviembre 2022

Estado del clima
Soleado
Poco Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficiales de obra (2)
Ayudantes de obra (8)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra
1. Muro en blogue de concreto para paredes de la tarima
2. Excavacion manual
3. Fundicion concreto ciclopeo
4. Fundicion base en concreto pobre

Powered by CamScanner

04 Noviembre 2022 Estado del Clima Nublado / Parc. Nubl.

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- oficial de obra (1)
- Ayudantes de obra (2)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra:
1. Muro en bloque de concreto para paredes de la fachada.
2. Excavacion manual
3. Demolicion Cimiento enterrado
4. Fundicion base en concreto pobre.
5. Fundicion Concreto Ciclopeo.

05 Noviembre 2022 Estado del clima Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (8)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Mezcladora.

Actividades de obra.
1. Muro en bloque de concreto para la fachada
2. Excavacion red hidraulica.
3. Demolicion cimiento enterrado
4. Inicio instalacion red hidraulica y Sanitaria.

Powered by CamScanner

08 Noviembre 2022

estado del clima
Soleado
Para Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (8)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Demoledor manual

Actividades de obra
1. Excavacion para red hidraulica
2. Excavacion para rampa.
3. Demolicion cimiento enterrado.
4. Muro en bloque de concreto para tanque

09 Noviembre 2022

estado del clima
Nublado con
presencia de lluvia

Personal en obra:
Director de obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra (1) / oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

NOTA: se presento precipitacion, la cual retraso las actividades.

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora. Apisonador

Actividades de obra.
1. Excavacion manual para instalacion red sanitaria. baños de la tienda.
2. Demolicion cimiento enterrado pedestales existentes anteriormente al inicio de obra.
3 Relleno con recebo cimentacion estructura de la cubierta.
4. Fundicion de concreto ciclopeo cimentacion estructura de la cubierta.

Powered by CamScanner

10 Noviembre 2022

Estado del clima
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Apisonador
Actividades de obra:

1. Relleno con recebo para cimentacion estructura de la cubierta y tarima.
2. Fundacion de concreto ciclopeo
3. Descapote manual
4. Cajas de inspeccion.
5. instalacion red sanitaria e hidraulica.

11 Noviembre 2022

Estado del clima:
Nublado poco soleado.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora Apisonador.
Actividades de obra:

1. Relleno con recebo para la tarima.
2. instalacion tuberia red hidraulica y sanitaria
3. Fundicion concreto ciclopeo. cimentacion estructura de la cubierta
4. Excavacion manual cimentacion estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

12 Noviembre 2022

Estado del clima
Soleado Poco Nublado.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Apisonador Mezcladora

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo para la tarima.
2. Fundicion concreto ciclopeo estructura de la cubierta.
3. Excavacion manual para cimentacion de la cubierta

NOTA: En el transcurso de la semana se presentaron retrasos relacionados a las actividades de cimentacion para la estructura de la cubierta, producto del empozamiento de agua en las excavaciones

15 Noviembre 2022

Estado del Clima.
Nublado con presencia de lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra. (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

NOTA: Se evidencia empozamiento de agua en todo el terreno debido a las lluvias presentadas en dias anteriores.

Maquinaria y Equipo:
• Herramienta menor • Demoledor manual • Mezcladora • Apisonador.

Actividades de obra:
1. Demolicion cimiento pedestales existentes.
2. Fundicion concreto ciclopeo. Cimentacion cubierta
3. Excavacion manual cimentacion cubierta.
1. Relleno para la tarima.

Powered by CamScanner

16 Noviembre 2022

Estado del clima
Nublado para
soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1) · operadores volquetas
Oficial de obra (1) · Operario Retroexcavadora
Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo:
· Herramienta menor. · Demoledor manual · Mezcladora

Actividades de obra:
1. Demolición cimiento enterrado
2. Excavacion manual
3. Retiro de sobrantes
4. base en concreto pobre.
5. Malla de acero para vigas de enlace
6. Fundicion concreto ciclopeo

D.M

17 Noviembre 2022

Estado del clima
Nublado con
presencia de lluvia

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1) · operadores volquetas
Oficial de obra (1) · operario Retroexcavadora.
Ayudantes de obra (7).

Maquinaria y Equipo:
· Herramienta menor · Mezcladora · Demoledor manual.

Actividades de obra:
1. Demolicion cimento enterrado.
2. Excavacion manual.
3. Retiro de sobrantes
4. Fundicion Concreto ciclopeo y concreto para vigas de enlace cimentacion estructura de la cubierta.

5

18 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra (2)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (7)
- operarios vdgetas
- operario Bobcat

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor · Demoledor manual · Mezcladora

Actividades de obra:
1. Reverzo malla electrosoldada para placa de piso de la tarima.
2. Fundicion concreto para placa base de la tarima.
3. Excavacion manual cimentacion estructura de la cubierta.
4. Amarre de acero para zapatas y columnas de la estructura de la cubierta.
5. Fundicion viga de enlace cimentación cubierta.
6. Retiro de sobrantes

DMV

19 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado presencia de lluvia.

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria.
- Maestro de obra (2)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (6)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor · Mezcladora · Demoledor manual.

Actividades de obra:
1. Excavacion manual
2. Demolicion concreto enterrado
3. Fundicion concreto ciclopeo y concreto para vigas estructura de la cubierta.

Powered by CamScanner

21 Noviembre 2022 — Estado del clima: Soleado, Tarde poco lluvioso

- Personal en obra:
  - Residente de obra
  - Residente de interventoria
  - Maestro de obra (1)
  - Oficial de obra (2)
  - Ayudantes de obra (7)
  - Operarios Vulgacetas
  - Operario Bobcat

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor
- Demoledor manual
- Mezcladora

Actividades de obra:
1. Demolicion concreto enterrado.
2. Excavacion manual
3. Fundicion concreto ciclopeo.
4. Amarre de acero para zapatas y columnas para estructura de la cubierta.
5. Fundicion Concreto para zapatas de la cubierta

22 Noviembre 2022 — Estado del clima: Soleado poco Nublado

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra (2)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor
- Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Excavacion manual
2. Retiro de sobrantes
3. Fundicion de concreto para zapatas de la cubierta.
4. Amarre de acero.

Powered by CamScanner

23 Noviembre 2022

Estado del clima:
Nublado con
Presencia de lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

·Operario volquetas
·operario Bobcat

Maquinaria y Equipo.
· Herramienta menor · Mezcladora

Actividades de obra:
1. Fundicion concreto para zapatas y pedestales para cimentacion estructura de la cubierta.
2. Demolicion cimiento enterrado
3. Retiro de sobrantes.
4. Fundicion concreto ciclopeo y concreto para vigas.
· cimentacion estructura de la cubierta.

24 Noviembre 2022

Estado del clima:
Soleado
Tarde nublado y con presencia de lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo
· Herramienta menor · Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Amarre de acero
2. Excavacion y fundicion de concreto ciclopeo para cubierta.
3. Fundicion de concreto para zapatas y pedestales estructura de la cubierta.
4. Relleno con recebo para cimentacion estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

23 Noviembre 2022

Estado del clima.
Nublado con
Presencia de lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

- Operario volqueta
- Operario Bobcat

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor - Mezcladora

Actividades de obra:
1. Fundicion concreto para zapatas y pedestales para cimentacion estructura de la cubierta.
2. Demolicion cimiento enterrado
3. Retiro de sobrantes.
4. Fundicion concreto ciclopeo y concreto para vigas.
- cimentacion estructura de la cubierta.

24 Noviembre 2022

Estado del clima:
Soleado
Tarde nublada y con
presencia de lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor - Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Amarre de acero
2. Excavacion y fundicion de concreto ciclopeo para cubierta.
3. Fundicion de concreto para zapatas y pedestales estructura de la cubierta.
4. Relleno con recebo para cimentacion estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

25 Noviembre 2022

Estado del clima.
Nublado para Soleado
Tarde lluviosa

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Director de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes de obra (4)
Oficiales de obra (2)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Demoledor manual. Mezcladora. Aposonador.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo para cimentacion estructura de la cubierta
2. Fundicion de concreto para zapatas y pedestales de la cubierta
3. Amarre de acero.
4. Demolicion de cimiento enterrado.

26 Noviembre 2022

Estado del clima:
Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipos:
Herramienta menor. Mezcladora. Aposonador. Vibro compactador

Actividades de obra.
1. Fundicion de concreto para zapatas y pedestales de la cubierta
2. Fundicion de concreto ciclopeo y concreto para vigas de la estructura de la cubierta.
3. Amarre de acero para zapatas, vigas y columnas.

Nota: En el transcurso de la semana se evidencio presencia de lluvia, lo cual provoco empozamiento de agua en el la.....

Powered by CamScanner

28 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Vibrador manual [illegible]

Actividades de obra.
1. Vaciado vigas y columnas + Cimiento enterrado
2. Retiro de sobrantes
3. Relleno con recebo común debidamente compactado
4. Encofrar viga de amarre muro de cerramiento
5. Amarre de acero.

29 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado

Personal en obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoría.
- Maestro de obra.
- Oficial de obra (2)
- Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora Vibrador manual Vibrocompactador

Actividades de obra:
1. Retiro de sobrantes
2. Vaciado vigas y Columnas + Cimiento enterrado
3. Fundir concreto para viga de amarre del muro de cerramiento
4. Relleno con recebo común debidamente Compactado

Powered by CamScanner

30 Noviembre de 2022

Estado del Clima:
Nublado / Parcialmente.
Soleado.

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoría
- Maestro de obra.
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Encofrar y Fundir columnas.
2. Amarre de acero.
3 Relleno con recebo común debidamente compactado.

DMF

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

543 - 2022.

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

OBRA:
CONSTRUCCION : OBRA NUEVA - ADECUACION - CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO LA MAGNOLIA

FECHA INICIO:
20 JUL 2022.

impulsado por CamScanner

Powered by CamScanner

Estado del Clima
Nublado

31 Octubre 2022
Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
oficiales de obra (2)
Ayudantes de obra. (8)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora
Actividades de obra:
1. Excavacion manual para red hidraulica de la tarima
2. instalacion tuberia hidraulica
3. Fundicion de concreto ciclopeo.

01 Noviembre 2022
Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
oficiales de obra (2)
Ayudantes de obra (8)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora
Actividades de obra:
1. Excavacion manual para cimentacion estructura de la cubierta
2. Fundicion base en concreto pobre.
3. Fundicion Concreto Ciclopeo

Estado del Clima:
Nublado
Poco soleado

Powered by CamScanner

02 Noviembre 2022 — Estado del Clima: Nublado, Poco Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- oficiales de obra (2)
- Ayudantes de obra (8)
- Director de obra.

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Actividades de obra
1. Excavacion manual
2. Muro en bloque de concreto para paredes de la fachada
3. Fundicion de concreto ciclopeo

03 Noviembre 2022 — Estado del clima: Soleado, Poco Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- oficiales de obra (1)
- Ayudantes de obra (8)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora

Actividades de obra
1. Muro en bloque de concreto para paredes de la fachada
2. Excavacion manual
3. Fundicion concreto ciclopeo
4. Fundicion base en concreto pobre

Powered by CamScanner

04 Noviembre 2022 Estado del Clima Nublado / Parc. Nubl.

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- Oficial de obra (1)
- Ayudantes de obra (2)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Mezcladora

Actividades de obra:
1. Muro en bloque de concreto para paredes de la tarima.
2. Excavacion manual
3. Demolicion Cimiento enterrado
4. Fundicion base en concreto pobre.
5. Fundicion Concreto Ciclopeo.

05 Noviembre 2022 Estado del Clima Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (8)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor Mezcladora.

Actividades de obra.
1. Muro en bloque de concreto para la tarima
2. Excavacion red hidraulica.
3. Demolicion cimiento enterrado
4. Inicio instalacion red hidraulica y Sanitaria.

Powered by CamScanner

08 Noviembre 2022 — estado del clima: Estable Para trabajar

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- oficial de obra (1)
- Ayudantes de obra (8)

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor — Demoledor manual

Actividades de obra
1. Excavacion para red hidraulica
2. Excavacion para ramca
3. Demolicion cimiento enterrado.
4. Muro en bloque de concreto para fachada

09 Noviembre 2022 — estado del clima: Nublado con presencia de lluvia

Personal en obra:
- Director de obra.
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Maestro de obra (1) / oficial de obra (1)
- Ayudantes de obra (7)

NOTA: Se presento persa tarde, la cual retraso las actividades.

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor — Mezcladora. — Vibrisonador

Actividades de obra.
1. Excavacion manual para instalacion red sanitaria. baños de la fachada.
2. Demolición cimiento enterrado pedestales existentes anteriormente al inicio de obra.
3. Relleno con recebo cimentacion estructura de la cubierta.
4. Fundicion de concreto ciclopeo cimentacion estructura de la cubierta.

Powered by CamScanner

10 Noviembre 2022

Estado del clima
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Apisonador
Actividades de obra:

1. Relleno con recebo para cimentacion estructura de la cubierta y tarima.
2. Fundacion de concreto ciclopeo
3. Descapote manual
4. Cajas de inspeccion.
5. instalacion red sanitaria e hidraulica.

11 Noviembre 2022

Estado del clima:
Nublado poco soleado.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora Apisonador.
Actividades de obra:

1. Relleno con recebo para la tarima.
2. instalacion tuberia red hidraulica y sanitaria
3. Fundicion concreto ciclopeo. cimentacion estructura de la cubierta
4. Excavación manual cimentacion estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

12 Noviembre 2022

Estado del clima
Sabado Poco Nublado.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Apisonador Mezcladora

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo para la tarima.
2. Fundicion concreto ciclopeo estructura de la cubierta.
3. Excavacion manual para cimentacion de la cubierta

NOTA: En el transcurso de la semana se presentaron retrasos relacionados a las actividades de cimentacion para la estructura de la cubierta, producto del encharcamiento de agua en las excavaciones

15 Noviembre 2022

Estado del clima.
Nublado con presencia de lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra. (1)
oficial de obra. (1)
Ayudantes de obra (7)

NOTA: Se evidencia empozamiento de agua en todo el terreno debido a las lluvias presentadas en dias anteriores.

Maquinaria y Equipo:
· Herramienta menor · Demoledor manual · Mezcladora · Apisonador.

Actividades de obra:
1. Demolicion Cimiento pedestales existentes.
2. Fundicion concreto ciclopeo. Cimentacion cubierta
3. Excavacion manual cimentacion cubierta.
4. Relleno para la tarima.

Powered by CamScanner

16 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado para variado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra (2) — operadores volquetas
- Oficial de obra (1) — operario Retroexcavadora
- Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Demoledor manual
- Mezcladora

Actividades de obra:
1. Demolición cimiento enterrado
2. Excavacion manual
3. Retiro de sobrantes
4. base en concreto pobre.
5. Malla de acero para vigas de enlace.
6. Fundicion concreto ciclopeo

D M

17 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado con presencia de lluvia

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Maestro de obra (2) — operadores volquetas
- Oficial de obra (2) — operario Retroexcavadora.
- Ayudantes de obra (7).

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor
- Mezcladora
- Demoledor manual.

Actividades de obra:
1. Demolicion cimento enterrado.
2. Excavacion manual.
3. Retiro de sobrantes
4. Fundicion Concreto ciclopeo y concreto para vigas de enlace cimentacion estructura de la cubierta.

D M

Powered by CamScanner

18 Noviembre 2022 Estado del clima
Nublado

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra (2)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (7)
- operarios volquetas
- operario Bobcat

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor · Demoledor manual · Mezcladora

Actividades de obra:
1. Reverzo malla electrosoldada para placa de piso de la tarima.
2. Fundicion concreto para placa base de la tarima.
3. Excavacion manual cimentacion estructura de la cubierta.
4. Amarre de acero para zapatas y columnas de la estructura de la cubierta.
5. Fundicion viga de enlace cimentación cubierta.
6. Retiro de sobrantes

DMV

19 Noviembre 2022 Estado del clima:
Nublado
presencia de lluvia.

Personal en obra:
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra (2)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (6)

Maquinaria y Equipo:
· Herramienta menor · Mezcladora · Demoledor manual

Actividades de obra:
1. Excavacion manual
2. Demolicion concreto enterrado
3. Fundicion concreto ciclopeo y concreto para viga: estructura de la cubierta.

DMV

MKB

Powered by CamScanner

21 Noviembre 2022

Estado del clima
Soleado
Tarde para lluvias

- Personal en obra:
  - Residente de obra
  - Residente de interventoria
  - Maestro de obra (1)
  - Oficial de obra (2)
  - Ayudantes de obra (7)
  - Operarios Vulgares
  - Operario Bobcat

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor
- Demoledor manual
- Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Demolicion concreto enterrado.
2. Excavacion manual.
3. Fundicion concreto ciclopeo.
4. Amarre de acero para zapatas y columnas para estructura de la cubierta.
5. Fundicion Concreto para zapatas de la cubierta

22 Noviembre 2022

Estado del clima:
Soleado poco Nublado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Maestro de obra (2)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor
- Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Excavacion manual
2. Retiro de sobrantes
3. Fundicion de concreto para zapatas de la cubierta.
4. Amarre de acero.

Powered by CamScanner

23 Noviembre 2022

Estado del clima
Nublado con
Presencia de lluvia

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

- Operario volqueta
- Operario Bobcat

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor
- Mezcladora

Actividades de obra:
1. Fundicion concreto para zapatas y pedestales para cimentacion estructura de la cubierta.
2. Demolicion cimiento enterrado
3. Retiro de sobrantes.
4. Fundicion concreto ciclopeo y concreto para vigas.
- cimentacion estructura de la cubierta.

24 Noviembre 2022

Estado del clima:
Soleado
Tarde nublado y con presencia de lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (7)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor
- Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Amarre de acero
2. Excavacion y Fundicion de concreto ciclopeo para cubierta.
3. Fundicion de concreto para zapatas y pedestales estructura de la cubierta.
4. Relleno con recebo para Cimentacion estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

25 Noviembre 2022

Estado del clima.
Nublado para Soleado
Tarde lluviosa

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Director de obra
Maestro de obra (1)
Ayudantes de obra (4)
Oficiales de obra (2)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Demoledor manual. Mezcladora. Aposonador.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo para cimentacion estructura de la cubierta.
2. Fundicion de concreto para zapatas y pedestales de la cubierta
3. Amarre de acero.
4. Demolicion de cimiento enterrado.

D M

26 Noviembre 2022

Estado del clima:
Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora. Aposonador. Vibro compactador

Actividades de obra:
1. Fundicion de concreto para zapatas y pedestales de la cubierta
2. Fundicion de concreto ciclopeo y concreto para vigas de la estructura de la cubierta.
3. Amarre de acero para zapatas, vigas y columnas.

Nota: En el transcurso de la semana se evidencio presencia de lluvia, lo cual provoco empozamiento de agua en el terreno.

D M

Powered by CamScanner

63

28 Noviembre 2022

Estado del clima.
Soleado parcialmente
Nublado
Tarde para Lluviosa.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (1)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor · Demoledor manual Apisonador · Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Excavacion y Demolición para proceso constructivo de cimentacion de la estructura de la cubierta.
2. Fundicion de concreto ciclopeo, concreto para vigas, zapatas y pedestales de la estructura de la cubierta.
3. Relleno con recebo debidamente compactado.
4. Amarre de acero.

D.M

29 Noviembe 2022

Estado del clima.
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
•Herramienta menor •Demoledor manual •Apisonador •Mezcladora.

Actividades de obra.
1. Excavacion manual y Demolicion cimento pedestales existentes.
2. Fundicion concreto ciclopeo, concreto para: zapatas, vigas y pedestales
3. Amarre de acero para zapatas vigas y pedestales.
4. Relleno con recebo B-200 debidamente compactado.

D.M

Powered by CamScanner

64

30 Noviembre 2022 Estado del Clima:
Nublado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (6)

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor .Mezcladora .Aprisionador .Vibrador.

Actividades de obra:
1. Excavacion manual y demolicion de cimiento enterrado
2. Fundicion de concreto ciclopeo, base en concreto pobre, concreto para zapatas, pedestales y vigas de la estructura de la cubierta.
3. Relleno con recebo debidamente compactado
4. Retiro de sobrantes.
5. Amarre de acero.

Powered by CamScanner

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS

FECHA INICIO:

22 JUN 2022.

impulsado por CamScanner

Powered by CamScanner

31 octubre 2022

Estado del clima
Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor ·Mezcladora ·Vibro compactador.

Actividades de obra.
·1. Relleno con recebo debidamente compactado
·2. Fundir base en concreto pobre.
·3. Amarrar acero.
·4. Descapote manual.

DMJ

01 Noviembre 2022

Estado del Clima.
Nublado
Poco Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficiales de obra (1)
Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor ·Mezcladora ·Vibro compactador

Actividades de obra.
1. Descapote manual
2. Relleno con recebo debidamente compactado.
3. Corte y Figuracion de acero
4. Excavacion manual para Cimentacion gradericas y muro de cerramiento.

DMJ

Powered by CamScanner

02 Noviembre 2022 — Estado del clima: Nublado, Poco Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor. Vibrocompactador Mezcladora

Actividades de obra.
1. Relleno con recebo debidamente compactado
2. Fundir base en concreto pobre.
3. Encofrar y fundir Concreto para viga de amarre
4. Descapote manual
5. Figuracion y amarre de acero.

03 Noviembre 2022 — Estado del clima: Soleado, Poco Nublado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor - Mezcladora - Vibrocompacto.

Actividades de obra
1. Excavacion manual
2. Fundir base en concreto pobre y viga de amarre
3. Encofrar y fundir concreto para vigas y Columnas.
4. Muro en bloque de concreto para el cerramiento.
5. Descapote manual
6. Corte, figuracion y amarre de acero

Powered by CamScanner

04 Noviembre 2022 — Estado del clima: Lubiendo Poco Soleado

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
Oficiales de obra (2)
Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor. - Mezcladora - Vibrocompactador.

Actividades de obra
1. Encofrar y fundir concreto para Columnas.
2. Descapote manual
3. Excavacion manual
4. Encofrar y fundir Viga aerea (Eje 2 y 3)
5. Relleno con recebo debidamente compactado.

05 Noviembre 2022 — Estado del Clima: Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Maestro de obra (1)
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. - Mezcladora. - Vibrocompactador.

Actividades de obra.
1. Excavacion y Descapote manual → Retiro de sobrantes.
2. Relleno con recebo comun debidamente compactado. (Zona cultivo)
3. Muro en bloque de concreto.
4. Corte, figuracion y amarre de acero.

Powered by CamScanner

08 Noviembre 2022

Estado del clima
Soleado
Poco Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra (1)
Ayudantes de obra. (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor · .Vibrocompactador

Actividades de obra.
1. Relleno con recebo comun compactado.
2. Muro en bloque de concreto para cerramiento y gradena
3. Acero Figurado y amarre de acero.
4. Encofrar vigas inclinadas gradena.

DM

09 Noviembre 2022

Estado del clima
Nublado con presencia de lluvia
Tarde bastante lluvias

Personal en obra.
Director de obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de oficial (1)
Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor ·vibrocompactador ·Mezcladora

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo debidamente compactado
2. Muro en bloque de concreto prefabricado para baños (gradenas)
3. Corte, figuracion y amarre de acero para pasos y contrapaso de las gradenas
4. Fundicion de concreto para Columnas y vigas aereas de la gradena

84

Powered by CamScanner

10 Noviembre 2022

Estado del Clima.
Soleado poco
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor. ·Vibrocompactador . Mezcladora

Actividades de obra
1. Relleno con recebo comun debidamente compactado.
2. Encofrar lados gradería.
3. Corte, figuración y amarre de acero
4. Encofrar y fundir concreto para vigas aereas de la gradería

DM

11 Noviembre 2022

Estado del clima.
Nublado poco
Soleado
Tarde poco lluviosa.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor. ·Vibrocompactador · Mezcladora.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo común compactado mecanicamente.
2. fundición de concreto para viga aerea gradería
3. Corte, figuración y amarre de acero para huellas y contra huellas de la gradería
4 Encofrar y fundir concreto para placa de la gradería

D.M

Powered by CamScanner


12 Noviembre 2022

Estado del clima
Soleado Poco
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (4)

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor Mezcladora vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo común debidamente compactado
2. Encofrar y fundir concreto para placa de la gradena.
3. Corte, figuracion y amarre de acero






15 Noviembre 2022

Estado del Clima.
Nublado con presencia de lluvia

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor. ·Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Excavacion y Descapote manual
2. Encofrar y fundir concreto para columnas
3. Subbase y relleno debidamente compactado
4. Muro en bloque de concreto





Powered by CamScanner

16 Noviembre 2022

Estado del clima:
Nublado

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor. · Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Corte, figuracion y amarre de acero.
2. Encofrar y fundir concreto para columnas
3. Descapote manual
4. Relleno con recebo

17 Noviembre 2022

Estado del clima:
Nublado con presencia de lluvia.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (10)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor. · Mezcladora - Vibrocompactador

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo camión
2. Descapote manual
3. Encofrar pasos y contrapasos graderia.
4. Amarre de acero.
5. Muro en bloque de concreto

Powered by CamScanner

18 noviembre 2022 Estado del clima.
Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
·Maestro de obra.
Oficial de obra (2)
Ayudante de obra (10)

Maquinaria y Equipo
·Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo comun debidamente compactado.
2. Descapote manual
3. Fundicion de concreto para placa de la graderia.
4. Anclaje de acero para pases y contrapases de la graderia.
5. Muro en bloque para bancos de la graderia

DMV

19 Noviembre 2022 Estado del clima:
Nublado
Tarde Lluviosa.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudante de obra. (8)

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor: Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra
1. Relleno con recebo comun debidamente compactada
2. Encofrar pases y contrapasos graderia
3. Descapote manual y Retiro de escombros.
4. Muro en bloque de concreto

88

21 noviembre 2022

Estado del clima
Soleado
Tarde con presencia de lluvia.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra. (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor. Mezcladora. Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Retiro de Escombros.
2. Relleno con recebo común debidamente compactado
3. Corte, Figuracion y amarre de acero.
4. Encofrar pasos y contrapasos de la gradena.

22 noviembre 2022

Estado del clima
Soleado poco Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Retiro de Escombros.
2. Relleno con recebo común debidamente compactado
3. Corte, Figuracion y amarre de acero.
4. Encofrar y fundir concreto para placa de las gradenas

Powered by CamScanner

23 Noviembre 2022 — Estado del Clima: Nublado, Tarde lluviosa

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Retiro de sobrantes
2. Relleno con recebo comun compactado.
3. Acero Figurado.
4. Encofrar placa para pasos y contrapasos graderia
5. Encofrar y fundir concreto para Vigas aereas

DM

24 Noviembre 2022 — Estado del Clima: soleado, Tarde lluvosa.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra.
Oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo.
- Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo comun debidamente compactado.
2. Encofrar y fundir concreto para vigas aereas de la graderia.
3. Corte, figuracion y amarre de acero.
4. Encofrar placa para pasos y contrapasos de la graderia

Powered by CamScanner

25 Noviembre 2022

Estado del clima
Soleado / Poco Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
·Herramientamenor. Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Retiro de escombros.
2 Encofrar y fundir placa para pasos y contrapasos de la gradería
3 Encofrar y fundir Viga aerea gradería
4 Corte, Figuracion y amarre de acero.
5. Relleno con recebo comun debidamente compactado.

Dmf

26 Noviembre 2022

Estado de Clima:
Nublado.

Personal en obra:
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora ·Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo comun compactado
2. Encofrar y fundir anapelo para viga aerea
3. Corte, figuracion y amarre de acero.

Powered by CamScanner

28 noviembre 2022

Estado del clima.
Nublado
Poco Soleado
Tarde lluviosa

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra.
Oficial de obra. (2)
Ayudantes de obra. (9)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Demoledor manual. Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Demolicion Vigas y columnas + Cimiento entelado
2. Retiro de sobrantes
3. Relleno con recebo comun debidamente compactado.
4. Encofrar viga de amarre muro de cerramiento
5. Amarre de acero.

29 Noviembre 2022

Estado del clima.
Nublado

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora Demoledor manual Vibrocompactador

Actividades de obra:
1. Retiro de sobrantes
2. Demolicion Vigas y Columnas + Cimiento entelado
3. Fundir concreto para viga de amarre del muro de cerramiento
4. Relleno con recebo comun debidamente Compactado

Powered by CamScanner

30 Noviembre de 2022

Estado del Clima:
Nublado / Parcialmente Soleado.

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoría
- Maestro de obra.
- oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
- Herramienta menor. Mezcladora. Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Encofrar y fundir columnas.
2. Amarre de acero.
3. Relleno con recebo común debidamente compactado.


DMF

Powered by CamScanner

ANEXO 2.
REPORTE DE LLUVIAS

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com


Powered by CamScanner

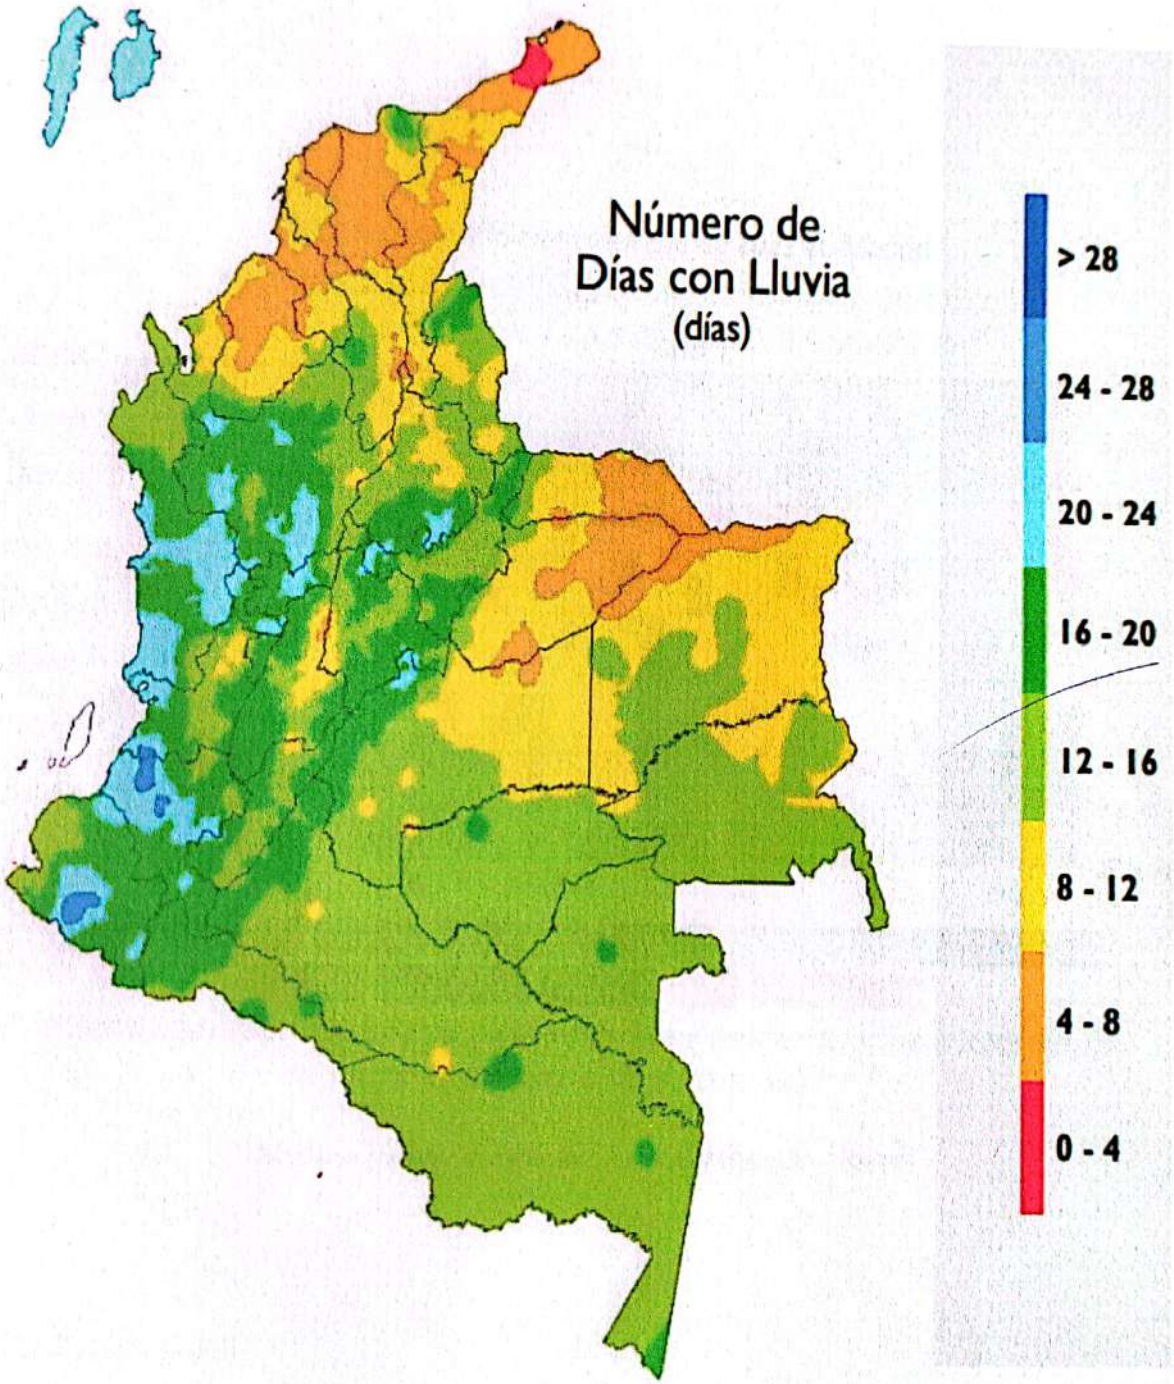

Fuente: IDEAM - Boletín_Climatológico_Noviembre_2022

Powered by CamScanner

Tiempo observado en noviembre de 2022 en Madrid

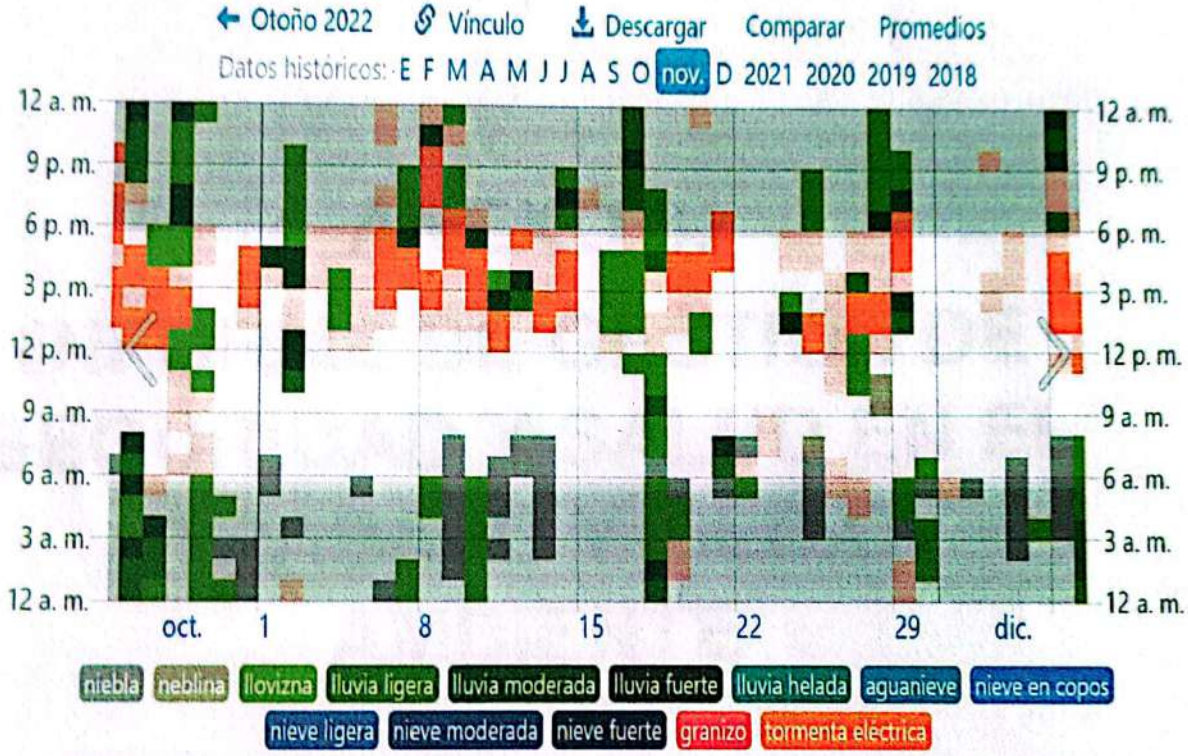

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.

Días con presencia de lluvia: 25 días (MES NOVIEMBRE)

© WeatherSpark.com

Powered by CamScanner

ANEXO 3.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

Powered by CamScanner

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

MADRID, CUNDINAMARCA

2022

Powered by CamScanner

Contenido

ALCANCE 3
OBJETIVOS 3
DEFINICIONES 4
4. MANEJO DE HERRAMIENTAS 5
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 5
a. Protección de la cabeza 5
b. Protección de los pies 5
c. Protección de las manos y piel 5
d. Protección visual 6
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
7. DISPOSICIÓN DEL PERSONAL 9
8. INDUCCIÓN 9
9. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 9
10. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 11
11. INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13
12. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES 14
13. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES 14
a. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 14
CONCLUSIONES 16

Powered by CamScanner

DATOS DE ENTRADA

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

TIEMPO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2022

ALCANCE

Aplica al total de los colaboradores y encargados de la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

OBJETIVOS

Capacitar al personal de trabajo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplicados durante la ejecución del proyecto.

Establecer las medidas mínimas de seguridad en el trabajo para la realización de las actividades propias del objeto del contrato de obra

Powered by CamScanner

DEFINICIONES

so: evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación.

VID-19: Siglas de Coronavirus 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es una ermedad respiratoria causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que ha diseminado desde China o más de 170 países alrededor del mundo, incluida ombia.

ergencia de salud pública: Evento extraordinario que constituye un riesgo para alud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la ermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada.

rumbe: Desprendimiento de una porción de suelo o roca de una excavación y lesplazamiento súbito hacia la excavación por caída o deslizamiento.

acio confinado: Cuando los medios de entrada y salida son restringidos, con el acio adecuado para permitir las labores por el personal.

avación: Es el corte, depresión, cavidad o zanja hecha mecánica o manualmente el fin de remover tierra, arena, grava, rajón, recebo u otro material.

ona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de un año para ular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar sistemas de prevención otección, elaborar especificaciones de trabajo, proyectos o productos acorde o establecido a la normativa.

ma de protección: Significa un método (inclinación, puntales, entibados o es escalonados) para proteger a los trabajadores de un derrumbe, de riales que podrían caer o rodar en la excavación o por el colapso de estructuras dantes.

: Es el material no consolidado o semi consolidado compuesto de la mezcla rtículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y en diferentes cantidades es de materias orgánicas los cuales se encuentran sobre la corteza terrestre.

, trinchera: Excavación estrecha realizada en la tierra donde generalmente la ndidad es superior al ancho de esta.

jo en Alturas: Se refiere a todas y cada una de las actividades que se rollan a partir de 1,5m de altura donde se establece el uso de sistemas de ción tales como cuerdas, líneas de vida o arneses

Powered by CamScanner

4. MANEJO DE HERRAMIENTAS

Las diferentes actividades establecidas para la ejecución de los cuatro (4) Polideportivos del Municipio de Madrid Cundinamarca, requieren del uso de una serie de herramientas y equipos los cuales tienen la capacidad de afectar al personal de trabajo en función del uso que se le pueda dar; por ello al ingresar a obra se realizan las indicaciones de seguridad al personal que la manipulara evitando de esta forma la posible materialización de accidentes de origen laboral.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Las condiciones de trabajo en área de la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto y el diseño de tareas se necesita el uso de elementos de protección personal (EPP) como lo son casco de seguridad, protección visual, protección auditiva, botas de seguridad con puntera y guantes, contando además con supervisión en seguridad y salud en el trabajo para asegurar que el personal trabajador usen los elementos de protección y trabajen de forma adecuada en pro de la seguridad.

a. Protección de la cabeza

Los objetos que caen, el izaje de cargas y los elementos sobresalientes se pueden presentar en cualquier lugar de las obras en ejecución, una herramienta pequeña o material que cae puede causar lesiones graves o incluso la muerte, esta afectación al personal se puede presentar cuando el trabajador realiza su actividad o se desplaza de un lado a otro; por ello se realiza énfasis en el uso permanente de los cascos de seguridad en obra, sobre todo en las áreas donde se está ejecutando trabajos en alturas.

b. Protección de los pies

Las lesiones en los pies se pueden presentar por sucesos como punzones debido a presencia de clavos que no han sido doblados o retirados adecuadamente de material como madera, golpes por herramienta o aplastamientos debido a caída de materiales. Sin embargo estos riesgos se minimizan usando el calzado de seguridad apropiado, esto dependerá de la índole del trabajo que se realice observando si existe o no la exposición a trabajos en excavación los cuales requerirán de un tipo de calzado especifico como bota de caucho caña alta con puntera que brinde la protección adecuada para trabajar sobre superficies húmedas, para las demás actividades se podrá contar con botas de material con puntera.

c. Protección de las manos y piel

Las manos son uno de las partes del cuerpo fundamentales para el desarrollo de actividades volviéndose sumamente vulnerables a las lesiones como heridas

Powered by CamScanner

abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras derivados del uso y manipulación de materiales, herramientas y equipos, siendo evitables con el uso permanente de protección personal adecuada como guantes.

d. Protección visual

Los ojos durante la ejecución de las diferentes actividades se encuentran expuestos a proyección de fragmentos, esquirlas, polvo y radiación entre otros, las cuales pueden llegar a generar lesiones o hasta la pérdida de la visión en actividades como corte, perforación, demolición, afinado, soldadura, pañete, preparación de mezclas, manipulación de objetos punzantes, etc.

Estos riesgos se pueden identificar y controlar de modo parmente por medio del uso adecuado en las máquinas con accesorios completos, guardas de seguridad en máquinas como pulidoras o tronzadoras y el uso de gafas de seguridad, caretas de seguridad o caretas para soldar los cuales son ayudas prácticas para mantener la integridad física del trabajador.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la siguiente tabla se relaciona el personal activo durante mes de noviembre; se incluyen a las personas que se contrataron, y por diversos motivos (se exponen en la misma tabla, en la columna denominada "Observaciones") se desvincularon en el transcurso del mismo mes.

ID		CARGO	NOMBRE	CC
DR	1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING	1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL	1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS	1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP	1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO	1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodríguez	1.020.776.092
AES		AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

Powered by CamScanner

ADMINISTRATIVO-OPERATIVO					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**Fecha Ingreso**	**Fecha desafiliación**	**Observaciones**
ING. Auxiliar	Diana Maria Olaya Ortiz	1.073.176.550	1/06/2022		
ING. SST Auxiliar	Etna Daniela Mora Salinas	1.007.569.303	27/07/2022		

MAESTROS DE OBRA					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**Fecha ingreso**	**Fecha desafiliación**	**Observaciones**
Maestro	Jose Omar Ortega Ortega	13.644.481	24/08/2022		
Maestro	Luis Alfredo Palomino	1.064.115.331	28/09/2022		
Maestro	Jose Bernardo Rodriguez	13.644.813	1/09/2022		
Maestro	Derlen Fabian Becerra	1.102.717.527	10/10/2022		

OFICIALES					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**Fecha ingreso**	**Fecha desafiliación**	**Observaciones**
Oficial	Luis Camaro Cantillo	4.740.593	10/08/2022	02/11/2022	Renuncia
Oficial	Wilman Lima Palomino	79.991.959	24/08/2022		
Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	23/08/2022		
Oficial	José Steven Chaves	1.069.926.042	21/09/2022		

AYUDANTES					
CARGO	**NOMBRE**	**CC**	**Fecha ingreso**	**Fecha desafiliación**	**Observaciones**
Ayudante	José Guillermo Rubio Chivata	6.761.189	23/06/2022		
Ayudante	Oscar Daniel Torres Vanegas	1.070.970.219	9/07/2022		
Ayudante	Daniel Enrique Arias	1.081.797.879	11/07/2022		
Ayudante	José Mauricio Contador	1.095.571	12/07/2022		
Ayudante	Pablo Emiro Bermon Rojas	5.414.671	19/07/2022		
Ayudante	Baron Martinez Epinayu	17.945.714	9/08/2022		

Powered by CamScanner

Ayudante	Cristhian Jose Rivas	27.164.347	16/08/2022	1/11/2022	Renuncia
Ayudante	Adalberto Omas Blanco	1.065.828.837	22/08/2022	1/11/2022	Retiro
Ayudante	Andres Antonio Ipuana	1.124.077.746	23/08/2022		
Ayudante	Juan David Quintero	1.105.784.091	24/08/2022	2/11/2022	Renuncia
Ayudante	Ángel Miguel Lima Palomino	1.063.484.703	24/08/2022		
Ayudante	Julio Cesar Delgado Castro	1.065.667.422	2/09/2022		
Ayudante	William Andrés Lima Mejía	1.192.771.091	2/09/2022		
Ayudante	Alfredo José Epieyu Epinayu	1.124.540.026	23/09/2022		
Ayudante	Dairon Eduardo Hernández	1.073.171.132	23/09/2022		
Ayudante	Nelson Rocha Obregón	73.584.580	27/09/2022		
Ayudante	Esteban David Santana	1.002.426.760	27/09/2022		
Ayudante	Samuel Rocha Villalba	1.002.423.265	27/09/2022		
Ayudante	Jose David Acevedo Diaz	1.073.169.486	4/10/2022	2/11/2022	Renuncia
Ayudante	Carlos Santana Obregon	1.051.737.892	11/10/2022		
Ayudante	Dagoberto Mora Tellez	9.167.984	11/10/2022	2/11/2022	Renuncia
Ayudante	Marcelno Bouriyu Machado	5.184.210	19/10/2022	1/11/2022	Renuncia
Ayudante	Orlando Diaz Cuellar	94.322.911	14/10/2022	1/11/2022	Retiro
Ayudante	Angel Cecilio Torres Ipuana	17.900.524	19/10/2022		
Ayudante	Cristian David Ospina	1.073.166.763	15/10/2022	1/11/2022	Retiro
Ayudante	Brayan Fabian Martinez	1.003.616.842	15/10/2022	2/11/2022	Renuncia
Ayudante	Fredi Alonso Navarro	1.073.239.511	19/10/2022	2/11/2022	Retiro
Ayudante	Vicente Epieyu Epieyu	1.192.726.939	21/10/2022		
Ayudante	Jhon Jairo Chavez Rodriguez	1.075.629.705	25/10/2022		

Nota: durante el mes de noviembre no se ingresó personal nuevo a los proyectos.

Anexo 1. Planillas de seguridad social

Powered by CamScanner

7. DISPOSICIÓN DEL PERSONAL

El personal es apto para realizar las respectivas labores como ayudantes, oficiales y maestros de acuerdo con entrevista laboral realizada por coordinador de obras y empresa.

8. INDUCCIÓN

Se realiza por parte del maestro encargado de obra inducción acerca del manejo de máquinas equipos y herramientas, en acompañamiento de personal SST, a cada uno de los ayudantes y oficiales que ingresan y estarán ejecutando actividades de mayor complejidad, como es el caso de:

- Manejo de pulidoras
- Manejo de demoledor manual
- Manejo de tronzadora
- Manejo de mezcladoras
- Manejo de cierra circular
- Manejo de pisón compactador

9. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el periodo del mes de noviembre se realizan actividades de capacitación, charlas y calistenia a todo el personal activo en los diferentes frentes de trabajo (San Luis, Escallon, Magnolia y San Carlos) ejecutados al iniciar labores brindando temas como:

- Trabajo en equipo
- Riesgo biológico
- Orden y limpieza
- El respeto
- Primeros auxilios (desmayos)
- Uso de EPP
- La electricidad puede ser un enemigo mortal

Powered by CamScanner

Registro fotográfico No. 1 Capacitación de personal a cargo de profesional SST.










Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner

Registro fotográfico No. 2 Pausas y calistenias.



10. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Durante el mes de noviembre se hizo entrega al personal de los siguientes elementos de protección personal

- Guantes: se entregó guantes de seguridad a todo el personal y se realiza los correspondientes cambios por daño debido al uso.
- Dotación (camisa – pantalón): Se realiza entrega de dotación al personal con mayor antigüedad en la obra.
- Botas: Se realiza entrega al personal con mayor antigüedad en obra.

Powered by CamScanner

- Gafas y caretas de seguridad: se realiza la entrega de estos elementos para protección facial del personal en obra.
- Cascos de seguridad: se realiza entrega de casco de seguridad a todo el personal.

Registro fotográfico No.3. Entrega y uso de EPP por parte del personal en obra



Anexo 2. Formato Registro entrega de dotación.

Powered by CamScanner

11. INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El manejo de los equipos empleados en el periodo del presente informe estuvo a cargo del siguiente personal:

Pulidoras

- Daniel Arias – Ayudante
- Wilman Lima – Ofcial
- Andres Ipuana – Ayudante
- Oscar Torres – Ayudante
- Faber morales – Oficial
- Steven Chaves – Oficial
- Samuel Rocha – Ayudante

Taladro demoledor

- Daniel Arias – Ayudante
- Wilman Lima – Ofcial
- Andres Ipuana – Ayudante
- Faber morales – Oficial
- Juan David Quintero – ayudante

Tronzadora

- Daniel Arias – Ayudante
- Wilman Lima – Ofcial
- Andres Ipuana – Ayudante
- Faber morales – Oficial
- Steven Chaves – Oficial
- Samuel Rocha – Ayudante

Mezcladora

- Daniel Arias – Ayudante
- Wilman Lima – Ofcial
- Andres Ipuana – Ayudante
- Oscar Torres – Ayudante
- Faber morales – Oficial
- Cristian Rivas – Ayudante

Pisón compactador

- Oscar Torres – Ayudante
- Pablo Bermon – Ayudante

El personal restante, solo empleo herramientas menores.

Powered by CamScanner

12. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES

Se realiza inspección del uso de los elementos de protección del personal actual de la obra, encontrando que la mayoría están utilizando los EPP durante sus labores; para el personal que por motivos de incomodidad u olvido que no estaban usando sus elementos de protección, se les informo de la importancia del uso y el cumplimiento de estos.

13. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES

POYECTO: **CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022** "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

a. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Para el periodo comprendido entre 01 al 30 de noviembre de 2022 se presentaron cero (0) accidentes, cero (0) incidentes y (0) días de ausentismo laboral.

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se ausentaron por enfermedad general o diligencias personales, en el periodo del presente informe.

DATOS DE AUSENTISMO LABORAL MES DE NOVIEMBRE						
ID	Ausencia por causa de salud	No. horas de ausencia por EL	Ausencia por EL	No. Horas ausencia citas medicas	No. De horas diligencias personales	No. Total, horas de ausentismo
Administrativo - Operativo						
Diana Olaya	0	0	0	0	0	0
Daniela Mora	0	0	0	0	0	0
Maestros de obra						
José Omar Ortega Ortega	0	0	0	0	0	0
Luis Alfredo Palomino	0	0	0	0	0	0
José Bernardo Rodríguez	0	0	0	0	0	0
Derlen Fabian Becerra	0	0	0	0	0	0
Oficiales						
Luis Camaro Cantillo	0	0	0	0	4	4
Wilman Lima Palomino	0	0	0	0	0	0
Faber Augusto Morales	0	0	0	0	0	0

Powered by CamScanner

José Steven Chaves	0	0	0	0	12	12
Ayudantes						
José Guillermo Rubio	0	0	0	0	0	0
Oscar Daniel Torres	0	0	0	0	0	0
Daniel Enrique Arias	0	0	0	0	8	8
José Mauricio Contador	0	0	0	0	0	0
Pablo Emiro Bermon Rojas	0	0	0	0	0	0
Baron Martinez Epinayu	0	0	0	0	0	0
Cristhian Jose Rivas	0	0	0	0	4	4
Adalberto Omas Blanco	0	0	0	0	0	0
Andres Antonio Ipuana	0	0	0	0	0	0
Juan David Quintero	0	0	0	0	12	12
Ángel Miguel Lima Palomino	0	0	0	0	0	0
Julio Cesar Delgado Castro	0	0	0	0	0	0
William Andrés Lima Mejía	0	0	0	0	8	8
Alfredo José Epieyu	0	0	0	0	0	0
Dairon Eduardo Hernández	0	0	0	0	0	0
Nelson Rocha Obregón	0	0	0	0	0	0
Esteban David Santana	0	0	0	0	0	0
Samuel Rocha Villalba	0	0	0	0	0	0
Jose David Acevedo Diaz	0	0	0	0	0	0
Carlos Santana Obregon	0	0	0	0	0	0
Dagoberto Mora Tellez	0	0	0	0	0	0
Marcelno Bouriyu Machado	0	0	0	0	0	0
Orlando Diaz Cuellar	0	0	0	0	0	0
Angel Cecilio Torres Ipuana	0	0	0	0	0	0
Cristian David Ospina	0	0	0	0	8	8
Brayan Fabian Martinez	0	0	0	0	0	0
Fredi Alonso Navarro	0	0	0	0	0	0
Vicente Epieyu Epieyu	0	0	0	0	4	4
Jhon Jairo Chavez	0	0	0	0	0	0

Trabajadores que se ausentaron por enfermedad general:

No se presentó ausentismo por enfermedad general.

Trabajadores que se ausentaron sin excusa justificada:

- Vicente Epieyu
- Cristian David Ospina

Powered by CamScanner

- Cristian Rivas
- Willian Lima
- Juan David Quintero
- Jose Steven Chaves
- Luis Camaro

CONCLUSIONES

- Se abarco todo el personal informando las condiciones a las cuales se encuentran expuestos en obra y la importancia del uso de adecuado de los EPP, el trabajo en equipo y otros temas en pro del cuidado integral de la salud y la seguridad en sus labores.
- Se logró mantener los niveles de accidentalidad y enfermedad laboral en 0 durante la ejecución de actividades en el periodo de noviembre.

DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
Profesional en seguridad salud y trabajo

Powered by CamScanner

AFILIACIONES PERSONAL RETIRADO MES DE NOVIEMBRE

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 19 de Octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000020 - OBRA MADRID, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número dentificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
79167984	MORA TELLEZ DAGOBERTO	11/10/2022		82019122	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

RETIRADO

i desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí ntenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único e generación válido por un mes:C10306505802229239179

lentamente,

irección de Afiliaciones y Recaudos

te certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación portante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

te certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/10/2022 10:52:59 .
s trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
s coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

ección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 18 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 OBRA MADRID			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C5184210	BOURIYU MACHADO MARCELINO	19/10/2022		15119920	DEPENDIENTE	POR INICIAR

RETIRADO

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/10/2022 09:53:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 14 de Octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000020 - OBRA MADRID, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1003616842	MARTINEZ BRAYAN FABIAN	15/10/2022		V2292131	DEPENDIENTE	POR INICIAR

RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10306505802228761590

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/10/2022 17:06:30 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000020 - OBRA MADRID, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1105784091	QUINTERO CESPEDES JUAN DAVID	26/08/2022		145193xR	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10306505802226955831

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000020 - OBRA MADRID, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
X27164347	RIVAS CARRASQUERO CRISTHIAN JOSE	17/08/2022		t1541713	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10306505802226955273

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 OBRA MADRID			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
X4740593	CAMARO CANTILLO LUIS	10/08/2022		I1222139	DEPENDIENTE	POR INICIAR

RETIRADO

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2022 17:37:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de junio de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000020 OBRA MADRID		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1073239511	NAVARRO BAQUERO FREDI ALONSO	23/06/2022		22125113	DEPENDIENTE

RETIRADO

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/06/2022 17:05:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.6, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 21 de Octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000020 - OBRA MADRID, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre		Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1073166763	OSPINA	CRISTIAN DAVID	15/10/2022		22241225	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10306505802229463305

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/10/2022 17:35:04 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 26 de Septiembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000020 - OBRA MADRID, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1065828837	OMAS BLANCO ADALBERTO	23/08/2022		38217220	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10306505802226955726

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 19 de Octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS, en el centro de trabajo 0000000020 - OBRA MADRID, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1073169486	ACEVEDO DIAZ JOSE DAVID	04/10/2022		22524012	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10306505802229239105

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/10/2022 10:51:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

12

Powered by CamScanner

ARL | sura

Medellín, 13 de octubre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de GCS CONSTRUCCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000020 OBRA MADRID			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C94322911	DIAZ CUELLAR ORLANDO	14/10/2022		245P9616	DEPENDIENTE	POR INICIAR

RETIRADO

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/10/2022 16:37:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.244.208.49, 192.230.104.10, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				144	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	64060663	$31.168.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	100.000	0		0		0	2	300	0	100.300	3
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0		0		0	2	200	0	88.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.500	0		0		0	2	200	0	53.700	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	438.800	0		0		0	2	1.000	0	439.800	12
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	212.000	0		0		0	2	500	0	212.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	983.200	0		0		0	2	2.200	0	985.400	39
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	963.700	0		0		0	2	2.100	0	965.800	29
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	328.400	0		0		0	2	800	0	329.200	14
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	40.000	0		0		0	2	100	0	40.100	1
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	41.400	0		0		0	2	100	0	41.500	2
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	40.000	0		0		0	2	100	0	40.100	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	16.000	0		0		0	2	100	0	16.100	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	45.400	0		0		0	2	100	0	45.500	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	140.200	0		0		0	2	400	0	140.600	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	648.400	0		0		0	2	1.400	0	649.800	20
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093848-0	5.600	0		0		0	2	100	0	5.700	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.952.400	0	0	0	0	2	4.300	0	1.956.700	18
230301	Porvenir	800224808-6	9.802.500	0	0	0	0	2	21.200	0	9.823.700	95
231001	Colfondos	800227940-6	640.000	0	0	0	0	2	1.400	0	641.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.072.100	0	0	0	0	2	8.800	0	4.080.900	26

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.345.900				6.345.900	2	13.700	6.359.600			63.459	6.359.600	144

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.173.700	2	4.700	2.178.400	75

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				144	0
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	84060663	TOTAL A PAGAR	
					$31.168.500	

CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	326.000	2	800	326.800	19
CCF39	Cajasan	890200106-1	1.639.300	2	3.600	1.642.900	50

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.400	2	100	1.500	2
ICBF				
2.200	2	100	2.300	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	16	4.144.600	4.154.300
Pensión	4	16.467.000	16.502.700
Riesgos Laborales	1	6.345.900	6.359.600
CCF	3	4.139.000	4.148.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.200	2.300
MEN	0	0	0
SENA	1	1.400	1.500
TOTALES	26	31.100.100	31.168.500

PAGADA

Powered by CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 144 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	64060663	$31.158.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Corrección	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003423265	ROCHA VILLALBA SAMUEL	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003426760	SANTANA VILLALBA ESTEBAN DAVID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1003618542	MARTINEZ BRAYAN FABIAN	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	1007992815	FUENTES AVILA LAURA DANIELA	1	0			S																	230301	1.800.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	64.000	14-11	1.800.000	1	6.400	CCF24	1.800.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	1007988303	MORA SALINAS ETNA DANIELA	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	1018487944	SIERRA GORDILLO YESICA ASTRID	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	12981495	CHAMORRO HERNANDEZ SERVIO JESUS	1	0			S		x															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
8	CC	57490896	JURADO ANDRADE JAVIER ARMANDO	1	5			S	x																	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	500.000	20.000	14-11	500.000	5	34.800	CCF35	500.000	20.000	0	0	0	0	0
9	CC	57482327	YELA SANTANDER JOSE	1	0			S	x																	230301	200.000	32.000	0	0	0	0	ESSC18	200.000	8.000	14-11	200.000	5	14.000	CCF35	200.000	8.000	0	0	0	0	0
10	CC	57810083	RODRIGUEZ PANTOJA HECTOR ANIBAL	1	0			S	x																	230301	933.334	149.400	0	0	0	0	ESSC18	933.334	37.400	14-11	933.334	5	65.000	CCF35	933.334	37.400	0	0	0	0	0
11	PT	5020797	CHIRINOS COLINA OSCAR RAMON	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
12	PT	5980440	MONTEROLA BATATIN JESUS EDUARDO	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
13	CC	1098726090	BASTIDAS DIAZ VICTOR ALFONSO	1	0			S	x																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	1098736536	DIAZ VARGAS JOSE LUIS	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
15	CC	1098736914	ROMO ORTEGA VICTOR MANUEL	1	0			S	x																	230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPSIC5	200.000	8.000	14-11	200.000	5	14.000	CCF35	200.000	8.000	0	0	0	0	0
16	CC	1098737786	BASTIDAS ERAZO JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
17	CC	1098264503	NASTACUAS NASTACUAS CRISTIAN OSWALDO	1	0			S	x																	230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPSIC5	200.000	8.000	14-11	200.000	5	14.000	CCF35	200.000	8.000	0	0	0	0	0
18	CC	1116605035	SERRANO SUAREZ CRISTIAN MANUEL	1	0			S	x																	230301	500.000	80.000	0	0	0	0	CCFC55	500.000	20.000	14-11	500.000	5	34.800	CCF35	500.000	20.000	0	0	0	0	0
19	CC	1098693670	MONTERO ALVAREZ ANDREA DAYANA	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
20	CC	1087262076	CASANOVA RODRIGUEZ DANILO FERNANDO	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
21	CC	1092160776	PRETEL RIVAS LUIS GIOVANY	1	0			S	x																	230301	433.334	69.400	0	0	0	0	ESSC18	433.334	17.400	14-11	433.334	5	30.200	CCF35	433.334	17.400	0	0	0	0	0
22	CC	1082164196	PISMAG MUÑOZ JOSE MEDARDO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC18	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
23	CC	1085281808	ZAMBRANO ERASO ANDERSON GIOVANNI	1	0			S	x																	230301	933.334	149.400	0	0	0	0	ESSC18	933.334	37.400	14-11	933.334	5	65.000	CCF35	933.334	37.400	0	0	0	0	0
24	CC	1087122606	QUIÑONES ANGULO MARCO ANTONIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
25	CC	91228761	RIOS CARREÑO DIONISIO	1	0			S	x																	25-14	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS037	666.667	26.700	14-11	666.667	5	46.500	CCF35	666.667	26.700	0	0	0	0	0
26	CC	91286206	ESPINDOLA RODRIGUEZ HENDER	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
27	CC	91438018	ESTUPIÑAN GARCES ECELINO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
28	CC	91811987	SILVA CORTES ELIJIN FABIAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
29	PT	5323839	LUGO RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
30	CC	1062182915	HURTADO MONTAÑO JHON KILIAN	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
31	CC	91444476	GUALDRON MANTILLA SERGIO	1	0			S		x															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
32	CC	91448850	DOMINGUEZ AGUILAR ROBINSON	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
33	CC	91448880	LUQUE DURAN CESAR ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
34	CC	91448206	MARMOLEJO GIRALDO RIGOBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
35	CC	91452237	ACOSTA GUALTERO LIBARDO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS046	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
36	CC	91456515	MOTTA SERRANO JAIRO	1	0			S	x																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC07	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
37	CC	91456857	FLOREZ VASQUEZ FRANCISCO	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
38	CC	8996785	MURILLO AMAYA PEDRO JESUS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
39	CC	74329459	SANCHEZ MARTINEZ MISAEL	1	0			S																																					

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	64060663	$31.168.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Incidente	Extranjero	Cotiza exterior	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
0	CC	91041587	GARCIA TRUJILLO JOSE VICENTE	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1	CC	91043058	GARCIA LEON HECTOR	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	91043825	VARGAS REYES HUGO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	13842103	PEÑA AMADOR CARLOS JESUS	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	13842134	QUINTERO JORGE	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	13842679	NOVA GOMEZ JOSERITO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	13843320	ARAQUE RAMIREZ JOSE EXPEDITO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	13843969	GARAVITO GUILLERMO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	13844813	RODRIGUEZ PORRAS JOSE BERNARDO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	1104868222	BARON ALTAMIRANDA OSMAR DAVID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
0	CC	1104871116	PADILLA MARIMON YONATAN ALBERTO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1	CC	1126761151	LUNA RINCON RAFAEL	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	12128314	MURCIA CAMEDES DAGOBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1232982101	QUINTERO DIAZ DUWAN FERNEY	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	13967833	MORENO DOMINGUEZ JORGE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1192718712	NOVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	1192718733	SERRANO RONDEROS CESAR ORLANDO	1	0			N		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
7	CC	1192720948	BRAVO CALDERON JEFFERSON ARNULFO	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
8	CC	1192722715	AMADO CALDERON LUIS CARLOS	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
9	CC	1192726247	ARAQUE MARTINEZ ALEX DAYAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
0	CC	1192726680	LUQUE URIBE CESAR DUVAN	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
1	CC	1192717050	CALDERON BARON REYNALDO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1192717223	HERNANDEZ MORALES GERMAN DAVID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1192717248	PICO DIAZ ANDERSON FERNEY	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	1192717527	BECERRA AGREDO DERLEN FABIAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1192718754	NOVA JIMENEZ JOSE ANGEL	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	1192719489	ARENIZ ARENIZ ALBEIRO	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	1098298535	MORENO DOMINGUEZ ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	1098328181	MADERA TRESPALACIOS SERGIO ANTONIO	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
9	CC	1098328043	DIAZ MARULANDA JOSE DAVID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
0	CC	1098994063	QUINTERO GARCIA CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1	CC	1192821907	CALDERON ARGUELLO ANGEL LEONARDO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1192718643	PRADA BECERRA OSCAR IVAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1097785205	RODRIGUEZ ROBAYO JULIAN STEVEN	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	3221110	GOMEZ RINCON WILSON	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	6529520	NOVOA LARA MILLER MAURICIO	1	0			S		x															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
6	CC	1099999122	QUINTERO LOPEZ BUDWEISER DAYAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	1092668152	GUTIERREZ DURAN ANGEL OMAR	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	1098162906	MORENO DOMINGUEZ JONATHAN	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
9	CC	8692291	DIAZ CUELLAR ORLANDO	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
0	PT	1026927	DURAN GUTIERREZ ORLANDO RAMON	1	0			S		x															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC61	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	64060663	$31.168.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	PT	27164347	RIVAS CARRASQUERO CRISTHIAN JOSE	1	0			S	x															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
2	PT	4740593	CAMARO CANTILLO LUIS ANTONIO	1	0			S	x															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
3	CC	1000718048	CARDENAS SOTO DIEGO JAVIER	1	0			S	x	x														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	1003505213	GARZON OCHOA OSCAR JAVIER	1	0			S	x															230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS037	900.000	36.000	14-11	900.000	5	62.700	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
5	CC	80774210	GUAQUETA BARRAGAN NESTOR ANDRES	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	80813050	LIBERATO TIBADUIRA JHON ALBERTO	1	0			S																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	88010599	MORALES CHICA FABER AUGUSTO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	91048967	RODRIGUEZ CASTILLO FREDY BERNARDO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	91293215	ROJAS BUENO LUIS ALBERTO	1	0			S	x															230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS002	266.667	10.700	14-11	266.667	5	18.600	CCF24	266.667	10.700	0	0	0	0	0
10	CC	9167984	MORA TELLEZ DAGOBERTO	1	0			S		x														25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
11	CC	5414471	SERMON ROJAS PABLO EMIRO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
12	CC	5781189	RUBIO CHIVATA JOSE GUILLERMO	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
13	CC	73584550	ROCHA OBREGON NELSON	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	79187788	GONZALEZ CORTES JORGE RICARDO	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
15	CC	79870516	BOGOTA GAONA JESUS MARIA	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
16	CC	79891859	LIMA PALOMINO WILMAN	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
17	CC	17845714	MARTINEZ EPINAYU BARON	1	0			S																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
18	CC	266093	CHISICA ZAPATA JOSE ALBEIRO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
19	CC	285375	RODRIGUEZ PIRAQUIVE YIMY ERNESTO	1	0			S	x															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
20	CC	2956975	GARAVITO USECHE JULIO CESAR	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
21	CC	45765705	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELA	1	0			S																230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	ESSC07	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	1	5.900	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
22	CC	5184210	BOURIYU MACHADO MARCELINO	1	0			S		x														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
23	CC	11367578	ZAPATA TORRES OSCAR ORLANDO	1	0			S																25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	6.500	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
24	CC	11511389	GUTIERREZ RODRIGUEZ NELSON MIGUEL	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
25	CC	1192728939	EPIEYU EPIEYU VICENTE	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
26	CC	1192771091	LIMA MEJIA WILLIAM ANDRES	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
27	CC	13844681	ORTEGA ORTEGA JOSE OMAR	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
28	CC	17698824	TORRES IPUANA ANGEL CECILIO	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
29	CC	1121546249	HERRERA RINCON RAFAEL ANTONIO	1	0			S		x														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC01	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
30	CC	1124044748	IPUANA ANDRES ANTONIO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
31	CC	1134497038	URARIYU LUCAS	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSIC1	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
32	CC	1134497041	URARIYU DAVID	1	0			S		x														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSIC1	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
33	CC	1134508264	IPUANA URARIYU JAVIER	1	0			S		x														230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
34	CC	1134508335	EPIEYU EPINAYU ALFREDO JOSE	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSIC4	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	84060663	$31.168.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VIT	ELE	FSE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1075200863	MORA CONTENTO WILDER ALFONSO	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC91	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1081787679	ARIAS FIGUEROA DANIEL ENRIQUE	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1098671	CONTADOR ECHEVERRIA JOSE MAURICIO	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1102717189	DAVILA VELEZ ROBINSON	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1102720388	PRADA GOMEZ JOHAN SEBASTIAN	1	0		S																		230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS037	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	5	94.000	CCF24	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
CC	1196[illegible]001	QUINTERO CESPEDES JUAN DAVID	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1073186763	OSPINA CRISTIAN DAVID	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]488	ACEVEDO DIAZ JOSE DAVID	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	1	200	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1073191132	HERNANDEZ NARVAEZ DAIRON EDUARDO	1	0		S																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1072178550	OLAYA ORTIZ DIANA MARIA	1	0		S																		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
CC	1073236511	NAVARRO BAQUERO FREDI ALONSO	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1074629705	CHAVEZ RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]719	TORRES VANEGAS OSCAR DANIEL	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1071548195	AGUJA LEON JOSE HERMES	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1071548884	MARTINEZ VASQUEZ REYES	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1074692596	HUERFANO REYES BRAYAN SEBASTIAN	1	0		S	x	x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC91	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1074692867	CARDONA CAMACHO ALEX FERNANDO	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1074629794	HERNANDEZ CRUZ DIEGO ARMANDO	1	0		S																		25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1094[illegible]831	PALOMINO PERTUZ LUIS ALFREDO	1	0		S																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]422	DELGADO CASTRO JULIO CESAR	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]537	OMAS BLANCO ADALBERTO	1	0		S		x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]821	GARNICA ALDANA EDGAR ARTURO	1	0		S																		230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]806	RICAURTE PINTO DURFAY STEVEN	1	0		N	x	x																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
CC	1[illegible]842	CHAVES SANCHEZ JOSE STEVEN	1	0		S																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]865	MONSALVE GIRALDO ESTEBAN	1	0		S																		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]957	PRADA MILLAN DANIEL CAMILO	1	0		S																		230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS002	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
CC	1[illegible]560	QUINTERO ZIPACON PAULA STEFANNY	1	0		S																		25-14	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS017	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	1	8.100	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	64060663	$31.168.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombi	Extranje	Extranjera	Colom. exterior	Estudiante	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1061797652	SANTANA OBREGON CARLOS	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
	CC	1061738151	SANTANA OBREGON DELIA	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
	CC	1065824703	LIMA PALOMINO ANGEL MIGUEL	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS		CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	I	29/12/2022	84068251	TOTAL A PAGAR	
					$353.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	14	2.300	0	152.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	14	2.900	0	194.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.300				6.300	14	100	6.400			63	6.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	152.300
Pensión	1	192.000	194.900
Riesgos Laborales	1	6.300	6.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	348.300	353.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS		CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	I	29/12/2022	84068251	TOTAL A PAGAR	
					$353.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Encontrado	IRR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1126001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	59	0			N																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000	14-11	1.200.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 10 No. 5 - 08	3132657941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	10/12/2022	85178413	$944.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	17	700	0	40.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	80.000	0		0		0	17	1.300	0	81.300	2

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	17	2.600	0	162.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	17	2.600	0	162.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	17	2.600	0	162.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.800				208.800	17	3.400	212.200			2.088	212.200	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	120.000	17	2.000	122.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	120.000	122.000
Pensión	3	480.000	487.800
Riesgos Laborales	1	208.800	212.200
CCF	1	120.000	122.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	928.800	944.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS		CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	10/12/2022	65178413	$944.000	

DETALLE POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TLP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547987	QUINTERO GUALDRON OSCAR GIOVANY	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1102723325	CARREÑO ACEVEDO FABIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	91043063	ACEVEDO FERREIRA CARLOS JULIO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

Identificación	dv	Razon Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71664413		OLIER RESTREPO DANIEL MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 #68-22	IBAGUE - TOLIMA	65755556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	084656496	9864589632	I	2022/12/09	2021/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	71664413	OLIER DANIEL	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,200,000	$192,900			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

2022/12/09 10:04 AM

Powered by CamScanner

Identificación	DV	Razón Social						ICBF
CC 71664413		OLIER RESTREPO DANIEL MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 #68-22	IBAGUE - TOLIMA	65755556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	084656496	9864589632	I	2022/12/09	2022/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-11	890,903,790	5	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

2022/12/09 10:04 AM

Powered by CamScanner

Identificación		Razón Social	C[illegible] Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-D[illegible]amento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102721369		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7352055	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-11	117564869	9978514986	I	2022/12/12	2022/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA D.C Depto: BOGOTA D.C (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	1102721369	LOPEZ LEONEL	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS001	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total			Afiliados(1)			$1,200,000	$192,900			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

2022/12/12 03:45 PM

Powered by CamScanner

CC 1102721369	LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7352055	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	117564869	9978514986	I	2022/12/12	2022/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
ALIANSALUD EPS S.A	EPS001	830,003,564	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/12/12 03:45 PM

Powered by CamScanner

Identificación		Razón Social	Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900702893	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1121562483	9956554122	E	2022/12/07	2022/12/07	BANCO DE OCCIDENTE		$245,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTECOR (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1020776092	LAMUS JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/12/07 02:43 PM

Powered by CamScanner

NIT				Dirección	Ciudad-D[illegible]amento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900702893	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1121562483	9956554122	E	2022/12/07	2022/12/07	BANCO DE OCCIDENTE		$245,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$5,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$40,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$40,000	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$40,000
TOTAL				1	$245,300	$0	$245,300

2022/12/07 02:43 PM

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2022-11
Período Salud : 2022-12

Se certifica que en la fecha 2022-12-09 la empresa INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS con documento de identificación NI 901043519 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CORREA DUARTE NICOLAS ALFONSO identificado con CC-1090425817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
NI-901043519	INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
35489849	E	2022-12-09	0,0696

Datos Administradoras				
Tipo	**NIT**	**Código**	**Nombre**	**Dias**
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	30

Powered by CamScanner

REGISTRO ENTREGA DE DOTACIÓN MES DE NOVIEMBRE

Powered by CamScanner

GCS Construcciones S.A.S.

REGISTRO ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OBRA PROYECTO POLIDEPORTIVOS MADRID

Alcaldía de Madrid | Madrid

NOMBRE	CC	CARGO	FECHA	DOTACIÓN	FIRMA RECIBIDO
Orlando Diaz.	94322919	Ayudante	18-10-22	Casco, Guantes	
Freddy Navarro	1093239511	Ayudante	18-10-22	Guantes Vaqueta	
Andres Ipuana	1124044146	Ayudante	15-10-22	Botas de material	
Mauricio Contador	1095571	Ayudante	31-10-22	Guantes Vaqueta.	
Samuel Rocha	1.[illegible]123265	Ayudante	31-10-22	Guantes Vaqueta	samuel
Nelson Rocha	73558580	Ayudante	31-10-22	Guantes Vaqueta	
Luis Camaro	18525129	Oficial	31-10-22	Guantes Vaqueta	
Dairon Hernandez	1073177132	Ayudante	31-10-22	Casco, Guantes	Dairon
Jose David Acuerdo	1073169486	Ayudante	31-10-22	Casco, Guantes	
Mauricio Contador	1095571	Ayudante	27-10-22	Guantes.	
William Cimo	1192771091	Ayudante	27-10-22	Guantes	WILLIAM
Marcelino Bauriyo	51842 10	Ayudante	15-10-22	Guantes (cambio)	marcelino
Botas de seguridad	1070970219	Ayudante	16-11-22	Oscar Daniel Torres	
Carlos Santana	1051737892	Oficial	16-11-22	Camisa, Guantes, Gafas	
Nelson Rocha	73558580	Ayudante	16-11-22	Camisa, Gafas, Botas.	Nelson R.o
Esteban Santana	1002426760	Ayudante	16-11-22	Camisa, Guantes, Gafas	Esteban S.V
Jogoberto Mora	9.757.984	Oficial	16-11-22	Camisa. Gafas	
Jose Rodriguez	13614813	Maestro	16-11-22	Camisa	
Samuel Rocha	1002423265	Ayudante	16-11-22	Camisa y Gafas, Guantes	samuel
Oscar Daniel Torres	1070970219	Ayudante	11-11-22	Guantes de Vaqueta	
Samuel Rocha	1002423265	Ayudante	11-11-22	Botas de cuero.	samuel
Jhon Jairo Chavez	1075629705	Ayudante	21-11-22	Guantes, Botas.	Jhon JAiro
Vicente Epieyu	1192726934	Ayudante	21-11-22	Botas, Guantes.	Vicente

Powered by CamScanner

GCS

REGISTRO ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OBRA PROYECTO POLIDEPORTIVOS MADRID

MADRID | Madrid

ID	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA	DOTACIÓN	FIRMA RECIBIDO
	Jose steven chaves	1069926042	Oficial	21-11-22	Botas caña alta, Camisa	Jose Chaves
	Fabian Becerra	1102717529	Maestro	21-11-22	2 Camisas	
	Jose Rubio	6761189	Ayudante	21-11-2022	Botas caña alta	
	Omar Ortega	13644681	Maestro	21-11-2022	Guantes	
	Dairon Hernandez	1073171732	Ayudante	21-11-2022	Camisa	
	Mauricio Contador	1098571.	Ayudante	21-11-2022	Guantes	
	Fabor Morales	86010586	Oficial	21-11-2022	Camisa, Pantalon	
	Daniel Arias	1030930219	Ayudante	22-11-22	Guantes	Dairon
	Oscar Torres	1081793879	Ayudante	28-11-22	Guantes	
	Fabian Becerra	1102717529	Maestro	30-11-22	Guantes Vaqueta	
	Nelson Rocha	73584580	Ayudante	30-11-22	Guantes Vaqueta	
	Edgoberto Mora	4.169454	Oficial	30-11-22	Guantes Vaqueta	

Powered by CamScanner

ANEXO 4.

INFORME DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

FORME GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

BJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: A MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

INFORME MES DE NOVIEMBRE 2022

MADRID, CUNDINAMARCA
2023

Powered by CamScanner

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GLOSARIO 4
3. ANTECEDENTES 6
3.1. ASPECTOS CONTRACTUALES 6
4. ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO 7
4.1. GARANTÍAS: 7
4.2. ASPECTOS FINANCIEROS 7
5. MARCO NORMATIVO 8
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10
6.1. Localización del Proyecto 10
6.2. ALCANCE 10
7. OBJETIVOS 12
8. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 13
9. GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN RCD 13
9.1. RESIDUOS EN CADA ETAPA CONSTRUCTIVA 13
9.2. MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 16
9.3. PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES PARA EFECTUAR LA GESTIÓN DE RCD 18
9.3.1. Procedimiento para la reducción de la generación de RCD 18
9.3.2. Procedimiento para la separación en la fuente 18
9.3.3. Procedimiento para la reutilización de los RCD 19
9.3.4. Procedimiento para la disposición de los RCD 20
9.3.5. Acciones de Socialización y Comunicación al personal 21
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 21
11. CONCLUSIONES 26

Powered by CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

En el contrato de obra 543 de 2022 pactado entre el GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. y el municipio de Madrid Cundinamarca, que tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"** se pretende por medio de este informe dar una justificación al manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD, que se ha llevado a cabo en la ejecución de las actividades del proyecto, buscando contribuir con el medio ambiente en la producción limpia de los procesos realizados.

En cumplimiento de los requisitos exigidos de perfeccionamiento y legalización de acuerdo a la guía para la elaboración de plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD, en a la obra y conforme a la resolución 1115 de 2012 y 0932 del 2021 y demás normas ambientales, se presenta el plan de gestión de residuos de construcción y demolición, el cual es un documento integral para la ejecución del proyecto.

Powered by CamScanner

2. GLOSARIO

- **Aprovechamiento:** toda actividad que busque la gestión adecuada de los RCD a través de la reutilización, reciclaje y revalorización, con el propósito de incurrir lo mínimo posible en la disposición final.

- **Centro de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición** (RCD): sitio autorizado para transformar los RCD aprovechables y producir materiales de construcción a través de plantas fijas y/o móviles.

- **Centro de transferencia de RCD:** sitio autorizado para el acopio temporal de RCD con objetivo aprovechable y sin fines de transformación.

- **Escombro:** todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas.

- **Generador:** persona natural o jurídica que realiza actividades de demolición, excavación y construcción, generando RCD para ser aprovechados o dispuestos finalmente según sus características.

- **Gestor integral:** persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD.

- **Grandes generadores:** son los usuarios privados y públicos que generan RCD en volúmenes superiores a 1 m3 (metro cúbico mensual).

- **Planta móvil:** maquinaria portátil disponible para realizar transformación de RCD en centros de aprovechamiento o en frentes de obra.

- **Residuos de construcción y demolición (RCD):** todo residuo sólido sobrante de las actividades de demolición, excavación, construcción y/o reparación de las obras civiles o de otras actividades conexas.

Powered by CamScanner

- **Residuo peligroso:** es aquel que, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas y envases de estos, generan riesgo sobre la población, el ambiente, los bienes y la infraestructura.

- **Sitio de disposición final:** lugar autorizado para recibir y acopiar de forma definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo, que por sus características físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento.

- **Reciclaje:** proceso realizado por gestores especiales sobre los residuos generados, cuyo objeto es la transformación de estos en insumos para el sector de la construcción.

- **Reducción:** estrategia de gestión que promueve el empleo mínimo y eficiente de los insumos de construcción, con miras a generar los menores volúmenes de residuos.

- **Reutilización:** acción de darle un siguiente uso a los residuos generados de las actividades de demolición, excavación y construcción, para efectos de alargar su ciclo de vida.

- **Revalorización:** estrategia de gestión dirigida hacia la caracterización química de los residuos, permitiendo así integrarlos al proceso a través de la re potencialización de sus componentes.

Powered by CamScanner

3. ANTECEDENTES

Las características particulares del Contrato de Obra son:

3.1. ASPECTOS CONTRACTUALES

CONTRATO No.	CO- 543 - 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MADRID (CUNDINAMARCA) NIT 899.999.325-8
CONTRATISTA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
DIRECCIÓN	Calle 134 # 13-66
TELÉFONO	275 94 30
CORREO ELECTRÓNICO	gcs.construcciones@hotmail.com
ACTA DE INICIO OBRA	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.404.922.142,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

Powered by CamScanner

4. ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS DEL CONTRATO

4.1. GARANTÍAS:

El contrato de contratista se encuentra amparado por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A con las siguientes pólizas iniciales:

Amparo	Número	Valor	Vigencia	Anexo
Cumplimiento del Contrato	21-44-101382432	$2.422.707.178,10	28/04/2022 a 31/12/2027	0
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101187609	$1.200.000.000.00	28/04/2022 a 31/12/2022	0
Cumplimiento del Contrato	21-44-101382432	$2.422.707.178,00	31/05/2022 a 02/02/2028	2
Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101187609	$1.200.000.000.00	31/05/2022 a 02/02/2023	2

4.2. ASPECTOS FINANCIEROS

El contrato de obra cuenta con la siguiente información financiera:

Valor del Contrato:	$ 4.404.922.142,00
Valor adición del Contrato:	$ 0
Valor total del Contrato:	$ 4.404.922.142,00
Valor Pagado por el Municipio:	$ 0
Valor por pagar por el Municipio:	$ 4.404.922.142,00

Powered by CamScanner

5. MARCO NORMATIVO

A continuación, se relaciona la normatividad ambiental vigente, aplicable para la gestión de RCD. En la tabla No.1 se presentan como principales requisitos legales vigentes los siguientes aplicables al proyecto.

NORMA	*TITULO DE LA NORMA APLICABLE Y/O DESCRIPCIÓN*
Resolución 541 de 1994	"Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación".
Decreto 948 de 1995	"Reglamenta en relación con la prevención y control de la contaminación Atmosférica y protección de la calidad del aire".
Decreto 357 de 1997	"Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción".
Ley 769 de 2002	"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre".
Resolución 556 de 2003	"Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en fuentes móviles".
Decreto 4741 de 2005	"Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral".
Decreto 312 de 2006	"Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital".
Decreto 620 de 2007	"Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital".
Ley 1259 de 2008	Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros".

Powered by CamScanner

Decreto 034 de 2009	"Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo 417 de 2009	"Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo 515 de 2012	Por medio del cual se modifica el Acuerdo 417 de 2009, que reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital".
Resolución 01115 de 2012	"Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital".
Resolución 715 de 2013	"Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012".
Resolución 01138 de 2013	Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y se toman otras determinaciones".
Decreto 364 de 2013	"Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.".
Resolución 0932 de 2015	Por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 de 2012
Decreto 442 de 2015	"Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones."
Resolución 472 de 2017	"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones."
Resolución 1257 de 2021	"Por el cual se modifica la resolución 472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se dictan otras disposiciones."

Powered by CamScanner

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1. Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**



Coordenadas 4°43'50"N 74°15'50"O

Figura 1. Localización General del Proyecto

6.2. ALCANCE

El presente informe de gestión de RCD aplica para las actividades que han sido desarrolladas en el mejoramiento de los Polideportivos de los barrios La Magnolia, Escallón, San Luis y San Carlos en el municipio de Madrid, Cundinamarca en donde se están ejecutando las siguientes actividades:

POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

- Excavación
- Relleno con recebo común compactado
- Concreto ciclópeo
- Zapatas de concreto
- Vigas de cimentación en concreto
- Figurado de acero de refuerzo
- Pedestales de concreto (Columnas)
- Vigas de amarre
- Vigas aéreas en concreto
- Mampostería en bloque de concreto
- Retiro de sobrantes
- Escalera maciza en concreto

Powered by CamScanner

POLIDEPORTIVO SAN LUIS

- Columnas en concreto para tarima
- Figurado de acero de refuerzo
- Excavación manual
- Demolición de cimiento enterrado
- Columnas en concreto
- Instalación de conexión para red eléctrica
- Retiro de escombros
- Instalación de red hidráulica
- Base en concreto pobre
- Viga de amarre
- Vigas aéreas en concreto
- Concreto ciclópeo
- Mampostería en bloque en concreto
- Relleno en recebo común compactado
- Placa base tarima
- Cajas de inspección
- Zapatas en concreto
- Vigas de enlace en concreto

POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA

- Excavación manual para cimentación
- Concreto ciclópeo
- Zapatas en concreto
- Pedestales en concreto (pedestales)
- Base en concreto pobre
- Figurado de acero de refuerzo
- Desmonte de módulos de cerramiento de parque infantil
- Demolición de cimiento enterrado
- Vigas de cimentación en concreto
- Columnas en concreto
- Sardinel fundido in situ
- Escaleras en concreto
- Rampa de acceso en concreto
- Descapote manual
- Demolición escaleras y rampa de acceso existentes

Powered by CamScanner

- Relleno con recebo común compactado
- Retiro de sobrantes.

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS

- Localización y replanteo
- Demolición cimiento enterrado
- Demolición de placa de piso
- Excavación manual
- Descapote manual
- Adecuación de cerramiento
- Concreto ciclópeo
- Figurado de acero de refuerzo
- Zapatas en concreto reforzado
- Base en concreto pobre
- Columnas en concreto
- Relleno con recebo común compactado
- Retiro de sobrantes
- Vigas de cimentación en concreto

7. OBJETIVOS

GENERAL

El presente informe de seguimiento a la gestión de los residuos de construcción y demolición tiene como objetivo general definir las estrategias a aplicar para el manejo de residuos de construcción y demolición durante cada una de las fases del proyecto, de modo que se realice una adecuada clasificación, cuantificación y disposición de acuerdo a la normatividad vigente.

ESPECÍFICOS

- Prever la separación efectiva de los residuos de construcción y demolición generados por las actividades realizadas en las diferentes etapas del proyecto en el periodo comprendido entre los meses de septiembre a noviembre.

- Gestionar la disposición de residuos de manera tal que se cumpla a cabalidad con la normativa vigente, tomando las medidas contempladas en la resolución 01115 de 2012, resolución 00715 de 2012 y resolución 0932 de 2015 las cuales son de obligatorio cumplimiento.

Powered by CamScanner

- Caracterizar de manera adecuada los residuos con el fin de destinar los RCD a procesos de reutilización en función de su tipología, origen y punto de puesta en obra, dándoles un uso adecuado para mitigar al máximo los impactos ambientales.

8. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, Municipio de Madrid, es un municipio y localidad de Colombia en la provincia de Sabana Occidente, se encuentra a 21 Km de Bogotá y hace parte de su área metropolitana. es el octavo municipio más grande del departamento. El municipio de Madrid está situado en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano cundiboyacense, el casco urbano se encuentra a una altitud de 2.630 m.s.n.m. Cuenta con más de 130.000 habitantes, presentando una alta tasa de crecimiento poblacional debido a que hace parte del área metropolitana de Bogotá. Posee una extensión aproximada de 120 Km2, su río más extenso es el Río Subachoque el cual ha presentado altos niveles de contaminación.

El Municipio limita hacia el norte con Subachoque, al noreste con Tenjo, noroeste con El Rosal, al sur Bojacá, Facatativá y Mosquera, al oriente con Funza y hacia el occidente con Subachoque y Pacho.

9. GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN RCD

9.1. RESIDUOS EN CADA ETAPA CONSTRUCTIVA

La estimación de generación de los RCD se estima por metro cuadrado o el volumen que se extrae de acuerdo a las actividades de obra y los materiales a usar por la proyección de las actividades de construcción.
Las actividades de obra que van a generar RCD son las actividades de:

- **Demolición**

POLIDEPORTIVO ESCALLÓN		
DEMOLICIÓN		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
MURO Y MAMPOSTERÍA	M3	23,09
VIGAS Y COLUMNAS + CIMIENTO	M3	42,74
PLACA	M3	102,62

Powered by CamScanner

POLIDEPORTIVO SAN LUIS		
DEMOLICIÓN		
ELEMENTOS	UND	CANT
MURO Y MAMPOSTERÍA	M3	2,22
VIGAS Y COLUMNAS + CIMIENTO	M3	86,93
PLACA	M3	127,68

POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA		
DEMOLICIÓN		
ELEMENTOS	UND	CANT
MURO Y MAMPOSTERÍA	M3	18,71
VIGAS Y COLUMNAS + CIMIENTO	M3	61,68
PLACA	M3	23,01

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS		
DEMOLICIÓN		
ELEMENTOS	UND	CANT
MURO Y MAMPOSTERÍA	M3	18,95
VIGAS Y COLUMNAS + CIMIENTO	M3	27,06
PLACA	M3	4,41

- **Excavación**

POLIDEPORTIVO ESCALLÓN		
ELEMENTOS	UND	CANT
EXCAVACIÓN	M3	1.306,33

POLIDEPORTIVO SAN LUIS		
ELEMENTOS	UND	CANT
EXCAVACIÓN	M3	560,10

POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA		
ELEMENTOS	UND	CANT
EXCAVACIÓN	M3	329,88

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS		
ELEMENTOS	UND	CANT
EXCAVACIÓN	M3	312,13

Powered by CamScanner

- **Descapote**

POLIDEPORTIVO ESCALLÓN		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
DESCAPOTE	M3	1.185,80

POLIDEPORTIVO SAN LUIS		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
DESCAPOTE	M3	490,80

POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
DESCAPOTE	M3	215,37

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
DESCAPOTE	M3	806,40

- **TOTAL, ACTIVIDADES**

TOTAL 4 POLIDEPORTIVOS		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
DEMOLICIÓN	M3	539,10
EXCAVACIÓN	M3	2.508,44
DESCAPOTE	M3	2.698,37

- **CANTIDAD INFORME AMBIENTAL N°1**

INFORME AMBIENTAL AGOSTO		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
DEMOLICIÓN	M3	393,19
aprovechamiento	M3	0,38
EXCAVACIÓN + DESCAPOTE	M3	1586,26

- **CANTIDAD INFORME AMBIENTAL N°2**

INFORME AMBIENTAL NOVIEMBRE		
ELEMENTOS	**UND**	**CANT**
DEMOLICIÓN	M3	**145,53**
EXCAVACIÓN + DESCAPOTE	M3	**3.620,55**

Powered by CamScanner

9.2. MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

Como principales actividades que generan RCD en el desarrollo del proyecto tenemos las demoliciones, excavaciones y construcción en los sitios de intervención.

La generación de estos RCD se llevará a cabo con los controles necesarios en obra, estos residuos de igual manera serán separados en la fuente (cuando aplique), se acopiarán de manera adecuada, se estima a partir de lo dispuesto en las etapas de proyección, prevención y minimización de las cantidades de RCD originados, separación en la fuente, aprovechamiento de los RCD, acopio de los RCD, gestión de los residuos y disposición final.

A continuación, se describe el tipo de residuo generado y su manejo.

ACTIVIDAD	***RESIDUOS GENERADOS***	***MANEJO***	***GESTOR AMBIENTAL CUANDO NO APLIQUE MANEJO***
DESCAPOTE Y REMOCIÓN	El desmonte y limpieza del terreno natural del área intervenida por la obra. Se remueve el rastrojo, pastos, tocones, raíces y residuos ordinarios, de modo que el terreno quede limpio y su superficie resulte apta para iniciar los trabajos.	El residuo se debe clasificar con el objeto de reutilizarlo o de reciclarlo. Esta actividad también incluye la disposición final adecuada para lo cual deben utilizarse predios que cuenten con el aval por parte de la autoridad ambiental.	Escombrera Autorizada

Powered by CamScanner

EXCAVACIÓN	Consiste en la remoción del suelo o de las estructuras existentes, en este acápite se describe: • Excavación Manual • Excavación mecánica	Estos residuos deben clasificarse para reciclar la materia prima útil en el mejoramiento de estructuras granulares, siempre y cuando el material cumpla para su reutilización. El material contaminado será dispuesto en escombreras autorizadas.	Escombrera Autorizada
CONSTRUCCIÓN	Etapa relacionada con la construcción y/o montaje de estructuras que involucran el manejo de grandes volúmenes de materiales que después de su instalación quedan sobrantes como: • Residuos de prefabricados • Residuos de concreto • Residuos de madera • Residuos de PVC y sus componentes	Estos residuos deben clasificarse para ser reciclados en otras obras y/o actividades, siempre y cuando el material cumpla para su reutilización. Por otra parte, los residuos no aprovechables se deben disponer de acuerdo al su tipo al sitio apto para su disposición final	Escombrera Autorizada

Powered by CamScanner

9.3. PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES PARA EFECTUAR LA GESTIÓN DE RCD

9.3.1. Procedimiento para la reducción de la generación de RCD

Objetivo

Establecer estrategias para efectuar acciones tendientes a la reducción de RCD en su etapa de generación

Estrategias

- Se estimará la cantidad de RCD que se generan en cada actividad constructiva las cuales se caracterizarán dependiendo su procedencia, es decir, si son de demolición, excavaciones o residuos peligrosos
- Se deberá valorar el material con el fin de definir si es posible su reutilización dentro del proyecto
- Se definirán la cantidad de material que serán llevados a sitios de disposición final y /o plantas de aprovechamiento autorizados.
- Conocer desde la planeación de los diseños finales, para no generar sobre excavación o en sitios no autorizados
- Coordinar los suministros y transporte de materiales, con el fin de evitar pérdidas y mezclas indeseables.
- Utilizar el material necesario ya estandarizado y ajustado a las líneas civiles y arquitectónicas diseñadas y planificadas, buscando desde el inicio de la planeación, que material es el apropiado para la estructura de la construcción.
- Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad de la obra, como son el uso de minicargadores para acopio temporal de RCD y retiro, de igual forma herramienta menor.

9.3.2. Procedimiento para la separación en la fuente

Objetivo

Incentivar la separación efectiva de los RCD generados por las actividades constructivas.

Estrategias

- Revisar que los materiales sobrantes de las actividades en la obra no estén contaminados con otros tipos de materiales catalogados como peligrosos. Si están contaminados, se deberán manejar como residuo peligroso.

Powered by CamScanner

- Adecuar en el frente de obra, áreas de almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición a reutilizar o para su posterior disposición final, los cuales estarán debidamente señalizados y cubiertos para evitar la acción de arrastre por el agua y el viento.
- En actividades de demolición, realizar una separación selectiva.
- Los residuos se ubicarán en zonas claramente identificadas como puntos ecológicos, donde se haga su selección, de acuerdo al tipo de residuo a ser aprovechado, para luego ser recogido por la empresa de recolección de residuos, reciclados o gestor autorizado.
- Los materiales dispuestos en las zonas de acopio deberán permanecer cubiertos para evitar dispersión de material particulado, material de arrastre, olores ofensivos y proliferación de vectores.

- Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la definición de residuos peligrosos y/o contaminantes (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas, entre otros), se debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 4741 de 2005,
- Cuando se finalice el proceso de separación, se gestionarán los materiales que son valorizables y se integraran en el plan de reciclaje o reutilización, y los que no se, enviaran a sitios de disposición final autorizados.

9.3.3. Procedimiento para la reutilización de los RCD

Objetivo

Lograr destinar un porcentaje de los diferentes RCD generados en una obra, a un proceso de reutilización.

Estrategias

- Se podrán reutilizar los RCD, siempre y cuando estos no se encuentren contaminados de materia orgánica, plásticos, maderas, papel, hierro, o sustancias peligrosas. No se reutilizarán RCD sin previa clasificación.
- Los materiales generados estimados que puedan ser reutilizados en la obra pueden corresponder a materiales pétreos como recebo, concreto y rodadura de asfalto.
- El material que no pueda ser reutilizado, deberá ser retirado por transportadores debidamente registrados y avalados de acuerdo a lo establecido por la SDA.

Powered by CamScanner

- Los materiales pétreos y concretos se estima reutilizarlos en la estructura de la vía, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas.

En la ejecución de las actividades se empleó material RCD producto de la demolición de muro de cerramiento para un paso peatonal en el frente Escallón, las cantidades aprovechadas se evidencian a continuación.

RCD APROVECHADO		
TIPO DE RESIDUO	**UND**	**CANT**
DEMOLICIÓN DE MUROS	M3	0,38

9.3.4. Procedimiento para la disposición de los RCD

Objetivo

Establecer estrategias para hacer el traslado de los RCD a sitios de disposición final autorizados y evitar al máximo los impactos generados al ambiente.

Estrategias

- Los residuos sobrantes a los que no se les haya atribuido un aprovechamiento, se deberán disponer en los sitios de disposición final de RCD autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente o la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, según su ubicación geográfica.
- Una vez generados, separados y seleccionados los RCD, se retirarán de las zonas de acopio temporal en el frente de obra, se retirarán según sea el destino que se les vaya a dar.
- Se dispondrá una zona de estacionamiento de las volquetas dentro del frente de obra para el cargue de materiales, en caso de que el avance del proyecto no lo permita se coordinara el estacionamiento de estas de tal forma que no se obstaculice el tránsito vehicular y peatonal, y que esté de acuerdo a lo establecido en el PMT (si aplica).

Los RCD sobrantes a los cuales no se le ha dado aprovechamiento, de acuerdo a las actividades ejecutadas a la fecha se disponen en un sitio autorizado por la autoridad ambiental, cuya cantidad se relaciona a continuación:

Powered by CamScanner

TIPO DE RESIDUO	CANT (M3)	DISTANCIA (KM)	COSTO ($/M3)
Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno	5.206,81	9	$7.000,00
Pétreos	538,72	9	$7.000,00

9.3.5. Acciones de Socialización y Comunicación al personal

El personal de obra conocerá la correcta gestión de cada uno de los residuos que se generen por las actividades de obra.
La comunicación con los trabajadores será mediante socialización, charlas informativas y capacitaciones según su temática y en las que se incluyan los siguientes temas.

- Orden y aseo en obra
- Brigadas de aseo
- Normatividad legal vigente
- Clasificación y separación de residuos en la obra
- Manejo y protección de materiales

). REGISTRO FOTOGRAFICO

ESCALLÓN	SAN LUIS
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	
	

Powered by CamScanner

EXCAVACIÓN







RETIRO





Dirección: Calle 134 # 13- 66| Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner

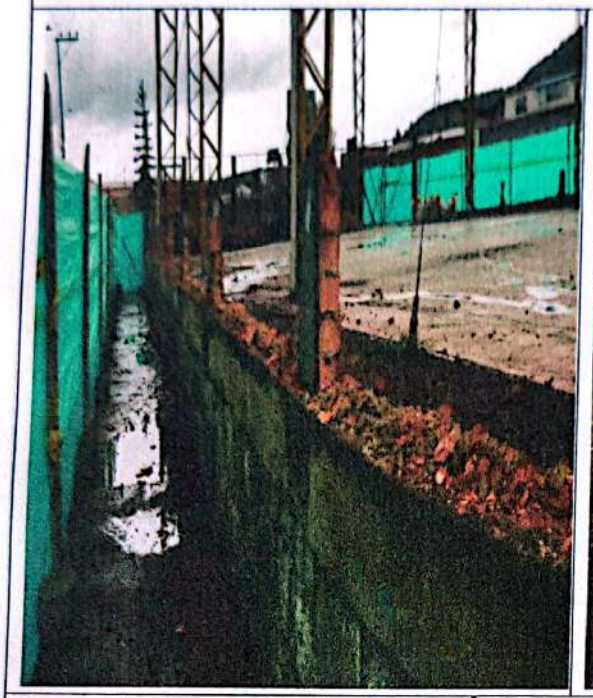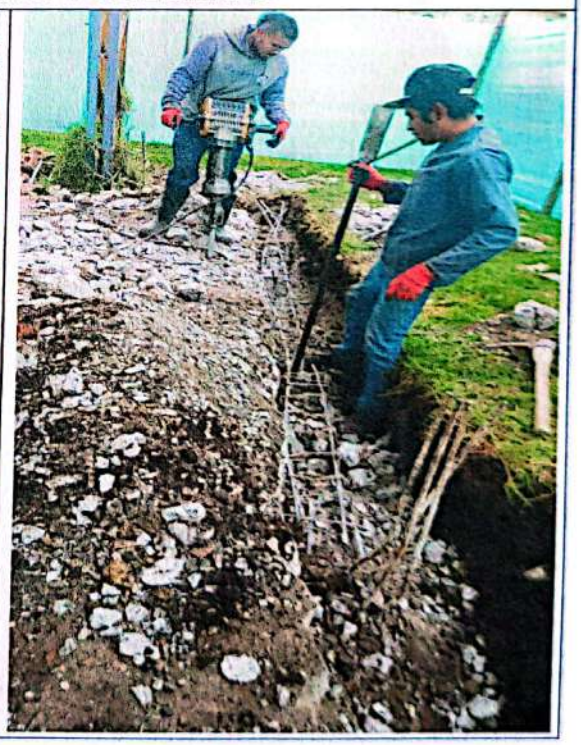LA MAGNOLIA	SAN CARLOS
DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERIA	
	
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	
	

Powered by CamScanner

GCS
Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S
NIT 900.653.937-2

DEMOLICIÓN PLACA





EXCAVACIÓN





Dirección: Calle 134 # 13- 66| Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gerencia@gcsconstrucciones.com.co


Powered by CamScanner

DESCAPOTE





RETIRO

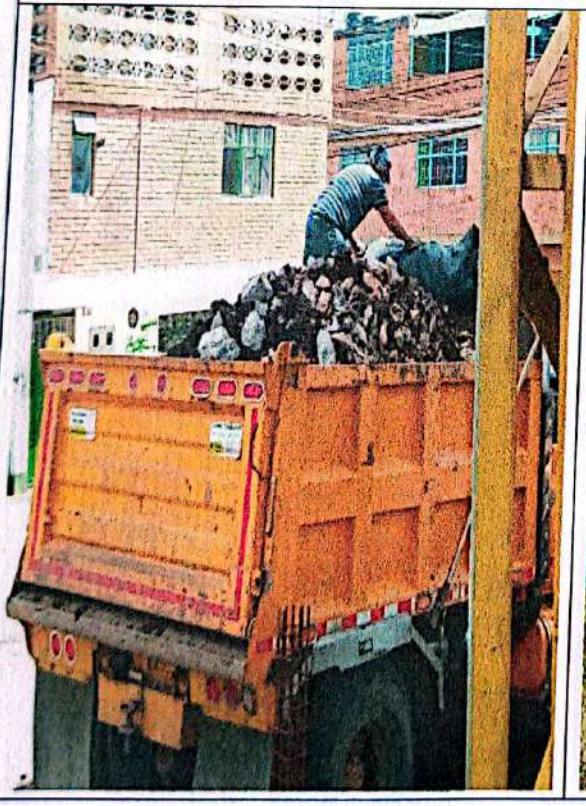



Dirección: Calle 134 # 13- 66| Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner

11. CONCLUSIONES

- El manejo de los residuos de construcción y demolición RCD, en sus etapas de demolición, excavación y/o cimentación y Construcción, son responsabilidad del constructor, ejerciendo los diferentes procedimientos establecidos en el plan RCD.

- El ingreso del total de los materiales de construcción para la ejecución de la obra ha sido suministrado por gestores y canteras debidamente autorizadas

Powered by CamScanner

ANEXO 5.
CERTIFICADO DISPOSICIÓN RCD

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

ANEXO III. FORMATO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GESTORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto		
Nombre o razón social	AGENCIA NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE S.A.S. E.S.P.	
Documento de identificación o NIT	830121307-6	
Representante Legal	CESAR A GAVIRIA S	
Dirección	TRANSV 57 A 103B-66	
Teléfono	3187509487	
Correo electrónico		
Municipio o Distrito	Bogotá	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD (t)**	
	Aprovechamiento	**Disposición final**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.		3620.55
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		145.53
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)		3.766,08
Período de reporte de RCD	05 de septiembre de 2022 a 25 de noviembre de 2022	

Cordialmente,

Powered by CamScanner
