Madrid - Cundinamarca, 24 de Abril de 2023

MUNICIPIO DE MADRID
RECIBIDO
25 ABR 2023
15938

Ingeniero:
HOLLMAN JOVANNY MENDEZ GONZALEZ
Secretario de infraestructura y servicios públicos
Alcaldía Madrid – Cundinamarca
Calle 5 No 4 - 74

CIM 047-2023

REFERENCIA: INFORME MENSUAL No 7 DEL CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA".

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente me permito remitir el informe mensual No 7 que corresponde al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022 del contrato de obra 543 – 2022, con sus respectivos anexos

Lo anterior para fines pertinentes.

Cordialmente,

MUNICIPIO DE MADRID
26 ABR 2023 H:8:30
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Cordialmente,

ZULAY YADIRA VASQUES PINO
R/L **UNIÓN TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022**
NIT: 901.580.791-3

FOLIOS 111

UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVO MADRID 2022
ut.interpolideportivosmadrid22@gmail.com
calle 8 No 10 – 02 oficina 79
321-2709494

Powered by CamScanner

GCS
Construcciones S.A.S

GCS Construcciones S.A.S
NIT 900.653.937-2
GCS-MAD-CO-543-043

Bogotá, 20 de Abril de 2023

Señores

ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO
UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022
Representante Legal.
Centro Comercial Bolivar OF. A10
Cucuta – Norte de Santander

ASUNTO: GCS-MAD-CO-543-043, INFORME MENSUAL No. 7 – DICIEMBRE

REFERENCIA: CONTRATO No 543 de 2022, "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remite el informe de obra mensual No. 7 correspondiente al mes de diciembre para su respectiva revisión y aval, el cual contiene el informe de obra, SST con sus respectivos anexos

Agradezco la atención prestada, quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

GCS CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
C. C. No. 1.126.001.358 de Londres (ING)
Tarjeta Profesional No.25202-252504 CND
NIT: 900.653.937-2

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Recibí
20-04-23

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

INFORME TECNICO No. 7 – MES DE DICIEMBRE 2022

MADRID, CUNDINAMARCA

2023

Powered by CamScanner

MADRID – CUNDINAMARCA

INFORME TECNICO No. 7

PERIODO: DICIEMBRE 01 DE 2022 – DICIEMBRE 31 DE 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"

Elaboró: DIANA MARIA OLAYA ORTIZ	**Revisó:** DANIEL CAMILO PRADA MILLAN	**Revisó y aprobó:** JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Cargo: Ing. Auxiliar	**Cargo:** Ing. Residente	**Cargo:** Representante Legal
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: 12/01/23	**Fecha:** 18/01/23	**Fecha:** 21/01/23

Powered by CamScanner

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. LOCALIZACIÓN 4
4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA 5
5. INFORME TECNICO 6
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
5.2. RESUMEN DE OBRA 8
5.2.1. Valor de Actividades por Frentes 8
5.2.2. Porcentaje por Frentes 9
5.3. REGISTRO PERSONAL 10
5.3.1. PERSONAL 10
5.4. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO 12
5.5. MODIFICACIONES DE CANTIDADES DE OBRA Y DISEÑOS 12
5.6. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 13
5.7. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA 13
5.8. REPORTE MULTAS Y SANCIONES 13
5.9. POLIZAS DEL CONTRATISTA 14
5.10. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO 14
5.11. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 14
5.12. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 15
5.13. AFECTACIONES 15
5.13.1. CONDICIONES CLIMATICAS 15
5.13.2. VANDALISMO 16
5.14. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS 17
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 17
7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN 17
7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS 25
7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA 32
7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS 32
8. CONCLUSIÓN 32

Powered by CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Madrid - Cundinamarca, concluyo contratar a GCS CONTRUCCIONES S.A.S para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato No 543 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**

El presente informe surge de la rendición de cuentas para la entidad contratante y consigna todas las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, cumpliendo con los aspectos técnicos y contractuales.

2. OBJETIVO

Generar un informe de rendición de cuentas del contrato de obra No. 543 de 2022, dando cumplimiento a las condiciones generales establecidas en el contrato según los requerimientos y observaciones realizadas por parte de la Interventoría y Supervisión.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid. Para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"**



Coordenadas 4°43'50"N 74°15'50"O

Powered by CamScanner

4. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	CO- 543 - 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS, Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MADRID (CUNDINAMARCA) NIT 899.999.325-8
CONTRATISTA	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
DIRECCIÓN	Calle 134 # 13-66
TELÉFONO	275 94 30
CORREO ELECTRÓNICO	gcs.construcciones@hotmail.com
ACTA DE INICIO OBRA	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	MARTES 31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	LUNES 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	30 DICIEMBRE 2022
FECHA DE REANUDACIÓN	30 DE ENERO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	02 DE MARZO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.404.922.142,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

Powered by CamScanner

5. INFORME TECNICO

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el transcurso del mes de diciembre se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo a los diferentes frentes de trabajo:

A. Frente polideportivo del barrio Escallón:

Inicio de actividades: **16 de junio 2022**

- Demolición vigas
- Excavación
- Retiro de sobrantes
- Relleno con Recebo común
- Fundición de concreto
    - Placa gradería
    - Estriado rampas
    - Base en concreto
    - Viga de amarre
    - Columnas
    - Placa base
    - Alfajías
- Muro en bloque de concreto
    - Cerramiento
    - Baños graderías
- Subbase granular
- Refuerzo malla electrosoldada

Powered by CamScanner

B. Frente polideportivo del barrio San Luis:

Inicio de actividades: **22 de junio 2022**

- Demolición cimiento enterrado
- Relleno con recebo común
- Fundición de concreto
    - Estructura de la cubierta:
        - Concreto Ciclópeo
        - Zapatas
        - Viga amarre
        - Columnas
    - Baños tarima
        - Placa base
- Refuerzo en malla electrosoldada
- Cajas de inspección sanitaria
- Salidas sanitarias PVC-S/PARAL 2" y 4"
- Red suministro hidráulico de 1/2" y 3/4"
- Punto hidráulico PVC-P/PARAL 1/2"
- Alistado pisos
- Muro en bloque N°4
- Celosía tubular
    - Cerramiento
    - Cubierta
    - Subbase granular

C. Frente polideportivo del barrio La Magnolia:

Inicio de actividades: **20 Julio 2022**

- En el frente de obra correspondiente al polideportivo de La Magnolia, durante el mes de diciembre no se realizó un avance significativo en la ejecución de actividades de obra, debido a que los proveedores tuvieron inconvenientes con el suministro de materiales que se solicitó.

Powered by CamScanner

D. Frente polideportivo barrio San Carlos

Inicio de actividades: **12 agosto 2022**

- Para el polideportivo San Carlos en el séptimo mes de ejecución de la obra, no se reportan avances debido a la escasez de materiales de construcción en el mercado, lo que ocasiono que se tuviera que dar un cierre temporal a este frente de trabajo, ya que no se contaba con material para trabajar; el personal se trasladó a los otros frentes.

5.2. RESUMEN DE OBRA

5.2.1. Valor de Actividades por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 806.875.792,00
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 1.428.004.293,00
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 1.398.078.270,00
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 771.963.787,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 4.404.922.142,00**

5.2.1.1. Valor de Actividades Ejecutadas por frente en el periodo del presente informe

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 0
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 118.715.854,88
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 132.488.746,72
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 0

5.2.1.2. Valor de Actividades Ejecutadas por frente acumulado

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	$ 258.361.628,92
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	$ 713.643.184,32
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	$ 538.698.298,54
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	$ 281.303.603,98

Powered by CamScanner

5.2.1.3. Valor de Actividades Ejecutadas General del proyecto

VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	**$ 251.204.601,60**
VALOR TOTAL de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	**$ 1.792.006.715,76**

5.2.2. Porcentaje por Frentes

1	POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	18,32%
2	POLIDEPORTICO ESCALLÓN	32,42%
3	POLIDEPORTIVO SAN LUIS	31,74%
4	POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	17,53%
	% TOTAL DEL PROYECTO	**100%**

5.2.2.1. Porcentaje Ejecución por Frentes en el periodo del presente informe

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	0%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	8,31%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	9,48%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	0%

5.2.2.2. Porcentaje Ejecución por Frentes acumulado

POLIDEPORTIVO SAN CARLOS	32,02%
POLIDEPORTICO ESCALLÓN	49,97%
POLIDEPORTIVO SAN LUIS	38,53%
POLIDEPORTIVO MAGNOLIA	36,44%

Powered by CamScanner

5.2.2.3. Porcentaje Ejecución General del Proyecto

PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato en el Periodo del Presente informe	5,70%
PORCENTAJE de Actividades Ejecutadas del total del contrato Acumulado	40,68%

5.3. REGISTRO PERSONAL

El personal vinculado a la obra contó con la entrega de los elementos de protección de seguridad industrial, además contaron con la afiliación, pagos de seguridad social y parafiscales, salud (EPS), riesgos laborales (ARL), pensión (AFP), caja de compensación, SENA e ICBF.

5.3.1. PERSONAL

El personal del contratista – GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, en obra en el periodo del presente informe, está compuesto por:

- Director de Obra: Javier Antonio González Arenas
- Ingeniero Residente de Obra: Daniel Camilo Prada Millán
- Asesor eléctrico: Carlos Julio Acevedo Ferreiro
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo: Daniel Mauricio Oler Restrepo
- Topógrafo: Leonel Eduardo López Duran
- Coordinador de Obra: José Lamus Rodríguez
- Asesor Estructural: Nicolas Alfonso Correa Duarte

ID		CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO
ING	1	ING. Auxiliar	Diana Maria Olaya Ortiz	1.073.176.550	Activo
PSS	1	ING. SISO Auxiliar	Etna Daniela Mora Salinas	1.007.569.303	Activo

Powered by CamScanner

MS	2	Maestro	José Omar Ortega Ortega	13.644.481	Activo
MS	3	Maestro	Derlen Fabián Becerra	1.102.717.527	Activo
OF		Oficial / Maestro	Luis Alfredo Palomino Pertuz	1.064.116.331	Se traslado a otra obra de la empresa
OF	4	Oficial	Wilman Lima Palomino	79.991.959	Se traslado a otra obra de la empresa
OF	5	Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	Activo
OF	6	Oficial	José Stiven Chávez Sanchez	1.069.926.042	Activo
OF	7	Oficial	Carlos Santana Obregón	1.051.737.892	Activo
OF	8	Oficial	Dagoberto Mora Téllez	9.167.984	Activo
AY	2	Ayudante	José Guillermo Rubio Chivata	6.761.189	Activo
AY	5	Ayudante	Oscar Daniel Torres Vanegas	1.070.970.219	Activo
AY	7	Ayudante	Daniel Enrique Arias Figueroa	1.081.797.879	Activo
AY	11	Ayudante	José Mauricio Contador Echeverria	1.095.571	Activo
AY	17	Ayudante	Pablo Emiro Bermon Rojas	5.414.671	Activo
AY	37	Ayudante	Barón Martinez Epinayu	17.945.714	Activo
AY	46	Ayudante	Andres Antonio Ipuana	1.124.077.746	Activo
AY	50	Ayudante	Ángel Miguel Lima Palomino	1.063.484.703	Se traslado a otra obra de la empresa
AY	54	Ayudante	Julio Cesar Delgado Castro	1.065.667.422	Se traslado a otra obra de la empresa
AY	55	Ayudante	William Andres Lima Mejía	1.192.771.091	Se traslado a otra obra de la empresa
AY	61	Ayudante	Dairon Hernández	1.073.171.132	Activo
AY	68	Ayudante	Alfredo José Epieyu Epinayu	1.124.540.026	Activo
AY	69	Ayudante	Samuel Rocha Villalba	1.002.423.265	Activo
AY	70	Ayudante	Nelson Rocha Obregón	73.584.580	Activo
AY	71	Ayudante	Esteban Santana Villalba	1.002.426.760	Activo
AY	79	Ayudante	Vicente Epieyu Epieyu	1.192.726.939	Activo
AY	80	Ayudante	Jhon Jairo Chávez Rodríguez	1.075.629.705	Activo

Powered by CamScanner

Notas: En el transcurso del mes de diciembre, se presentó la incorporación de personal nuevo, así como el retiro de varios empleados; en la tabla anterior se relaciona el estado actual del personal (28/12/2022). El día miércoles 28 de diciembre de 2022, todo el personal de obra fue desvinculado de la empresa, se vincularán nuevamente una vez se retomen actividades (10 enero 2023).

5.4. CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación, se encuentra el listado de maquinaria y equipo empleado que se encuentran en obra y en los diferentes frentes a desarrollar:

Cantidad	Descripción
1	Retroexcavadora
1	Minicargador – Bobcat
5	Volqueta capacidad mayor 6 m3
8	Pulidora
10	Porras
10	Barra
10	Picas
12	Pala
8	Macetas
2	Demoledor manual
8	Andamio (sección)
2	Vibro compactador (canguro)
2	Vibro compactador (rana)
2	Vibrador concreto

5.5. DISEÑOS

Las modificaciones en los diseños de los polideportivos presentados a interventoría y supervisión:

Frente polideportivo Escallón:

- Ubicación de las graderías: A borde con las columnas de la cubierta

Powered by CamScanner

- Ubicación de la placa de piso: Centrada con relación a la cubierta

Frente polideportivo San Luis:

- Niveles de la tarima: Nivel 0 = -0,4m por temas de seguridad con relación a la altura.
- Diseño de la cubierta del polideportivo

Frente polideportivo Magnolia:

- Diseño cimentación cerramiento
- Diseño de baños, no contemplados inicialmente

Frente polideportivo San Carlos:

- Dimensiones cerramiento: Lateral colindante con el predio de la iglesia

5.6. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS

Los ensayos realizados, así como los resultados de estos mismos, fueron anexados en la primera cuenta de cobro (11/11/2022). Los ensayos realizados después de esta fecha, serán anexadas en la siguiente cuenta de cobro.

5.7. COPIA DE LA BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra durante el periodo de ejecución del presente informe. (ANEXO No. 1)

5.8. REPORTE MULTAS Y SANCIONES

No se reportaron multas ni se adelantaron procesos de sanciones durante el periodo del presente informe.

Powered by CamScanner

5.9. POLIZAS DEL CONTRATISTA

Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma del SECOP

5.10. MANEJO DE CAMPAMENTO Y CENTRO DE ACOPIO

- El contratista cuenta con una oficina en el barrio Escallón (Carrera 10° # 15-29), de igual manera se está almacenando el material, herramientas de construcción y demás elementos en bodega, que se encuentra ubicada en el mismo barrio, en el predio colindante (parqueadero). Además, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno.

- En el polideportivo del barrio San Luis, se construyó un campamento en el interior de la obra, además, se cuenta con el alquiler del salón comunal del barrio San Luis, donde se guarda material y herramientas de la obra.

- En el polideportivo del barrio La Magnolia, se cuenta con personal para celaduría en el horario nocturno, por lo cual, las herramientas y material de construcción permanecen dentro de la obra.

- En el polideportivo San Carlos, el contratista cuenta con el alquiler de dos (2) bodegas ubicadas en el frente del polideportivo (Carrera 21 6B Sur), para el almacenamiento de equipo y herramientas.

5.11. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Todo el material generado por las actividades como excavación o demolición en los diferentes frentes de trabajo es apilado en puntos estratégicos dentro de las obras para posteriormente ser retirado implementando volquetas, retroexcavadora y bodcat hacia botaderos certificados. Estos certificados se anexan trimestralmente en el informe ambiental.

Powered by CamScanner

5.12. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

Frente polideportivo Escallón:

Se evidencia la presencia de un cuerpo de agua colindante con el cerramiento del polideportivo por la parte posterior y a la medianía con el predio correspondiente con el parqueadero, el cual, afecto el proceso constructivo en los meses anteriores; en el transcurso del mes de diciembre, no se presentó inconvenientes por la presencia de este cuerpo de agua.

Frente polideportivo San Luis:

En el área de influencia de este frente, no se presenta ningún cuerpo de agua; pero si se genera inconvenientes en tiempos de lluvia, debido a que el polideportivo no cuenta con cubierta, lo que genera empozamiento de agua y afectaciones a las condiciones del terreno.

Frente polideportivo La Magnolia:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

Frente polideportivo San Carlos:

En el área de influencia de este polideportivo, no se evidencia la presencia de cuerpos de agua.

5.13. AFECTACIONES

5.13.1. CONDICIONES CLIMATICAS

En el transcurso del séptimo mes de ejecución del proyecto, se presentaron inconvenientes por las condiciones climáticas (lluvia) en algunos días de trabajo en todos los frentes de los polideportivos, pero en menor frecuencia en comparación con los meses anteriores; ya que el mes de diciembre fue mayormente soleado. (Anexo No. 2)

Powered by CamScanner

A pesar de que el mes de diciembre fue mayormente soleado, se evidencio en algunas ocasiones fuertes lluvias lo que genero algunos inconvenientes en los diferentes frentes de trabajo:

Frente Polideportivo Escallón:

- Detención de actividades, especialmente fundición de concreto ya que en el área de trabajo no se cuenta con cubierta (muro de cerramiento – gradería) por lo cual se frenan las actividades que se estaban desarrollando por la seguridad y salud de los trabajadores.

Frente Polideportivo San Luis:

- Debido a que este polideportivo no cuenta con cubierta, las labores se interrumpen cuando se presenta precipitación, por lo cual, se debe detener toda actividad que se esté desarrollando. En el transcurso del mes del presente informe los inconvenientes por agua fueron ocasionales, pero si afectaron las actividades que se estaban desarrollando debido a que en este mes se empezó a realizar la construcción de la estructura de la cubierta, lo que requiere de equipo de soldadura y ya que el lugar de trabajo es a la intemperie, este se ve afectado en tiempos de lluvia.

Frente Polideportivo La Magnolia y Polideportivo San Carlos:

- En el transcurso del mes de diciembre no se reportan actividades en estos frentes debido a escasez de materiales, por lo cual las condiciones climáticas no fueron un factor a considerar.

5.13.2. VANDALISMO

En el periodo del presente informe no se reporta el hurto de material y herramientas en los diferentes frentes de trabajo. El contratista, además de tener el alquiler de bodegas para almacenamiento, cuenta con celador en el horario nocturno en todos los frentes de obra con el fin de evitar estas acciones.

Powered by CamScanner

6. REPORTE INSPECCIONES REALIZADAS

En el periodo del presente informe No se registran inspecciones de obra en los diferentes frentes de trabajo.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1. FRENTE: POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

Demolición vigas





Excavación





Powered by CamScanner




Retiro de sobrantes



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Relleno con Recebo común

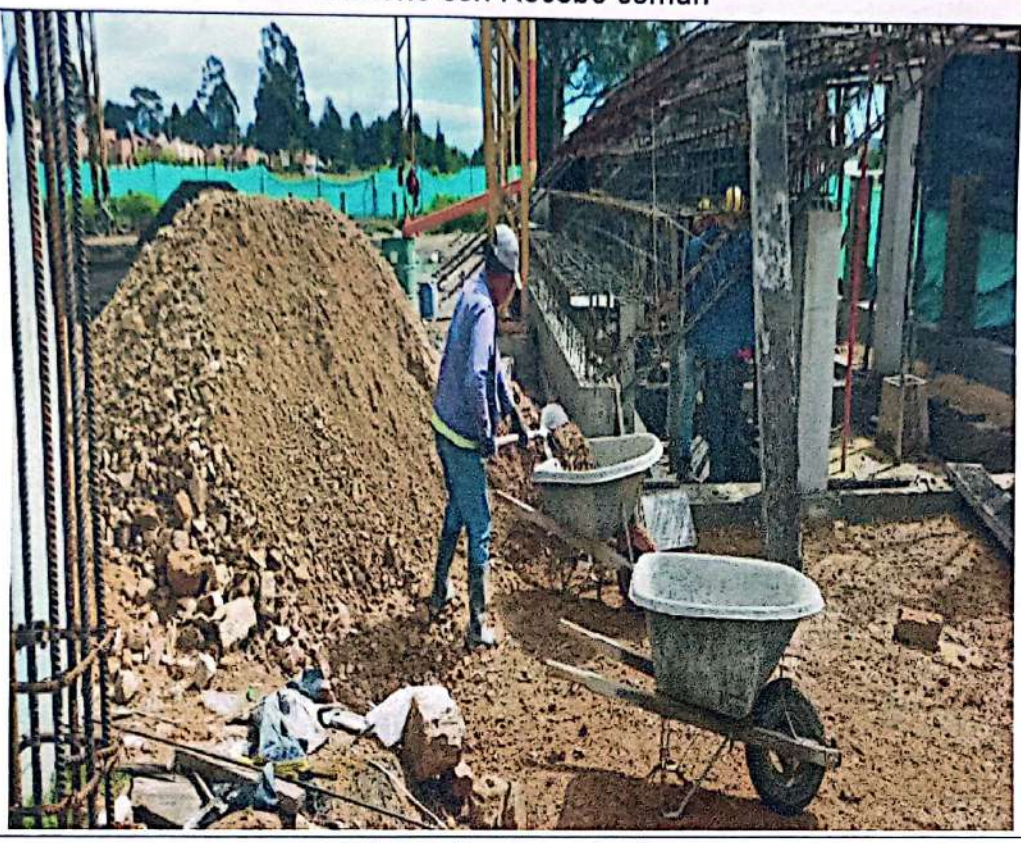

Fundición de concreto:
Placa gradería - Estriado rampas - Base en concreto - Viga de amarre – Columnas - Placa base - Alfajías



Powered by CamScanner




Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner







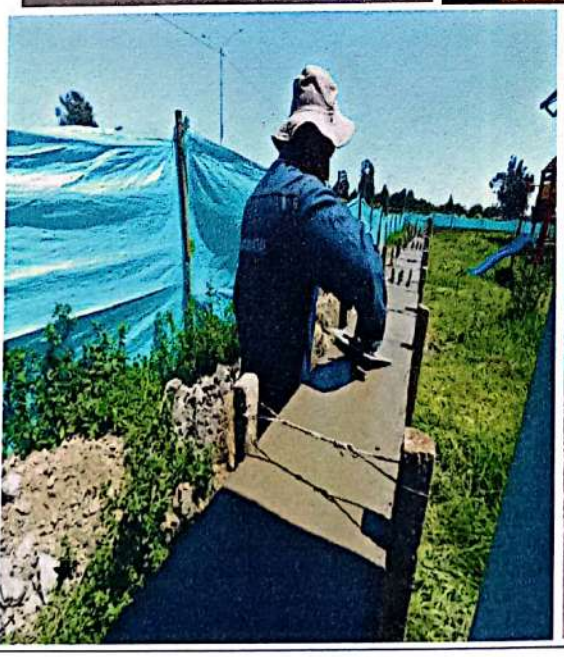



Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Muro en bloque de concreto:
Cerramiento - Baños graderías









Powered by CamScanner

Subbase granular



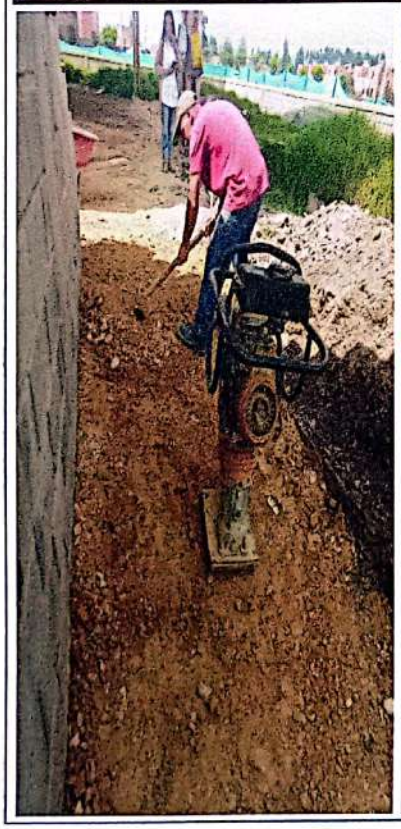

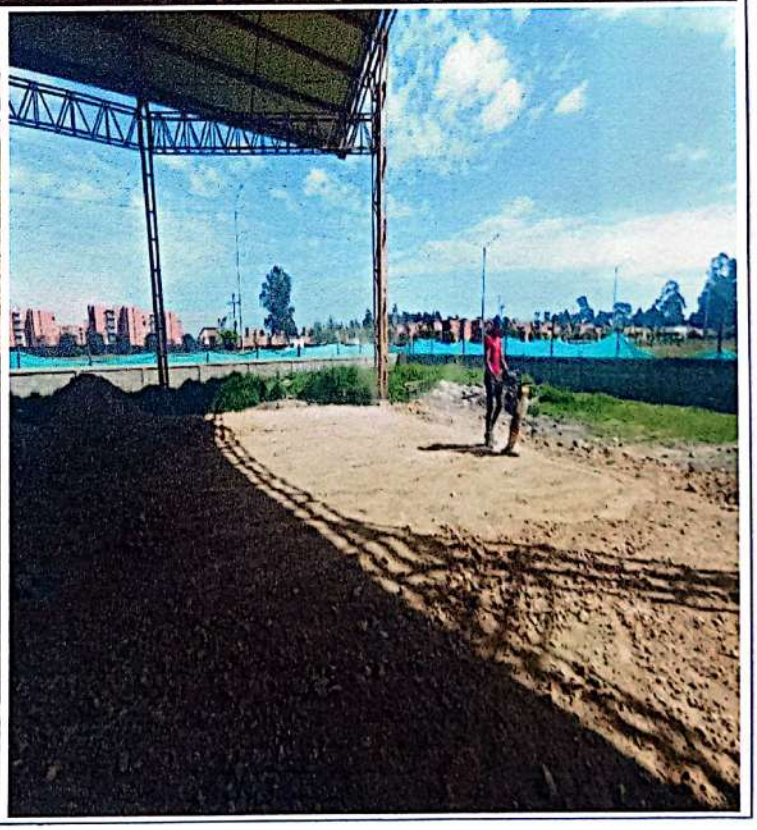


Powered by CamScanner

Refuerzo malla electrosoldada





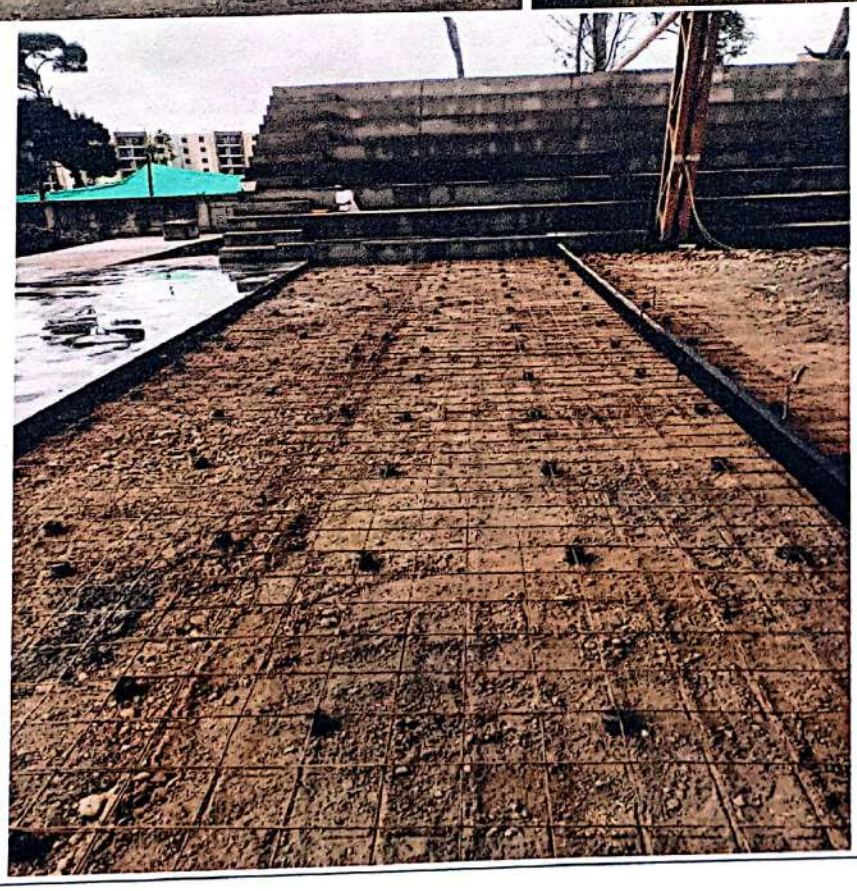


Powered by CamScanner


7.2. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN LUIS


Demolición cimiento enterrado



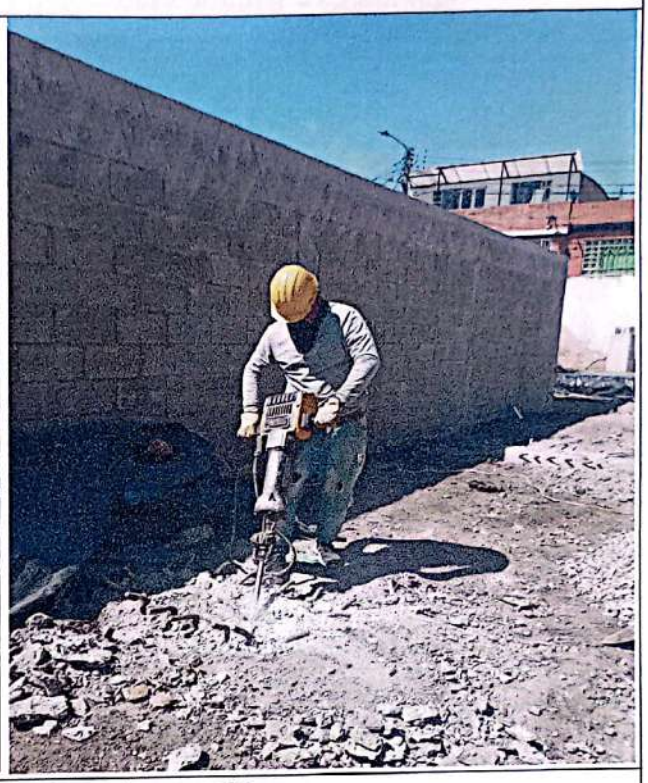

Relleno con recebo común

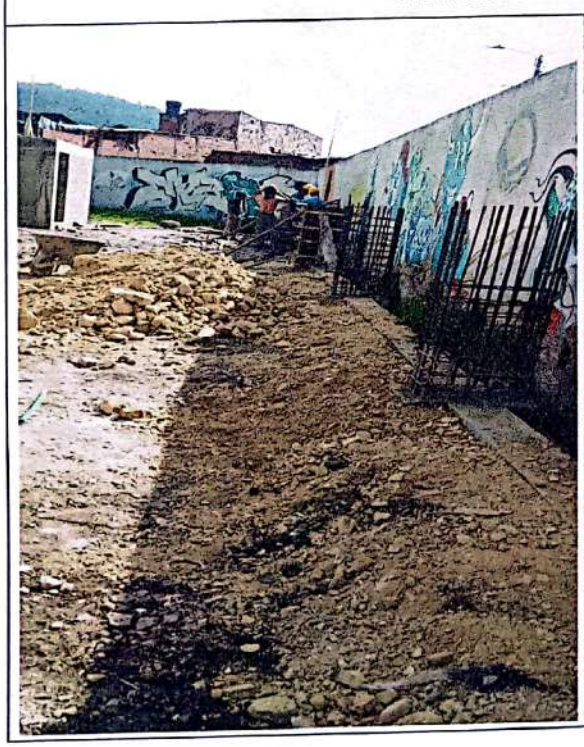

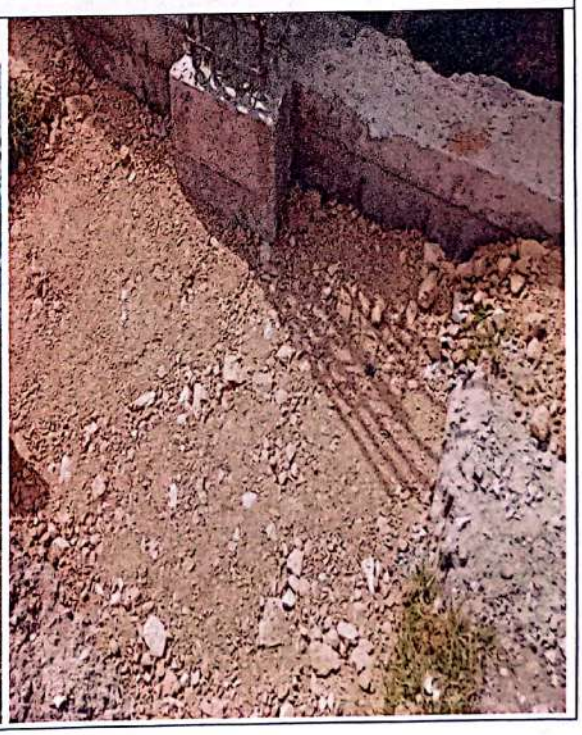

Powered by CamScanner

Fundición de concreto
Estructura de la cubierta: Concreto Ciclópeo – Zapatas - Viga amarre – Columnas









Powered by CamScanner



Baños tarima:
Placa base




Powered by CamScanner

Refuerzo en malla electrosoldada



Cajas de inspección sanitaria



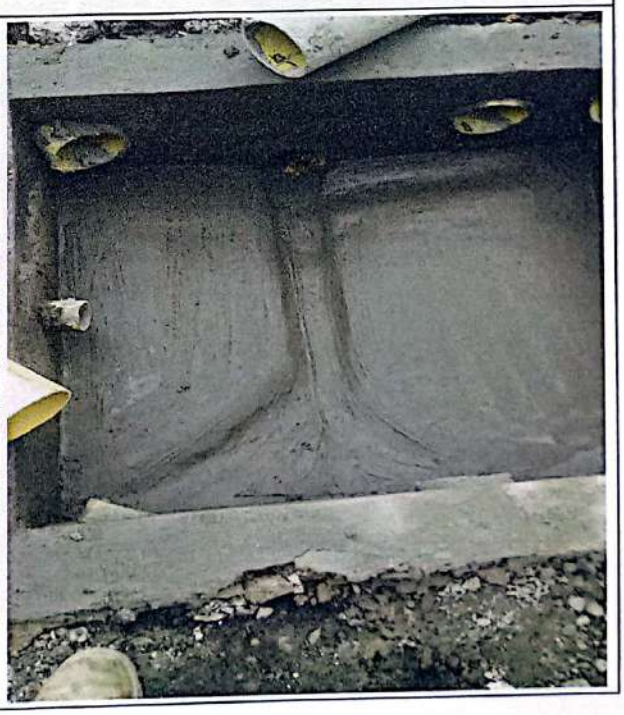

Powered by CamScanner


Red sanitaria y Red suministro hidráulico






Muro en bloque N°4




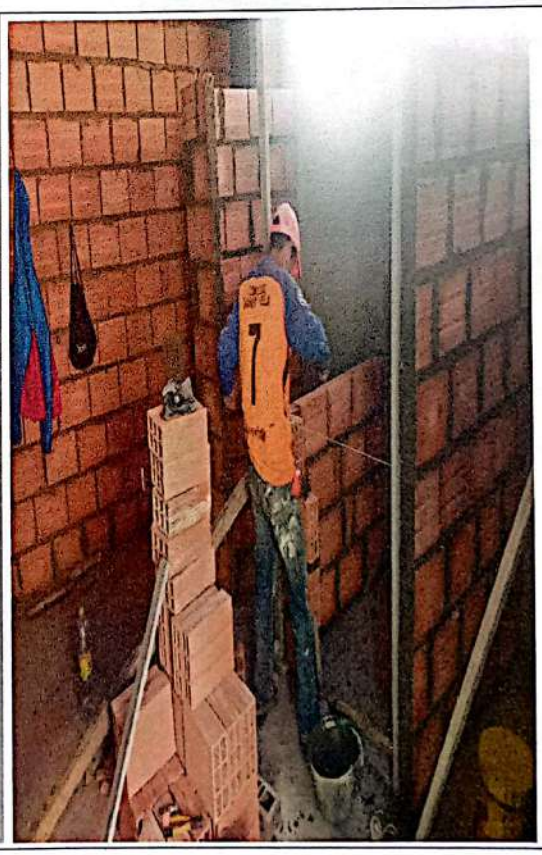



Powered by CamScanner

Celosía tubular
Cerramiento - Cubierta

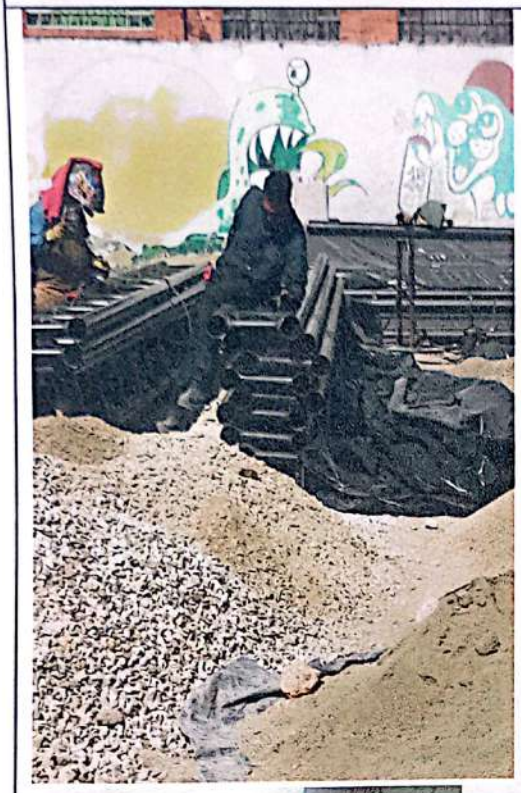

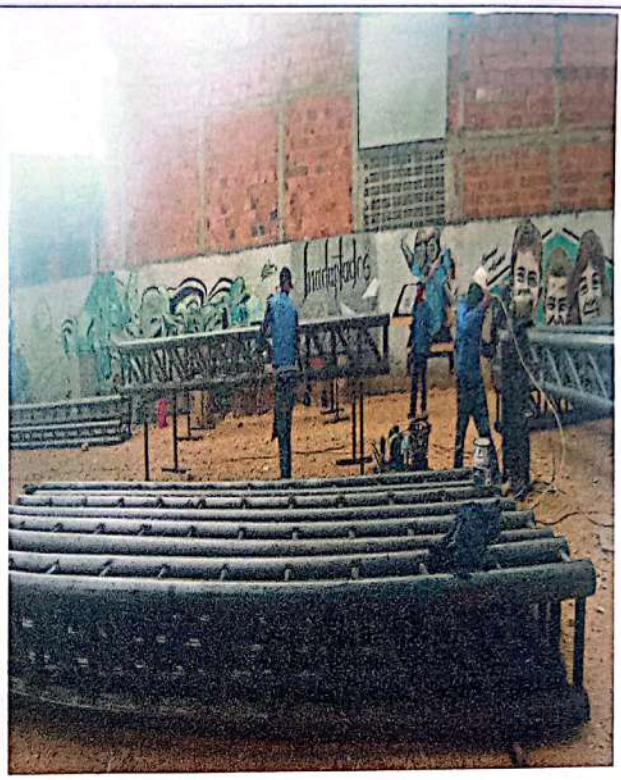

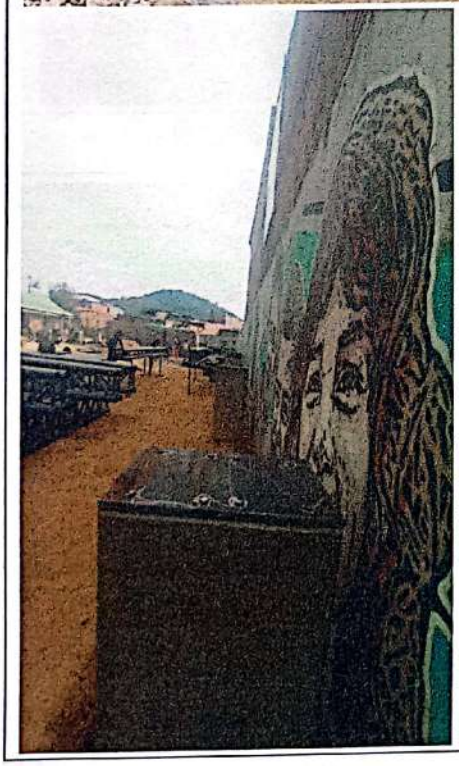

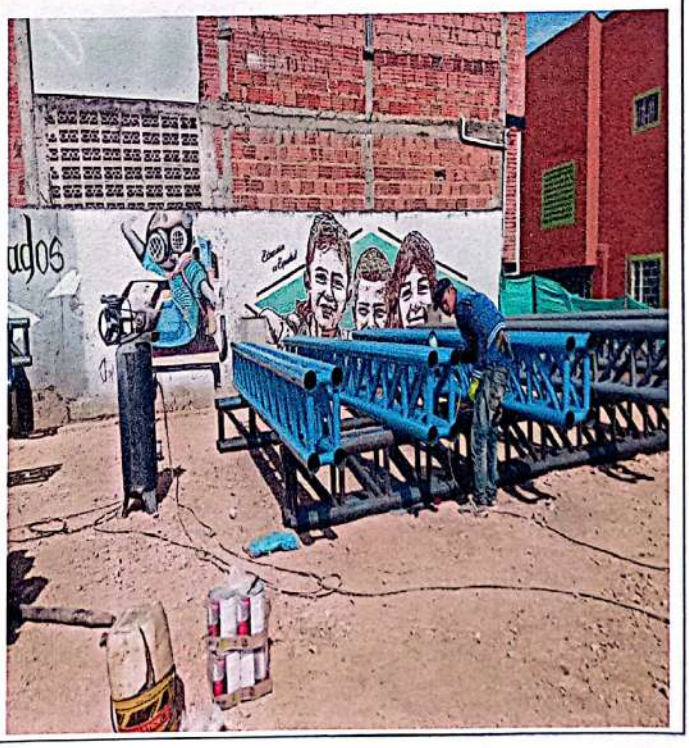

Powered by CamScanner



Subbase granular





Powered by CamScanner

7.3. FRENTE: POLIDEPORTIVO LA MAGNOLIA

- En el transcurso del mes de diciembre no se realizaron actividades en este frente.

7.4. FRENTE: POLIDEPORTIVO SAN CARLOS

- En el transcurso del mes de diciembre no se realizaron actividades en este frente.

8. CONCLUSIÓN

Se concluye que el proyecto referente al contrato de obra No. 543 de 2022 que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".** suscrito entre la Alcaldía de Madrid (CUNDINAMARCA) y GCS CONSTRUCCIONES S.A.S, presento el avance de ejecución de las actividades contratadas respecto al mes siete (7) y las obras que a su vez fueron ejecutadas de conformidad con la interventoría y la supervisión por parte del municipio. Se continúan actividades de acuerdo a programación y avance de acuerdo al debido proceso constructivo para cada frente de trabajo.

Las condiciones climáticas en el mes de diciembre no afectaron en gran magnitud el avance de obra en los diferentes frentes de trabajo, pero a pesar de esto, se sigue evidenciando retrasos como consecuencia a la ola invernal reportada en los meses anteriores. Otro factor que perjudica el avance de obra es la escasez de materiales de construcción, principalmente el acero, razón por la cual, GCS CONSTRUCCIÓNES plantea como plan de contingencia, formalizar la solicitud de una suspensión por el transcurso de un mes, con el fin de garantizar la presencia de materiales necesarios en todos los frentes de trabajo.

Powered by CamScanner

ANEXO 1.
BITACORA

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

542 - 2022.

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCION: OBRA NUEVA- ADECUACION- CERRAMIENTO

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO SAN CARLOS

FECHA INICIO

12 AGO 2022.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

26 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima:
Nublado

28 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima:
Parcialmente Nublado

29 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima:
Nublado.

30 Noviembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima:
Soleado / Parc Nublado.

01 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Parcialmente nublado
Poco Soleado

02 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima:
Parcialmente Nublado
Tarde Lluviosa.

03 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMV

Estado del clima
Poco Soleado
Parcialmente nublado

Powered by CamScanner

05 Diciembre 2022
No se reportan actividades
Ni se reporta visita del alcalde
D.M.

Estado del Clima.
Soleado / Poco Nublado

06 Diciembre 2022
No se reportan actividades.
D.M.

Estado del Clima
Nublado / Poco Soleado

07 Diciembre 2022
No se reportan actividades
D.M.

Estado del Clima:
Nublado / Presencia de lluvia.

09 Diciembre 2022
No se reportan actividades.
D.M.

Estado del Clima:
Nublado / Poco soleado

10 Diciembre 2022
No se reportan actividades
D.M.

Estado del clima.
Nublado

12 Diciembre 2022
No se reportan actividades
D.M.

Estado del Clima
Nublado

13 Diciembre 2022
No se reportan actividades
D.M.

Estado del Clima
Soleado

Powered by CamScanner

14 Diciembre 2022 — Estado del clima
No se reportan actividades. — soleado
Tarde lluvioso
DMF

15 Diciembre 2022 — Estado del clima
No se reportan actividades. — Soleado
DMF

16 Diciembre 2022 — Estado del clima
No se reportan actividades. — Soleado
DMF

17 Diciembre 2022 — estado del clima.
No se reportan actividades. — Soleado
DMF

19 Diciembre 2022 — estado del clima.
No se reportan actividades. — soleado
Poco Nublado
DMF

20 Diciembre 2022 — Estado del clima
No se reportan actividades. — Soleado
DMF

Powered by CamScanner

21 Diciembre 2022
No se reportan actividades.
DMP

estado del clima
Soleado
Tarde lluviosa.

22 Diciembre 2022
No se reportan actividades.
DMP

estado del clima
soleado / Poco nublado

23 Diciembre 2022
No se reportan actividades.
DMP

estado del clima
Soleado

24 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMP

estado del clima
Soleado

26 Diciembre 2022
No se reportan actividades.
DMP

estado del clima
Soleado

27 Diciembre 2022
No se reportan actividades
DMP

estado del clima
Soleado

28 Diciembre 2022
No se reportan actividades.
DMP

estado del clima
Soleado

Powered by CamScanner

24 Diciembre 2022 Estado del clima

No se reportan actividades. Soleado

30 Diciembre 2022

El contrato 513 - 2022 Entra en suspension por el termino de un (01) mes a partir del 30 de Diciembre, se reanudaran actividades de obra el dia 30 de Enero del 2023

30 Enero de 2023. Estado del clima Nublado

Personal en obra

Residente de obra.

Residente de interventoria

Maestro de obra. (-1)

oficial de obra. (1)

Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor.

Actividades de obra

1. Muro en blogue de concreto prefabricado.
2. Excavacion y Retiro de Sobrantes.

Powered by CamScanner

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO.

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLÓN.

FECHA INICIO:

16 JUN 2022

impulsado por CamScanner

Powered by CamScanner

30 Noviembre de 2022

Estado del Clima:
Nublado / Parcialmente Soleado.

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria
- Maestro de obra.
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
-Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Encofrar y fundir columnas.
2. Amarre de acero.
3. Relleno con recebo común debidamente compactado.

DMF

01 Diciembre 2022

Estado del Clima:
Nublado / Poco Soleado

Personal en obra:
- Residente de obra.
- Residente de interventoria.
- Maestro de obra.
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador.

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo común debidamente compactado
2. Encofrar y fundir concreto para viga de amarre del muro de cerramiento.
3. Armar acero
4. Encofrar placa para pasos y contrapasos gradería

DMF

Powered by CamScanner

02 Diciembre 2022

Estado del clima
Parcialmente Nublado

- Personal en obra
  - Residente de obra
  - Residente de interventoria
  - Maestro de obra
  - Oficial de obra (2)
  - Ayudantes de obra (9)
- Maquinaria y Equipo
  - Herramienta menor. Mezcladora compactador
- Actividades de obra
  1. Demolicion de vigas y Retiro de Escombros
  2. Kelleno con recebo compactado mecanicamente
  3. Fundicion de concreto para viga de amarre y columnas
  4. Amarre de acero.
  5. Fundicion concreto para placa de graderias

03 Diciembre 2022

Estado del clima:
Sabado Poco Nublado

- Personal en obra
  - Residente de obra
  - Residente de interventoria
  - Maestro de obra
  - Oficial de obra (3)
  - Ayudantes de obra (9)
- Maquinaria y Equipo
  - Herramienta menor. Mezcladora compactador.
- Actividades de obra.
  1. Amarre de acero
  2. Fundicion de concreto para placa de graderias
  3. Kelleno con recebo
  4. Retiro de sobrantes

Powered by CamScanner

05 Diciembre 2022

Estado del clima:
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (4)
Director de obra

Maquinaria y equipo
Herramienta menor. Mezcladora Demoledor manual compactador

Actividades de obra.
1. Demolición vigas y columnas
2. Retiro de sobrantes
3. Fundición de placa para gradarias
4. Relleno en recebo común debidamente compactado

DM

06 Diciembre 2022

Estado del clima
Nublado con presencia de lluvia.

Personal en obra.
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Demoledor manual compactador.

Actividades de obra
1. Retiro de sobrantes
2. Amarre de acero
3. Fundición placa para gradarias.
4. Relleno en recebo común
5. Limpieza de material sobrante

DM

Powered by CamScanner

10

09 Diciembre 2022

Estado del clima
Nublado
Tarde lluviosa.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Martillo compactador.

Actividades de obra
1 Relleno con recebo común
2 Demolición de vigas
3 Retiro de escombros.
4 Fundición de concreto para placa de gradenas
5. Muro en bloque de concreto prefabricado

09 Diciembre 2022

Estado del clima
Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra.
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor compactador.

Actividades de obra.
1 Relleno con recebo común
2. Muro en bloque de concreto prefabricado
3 Retiro de escombros.
4 Demolición viga
5 Fundición placa para gradenas

Powered by CamScanner

10 Diciembre 2022

Estado del clima.
Nublado con presencia de lluvia.

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor Mezcladora compactador

Actividades de obra:
1. Relleno con recebo comun.
2. Retiro de sobrantes.
3. Muro en bloque de concreto prefabricado.
4. Fundicion de obra para graderia

12 Diciembre 2022

Estado del clima.
Nublado con presencia de lluvia

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra.
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra. (9)
Director de obra.

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. compactador.

Actividades de obra.
2. Retiro de sobrantes
2. Arreglos varios
3. Relleno con recebo comun
4. Muro en bloque de concreto.

Powered by CamScanner

13 Diciembre 2022

Estado del Clima
Soleado / Poco Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora compactador.
Actividades de obra:
1. Relleno con recebo comun debidamente compactado
2. Retiro de sobrantes
3. Amarrar acero
4. Muro en bloque de concreto
5. Fundicion de placa para gradenas.

DMP

14. Diciembre 2022

Estado del Clima.
Soleado
Tarde lluviosa.

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (4)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. compactador.
Actividades de obra
1. Relleno con recebo comun debidamente compactado
2. Muro en bloque de concreto
3. Amarrar acero.

DMP

Powered by CamScanner

15 Diciembre 2022

Estado del clima
soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. compactador
Actividades de obra
1. Relleno con recebo común debidamente compactado
2. Encofrar placa para gradería
3. Muro en bloque de concreto

DMF

16 Diciembre 2022

Estado del clima
soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. compactador Mezcladora
Actividades de obra
1. Relleno con recebo común debidamente compactado
2. Pedido de Señuelos
3 Muro en bloque de concreto
4. Fundicion de placa para gradería

DMF

Powered by CamScanner

1º Diciembre 2022

Estado del Clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de inventario
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. compactador
Actividades de obra.
1 Relleno en terreno con material compactado mecanicamente.
2 Armado acero
3 Muro en bloque de concreto prefabricado

D M/ N

19 Diciembre 2022

Estado del Clima.
Soleado
Poco Nublado

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de inventario
Maestro de obra
Ayudantes de obra (2)
Oficial de obra (9)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Compactador.
Actividades de obra.
1 Relleno en terreno con material compactado mecanicamente
2 Muro en bloque de concreto prefabricado.
3 Encofrar placa para gradería.
4 Colocar grandes con formas de [illegible]

D M/ N

Powered by CamScanner

20 Diciembre 2022

Estado del clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor compactador Mezcladora.
Actividades de obra:
1 Relleno con recebo común.
2. Armado de acero
3 Fundición de placa para gradas
4 Subbase granular para rampas de acceso baños.

21 Diciembre 2022

Estado del clima
Soleado
Tarde lluviosa.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Compactador
Actividades de obra
1 Relleno con recebo común
2. Subbase granular
3. Armado de acero y fundición de placa para gradas

Powered by CamScanner

Estado del Clima
· Soleado / Poco Nublado

22 Diciembre 2022

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo
-Herramienta menor. compactador Mezcladora

Actividades de obra.
1 Relleno con recebo comun compactado mecanicamente
2 Fundicion de concreto para placa de gradenes
3 Fundicion de concreto para Ramps de acceso a baños.
4. Sub base granular.
5 Refuerzo malla electrosoldada

23 Diciembre 2022 Estado del Clima
Personal en obra Soleado
Residente de obra Tarde lluviosa.
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudante de obra (9)

Maquinaria y Equipo
-Herramientamenta Mezcladora compactador.

Actividades de obra.
1 Relleno con recebo comun.
2 Subbase granular
3 Refuerzo malla electrosoldada
4 Fundicion de concreto para Ramps
5 Formaleta recta y curva (fibra para gradenes


24 Diciembre 2022

Estado del Clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (5)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Compactador. Mezcladora

Actividades de obra:
1. Rellenos con recebo común compactado
2. Armado de acero y encofrado de placa para graderias
3. Sub base granular debidamente compactada
4. Fundicion Alrejios




26 Diciembre 2022

Estado del Clima:
Soleado

Personal de obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (5)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor. Mezcladora compactador

Actividades de obra:
1 Excavacion manual y relleno con recebo comun
2 Fundicion de concreto para placa de graderia
3 Sub base granular debidamente compactada
4 Fundicion alrejios
5 Base en concreto pobre
6. Malla electrosoldada



Powered by CamScanner

27 Diciembre 2022

Estado de [illegible]
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria.
Maestro de obra
Oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (5)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Mezcladora compactador
Actividades de obra:
1. Fundicion de base en concreto pobre.
2. Subbase granular, Malla de refuerzo y Placa base
3. Fundición viga de amarre.
4. Amarre de acero
5. Relleno con recebo.

28 Diciembre 2022

estado del clima
Soleado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (5)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezclarora compactador
Actividades de obra:
1. Fundicion de Columnas.
2. Subbase granular. y Malla electrosoldada
3. Amarre de acero
4. Relleno con recebo
5. Fundicion de dilatos

Powered by CamScanner

Con la finalidad de [illegible] día 24 y 25 de diciembre al personal

El contrato 543-2022 entra en vigencia el día 30 de Diciembre por el termino de un mes, se renuevan actividades el 31 de Enero de 2023.

31 Enero 2023.

Estado del día
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de inventario
Maestro de obra
Oficial de obra (3)
Ayudantes de obra (7)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora compactador
Actividades de obra
1. Sub base granular
2. Instalación de malla electrosoldada y fundición de concreto para placa base
3. Tarrajeo de ollajas
4. Retiro de escombros
5. Armado de acero y fundición de columnas

Estado del día
Nublado

1 Febrero 2023

Personal en obra
Residente de obra
Residente de inventario
Maestro de obra
Oficial de obra (3)
Ayudantes de obra (7)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora compactador

... Actividades de obra:

1. Sub base granular
2. amarar acero, encofrar columnas y atrajes.
3. Fundir columnas y atrajes.
4. Retiro de Escorantes

Powered by CamScanner

Powered by CamS

CONTRATO OBRA PUBLICA

543 - 2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA - ADECUACION - CERRAMIENTO

FRENTE:

POLIDEPORTIVO BARRIO SAN LUIS.

FECHA INICIO:

22 JUN 2022.

impulsado por CamScanner

Powered by CamScanner

30 Noviembre 2022 Estado del Clima
Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (6)
Maquinaria y Equipos:
Herramienta menor . Mezcladora . Aprisonador Vibrador
Actividades de obra
1 Excavación manual y demolición de cimiento enterrado
2 Fundición de concreto ciclopeo, base en concreto pobre concreto para zapatas, pedestales y vigas de la estructura de la cubierta.
3. Relleno con recebo debidamente compactado
4. Retiro de sobrantes.
5. Amarre de acero.

01 Diciembre 2022 Estado del Clima
Soleado
Tarde poco lubiada

Personal en obra:
Residente de obra.
Director de obra.
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipos:
·Herramienta menor ·Demedor Manual ·Mezcladora ·Aprisonador
Actividades de obra:
1. Demolicion cimiento pedestales y vigas existentes
2. Excavacion manual para vigas y zapatas de la cub...
3 Retiro de Sobrantes.
4. Fundicion de ... 1. para ...

Powered by CamScanner

.. 5. Amarre de acero
6 Relleno con recebo

02 Diciembre 2022
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Estado del clima: Parcialmente Nublado
Maquinaria y Equipo
·Herramienta menor · Mezcladora · Apisonador.
Actividades de obra:
1. Amarrar acero para zapatas y columnas estructura de la cubierta
2 Fundicion de concreto ciclopeo, concreto para zapatas y pedestales de la estructura de la cubierta.
3. Relleno con recebo debidamente compactado

03 Diciembre 2022
Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (7)
Estado del clima: Soleado poco Nublado.
Maquinaria y Equipo:
·Herramienta menor · Mezcladora · Apisonador.
1 Amarrar acero y fundir concreto para zapatas y pedestales.
2. Relleno con recebo debidamente compactado.

Powered by CamScanner

05 Diciembre 2022

Estado del Clima
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo
•Herramienta menor •Mezcladora •Apisonador •Soldador manual

Actividades de obra.
1. Excavación manual y fundición concreto enterrado.
2. Amarrar acero para zapatas, vigas y columnas.
3. Fundir concreto para zapatas, vigas y columnas de la estructura de la cubierta
4. Relleno con recebo debidamente compactado

Nota:
se reporta visita del Alcalde en compañia de su equipo de trabajo.

06 Diciembre 2022

Estado del Clima.
Nublado con presencia de lluvia

Personal en obra
Residente de obra.
Residente de interventoria.
Maestro de obra (1)
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Vibrocompactador

Actividades de obra.
1 Excavación manual
2 Fundición de cimiento enterrado.
3 Fundir concreto para zapatas, vigas y columnas para la estructura de la cubierta
3 Relleno con recebo común compactado mecánicamente
4 Amarre de acero

07 Diciembre 2022

Estado del clima
Nublado en general
de Lluvia
Parcialmente
Nuboso

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (4)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Vibrocompactador manual Vibrocompactador

Actividades de obra.
1. Fundicion de concreto ciclopeo
2. Fundicion de concreto para zapatas
3. Instalacion instalacion de red sanitaria y red hidraulica
4. Armado de acero
5. Relleno con recebo comun debidamente compactado.
6. Demolicion cimiento existente

09 Diciembre 2022

estado del clima
Nublado/poco
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (8)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Mezcladora Vibrocompactador

Actividades de obra:
1. Fundicion concreto para zapatas, vigas y columnas de la estructura de la cubierta
2. Relleno con recebo comun debidamente compactado.
3. Armado de acero.

Powered by CamScanner

Estado del clima
Nublado con presencia de lluvia

Diciembre 2022
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (2)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (9)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Vibro compactador
Actividades de obra.
1 Fundacion concreto para columnas, vigas y zapatas para la estructura de la cubierta
2 Rellenos con recebo comun
3 Cajas de inspeccion sanitarios
4. Amarre acero

12 Diciembre 2022
Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1) Soldadores (2)
oficial de obra (2) Ayudantes Soldadores (4)
Ayudantes de obra (7)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor Mezcladora Equipo soldadora Tranzadora
Actividades de obra
1 Amarre de acero
2 Fundicion viga de amarre y columnas
3. Muro en bloque N 4
4. Celosia tubular → corte de elementos
5. Almacenado picos para bases.

Estado del clima
Nublado con presencia de lluvia

13 Diciembre 2022

Estado del clima
Soleado / Frio
Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (1)
Soldadores (2)
Ayudantes Soldadores (4)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor
Actividades de obra.

1. Fundicion placa de entrepiso para la loma → Este item es un NP (no pensado) ya que no se encuentra en el contrato inicial
2. Aislado pisos. para baños.
3. Corte perfiles (rebosa tubular) para estructura de la cubierta

14 Diciembre 2022

Estado del clima:
Soleado
Tarde para lluvioso.

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra (1)
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (1)
Soldadores (1)
Ayudantes Soldadores (4)
Maquinaria y Equipo:
Herramienta menor. Mezcladora Equipo soldadura Tronzadora Vibrocompacta
Actividades de obra.

1. Amarre de acero
2. Fundicion vigas de amarre y columnas para estructura de la cubierta
3. Demolicion de concreto enterrado para nivelacion del terreno para Subbase de la placa de la rampa
4. Corte perfiles rebosa tubular para estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

15 Diciembre 2022

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra (1)

Oficial de obra (2)

Ayudantes de obra (3)

Estado del clima

Soleado

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor Mezcladora Demoledor Manual Equipo Soldadura

Actividades de obra

1 Demolición de amiento enterrado

2 Armare de acero

3 Fundicion concreto para viga de amarre y columnas de la estructura de la cubierta

4 Corte y Soldadura Celosía tubular para estructura de la cubierta

16 Diciembre 2022

Personal en obra

Residente de obra

Residente de interventoría

Maestro de obra

Oficial de obra (2)

Ayudantes de obra (3)

estado del clima.

Soleado

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo.

Herramienta menor Demoledor manual vibrocompactador Equipo Soldadura

Actividades de obra:

1. Demolición de amiento enterrado para nivelar el terreno
2. Armare de acero y fundicion de concreto para viga de amarre y columnas de la estructura de la cubierta
3. Muro en bloque N4 para los elevaciones de los baños
4. Corte y soldadura para la celosía tubular para la estructura de la cubierta

Powered by CamScanner

16 Diciembre 2022

Estado del clima
Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Oficial de obra (1)
Ayudantes de obra (6)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor
Actividades de obra.
1. Excavación de cimiento enterrado
2. Fundición de viga de amarre y columnas para estructura de la cubierta
3. Amarre de acero y corte de celosía
4. Muro en bloque N° 4 para divisiones de baños.

Soldadores (6)

19 Diciembie 2022

Estado del clima
Soleado
Poco Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (6)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor, Mezcladora vibrocompactador.
Actividades de obra.
1 Fundición de columnas en concreto
2 Corte y soldadura para estructura de la cubierta
3. Muro en bloque N°4 para divisiones de baños
4 Sub base granular debidamente compactada

Soldadores (6)

Equipo soldadura.

Powered by CamScanner

2 Diciembre 2022 Estado del Clima

Personal en obra Soleado

Residente de obra

Residente de interventoria

Maestro de obra

Ayudantes de obra (2) Soldadores (2)

Oficial de obra (2)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor, Equipo de soldadura Rana compactadora Mezcladora

Actividades de obra

1 Subbase granular debidamente compactada

2 Muro en bloque N°4 para divisiones de baños

3 Fundición de concreto para columnas de la estructura de la cubierta

4 Corte y soldadura de celosia para cubierta

21 Diciembre 2022 Estado del Clima

Personal en obra Soleado

Residente de obra Tarde bastante lluviosa

Residente de interventoria

Maestro de obra

Ayudantes de obra (2) Soldadores (2)

Oficial de obra (2)

Maquinaria y Equipo

Herramienta menor Equipo soldadura Vibrocompactador Mezcladora

Actividades de obra

1. Subbase granular debidamente compactada
2. Fundicion de concreto para columnas de la estructura de la cubierta
3. Corte y soldadura de celosia para columnas de la estructura de la cubierta
4. Muro en bloque n°4 para divisiones de baños

Powered by CamScanner

22 Diciembre 2022

Estado del clima
Sabado Parcialmente.

Personal en obra
[illegible]
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (6)

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Mezcladora [illegible] compactadora Equipo soldadura

Actividades de obra

1. Corte y Soldadura de celosia para columnas de la estructura
2. Subbase granular debidamente compactada
3. Fundicion de concreto para columnas

23 Diciembre 2022

Estado del clima:
Soleado
Tarde/noche Nublado.

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra
oficial de obra (2)
Ayudantes de obra (6)

Soldadores (6)

Maquinaria y Equipo
Herramienta menor. Mezcladora [illegible] compactadora Equipo soldadura

Actividades de obra

1. Corte y Soldadura de celosia para columnas de la estructura (se aplica anticorrosivo a los elementos el cual no esta contemplado con el item contractual [NP])
2. Subbase granular debidamente compactada
3. Fundicion de columnas para estructura de la cubierta
4. Muro N 4 para divisiones

Powered by CamScanner

Estado del clima
Soleado

[illegible]

Soldadores (5)

[illegible]

1. Corte y Soldadura de celosía para elementos de columnas de la cubierta (se pintan los elementos soldados con anticorrosivo)
2. Subbase granular debidamente compactada
3. Fundición de concreto para columnas de la estructura [illegible]

26 Diciembre 2022

Estado del clima
Soleado

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoría
- Maestro de obra
- Oficial de obra (2)
- Ayudantes de obra (5)

Soldadores (5)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor

Actividades de obra
1. Corte y Soldadura de celosía para columnas de la cubierta - se pintan con anticorrosivo todos los elementos soldados
2. Subbase granular debidamente compactada
3. Muro en bloque N4 para divisiones de baños
4. Fundición de concreto para columnas de la estructura de la cubierta

27 Diciembre 2022 — Estado del clima: Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Oficial de obra (1) — Soldadores (5)
Ayudantes de obra (5)
Maquinaria y equipo
Herramienta menor Martillos Equipo soldadura Vibro apisonador
Actividades de obra
1 Fundación de concreto para columnas (Anclaje de acero)
2 Subbase granular debidamente compactada
3 Corte, soldadura y pintura con anticorrosivo para los elementos de las columnas de la estructura de la cubierta
4 Muro en bloque N4 para muros divisorios del baño

28 Diciembre 2022 — Estado del clima: Soleado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoría
Maestro de obra
Oficial de obra
Ayudantes de obra
Maquinaria y equipo
Herramienta menor
Actividades de obra
1 Fundación de concreto para columnas de la cubierta
2 Corte, soldadura y anticorrosivo para elementos de las columnas de la estructura de la cubierta
3 Muro en bloque N4 para muros divisorios del baño
4 Subbase granular

29 Diciembre 2022

Por actividades de fin de año se le da a personal los días 29 y 30 como descanso.

30 Diciembre 2022

El contrato 543 - 2022 entra en suspensión por un periodo de un (01) mes a partir de la fecha, se reanudan actividades de obra el día 30 enero 2023

Powered by CamScanner

Powered by CamS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

543 - 2022.

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

OBRA:
CONSTRUCCION : OBRA NUEVA - ADECUACIÓN - CERRAMIENTO

FRENTE:
POLIDEPORTIVO BARRIO LA MAGNOLIA

FECHA INICIO:
20 JUL 2022.

impulsado por CamScanner

Powered by CamScanner

01 de Diciembre 2022 — Estado del Clima: Soleado / Parcialmente Nublado

Personal en obra
Residente de obra
Residente de interventoria
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor
Actividades de obra
1 Corte, Figuracion y amarre de acero
2 Encofrar rompa acceso parque infantil
3 Demolicion anden

Dmf

02 de Diciembre 2022 — Estado del Clima: Soleado / Parcialmente Nublado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria — Tarde Lluvioso
Oficial de obra:
Ayudantes de obra (3)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor — Mezcladora
Actividades de obra
1 Corte, Figuracion y amarre de acero
2. Fundicion Concreto para rampa acceso parque infantil
3. Demolicion anden

Dmf

Powered by CamScanner

03 de Diciembre 2012

Estado del Clima:
Parcialmente Nublado
Poco Soleado

Personal en obra:
Residente de obra
Residente de interventoria
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y equipo
Herramienta menor.

Actividades de obra.
1. Corte, Figuracion y amarre de acero
2. Relleno con recebo B-200

05 de Diciembre 2012

Estado del Clima
Soleado / Poco Nublado

Personal en obra.
Residente de obra
Residente de interventoria
Maestro de obra.
Oficial de obra
Ayudantes de obra (3)

Maquinaria y Equipo.
Herramienta menor.

Actividades de obra
1. Relleno con recebo B-200
2. Corte, Figuracion y amarre de acero

Nota: Se recorto visto del alcalde del municipio en compañia de su equipo de trabajo

Powered by CamScanner

06 de Diciembre 2022 Estado del Clima
Personal en obra. Parcialmente Nublado
Residente de obra
Residente de interventoria
Oficial de obra - Maestro de Obra
Ayudantes de obra (1)
Maquinaria y Equipo
Herramienta menor.
Actividades de obra:
1 Armado de acero
2 Fundicion concreto para escaleras de acceso
parque infantil
DMF

07 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la falta de material.
DMF

09 Diciembre 2022.
No se reportan actividades debido a la falta de material.
DMF

10 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la falta de material.
DMF

12 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la falta de material.
DMF

Powered by CamScanner

12 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la falta de material.
D.M.

14 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la. Falta de material.
D.M.

15 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la. Falta de material.
D.M.

16 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la. Falta de material.
D.M.

17 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la. Falta de material.
D.M.

19 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la. Falta de material
D.M.

20 Diciembre 2022
No se reportan actividades debido a la. Falta de material.
D.M.

Powered by CamScanner

21 Diciembre 2022
No se reportan actividades

22 Diciembre 2022
No se reportan actividades.

23 Diciembre 2022
No se reportan actividades.

24 Diciembre 2022
No se reportan actividades.

26 Diciembre 2022
No se reportan actividades.

27 Diciembre 2022
No se reportan actividades.

28 Diciembre 2022
No se reportan actividades.

Powered by CamScanner

24 Diciembre 2022

No se reportan actividades.

30 Diciembre 2022.

El contrato de obra 513 - 2022 entra en suspension por un periodo de un (1) mes a partir de la fecha. Se reanudaran actividades el dia 30 de Enero de 2023

30 Enero 2023 Estado del clima Nublado

Se reanuda en contrato de obra 513 - 2022 de acuerdo a suspension 1

Personal en obra
- Residente de obra
- Residente de interventoria
- Maestro de obra
- Oficial de obra
- Ayudantes de obra (2)

Maquinaria y Equipo
- Herramienta menor. compactador

Actividades de obra:
1. Muro en bloque de concreto
2. Relleno con recebo debidamente compactado.


Powered by CamScanner

ANEXO 2.
REPORTE DE LLUVIAS

Dirección: Calle 134 # 13-66 | Bogotá,CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel:3214522574
E-mail:gcs.construcciones@hotmail.com

Powered by CamScanner

Tiempo observado en diciembre de 2022 en Madrid

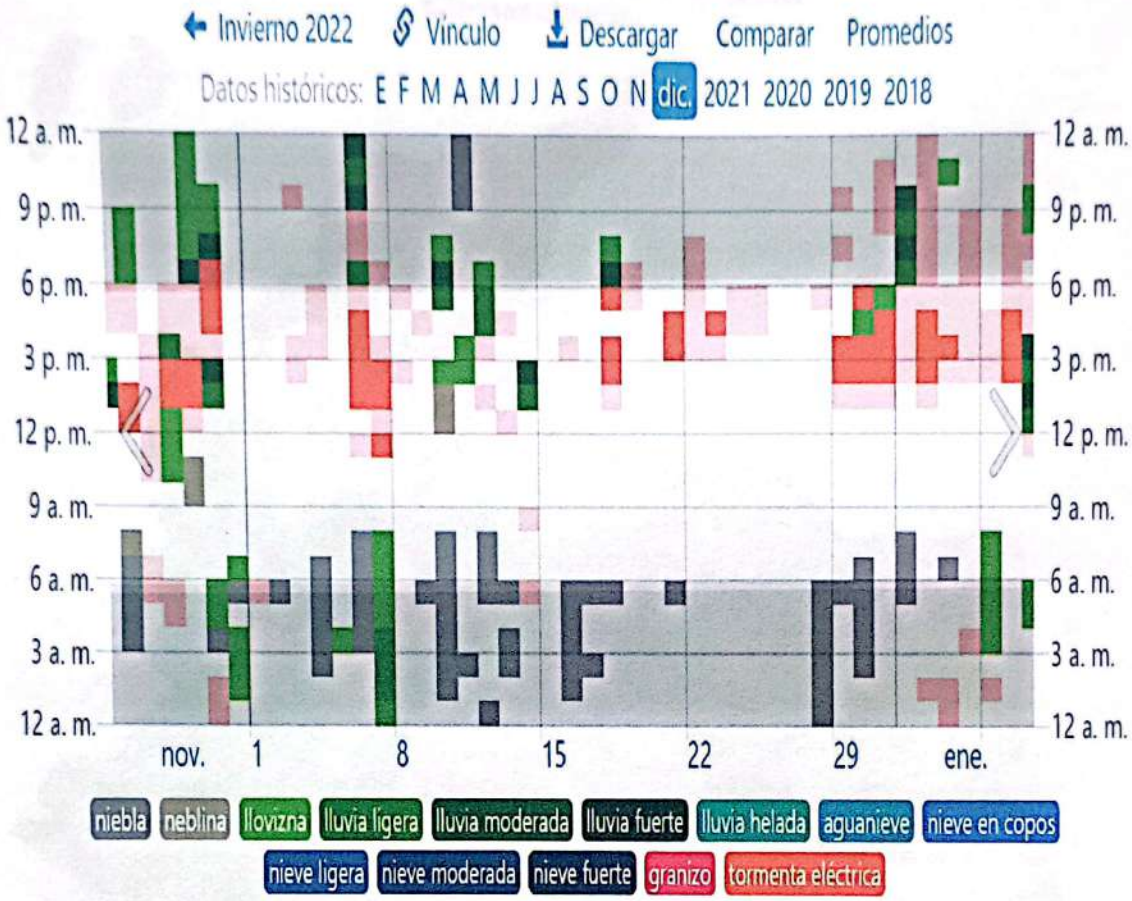

El tiempo observado por hora, codificado por color por categoría (en orden de gravedad). Si hay múltiples informes, se muestra el código más drástico.


© WeatherSpark.com

Días con presencia de lluvia: 13 días (MES DICIEMBRE)

Powered by CamScanner

Número de Días con Lluvia
Climatología

Mapa 3

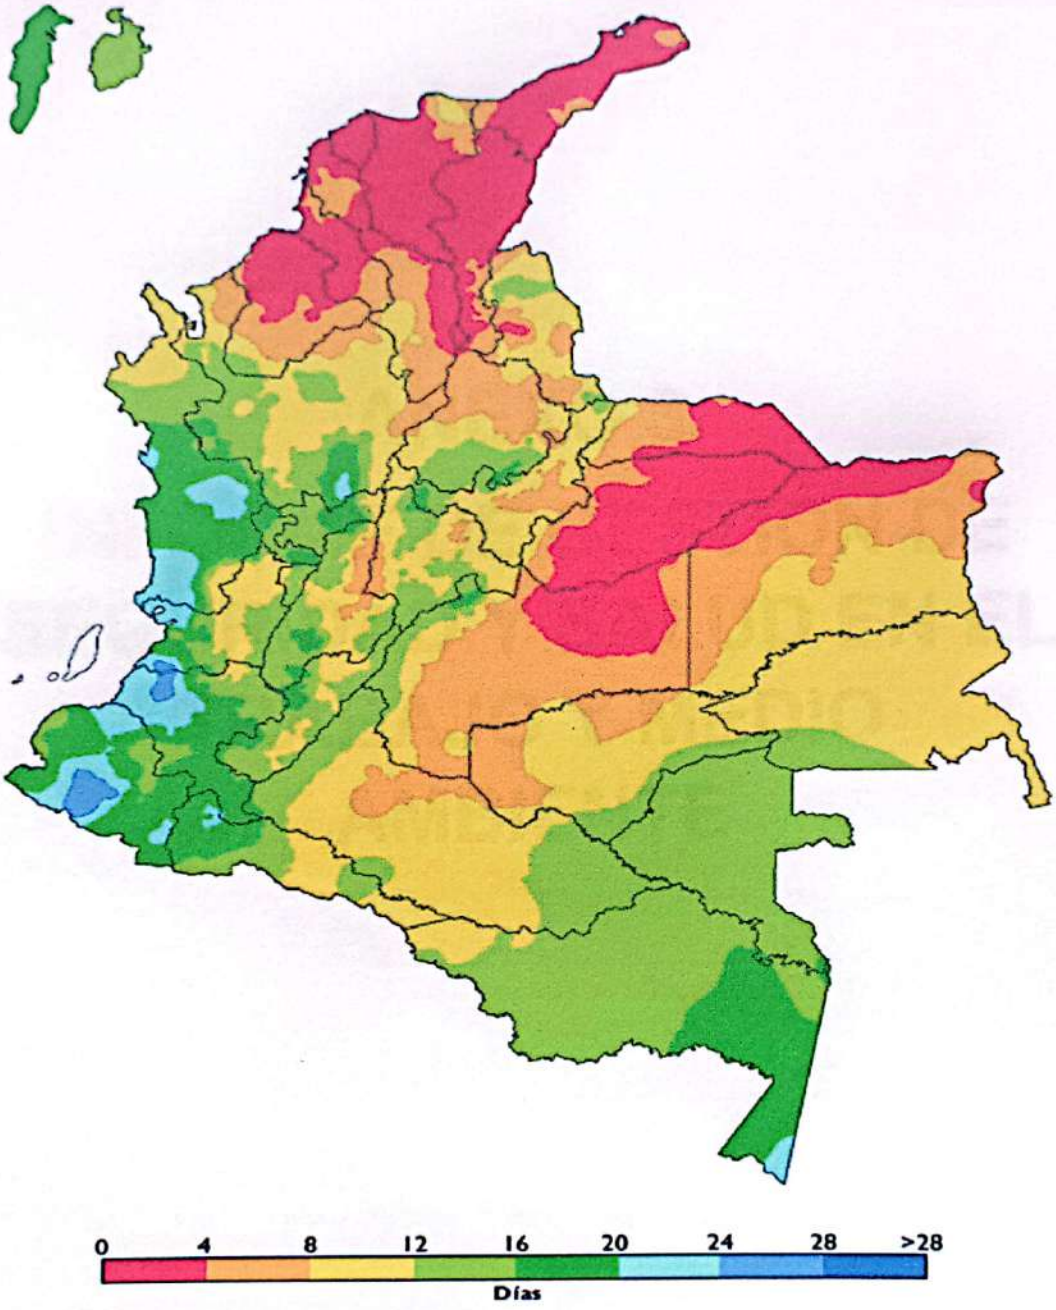

Tomado: Boletín Climatológico Diciembre 2022 - IDEAM

Powered by CamScanner

ANEXO 3.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

Powered by CamScanner

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

PERIODO 01 DE DICIEMBRE – 31 DE DICIEMBRE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

MADRID, CUNDINAMARCA

2022

Powered by CamScanner

DATOS DE ENTRADA

OBJETO: CONTRADO 543 .2022 "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

TIEMPO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO: 31 DE MAYO DE 2022

ALCANCE

Aplica al total de los colaboradores y encargados de la ejecución del "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

OBJETIVOS

Capacitar al personal de trabajo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST aplicados durante la ejecución del proyecto.

Establecer las medidas mínimas de seguridad en el trabajo para la realización de las actividades propias del objeto del contrato de obra.

Powered by CamScanner

Contenido

ALCANCE 2
OBJETIVOS 2
1. DEFINICIONES 4
2. MANEJO DE HERRAMIENTAS 5
3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 5
3.1. Protección de la cabeza 5
3.2. Protección de los pies 5
3.3. Protección de las manos y piel 6
3.4. Protección de la vista 6
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA 7
5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL 8
6. INDUCCIÓN 8
7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 8
3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP 10
3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES 11
5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES 11
4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 11
6. CONCLUSIONES 14

Powered by CamScanner

1. DEFINICIONES

Caso: Un evento registrable en una población o grupo de estudio de una enfermedad en particular, un trastorno de la salud o una condición bajo investigación.

COVID-19: Siglas de Coronavirus 2019 (enfermedad por coronavirus 2019), es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que se ha diseminado desde China o más de 170 países alrededor del mundo, incluida Colombia.

Emergencia de salud pública: Evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de la enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada.

Derrumbe: Desprendimiento de una porción de suelo o roca de una excavación y su desplazamiento súbito hacia la excavación por caída o deslizamiento.

Espacio confinado: Cuando los medios de entrada y salida son restringidos, con el espacio adecuado para permitir las labores por el personal.

Excavación: Es el corte, depresión, cavidad o zanja hecha mecánica o manualmente con el fin de remover tierra, arena, grava, rajón, recebo u otro material.

Persona calificada: Ingeniero con experiencia certificada mínimo de un año para calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar sistemas de prevención y protección, elaborar especificaciones de trabajo, proyectos o productos acorde con lo establecido a la normativa.

Sistema de protección: Significa un método (inclinación, puntales, entibados o niveles escalonados) para proteger a los trabajadores de un derrumbe, de materiales que podrían caer o rodar en la excavación o por el colapso de estructuras colindantes.

Suelo: Es el material no consolidado o semi consolidado compuesto de la mezcla de partículas de diferentes tamaños, diferentes minerales y en diferentes cantidades y clases de materias orgánicas los cuales se encuentran sobre la corteza terrestre.

Zanja, trinchera: Excavación estrecha realizada en la tierra donde generalmente la profundidad es superior al ancho de esta.

Trabajo en Alturas: Se refiere a todas y cada una de las actividades que se desarrollan a partir de 1,5m de altura donde se establece el uso de sistemas de

Powered by CamScanner

protección tales como cuerdas, líneas de vida o arneses

2. MANEJO DE HERRAMIENTAS

Las diferentes actividades establecidas para la ejecución de los cuatro (4) Polideportivos del Municipio de Madrid Cundinamarca, requieren del uso de una serie de herramientas y equipos los cuales tienen la capacidad de afectar al personal de trabajo en función del uso que se le pueda dar. La ejecución del proyecto requiere del funcionamiento de una serie de maquinaria y equipos que de no ser direccionadas las indicaciones al personal que se va a hacer a cargo, pueden derivar en lesiones para el personal de trabajo:

3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Las condiciones de trabajo en la construcción son tales que pese a todas las medidas preventivas que se adopten en la planificación del proyecto y el diseño de tareas, se necesitara algún tipo de protección personal EPP, como lo son cascos, protección de la vista y los oídos, botas y guantes, sin embargo el uso de EPP tiene sus desventajas tales como; algunas formas de EPP son incómodas y hacen más lento el trabajo, se necesita mayor supervisión para asegurar que los obreros usen lo elementos de protección.

3.1. Protección de la cabeza

Los objetos que caen, las izadas por las grúas y los ángulos sobresalientes se dan por todas partes en las obras de construcción, una herramienta pequeña o un perno que cae a 10 o 20 metros de altura puede causar lesiones graves o incluso la muerte, las heridas en la cabeza se producen cuando el obrero trabaja o se desplaza inclinado hacia adelante, cuando endereza el cuerpo después de haberse inclinado.

Los cascos de seguridad resguardan la cabeza efectivamente contra la mayoría de esos riesgos y es preciso usar casco constantemente en la obra, sobre todo en las áreas donde se está realizando el trabajo más arriba.

3.2. Protección de los pies

Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías principales; las causadas por la penetración de clavos que no han sido sacados o doblados en la planta del pie, y las debidas a aplastamientos del pie por caída de herramientas o materiales. Ambas pueden minimizarse usando calzado protector, la clase de zapatos o de botas

Powered by CamScanner

protectoras dependerá de la índole del trabajo (por ejemplo, la presencia de agua subterránea en la obra) pero todo calzado protector debe tener suela impenetrable y capellada con una puntera de acero.

3.3. Protección de las manos y piel

Las manos son sumamente vulnerables a las lesiones accidentales, y en la construcción manos y muñecas sufren más lastimaduras que ninguna otra parte del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son evitables con mejores técnicas y equipo de trabajo manual, con el uso de protección adecuada como guantes o manoplas.

3.4. Protección de la vista

Los fragmentos y esquirlas, el polvo o la radiación son causas de muchas lesiones de la vista en las siguientes tareas:

- El picado, corte, perforación, labrado o afirmado de piedra, concreto y ladrillo con herramientas de mano o automáticas.
- El corte y soldadura de metales

Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo definitivo por medio de resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire o un mejor diseño de tareas. En muchos casos, como por ejemplo el labrado y corte de piedra, la protección personal (anteojos de seguridad o visera) es la única solución práctica. A veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus consecuencias si sufren daño en los ojos, pero no utilizan protección.

Powered by CamScanner

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1. PERSONAL EN OBRA DEL CONTRATISTA

ID		CARGO	NOMBRE	CC
DR	1	Dir. Obra	Javier Antonio Gonzalez Arenas	1.126.001.358
ING	1	ING. Residente	Daniel Camilo Prada Millán	1.098.651.957
AEL	1	AS. Electrico	Carlos Julio Acevedo Ferreiro	91.043.063
SS	1	PR. Seguridad y Salud	Daniel Mauricio Oler Restrepo	71.664.413
TP	1	Topografo	Leonel Eduardo López Duran	1.102.721.369
CO	1	Coordinador de Obra	José Lamus Rodríguez	1.020.776.092
AES		AS. Estructural	Nicolas Alfonso Correa Duarte	1.090.425.817

ADMINISTRATIVO – OPERATIVO

CARGO	NOMBRE	CC	ESTADO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ing Auxiliar	Diana María Olaya Ortiz	1.073.176.550	1/06/2022	30/12/2022	Retirado
Ing SST Auxiliar	Etna Daniela Mora Salinas	1.007.569.903	27/07/2022	30/12/2022	Retirado

MAESTROS DE OBRA

CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Maestro	Derlen Fabian Becerra	1.102.717.527	11/08/2022	30/12/2022	Retirado
Maestro	Jose Omar Ortega Ortega	13.644.481	24/08/2022	30/12/2022	Retirado

OFICIALES DE OBRA

CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Oficial	Carlos Santana Obregon	1.051.737.892	10/10/2022	30/12/2022	Retirado
Oficial	Faber Augusto Morales Chica	86.010.588	23/08/2022	30/12/2022	Retirado

AYUDANTES DE OBRA

CARGO	NOMBRE	CC	FECHA INGRESO	FECHA DESAFILIACIÓN	OBSERVACIONES
Ayudante	Oscar Daniel Torres Vanegas	1.070.970.219	09/07/2023	30/12/2022	Retirado
Ayudante	Pablo Emiro Bermon Rojas	5.414.671	19/07/2022	30/12/2022	Retirado
Ayudante	Angel Cecilio Torres Ipuana	17.900.524	19/10/2022	30/12/2022	Retirado
Ayudante	Nelson Rocha Obregon	73.584.580	27/09/2022	30/12/2022	Retirado
Ayudante	Jose Mauricio Contador Echeverria	1.095.571	12/07/2022	30/12/2022	Retirado
Ayudante	Daniel Enrique Arias Figueroa	1.081.797.879	11/07/2022	30/12/2022	Retirado

Powered by CamScanner

Ayudante	Baron Martínez Epinayu	17.945.714	09/08/2022	30/12/2022	Retirado
Ayudante	Jhon Jairo Chavez Rodríguez	1.075.629.705	25/10/2022	30/12/2022	Retirado
Ayudante	Vicente Epieyu Epieyu	1.192.726.939	19/10/2022	30/12/2022	Retirado

En la anterior tabla, se relaciona el personal del contratista del mes de diciembre; se incluye a las personas que se contrataron, y por diversos motivos se desvincularon en el transcurso del mismo mes, motivos los cuales también se exponen en la misma tabla, en la columna denominada "Observaciones".

Anexo 1. Afiliaciones ARL

Anexo 2. Planillas de seguridad social

5. DISPOSICIÓN EL PERSONAL

El personal es apto para realizar las respectivas labores como ayudantes, oficiales y maestros de acuerdo con entrevista laboral realizada por coordinador de obras y empresa.

6. INDUCCIÓN

El maestro de obra realizo inducción, acerca del manejo de equipos, maquinaria y herramientas con acompañamiento de personal SST, a cada uno de los ayudantes y oficiales que ingresan y estarán ejecutando las actividades de mayor complejidad, como es el caso de:

- Manejo de las pulidoras
- Manejo de demoledor manual
- Manejo Tronzadora
- Manejo Mezcladoras
- Manejo de sierra circular
- Manejo de pistón compactador

7. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el periodo del mes de diciembre se realizaron actividades de capacitación, charlas y calistenia a todo el personal activo en los diferentes frentes de trabajo (San Luis, Escallón, Magnolia y San Carlos) ejecutados al iniciar labores brindando temas como:

Powered by CamScanner

- Manejo manual de cargas
- Lesiones pequeñas
- La seguridad responsabilidad de todos
- Manejo de extintores
- Uso de EPP
- Peligro mecánico
- Peligro locativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Powered by CamScanner





3.5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Durante el mes de diciembre se hizo entrega al personal de los siguientes elementos de protección personal:

- Guantes: se entregaron guantes de seguridad

El manejo de los equipos empleados en el periodo del presente informe estuvo a cargo del siguiente personal:

Pulidoras

- Faber Morales
- Jose Guillermo Rubio
- Oscar Daniel Torres

Powered by CamScanner

Demoledor Manual

- Daniel Arias
- Baron Martínez

Tronzadora

- Oscar Torres
- Jose Guillermo Rubio

Mezcladora

- Daniel Arias
- Oscar Torres
- Pablo Bermon

El personal restante, solo empleo herramienta menor.

3.7. INSPECCION ELEMENTOS PERSONALES

Se realiza inspección del uso de los elementos de protección del personal actual de la obra, encontrando que la mayoría están utilizando los EPP durante sus labores; para el personal que, por motivos de incomodidad u olvido que no estaban usando sus elementos de protección, se les informo de la importancia del uso de estos y el cumplimiento de este.

5. INDICADORES DE GESTIÓN Y REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES GENERALES Y LABORALES

POYECTO: **CONTRATO DE OBRA No. 543 DE 2022** "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLÓN, SAN LUIS Y SAN CARLOS, DEL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA".

4.1. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se ausento ya sea por enfermedad general o diligencias personales, en el periodo del presente informe.

No se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo en los frentes de los polideportivos activos: Escallón, San Luis y La Magnolia. Por otro lado, algunos de

Powered by CamScanner

los trabajadores se ausentaban constantemente y no presentaron incapacidad o excusa valida.

DATOS DE AUSENTISMO LABORAL MES DE DICIEMBRE						
NOMBRE	Ausencia por causa de salud	No. Horas de ausencia por EL	Ausencia por EL	No. de horas de ausencia citas médicas	No. de horas diligencias personales	No. total de horas ausentismo
Diana María Olaya Ortiz	0	0	0	0	0	0
Etna Daniela Mora Salinas	0	0	0	0	0	0
Derlen Fabian Becerra	0	0	0	0	0	0
Jose Omar Ortega Ortega	0	0	0	0	0	0
Carlos Santana Obregon	0	0	0	0	0	0
Faber Augusto Morales Chica	0	0	0	0	0	0
Oscar Daniel Torres Vanegas	0	0	0	0	0	0
Pablo Emiro Bermon Rojas	0	0	0	0	0	0
Angel Cecilio Torres Ipuana	0	0	0	0	0	0
Nelson Rocha Obregon	0	0	0	0	0	0
Jose Mauricio Contador Echeverria	0	0	0	0	0	0
Daniel Enrique Arias Figueroa	0	0	0	4	1.5	6.5
Baron Martínez Epinayu	0	0	0	0	0	0
Jhon Jairo Chavez Rodríguez	0	0	0	0	1	1
Vicente Epieyu Epieyu	8	0	0	0	8	16

Trabajadores que solicitaron permiso para atender diligencias personales:

- Daniel Arias
- Jhon Jairo Chavez
- Vicente Epieyu

Trabajadores que se ausentaron por enfermedad general:

- Vicente Epieyu

Powered by CamScanner

Trabajadores que se ausentaron por cuestiones de salud:

- Daniel Arias

Nota: Se presenta constantemente el caso de personal nuevo que se reporta solo el día de ingreso y no vuelve a trabajar, o del personal que se vincula y nunca se presenta en la obra.

Powered by CamScanner

6. CONCLUSIONES

Se informo al personal los peligros que se pueden generar en obra y la importancia del uso de los EPP para el resguardo de su salud y bienestar.

Hasta la fecha de finalización del periodo del presente informe, no se han reportado ni accidentes ni incidentes laborales o ausencias por enfermedad laboral.

Al finalizar las labores diarias, se realiza el almacenamiento de herramientas y equipos en bodega, dejando organizado el espacio donde se desarrollan las labores de obra.

DANIEL MAURICIO OLIER RESTREPO
Profesional en seguridad salud y trabajo

Powered by CamScanner

PLANILLAS

Dirección: Calle 134 #13-66 | Bogotá, CUNDINAMARCA
Tel:(+571) 7968319 Cel: 3214522574
E-mail: gerencia@gcsconstrucciones.com.co

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	16/01/2023	64259498	$353.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	150.000	0		0		0	14	2.300	0	152.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	14	2.900	0	194.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.300				6.300	14	100	6.400			63	6.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	152.300
Pensión	1	192.000	194.900
Riesgos Laborales	1	6.300	6.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	348.300	353.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1126001358	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS		CLL 41 A 8 25 AP 1112	2759450	JAGA_91_26@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	16/01/2023	84259498	$353.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
e.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Estudiante	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1126001358	GONZALEZ ARENAS JAVIER ANTONIO	59	0			N																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	160.000	14-11	1.200.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7966319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	84849095	$14.026.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	42.800	0		0		0	0	0	0	42.800	3
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	133.400	0		0		0	0	0	0	133.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.800	0		0		0	0	0	0	180.800	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.400	0		0		0	0	0	0	145.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	757.100	0		0		0	0	0	0	757.100	24
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	317.800	0		0		0	0	0	0	317.800	24
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	88.400	0		0		0	0	0	0	88.400	8
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	1.400	0		0		0	0	0	0	1.400	1
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	1.400	0		0		0	0	0	0	1.400	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	2.800	0		0		0	0	0	0	2.800	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	27.900	0		0		0	0	0	0	27.900	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	7.000	0		0		0	0	0	0	7.000	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	99.600	0		0		0	0	0	0	99.600	15

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.147.000	0	0	0	0	0	0		1.147.000	12
230301	Porvenir	800224808-8	5.105.200	0	0	0	0	0	0		5.105.200	62
231001	Colfondos	800227940-6	330.800	0	0	0	0	0	0		330.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	980.000	0	0	0	0	0	0		980.000	25

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.675.800				2.675.800	0	0	2.675.800			26.758	2.675.800	103

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.626.600	0	0	1.626.600	50
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	55.400	0	0	55.400	12
CCF39	Cajasan	890200106-1	211.800	0	0	211.800	41

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADA

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 28A # 13 - 67 OFC 903	7966319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	84849095	$14.026.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	1.893.800	1.893.800
Pensión	4	7.563.000	7.563.000
Riesgos Laborales	1	2.675.800	2.675.800
CCF	3	1.893.800	1.893.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	22	14.026.400	14.026.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S		CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64849095	$14.026.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003423265	ROCHA VILLALBA SAMUEL	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1002426760	SANTANA VILLALBA ESTEBAN DAVID	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.900	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1003505213	GARZON OCHOA OSCAR JAVIER	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	1005595122	QUINTERO LOPEZ BUDWEISER DAYAN	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
5	CC	1007382815	FUENTES AVILA LAURA DANIELA	1	0			S	X															230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
6	CC	1007569303	MORA SALINAS ETNA DANIELA	1	0			S	X															231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	1018467944	SIERRA GORDILLO YESICA ASTRID	1	0			S	X															230301	1.166.667	186.700	0	0	0	0	EPS017	1.166.667	46.700	14-11	1.166.667	1	6.100	CCF24	1.166.667	46.700	0	0	0	0	0
8	CC	1018488885	MONSALVE GIRALDO ESTEBAN	1	0			S	X															230301	680.000	108.800	0	0	0	0	EPS005	680.000	27.200	14-11	680.000	1	3.600	CCF24	680.000	27.200	0	0	0	0	0
9	CC	1068651957	PRADA MILLAN DANIEL CAMILO	1	0			S	X															230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS002	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
10	CC	1022938152	GUTIERREZ DURAN ANGEL OMAR	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
11	CC	1028180978	PRETEL RIVAS LUIS GIOVANY	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
12	CC	1030655560	QUINTERO ZIPACON PAULA STEFANNY	1	0			S	X															25-14	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS017	1.550.000	62.000	14-11	1.550.000	1	8.100	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
13	CC	1051737882	SANTANA OBREGON CARLOS	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	1051738151	SANTANA OBREGON DELIA	1	0			S	X															25-14	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS005	700.000	28.000	14-11	700.000	1	3.700	CCF24	700.000	28.000	0	0	0	0	0
15	CC	1063484703	LIMA PALOMINO ANGEL MIGUEL	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
16	CC	1064115331	PALOMINO PERTUZ LUIS ALFREDO	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
17	CC	1065567422	DELGADO CASTRO JULIO CESAR	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
18	CC	1065929821	GARNICA ALDANA EDGAR ARTURO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
19	CC	1069926042	CHAVES SANCHEZ JOSE STEVEN	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
20	CC	1070972219	TORRES VANEGAS OSCAR DANIEL	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
21	CC	1071628794	HERNANDEZ CRUZ DIEGO ARMANDO	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
22	CC	1073171132	HERNANDEZ NARVAEZ DAIRON EDUARDO	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
23	CC	1073176550	OLAYA ORTIZ DIANA MARIA	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
24	CC	1075629705	CHAVEZ RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
25	CC	1061797879	ARIAS FIGUEROA DANIEL ENRIQUE	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
26	CC	1062104196	PISMAG MUÑOZ JOSE MEDARDO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
27	CC	1065281808	ZAMBRANO ERASO ANDERSON GIOVANNI	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
28	CC	1087122806	QUIÑONES ANGULO MARCO ANTONIO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
29	CC	1088728090	BASTIDAS DIAZ VICTOR ALFONSO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
30	CC	1088736914	ROMO ORTEGA VICTOR MANUEL	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSIC5	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
31	CC	1088737788	BASTIDAS ERAZO JOHN ALEXANDER	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
32	CC	1089294593	NASTACUAS NASTACUAS CRISTIAN OSWALDO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSIC5	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
33	CC	1095571	CONTADOR ECHEVERRIA JOSE MAURICIO	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
34	CC	1096209535	MORENO DOMINGUEZ ALEXANDER	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
35	CC	1096248043	DIAZ MARULANDA JOSE DAVID	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
36	CC	1098804063	QUINTERO GARCIA CARLOS ALBERTO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
37	CC	1100221607	CALDERON ARGUELLO ANGEL LEONARDO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
38	CC	1102716843	PRADA BECERRA OSCAR IVAN	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF38	33.334	1.400	0	0	0	0	0
39	CC	1102717050	CALDERON BARON REYNALDO	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64849095	$14.026.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Bolsillo	Extranjero	Cotiz. estudiar	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
0	CC	1102717189	DAVILA VELEZ ROBINSON	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
1	CC	1102717223	HERNANDEZ MORALES GERMAN DAVID	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
2	CC	1102717527	BECERRA AGREDO DERLEN FABIAN	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1102718754	NOVA JIMENEZ JOSE ANGEL	1	0			S	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	1102719489	ARENIZ ARENIZ ALBEIRO	1	0			S	X															231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
5	CC	1102719712	NOVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
6	CC	1102720366	PRADA GOMEZ JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X															230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS037	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	5	94.000	CCF24	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
7	CC	1102725247	ARAQUE MARTINEZ ALEX DAYAN	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
8	CC	1104869222	BARON ALTAMIRANDA OSMAR DAVID	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	CCFC55	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
9	CC	6815012	GUERRA GUERRA YOEL ENRIQUE	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
0	CC	1116803035	SERRANO SUAREZ CRISTIAN MANUEL	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	CCFC55	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
1	CC	1124044746	IPUANA ANDRES ANTONIO	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1124497936	URARIYU LUCAS	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSIC1	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
3	CC	1124540225	EPIEYU EPINAYU ALFREDO JOSE	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1125761151	LUNA RINCON RAFAEL	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
5	CC	11387578	ZAPATA TORRES OSCAR ORLANDO	1	0			S	X															25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS001	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
6	CC	11511389	GUTIERREZ RODRIGUEZ NELSON MIGUEL	1	0			S	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
7	CC	1192726939	EPIEYU EPIEYU VICENTE	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	1192771091	LIMA MEJIA WILLIAM ANDRES	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	12129314	MURCIA CAVIEDES DAGOBERTO	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
0	CC	1232892101	QUINTERO DIAZ DUWAN FERNEY	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
1	CC	13567833	MORENO DOMINGUEZ JORGE	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
2	CC	13642103	PEÑA AMADOR CARLOS JESUS	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
3	CC	13642134	QUINTERO JORGE	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	13642679	NOVA GOMEZ JOSEFITO	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
5	CC	13643320	ARAQUE RAMIREZ JOSE EXPEDITO	1	0			S	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
6	CC	13643989	GARAVITO GUILLERMO	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
7	CC	13644481	ORTEGA ORTEGA JOSE OMAR	1	0			S	X															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	13644813	RODRIGUEZ PORRAS JOSE BERNARDO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	17900624	TORRES IPUANA ANGEL CECILIO	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
0	CC	17945714	MARTINEZ EPINAYU BARON	1	0			S	X															231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1	CC	286093	CHISICA ZAPATA JOSE ALBEIRO	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	6.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	2955975	GARAVITO USECHE JULIO CESAR	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
3	CC	3221110	GOMEZ RINCON WILSON	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	45769705	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELA	1	0			S	X															230301	696.667	111.500	0	0	0	0	ESSC07	696.667	27.900	14-11	696.667	1	3.700	CCF24	696.667	27.900	0	0	0	0	0
5	CC	5414571	BERMON ROJAS PABLO EMIRO	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	5690785	MURILLO AMAYA PEDRO JESUS	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
7	CC	5761189	RUBIO CHIVATA JOSE GUILLERMO	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	73584660	ROCHA OBREGON NELSON	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	74329159	SANCHEZ MARTINEZ MISAEL	1	0			S	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
0	CC	79187788	GONZALEZ CORTES JORGE RICARDO	1	0			S	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
1	CC	79970518	BOGOTA GAONA JESUS MARIA	1	0			S	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900653937-2	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 26A # 13 - 97 OFC 903	7968319	gcs.construcciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	06/01/2023	64849095	$14.026.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Dom/Elección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
2	CC	79991959	LIMA PALOMINO WILMAN	1	0			S	X																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	160.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	80774210	GUAQUETA BARRAGAN NESTOR ANDRES	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	80813060	LIBERATO TIBAQUIRA JHON ALBERTO	1	0			S	X																231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
5	CC	86010588	MORALES CHICA FABER AUGUSTO	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	160.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	73227244	CASIANES MADRID AMAURIS LUIS	1	5			S	X																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	87452327	YELA SANTANDER JOSE	1	0			S	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
8	CC	87810093	RODRIGUEZ PANTOJA HECTOR ANIBAL	1	0			S	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC18	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF35	33.334	1.400	0	0	0	0	0
9	CC	91041587	GARCIA TRUJILLO JOSE VICENTE	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
0	CC	91043068	GARCIA LEON HECTOR	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
1	CC	91043825	VARGAS REYES HUGO	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
2	CC	91045650	DOMINGUEZ AGUILAR ROBINSON	1	0			S	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
3	CC	91045880	LUQUE DURAN CESAR ENRIQUE	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
4	CC	91046208	MARMOLEJO GIRALDO RIGOBERTO	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
5	CC	91046967	RODRIGUEZ CASTILLO FREDY BERNARDO	1	0			S	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
6	CC	91102237	ACOSTA GUALTERO LISARDO	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
7	CC	91218418	MOTTA SERRANO JAIRO	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS046	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
8	CC	91225761	RIOS CARREÑO DIONISIO	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
9	CC	91286208	ESPINDOLA RODRIGUEZ HENDER	1	0			S	X																25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
0	CC	91293215	ROJAS BUENO LUIS ALBERTO	1	0			S	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	0	0	0	0	0
0	CC	91430318	ESTUPIÑAN GARCES ECELINO	1	0			S	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0
0	CC	91517967	SILVA CORTES ELKIN FABIAN	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF39	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
0	PT	6323039	LUGO RAFAEL ANTONIO	1	0			S	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS041	33.334	1.400	14-11	33.334	5	2.400	CCF39	33.334	1.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS		CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	23/01/2023	65179165	$944.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	17	700	0	40.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	80.000	0		0		0	17	1.300	0	81.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	17	2.600	0	162.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	17	2.600	0	162.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	17	2.600	0	162.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.800				208.800	17	3.400	212.200			2.088	212.200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	120.000	17	2.000	122.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	120.000	122.000
Pensión	3	480.000	487.800
Riesgos Laborales	1	208.800	212.200
CCF	1	120.000	122.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	928.800	944.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900930439-4	ELECTRI C.A. CONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 10 No. 5 - 08	3132857941	electricaconstrucciones@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	23/01/2023	65179165	$944.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
o.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030547987	QUINTERO GUALDRON OSCAR GIOVANY	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1102723325	CARREÑO ACEVEDO FABIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	91043063	ACEVEDO FERREIRA CARLOS JULIO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Powered by CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71664413		OLIER RESTREPO DANIEL MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 #68-22	IBAGUE - TOLIMA	65755556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	102484664	9875131415	I	2023/01/10	2023/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	71664413	OLIER DANIEL	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,200,000	$192,900			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71664413		OLIER RESTREPO DANIEL MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 #68-22	IBAGUE - TOLIMA	65755556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	102484664	9875131415	I	2023/01/10	2023/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-11	890,903,790	5	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

Powered by CamScanner

2023/01/11 03:53 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102721369		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7352055	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2022-12	117571549	9982156389	I	2023/01/10	2023/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA D.C Depto: BOGOTA D.C (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	1102721369 LOPEZ LEONEL	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS001	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,200,000	$192,900			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

Powered by CamScanner

2023/01/10 01:26 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102721369		LOPEZ DURAN LEONEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 48 #141-59	BOGOTA D.C -BOGOTA D.C	7352055	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	117571549	9982156389	I	2023/01/10	2023/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
ALIANSALUD EPS S.A	EPS001	830,003,564	7	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

Powered by CamScanner

2023/01/10 01:26 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900702893	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1121687146	9956783456	E	2023/01/06	2023/01/06	BANCO DE OCCIDENTE		$245,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTECOR (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1020776092	LAMUS JOSE	230301	30 $1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900702893	8	CONTECOR SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CONTECOR	Calle 155 #9-45 Torre 5 apto 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1121687146	9956783456	E	2023/01/06	2023/01/06	BANCO DE OCCIDENTE		$245,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$5,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$40,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$40,000	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$40,000
TOTAL				1	$245,300	$0	$245,300

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2022-12
Período Salud : 2023-01

Se certifica que en la fecha 2023-01-10 la empresa INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS con documento de identificación NI 901043519 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CORREA DUARTE NICOLAS ALFONSO identificado con CC-1090425817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901043519	INGENIEROS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35489849	E	2023-01-10	0,0696

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890500516	CCF37	Caja de Compensacion Familiar del Norte de Santander COMFANORTE	30

111

Powered by CamScanner
