	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA	25/04/23 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 05
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO Nº 1966-2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado y Avance del Contrato
2. Ajustes del precio del Asfalto.
3. Opciones presupuestales para dar mayor alcance al Contrato.
4. Socialización

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 4
		FECHA	25/04/23 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Avance del Contrato
   - Inversion programada = 1,96%
   - Inversion Ejecutada = 2,71%
   - Avance o Atraso = +0,75%


2. Ajuste precio Asfalto.
   El Contratista manifiesta que va a presentar el ajuste del precio del Asfalto. Se Compromete a presentar el 5 de Mayo de 2023
   Una vez se tenga el documento la interventoria lo revisara y remita al municipio - Sec. infraestructuras.

3. Opciones presupuestales para dar mayor alcance al contrato:
   opcion #1: tomar los recursos no comprometidos del Concurso para llevar el alcance de intervencion del pavimento hasta el K16+000

   opcion #2: Conseguir un recurso adicional para ejecutar los 21.9 Km y las obras de acceso al puente La Voragine.

   - El municipio propone emplear los recursos no Comprometidos para alcanzar el pavimento hasta los 16 Km.
   - El Contratista manifiesta que cualquier adicional que llegara aprobar estaria sujeto a la aprobacion de la reclamacion por mayor valor del precio del asfalto que presentara el Contratista.

4. Socalyacón: Está sujeta adición del alcance o mayor alcance apuntado al día de hoy tal como esta consignado en el acta de modificación N° 2 del 28 de marzo de 2023.

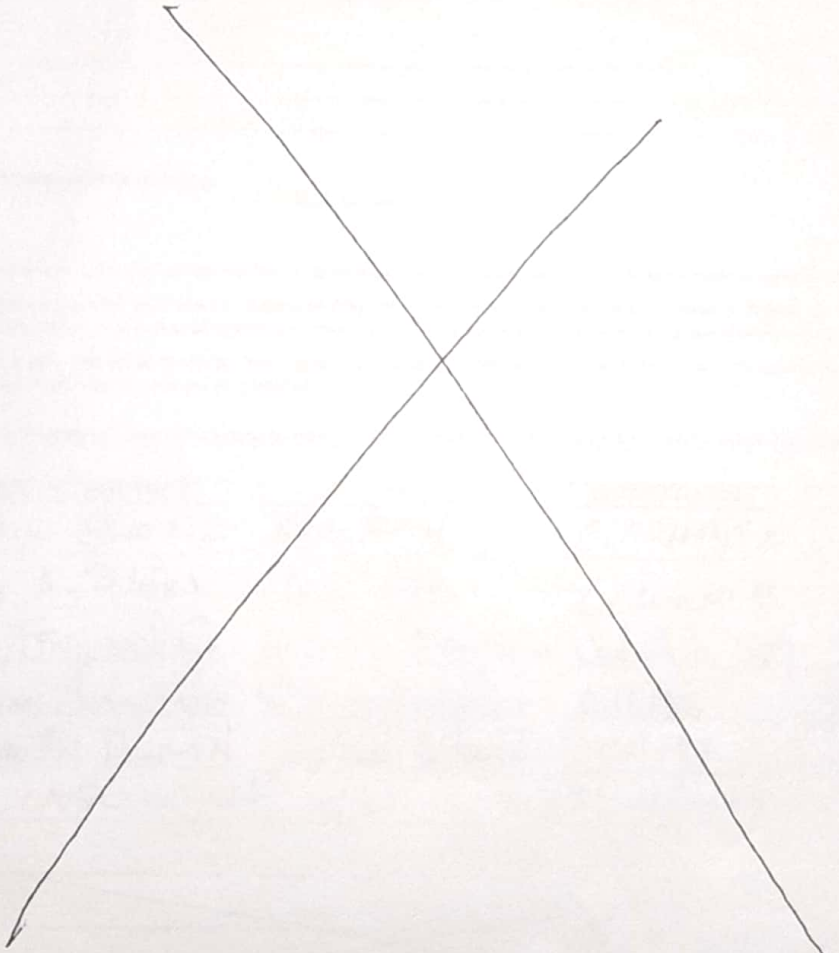

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
presentar Ajustes precio Asfalto	05/05/2023	Contratista de Obra.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
RODRIGO ESCOBAR	RESP. ICES	C. MONTAJE	
Jorge A. Tellez	D:r. OBRAS	C. Montajes	
Rita Esquivel C	Apoyo a la supervisión	Contratista SIM	Rita Esq.
Guillermo Cabrera Peña	Dir Interventoría	C 11196	
Alexander Bueno N.	Residente Interventor	C 11196	
HONORATO RICAURTE	SIM	Alcaldía Mzz	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner
