MUNICIPIO DE GRANADA

Nit: 832000992-1

CALLE 11 # 14 - 28- Tel (091) 866 9300

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202200059

Fecha de la Orden: martes, 20 de diciembre de 2022

Contratista: **FUNDACION CATALINA MUÑOZ**

Nit / C.C. **830504284**

Dirección: DIAG 48 19 16 BOGOTA BOGOTA **Teléfonos:**

Por cuenta de MUNICIPIO DE GRANADA con destino a MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA, y rubro presupuestal N° 2.3.2.02.02.005 rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización .

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNID	CANT	VLR UNIT	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	105020001	MODULOS HABITACIONAL PREFABRICADOS	UND	5.00	15,332,233.00	0.00	0.00	76,661,165.00
2	105020001	MODULOS HABITACIONAL PREFABRICADOS	UND	1.00	15,332,233.00	0.00	0.00	15,332,233.00
3	105020002	INSUMOS PARA CONTRUCCION DE PLACA	UND	5.00	5,896,100.00	0.00	0.00	29,480,500.00
4	105020002	INSUMOS PARA CONTRUCCION DE PLACA	UND	1.00	5,896,100.00	0.00	0.00	5,896,100.00

Sub Total	127,369,998.00
Vlr. Descuento:	0.00
Vlr. IVA:	0.00
Vlr. Total:	**127,369,998.00**

Disponibilidad : 2022000685 **Valor Disponibilidad:** $ 106,141,665.00 **Rubro:** 2.3.2.02.02.005

Plazo de Ejecución:

Objeto: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA

Valor del Contrato: **$ 127,369,998.00**

CIENTO VEINTI SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Forma de Pago DESEMBOLSO MEDIANTE PRESENTACION DE ACTAS PARCIALE

ORDENADOR DEL GASTO
CARGO ORDENADOR DEL GASTO

GIRALDO CHICA GOHARD
CONTRATISTA


El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuenta incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibalidad previstas en la ley 80 de 1993.

CRONOGRAMA DE OBRAS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRANADA, CUNDINAMARCA Y LA FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ
2022

Catalina Muñoz FUNDACIÓN

ACTIVIDADES PRELIMINARES												
ACTIVIDADES	DICIEMBRE											
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PROCESO ADMINISTRATIVO												
VISITAS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO												
FIRMA DE CONVENIO												
TRÁMITE DE PÓLIZAS												
INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES												
ACTIVIDADES PRELIMINARES												
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN												
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA												
PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500PSI 49M2												
RED HIDROSANITARIA												
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"												
RED SANITARIA PVC-S 4"(5ML POR TERRENO)												
PUNTO HIDRAULICOPVC-P/PARAL ½" (2 UNI POR TERRENO)												
RED SUMINISTRO PVC ½"(5ML POR TERRENO)												
REGISTRO ½"												
CAJA DE INSPECCIÓNDE 80X80 CM												
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS 36M2												
ENVÍO Y DESCARGUE EN SITIO DE MATERIAL PREFABRICADO												
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO 36M2												

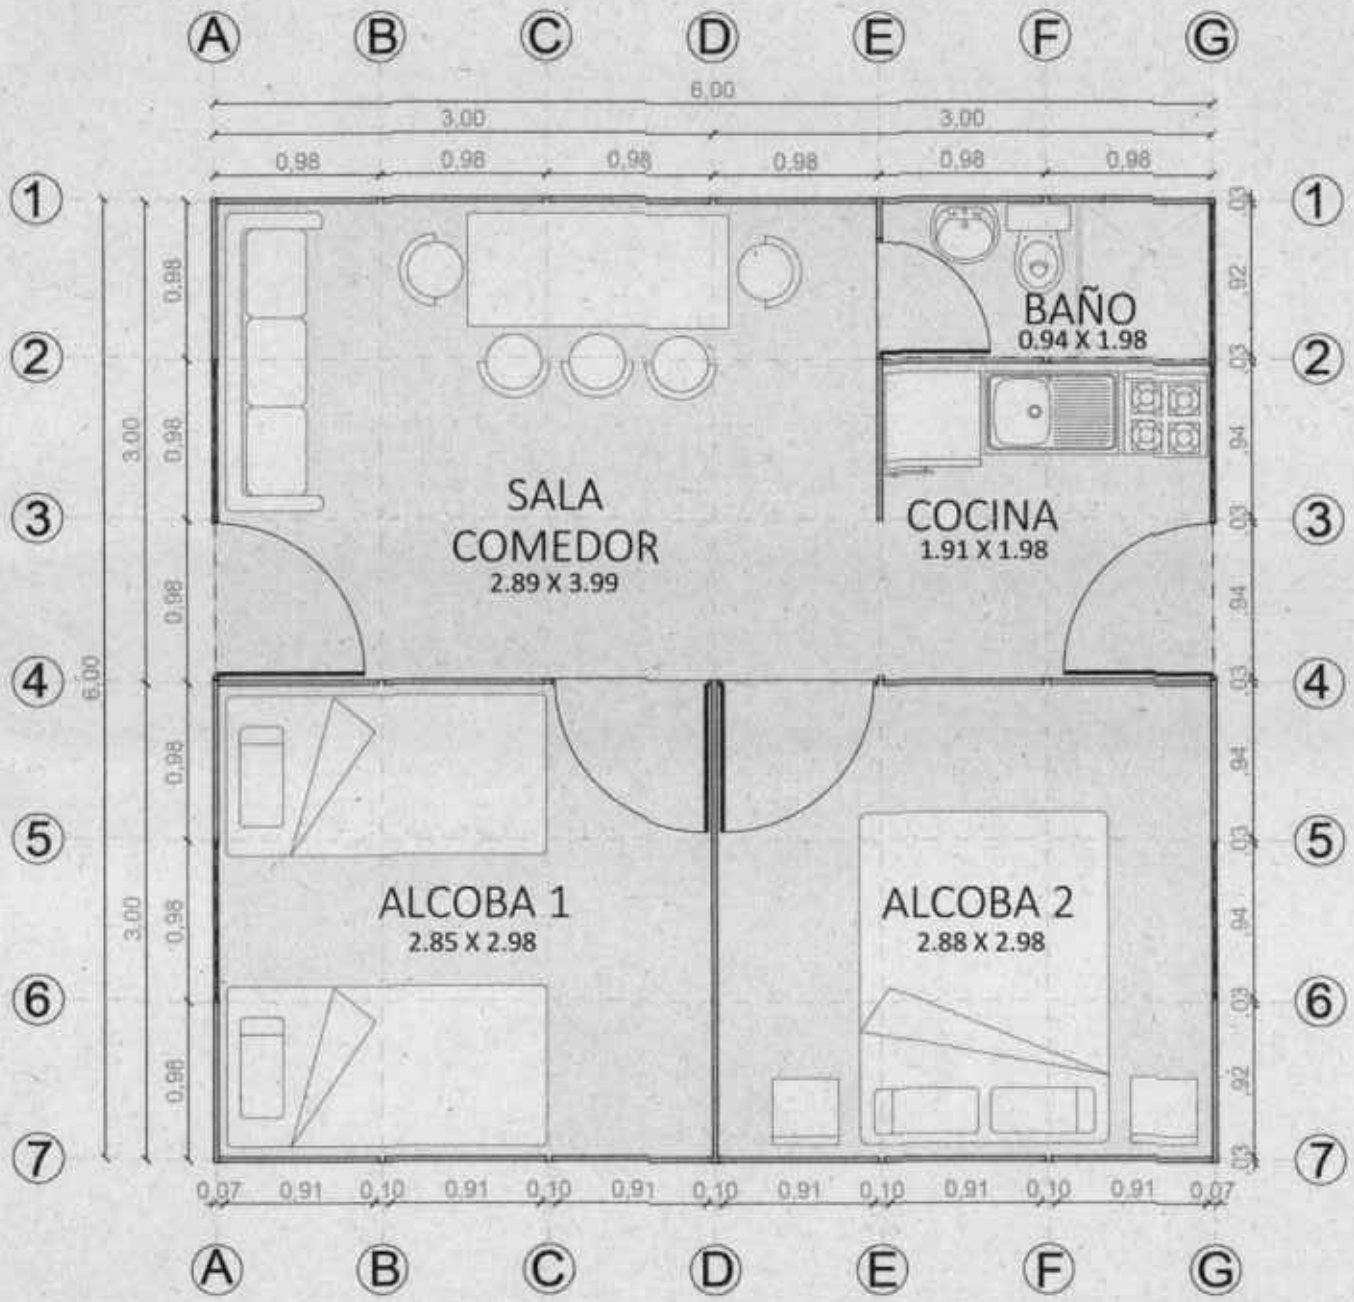

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
PLANTA GENERAL

ESCALA:
1.25

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ,
M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ. JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
1/9

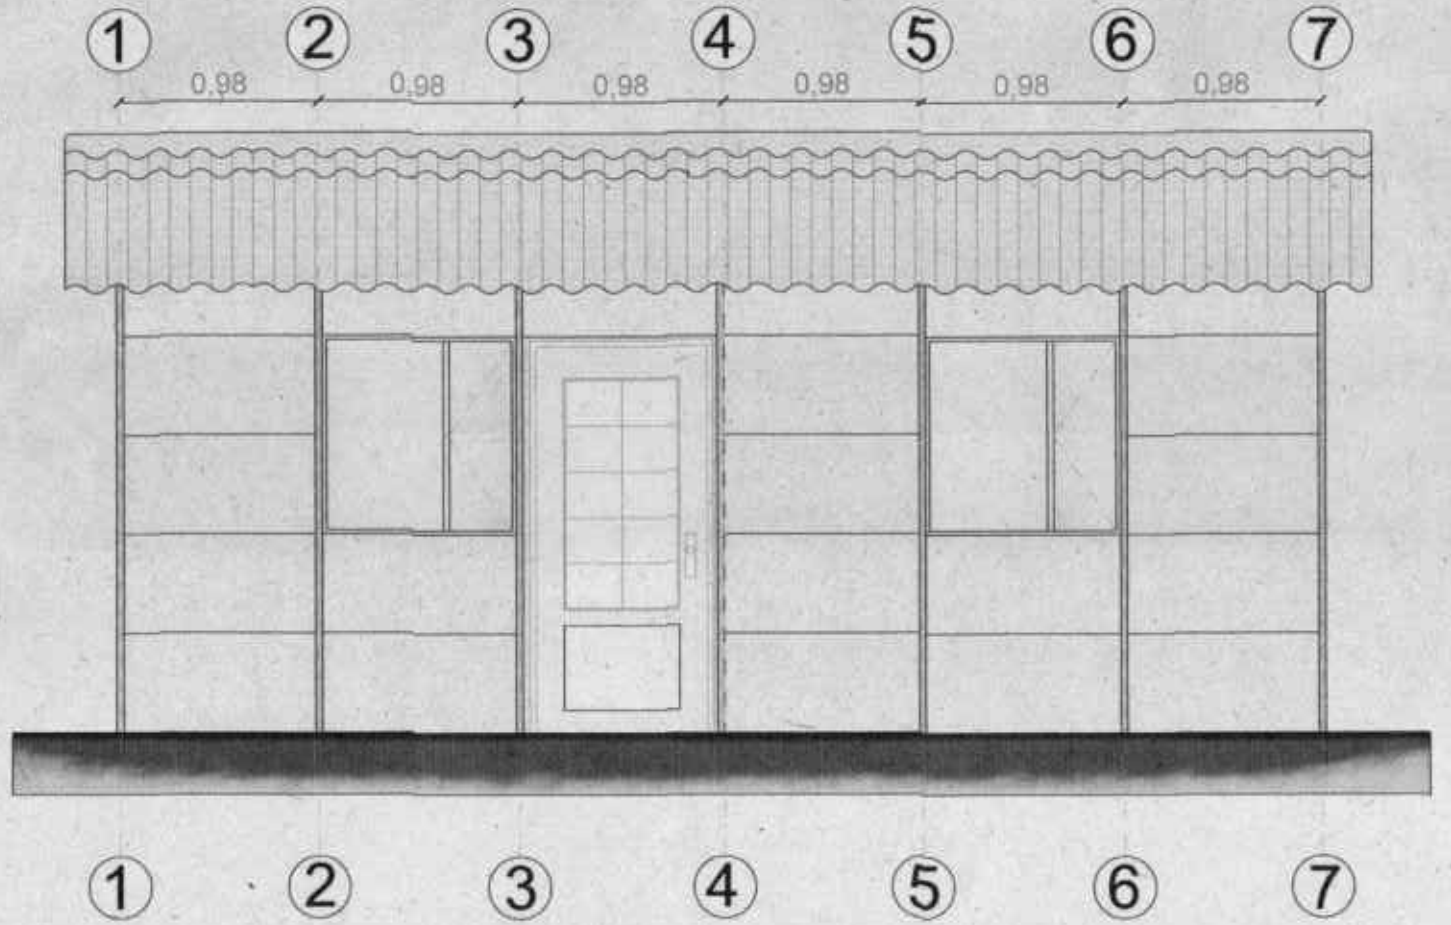

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
FACHADA FRONTAL

ESCALA:
1.20

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ, M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ, JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
2/9

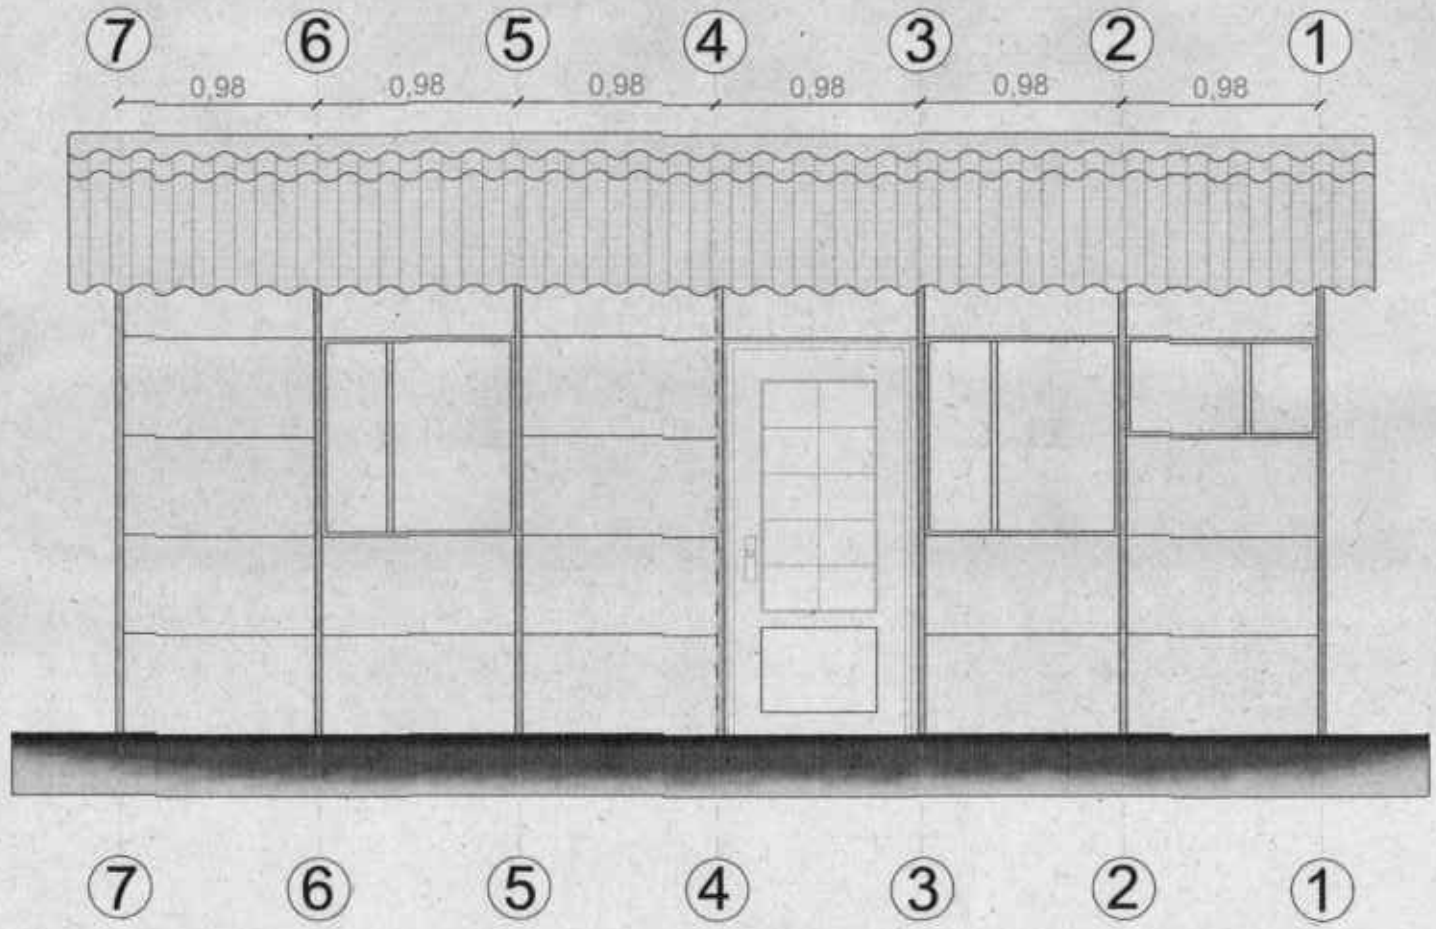

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
FACHADA POSTERIOR

ESCALA:
1.20

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ, M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ. JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
3/9

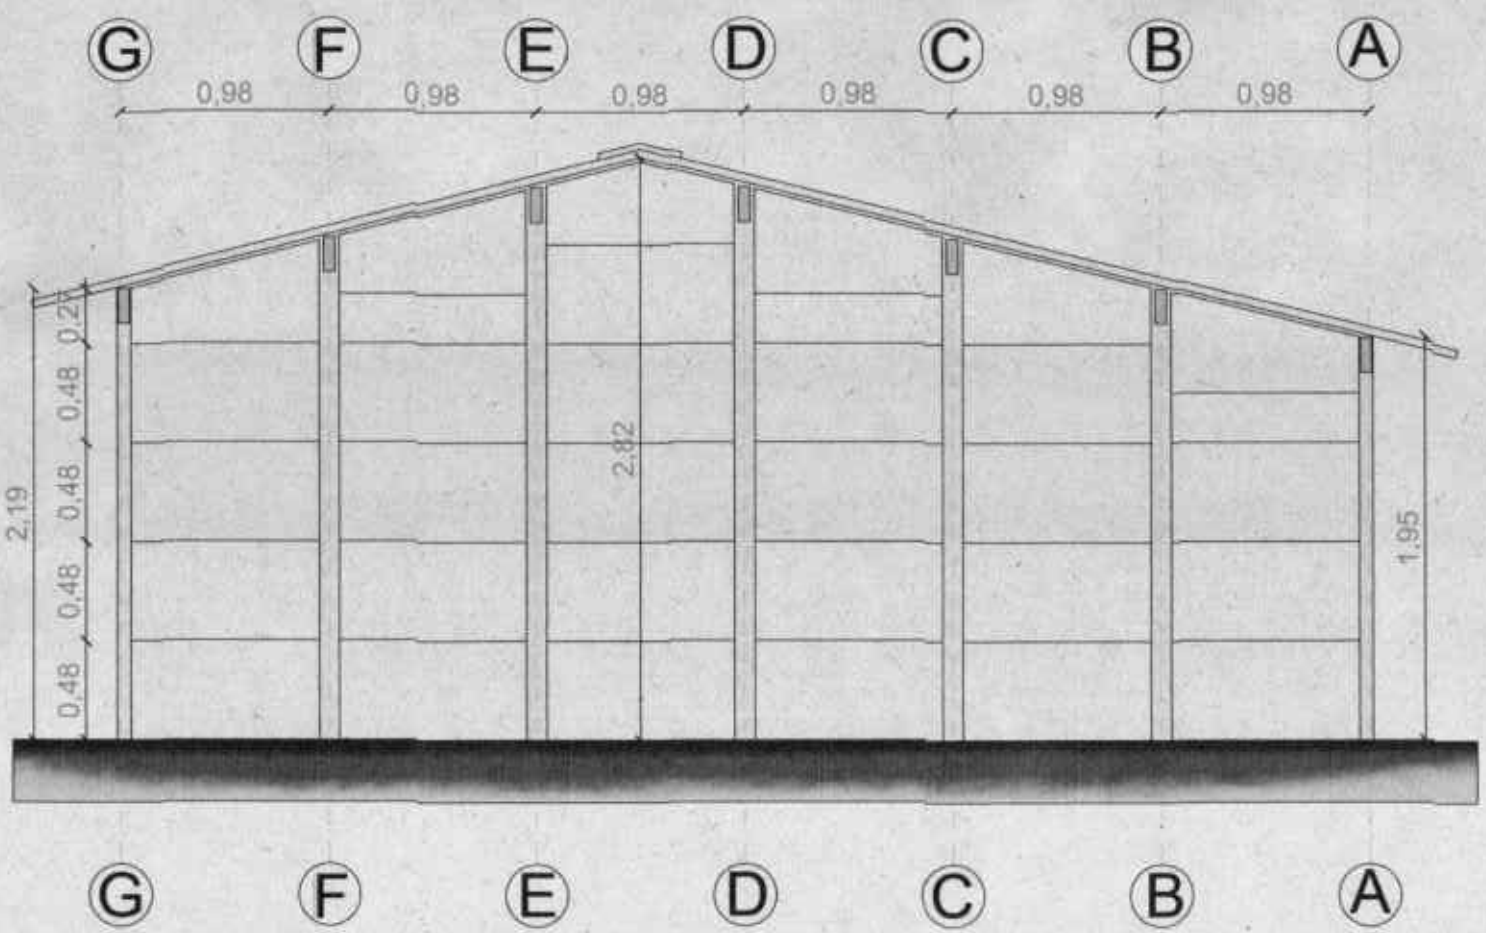

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
FACHADA LATERAL IZQUIERDA

ESCALA:
1.20

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ.
M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ. JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
4/9

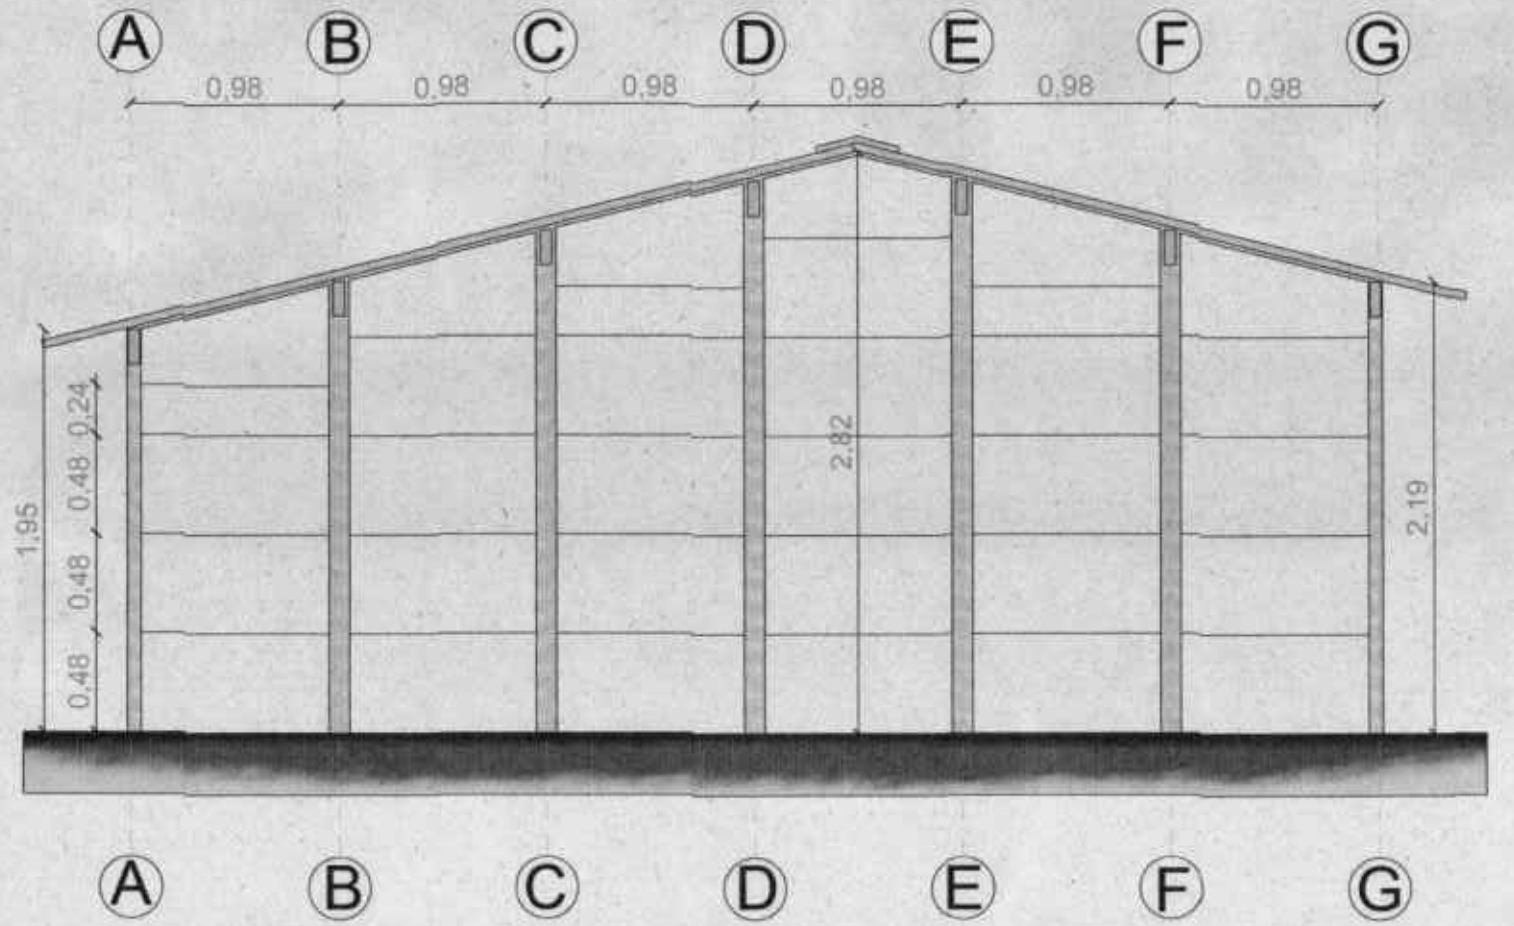

Catalina Muñoz FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
FACHADA LATERAL DERECHA

ESCALA:
1.20

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ, M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ. JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
5/9

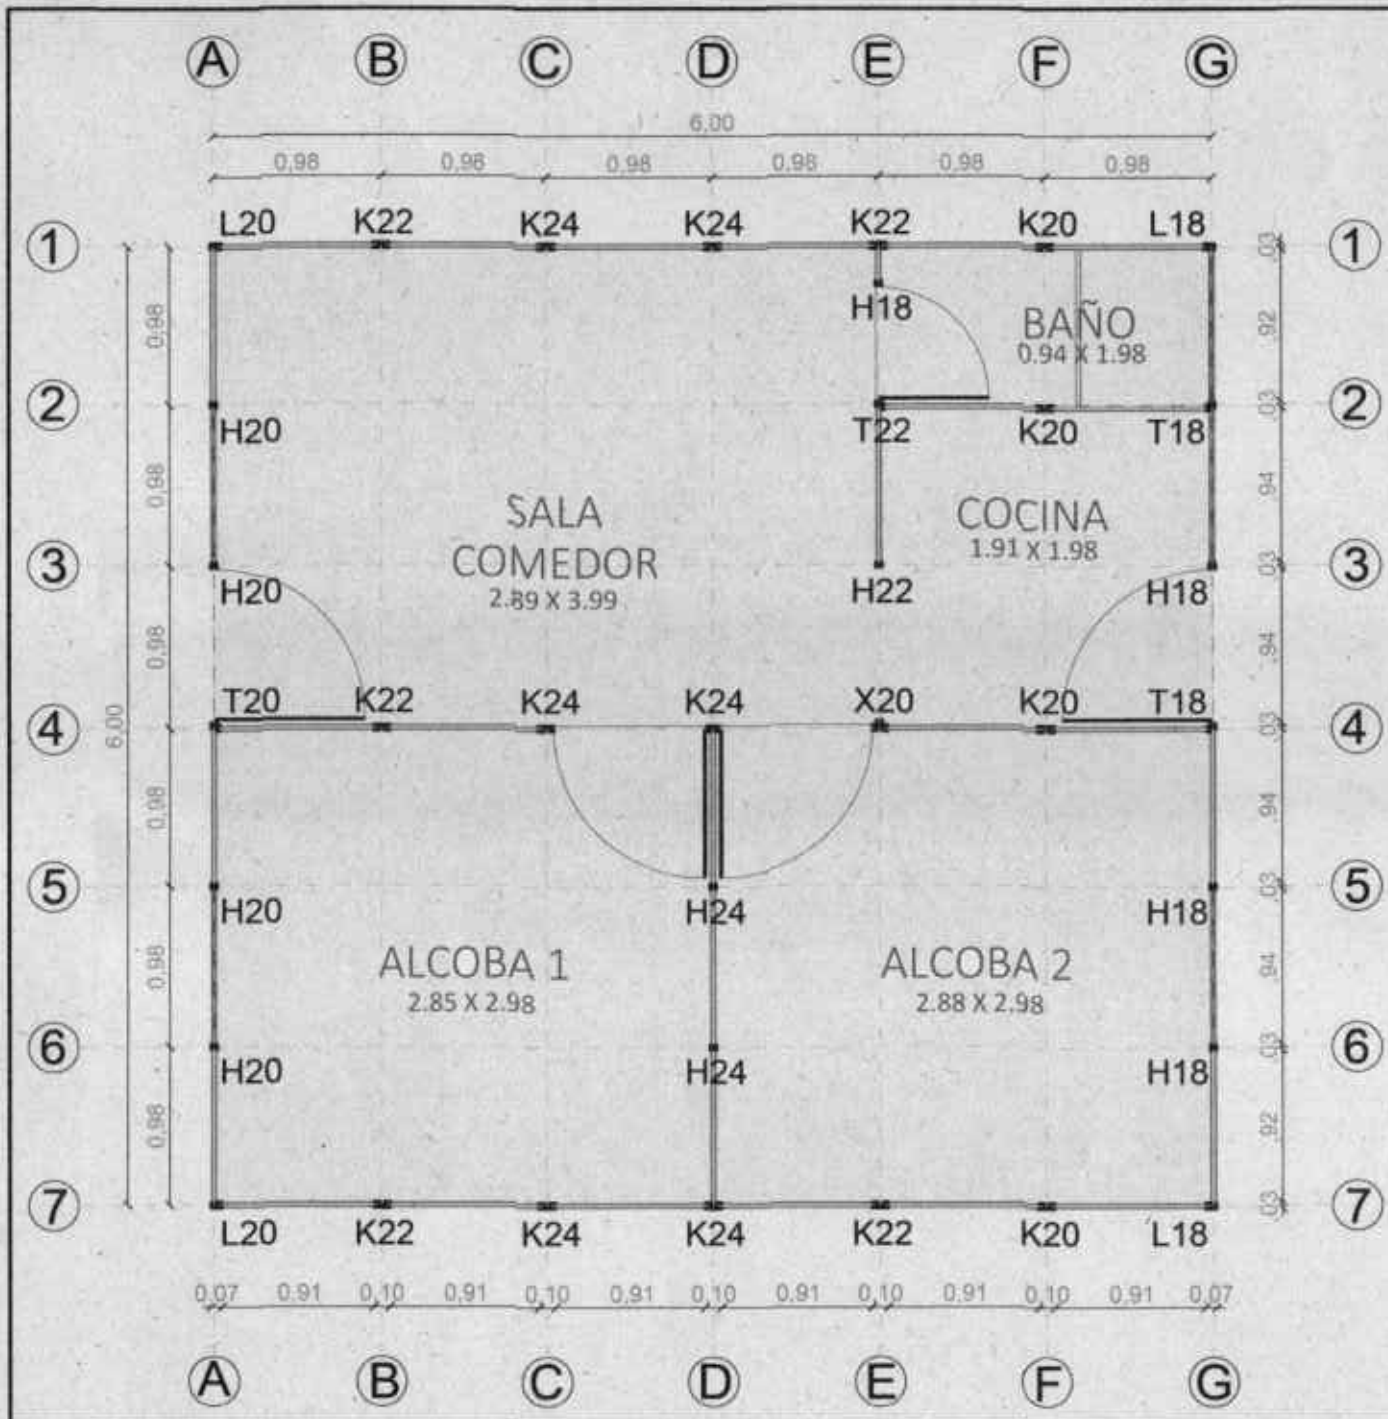

	L-16	2
	L-18	2
	H-16	4
	H-18	4
	H-20	1
	H-22	2
	T-16	2
	T-18	1
	T-20	1
	K-18	4
	K-20	5
	K-22	6
	X-20	1

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
PLANTA DE PERFILERIA

ESCALA:
1.25

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ, M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ, JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
6/9

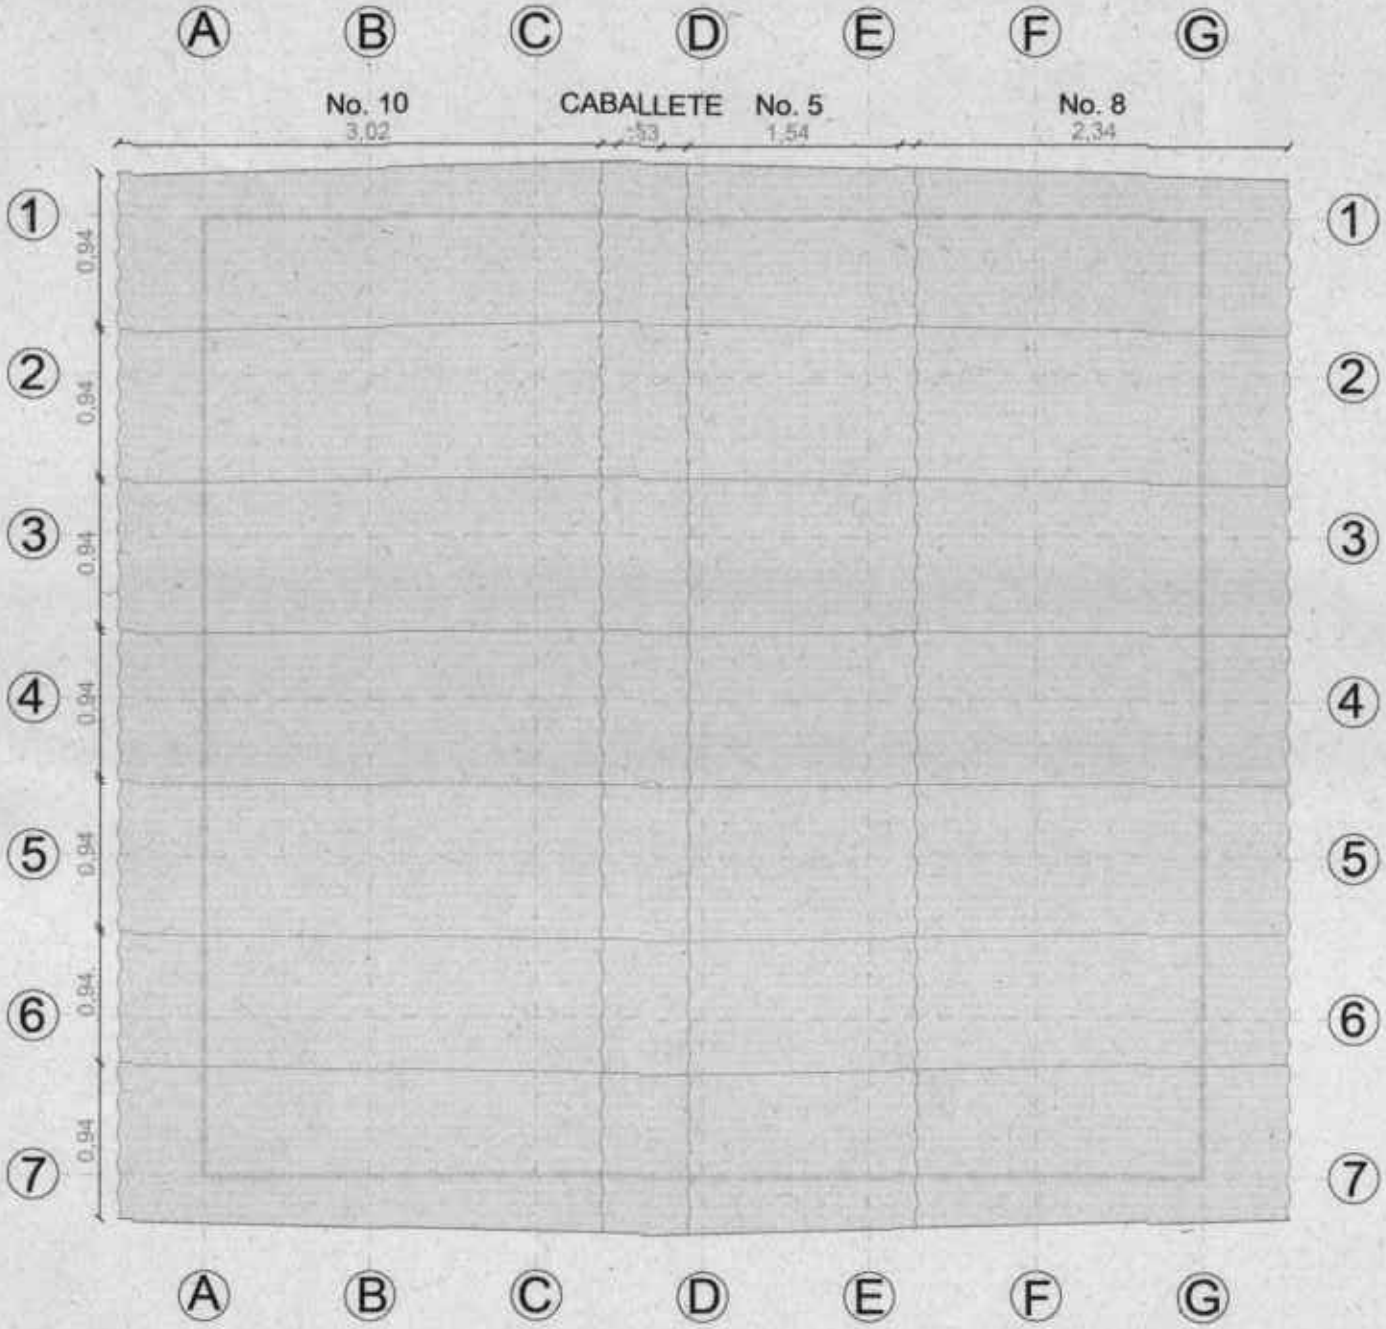

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
PLANTA DE CUBIERTAS

ESCALA:
1.25

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ.
M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ. JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
7/9

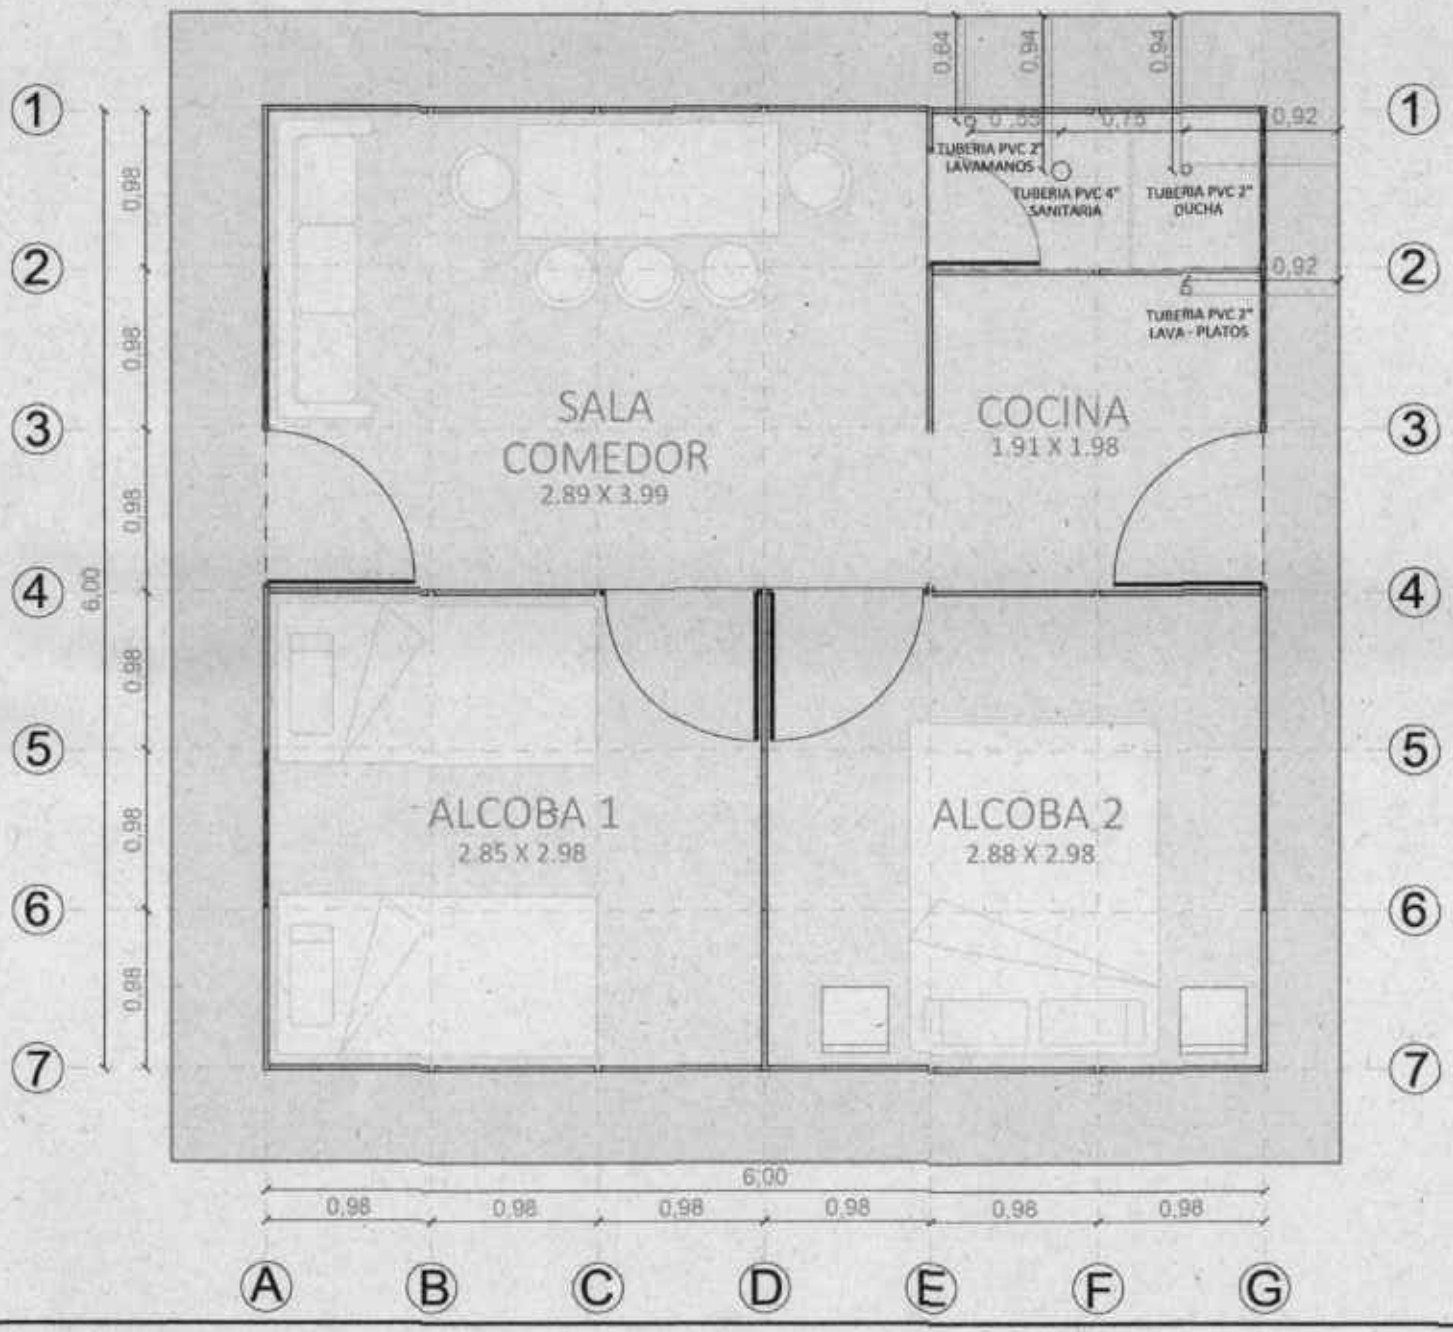

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

ESCALA:
1.25

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ.
M.P A20212019-1019006018


DIBUJO:
ARQ. JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
8/9

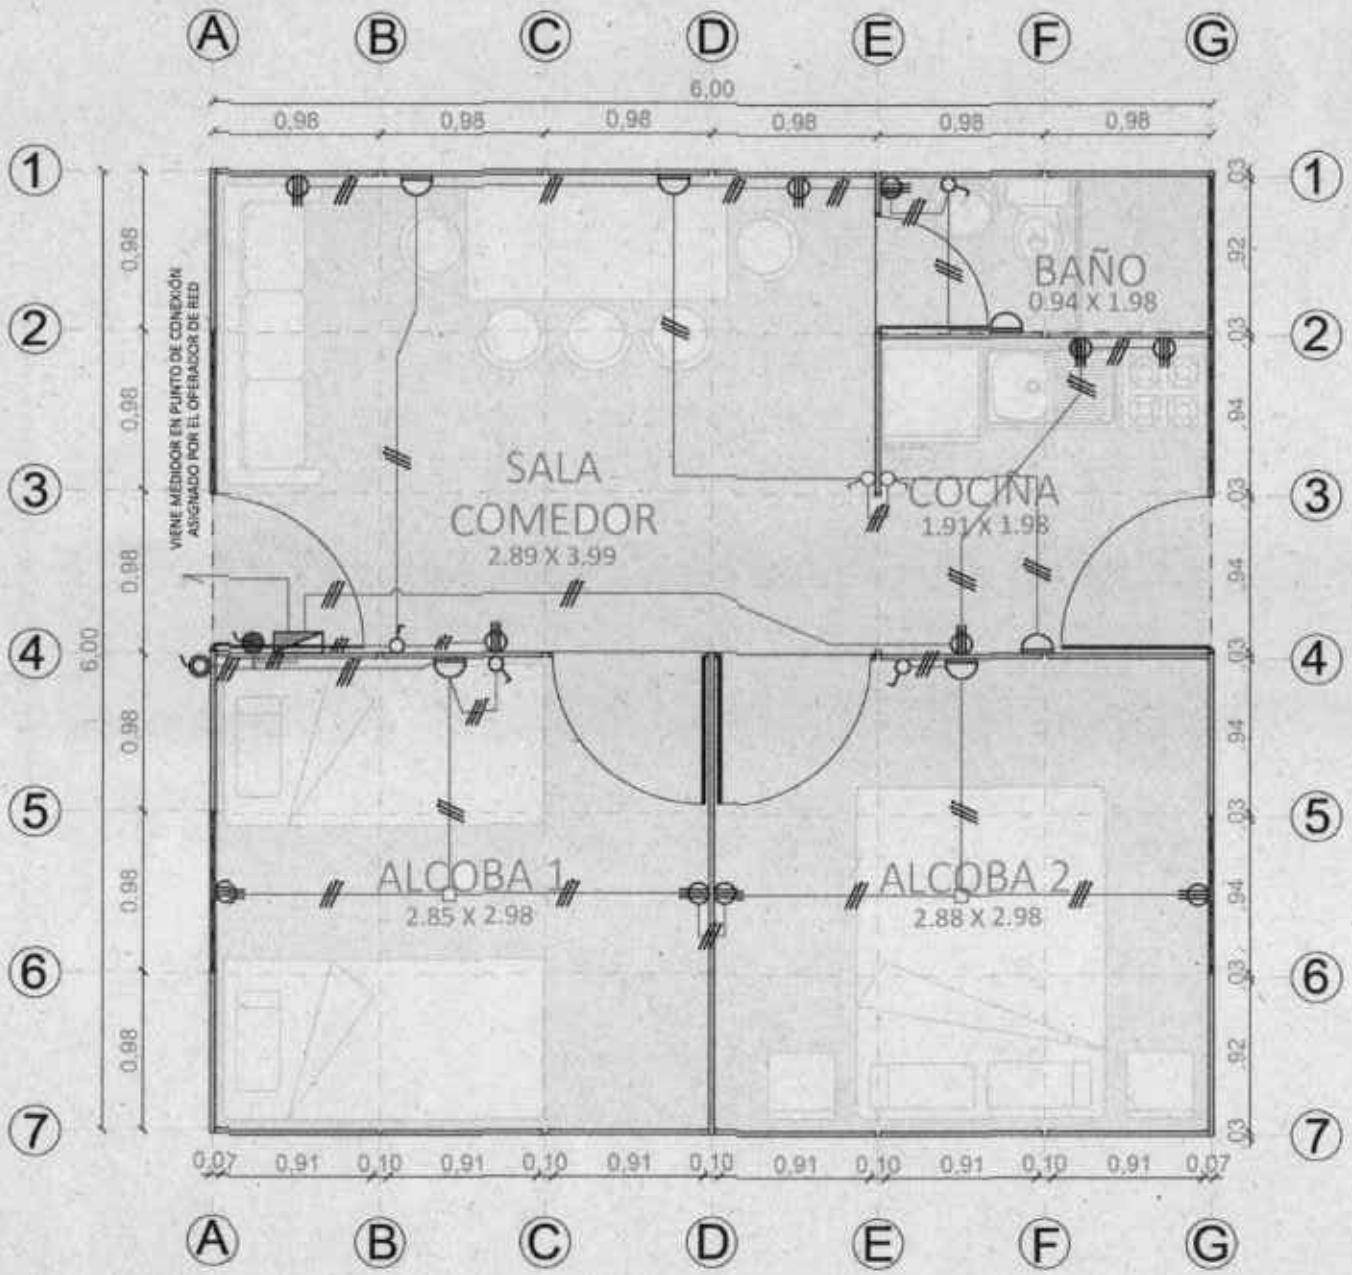

FORMA	REFERENCIA
	TUBERÍA DE TECHO
	TABLERO DE CIRCUITOS
	INTERRUPTOR SENCILLO
	CAMPANA TIMBRE
	PULSADOR TIMBRE
	TOMACORRIENTE MONOFASICO GFCI
	TOMACORRIENTE MONOFASICO
	ROSETA

Catalina Muñoz
FUNDACIÓN

PROYECTO:
UNIDAD BÁSICA HABITACIONAL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 36 M2

CONTENIDO:
INSTALACIONES ELECTRICAS

ESCALA:
1.25

DIRECTOR DE PROYECTO:
ARQ. MARISOL BARONA ORTIZ,
M.P A20212019-1019006018

DIBUJO:
ARQ. JUAN SEBASTIAN BAYONA C.C. 1233511954

VO.BO.:

FECHA:
19/02/2021

OBSERVACIONES:

PLANO NO.
9/9

MUNICIPIO DE GRANADA

Nit: 832000992-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200085

FECHA DE INGRESO: GRANADA MIÉRCOLES, 28 DICIEMBRE 2022 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200059** del **MARTES, 20 DICIEMBRE 2022**

Proveedor FUNDACION CATALINA MUÑOZ, DIR: DIAG 48 19 16, TEL: , NIT: 830504284 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	105020002	insumos para contruccion de placa de contrapiso 7x7 fundacion CATALINA MUÑOS	UND	1.00	5,896,100.00	5,896,100.00
2	105020001	modulos habitacional prefabricados en concreto de 36 M2 fundacion CATALINA MUÑOS	UND	1.00	15,332,233.00	15,332,233.00
3	105020002	insumos para contruccion de placa de contrapiso 7x7 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	UND	5.00	5,896,100.00	29,480,500.00
4	105020001	modulos habitacional prefabricados en concreto de 36 M2 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA	UND	5.00	15,332,233.00	76,661,165.00
				Total	$	127,369,998.00

Detalle: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA

Destino: MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA

SON: CIENTO VEINTI SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE GRANADA

Nit: 832000992-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO DONACION

Nro. 202200234

FECHA DE SALIDA: GRANADA VIERNES, 30 DICIEMBRE 2022 **Centro de Costo:** 1010

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202200085 del MIÉRCOLES, 28 DICIEMBRE 2022

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION

RESPONSABLE CUEVA CLAVIJO JAVIER ALIRIO, C.C.2965464

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	105020001	5.00	modulos habitacional prefabricados en concreto de 36 M2 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA, Placa Almc.:0			15,332,233	76,661,165
2	UND	105020001	1.00	modulos habitacional prefabricados en concreto de 36 M2 fundacion CATALINA MUÑOS, Placa Almc.:0			15,332,233	15,332,233
3	UND	105020002	1.00	insumos para contruccion de placa de contrapiso 7x7 fundacion CATALINA MUÑOS, Placa Almc.:0			5,896,100	5,896,100
4	UND	105020002	4.00	insumos para contruccion de placa de contrapiso 7x7 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA, Placa Almc.:0			5,896,100	23,584,400
5	UND	105020002	1.00	insumos para contruccion de placa de contrapiso 7x7 ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA, Placa Almc.:0			5,896,100	5,896,100

Total $	127,369,998

RESUMEN

Grupo	Valor
105	127,369,998.00
Total $	127,369,998.00

Detalle: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA

Destino: MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA

SON CIENTO VEINTI SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN
ALMACEN GENERAL

CUECA CLAVIJO JAVIER ALIRIO
c.c. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: Ubaque g	Modificó Ubaque g 07/02/2023	
