INFORME No. 3

PERIODO: 27 DE FEBRERO 2023 HASTA EL 26 DE MARZO DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. LEONARDO MANTILLA NOGUERA	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	

FZ INGENIERIA SE SAS

901.036.726-2

CIENAGA DEL OPON, SANTANDER

Contenido

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL 4
2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 5
3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA 7
4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 8
4.1 LOCALIZACIÓN 8
4.2 Descripción de la ubicación del proyecto: 9
5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO 9
6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 10
6.1 Observaciones generales del interventor: 29
7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO 30
7.1 AVANCE FÍSICO 30
7.2 Avance en tiempo 30
7.3 Avance financiero: 30
8. Reporte del estado de tiempo: 31
9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 91
9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA 92
9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA 93
9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 94
9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL 95
9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION 96
9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA 96
9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 96
..... 96
9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 96
9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 97
9.5.1 FORMA DE PAGO 97
9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO 98
9.5.3 CURVA DE AVANCE FINANCIERO 98

9.5.4 CURVA DE AVANCE FISICO 98
10. CONCLUSIONES 99

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El colegio de Ciénega del Opón no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un espacio adecuado que brinde el desarrollo de las actividades escolares de su comunidad estudiantil, puesto que presenta humedad en cubierta y muros divisorios, no cuenta con el aislamiento necesario entre la cocina – comedor y las aulas, no cuenta con un acceso establecido ni con áreas amplias de circulación en la zona de los baños, ya que el alto grado de deterioro hace que no cumpla con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en edad escolar contribuyen al desempleo y sub empleo. Este proyecto rural beneficiará en especial a 86 Familias en Centro Poblado y 82 Familias en Veredas de Corregimiento Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito y reviste de una gran importancia al dar cumplimiento con el Plan Integral de reparación colectiva para esta comunidad víctima del conflicto armado desde finales de la década de 1970 cuando ocurrió la primera incursión de actores armados en la zona. Esta intervención integral contempla: Escuela, Comedor, Cocina, Vivero, Polideportiva y Parque de niños en un área total aproximada de 3 mil metros cuadrados. Adicionalmente la secretaria de Educación Distrital revisará la posibilidad para que los estudiantes de la zona puedan terminar su nivel de bachillerato en estas nuevas instalaciones ya que a la fecha esta terminación no es posible y deben desplazarse hacia otras sedes cercanas al rio Magdalena, aumentando la imposibilidad de graduación dada la vulnerabilidad económica de esta población.

Este proyecto que trata de la CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, se encuentra ubicado en el corregimiento de ciénaga del opón.



Viendo la necesidad de mejorar y recuperar el uso de la actual infraestructura de la escuela de Ciénaga del Opón, se genera una nueva infraestructura con nuevos espacios de interactuación social y académica. Espacios que comprenden un conjunto de mobiliario escolar y de estancia, sala de informática (1), batería sanitaria (1 baño preescolar, 1 damas, 1 caballeros, 1 movilidad reducida, 1 servicio), comedor y cocina, aula TIM (1), aulas escolares (4 aulas modulares, 1 aula preescolar. 5 aulas en total), áreas de archivo y mantenimiento, juegos infantiles, ejercicio y deporte al aire libre, manteniendo la cancha polideportiva que se encuentra allí actualmente, mejorando los espacios verdes, zonas de recorrido, zonas de juego y sus espacios públicos adyacentes, incluyendo un espacio destinado para huerta, para el fomento de las actividades de agricultura. El área dispuesta para el proyecto corresponde al área de sana posesión realizada para el predio de la Escuela Campo Galán, que es equivalente a 3.300 M2 incluye área de la cancha, centro de salud, e inspección de policía

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	N° 6223-22
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO R83
NIT.	:	901219917-9
REP LEGAL	:	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
C.C.	:	13.745.615 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CARRERA 14 N. 35-26 EL CENTRO
TELÉFONO	:	3153902619
CORREO ELECTRÓNICO		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION		GRUPO J8 SAS identificado con NIT: 900.266.469-7 con el 90% de participación, y R3 CONSTRUCTORES, identificado con NIT: 829.002.433-2 con el 10% de participación
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	FZ INGENIERÍA SE SAS

NIT.	:	901036726-2
REP LEGAL	:	FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C.	:	91291804 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CALLE 50 N°10ª-48 OFICINA 304
TELÉFONO	:	3176679736
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($3.266.051.722,92) incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	NOVIEMBRE 30 DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		26 DE JUNIO DE 2023
AVANCE EN TIEMPO		TRES (03) MESES
AVANCE EN EJECUCION		10,12%

RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SIETE (07) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 22-06716 del 11 de agosto de 2022 con el cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-22010501-2022680810056-53290, por concepto de OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, fuente de financiación CREDITO INTERNO por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($571.435.433) correspondiente al 15% del presupuesto oficial. Acuerdo municipal No. 045 de 2022 vigencias futuras, expedido por el concejo municipal de Barrancabermeja en el cual se contempla el porcentaje restante del valor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	22-06716 DE AGOSTO 11 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	22-11559 DE DICIEMBRE 02 DE 2022
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.10479887 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810056 DEL 19 DE JULIO DE 2022
CEPAA	:	6852 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		23-00753 FEBRERO 03 DE 2023
OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 6223-22		22 DE MARZO DE 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: nipHuRsHlvC79a6/wY9lrA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
ASEGURADO	CONSORCIO R83	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SASNIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00	400,000,000.00	400.000.000,00	580.822,00
PATRONAL	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	580.822,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	580.822,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	111.306,00
TOTAL A PAGAR	$	697.128,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO R83, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: CRgWzqj4MJ+F8gHonDt5wQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/12/2023	653.210.344,60	2.120.697,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/06/2026	326.605.172,30	3.511.229,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2023	24:00 Horas Del 30/06/2028	653.210.344,60	9.808.893,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.633.025.861,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	15.440.819,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	15.440.819,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.934.705,61
TOTAL A PAGAR	$	18.380.524,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en el corregimiento de ciénaga del opón centro educativo campo galán, sede educativa ciénaga del opón, ubicado en el distrito de Barrancabermeja, Santander.

4.1 LOCALIZACIÓN

Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito de Barrancabermeja,Santander.



Información geográfica de Ciénaga del Opón

Latitud:	6.9169444
Longitud:	-73.8972222
UFI:	-593713
UNI:	9129806
UTM:	XN26

JOG: NB18-07

MATERIALES

Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en cuenta que los proveedores de


todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

SISTEMAS

El sistema constructivo a utilizar para el proyecto será un sistema de pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía. (DMO) con entrepiso en Steeldeck, según los requisitos mínimos sismo-resistentes de la norma aplicable vigente, "Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente NSR-10".

4.2 Descripción de la ubicación del proyecto:

El proyecto se localizará en el corregimiento de ciénaga del opón en su cabecera punta sola.

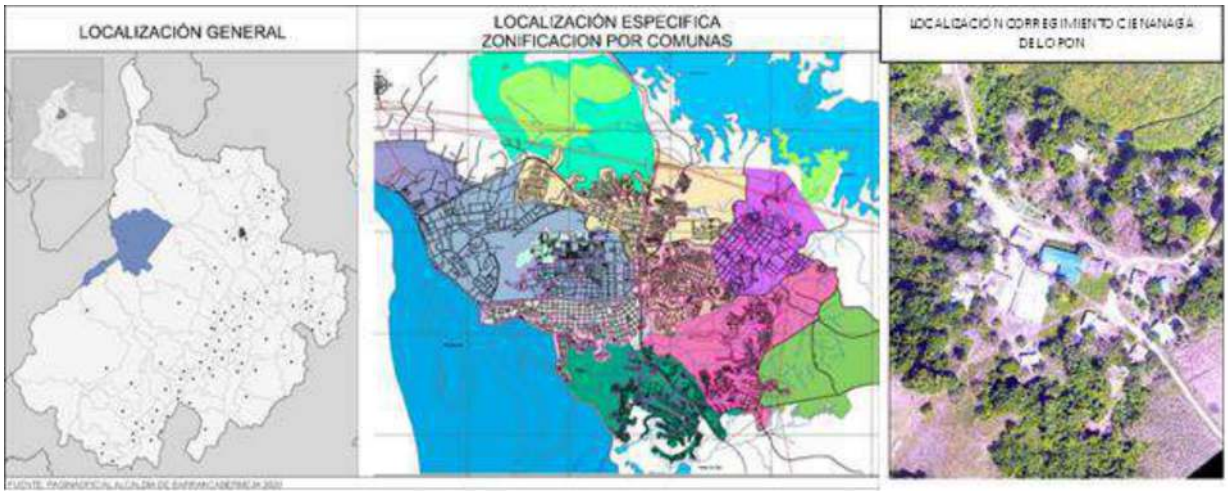

5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4228292
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/11/2022 6:02:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 6223-22
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(27/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO R83

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900266469

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO R83			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BERTA OCHOA MANCIPE* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:36:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:39:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4228292_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4228292_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	400		
Fecha límite para entrega de garantías:	15/11/2022 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2022 6:52:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10479887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.033.025.861,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10309329	Seriedad de la oferta	-	340.443.304,10 COP	-	14/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4228292
Proveedor CONSORCIO R83
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCCNTR.4228292
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.404.433.041,00	3.266.051.722,92
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151100	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1,00	UN	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CEPAA.pdf	CEPAA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar
Supervisor	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.266.051.722,92
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.266.051.722,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810056	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22-06716	CDP	No validado		571.435.433 COP	00-00-00	Editar
☐	Acuerdo-045-2022	Vigencia futura ordinaria	No validado		2.832.997.605 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22-11559	Presupuestal (CDP)	-	No validado	571.435.433 COP		571.435.433 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 571.435.433 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 571.435.433 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante este Tercer mes hubo avance en las actividades preliminares contractuales del proyecto, movimientos de tierras, concretos , aceros y mampostería como se mostrará a continuación con sus respectivas cantidades de obra.

Se presenta registro fotográfico del estado del proyecto donde se realizará el contrato de obra CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PREACTA PARCIAL Nº2		ACUMULADO GENERAL	
		CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1.0	**Preliminares**				
1.2	Cerramiento provisional en malla polipropileno verde	43,50	$1.386.041	161,40	$5.142.688
	Subtotal		**$1.386.041**		**$67.914.794**
2.0	**Movimiento de tierras**				
2.2	Excavación Manual en material común	45,15	$2.573.460	94,60	$5.392.011
2.3	Relleno y compactación con material de recebo	13,45	$2.220.017	13,45	$2.220.017
2.4	Cargue y retiro de material sobrante	525,00	$4.787.475	5.913,32	$53.923.565
	Subtotal		**$9.580.951**		**$66.795.163**
3.0	**Concretos y mampostería**				
3.5	Concreto de 2000 Psi, Clase F, para solado para protección de estructuras de cimentación esp. 0.05m	24,42	$1.301.415	92,92	$4.951.986
3.6	Concreto de 3000 Psi para concreto ciclópeo (60% concreto de 3000 Psi y 40% de piedra bolo, para mejoramiento de suelo)	15,75	$10.563.431	15,75	$10.563.431
3.12	Concreto de 3000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)	3,79	$3.970.927	14,59	$15.286.497
3.14	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.30m (Incluye acero de refuerzo 6.51 kg/mL)	107,51	$22.980.693	283,89	$60.682.623
3.15	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.90x0.30m (Incluye acero de refuerzo 27.24 kg/mL)	25,41	$14.274.195	25,41	$14.274.195
3.18	Concreto de 3000 psi para columnas sección 0.12-0.16m2 (No incluye acero de refuerzo)	57,75	$10.378.484	150,15	$26.984.057
3.29	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)	4.539,26	$41.956.380	7.115,06	$65.764.500

CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITEM: 1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA POLIPROPILENO VERDE
CANTIDAD EJECUTADA: 43,5 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 244 ML

Durante este mes se hace el seguimiento para realizar el cerramiento en malla polipropileno verde del área del proyecto donde se realizaron las excavaciones para las zapatas, vigas de cimentación entre otros, esto con el fin de confinar la obra y por seguridad para la comunidad, así de esta manera prevenimos al público de que se están realizando actividades que pueden ser de peligro para aquellos que no pertenezcan a la obra y no estén utilizando todos los elementos de seguridad necesarios.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Espesor		
CERRAMIENTO					
SECTOR NORTE	4,50				4,50
SECTOR SUR	39,00				39,00
Subtotal					43,50
Vienen					
TOTAL					**43,50**





CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: 2.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN
CANTIDAD EJECUTADA: 45,15 M3
CANTIDAD CONTRATADA: 180,03 M3

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a toda clase de excavación necesaria para la construcción de las obras mostradas en planos de acuerdo con las líneas y pendientes que ahí se estipulan y que por su poca profundidad y sus dimensiones pueda ser llevada a cabo por medios manuales con herramientas menores, se realizaron excavaciones para zapatas y vigas de cimentación del proyecto.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
ZAPATAS					
Eje 4 entre ejes G-J	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
Eje 3 entre ejes G-J	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Eje 3 entre ejes G-J	1,10	1,10	1,00	2,00	2,42
Eje 2 entre ejes E-J	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00
Eje 1´ entre ejes G-I	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00
Eje 1 entre ejes E-J	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00
TANQUE CENTRO SALUD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
VIGAS CIMENTACION					
Ejes 3 y 4 entre ejes G-J	14,22	0,30	0,50	2,00	4,27
Ejes 1 y 2 entre ejes G-J	18,72	0,30	0,50	2,00	5,62
Eje 1´ entre ejes E-J	16,08	0,30	0,50	1,00	2,41
Ejes G al J entre ejes 1 y 4	10,77	0,30	0,50	4,00	6,46
Ejes E y F entre ejes 1 y 3	6,55	0,30	0,50	2,00	1,97
Subtotal					45,15
Vienen					
TOTAL					**45,15**





CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: 2.3 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE RECEBO
CANTIDAD EJECUTADA: 13,45 M3
CANTIDAD CONTRATADA: 72,46 M3

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad en la cual se rellena con material de recebo todas aquellas excavaciones necesarias debido al diseño del proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato y que haya cumplido previamente con los ensayos necesarios para la calidad del material.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
ZAPATAS					
Eje 6 entre ejes A-F	1,00	1,00	0,35	6,00	2,10
Eje 5 entre ejes A-F	1,00	1,00	0,35	6,00	2,10
Eje 4 entre ejes A-F	1,00	1,00	0,35	6,00	2,10
Eje 3 entre ejes A-F	1,00	1,00	0,35	6,00	2,10
Eje 4 entre ejes G-J	1,00	1,00	0,35	4,00	1,40
Eje 3 con ejes G y J	1,00	1,00	0,35	2,00	0,70
Eje 3 entre ejes H - I	1,10	1,10	0,35	2,00	0,85
Eje 2 entre ejes E-J	1,00	1,00	0,35	6,00	2,10
Subtotal					13,45
Vienen					
TOTAL					**13,45**





CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: 2.4 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
CANTIDAD EJECUTADA: 525 M3*KM
CANTIDAD CONTRATADA: 7202,19 M3*KM

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere al trabajo de recolectar el material sobrante de la obra y que no se utiliza y se tiene como desperdicio incluido el escombro que se genera producto del proceso de demolición y el proceso constructivo, teniendo en cuenta el kilometraje de la obra hasta el sitio de disposición.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			DISTANCIA (KM)	25'% expansion	Medida Total
	Area	Espesor	Volumen			
Excavacion						
Excavacion Manual			30,00	14	7,50	525,00
Subtotal						525,00
Vienen						
TOTAL						**525,00**





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.5 CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN ESP. 0.05M
CANTIDAD EJECUTADA: 24,42 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 134,15 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y vigas de cimentación, de un concreto simple de 2000psi de resistencia a la compresión. Este solado de limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
ZAPATAS					
Eje 4 entre ejes G-J	1,00	1,00		4,00	4,00
Eje 3 entre ejes G-J	1,00	1,00		2,00	2,00
Eje 3 entre ejes G-J	1,10	1,10		2,00	2,42
Eje 2 entre ejes E-J	1,00	1,00		6,00	6,00
Eje 1´ entre ejes G-I	1,00	1,00		3,00	3,00
Eje 1 entre ejes E-J	1,00	1,00		6,00	6,00
TANQUE CENTRO SALUD	1,00	1,00		1,00	1,00
Subtotal					24,42
Vienen					
TOTAL					**24,42**





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.6 CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONCRETO CICLÓPEO (60% CONCRETO DE 3000 PSI Y 40% DE PIEDRA BOLO, PARA MEJORAMIENTO DE SUELO)

CANTIDAD EJECUTADA: 15,75 M3
CANTIDAD CONTRATADA: 133,79 M3

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para concreto ciclópeo de acuerdo con las condiciones del diseño, a la cual se le realizaron sus respectivos ensayos de resistencia y a su vez se verifico el diseño de mezclas entregado por el contratista para la resistencia del concreto requerido en campo.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
MURO CERRAMIENTO					
SECTOR NORTE	25,41	0,90	0,40		9,15
SECTOR OCCIDENTAL	18,33	0,90	0,40		6,60
Subtotal					15,75
Vienen					
TOTAL					**15,75**





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.12 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE CIMENTACIÓN (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 3,79 M3
CANTIDAD CONTRATADA: 46,64 M3

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para zapatas de cimentación de acuerdo con las condiciones del diseño, a la cual se le realizaron sus respectivos ensayos de resistencia y a su vez se verifico el diseño de mezclas entregado por el contratista para la resistencia del concreto requerido en campo.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
ZAPATAS					
Eje 4 entre ejes G-J	1,00	1,00	0,45	4,00	1,80
Eje 3 entre ejes H-I	1,10	1,10	0,45	2,00	1,09
Eje 3 con eje G	1,00	1,00	0,45	1,00	0,45
Eje 3 con eje J	1,00	1,00	0,45	1,00	0,45
Subtotal					3,79
Vienen					
TOTAL					**3,79**




CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.14 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0.30X0.30M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6.51 KG/ML)
CANTIDAD EJECUTADA: 107,51 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 427,23 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para las vigas de cimentación de la edificación, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
VCIM-3					
Eje 4 entre ejes F-J	16,83			1,00	16,83
VCIM-2					
Eje 2 entre ejes F-J	16,68			1,00	16,68
VCIM-1					
Ejes 1 y 2 entre ejes E-J	21,76			2,00	43,52
VCIM-1´					
Eje 1´ entre ejes E - I	17,84			1,00	17,84
VCIM-D					
Eje J entre ejes 1 - 4	12,64			1,00	12,64
Subtotal					107,51
Vienen					
TOTAL					**107,51**





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.15 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0.90X0.30M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 27.24 KG/ML)
CANTIDAD EJECUTADA: 25,41ML
CANTIDAD CONTRATADA: 84,48 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para las vigas de cimentación de la edificación, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de

acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
MURO CERRAMIENTO					
SECTOR NORTE	25,41				25,41
Subtotal					25,41
Vienen					
TOTAL					**25,41**





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.18 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.12-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 57,75 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 236,80 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para columnas de la edificación, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural,

así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
COLUMNAS N + 3.30					
COL. TIPO 1					
EJE E ENTRE EJES 1 y 2	3,85			2,00	7,70
COL. TIPO 2					
EJE 3 ENTRE EJES G-H-I	3,85			3,00	11,55
COL. TIPO 3					
EJE 4 ENTRE EJES G - J	3,85			4,00	15,40
EJE 3 CON EJE J	3,85			1,00	3,85
COL. TIPO 4	3,85			1,00	3,85
COL. TIPO 5	3,85			1,00	3,85
COL. TIPO 6	3,85			1,00	3,85
COL. TIPO 7					
EJE J ENTRE EJES 1 y 2	3,85			2,00	7,70





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.29 INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)
CANTIDAD EJECUTADA: 4539,26 KG
CANTIDAD CONTRATADA: 30270,89 KG

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los diseños estructurales del proyecto.

N°	ELEMENTO ZAPATAS Y COLUMNAS				CANT. VARILLAS	1/4 0,25	3/8 0,56	1/2 1,00	5/8 1,55
1	**ZAPATAS T- 01**								
	EJES 1 AL 4 ENTRE EJES G y J								
	EJES 1 AL 2 ENTRE EJES E y F.								
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,30	mts	147			191,10	
	ACERO LONGITUDINAL	L	1,30	mts	147			191,10	
2	**MURO CERRAMIENTO**								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	132			792,00	
	ACERO LONGITUDINAL	L	3,00	mts	36			108,00	
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,20	mts	860			1.032,00	
3	**ZAPATAS T- 02**								
	EJES 3 AL 6 ENTRE EJES A y F; EJES 1 AL 4 ENTRE EJES G y J								
	EJES 1 AL 2 ENTRE EJES E y F.								
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	16			22,40	
	ACERO LONGITUDINAL	L	1,40	mts	16			22,40	
4	**COLUMNAS TIPO 2**								
	EJE 3 CON EJES H - I								
	ACERO LONGITUDINAL	L	4,70	mts	30				218,55
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	81		63,50		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,50	mts	162		45,36		
5	**COLUMNAS TIPO 3**								
	EJE 4 ENTRE EJES F - J; EJE 3 CON EJE F; EJE 3 CON EJE J								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	28				260,40
	ACERO LONGITUDINAL	L	3,10	mts	28				134,54
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,20	mts	189		127,01		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,42	mts	378		88,91		
6	**COLUMNAS TIPO 4**								
	EJE 1 CON EJE G								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	5				46,50
	ACERO LONGITUDINAL	L	3,10	mts	5				24,03
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	29		22,74		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,50	mts	58		16,24		
7	**COLUMNAS TIPO 5**								
	EJE 1 CON EJE H								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	5				46,50
	ACERO LONGITUDINAL	L	3,10	mts	5				24,03
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	31		24,30		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,50	mts	62		17,36		
8	**COLUMNAS TIPO 6**								
	EJE 1 CON EJE I								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	5				46,50
	ACERO LONGITUDINAL	L	3,65	mts	5				28,29
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	34		26,66		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,50	mts	68		19,04		
9	**COLUMNAS TIPO 7**								
	EJE J ENTRE EJES 1 - 2								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	5				46,50
	ACERO LONGITUDINAL	L	2,40	mts	5				18,60
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	62		48,61		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,50	mts	124		34,72		
10	**COLUMNAS TIPO 8**								
	EJE 2 CON EJE I								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	5				46,50
	ACERO LONGITUDINAL	L	2,40	mts	5				18,60
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	34		26,66		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,50	mts	68		19,04		
11	**COLUMNAS TIPO 9**								
	EJE 2 CON EJE H								
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	5				46,50
	ACERO LONGITUDINAL	L	2,65	mts	5				20,54
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,40	mts	32		25,09		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,50	mts	64		17,92		

12	**COLUMNAS TIPO 10**											
	EJE 2 CON EJE G											
	ACERO LONGITUDINAL		L	6,00	mts			5				46,50
	ACERO LONGITUDINAL		L	3,00	mts			5				23,25
	ACERO TRANSVERSAL		L	1,40	mts			32		25,09		
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,50	mts			64		17,92		
13	**COLUMNAS TIPO 11**											
	EJE F CON EJES 1 y 2											
	ACERO LONGITUDINAL		L	6,00	mts			10				93,00
	ACERO LONGITUDINAL		L	3,10	mts			10				48,05
	ACERO TRANSVERSAL		L	1,40	mts			54		42,34		
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,50	mts			108		30,24		
14	**COLUMNAS TIPO 12**											
	EJE 1´ CON EJE G											
	ACERO LONGITUDINAL		L	4,50	mts			6				41,85
	ACERO TRANSVERSAL		L	1,00	mts			34		19,04		
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,38	mts			68		14,47		
15	**COLUMNAS TIPO 13**											
	EJE 1´ CON EJE H											
	ACERO LONGITUDINAL		L	4,00	mts			6				37,20
	ACERO TRANSVERSAL		L	1,00	mts			31		17,36		
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,38	mts			62		13,19		
16	**COLUMNAS TIPO 14**											
	EJE 1´ CON EJE I											
	ACERO LONGITUDINAL		L	3,70	mts			6				34,41
	ACERO TRANSVERSAL		L	1,00	mts			27		15,12		
	ACERO TRANSVERSAL		L	0,38	mts			54		11,49		



6.1 Observaciones generales del interventor:

- La interventoría ha realizado el seguimiento en cada actividad realiza durante este mes, las cuales por el momento solo han sido administrativas y se ha presentado por parte del contratista la reprogramación teniendo en cuenta los tiempos perdidos al inicio de obra.

- La interventoría junto a supervisión y contratista se encuentran revisando los distintos diseños a detalle del proyecto para presentar observaciones de acuerdo a lo encontrado en campo y poder resolverlas con anterioridad a la ejecución de la actividad.

- La interventoría ha velado por que se cumpla con la dosificación del concreto utilizado de acuerdo a los diseños de mezclas entregados y la calidad de los materiales utilizados durante este mes en obra.

- Durante este mes se corrigen junto a supervisión los diferentes cambios al diseño de acuerdo a lo revisado en campo junto al contratista y lo plasmado en bitácora y comités.

- Se presentaron fuertes lluvias que repercutió en daños de luz y por lo tanto atraso en el cumplimiento de las actividades.

7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

7.1 AVANCE FÍSICO

ETAPA CONSTRUCTIVA	ACTIVIDADES PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA.

7.2 Avance en tiempo


TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	3 MES
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO	42,85%

7.3 Avance financiero:

Durante el Tercer mes se presenta un cobro de acta parcial.

ACTA PARCIAL 1		FECHA
CONTRATISTA	**$ 216.824.730**	**29-mar-26**
INTERVERNTOR	**$ 23.655.732**	**29-mar-26**

8. Reporte del estado de tiempo:

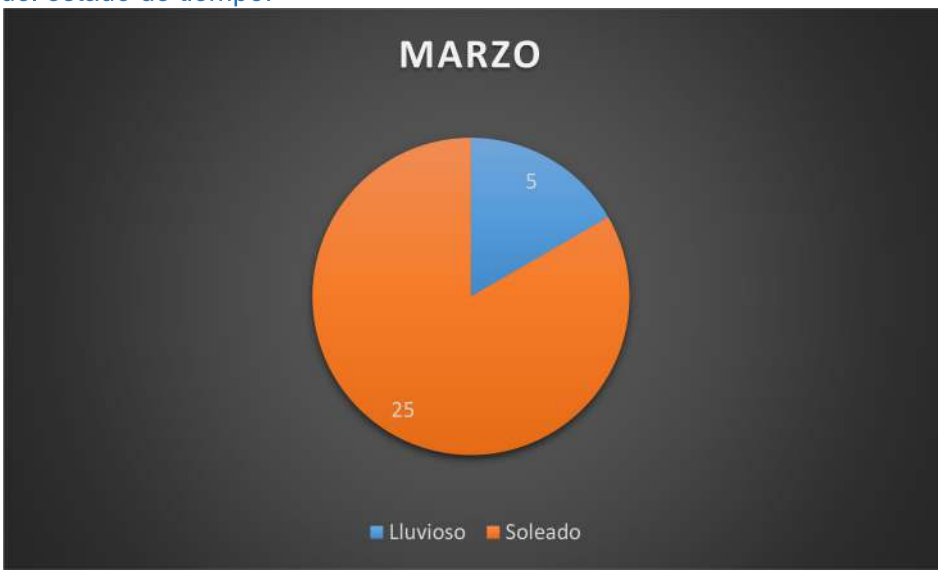

8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SS

Esta interventoría se ha asegurado del correcto uso a diario y seguimientos de control de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

- Como interventoría se ha hecho el seguimiento de la entrega de las afiliaciones por parte el contratista del personal nuevo que va ingresando al proyecto, las cuales fueron entregadas correctamente por el contratista y se relaciona adjunta los soportes del personal de campo

AFILIACION DE PERSONAL NUEVO DE CAMPO (Ayudantes de obra)

AFILIACION A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES



ARL | sura

Medellín, 06 de Marzo de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO R83, en el centro de trabajo 0000000001 - OPERATIVO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Codigo de transaccion	Tipo Cotizante	Estado
C1005185426	ZAMBRANO VANEGAS JEAN CARLOS	07/03/2023		v135207J	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C6339295623065628 25



ARL | sura

Medellín, 11 de marzo de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO R83.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVO			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C1005185500	MARTINEZ CALA KEIMER FABIAN	13/03/2023		13221113	DEPENDIENTE	POR INICIAR



ARL | sura

Medellin, 18 de marzo de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO R83.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1192725777	GOMEZ DIAZ VICTOR MANUEL	21/03/2023		238224x1	DEPENDIENTE	POR INICIAR



ARL | sura

Medellín, 11 de marzo de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS


HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO R83.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1005176224	ZAMBRANO VANEGAS VICTOR JULIO	13/03/2023		30K1444k	DEPENDIENTE	POR INICIAR

AFILIACION A EPS

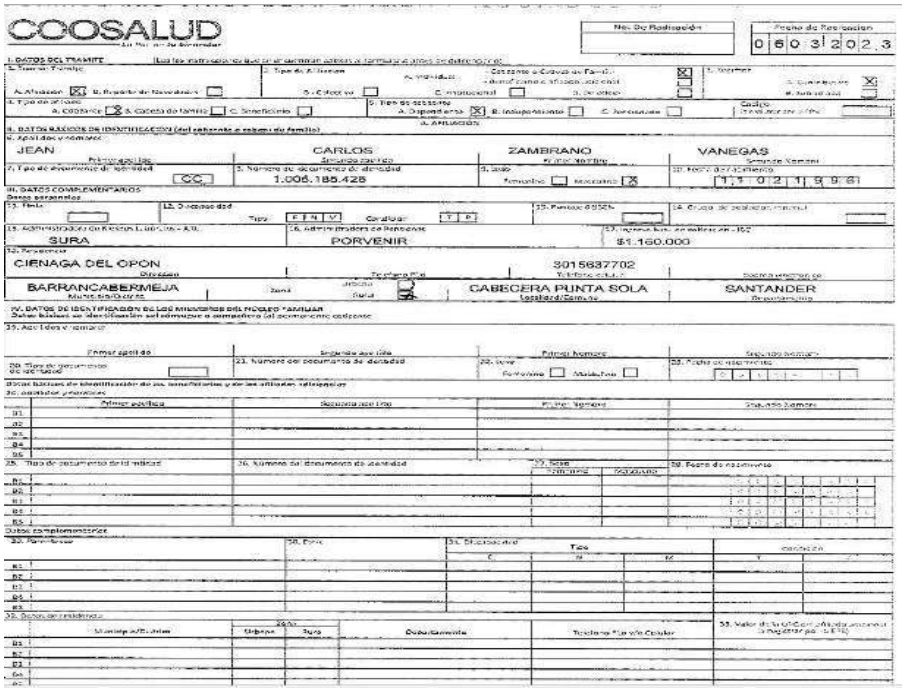

COOSALUD

JEAN	CARLOS
ZAMBRANO	VANEGAS
CC	1.006.185.428
SURA	PORVENIR
$1.160.000	
CIENAGA DEL OPON	3015637702
BARRANCABERMEJA	CABECERA PUNTA SOLA
SANTANDER	

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009946035	1 3 0 3 2 0 2 3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1.Tipo de tramite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion: A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. De oficio ☐ B. Colectivo ☐ B. Institucional ☐

3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
MARTINEZ (Primer apellido)	CALA (Segundo apellido)	KEIMER (Primer nombre)	FABIAN (Segundo nombre)

7.Tipo documento de identidad	8.Número del documento de identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1006185500	Femenino ☐ Masculino ☒	19 09 6 2 0 0 3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de población especial
6	Tipo FNM	Condicion TIF		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR EPS	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 1 3 5		3 1 0 3 2 2 9 1 2 7	KEINERMARTINEZ@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BUCARAMANGA	Urbana ☒ Rural ☐		SANTANDER

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				


	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo P	Tipo K	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

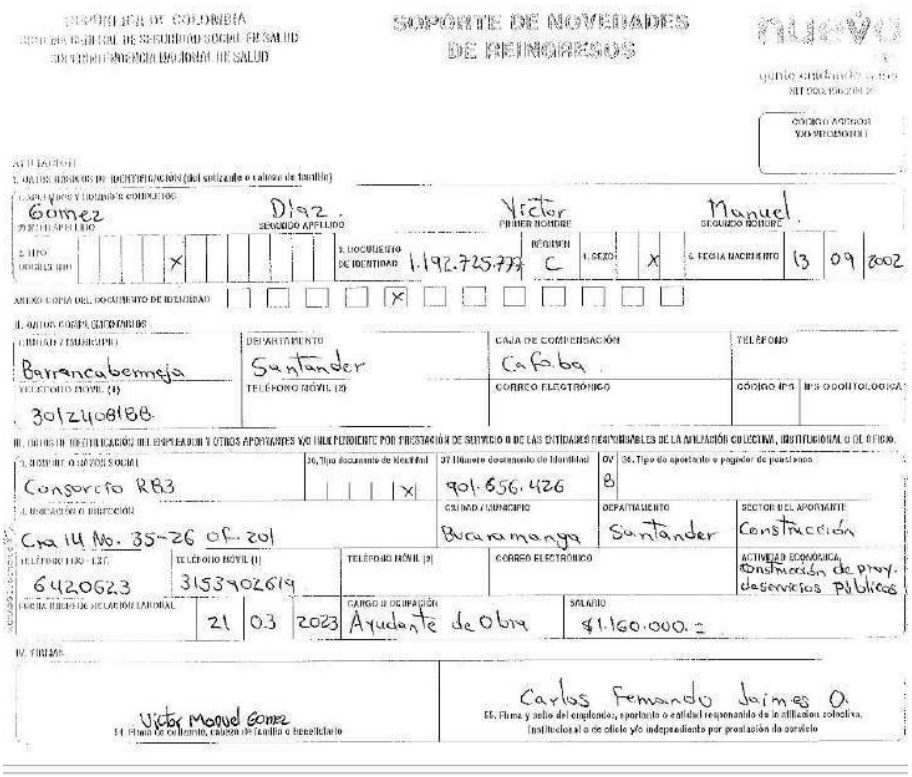

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE SALUD

SOPORTE DE NOVEDADES
DE REINGRESOS

PILA-Y

I. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL COTIZANTE | | |

AFILIACION A PENSION

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.185.426**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 4 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.192.725.777**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.176.224**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

- Esta interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado.

- Durante este mes se verifica con la profesional ambiental de obra, todas las posibles actividades potenciales de riesgo para las próximas actividades en excavaciones donde se toman las acciones preventivas para evitar accidentes que afecten la integridad física de los trabajadores.

- Se hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST en apoyo con el área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los riesgos del día de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del maestro de obra.

- El contratista está a la espera del apoyo de la caja de compensación familiar CAFABA, para socializar al personal el proceso de inscripción a los integrantes de la familia y poder acceder al cobro de la cuota monetaria por la caja de compensación familiar CAFABA.

8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA

N	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	BERTA OCHOA MANCIPE	41565068	Directora de obra
2	JUAN NAVARRO ANAYA	91.495.929	Residente de obra
3	LINA MARCELA ROMERO SANCHEZ	1.098.608.473	HSEQ
4	FERNEL GARCIA LEDESMAS	91.446.762	Ayudante de obra
5	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	91.445.073	Ayudante de obra
6	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	1.050.544.297	Ayudante de obra
7	PABLO NIÑO PAEZ	91.234.001	Maestro de Obra
8	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	1.096.182.667	Ayudantes de obra
9	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	1.096.215.607	Ayudantes de obra
10	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	1.096.252.941	Ayudantes de obra
11	DANIEL VANEGAS ESPARZA	1.096.208.945	Ayudantes de obra
12	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	9.161.846	Ayudantes de obra
13	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	13.854.910	Ayudantes de obra
14	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	1.005.185.426	Ayudantes de obra
15	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	1.005.185.500	Ayudantes de obra
16	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	1.005.176.224	Ayudantes de obra

17	VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ	1.192.725.777	Ayudantes de obra
18	EDO FABIAN PINTO CHACON	1005602465	Oficial de obra
19	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	1095830842	Ayudantes de obra


RELACIÓN PERSONAL RETIRADO

CEDULA	CARGO	
FERNEL GARCIA LEDESMAS	91.446.762	Ayudante de obra

8.3 GESTION SST DEL MES: CHARLAS DIARIAS HSE, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP

Esta interventoría realiza el seguimiento diario del proceso de la gestión SST del proyecto donde se anexan los soportes a continuación:

CHARLAS DIARIAS HSE

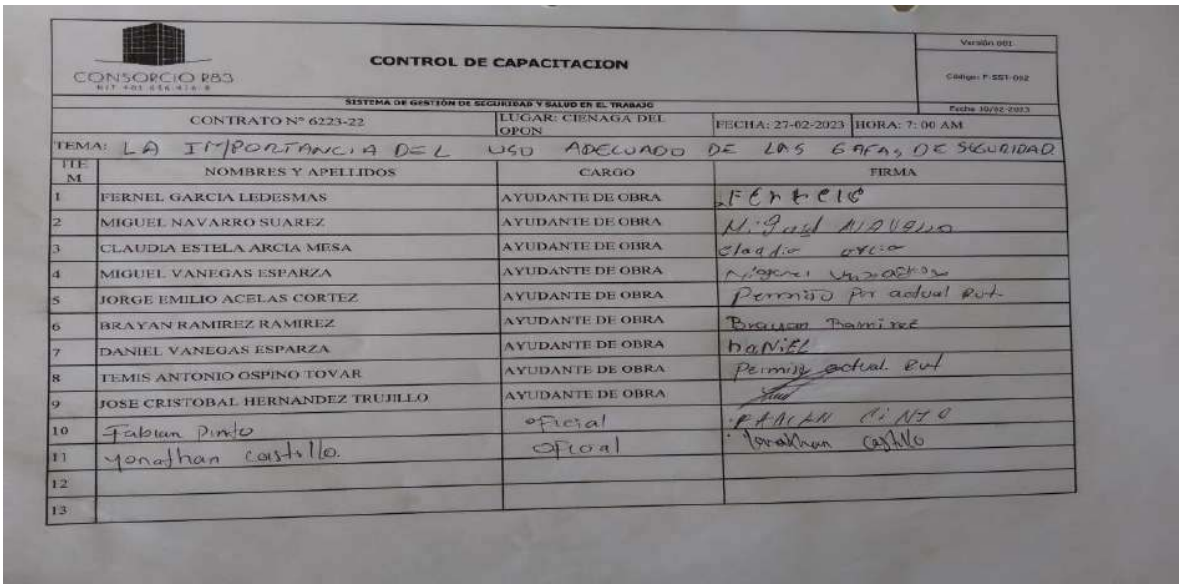

CONSORCIO R83

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-092


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 10/02/2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 27-02-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: LA IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernel
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Permiso por actual Rut
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Permiso actual. Rut
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	oficial	Fabian Pinto
11	Yonathan castillo.	oficial	Yonathan Castillo
12			
13			

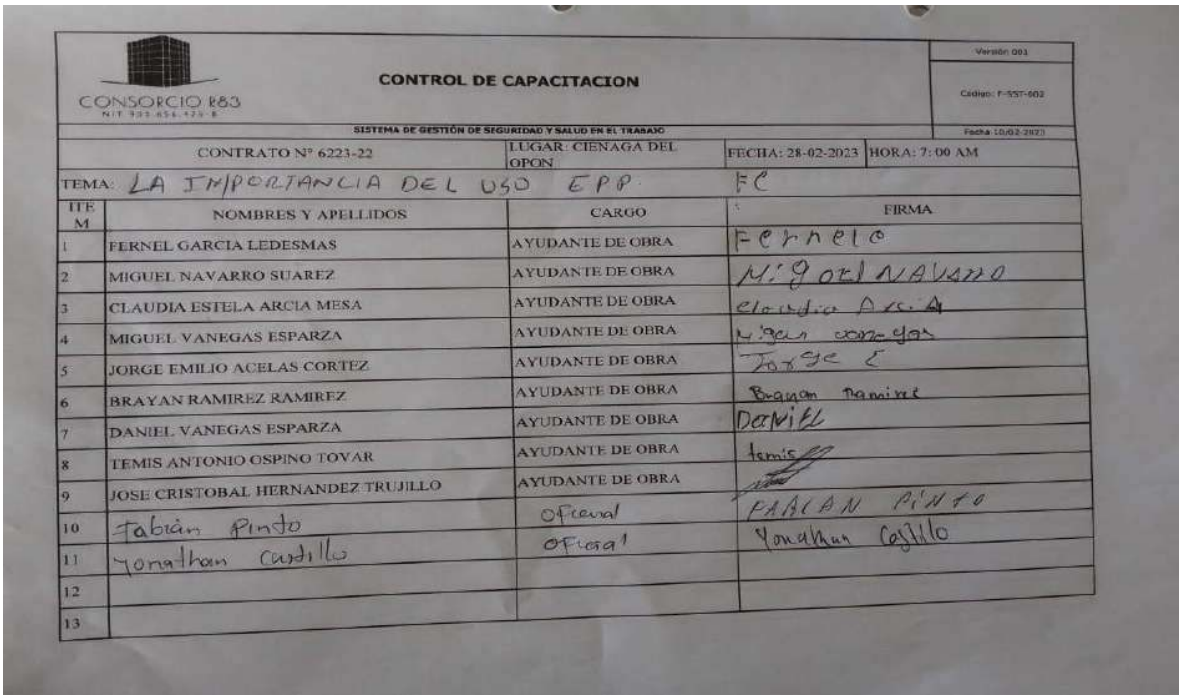

CONSORCIO 883
NIT 901.456.429-8


CONTROL DE CAPACITACION

Versión: 001
Código: F-SST-002
Fecha: 10/02/2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 28-02-2023	HORA: 7:00 AM
TEMA: LA IMPORTANCIA DEL USO EPP		FC	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernel G
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	M. Gabriel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabián Pinto	Oficial	FABIAN PINTO
11	Yonathan Castillo	Oficial	Yonathan Castillo
12			
13			

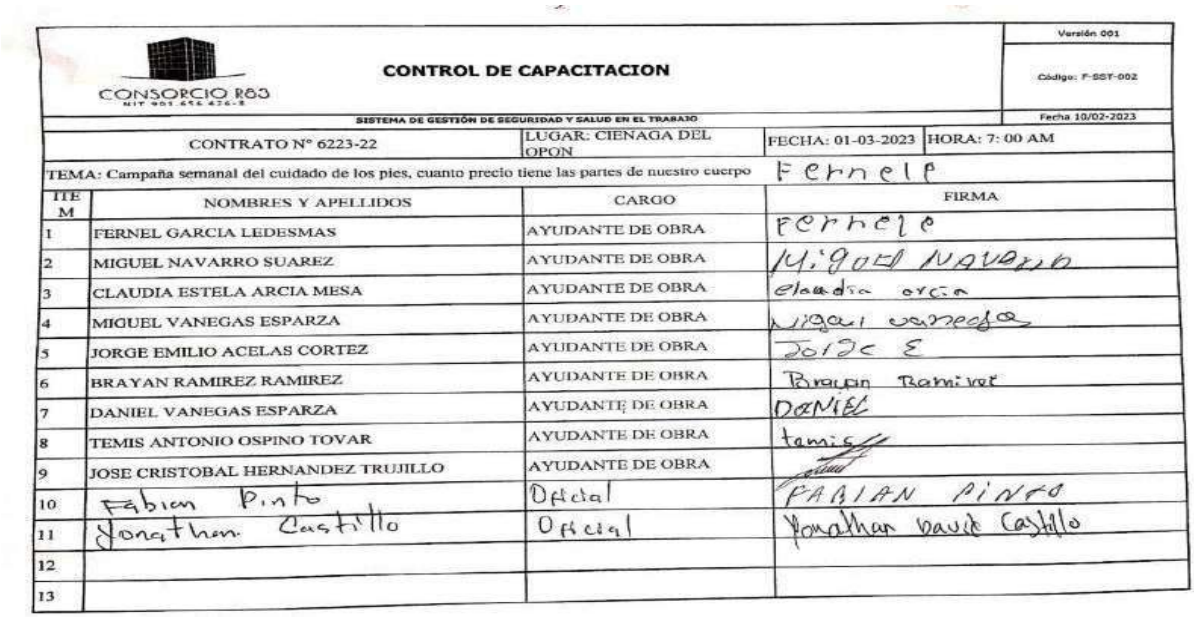

CONSORCIO R83

NIT 901 456 476-5

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 01-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal del cuidado de los pies, cuanto precio tiene las partes de nuestro cuerpo Fernel F

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernel F
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	M. NAVARRO
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	claudia arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	Oficial	FABIAN PINTO
11	Jonathon Castillo	Oficial	Jonathan David Castillo
12			
13			

CONSORCIO R83

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 02-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal del cuidado de los pies, cuanto precio tiene las partes de nuestro cuerpo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernel
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temiss
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	Oficial	FABIAN PINTO
11	Yonaton Castillo	Oficial.	Yonathan david castillo
12			
13			

CONSORCIO R83
NIT 901.455.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 03-03-2023	HORA: 7: 00 AM
TEMA: Campaña semanal del cuidado de los pies; cuanto precio tiene las partes de nuestro cuerpo			

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernel
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	Oficial	Fabian Pinto
11	Yonathan David Castillo	Oficial	Yonathan David Castillo
12			
13			

CONSORCIO R83
NIT 901.456.476-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 04-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal del cuidado de los pies, cuanto precio tiene las partes de nuestro cuerpo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	M.Jose Navarro Suarez
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	M.Jose Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	Oficial	FABIAN PINTO
11	Yonathan David Castillo	Oficial	Yonathan david castillo
12			
13			

CONSORCIO R83

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 07-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Yo me cuido, tú me cuidas, SOY UN ANGEL QUE CUIDA MI VIDA Y LA DE MI COMPAÑERO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernel
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	M. Guel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	Oficial	Fabian Pinto
11	Yonathan Castillo	Oficial	Yonathan Castillo
12			
13			

CONSORCIO R83

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 06-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Yo me cuido, tú me cuidas, SOY UN ANGEL QUE CUIDA MI VIDA Y LA DE MI COMPAÑERO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernel
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	M. Guel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Yonathan Castillo	Oficial	Yonathan Castillo
11			
12			
13			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-6

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 08-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Yo me cuido, tú me cuidas, SOY UN ANGEL QUE CUIDA MI VIDA Y LA DE MI COMPAÑERO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernele
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian. Pinto.	Oficial.	FABIAN PINTO
11	Yonathan Castillo	Oficial.	Yonathan Castillo
12	Jean Carlos Zambrano V	Ayudante Obra	
13			

CONSORCIO P83
NIT 901.658.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002


Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 09-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Yo me cuido, tú me cuidas, SOY UN ANGEL QUE CUIDA MI VIDA Y LA DE MI COMPAÑERO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Rotivatu
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel NAVARRO
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	Oficial	FABIAN PINTO
11	Yonathan Castillo	Oficial	Yonathan Castillo
12	Jean Carlos Zambrano.V		
13			

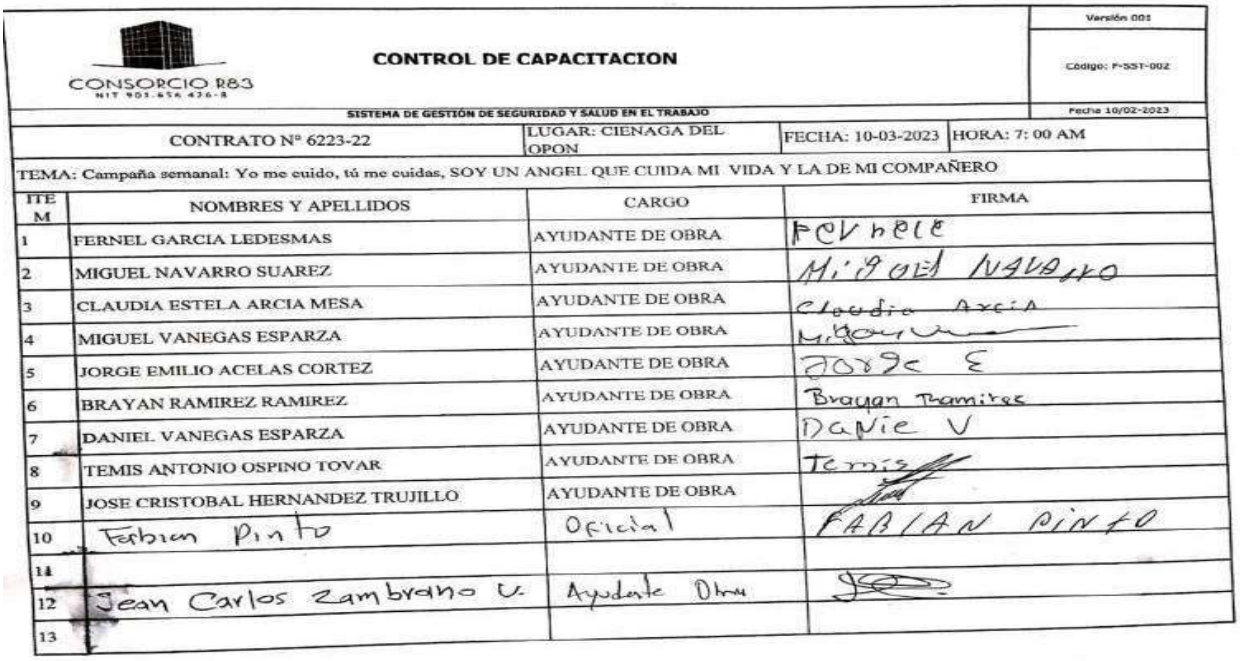

CONSORCIO R83
NIT 901-654.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 10-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Yo me cuido, tú me cuidas, SOY UN ANGEL QUE CUIDA MI VIDA Y LA DE MI COMPAÑERO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	FGV hele
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Danie V
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Fabian Pinto	Oficial	FABIAN PINTO
11			
12	Jean Carlos Zambrano U.	Ayudante Obra	
13			

CONSORCIO R83
NIT 901.616.470-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	FECHA: 11-03-2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Yo me cuido, tú me cuidas, SOY UN ANGEL QUE CUIDA MI VIDA Y LA DE MI COMPAÑERO

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	FERNEL GARCIA LEDESMAS	AYUDANTE DE OBRA	Fernele
2	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel NAVARRO
3	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
4	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
5	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
6	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
7	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
8	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
9	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
10	Yonatan Castillo	Oficial Obra	Yonathan Castillo
11	Fabian Pinto	Ayudante Obra	FABIAN PINTO
12	Jean Carlos Zambrano V	Ayudante Obra	
13			

CONTROL DE CAPACITACION

CONSORCIO R83 NIT 901.656.474-8

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	13-mar-23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de evitar las bromas en el lugar de trabajo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	Fabian Pinto
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez NS
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
14			

CONTROL DE CAPACITACION

CONSORCIO R83 NIT 901.656.474-8

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	14-Marzo/2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Uso Adecuado de las mascarillas para material particulado

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	Fabian Pinto
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
14			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	15 marzo 2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Divulgacion de la Ficha de seguridad del ACPM

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	MIGUEL NAVARRO
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge C
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temi
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J.Z.V
14			

CONSORCIO R83

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	16 marzo 2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Divulgacion de la Ficha de Seguridad del cemento

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Zambrano
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
14			

CONSORCIO R83
NIT 901.654.427-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	17 marzo/2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La importancia de la clasificacion de los Residuos Solidos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	MIGUEL NAVARRO
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	MIGUEL
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel V
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	tEMIS
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean carlos Zambrano
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez.
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J ZV
14			

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	18 marzo/2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Campaña Pasos Seguros

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	MIGUEL NAVARRO
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Mi
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel V
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Zambrano
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J ZV
14			

18 DE 23

CONTROL DE CAPACITACION

CONSORCIO R83

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	21 marzo /2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Responsabilidad del trabajador frente al uso Adecuado EPP.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	Fabian Pinto
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z.V
14			

CONSORCIO R83

NIT 901.414.476-5

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	22 Marzo/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Importancia de Identificar los peligros en cada una de las Actividades

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel NAVARRO
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	M
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Incapacidad x Licencia
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	T
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z. V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J ZV
14			Victor Manuel Gomez

CONTROL DE CAPACITACION

CONSORCIO R83 NIT 901.616.426-8

Versión 001 | Código: F-SST-002 | Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	23/03/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Manejo de Residuos Solidos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	MIGUEL NAVARRO
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia ArciA
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	MVE
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Incapacidad
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
14	Victor Gomez	Ayudante	Victor Manuel Gomez

CONSORCIO R83 NIT 901.616.426-8


Código: F-SST-002 | Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	24/03/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del orden y Aseo en el sitio de trabajo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	MIGUEL NAVARRO
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia ArciA
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	MVE
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Incapacidad
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	DANIEL
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	Yonathan
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
14	Victor Manuel Gomez	Ayudante	Victor Manuel Gomez

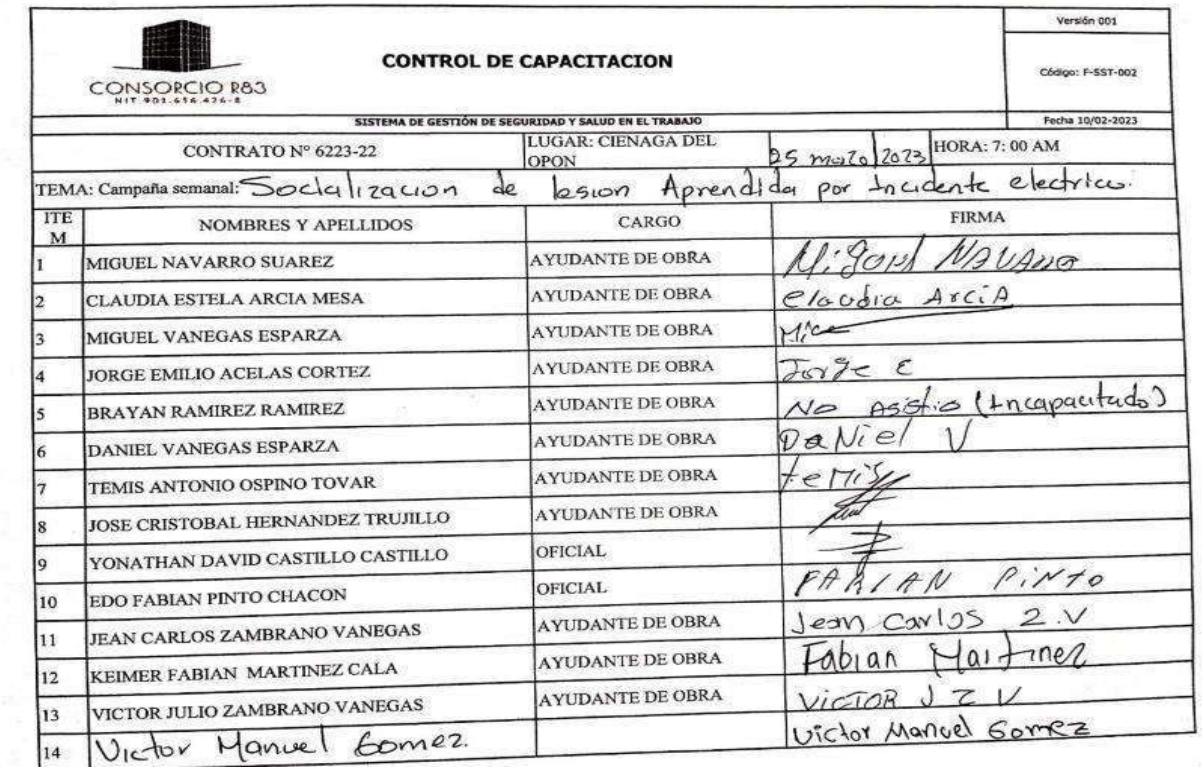

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	25 marzo 2023	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Socializacion de lesion Aprendida por Incidente electrico.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Mice
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	No asistio (Incapacitado)
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel V
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO	OFICIAL	
10	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	FABIAN PINTO
11	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
12	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
14	Victor Manuel Gomez.		Victor Manuel Gomez

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

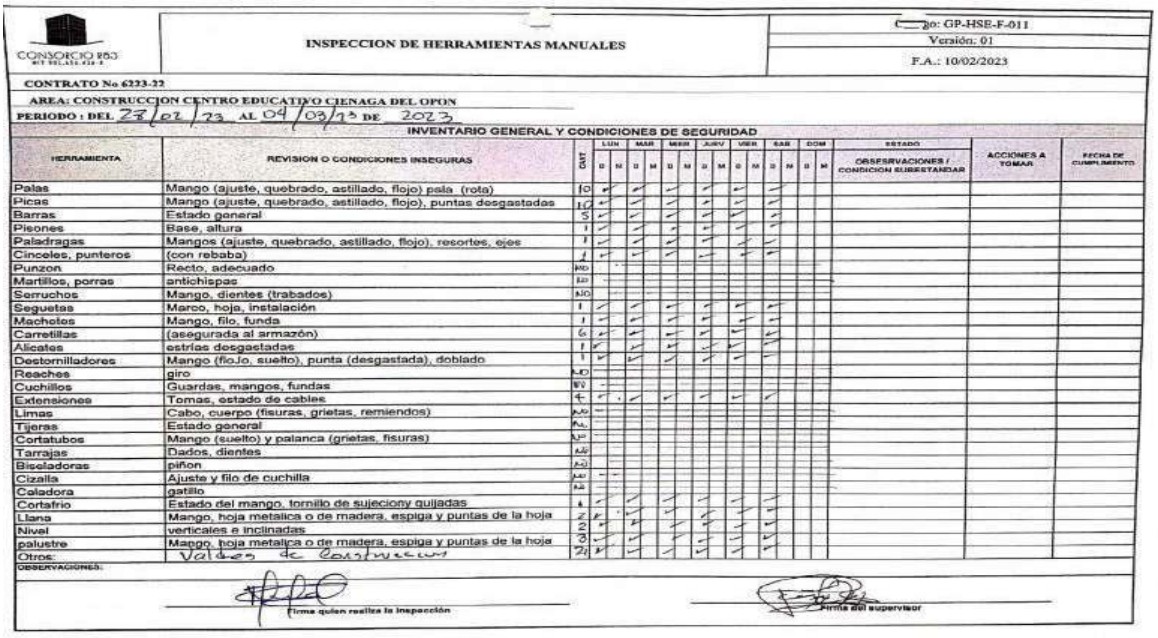

CONSORCIO 883

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 28/02/23 **AL** 04/03/23 **DE** 2023


INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT.	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIER D	MIER M	JUEV D	JUEV M	VIER D	VIER M	SAB D	SAB M	DOM D	DOM M	ESTADO OBSERVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10																	
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10																	
Barras	Estado general	5																	
Pisones	Base, altura	1																	
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1																	
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1																	
Punzon	Recto, adecuado	NO																	
Martillos, porras	antichispas	NO																	
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NO																	
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1																	
Machetes	Mango, filo, funda	1																	
Carretillas	(asegurada al armazón)	6																	
Alicates	estrias desgastadas	1																	
Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado	1																	
Reaches	giro	NO																	
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NO																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4																	
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NO																	
Tijeras	Estado general	NA																	
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NO																	
Tarrajas	Dados, dientes	NO																	
Biseladoras	piñon	NO																	
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NO																	
Caladora	gatillo	NO																	
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujecion y quijadas	1																	
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2																	
Nivel	verticales e inclinadas	2																	
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3																	
Otros:	Valdes de Construccion	21																	

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

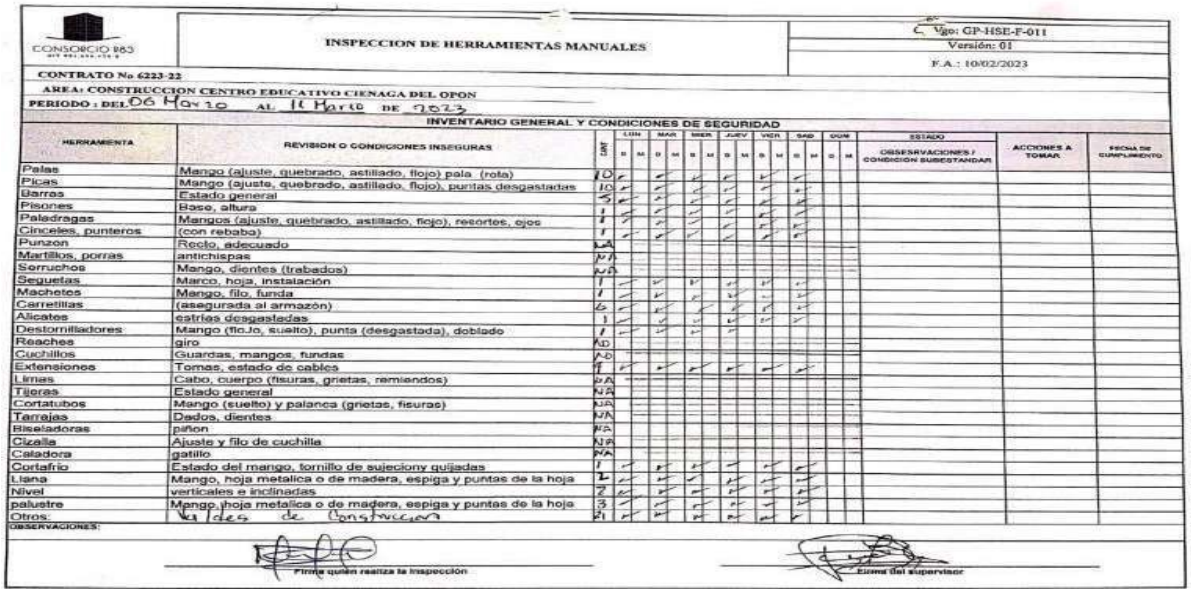

CONSORCIO 883

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 06 Marzo **AL** 11 Marzo **DE** 2023


INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT.	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIER D	MIER M	JUEV D	JUEV M	VIER D	VIER M	SAB D	SAB M	DOM D	DOM M	ESTADO OBSERVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10																	
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10																	
Barras	Estado general	5																	
Pisones	Base, altura	1																	
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejos	1																	
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1																	
Punzon	Recto, adecuado	NA																	
Martillos, porras	antichispas	NA																	
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NO																	
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1																	
Machetes	Mango, filo, funda	1																	
Carretillas	(asegurada al armazón)	6																	
Alicates	estrias desgastadas	1																	
Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado	1																	
Reaches	giro	NO																	
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NO																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4																	
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NA																	
Tijeras	Estado general	NA																	
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NA																	
Tarrajas	Dados, dientes	NA																	
Biseladoras	piñon	NA																	
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NA																	
Caladora	gatillo	NA																	
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujecion y quijadas	1																	
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2																	
Nivel	verticales e inclinadas	2																	
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3																	
Otros:	Valdes de Construccion	21																	

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

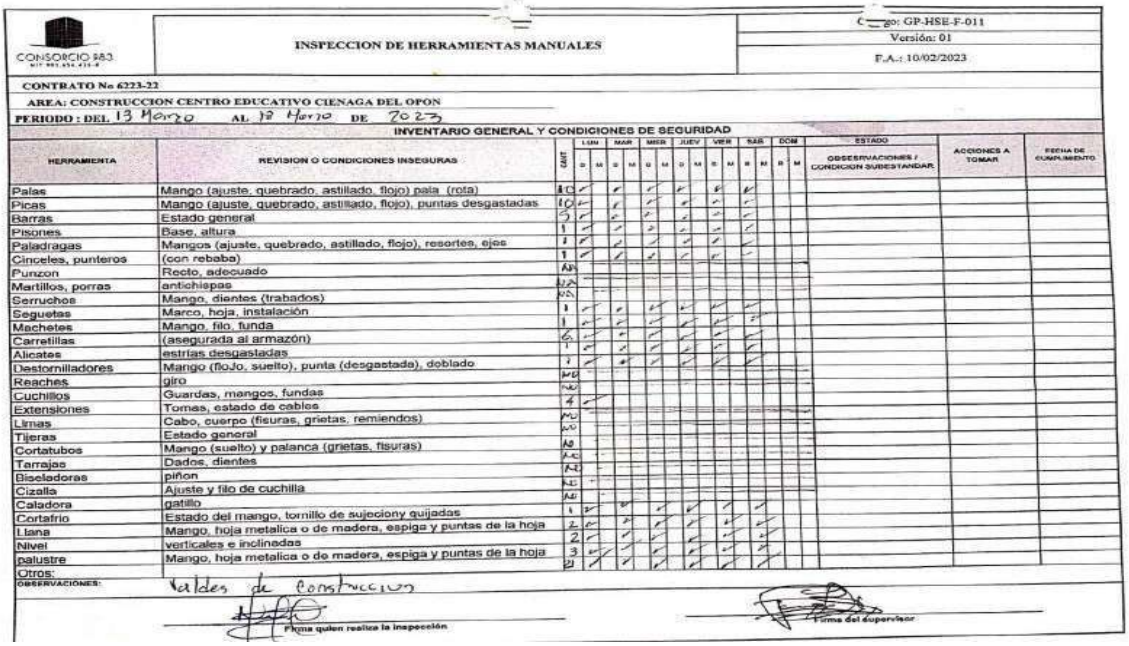

CONSORCIO SBJ

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 13 Marzo **AL** 18 Marzo **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIER D	MIER M	JUEV D	JUEV M	VIER D	VIER M	SAB D	SAB M	DOM D	DOM M	ESTADO OBSERVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon	Recto, adecuado	AN																	
Martillos, porras	antichispas	NA																	
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NO																	
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrias desgastadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro	NO																	
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NO																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	✓																
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NO																	
Tijeras	Estado general	NO																	
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NO																	
Terrajas	Dados, dientes	NO																	
Biseladoras	piñon	NO																	
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NO																	
Caladora	gatillo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujecion y quijadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:																			

OBSERVACIONES: Kaldes de construccion

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

CONSORCIO R&S

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OFON

PERIODO : DEL 21 Mayo **AL** 24 Mayo **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIER D	MIER M	JUEV D	JUEV M	VIER D	VIER M	SAB D	SAB M	DOM D	DOM M	ESTADO OBSERVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon	Recto, adecuado	NO																	
Martillos, porras	antichispas	NO																	
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NO																	
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (flojo, suelto), punta (desgastada), doblado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro	NO																	
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NO																	
Extensiones	Tomas, estado de cables	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NO																	
Tijeras	Estado general	NO																	
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NO																	
Tarrajas	Dados, dientes	NO																	
Biseladoras	piñon	NO																	
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NO																	
Caladora	gatillo	NO																	
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujecion y quijadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	20	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:																			

OBSERVACIONES: Valero de Construccion

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

CONSORCIO RSS

NOMBRE	Yesnel García Ledesmas	DOCUMENTO IDENTIDAD	91.446.762
CARGO	Ayudante	LUGAR DE TRABAJO	Cienaga del opón
RESPONSABLE ENTREGA	Lina Ramos		

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR – ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	DOTACIÓN: CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO: ¿Cuál?	FIRMA DEL TRABAJADOR
1-Feb-2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N/A	—	Yesnel
1-Mar-2023	1	✱	✱	✱	✱	—	—	—	—	—	Yesnel

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

CONSORCIO RSS

NOMBRE	Claudia Arcia Ayala	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.050.544.297
CARGO	Ayudante	LUGAR DE TRABAJO	Cienaga del opón
RESPONSABLE ENTREGA	Lina Ramos		

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR – ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	DOTACIÓN: CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO: ¿Cuál?	FIRMA DEL TRABAJADOR
01-Feb-2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N/A	—	Claudia Arcia

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.



ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/06/2021

NOMBRE	Miguel Navarro Suarez	DOCUMENTO IDENTIDAD	91.445.073
CARGO	Ayudante	LUGAR DE TRABAJO	Cienaga del Opon
RESPONSABLE ENTREGA	Lina Romero		

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL — GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCION	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	DOTACIÓN — CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUAL?	FIRMA DEL TRABAJADOR
1-Febrero-2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N/A	—	M.º Gol NAVARRO
21-Feb-2023	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	M.º Gol NAVARRO
21 Marzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tapa oidos Insercion	M.º GOL/NAVARRO
04/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	M. GOL NAVARRO

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declara haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

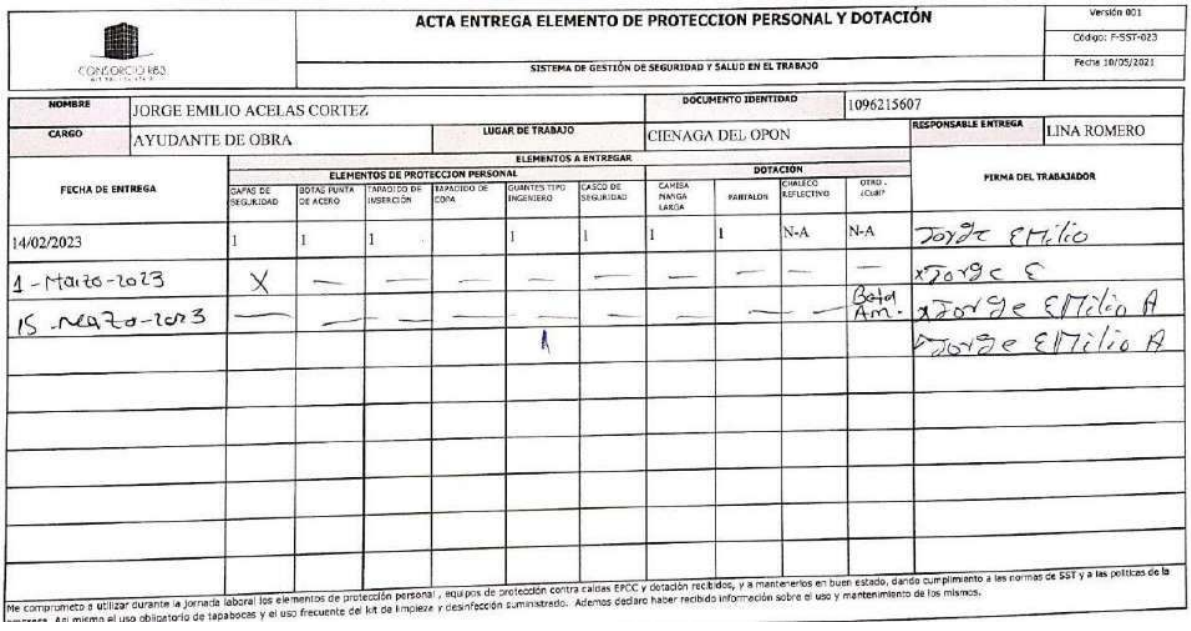

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	DOCUMENTO IDENTIDAD	1096215607
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON
RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO		


FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL — GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	DOTACION — CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUAL?	FIRMA DEL TRABAJADOR
14/02/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	Jorge Emilio
1-Marzo-2023	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jorge E
15-Marzo-2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Botas Am.	Jorge Emilio A
					1						Jorge Emilio A

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

CONSORCIO R83	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-023
		Fecha 10/05/2021

NOMBRE	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR						DOCUMENTO IDENTIDAD				9161846	
CARGO	AYUDANTE DE OBRA			LUGAR DE TRABAJO			CIENAGA DEL OPON				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR	
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN					
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿Cual?		
14/02/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	Temis	
21-Feb-2023	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	Temis	
25. Marzo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Temis	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

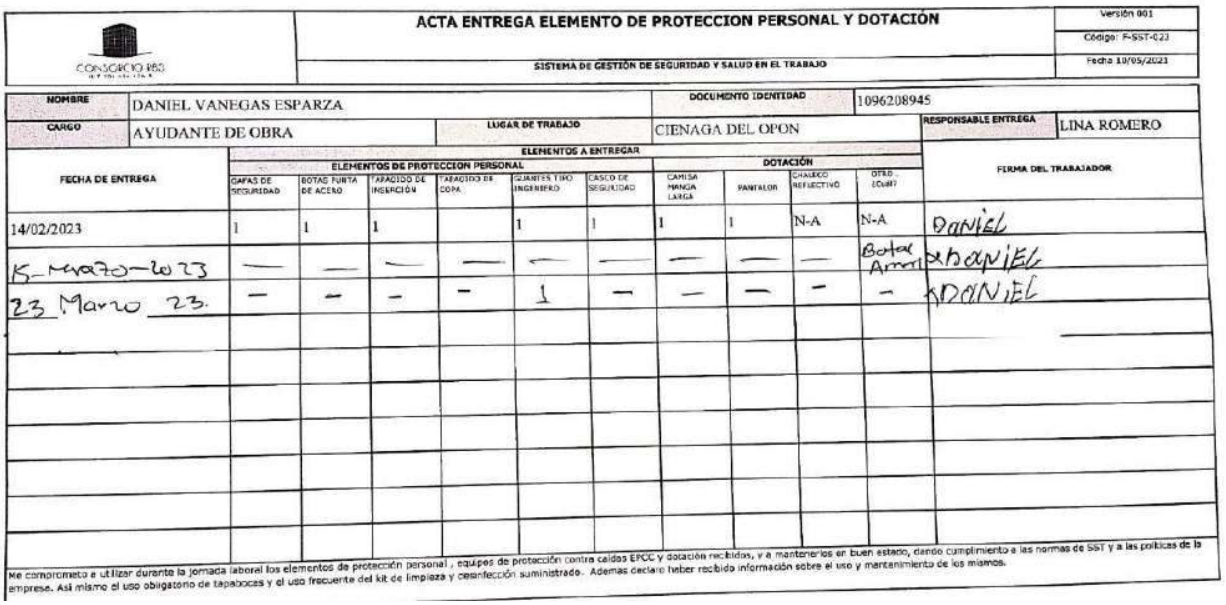

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	DANIEL VANEGAS ESPARZA	DOCUMENTO IDENTIDAD	1096208945		
CARGO	AYUDANTE DE OBRA	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				FIRMA DEL TRABAJADOR
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPABOCAS DE INSERCION	TAPABOCAS DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO (Cual?)	
14/02/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	DANIEL
5-Mayo-2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bota Amarilla	DANIEL
23 Marzo 23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	DANIEL

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

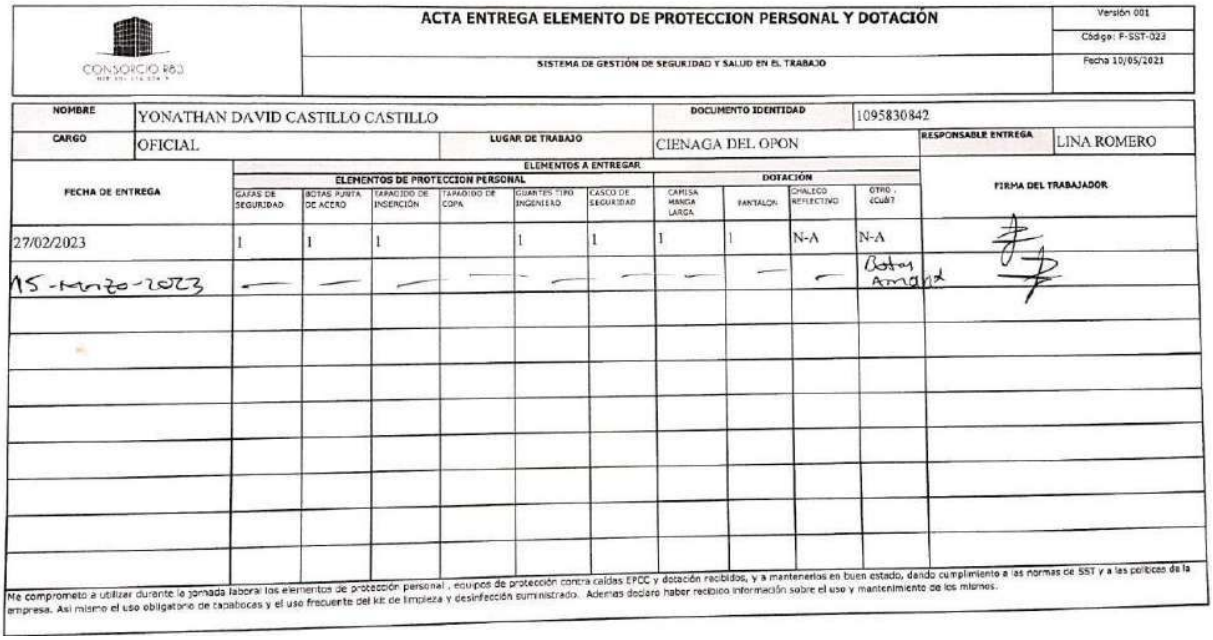

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN


CONSORCIO R&J

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	YONATHAN DAVID CASTILLO CASTILLO						DOCUMENTO IDENTIDAD			1095830842	
CARGO	OFICIAL						LUGAR DE TRABAJO			CIENAGA DEL OPON	RESPONSABLE ENTREGA: LINA ROMERO
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				FIRMA DEL TRABAJADOR
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPACIDO DE INSERCIÓN	TAPACIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUAL?	
27/02/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	
15-marzo-2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Botas Amarillas	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

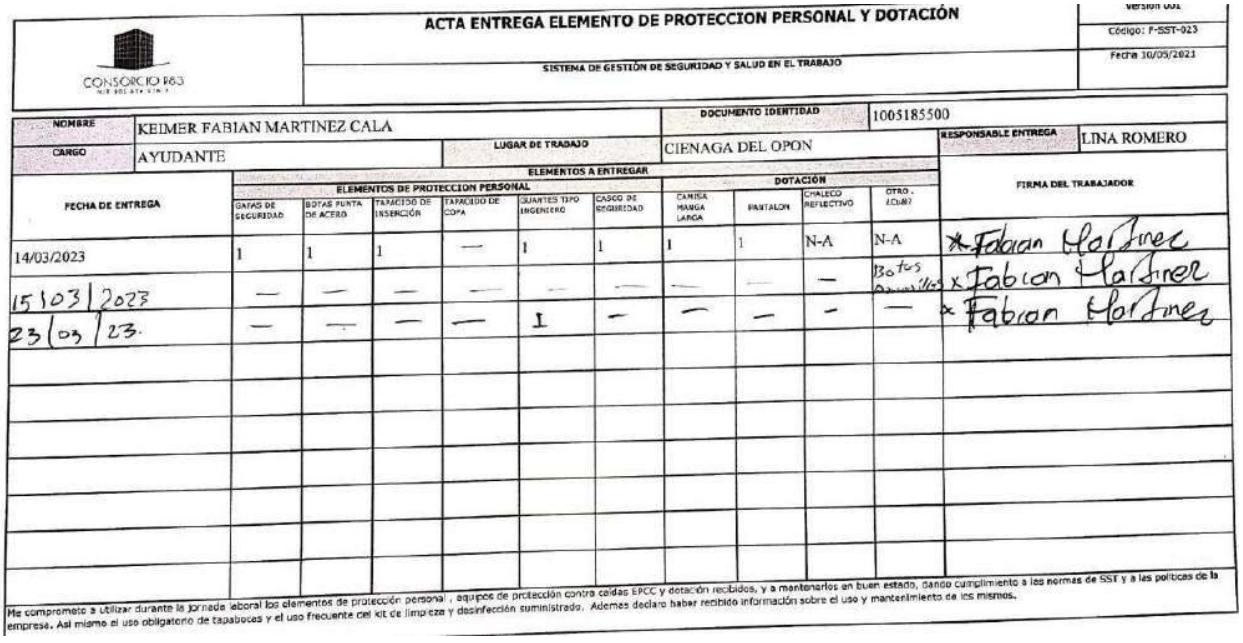

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN


CONSORCIO R&J

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA						DOCUMENTO IDENTIDAD			1005185500	
CARGO	AYUDANTE						LUGAR DE TRABAJO			CIENAGA DEL OPON	RESPONSABLE ENTREGA: LINA ROMERO
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				FIRMA DEL TRABAJADOR
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPACIDO DE INSERCIÓN	TAPACIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUAL?	
14/03/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	* Fabian Martinez
15/03/2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Botas Amarillas	x Fabian Martinez
23/03/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	x Fabian Martinez

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

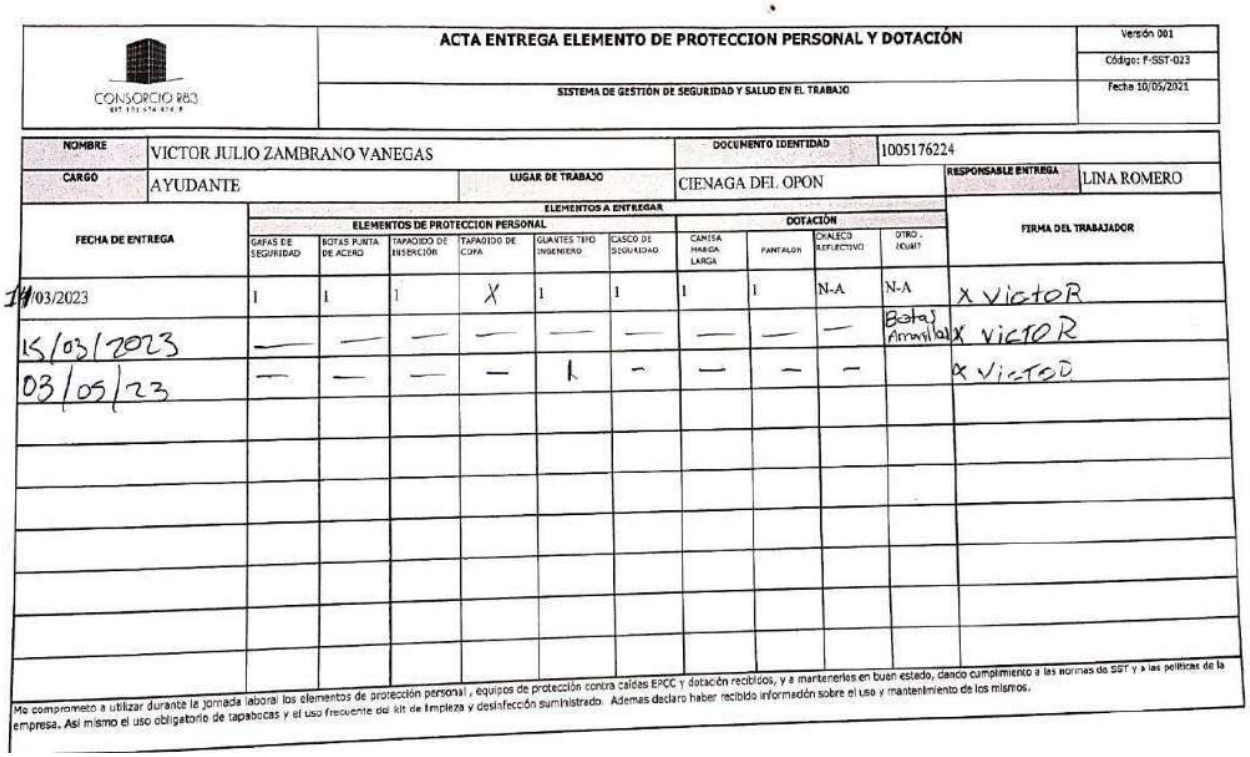

CONSORCIO R83

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS			DOCUMENTO IDENTIDAD	1005176224			RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON					

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUAL?	
14/03/2023	1	1	1	X	1	1	1	1	N-A	N-A	X VICTOR
15/03/2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bota Amarilla	X VICTOR
03/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—		X VICTOR

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal, equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

INSPECCION LOCATIVA

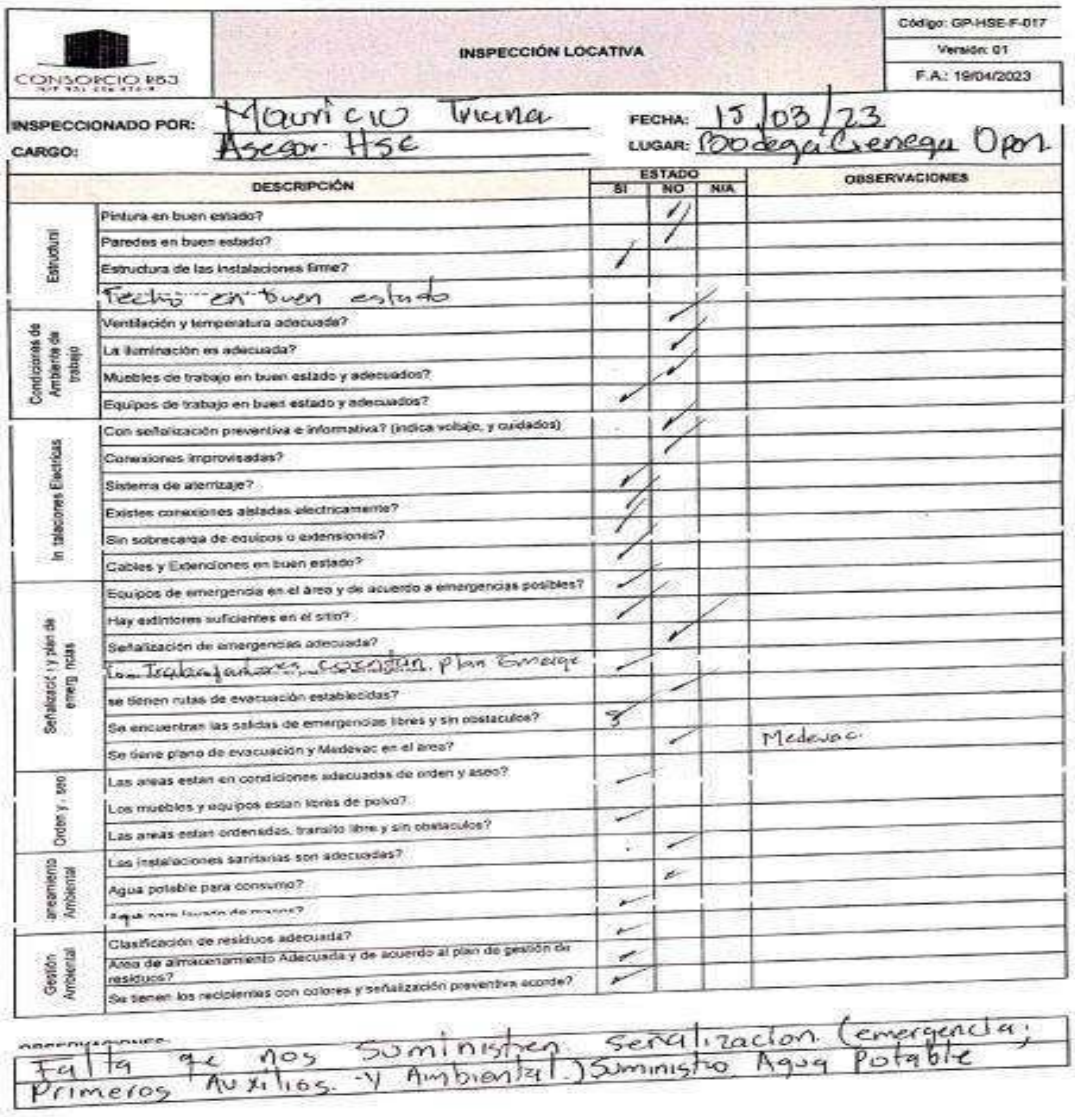

CONSORCIO 953

INSPECCIÓN LOCATIVA

Código: GP-HSE-F-017
Versión: 01
F.A.: 19/04/2023

INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana
CARGO: Asesor HSE
FECHA: 15/03/23
LUGAR: Bodega Ciénega Opon

	DESCRIPCIÓN	ESTADO SI	ESTADO NO	ESTADO NA	OBSERVACIONES
Estructura	Pintura en buen estado?		/		
	Paredes en buen estado?	/			
	Estructura de las instalaciones firme?				
	Techo en buen estado				
Condiciones de Ambiente de trabajo	Ventilación y temperatura adecuada?		/		
	La iluminación es adecuada?		/		
	Muebles de trabajo en buen estado y adecuados?		/		
	Equipos de trabajo en buen estado y adecuados?	/			
Instalaciones Eléctricas	Con señalización preventiva e informativa? (indica voltaje, y cuidados)		/		
	Conexiones improvisadas?		/		
	Sistema de aterrizaje?	/			
	Existen conexiones aisladas electricamente?	/			
	Sin sobrecarga de equipos o extensiones?	/			
	Cables y Extenciones en buen estado?	/			
Señalización y plan de emergencias	Equipos de emergencia en el área y de acuerdo a emergencias posibles?	/			
	Hay extintores suficientes en el sitio?	/		/	
	Señalización de emergencias adecuada?				
	Se tienen rutas de evacuación establecidas?	/		/	
	Se encuentran las salidas de emergencias libres y sin obstaculos?	3			
	Se tiene plano de evacuación y Medevac en el area?		/		Medevac
Orden y aseo	Las areas estan en condiciones adecuadas de orden y aseo?	/			
	Los muebles y equipos estan libres de polvo?	/			
	Las areas estan ordenadas, transito libre y sin obstaculos?		/		
Saneamiento Ambiental	Las instalaciones sanitarias son adecuadas?		/		
	Agua potable para consumo?	/			
	Agua para lavado de manos?	/			
Gestión Ambiental	Clasificación de residuos adecuada?	/			
	Area de almacenamiento Adecuada y de acuerdo al plan de gestión de residuos?	/			
	Se tienen los recipientes con colores y señalización preventiva acorde?	/			

OBSERVACIONES:
Falta de nos suministren señalizacion (emergencia, Primeros Auxilios, y Ambiental) Suministro Agua Potable

INSPECCION BOTIQUIN

CONSORCIO 883

INSPECCION DE BOTIQUIN

Código: GP-HSE-F-015
Versión: 01
F.A.: 18/04/2023

CONTRATO No. 623-32 FECHA: 23/03/23 ING RESIDENTE: Juan Navarro
AREA: Cienego Opon HORA: 7:53 am INSPECTOR HSE: Mauricio Triana

ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE	NO CUMP	FECHA VENCE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
MATERIAL DE CURACIÓN		✓			
Algodón		✓			Contaminado
Gasa		.			
Curitas	✓				
Vendas					
Aplicadores Asépticos	✓				
Esparadrapo		✓			
Micropore		✓			
suero fisiologico		✓			
Apositos Oculares		✓			
MEDICAMENTOS					
Suero Rehidratante		✓			
MATERIAL DE DESINFECCIÓN					
Agua Oxigenada		✓			
Alcohol Antiseptico		✓			
Isodine Espuma	✓		05/03/24	1	
Isodine Solución	✓		07/05/24	1	
Jabon Bactericida		✓			
Toallas Absobentes		✓			
INSTRUMENTAL					
Guantes Quirurgicos	✓				
Tijeras	✓				
Bajalenguas Asépticas		✓			
Tapa bocas					
Inmovilizadores		✓			
Lapicero	✓				

OBSERVACIONES: Hay realizar la reposicion y/o suministro de los elementos del Botiquin de primeros Auxilios

Responsable HSE: _____

Realizó	Revisó	Aprobó
LINA ROMERO	JUAN NAVARRO	BERTA OCHOA
Profesional HSEQ	Ing. Residente	Representante Legal

INSPECCION EXTINTOR

CONSORCIO RBO	INSPECCION DE EXTINTOR	Código: GP-HSE-F-003 Versión: 01 F.A.: 10/02/2023
CONTRATO No. 6223-22	**FECHA:** 23/03/23	**ING RESIDENTE:** JUAN NAVARRO
AREA: CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN - CIENAGA DEL OPON		**HSEQ:** LINA ROMERO
TIPO DE EXTINTOR: MULTIPROPOSITO		**CAPACIDAD:** 10 LBS
FECHA DE RECARGA:		

1. ASPECTOS A REVISAR	S/C	N/C	N/A	OBSERVACION
El extintor se encuentra ubicado adecuadamente	✓			
El extintor se encuentra señalizado y esta identificado por el personal del area		✓		
El personal esta capacitado para el manejo del equipo extintor		✓		
El extintor esta cargado	✓			
La etiqueta es legible y la fecha de carga esta vigente	✓			
El manometro indica la presion normal del extintor	✓			
Boquilla en buen estado	✓			
El pin esta en su sitio	✓			
Abrazadera del pin en su sitio y en buen estado	✓			
El cilindro esta en buenas condiciones (sin abulladoras y con pintura)	✓			
La manguera esta en buenas condiciones	✓			
Manija de transporte se encuentra en buen estado	✓			
Elemento extintor es acorde al riesgo del area de trabajo	✓			
La capacidad del elemento extintor es suficiente según el riesgo	✓			
Hay suficientes extintores en el area	✓			
El personal conoce la ubicación de los extintores del area	✓			

S/C: Se Cumple N/C: No se Cumple N/A: No Aplica

OBSERVACIONES:	REALIZADO POR:
Falta Señalizacion en Obra.	Mauricio Triana D.

Realizó:	Revisó:	Aprobó:
LINA ROMERO Profesional HSEQ	JUAN NAVARRO Ing. Residente	BERTA OCHOA Representante Legal

8.4 AUSENTISMO LABORAL

Durante el período no se presentó ausentismo laboral.

8.5 ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante el período se presentó un incidente eléctrico por contacto de una de las cerchas o columnas en varilla, con una de las redes de baja tensión que alimenta a una de las viviendas del sector, el acto inseguro y la condición insegura no deja daños o pérdidas humanas ni afectación al personal de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES





CHARLA DE INICIO DE TURNO LIDERADO POR EL MAESTRO DE OBRA LIDERADO POR EL MAESTRO DE OBRA, DONDE SE LES DIVULGA LOS RIESGOS A LOS CUALES ESTAN EXPUESTOS






REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL





ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES

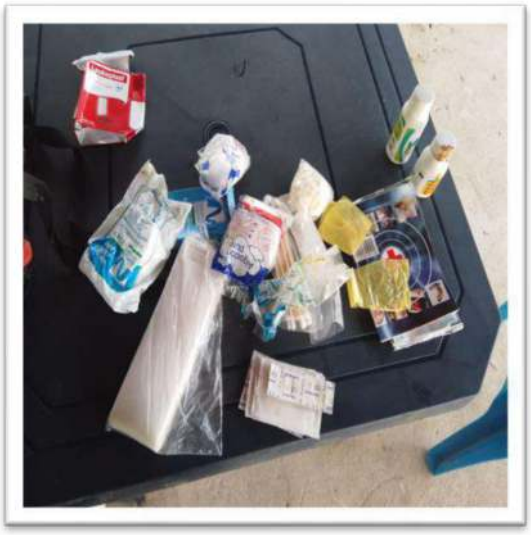



INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA





SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREA

8.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo comprendido del 27 de febrero del 2023 al 26 marzo de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus evidencias

Esta interventoría realizó el continuo seguimiento técnico al Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) para el presente informe de interventoría del contrato de obra No. 6223-22 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante este corte de ejecución del proyecto, se ha dado cumplimiento a la implementación del mismo, realizando las siguientes actividades:

La interventoría realizo revisión de la documentación de los vehículos y máquinas que operan en el área intervenida por el contratista con el fin de verificar certificado técnico-mecánica garantizando que los vehículos y maquinaria pesada cumplieran con los pre operacionales y toda la reglamentación ambiental. A La fecha continúan con los mismo vehículos que apoyan en el proceso de suministro de material al proyecto.



Rastrack S.A.S.
Administración Satelital de Vehículos

CERTIFICACION

RASTRACK S.A.S. con NIT 830.126.626-3 certifica que la empresa GRUPO J8 S.A.S. con identificación No. 900286469, posee dispositivo de Monitoreo y Localización GPRS en la maquina relacionada a continuación.

CHASSIS	CLASE	MARCA	MOTOR	SERIAL GPS
CAT0420DHFDP22632	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	CR515752	RAS9CCK8741

CHASSIS	INSTALACION	IMEI GPS	TIPO DE DISPOSITIVO	ORIGEN DEL GPS
CAT0420DHFDP22632	Instalada el 15-06-2021	359632104383143	GPRS	IMPORTADO


Estimado Cliente para efectos de movilización de maquinaria amarilla recuerde validar antes de iniciar el viaje que su equipo de monitoreo se encuentra reportando y que su máquina cuente con la placa de identificación de monitoreo Rastrack.

Se expide el día jueves, 26 de enero de 2023

Cordialmente

Rastrack S.A.S

Alejandro Ayala Perilla
Servicio al cliente
Rastrack S.A.S



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
No. 77535

No. DE REGISTRO MC038303	MARCA CATERPILLAR	LINEA 420D	AÑO MODELO 2005
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA	No. SERIE CAT0420DHFDP22632	
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR CR515752	MODELO NEUMATICOS	
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS PESO 7150 Kg	ALTO 3300 mm	ANCHO 2380 mm	LARGO 9300 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O RAZON SOCIAL GRUPO J8 SAS		IDENTIFICACION NIT 900.286.469	



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) IDENTIFICACION
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
INSP MCPAL TTOYTTE SAN GIL

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
17-05-2016	25-01-2021	
ORIGEN IMPORTACIÓN	DOC. IMPORTACION 0520080.00028118	FECHA DE LEVANTE 30/01/2008

TM02000034752

DOCUMENTOS DE LA RETROEXCAVADORA



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA REVITEC S.A.
NIT: 900088581
No. de Certificado de Acreditación: 09-CIN-080-001
Fecha de expedición: 2022/02/22
Fecha de vencimiento: 2023/02/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UVE477	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	MODELO:	1961
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	2800	NRO. MOTOR:	11052743
NRO. CHASIS:	1HJ0204	VIN:	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	AZUL VERDOSO		

NOMBRE PROPIETARIO: SILVIA J. JAIMES O.

FIRMA DEL RESPONSABLE
RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR



DOCUMENTOS DE LA VOLQUETA

• Esta interventoría realizó continuo seguimiento para este periodo a la entrega de elementos de protección personal que ingresa nuevo al proyecto, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA. de igual manera se evidencia los soportes en la gestión SST.

• Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras; también se evidencia en obra la instalación de la valla informativa y cerramiento de la obra.

EXCAVACIÓN

Durante el periodo comprendido del 27 de febrero al 26 de marzo de 2023, se realizaron actividades con referencia a este programa, haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización y otra parte del material se le dono a la comunidad de ciénaga del opón.

TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo comprendido del 27 de febrero al 26 de marzo de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido del 27 de febrero al 26 de marzo de 2023 no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ubicación del extintor en el área de trabajo



Instalación de camilla rígida en bodega



Punto ecológico en sitio de trabajo



Cerramiento área perimetral de la obra

- Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico y lo establecido en el PMA.

- Se revisa las quejas presentadas por la comunidad, sin embargo para el presente informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL

El contratista presenta a la interventoría el seguimiento a todas las actividades sociales de la construcción del centro educativo del corregimiento de Ciénaga del Opón.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el presente periodo ya mencionado se realizaron las siguientes actividades de la gestión social por parte del contratista de obra:

- Atender las preguntas de la comunidad, sin embargo, no se ha tenido inconvenientes con los mismos y a la fecha se está ejecutando el proyecto sin novedad alguna.



NATALIA RUEDA SERRANO

SST Y AMBIENTAL DE

INTERVENTORÍA FZ

INGENIERIA SE SAS

9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

I. INFORMACION GENERAL			
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 6231-22		
OBJETO	"**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRCUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**		
CONTRATISTA Y NIT	FZ INGENIERIA SE SAS 901.036.726-2		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ		
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES		
FECHA DE ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2022		
FECHA DE SUSPENSION	N/A		
FECHA DE TERMINACION	26 DE JUNIO DE 2023		
PLAZO TRANSCURRIDO	3 MESES	**PORCENTAJE**	42,85%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR POR PAGAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		

SALDO POR EJECUTAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	22 DE MARZO DE 2023

9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA

PREACTA DE RECIBO PARCIAL N°1							
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA							
CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22							
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**		$ 356.261.026,7	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1**		ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**		0,00	Valor preacta N.1:	$ 23.655.732,17	Valor actas:	$ 23.655.732,17
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES		Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. LUISA	**FECHA DE**	27/12/2022		Neto a Pagar:	$ 23.655.732,17	VALOR NETO	$ 23.655.732,17

FERNANDA OROZCO MOLINA	**INICIO :**					EJECUTADO	
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**		26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 332.605.294,49
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**			% EJECUTADO	6,64%	% EJECUTADO	6,64%
CONDICIONES ORIGINALES				**ACTA 1**		**ACUMULADO**	

N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00 %*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*6,64%*	$ 19.878.766,53	6,64%	**$ 19.878.766,53**
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 3.776.965,64	IVA 19%	**$ 3.776.965,64**
	VALOR TOTAL			**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°1**	**$ 23.655.732,17**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 23.655.732,17**

9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2022	27	12	2022	00:00	26	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FZ INGENIERIA SE S.A.S	NIT: 901.036.726-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA	NIT: 890.201.900-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/12/2022**	**26/07/2026**	**$35,626,102.67**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ACTA DE INICIO, DE FECHA DE FIRMA 27/12/2022, DEL CONTRATO N. 6231-22.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 27/12/2022

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****936,937.00	$ ******28,000.00	$ *****183,338.00	$ *********1,148,275.00	$ ******178,130,513.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2022	27	12	2022	00:00	26	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
FZ INGENIERIA SE S.A.S			**NIT: 901.036.726-2**
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA			**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACION DE GARANTIAS	Aprobado	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	30/12/2022 4:45:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía	CO1.WRT.10650243
Referencia de la garantía	56-44-101004190 Anexo 3
Estado	Aprobado
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Pago de salarios ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de póliza	56-44-101004190 Anexo 3
Tomador	FZ INGENIERIA SE S.A.S
Beneficiario	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARANCABERMEJA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	35.626.102,67 COP	26/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Descargar	Detalle

9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Se han realizado los informes técnicos semanales, con el fin de mantener una trazabilidad para la entidad contratante del avance de las actividades de obra, así como lograr evaluar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato de OBRA No. 6223-22.

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.6223-22.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños estructurales y diseños arquitectónicos para realizar su posterior revisión y tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar.

9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

Se han presentado las observaciones al proyecto, las cuales han sido resueltas oportunamente por la entidad, teniendo estas soluciones prácticas y oportunas sin afectar la ejecución del contrato.

9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION

ACTA	ASUNTO	FECHA
ACTA DE COMITÉ 4	VISITA DE OBRA	10/03/2023
ACTA DE COMITÉ 5	VISITA DE OBRA	23/03/2023

9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

28-feb-23	026-INT2022	SOLICITUD DE INCREMENTO EN EL PERSONAL EN CAMPO OFICIALES Y AYUDANTES.	CONSORCIO R83

9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

.

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	RECIBIDO
27-feb-23	RADICADO No.: EE-20230224-0180-000002322	ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORIA.	SUPERVISOR DEL CONTRATO
1/03/2023	CSCR83-027	NOTA ACLARATORIA REPROGRAMACION	CONSORCIO R83
1/03/2023	CSCR83-028	RESPUESTA OFICIO 026-INT2022	CONSORCIO R83
2/03/2023	CSCR83-HSEQ-002	Respuesta a oficio 013-INT2022	CONSORCIO R83
3/03/2023	CSCR83-029	RESPUESTA OFICIO 012-INT2022	CONSORCIO R83
3/03/2023	CSCR83-030	RESPUESTA OFICIO 014-INT2022	CONSORCIO R83
14/03/2023	CSCR83-031	ACTA DE COBRO PARCIAL No 01 CONT. 6223-22	CONSORCIO R83
15/03/2023	CSCR83-HSEQ-003	ENTREGA DE AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	CONSORCIO R83
15/03/2023	CSCR83-HSEQ-004	ENTREGA SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO Y FEBRERO	CONSORCIO R83

9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	91.258.439	DIRECTOR DE OBRA
2	ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	13.568.915	RESIDENTE DE OBRA
3	VLADIMIR ARIZA CARDOZO	91.285.884	ABOGADO
4	NATALIA RUEDA SERRANO	1.096.195.479	HSE
5	CESAR AUGUSTO MARTINEZ SEIJA	91.433.153	TOPOGRAFO
6	RONNY SHARIFF OTALVAREZ	91.526.488	CADENERO

9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($356.261.026.66) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

9.5.1 FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

a-) Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b-) Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagara una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que , en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago esta supeditado al PAC del distrito.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO

A la fecha solo no se ha realizado ningún pago parcial, se encuentra el cobro para pago.

9.5.3 CURVA DE AVANCE FINANCIERO

Hasta el momento no se han realizado avances ni cobros parciales, se encuentra el cobro para pago.

9.5.4 CURVA DE AVANCE FISICO



10. CONCLUSIONES

- Durante este tercer mes se presenta un avance físico del 8,53% vs un programado del 13%, por lo cual se presenta un atraso del 4,47%.

- Se le solicita al contratista abrir otro frente de trabajo, para aumentar el rendimiento en obra y poder solventar el atraso presentado en obra.

- Se ha trabajado por parte del contratista cumpliendo con todas las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato, así como su respectiva calidad en los materiales suministrados.

FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C. No. 91.291.804 de Bucaramanga
Representante legal

27 Feb 2023 Personal: residente de interventoria, Hse, cadenero topografo, residente de obra, Hse de obra, almacenista, maestro, 9 ayudantes.
tiempo: soleado
equipo: trompo
Actividades: excavacion manual para vigas de cimentacion de los ejes 6 y 5 entre ejes A y F. se continua con el corte y figurado de acero para los estribos de las columnas tipo I.

Res. de Obra Per. Interv.

28 Feb 2023 Personal: Residente de interventoria, Hse, cadenero, topografo, Residente de obra, Hse obra, almacenista, maestro y ayudantes.
Tiempo: Soleado.
Equipo: Trompo
Actividades: Se continua con la excavacion manual para las vigas de cimentación de los ejes 3 y 4 entre ejes A y F, se continua con el corte y figurado de acero para los estribos de las columnas Tipo 1, se lleva a cabo una reunion con la comunidad, representantes de la alcaldia municipal, Interventoría y contratista el cual se trataron temas relacionados con la contratación del personal y la ejecucion de las actividades del centro educativo. Llegan a Obra 7 viajes de Arena para concreto cada uno de 8 m^3

Residente de Obra Resd interv

01-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero, Residente de Obra, almacenista, maestro de Obra, 9 ayudantes, HSE

Equipo: Trompo Tiempo: Soleado

Actividades: Continuamos con la excavacion manual Para las vigas de cimentacion de los ejes A, B y C entre ejes 3 y 6, se comienza con la actividad de concreto para solado para las vigas de cimentación de los ejes 3 al 6 entre ejes A y F. Se comienza con la actividad de armado de castillos o acero de refuerzo para las vigas de cimentacion de los ejes 5 y 6 entre ejes A y F, llega a obra 1 viaje de triturado de 3/4" de $8m^3$

Res. de Obra

02-Marzo-2023 Personal: Residente Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, Almacenista, HSE, Maestro Obra 2 Oficiales, 9 ayudantes

Equipo: Trompo Tiempo: Soleado

Actividades: Se termina la excavacion manual para vigas de cimentacion de los ejes D, E y F entre ejes 3 y 6, se continua con la actividad de concreto para solado de las vigas de cimentación de los ejes A, B y C entre ejes 3 y 6, se continua con el armado del acero de refuerzo de las vigas de cimentacion de los ejes A, B y C entre ejes 3 y 6. Llega a Obra un viaje de triturado de 3/4" de $8m^3$, Se comienza actividad de demolicion de vigas de amarre existentes

Res. de Obra

Powered by CamScanner

03-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, Almacenista, Maestro de Obra, 2 Oficiales 9 Ayudantes, HSE

Equipos: Trompo Tiempo: Soleado

Actividades: Se funde concreto para solado de vigas de cimentacion de los ejes D, E y F entre ejes 3 y 6 continuamos con la actividad de demolicion de vigas de cimentación existentes, continua con la actividad de armado del acero de refuerzo para las vigas de cimentacion de los ejes, 3 y 4 entre ejes A y F

Res. de Obra

Resid Interv

04-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro de Obra 2 Oficiales, 9 ayudantes

Equipos: Trompo Tiempo: Nublado

Actividades: se continua con la demolicion de las vigas de cimentación existentes, continuamos con la actividad de armado de acero de refuerzo para vigas de cimentacion de los ejes D, E y F entre ejes 3 y 6 Se hace adecuacion, levantamiento del cerramiento perimetral en lona verde debido a que en la madrugada se presento tormenta y fuertes vientos los cuales ocacionan el colapso del cerramiento.

Res. de Obra

Resid Interv

05-Marzo-2023 Domingo dia Festivo No se trabaja

Powered by CamScanner

038

06-Marzo-2023

Personal: Residente de Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, almacenista, maestro de obra, 2 oficiales 9 ayudantes, HSE.
Equipo: Trompo
Tiempo: Mañana: Nublado Tarde: Soleado
Actividades: se inicia excavación manual para vigas de cimentación ejes E y F entre ejes 2 y 3; tambien se hace excavacion manual para vigas de cimentacion de los ejes 3 y 4 entre ejes F y G, se arma acero de refuerzo para vigas de cimentacion de los ejes E y F entre ejes 2 y 3; ejes 3 y 4 entre ejes F y G se comienza a fundir viga de cimentacion VIGA CIM 4 del eje 6 entre ejes C y F, durante el dia se presentan cortes de energia electrica desde la 9:00 am hasta 5:00 pm

Res. de Obra

Resid. interv.

07-Marzo-2023

Personal: Residente de Interventoría, HSE, Topografo Cadenero, Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro de Obra, 2 Oficiales, 9 ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba
Tiempo: Mañana se presentan fuertes lluvias desde las 6:00 am hasta las 9:00 am
Tarde: Nublado
Actividades: Se continua con la fundida de la viga de cimentación del eje 6 entre ejes A y C, continuamos con el armado de acero de refuerzo de las columnas tipo 1 de los ejes 3 y 6 entre ejes A y F durante el dia se presentan cortes de energia electrica desde 9:00 am hasta las 3:00 pm

Residente de Obra

Resid. interv.

08-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro de Obra 2 oficiales, 9 ayudantes.
Equipos: Trompo. Motobomba
Tiempo: Mañana: Se presentan fuertes lluvias desde las 7:30 am hasta 11:30 am horas en la que el personal no puede laboral debido al fuerte aguacero
Tarde: Nublado
Actividades: Se continua con la actividad de armado de acero de refuerzo para las columnas tipo 1 de los ejes 3 y 6 entre ejes A y F, se comienza a armar formaleta para las columnas tipo 1 eje 6 con eje F y eje 6 con eje E, la cuales se funden hasta el nivel 3.95 mts, durante el dia se presentan cortes de energia electrica desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm

Res. de Obra Resid. Interv.

09-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro de Obra 2 oficiales, 9 ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba
Tiempo: Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Actividades: Se continua con la fundida de concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion eje 6 entre ejes B y F; viga cimentacion ejes B, C, D, E y F entre ejes 5 y 6, se formaletea columnas de los ejes 6 con eje C y eje 6 con eje D y se funden estas dos columnas

Res. de Obra Resid. Interv.

Powered by CamScanner

040

10-Marzo-2023	Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero, Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales, 9 Ayudantes Equipo: Trompo, Motobomba Tiempo: Mañana Soleado Tarde: Soleado Actividades: Se continua con la fundida de concreto de 2000 psi para vigas de cimentacion VCIM-B e/c F entre ejes 4 y 5, viga de cimentacion VCIM-3 e/e 4 entre ejes C y F. Se continua con la armada de la formaleta para columnas 35 x 35 cm tipo 1 e/e 6 con e/c A y Eje 6 con e/c B, la cuales se funden, en horas de la mañana hace visita en obra personal de la secretaria de infraestructura, supervision del contrato, haciendo visita e inspeccion al lugar de trabajo Res. de Obra Res. interv.
11-Marzo-2023	Personal: Residente Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro de Obra 2 oficiales, 9 ayudantes Equipo: Trompo, Motobomba Tiempo: Mañana Nublado Actividades: Se continua con la fundida de vigas de cimentacion VCIM-B del e/c F entre ejes 3 y 4 en concreto de 3000 psi, se continua con la armada de formaleta y fundida para las columnas el e/c 5 con e/c F y e/e 5 con e/c E. Res. de Obra Res. interv.

12-Marzo-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra

Res. interv.

13-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero, Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales, Ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba
Tiempo: Mañana: se presentan lluvias en el transcurso de toda la mañana. Tarde: Soleado
Actividades: Se continua con la fundida de las vigas de cimentacion del eje D entre ejes 3 y 4; viga de cimentación VCIM-2 eje 3 entre ejes C y F, viga de cimentacion VCIM-B eje E entre ejes 3 y 4 y viga de cimentación VCIM-A eje D entre ejes 3 y 4, se continua con la armada de formaleta y fundida para las columnas eje D con eje 5 y eje C con eje 5, eje E con eje B

Res. de Obra

Res. interv

14-Marzo-2023 Persona/: Residente de interventoria, HSE, Topografo, Cadenero, Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales; 10 ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Taladro demoledor
Tiempo: Mañana: soleado Tarde: Soleado
Actividades: Se continua con la armada de formaleta y fundida de columnas tipo 1 en concreto de 3000 psi eje 4 con eje D y columna eje 4 con eje E y columna tipo 3 eje 4 con eje F tambien se continua con la fundida de las vigas de cimentación VCIM-A eje C entre ejes 3 y 4, VCIM-A eje B entre ejo 3 y 4, VCIM-2

Powered by CamScanner

entre ejes 3 y ejes B y C; viga cimentacion VCIM-3 eje 4 entre ejes B y C.

Res. de Obra

Res interv.

15-Marzo-2023

Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo Cadenero, Residente de Obra, HSE, Almacenista Maestro, 2 oficiales, 10 ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana: Nublado, Tarde: Soleado
Actividades: continuamos con la fundida de vigas de cimentación VCIM-2 eje 3 entre ejes A y B; VCIM-3 eje 4 entre ejes A y B; VCIM-A eje A entre ejes 3 y 4, se desencofran las columnas que se fundieron el dia anterior y se procede a armar formaleta metalica para las columnas Tipo 1 0.35 x 0.35 mts eje 3 con ejes E y F; eje 4 con eje C

Res. de Obra

Res interv.

16-Marzo-2023

Personal: Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero, Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 oficiales, 10 ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana - Se presentan fuertes lluvias desde las 8:30 am hasta las 10:00 am
Tarde: Nublado
Actividades: Se corta y figura acero de refuerzo de 1/2" para armar 14 zapatas tipo 01; se corta y figura acero de refuerzo de 5/8" para armar 2 columnas de 35 x 35 cm tipo 01

Powered by CamScanner

se arman formaleta de 35 x 35 cm para 9 columnas tipo 01.

Res. de Obra

Res. interv.

17-Marzo-2023 Personal: Residentes de Interventoria, HS,E, Topografo, Cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 10 Ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana Soleado ; Tarde: Soleado
Actividades: Se continua con la fundida de vigas de cimentación eje 3 entre ejes A y B; y eje A entre ejes 3 y 6, se funden columnas tipo 1, eje 3 con eje D; eje 3 con eje E eje 3 con eje F y eje 4 con ejes C, llegan 16 m³ de triturado de 3/4" y 16 m³ de arena, Se amplia el cerramiento en lona verde en el sector, sur y en el sector occidental

Res. de Obra

Res. interv.

18-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoría, HSE, Topografo, cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 10 Ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo. Mañana: Soleado
Actividades: se continua y termina con la fundida de las columnas de 35 x 35 cm tipo 01 eje 3 con eje A, eje 3 con eje B, eje 3 con eje C, eje 4 con eje A y eje 4 con eje B

Res. de Obra

Res. interv.

Powered by CamScanner

19-Marzo-2023	Domingo (No se labora) Res. de Obra Res. interv.
20-Marzo-2023	Lunes festivo (No se labora) Res. de Obra Res interv.
21-Marzo-2023	Personal: Residente de Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero, Residente de Obra, HSE, Almacenista, 2 oficiales, 10, Ayudante, 1 Maestro, 1 Topografo, 1 Cadenero Contratista Equipo: Trompo, Motobomba, Estación, bastan, Nivel de precisión. vibro-compactador manual tipo rana Tiempo: Mañana Soleado, Tarde Soleado Actividades: Se comienza a armar acero de refuerzo para columnas tipo 1 (5 columnas), columna tipo 14 (1 columna), Columna tipo 13 (1 columna), Columna tipo 12 (1 columna), columna tipo 11 (2 columnas), Columna tipo 10 (1 columna), columna tipo 9 (1 columna), Columna tipo 8 (1 columna) y columa tipo 7 (2 columnas), se desencopan las 5 columnas que se fundieron el dia 18-Marzo-23 la comision topografica del contratista hace la localizacion y ubicacion de los ejes del 2 Modulo ejes 4 con eje J y eje 1 con eje J, eje 1 con eje E, tambien se hace la localizacion del cuarto de bombas y el pozo de agua el cual va abastecer el centro educativo de agua potable. y por ultimo se hace un chequeo a la estructura que ya se fundio entre los ejes 3 y 6 con ejes A y F, se hace relleno y compactacion manual Res. de Obra Res. interv.

Powered by CamScanner

22-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 oficiales, 10 Ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro Tipo Rana
Tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Actividades: Se comienza excavación manual para zapatas tipo 1 de 1.0 x 1,0 mts del eje E con ejes 1 y 2; eje F con ejes 1 y 2; eje 2 con eje G se termina la excavación de estas 5 zapatas y se procede a fundir el solado concreto de limpieza para estas 5 zapatas tipo 1, quedando estas con su solado de limpieza, se continua con el relleno y compactación manual

Res. de Obra

Res. interv

23-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 10 Ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Tipo Rana
Tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Actividades: Se instala acero de refuerzo para las zapatas tipo 01 del eje E con ejes 1 y 2; eje F con ejes 1 y 2; eje 2 con eje G, tambien se instala el acero de refuerzo de las columnas tipo 1 del eje E con ejes 1 y 2; se instala el acero de refuerzo de las columnas tipo 11 del eje F con ejes 1 y 2; se instala acero de refuerzo de la columna tipo 10 del eje 2 con eje G, se funden concreto ciclop psi para zapatas tipo 01 del eje E con ejes 1 y 2; eje F con ejes 1 y 2; y eje 2 con eje G, se continua con la excavacion manual para zapatas tipo 1 de 1.0m x 1.0m del eje H entre ejes 1 y 1'; eje I entre ejes 1, 1' y 2, eje se funde concreto para solado de las zapatas eje G con ejes 1 y 1', se instala acero de refuerzo para zapatas tipo 01 del eje G con ejes 1 y 1', se instala acero de refuerzo

Powered by CamScanner

	para columna tipo 12 ejc 6 con ejc 1', acero de refuerzo para columna tipo 4 ejc 6 con ejc 1 se funde concreto de 3000 psi para zapatas tipo 1 ejc 6 con ejes 1 y 1', se continua con la compactacion manual del relleno Res. Interv. Res. de Obra
29-Marzo-2023	Personal: Residente de Interventoria, Topografo, Cadenero HSE, Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 10 Ayudantes Equipo: Trompo, Motobomba, Planta electrica Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado Actividades: Continuamos con la instalación de acero de refuerzo para las zapatas tipo 1 del ejc H entre ejes 1, 1' y 2; la instalacion de acero de refuerzo para zapatas tipo 1 ejc I con ejes 1 y 2, se instala acero de refuerzo para columnas tipo 9 ejc H con ejc 2; columna tipo 13 ejc 1' con ejc H; columna tipo 5 ejc 1 con ejc H; columna tipo 8 ejc 2 con ejc I; columna tipo 6 ejc 1 con ejc H, se funde concreto de 3000 psi para zapatas tipo 1 1x1 mts ejc 1 con ejes H e I; ejc 1' con ejc H; ejc 2 con ejes H e I, se continua con la excavación manual para zapatas tipo 1 ejc J con ejes 1 y 2; ejc I con ejc 1' Res. de Obra Resid. Inter.
25-Marzo-2023	Personal: Residente de Interventoría, Topografo, Cadenero HSE, Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales 10 Ayudantes Equipo: Trompo, Motobomba, Planta electrica

Powered by CamScanner

Tiempo: Mañana Soleado
Actividades: Se continua con la excavación manual para zapatas tipo 01 del eje 3 con eje I; eje 3 con eje G, se funde solado de limpieza para zapatas tipo 01 eje 3 con eje I eje 3 con eje G, se hace excavación manual para zapatas tipo 02 eje 3 con ejes H e I, se funde solado de limpieza para zapatas tipo 02 eje 3 con ejes H e I se instala acero de refuerzo para columna tipo 3 eje 3 con eje I; se instala acero de refuerzo para columna tipo 2 eje 3 con ejes G-H-I

Res. de Obra

Rep. Interv.

26-Marzo-2023 Domingo (NO se labora)

Res. de Obra

27-Marzo-2023 Personal: Residente de Interventoría, Topografo, Cadenero, HSE Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 10 Ayudantes
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta electrica
Tiempo: Mañana: Soleado -, Tarde: Soleado
Actividades: Se continua con la excavación manual para zapatas tipo 01 eje 4 entre ejes G-J, se funde solado de limpieza para zapatas tipo 01 eje 4 entre ejes G-J se instala acero de refuerzo para zapatas tipo 01 eje 4 entre ejes G-J, se instala acero de refuerzo para columnas 3 eje 4 entre ejes G-J, se funde concreto de 3000 psi para zapatas tipo 01 eje 4 entre ejes G-J, eje 3 con eje J, eje 3 con eje G y se funde concreto de 3000 psi para zapatas tipo 02 eje 3 con ejes H-I

Res. de Obra

Rep. Interv.
