# INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL CONVENIO SOLIDARIO No. 4269330 de 2022

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER.**

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 6 DE DICIEMBRE de 2022 Y EL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 10 DE MARZO DE 2023 AL 13 DE ABRIL DE 2023**

**CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS

## INFORME DE ACTIVIDADES CONVENIO SOLIDARIO No. 4269330 de 2022

| CONVENIO SOLIDARIO No. | 4269330 de 2022 |
|---|---|
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS |
| VALOR | $ 27.880.020,10 |
| PLAZO INICIAL | UN (1) MES |
| FECHA DE INICIO | 3 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE SUSPENSION (1) | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 (1 MES) |
| FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION (1) | 20 DE ENERO DE 2023 (50 DIAS) |
| FECHA DE REINICIO (1) | 10 DE MARZO DE 2023 |
| OTROSI MODIFICATORIO (1) | 10 DE MARZO DE 2023<br>CAMBIO LOCALIZACION Y PRORROGA UN (1) MES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 17 DE ABRIL DE 2023 |

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS**

## ALCANCE DEL CONVENIO:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1,00 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO | m3 | 77,52 |
| 2,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR | m3 | 35,24 |
| 3,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS | m3 | 28,19 |
| 4,00 | CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60% | m3 | 14,09 |
| 5,00 | Acero de refuerzo 1/2" | kg | 325,89 |
| 6,00 | Acero de refuerzo 3/8" | kg | 743,99 |
| 7,00 | Acero de refuerzo 1/4" | kg | 144,20 |

## FORMA DE PAGO:

Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal. El valor aporte del Municipio será cancelado de la siguiente Manera A PAGO ANTICIPADO: El municipio reconocerá un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total de convenio suma equivalente a TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DIEZ PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($13.940.010,05) el cual se desembolsará una vez perfeccionada el convenio, cumpliendo los requisitos de ejecución del mismo y la correspondiente suscripción del acta inicio. B) UN SEGUNDO PAGO : POR VALOR DE ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($11.152.008,04) equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del convenio, el cual se desembolsara una vez ejecutada el cincuenta (50%) por ciento de la obra, C) UN PAGO FINAL : por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOS PESOS CPM UN CENTAVO M/CTE ($2.788.002,01) equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS.

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS**

## RELACION DE ACTAS:


| ACTAS | FECHA |
|---|---|
| **ACTA DE INICIO** | 3 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **ACTA DE SUSPENSION (1)** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION (1)** | 20 DE ENERO DE 2023 |
| **ACTA DE REINICIO (1)** | 10 DE MARZO DE 2023 |
| **OTROSI MODIFICATORIO (1)** | 10 DE MARZO DE 2023 |
| **ACTA PARCIAL 1** | 14 DE ABRIL DE 2023 |
| **ACTA PARCIAL 2** | 18 DE MAYO DE 2023 |


## ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2022 y el 21 de diciembre de 2022 y del 10 de marzo de 2023 al 13 de abril de 2023, con un avance de ejecución de más del 50% del Convenio Solidario.


| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1,00 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO | m3 | 52,03 |
| 2,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR | m3 | 23,65 |
| 3,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS | m3 | 18,92 |
| 4,00 | CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60% | m3 | 9,46 |
| 5,00 | Acero de refuerzo 1/2" | kg | 218,75 |
| 6,00 | Acero de refuerzo 3/8" | kg | 499,41 |
| 7,00 | Acero de refuerzo 1/4" | kg | 96,79 |


1. **EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO**







2. **SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR**

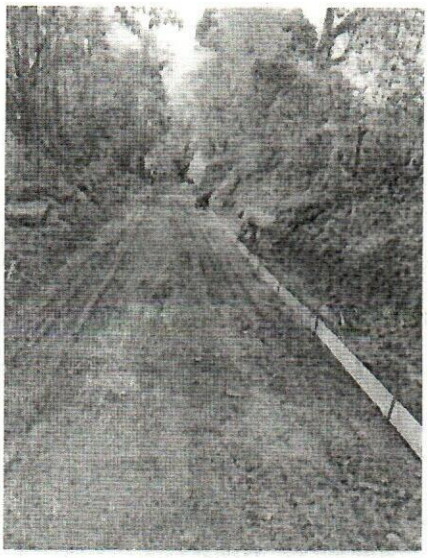

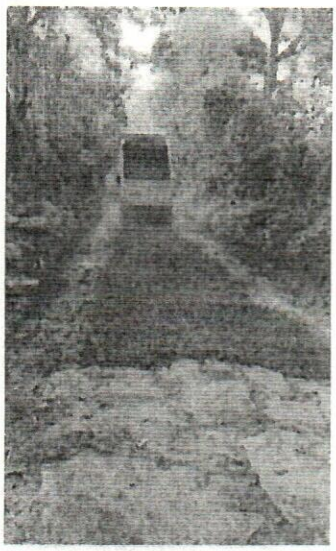



3. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS

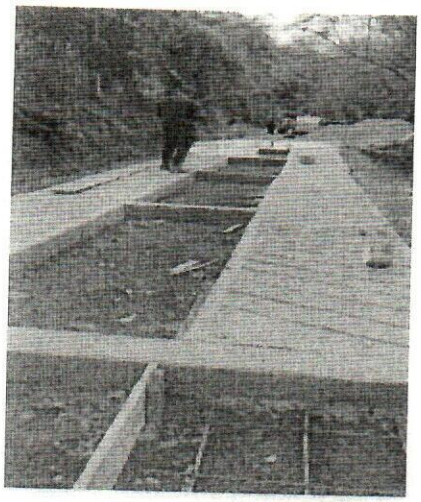

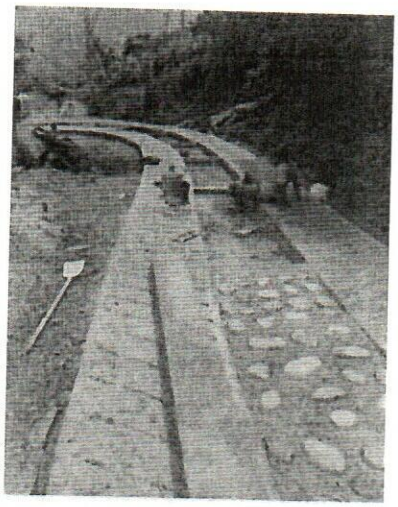



4. CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%

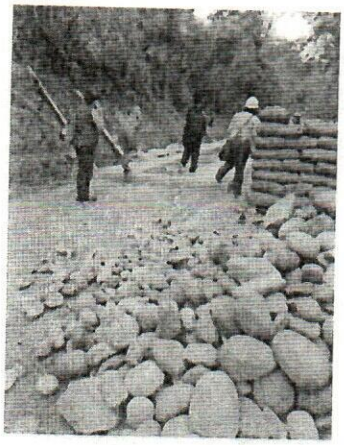

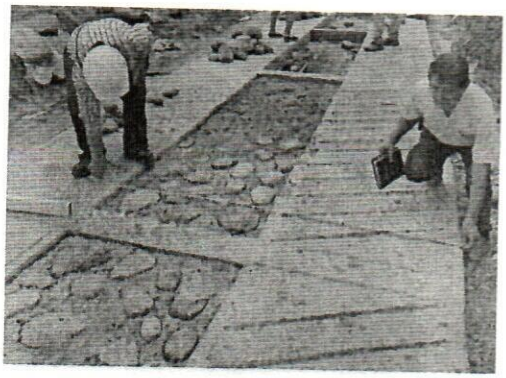

5. Acero de refuerzo 1/2"
6. Acero de refuerzo 3/8"
7. Acero de refuerzo 1/4"

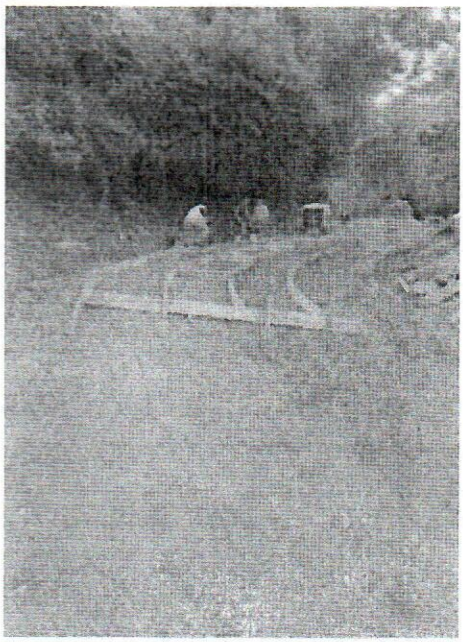

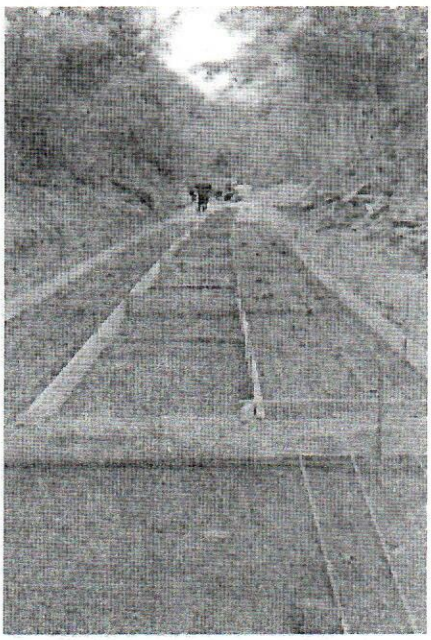

V.o.B.o

**Ingeniero Angelo Rivera**
Contratista de Apoyo Sec. de Planeación

**Ingeniero Juan Luis Beltrán**
Contratista de Apoyo Sec. de Planeación

**CARLOS GUSTAVO FIGUEREDO MONTAÑA**
Presidente Junta de acción comunal Vereda Alto de Reinas

**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS**
