	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	15/12/2022	INFORME No.	3	DEL	1/11/2022	AL	30/11/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	OBRAS NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN DEL RIESGO GENERADO EN LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR DE PALENQUE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, BAJO LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 202200221 DE AGOSTO DE 22 DE 2022
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VEREDA MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR DE PALENQUE

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.:				CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	8 MESES			PLAZO INICIAL:	9 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE MAYO 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE JUNIO 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	8			PLAZO ACTUALIZADO:	9		
PLAZO TRANSCURRIDO:	3,0	EQUIVALE AL	38%	PLAZO TRANSCURRIDO:	3,0	EQUIVALE AL	33,33%
VALOR INICIAL :	$ 1.247.657.590,00			VALOR INICIAL :	$ 94.979.350,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.247.657.590,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 94.979.350,00		
VALOR PAGADO:	$ 0,00	EQUIVALE AL	0,00%	VALOR PAGADO:	$ 0,00	EQUIVALE AL	0,00%
VALOR POR PAGAR:	$ 1.247.657.590,00	EQUIVALE AL	100,00%	VALOR POR PAGAR:	$ 94.979.350,00	EQUIVALE AL	100,00%
COORDINADOR:				INTERVENTOR:	CONSTRUCTORA KPB S.A.S		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

contrato de OBRA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado	$ 906.120.488,00	
contrato de INTERVENTORIA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado	$ 71.234.513,00	

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

FECHA	15/12/2022	INFORME No.	3	DEL	1/11/2022	AL	30/11/2022

1.1 AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESAROLLADAS DURANTE EL PERIODO

- Localización de muro con equipo de topografía.
- Excavaciones para construcción de muro.
- Construcción de muro en concreto.
- Armado de acero para muro.
- Vaciado muro en concreto.
- Instalación de filtro francés.
- Instalación de tubería perforada.
- Manejo de escorrentías durante la construcción de muro.
- Llenos en arenilla.
- Impermeabilización muro.
- Elaboración de cunetas.
- Construcción de aletas descole quebrada 100 pesos.
- Rocería y limpieza, talud margen derecha.
- Excavaciones obra transversal quebrada 100 pesos.
- Solados en concreto.
- Suministro, figuración y colocación de acero.
- Vaciado losa obra transversal quebrada 100 pesos.
- Estabilización de muro con costales llenos en material de excavación seleccionado.
- Inicio de excavaciones afluente dos, obra transversal.
- Continuación llenos muro de contención.
- Cambio de altura de murete de 1m a 1.50m con viga de 40cm x 40cm y pilotes de 1.50m y 1.60m los cuales se construyeron a 1.50m de distancia.
- Excavaciones extracción de derrumbe, talud margen derecha.

FECHA	15/11/2022	INFORME No.	3	DEL	1/11/2022	AL	30/11/2022

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se establece la necesidad de los estudios hidrólogicos de la zona y los diseños para las estructuras de contenció como son muros, cunetas, pocetas y boxcoulvert, de los cuales se han ido realizando entregas parciales y trabajo coordinado con el ing. Estructural para el avance de las actividades de mitigación inicial y definitivas de la zona a intervenir

ADMINISTRATIVOS:

- El contratista realiza un presupuesto con las actividades identificados para el desarrollo del proyecto, con un cronograma de trabajo, del cual está en revisión y aprobación

AMBIENTALES:

- Entregan el informe SOCIOAMBIENTAL y SST de la obra. donde se registra el seguimiento y actividades ejecutadas.
- El 23 de noviembre se realizó capacitación al personal de obra

SOCIALES:

-N/A

LEGALES:

- Se está en coodinación con la administración municipal para los documentos requeridos en la legalización del contrato

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	15/11/2022	INFORME No.	3	DEL	1/11/2022	AL	30/11/2022


5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO




Estabilización de muro con costales llenos en material de excavación seleccionado.



Excavaciones obra transversal quebrada 100 pesos.

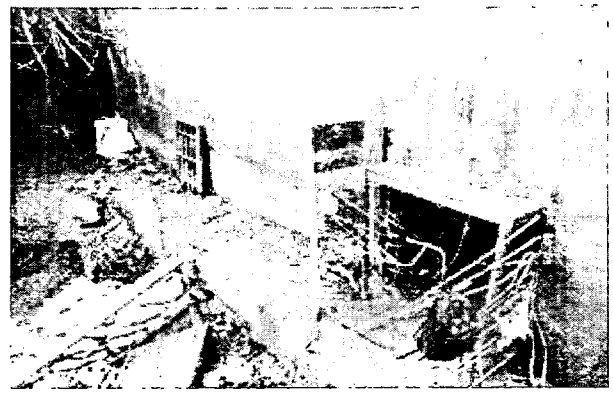


Manejo de escorrentías durante la construcción de muro.

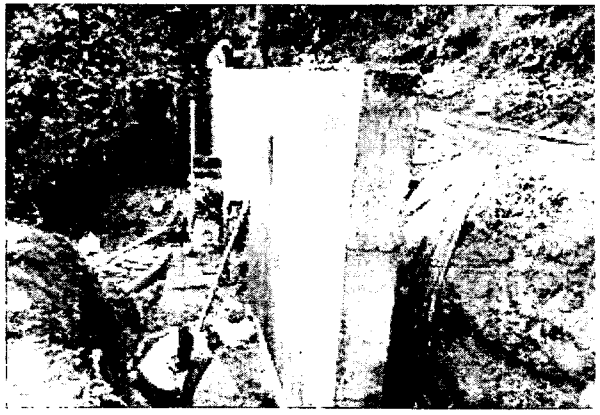

Vaciado muro en concreto



Impermeabilización muro

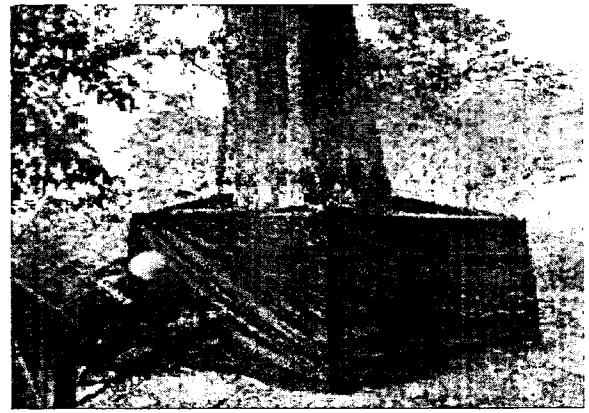

Proteccion de Arboles

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: ANA MILENA MOLINA OSORIO

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE:
