
CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

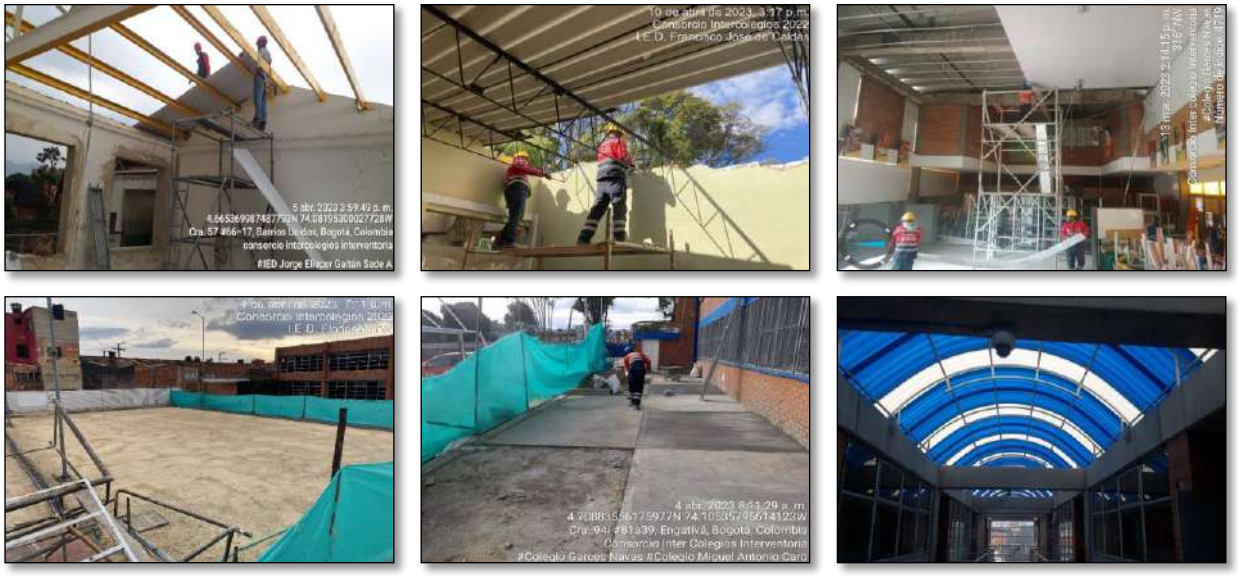

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL TECNICO DE INTERVENTORÍA No. 003

PERIODO DE EJECUCIÓN:
11 DE MARZO DE 2023 A 10 DE ABRIL DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



Titulo Documento		**INFORME MENSUAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA No.03**		
Revisión		**0**	**1**	**2**
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Camilo Antonio Camacá Pesca		
	Firma			
	Fecha	11 de abril de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	11 de abril de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	12 de abril de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 11
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 12
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12
1.3. ANTECEDENTES 13
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 14
1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 15
1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR 15
1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A 15
1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 16
1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 16
1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 17
1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 17
1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 18
1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 18
1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A 19
1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 19
1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 20
1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A 20
1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 21
1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 21
1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 22
1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 22
1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 23
1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A 23
1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A 24
1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A 24
1.6. ACTIVIDADES DE OBRA 25
1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 25
1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 27
1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 27
1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 27
1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 27
1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 28
1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 28
1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 28
1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A, ... 29
1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 29
1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 29
1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 30
1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 30
1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 30
1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 31
1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 31
1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 32
1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 32
1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 32
1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 32
1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 33
2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 33

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022 33
2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 33
2.1.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA 34

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022 35
2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 35

2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 36
2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 36
2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 36
2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA 36
2.3.2.2. PERSONAL ADICIONAL CONTRATISTA DE OBRA 37
2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA. 37
2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA 37
2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA 38

2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 38
2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA. 38
2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA. 39

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO. 39

3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO 39
3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 39
3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 39

3.2. MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO. 39
3.2.1. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE OBRA 40
3.2.2. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 40

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO. 40
3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 40
3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 40
3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022 41
3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 42
3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 42
3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 42
3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 42
3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 44
3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 45
3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 45
3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 47
3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 47
3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 47
3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 49
3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 52
3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 57
3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 57
3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas 60
3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 62
3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 62
3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 62
3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 64
3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 64
3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 65
3.3.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 66
3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 67
3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 67
3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022. 68

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO: 69
3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 69
3.4.2. CORRESPONDENCIA 70

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 78
3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. 78
3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 78
3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A 78
3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia 79
3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana 79
3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A 79
3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda 80
3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada 80
3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A 80
3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A 82
3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A 82
3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A 82
3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A 83
3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A 85
3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto 86
3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A 86
3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garcés Navas 88
3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A 89
3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A 89
3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A 89
3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A 90
3.5.3. ATENCIÓN EMERGENCIAS EDUCATIVAS 91
3.5.3.1. IED Morisco 91
3.5.3.2. IED Rafael Bernal Jiménez, sede B 91
3.5.3.3. IED Nydia Quintero de Turbay Sede A 91
3.5.3.4. IED República de Panamá 91
3.5.3.5. Dirección Local de Engativá 91
3.5.3.6. IED Laureano Gómez 91
3.5.3.7. IED Thomas Carrasquilla sede A 91
3.5.3.8. IED Tomas Cipriano de Mosquera 92
3.5.3.9. Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo 92
3.5.3.10. IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D 92
3.5.4. AVANCE GENERAL DE CONTRATO 92
3.5.5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS 94
3.5.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 94
3.5.7. CONTROL DE CALIDAD 95
3.5.8. REUNIONES EFECTUADAS 95
3.5.8.1. REUNIONES DE COMITÉ 95
3.5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 97
3.5.10. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 98

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 98

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL. 98

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 98

4.1. OBSERVACIONES 98

4.2. CONCLUSIONES 98

4.3. RECOMENDACIONES 99

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A. 27
TABLA 2. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA 27
TABLA 3. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED, SEDE B, PANAMERICANA....27
TABLA 4. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 28
TABLA 5. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA....28
TABLA 6. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA 29
TABLA 7. ALCANCE INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A....29
TABLA 8. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A....29
TABLA 9. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 30
TABLA 10. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 30
TABLA 11. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A 30
TABLA 12. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A 31
TABLA 13. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO 31
TABLA 14. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A 32
TABLA 15. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A, GARCES NAVAS 32
TABLA 16. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY 32
TABLA 17. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A 32
TABLA 18. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A 33
TABLA 19. ALCANCE INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 33
TABLA 20. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA. 34
TABLA 21. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA. 35
TABLA 22. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 35
TABLA 23. PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. 36
TABLA 24. PERSONAL MÍNIMO DE SAFRID INGENIERÍA S.A.S. 37
TABLA 25. PERSONAL ADICIONAL SAFRID INGENIERÍA S.A.S. 37
TABLA 26. PERSONAL MÍNIMO DE CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022. 38
TABLA 27. PERSONAL ADICIONAL CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 38
TABLA 28. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DEL CONTRATISTA. 38
TABLA 29. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DE LA INTERVENTORÍA. 39
TABLA 30. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 39
TABLA 31. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 39
TABLA 32. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. 41
TABLA 33. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEDE A. 42
TABLA 34. PRESUPUESTO ASIGNADO EDUCATIVA NIDIA QUINTERO DE TURBAY, SEDE B, FLORENCIA. 42
TABLA 35. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS CARRASQUILLA IED – SEDE B, PANAMERICANA. 42
TABLA 36. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 42
TABLA 37. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO IED, SEDE A. 44
TABLA 38.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE B, CIUDAD DE HONDA 44

TABLA 39. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEDE C, NUEVA ESTRADA 45
TABLA 40. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A 45
TABLA 41. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL, SEDE A. 47
TABLA 42.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO PRIMERO, SEDE A 47
TABLA 43. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA AYALA DE GAITÁN, SEDE A 47
TABLA 44. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 48
TABLA 45. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 49
TABLA 46.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A 49
TABLA 47. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORIDA BLANCA, SEDE A. 52
TABLA 48.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A 53
TABLA 49. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A. 57
TABLA 50. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, SEDE B, SIDAUTO 57
TABLA 51.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 57
TABLA 52. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A. 60
TABLA 53.PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A. 61
TABLA 54. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTO VÍCTOR CHARRY, SEDE A. 62
TABLA 55. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F KENNEDY, SEDE A. 62
TABLA 56. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE A. 62
TABLA 57. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 62
TABLA 58. PRESUPUESTO AJUSTADO MEDIANTE INFORME DE DIAGNÓSTICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCÉS NAVAS, SEDE A. 64
TABLA 59. PRESUPUESTO ASIGNADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEDE A 64
TABLA 60. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA. 65
TABLA 61. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE OBRA. 65
TABLA 62. TABLA DE VALORES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DEL CONTRATO DE OBRA. 67
TABLA 63. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 68
TABLA 64. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 68
TABLA 65. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA. 70
TABLA 66. CONTROL CORRESPONDENCIA. 78
TABLA 67. AVANCE DE OBRA MIGUEL ANTONIO CARO. 80
TABLA 68. AVANCE DE OBRA INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL 81
TABLA 69. AVANCE DE OBRA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A 83
TABLA 70. AVANCE DE OBRA COLEGIO FLORIDABLANCA 84
TABLA 71. AVANCE DE OBRA COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN 86
TABLA 72. AVANCE DE OBRA COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ 87
TABLA 73. AVANCE DE OBRA COLEGIO JUSTO VÍCTOR CHARRY 88

TABLA 74. AVANCE DE OBRA COLEGIO GARCÉS NAVAS 90
TABLA 75. AVANCE GENERAL DE OBRA 94
TABLA 76. RELACIÓN DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS. 97

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....15
FIGURA 2. COLEGIO REPÚBLICA DE GUATEMALA (IED) – SEDE – REPÚBLICA DE GUATEMALA. 16
FIGURA 3. COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) – SEDE B – FLORENCIA. 16
FIGURA 4. COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA (IED) – SEDE B – PANAMERICANA. 17
FIGURA 5. COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED). 17
FIGURA 6. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE B – CIUDAD DE HONDA. 18
FIGURA 7. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA (IED) – SEDE C. 18
FIGURA 8. INSTITUTO TÉCNICO JUAN DEL CORRAL (IED) – SEDE –JUAN DEL CORRAL. 19
FIGURA 9. COLEGIO FRANCISCO PRIMERO (IED) – SEDE A – ALEMANIA. 19
FIGURA 10. COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN (IED) – SEDE MANUELA AYALA DE GAITÁN. 20
FIGURA 11. COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED) – SEDE A – I.T FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS....20
FIGURA 12. COLEGIO FLORIDA BLANCA (IED) – SEDE – FLORIDA BLANCA. 21
FIGURA 13. COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN (IED) – SEDE A....21
FIGURA 14. COLEGIO JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (IED) – SEDE – SIDAUTO....22
FIGURA 15. COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ (IED) –SEDE A – RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ. 22
FIGURA 16. COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY (IED) – SEDE A – GARCÉS NAVAS – ZONA ESCOLAR NO. 4.....23
FIGURA 17. COLEGIO ROBERT F KENNEDY (IED) – SEDE ROBERT F. KENNEDY 23
FIGURA 18. COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR (IED) – SEDE A 24
FIGURA 19. COLEGIO GARCÉS NAVAS (IED) - SEDE A....24
FIGURA 20. COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ (IED) – SEDE A. 25

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1. VALORES ASIGNADOS POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 41
GRÁFICA 2. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 65
GRÁFICA 3. ACTAS PARCIALES DE OBRA. 66
GRÁFICA 4. VALORES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 67
GRÁFICA 5. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 68
GRÁFICA 6. ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA. 69
GRÁFICA 7. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO MIGUEL ANTONIO CARO. 80
GRÁFICA 8. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUAN DEL CORRAL. 81
GRÁFICA 9. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A. 83
GRÁFICA 10. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO FLORIDABLANCA. 84
GRÁFICA 11. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JORGE ELIECER GAITÁN. 86
GRÁFICA 12. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ. 87
GRÁFICA 13. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO JUSTO VÍCTOR CHARRY. 89
GRÁFICA 14. CURVA PROGRAMADO VS EJECUTADO GARCÉS NAVAS. 90

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido A.I.U. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

Para la Interventoría del Contrato de Obra la Secretaría de Educación Distrital abrió el CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, que tiene por objeto: " INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"." Este Contrato fue adjudicado al CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 con número de Nit. 901.649.961-8 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla que a su vez está constituido por las empresas GNG PROYECTOS S.A.S BIC (50%) con número de Nit.901.477.828-7. representada legalmente por GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ identificado con cedula de ciudadanía No 72.201.382 de Barranquilla y GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. (50%) con número de Nit.901.383.717-3 representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA identificado con cedula de ciudadanía No 72.007.216 de Barranquilla, dando origen al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 del 24 noviembre de 2022; con un valor de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL**

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 951.138.738), y un plazo total para la ejecución del contrato de Trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la etapa correspondiente, la cual se firmó el día 22 de diciembre de 2022.

El presente documento constituye el Informe mensual de Interventoría, en el cual se detallan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 11 de marzo de 2023 a 10 de abril de 2023, por parte del Contratista SAFRID INGENIERÍA SAS; así mismo, se describen las actividades realizadas por el Interventor, CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022, dentro del mismo período, en el desarrollo de sus respectivos contratos.

El capítulo primero contiene la información general del proyecto, justificación, antecedentes, localización general y particular y las características técnicas del proyecto haciendo énfasis en el alcance establecido para cada una de las instituciones educativas.

El segundo capítulo corresponde a la información general del contrato de obra e interventoría en sus condiciones iniciales y actualizadas; así mismo, se relaciona el personal y los recursos involucrados en los contratos en mención.

El capítulo tercero corresponde a la información legal, financiera, administrativa, y técnica del proyecto, así como las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra como por la interventoría en los componentes de orden técnico, social y de seguridad y salud en el trabajo.

En el capítulo cuarto la interventoría realiza las observaciones, conclusiones y recomendaciones concernientes al desarrollo del contrato.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de reparaciones locativas correspondientes a: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos y de trabajo, e igualmente en la atención de obras de que por necesidad o por circunstancias sobrevinientes, causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas imprevisibles, y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales las cuales deben ser atendidas de forma prioritaria; de allí se desarrolla la planificación para efectuar las intervenciones que sean necesarias a juicio de la supervisión de la Secretaría Distrital de Educación e interventoría, con ello, realizar sobre los planos existentes de cada Colegio los detalles constructivos, cálculos y presupuestos que

estén dentro del alcance del objeto: “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." – En las Localidades de Engativá y Barrios Unidos.

Por parte de la Secretaría de Educación Distrital se hizo entrega de los planos existentes de cada institución, dentro de los cuales se mencionan los siguientes:

- Planos Arquitectónicos.
- Planos Estructurales.
- Planos Eléctricos.
- Planos Hidrosanitarios.

1.3. ANTECEDENTES

En virtud a los lineamientos generales de la política educativa con respecto a la materialización del derecho a la educación: La política educativa de Bogotá se fundamenta en los principios constitucionales que definen la educación como un derecho fundamental, inalienable, esencial e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formación integral del individuo, el acceso al conocimiento, la preservación y desarrollo de la cultura, la convivencia ciudadana y la integración social.

La materialización del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en la escuela depende de un espacio escolar digno, placentero y seguro. Las áreas dedicadas a aulas, sanitarios, recreación, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionen condiciones especiales que favorecen el aprendizaje e inciden en los resultados de calidad del sistema educativo. Además, el espacio y la dotación escolar potencian o debilitan el ambiente pedagógico e inciden en el comportamiento de los individuos. El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la socialización, el conocimiento y la recreación. En este sentido, una institución escolar más que una obra arquitectónica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por un conjunto de ambientes pedagógicos creados con finalidades culturales, sociales, académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 310 del 2022 la Secretaría de Educación del Distrito tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral.

De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, la promoción de la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las diferentes localidades de Bogotá, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales como, la atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación ante posibles riesgos y el mantenimientos correctivo, entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, de selección de un total de doscientas veintitrés (223) plantas físicas, determinando 198 sedes educativas y 25 sedes administrativas, las cuales se encuentran ubicadas en las veinte (20) localidades de Bogotá D.C.

En el marco de las metas definidas en el Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C”, Programa Línea Estratégica: 4 -Inclusión Educativa para la Equidad, Proyecto Estratégico: Ambientes de Aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con algunas infraestructuras con una antigüedad de más de cuarenta (40) años, es conveniente y necesario realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura escolar y administrativa actual, con el fin de propiciar espacios adecuados para la construcción de saberes de los niños y niñas del Distrito, garantizando a su vez el correcto seguimiento a dichas actividades.

La población beneficiada del proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá y ofrece cobertura en toda la ciudad. Igualmente, en la institución educativa trabajan un equipo de docentes, directivos docentes y administrativos de la SED, los cuales también se verían beneficiados al contar con nuevos espacios para impartir clase y áreas administrativas de atención a la comunidad, adicionalmente la comunidad educativa conformada por padres de familia y los habitantes de la zona de influencia de cada uno de los colegios.

Con estas doscientas veintitrés (223) intervenciones se beneficiará una población aproximada de ochenta mil (80.000) estudiantes para todas las localidades de la ciudad de Bogotá D.C, en entornos urbanos y rurales, involucrando en su desarrollo estrategias de empleabilidad a jóvenes, mujeres, en empleos directos e indirectos.

1.5. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado al noroccidente de la ciudad de Bogotá, más precisamente en la localidad de Engativá y Barrios Unidos.

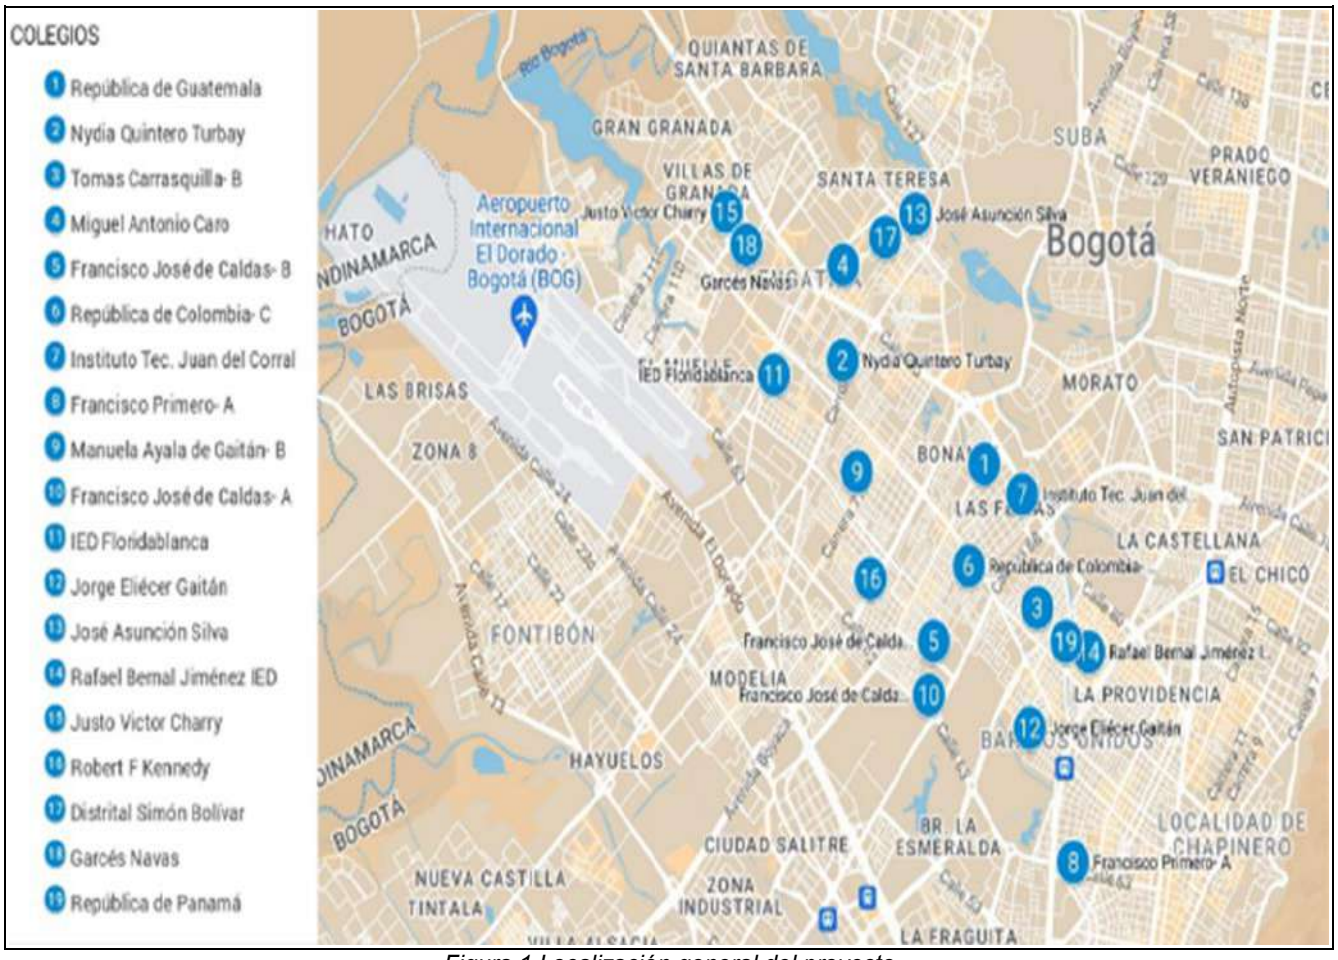


Figura 1 Localización general del proyecto
Fuente://www.google.com.co/maps/.

1.5.1. LOCALIZACIÓN PARTICULAR

1.5.1.1. Colegio República de Guatemala, sede A

El colegio República de Guatemala se encuentra localizado en la Calle 78 Bis #68a – 45, localidad de Engativá.



Figura 2. Colegio República de Guatemala (IED) – Sede – República de Guatemala.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

El colegio Nidia Quintero de Turbay se encuentra localizado en Dg. 74b #87-40, localidad de Engativá.



Figura 3. Colegio Nidia Quintero de Turbay (IED) – Sede B – Florencia.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

El colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, se encuentra localizado en Cl. 75A #63-55, localidad de Barrios Unidos.

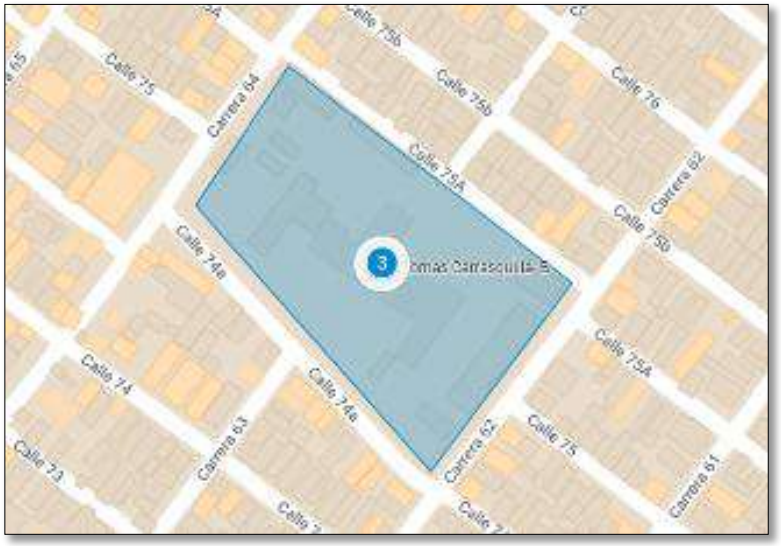


Figura 4. Colegio Tomás Carrasquilla (IED) – Sede B – Panamericana.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

El colegio Miguel Antonio Caro IED, se encuentra localizado en Tv. 94 # 81A-29, localidad de Engativá.

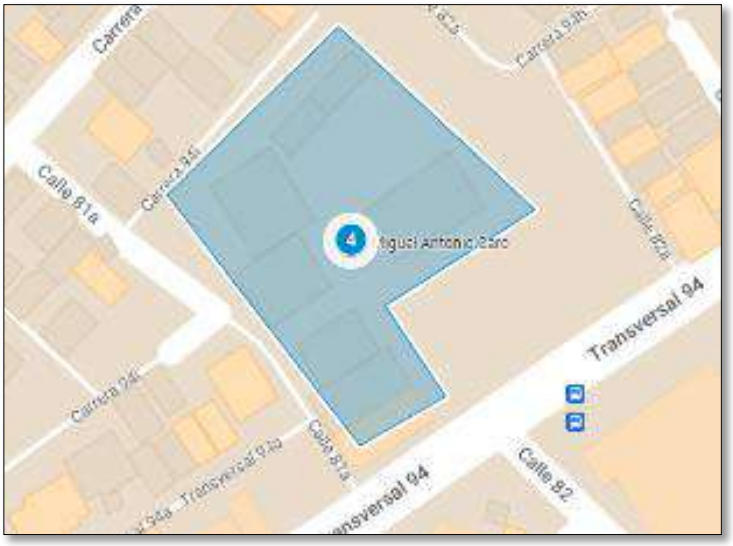


Figura 5. Colegio Miguel Antonio Caro (IED).
Fuente: Google Eath.

1.5.1.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

El colegio Francisco José de Caldas, Sede B, se encuentra localizado en Cl. 64f Bis #68g -54, localidad de Engativá.



Figura 6. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede B – Ciudad de Honda.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

El colegio República de Colombia, Sede C, se encuentra localizado en Cra. 68h #71A-01, localidad de Engativá.



Figura 7. Colegio República de Colombia (IED) – Sede C.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

El Instituto técnico Juan del Corral, se encuentra localizado en Cra. 69b #79A-42, localidad de Engativá.

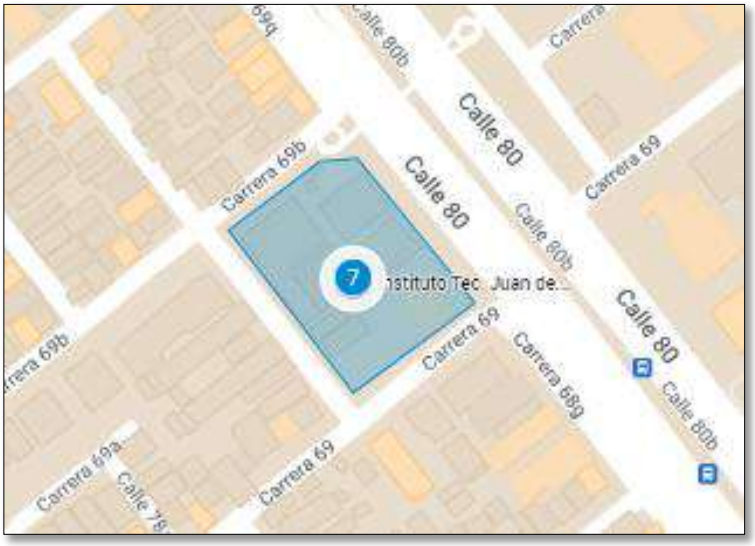


Figura 8. Instituto Técnico Juan del Corral (IED) – Sede –Juan del Corral.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.8. Colegio Francisco Primero, sede A

El Colegio Francisco Primero, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 28 #63-64, localidad de Barrios Unidos.



Figura 9. Colegio Francisco Primero (IED) – Sede A – Alemania.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

El Colegio Manuela Ayala de Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 78 #69 A -11, localidad de Engativá.



Figura 10. Colegio Manuela Ayala de Gaitán (IED) – Sede Manuela Ayala de Gaitán.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

El Colegio Francisco José de Caldas se encuentra localizado en Cra. 68f #63B-02, localidad de Engativá.



Figura 11. Colegio Francisco José de Caldas (IED) – Sede A – I.T Francisco José de Caldas.
Fuente: Google Eath.

1.5.1.11. Colegio Florida Blanca, sede A

El Colegio Florida Blanca, se encuentra localizado en Cra. 68f #63B-02, localidad de Engativá.



Figura 12. Colegio Florida Blanca (IED) – Sede – Florida Blanca.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

El Colegio Jorge Eliecer Gaitán, se encuentra localizado en Cra. 54 #65- 85, localidad de Barrios Unidos.

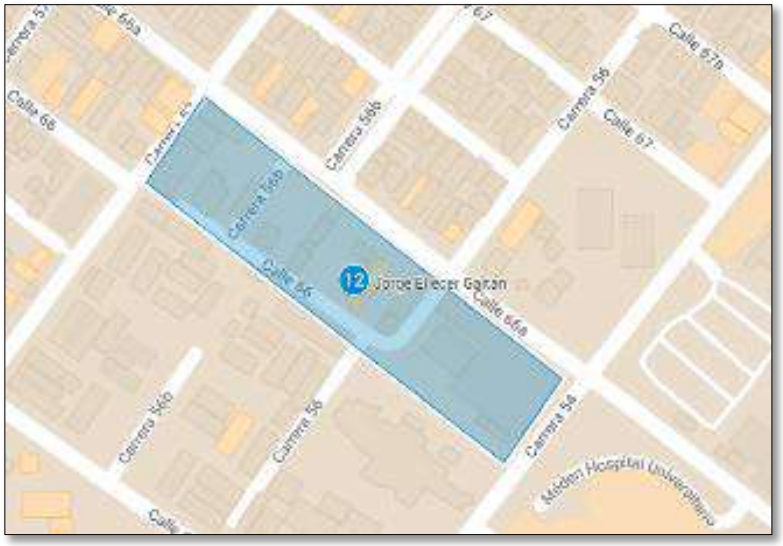


Figura 13. Colegio Jorge Eliecer Gaitán (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

El Colegio José Asunción Silva se encuentra localizado en Cl. 91 #16A - 82, localidad de Engativá.



Figura 14. Colegio José Asunción Silva (IED) – Sede – Sidauto.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

El Colegio Rafael Bernal Jiménez, Sede A, se encuentra localizado en Cr 53 #75-17, localidad de Barrios Unidos.



Figura 15. Colegio Rafael Bernal Jiménez (IED) –Sede A – Rafael Bernal Jiménez.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

El Colegio Justo Víctor Charry, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 108 #21, localidad de Engativá.



Figura 16. Colegio Justo Victor Charry (IED) – Sede A – Garcés Navas – Zona Escolar No. 4.
Fuente: Google Earth.

1.5.1.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

El Colegio Robert F Kennedy, se encuentra localizado en Av. Boyacá #64h - 39, localidad de Engativá.



Figura 17. Colegio Robert F Kennedy (IED) – Sede Robert F. Kennedy
Fuente: Google Earth.

1.5.1.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A

El Colegio Distrital Simón Bolívar, Sede A, se encuentra localizado en Cra. 92 #86 - 18, localidad de Engativá.



Figura 18. Colegio Simón Bolívar (IED) – Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.18. Colegio Garcés Navas, sede A

El Colegio Garcés Navas, se encuentra localizado en Cl. 78 #104a-2, localidad de Engativá.



Figura 19. Colegio Garcés Navas (IED) - Sede A
Fuente: Google Earth.

1.5.1.19. Colegio República de Panamá, sede A

El Colegio República de Panamá, se encuentra localizado en Cl. 75 #55a-29, localidad de Barrios Unidos.



Figura 20. Colegio República de Panamá (IED) – Sede A.
Fuente: Google Earth.

1.6. ACTIVIDADES DE OBRA

1.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se establecen los diagnósticos técnicos de las Instituciones Educativas a fin de brindar solución a las necesidades de cada una, de esta manera, se realiza la priorización de obras menores y de mejoramiento con características de reparaciones locativas en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, con ello, se efectuarán intervenciones que mejoran la infraestructura educativa en situaciones de atención prioritaria a las observaciones efectuadas por parte de la entidad contratante, obras menores de mitigación de posibles riesgos y mantenimientos correctivos, acorde con los requerimientos institucionales y de estudiantes que harán uso de estos espacios.

En atención a lo manifestado en visitas, reuniones previas al inicio de las obras, comités efectuados conjuntamente entre Supervisor de Contrato (SED), apoyo a la supervisión Contrato (SED), Contratista de obra (SAFRID INGENIERÍA S.A.S.) e Interventoría (CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022), y con base en los diagnósticos realizados, se identificó las insuficiencias y las soluciones a implementar para brindar seguridad, comodidad y estética a las instituciones a intervenir, de manera que, se presentaron las alternativas de mantenimiento y presupuestos ajustados acorde a cada necesidad y a la CARTILLA ILUSTRATIVA DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED).

De este modo, de manera general las actividades a realizar en las instituciones educativas corresponden a:

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO**: Se refiere a todas las actividades necesarias de topografía y localización del área a ser intervenida.

- **CERRAMIENTO**: Obras necesarias de aislamiento contra personas ajenas para evitar el tránsito y riesgo de accidentes.

- **DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO:** Actividad necesaria para la adecuación del área donde se realizarán las intervenciones.

- **DESMONTE:** Retiro de mobiliarios como puertas, ventanas, carpintería metálica, así como redes eléctricas, cielos rasos y cubiertas, entre otros.

- **EXCAVACIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS:** Obras para la construcción de la cimentación y adecuación de las áreas aledañas al sitio de obra.

- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO:** Actividades de construcción de soporte del edificio.

- **MAMPOSTERÍA:** Se refiere a las actividades de cerramiento de los pórticos y muros.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS:** Actividades que tienen como objetivo dotar de energía eléctrica a las edificaciones e infraestructuras.

- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS:** Sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, tanques, etc.) que se conectan entre sí para transportar determinadas cantidades de agua.

- **ENCHAPES, PINTURA, PAÑETE Y APARATOS SANITARIOS:** Obras necesarias para la entrega de las obras con las especificaciones necesarias para el buen uso de estas áreas.

- **CUBIERTA - CIELO RASO:** Adecuación de techos con las especificaciones técnicas establecidas.

- **CARPINTERÍA METÁLICA DE MADERA Y VIDRIOS:** Elementos que se instalan en los vanos dejados en la mampostería y para control en los accesos.

- **OBRAS EXTERIORES:** Todas las actividades necesarias de conectividad y urbanismo necesarias para acceder al edificio.

- **OTRAS OBRAS**: Se contemplan algunas obras complementarias como reparación de senderos, traslado de acometidas y aseo y disposición final.

1.6.2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

A continuación, se relacionan las actividades priorizadas en cada una de las instituciones educativas de acuerdo a lo expresado por la Supervisión de la secretaria de Educación de Bogotá.

1.6.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Calle 78 Bis #68a - 45	Mejoramiento de Canchas.	N/A	NO CUMPLE
	Baterías Sanitarias.	Intervención completa	CUMPLE
	Cambio de Cubierta.	Bloque C	CUMPLE
		Retirar antepecho	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de Baranda	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Patio.	N/A	NO CUMPLE

Tabla 1. Alcance Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Dg. 74b #87-40	Mejoramiento de cubierta	2 bloques / Intervención integral de cubierta. Revisar necesidad de estructura - Ventilación de aulas.	CUMPLE
	Patio.	Demolición de Tarima	CUMPLE
	Desagües.		NO CUMPLE
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Cuarto de refrigerios.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Pintura en carpintería metálica	CUMPLE

Tabla 2. Alcance Institución Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 75A #63-55	Baterías Sanitarias (Incluye Cubiertas).	Rehabilitación de baterías sanitarias - 2 bloques.	CUMPLE
	Mejoramiento de Patio y materas.	Remodelación patio y materas (Contenedores).	CUMPLE

Tabla 3. Alcance Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Tv. 94 # 81A-29	Se realizará valoración de los especialistas de la DCCEE a la estructura de los bloques existentes con el propósito de establecer situación actual y posibles intervenciones mientras se realizan nuevos estudios y obtención de licencia de construcción. Se evidencia alto deterioro en cubiertas de asbesto cemento y en piso de patio y canchas (requerimiento secretaria de Salud)	Reconocimiento de cubierta con dron. Ajuste de cubierta, canales, piezas necesarias y bajantes (impermeabilización).	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Tabla 4. Alcance Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 64f Bis #68g -54	Mejoramiento de Batería Sanitaria.	Baño y lavamanos	CUMPLE
	Staff room, salón de educación física	Demolición de divisiones Cambio de cubierta. Tanque Mejoramiento integral	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuar Shut de basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Patio.	Limpieza de zonas húmedas, Rehabilitación de cancha, demolición de placas, instalación de asfalto. (Conceptos técnicos).	CUMPLE

Tabla 5. Alcance Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68h #71A-01	Mejoramiento de Desagües.	Impermeabilización de techo y bajantes. Caja más profunda. Revisar viga canal y bajantes de cubierta.	CUMPLE
	Mejoramiento Equipo de Bombeo.	Revisar estado de bombas	CUMPLE
	Cancha deportiva.	Sellos de fisura y demarcación. Cambio de tableros de canchas.	CUMPLE
		Instalación de Cubierta en pasillo Cancha.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Tratamiento de filtraciones de Cubierta.	Impermeabilización de Cubierta.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
		Cuarto de Servicio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Ajustar cuarto de seguridad a Vestier.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Revisar filtraciones, humedades	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Reforzamiento de ventanas.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de Cuarto de Refrigerios.	Cubierta de cuarto de refrigerios y cocina, reubicación de los mismos.	CUMPLE

Tabla 6. Alcance Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

1.6.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A,

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 69b #79A-42	Impermeabilización de Cubiertas Planas	Pasillos, escalera, biblioteca acceso. Mortero y manto de impermeabilización, sifón. Impermeabilización de puente (alternativas para evitar mantenimientos continuos). Flanches en cubierta.	CUMPLE
	Sistemas de desagües en sótano.	Redistribución de tubería - Anclajes.	CUMPLE

Tabla 7. Alcance Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 28 #63-64	Mejoramiento de Cubiertas	AULAS 16,17, 18, 19. Bloque sur calle 63. Pintura.	CUMPLE
	Ventanería.	Casona Norte, Bloque sur Calle 63	CUMPLE
	Batería sanitaria.		NO CUMPLE
		Pintura y pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Zonas exteriores	Shut de basuras.	CUMPLE

Tabla 8. Alcance Institución educativa Francisco Primero, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 78 #69 A -11	Áreas exteriores	Organizar Cancha (Cambio de sentido), malla de cerramiento, mejoramiento de capa de asfalto, zona de volley ball demolición de baldosa, Demolición de muros en espacio público.	CUMPLE
	Cubierta bloque antiguo.	Bloque antiguo.	CUMPLE
	Pisos.	Demolición de baldos y ajuste.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Shut de basuras.	Shut de basuras.	CUMPLE
		Salón de educación física	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de tanque de reserva agua.		NO CUMPLE
	Sistema hidroneumático.	EAAB	CUMPLE

Tabla 9. Alcance Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68f #63B-02	Cambio de Cubierta.	Cambio de cubierta Coliseo. Cubierta entre coliseo y bloque de salones.	CUMPLE
	Baterías sanitarias.		NO CUMPLE
	Pisos.	Sendero con cubierta. Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
	Iluminación.	Iluminación Coliseo - Bloque bachillerato.	CUMPLE
		Ventanería coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura coliseo y Bloque bachillerato.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventilación Cruzada.		NO CUMPLE

Tabla 10. Alcance Institución educativa Francisco José de Caldas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 68f #63B-02	Cubierta.	Mantenimiento general bloque SENA (Pendiente por definir).	NO CUMPLE
	Pisos.	Pisos.	CUMPLE
	Ventanería.	Ventanería.	CUMPLE
	Adecuación área de servicios generales.	Adecuación área de servicios generales.	CUMPLE
	Piso Parqueadero y canchas.	Priorizar mejoramiento de canchas y parqueadero.	CUMPLE

Tabla 11. Alcance Institución educativa Florida Blanca, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 66ª #44-35	Mejoramiento de Cubiertas en Bloque de aulas y coliseo.	Bloque occidental sede A.	CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Recuperación de Instalaciones - recolección de aguas lluvia.		NO CUMPLE
		Ventanería	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Sistema de iluminación general	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Mejoramiento de baterías sanitarias	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Mejoramiento de cancha occidental y pisos de patios.		CUMPLE

Tabla 12. Alcance Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 91 #16A - 82	Áreas exteriores.	Mejoramiento de pasillo en L.	CUMPLE
	Cubiertas.	Cambio de Cubierta salones y área administrativa.	CUMPLE
	Pisos.	Salones	CUMPLE
		Shut de Basuras	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Adecuación Cuarto de Servicio generales y Refrigerio	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pintura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Iluminación	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Ventanería.	Ventanería salones y área administrativa	CUMPLE
	Muros	Shut basuras	CUMPLE

Tabla 13. Alcance Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cr 53 #75-17	Mejoramiento cubierta aula múltiple y policarbonato en marquesina.	Cambio de cubierta aula múltiple y comedor. Cambio de cubierta de policarbonato de aula principal.	CUMPLE
		Pintura general interior - exterior. / murales.	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Shut de Basura	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Instalación de césped	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Carpintería metálica	ACTIVIDAD ADICIONAL
		Pisos.	ACTIVIDAD ADICIONAL
	Cerramiento.		NO CUMPLE
	Canales.		NO CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Bajantes.		NO CUMPLE
	Rejilla de Cárcamo.		NO CUMPLE

Tabla 14. Alcance Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 108 #21	Mantenimiento de acabados de baños.	Baterías sanitarias. Soportes en fachada y acceso a cubierta.	CUMPLE

Tabla 15. Alcance Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Av. Boyacá #64h - 39	Mejoramiento de cubiertas.	Cambio de cubierta Administrativo, Enfermería, depósito y aulas. Revisión y ajuste de desagües.	CUMPLE
	Mejoramiento de Canchas.	Demoler y construcción de cancha.	CUMPLE

Tabla 16. Alcance Institución educativa Robert F Kennedy
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cra. 92 #86 - 18	Mejoramiento de cubiertas bloque de aulas y auditorio, incluye instalaciones eléctricas y ventilación.	Mejoramiento integral de bloque costado sur - oriental cubierta incluye cubierta, pisos, pintura, ventanería, sistema de iluminación. Demolición de mesones laboratorio. Reforzamiento de estructuras de cubierta. Ajuste de canales, mejoramiento de paredes fisuradas.	CUMPLE

Tabla 17. Alcance Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 78 #104a-2	Mejoramiento de cubiertas.	Mejoramiento integral de bloque con teja de fibrocemento prexistente incluye Pintura general, iluminación, ventanería, pisos. cambio de cubierta.	CUMPLE
	Baterías sanitarias		NO CUMPLE

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
	Cafetería	Demolición y construcción de salón polivalente en estructura metálica (opcional).	CUMPLE

Tabla 18. Alcance Institución educativa Garcés Navas, sede A
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

Dirección	Alcance	Diagnóstico Visita Institución	Cumple / No Cumple / Actividad Adicional
Cl. 75 #55a-29	Mejoramiento de Áreas de Comedor.	Demolición de tarima, construcción de muros divisorios, instalación de enchape, cambio de cubierta, construcción de comedor, instalación de mesones en acero inoxidable, cuartos fríos acorde a especificaciones SED.	CUMPLE

Tabla 19. Alcance Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

2.1. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 - 2022

2.1.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.
Contratista	SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT.	900.520.848-4
Representante legal	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Plazo inicial	12 MESES
Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2023

Fecha de finalización	10 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Sub - total	$ 10,949,686,818.90
Administración obra 20,94%	$ 2,292,864,419.88
Imprevistos 1.50%	$ 164,245,302.28
Utilidad 5%	$ 547,484,340.94
IVA sobre utilidad 19%	$ 104,022,024.78
Valor total inversión	$ 13,954,280,882.00

Tabla 20. Condiciones iniciales del contrato de obra.

2.1.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.
Contratista	SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT.	900.520.848-4
Representante legal	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Plazo inicial	12 MESES
Fecha de inicio	11 DE ENERO DE 2023
Fecha de finalización	10 DE ENERO DE 2024
Modificatorio No.1 – Adición y prórroga No.1	05 DE ABRIL DE 2023
Prórroga No.1	3 MESES Y 15 DÍAS
Plazo actualizado:	15 MESES Y 15 DÍAS
Terminación en virtud de la prórroga No.1	25 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	
Sub - total	$ 10,949,686,818.90
Administración obra 20,94%	$ 2,292,864,419.88

Imprevistos 1.50%	$ 164,245,302.28
Utilidad 5%	$ 547,484,340.94
IVA sobre utilidad 19%	$ 104,022,024.78
Valor total inversión inicial	$ 13,954,280,882.00
Adición No.1 – Incluido AIU	$ 5,370,000,000.00
Valor total de Contrato de obra Actualizado	$ 19,324,280,882.00

Tabla 21. Condiciones iniciales del contrato de obra.

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

2.2.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona la información inicial del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
No. Contrato	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Contratista	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022
Nit.	901.649.961-8
Representante legal	JORGE GÓMEZ FALLA
Plazo	13 MESES
Fecha de inicio	22 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de finalización	21 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022	
Costo básico	$ 770,422,377.78
IVA 19%	$ 180,716,360.22
Total	$ 951,138,738.00

Tabla 22. Condiciones iniciales del contrato de interventoría.

2.3. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Durante el desarrollo de los contratos de Obra e Interventoría, cada una de las partes cuenta con el talento humano que se relaciona a continuación:

2.3.1. PERSONAL AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La Secretaría de educación distrital cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Nombre
Supervisor de interventoría	Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Líder Territorial Zona Norte	Arq. EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRÍGUEZ
Apoyo a la supervisión	Arq. JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA

Tabla 23. Personal de la secretaria de educación distrital.

2.3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

2.3.2.1. PERSONAL CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA

El contratista SAFRID INGENIERÍA SAS, cuenta con el siguiente personal para el desarrollo o ejecución de su compromiso contractual.

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal	1	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
Director de Obra	1	LUIS EDUARDO MONTES ÁLVAREZ
Residente de obra No.1	1	LUZ ÁNGELA CAÑÓN RIVERA
Residente de obra No.2	1	ADRIANA PAOLA MÉNDEZ NAVARRO
Asesor Estructural	1	ANCIZAR PÉREZ CERVERA
Asesor Ambiental	1	NATALIA CARRANZA CEPEDA
Asesor en redes eléctricas	1	FRANK ALEXIS SÁNCHEZ SANTAMARÍA
Asesor en redes hidrosanitarias, gas y red contraincendios	1	OLGA LUCIA TORRES CAMARGO
Profesional de Costos, presupuestos y programación.	1	JEFFERSON SMIT RIVERA VELÁZQUEZ
Técnico SST No.1	1	SANDRA MILENA HUERTAS BARBOSA
Técnico SST No.2	1	ANGY LORENA OROZCO MONTILLA
Técnico SST No.3	1	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO

Cargo	Cant.	Nombre
Técnico SST No.4	1	YINNA CONSTANZA BLANCO ARENAS
Inspector de obra No. 1	1	JOSÉ DAVID ACUÑA CARVAJAL
Inspector de obra No. 2	1	HENRY ORTIGOZA MONTEALEGRE
Inspector de obra No. 3	1	MILLER ALBERTO CASTAÑEDA MONCADA
Inspector de obra No. 4	1	CAMILO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Maestro de obra	1	MANUEL GUILLERMO MARULANDA

Tabla 24. Personal mínimo de Safrid Ingeniería S.A.S.

2.3.2.2. PERSONAL ADICIONAL CONTRATISTA DE OBRA

Para el desarrollo del compromiso contractual e integral, CONSORCIO INTER COLEGIOS, conto con el siguiente personal adicional:

Personal Adicional		
Asesor en Geotecnia	1	DANILO MONTAÑA SANABRIA
Asesor Hidrosanitario		OMAR ARCHILA MENDOZA
Inspector de obra	1	JAIME ALEJANDRO MORENO MÉNDEZ
Inspector de obra	1	HENRY ORTIGOZA MONTEALEGRE
Inspector de obra	1	JESSICA CAROLINA ÁLVAREZ MORALES
Inspector de obra	1	CHRISTIAN SANTIAGO BARROS

Tabla 25. Personal adicional Safrid Ingeniería S.A.S.

2.3.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

2.3.3.1. PERSONAL CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con el siguiente personal:

Cargo	Cant.	Nombre
Representante Legal Suplente	1	ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO
Director de Interventoría	1	FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Residente de interventoría No. 1	1	CAMILO ANTONIO SAMACÁ PESCA
Residente de interventoría No. 2	1	RODOLFO CASTRO ORTEGÓN
Asesor estructural	1	JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS

Asesor ambiental	1	STEVEN ALEXANDER IBARRA SANABRIA
Asesor eléctrico	1	HERNANDO GÓMEZ CASAS
Asesor hidráulico	1	GUILLERMO EMILIO NARVÁEZ VÉLEZ
Asesor de costos y presupuestos	1	ENRIQUE LUIS MONROY MALDONADO
Abogado	1	MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
Inspector de interventoría No. 1	1	CAMILO FANDIÑO HERNÁNDEZ
Inspector de interventoría No. 2	1	NATALIA VANESSA CALDERÓN ACEVEDO
Maestro de obra	1	EDISON CALDERÓN
Inspector SST No. 1	1	LUIS CARLOS TOVAR
Inspector SST No. 2	1	GERALDINE DANIELA QUEVEDO GARAY

Tabla 26. Personal mínimo de Consorcio Intercolegios 2022.

2.3.3.2. PERSONAL ADICIONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual e integral, CONSORCIO INTER COLEGIOS, conto con el siguiente personal adicional:

Cargo	Cant.	Nombre
Coordinador de proyectos	1	MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ ROMERO
Auxiliar de Ingeniería	1	LUIS FELIPE LAVADO ALFONSO

Tabla 27. Personal adicional Consorcio Intercolegios 2022

2.4. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

2.4.1. RECURSOS DEL CONTRATISTA.

SAFRID INGENIERÍA S.A.S., en su compromiso contractual debe suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra de cada sede a intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de las obras; además contará con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
5	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 28. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista.

2.4.2. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.

Para el desarrollo del compromiso contractual, **CONSORCIO INTER COLEGIOS**, cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Cantidad	Equipo
1	Oficina
4	Equipo de oficina (Computadores, celulares)
1	Impresora y fotocopiadora

Tabla 29. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de la interventoría.

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO.

3.1. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO.

3.1.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha aprobación	14-10-2022		
Número	14-44-101164899		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 3,864,856,176.40	11-01-2023	27-10-2024
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 3,864,856,176.40	11-01-2024	11-01-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 1.395.458.088,20	11-01-2023	26-04-2027
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	$966,214,044.10	11-01-2023	26-04-2024

Tabla 30. Pólizas actualizadas del contrato de obra

3.1.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha aprobación	29/11/2022		
Número	NB-100235369		
Amparo	**Valor ($)**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**
Cumplimiento	$190.227.747,60	25/11/2022	25/06/2024
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$ 47.556.936,90	25/11/2022	25/12/2026
Calidad del servicio	$ 190.227.747,60	25/12/2023	25/12/2028

Tabla 31. Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

3.2. MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO.

A continuación, se detallan las modificaciones legales del contrato de obra e interventoría.

3.2.1. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE OBRA

A la fecha se realizó otrosí modificatorio No.1 adición y prórroga No.1 de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022, conforme con lo expuesto por parte del contratista de obra y de acuerdo con las directrices dadas por la entidad contratante en reunión efectuada el 15 de febrero de 2023, en la cual manifestó: (i) la necesidad intervenir la infraestructura de nuevos colegios, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y el talento humano y (ii) adicionar recursos que permitan el cumplimiento del objeto del contrato

3.2.2. MODIFICACIONES LEGALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha no se han realizado modificaciones legales al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

3.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DEL PROYECTO.

3.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

3.3.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.


A continuación, se presenta el presupuesto general del contrato de obra.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.								
No.	Instituciones Educativas	Sede	Presupuesto SED	% Respecto al Presupuesto SED	Valor Actualizado Contrato de Obra	% Respecto al Presupuesto Actualizado	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Francisco José de Caldas	A	$ 1.899.219.346,73	13,61%	$ 1.962.546.144,54	14,06%	25/01/2023	31/10/2023
2	Jorge Eliecer Gaitán	A	$ 1.889.077.759,47	13,54%	$ 2.024.236.834,00	14,51%	25/01/2023	31/10/2023
3	Floridablanca	A	$ 774.817.748,37	5,55%	$ 699.153.025,00	5,01%	6/02/2023	31/10/2023
4	Garces Navas	A	$ 677.885.855,00	4,86%	$ 787.083.405,50	5,64%	1/02/2023	31/07/2023
5	Rafael Bernal Jiménez	A	$ 651.384.822,00	4,67%	$ 677.034.595,00	4,85%	7/02/2023	31/07/2023
6	Juan del Corral	A	$ 527.199.087,00	3,78%	$ 524.030.444,00	3,76%	15/02/2023	12/09/2023
7	Justo Víctor Charry	A	$ 366.048.051,00	2,62%	$ 369.424.312,00	2,65%	13/02/2023	15/07/2023
8	Miguel Antonio Caro	A	$ 258.278.741,00	1,85%	$ 75.339.260,00	0,54%	7/02/2023	15/07/2023
9	Francisco Primero	A	$ 1.042.342.004,00	7,47%	$ 1.042.342.004,90	7,47%	24/03/2023	31/10/2023
10	José Asunción Silva	B	$ 856.851.911,00	6,14%	$ 856.851.911,18	6,14%	24/03/2023	31/10/2023

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.								
No.	Instituciones Educativas	Sede	Presupuesto SED	% Respecto al Presupuesto SED	Valor Actualizado Contrato de Obra	% Respecto al Presupuesto Actualizado	Fecha Inicio	Fecha Fin
11	Simón Bolívar	A	$ 749.402.904,00	5,37%	$ 749.402.904,02	5,37%	24/03/2023	31/10/2023
12	República de Colombia	C	$ 742.966.924,00	5,32%	$ 742.966.924,05	5,32%	24/03/2023	31/10/2023
13	Manuela Ayala de Gaitán	A	$ 543.797.778,00	3,90%	$ 543.797.778,83	3,90%	24/03/2023	31/10/2023
14	Nidia Quintero	B	$ 467.530.342,00	3,35%	$ 467.530.342,00	3,35%	10/05/2023	31/10/2023
15	República de Guatemala	A	$ 461.642.257,00	3,31%	$ 461.642.257,00	3,31%	10/05/2023	31/10/2023
16	República de Panamá	A	$ 440.541.748,00	3,16%	$ 440.541.748,39	3,16%	10/05/2023	31/10/2023
17	Robert F Kennedy	A	$ 376.475.297,00	2,70%	$ 376.475.297,02	2,70%	10/05/2023	31/10/2023
18	Tomas Carrasquilla	B	$ 376.628.772,00	2,70%	$ 376.268.772,57	2,70%	10/05/2023	31/10/2023
19	Francisco José de Caldas	B	$ 369.762.456,00	2,65%	$ 369.762.456,00	2,65%	10/05/2023	31/10/2023
20	Saldo		$ 482.427.078,43	3,46%	$ 407.850.466,00	2,92%	11/01/2023	10/01/2024

Tabla 32. Presupuesto Del Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

3.3.1.2. PRESUPUESTO POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022

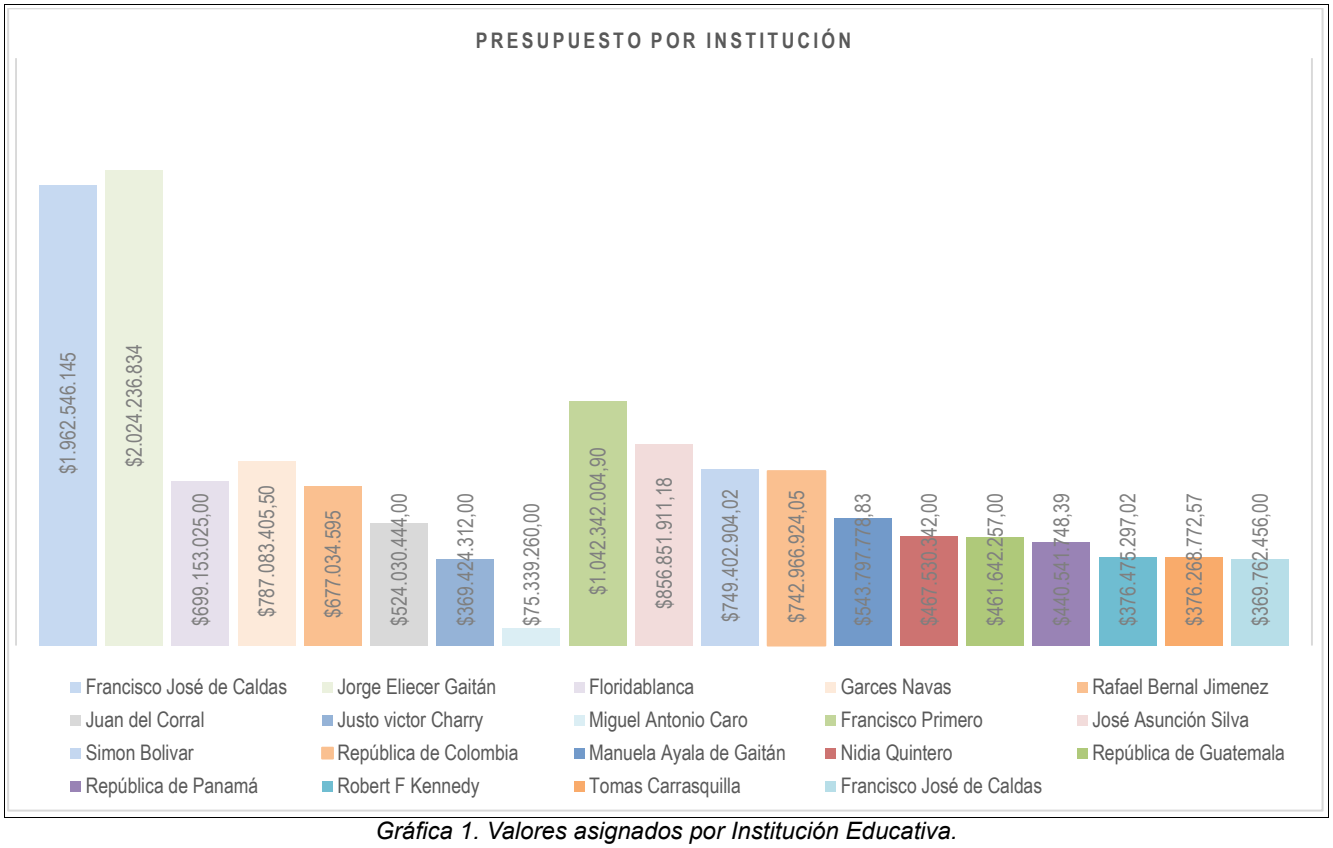

Gráfica 1. Valores asignados por Institución Educativa.

3.3.1.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
1	REP. DE GUATEMALA	A	REP. DE GUATEMALA	Calle 78 Bis #68a - 45	$ 461,642,257.00

Tabla 33. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Guatemala, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
2	NIDIA QUINTERO B	B	FLORENCIA	Dg. 74b #87-40	$ 467,530,342.00

Tabla 34. Presupuesto asignado Educativa Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
3	TOMAS CARRASQUILLA B	B	PANAMERICANA	Cl. 75A #63-55	$ 376,628,772.00

Tabla 35. Presupuesto asignado Institución Educativa Tomás Carrasquilla IED – Sede B, Panamericana.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
4	MIGUEL ANTONIO CARO A	A	MIGUEL ANTONIO CARO	Tv. 94 # 81A-29	$ 258,278,741.00

Tabla 36. Presupuesto asignado Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1558,21	$ 5.217	$ 8.129.182
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	142,00	$ 35.333	$ 5.017.286
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,56	$ 66.499	$ 2.165.207
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	123,64	$ 16.774	$ 2.073.937
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	30,00	$ 29.021	$ 870.630
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	30,03	$ 8.863	$ 266.156

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN DE AMARRES, FIJACIÓN DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	489,21	$ 13.243	$ 6.478.608
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	45,36	$ 4.165	$ 188.924
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 25.189.930,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	1,15	$ 74.796	$ 86.015
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	105,82	$ 45.116	$ 4.774.175
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	52,91	$ 95.319	$ 5.043.328
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN	M2	24,42	$ 88.225	$ 2.154.455
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	M	27,95	$ 113.346	$ 3.168.021
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	66,92	$ 8.654	$ 579.093
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 15.805.087**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	57,65	$ 73.003	$ 4.208.623
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.3	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00	$ 700.069	$ 700.069
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.908.692**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	10,00	$ 114.403	$ 1.144.030
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	27,50	$ 74.888	$ 2.059.420

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	27,50	$ 38.953	$ 1.071.208
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.274.658**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	1,00	$ 29.328	$ 29.328
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	53,45	$ 15.577	$ 832.591
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 861.919**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.12	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	20,00	$ 60.265	$ 1.205.300
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.205.300**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC 1.0 MM - TRASLUCIDA	M2	30,00	$ 89.966	$ 2.698.980
17.1.46	INSTALACIÓN DE CANAL EXISTENTE, INCLUYEN SOPORTES METÁLICOS, ANCLAJES Y DEMÁS TEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	10,03	$ 64.233	$ 644.257
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	123,64	$ 63.242	$ 7.819.241
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.162.478**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1558,21	$ 7.657	$ 11.931.196
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 11.931.196**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 75.339.260,00**

Tabla 37. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución Educativa Miguel Antonio Caro IED, sede A.

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
5	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS B	B	CIUDAD DE HONDA	Cl. 64f Bis #68g -54	$ 369,762,456.00

Tabla 38.Presupuesto asignado Institución Educativa Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
6	REPUBLICA DE COLOMBIA	C	NUEVA ESTRADA	Cra. 68h #71A-01	$ 742,966,924.00

Tabla 39. Presupuesto asignado Institución Educativa República de Colombia, sede C, Nueva Estrada
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
7	JUAN DEL CORRAL A	A	JUAN DEL CORRAL	Cra 69B #79ª - 42	$ 527,199,087.00

Tabla 40. Presupuesto asignado Instituto Técnico Juan del Corral, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	934,48	$ 5.217	$ 4.875.169
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	74,40	$ 30.460	$ 2.266.224
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	35,00	$ 16.774	$ 587.090
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILARÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	771,78	$ 29.021	$ 22.397.711
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,50	$ 22.614	$ 440.973
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,23	$ 18.855	$ 494.567
1.2.44	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	60,00	$ 5.029	$ 301.740
1.2.45	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	578,12	$ 7.165	$ 4.142.230
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	472,15	$ 21.075	$ 9.950.561
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	527,52	$ 20.851	$ 10.999.361
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	12,00	$ 7.945	$ 95.340
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	60,00	$ 4.165	$ 249.900
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 56.800.866**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	2250,00	$ 28.363	$ 63.816.750
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.816.750**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	35,00	$ 82.476	$ 2.886.660
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 2.886.660,00**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	60,00	$ 22.790	$ 1.367.400
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	578,12	$ 38.953	$ 22.519.508
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 23.886.908**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	929,06	$ 65.499,00	$ 60.852.658,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	206,51	$ 15.577,00	$ 3.216.806,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 64.069.464,00**
8	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.5	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	25,90	$ 122.378,00	$ 3.169.590,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERÍA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.169.590,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 10.805,00	$ 4.604.875,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	426,18	$ 17.655,00	$ 7.524.208,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 18.514,00	$ 4.515.379,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	750,00	$ 12.576,00	$ 9.432.000,00
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	243,89	$ 8.182,00	$ 1.995.508,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 28.071.970,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUAN DEL CORRAL					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	166,24	$ 46.399,00	$ 7.713.370,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	977,85	$ 57.806,00	$ 56.525.389,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	771,78	$ 180.356,00	$ 139.194.432,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	49,60	$ 95.654,00	$ 4.744.438,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	347,20	$ 96.953,00	$ 33.662.082,00
17.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES LATERALES PARA CUBIERTA UPVC, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 - DS= 1,00 - INCLUYEN PINTURAS	M	49,60	$ 146.822,00	$ 7.282.371,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	792,09	$ 34.274,00	$ 27.148.093,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 276.270.175,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,58	$ 7.657,00	$ 5.058.061,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.058.061,00**
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**21. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 0,00**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 524.030.444,00**

Tabla 41. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Instituto Técnico Juan del Corral, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
8	FRANCISCO I A	A	FRANCISCO I	Cra. 28 #63-64	$ 1,042,342,004.00

Tabla 42.Presupuesto asignado Institución educativa Francisco Primero, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
9	MANUELA AYALA DE GAITÁN A	A	MANUELA AYALA DE GAITÁN	Cra. 78 #69 A -11	$ 543,797,778.00

Tabla 43. Presupuesto asignado Institución educativa Manuela Ayala de Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
10	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS A	A	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Cra. 68f #63B-02	$ 1,899,219,346.00

Tabla 44. Presupuesto asignado Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	3829,12	$ 4.978,00	$ 19.061.354,00
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	8,70	$ 286.562,00	$ 2.492.115,00
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	114,58	$ 66.499,00	$ 7.619.189,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	416,77	$ 55.496,00	$ 23.128.978,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1642,96	$ 30.460,00	$ 50.044.537,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,67	$ 26.177,00	$ 2.451.869,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	493,07	$ 13.915,00	$ 6.861.063,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2313,37	$ 29.021,00	$ 67.136.189,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	139,00	$ 22.614,00	$ 3.143.346,00
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	66,00	$ 74.796,00	$ 4.936.536,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	66,00	$ 95.319,00	$ 6.291.054,00
2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	83,35	$ 531.091,00	$ 44.268.386,00
2.2.18	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,70	$ 1.232.133,00	$ 10.715.368,00
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	790,66	$ 7.900,00	$ 6.246.233,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	9178,51	$ 9.719,00	$ 89.205.948,00
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	4,00	$ 882.241,00	$ 3.528.964,00
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	159,41	$ 3.793,00	$ 604.642,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	70,00	$ 193.703,00	$ 13.559.210,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	18,00	$ 294.411,00	$ 5.299.398,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	70,00	$ 51.975,00	$ 3.638.250,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	3117,04	$ 43.727,00	$ 136.298.956,00
7.2.49	GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM	M	2297,47	$ 14.628,00	$ 33.607.411,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	2395,85	$ 71.855,00	$ 172.153.874,00
7.2.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 8 MM COLOR A ELECCION	M2	364,00	$ 133.849,00	$ 48.721.036,00
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	93,67	$ 820.064,00	$ 76.811.295,00
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	493,07	$ 619.206,00	$ 305.311.655,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	179,00	$ 26.095,00	$ 4.671.005,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9178,51	$ 20.030,00	$ 183.845.575,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	650,00	$ 12.000,00	$ 7.800.000,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2022,60	$ 23.727,00	$ 47.990.230,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	71,94	$ 57.806,00	$ 4.158.275,00
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	275,00	$ 135.267,00	$ 37.198.425,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	2313,37	$ 180.356,00	$ 417.229.402,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	107,77	$ 91.273,00	$ 9.836.491,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	650,00	$ 96.953,00	$ 63.019.450,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3829,12	$ 7.657,00	$ 29.319.563,00
NP2	DESMONTE DE CABALLETE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	ML	107,77	$ 14.526,13	$ 1.565.481,03
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CANALES, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	71,94	$ 36.500,00	$ 2.625.627,50
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 1.962.546.144,53**

Tabla 45. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Francisco José de Caldas, Sede A.

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
11	FLORIDABLANCA A	A	FLORIDABLANCA	Cra. 68f #63B-02	$ 774,817,748.00

Tabla 46.Presupuesto asignado Institución educativa Florida Blanca, sede A

Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO FLORIDA BLANCA					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.354,00	$ 0,00
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1108,851	$ 5.217,00	$ 5.784.876,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	211,65	$ 35.333,00	$ 7.478.229,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	453,56	$ 35.555,00	$ 16.126.482,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	412,62	$ 30.460,00	$ 12.568.417,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6,25	$ 24.626,00	$ 153.913,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	116,13	$ 218.577,00	$ 25.383.445,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,10	$ 13.915,00	$ 126.627,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,33	$ 29.021,00	$ 8.396.646,00
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN	1,00	$ 146.581,00	$ 146.581,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	11,00	$ 5.029,00	$ 55.319,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	433,68	$ 7.165,00	$ 3.107.317,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	74,75	$ 7.945,00	$ 593.889,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 80.429.197,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	485,77	$ 108.346,00	$ 52.631.334,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	485,77	$ 95.319,00	$ 46.303.196,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	200,05	$ 122.556,00	$ 24.517.867,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	330,05	$ 8.654,00	$ 2.856.291,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 126.308.688,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1819,98	$ 6.662,00	$ 12.124.707,00
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	1819,98	$ 28.363,00	$ 51.620.093,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	589,01	$ 9.719,00	$ 5.724.588,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 69.469.388,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	6,00	$ 32.621,00	$ 195.726,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 195.726,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 521.131,00	$ 521.131,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	433,68	$ 42.185,00	$ 18.294.791,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	33,00	$ 165.535,00	$ 5.462.655,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	11,00	$ 22.790,00	$ 250.690,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	433,68	$ 38.953,00	$ 16.893.137,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 41.422.404,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	412,62	$ 43.727,00	$ 18.042.652,00
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	719,59	$ 177.121,00	$ 127.454.678,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	M	152,64	$ 52.995,00	$ 8.089.157,00
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	719,59	$ 52.022,00	$ 37.434.563,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	157,60	$ 5.595,00	$ 881.772,00
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	200,05	$ 82.537,00	$ 16.511.890,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 208.414.712,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON	M2	12,50	$ 354.225,00	$ 4.427.813,00

	PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.				
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 1.00 X 1.00 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	6,00	$ 252.544,00	$ 1.515.264,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 5.943.077,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 10.805,00	$ 6.364.253,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	589,01	$ 20.030,00	$ 11.797.870,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	345,12	$ 30.300,00	$ 10.457.136,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	745,19	$ 23.727,00	$ 17.681.123,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 46.300.382,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.149.764,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	289,33	$ 180.356,00	$ 52.182.401,00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	28,80	$ 95.654,00	$ 2.754.835,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,00	$ 96.953,00	$ 8.144.052,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 63.081.288,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1108,85	$ 7.657,00	$ 8.490.472,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 8.490.472,00**
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	412,62	$ 85.420,00	$ 35.246.034,57
NP6	DESMONTE TUBERÍA PVC	ML	433,68	$ 8.536,00	$ 3.701.892,48
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 699.153.025,05**

Tabla 47. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Florida Blanca, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado

12	JORGE ELIECER GAITÁN A	A	JORGE ELIECER GAITÁN	Cra. 54 #65- 85	$ 1,889,077,759.00

Tabla 48.Presupuesto asignado Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1924,15	$ 5.217,00	$ 10.038.282,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	200,00	$ 124.946,00	$ 24.989.200,00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO METÁLICO REDONDO 1-1/2" H=2.2 M, (NO INCLUYE CONCRETO NI ACERO DE REFUERZO)	M	100,00	$ 194.702,00	$ 19.470.200,00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1745,53	$ 66.499,00	$ 116.075.780,00
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,34	$ 58.160,00	$ 542.982,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	147,72	$ 8.856,00	$ 1.308.217,00
1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	114,63	$ 218.577,00	$ 25.054.826,00
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	11,00	$ 13.915,00	$ 153.065,00
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	94,19	$ 75.460,00	$ 7.107.608,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	93,10	$ 26.177,00	$ 2.437.097,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	289,46	$ 13.915,00	$ 4.027.786,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	18,00	$ 14.791,00	$ 266.238,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	750,93	$ 29.021,00	$ 21.792.687,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	459,76	$ 22.614,00	$ 10.397.026,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	68,00	$ 8.576,00	$ 583.168,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	178,00	$ 8.863,00	$ 1.577.614,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	1513,12	$ 7.165,00	$ 10.841.505,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1259,00	$ 21.075,00	$ 26.533.425,00
1.2.50	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 253.728,00	$ 507.456,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5146,15	$ 10.552,00	$ 54.302.175,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	128,12	$ 4.165,00	$ 533.628,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 338.539.965,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	201,10	$ 74.796,00	$ 15.041.176,00
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 166.156,00	$ 16.706.653,00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	100,55	$ 181.505,00	$ 18.249.965,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	106,24	$ 601.926,00	$ 63.948.341,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	29,40	$ 202.929,00	$ 5.966.113,00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	48,00	$ 471.301,00	$ 22.622.448,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	405,90	$ 7.900,00	$ 3.206.610,00
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	580,43	$ 8.654,00	$ 5.023.015,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 150.764.321,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	31,82	$ 115.309,00	$ 3.669.132,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.669.132,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	$ 123.235,00	$ 1.478.820,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	27,00	$ 68.341,00	$ 1.845.207,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	31,00	$ 36.827,00	$ 1.141.637,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	5,00	$ 1.153.783,00	$ 5.768.915,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.234.579,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	68,00	$ 193.703,00	$ 13.171.804,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	6,00	$ 5.799.668,00	$ 34.798.008,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	68,00	$ 51.975,00	$ 3.534.300,00
5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	178,00	$ 27.103,00	$ 4.824.334,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	1513,12	$ 38.953,00	$ 58.940.563,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 115.269.009,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	502,74	$ 43.727,00	$ 21.983.312,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO 51 X 51 CM	M2	1688,51	$ 75.304,00	$ 127.151.911,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 149.135.223,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	147,72	$ 69.612,00	$ 10.283.154,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.283.154,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	289,46	$ 619.206,00	$ 179.233.140,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS (2) HOJAS Y DOS (2) CUERPOS FIJOS, MARCO EN PEINAZO CAL. 18 - HORIZONTALES EN TUBO CUADRADO DE 40 MM x 20 MM CAL.18, TABLERO TIPO PANEL, INCLUYE CERRADURA, PASADORES, FALLEBAS, PINTURA ANTICORROSIVO EN CROMATO DE ZINC Y ESMALTE TIPO ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD.	M2	10,90	$ 574.844,00	$ 6.265.800,00
9.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON AISLANTE ACUSTICO	M2	82,20	$ 1.044.918,00	$ 85.892.991,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 271.391.931,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	14,00	$ 872.835,00	$ 12.219.690,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	$ 688.692,00	$ 1.377.384,00
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 2.105.916,00	$ 2.105.916,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	10,14	$ 892.636,00	$ 9.051.329,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 24.754.319,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	55,80	$ 1.066.170,00	$ 59.495.271,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 59.495.271,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.6	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5146,15	$ 49.149,00	$ 252.928.126,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	5146,15	$ 10.805,00	$ 55.604.151,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	7536,12	$ 20.030,00	$ 150.948.484,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	232,50	$ 30.300,00	$ 7.044.750,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	5921,06	$ 23.727,00	$ 140.488.991,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 607.014.502,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	139,50	$ 93.091,00	$ 12.986.195,00
16.1.8	MINI CANCHA MÚLTIPLE DE 15 X 9 M PAVIMENTO ASFALTICO MD 10 60-70 EN OBRA	M2	39,22	$ 168.035,00	$ 6.589.661,00
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 10.149.764,00	$ 10.149.764,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 29.725.620,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	750,93	$ 180.356,00	$ 135.434.406,00
17.1.44	SEI DE VIGA CANAL GALVANIZADA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARÁ SEGUN LOS METROS LINEALES REALMENTE INSTALADOS). Ds = 100 CM - CAL 20	M	15,32	$ 116.327,00	$ 1.782.130,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 137.216.536,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1924,15	$ 7.657,00	$ 14.733.204,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 14.733.204,00**
VALOR TOTAL					**$ 1.922.226.766,00**

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A					
No.	Descripción	Und	Cantidad	V. Unit	V.Total
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					
VALOR TOTAL					$ 1.922.226.766,00

Tabla 49. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede A.

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
13	JOSÉ ASUNCIÓN SILVA B	B	SIDAUTO	Cl. 91 #16A - 82	$ 856,851,911.00

Tabla 50. Presupuesto asignado Institución educativa José Asunción Silva, sede B, Sidauto

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
14	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ A	A	RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ	Cr 53 #75-17	$ 651,384,822.00

Tabla 51.Presupuesto asignado Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.

Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	Descripción	Und	Cantidad	V. Unit	V. Total
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1834,63	$ 5.217,00	$ 9.571.265,00
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	85,00	$ 124.946,00	$ 10.620.410,00
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,00	$ 35.555,00	$ 568.880,00
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,07	$ 20.949,00	$ 1.405.049,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	539,66	$ 30.460,00	$ 16.438.044,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,09	$ 24.626,00	$ 297.728,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,77	$ 26.177,00	$ 360.457,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	99,48	$ 13.915,00	$ 1.384.264,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1121,29	$ 29.021,00	$ 32.540.957,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	6,80	$ 15.191,00	$ 103.299,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	35,00	$ 5.029,00	$ 176.015,00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	4,00	$ 142.626,00	$ 570.504,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 74.036.872,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	4,80	$ 108.346,00	$ 520.061,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,08	$ 601.926,00	$ 650.080,00
2.2.8	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	18,00	$ 202.929,00	$ 3.652.722,00
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	12,00	$ 87.417,00	$ 1.049.004,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	56,87	$ 106.387,00	$ 6.050.229,00
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	9,00	$ 122.556,00	$ 1.103.004,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	79,58	$ 8.654,00	$ 688.685,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 13.713.785,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE LIVIANO RUGOSO	M2	40,00	$ 114.906,00	$ 4.596.240,00
SUBTOTAL	**3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 4.596.240,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	$ 98.496,00	$ 196.992,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 196.992,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO T8. INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00	$ 70.647,00	$ 211.941,00
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INFERIOR. INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	35,00	$ 308.542,00	$ 10.798.970,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	35,00	$ 51.975,00	$ 1.819.125,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 12.830.036,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	822,02	$ 43.727,00	$ 35.944.469,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	642,75	$ 150.374,00	$ 96.652.889,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	34,00	$ 73.121,00	$ 2.486.114,00
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1,12	$ 105.976,00	$ 118.693,00
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2	112,20	$ 180.761,00	$ 20.281.384,00
7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	56,87	$ 116.961,00	$ 6.651.572,00
7.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	33,60	$ 19.403,00	$ 651.941,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 162.787.062,00**
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	25,20	$ 69.612,00	$ 1.754.222,00
8.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DE 12 MM VISTO UNA CARA.	M2	34,00	$ 62.105,00	$ 2.111.570,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.865.792,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	13,77	$ 559.540,00	$ 7.704.866,00
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	6,60	$ 631.610,00	$ 4.168.626,00
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	6,80	$ 928.733,00	$ 6.315.384,00
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	116,82	$ 619.206,00	$ 72.335.645,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 90.524.521,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE PARA CARCAMO ANCHO 20 CM	M	12,00	$ 280.966,00	$ 3.371.592,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.371.592,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	32,22	$ 44.672,00	$ 1.439.332,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO BERNAL JIMÉNEZ					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	545,29	$ 17.655,00	$ 9.627.095,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	10,80	$ 26.095,00	$ 281.826,00
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	539,44	$ 18.514,00	$ 9.987.192,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	822,00	$ 12.576,00	$ 10.337.472,00
13.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	10,20	$ 30.830,00	$ 314.466,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1442,50	$ 23.727,00	$ 34.226.198,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 66.213.581,00**
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
16.1.13	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	3,20	$ 140.745,00	$ 450.384,00
SUBTOTAL	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 450.384,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	49,64	$ 48.641,00	$ 2.414.539,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	77,04	$ 68.682,00	$ 5.291.261,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	66,00	$ 63.242,00	$ 4.173.972,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	776,05	$ 180.356,00	$ 139.965.274,00
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	283,50	$ 197.406,00	$ 55.964.601,00
17.1.42	LAMINA ANCHO 0.09 a 0.15 CAL 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA PODER ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS)	M	514,08	$ 34.274,00	$ 17.619.578,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 225.429.225,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1016,78	$ 7.657,00	$ 7.785.484,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1783,87	$ 6.297,00	$ 11.233.029,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 19.018.513,00**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 677.034.595,00**

Tabla 52. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Rafael Bernal Jiménez, sede A.

Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garces Navas

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado

15	JUSTO VICTOR CHARRY A	A	GARCÉS NAVAS	Cra. 108 #21	$ 366,048,051.00

Tabla 53.Presupuesto asignado Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	177,88	$ 5.217,00	$ 928.018,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,20	$ 41.408,00	$ 795.096,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,28	$ 24.626,00	$ 130.025,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	390,46	$ 8.856,00	$ 3.457.882,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	42,00	$ 26.177,00	$ 1.099.434,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	84,00	$ 14.791,00	$ 1.242.444,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	2259,50	$ 9.719,00	$ 21.960.041,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	60,00	$ 193.703,00	$ 11.622.180,00
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	100,00	$ 114.403,00	$ 11.440.300,00
5.1.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS LED T8, INCLUYE SOQUETS. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	120,00	$ 35.860,00	$ 4.303.200,00
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2	177,88	$ 30.565,00	$ 5.437.009,00
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	390,46	$ 69.612,00	$ 27.180.454,00
9.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTA FUEGO FABRICADAS EN LAMINA COLLED ROLLED CAL 18 CON MONTAJE FIJO Y MARCO TIPO ZAPATO DE 12CM DE ANCHO (NO INCLUYE BARRAS ANTIPANICO Y CIERRAPUERTAS)	M2	57,08	$ 825.461,00	$ 47.117.314,00
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	23,90	$ 619.206,00	$ 14.801.500,00
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	UN	4,00	$ 1.198.611,00	$ 4.794.444,00
9.3.22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2	20,06	$ 664.220,00	$ 13.320.932,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	32,00	$ 872.835,00	$ 27.930.720,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	10,00	$ 688.692,00	$ 6.886.920,00
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M	34,21	$ 892.636,00	$ 30.537.078,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V. Total**
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	52,60	$ 1.066.170,00	$ 56.080.542,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 10.805,00	$ 24.413.854,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	2259,50	$ 17.655,00	$ 39.891.402,00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	177,88	$ 26.095,00	$ 4.641.870,00
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	41,05	$ 161.138,00	$ 6.615.037,00
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	41,05	$ 34.945,00	$ 1.434.562,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	177,88	$ 7.657,00	$ 1.362.054,00
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 369.424.312,00**

Tabla 54. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Justo Víctor Charry, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
16	ROBERT F KENNEDY A	A	ROBERT F KENNEDY	Av. Boyacá #64h - 39	$ 376,475,297.00

Tabla 55. Presupuesto asignado Institución educativa Robert F Kennedy, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
17	SIMÓN BOLÍVAR SEDE A	A	SIMÓN BOLÍVAR	Cra. 92 #86 - 18	$ 749,402,904.00

Tabla 56. Presupuesto asignado Institución educativa Distrital Simón Bolívar, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
18	GARCÉS NAVAS SEDE A	A	GARCÉS NAVAS	Cl. 78 #104a-2	$ 677,885,855.00

Tabla 57. Presupuesto asignado Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	1868,14	$ 5.217,00	$ 9.746.105,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60,00	$ 35.333,00	$ 2.119.980,00
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	97,13	$ 18.057,00	$ 1.753.876,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,06	$ 26.177,00	$ 184.705,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	32,59	$ 13.915,00	$ 453.534,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1868,14	$ 29.021,00	$ 54.215.393,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1115,43	$ 22.614,00	$ 25.224.357,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	84,00	$ 5.029,00	$ 422.436,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	850,00	$ 7.165,00	$ 6.090.250,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	850,00	$ 21.075,00	$ 17.913.750,00
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	239,56	$ 119.052,00	$ 28.519.990,00
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN	63,66	$ 142.626,00	$ 9.080.270,00
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN	1,00	$ 384.601,00	$ 384.601,00
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	450,12	$ 13.278,00	$ 5.976.693,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	143,55	$ 4.165,00	$ 597.886,00
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	100,00	$ 96.086,00	$ 9.608.600,00
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2	35,00	$ 130.394,00	$ 4.563.790,00
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	375,00	$ 9.719,00	$ 3.644.625,00
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	84,00	$ 51.975,00	$ 4.365.900,00
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	84,00	$ 22.790,00	$ 1.914.360,00
5.1.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO 1#6 + 1#8 + 1#10T	M	850,00	$ 38.953,00	$ 33.110.050,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	7,06	$ 687.543,00	$ 4.851.303,00
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	17,00	$ 38.902,00	$ 661.334,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	375,00	$ 17.655,00	$ 6.620.625,00

PRESUPUESTO GRUPO 2: COLEGIO GARCÉS NAVAS					
No.	**Descripción**	**Und**	**Cantidad**	**V. Unit**	**V.Total**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	2110,260	$ 23.727,00	$ 50.070.139,00
16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA METALICA PARA CERCHA METALICA	M	390,00	$ 29.446,00	$ 11.483.940,00
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	97,13	$ 46.399,00	$ 4.506.735,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	70,00	$ 63.242,00	$ 4.426.940,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	219,15	$ 57.806,00	$ 12.667.896,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1868,14	$ 180.356,00	$ 336.930.889,00
17.1.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	1055,13	$ 96.953,00	$ 102.298.019,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	13,00	$ 103.890,00	$ 1.350.570,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1868,14	$ 7.657,00	$ 14.304.375,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	1868,14	$ 6.297,00	$ 11.763.700,00
NP1	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE VIGA CANAL, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	219,15	$ 36.500,00	$ 7.998.792,50
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 5 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	32,59	$ 850.000,00	$ 27.704.220,00
VALOR TOTAL					**$ 817.530.628,50**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)					**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 817.530.628,50**

Tabla 58. Presupuesto ajustado mediante informe de diagnóstico, Institución educativa Garcés Navas, sede A.
Fuente: Elaboración Propia.

3.3.1.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

No.	Colegio	Sede	Nombre de Sede	Dirección	Presupuesto Asignado
19	REPÚBLICA DE PANAMÁ SEDE A	A	REPÚBLICA DE PANAMÁ	Cl. 75 #55a-29	$ 440,541,748.00

Tabla 59. Presupuesto asignado Institución educativa República de Panamá, sede A
Fuente: Elaboración Propia


3.3.1.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de obra.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.		
Sub - total		$ 10.949.686.818,90
Administración obra	20,94%	$ 2.292.864.419,88
Imprevistos	1,50%	$ 164.245.302,28

Utilidad	5,00%	$ 547.484.340,95
IVA sobre utilidad	19,00%	$ 104.022.024,78
Valor total inversión		**$ 13.954.280.882,00**
Valor Adición No.1		**$ 5.370.000.000**
Valor Total de Contrato		**$ 19.324.280.882,00**

Tabla 60. Valores generales del contrato de obra.

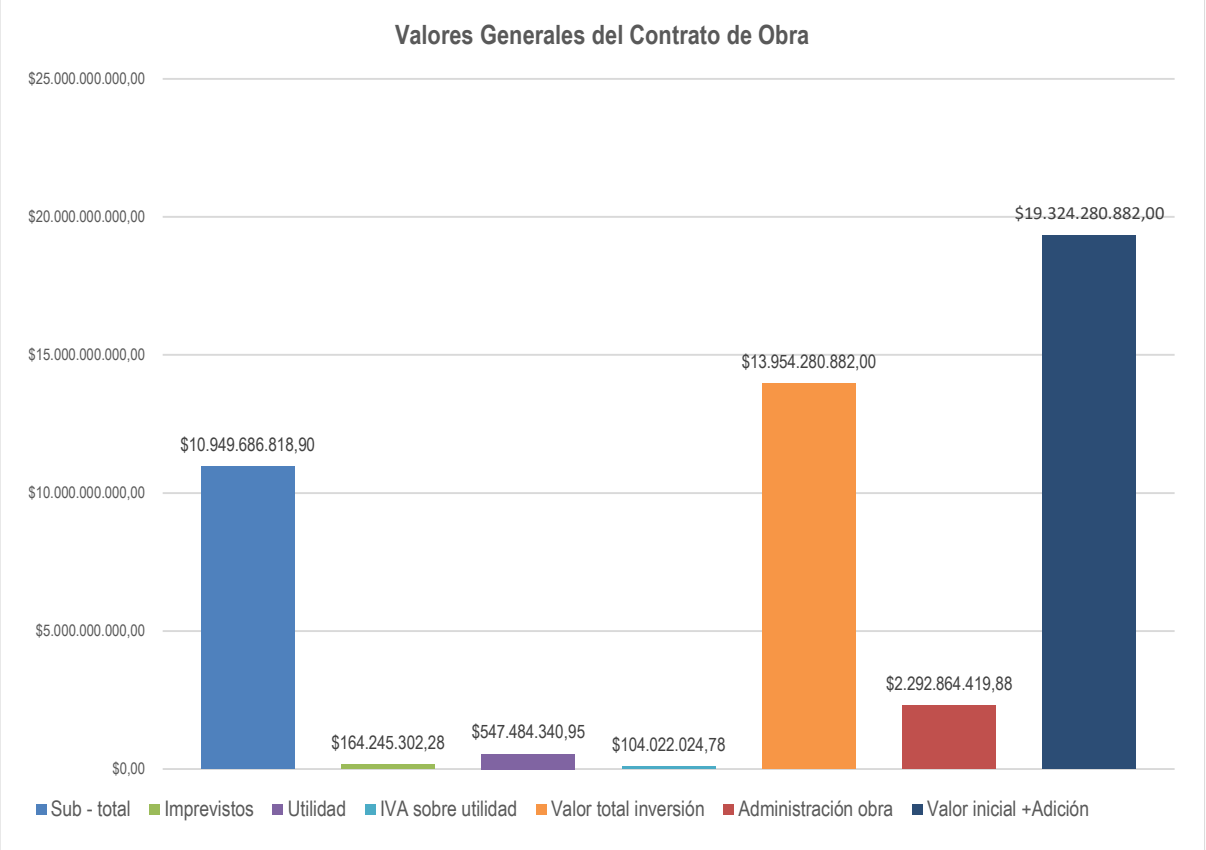


Gráfica 2. Valores generales del contrato de obra.

3.3.1.4. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe se tramito el acta de recibo parcial de obra No.1 y No.2.

Descripción	Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	%	Valor con AIU
Valor Acta parcial de obra No.1	2232	47437	1.17	$ 163,188,031.00
Valor Acta parcial de obra No.2	2232	47437	1.58	$ 220,392,311.41
Valor Total			2.75	$ 383,580,342.00

Tabla 61. Actas de recibo parcial de contrato de obra.

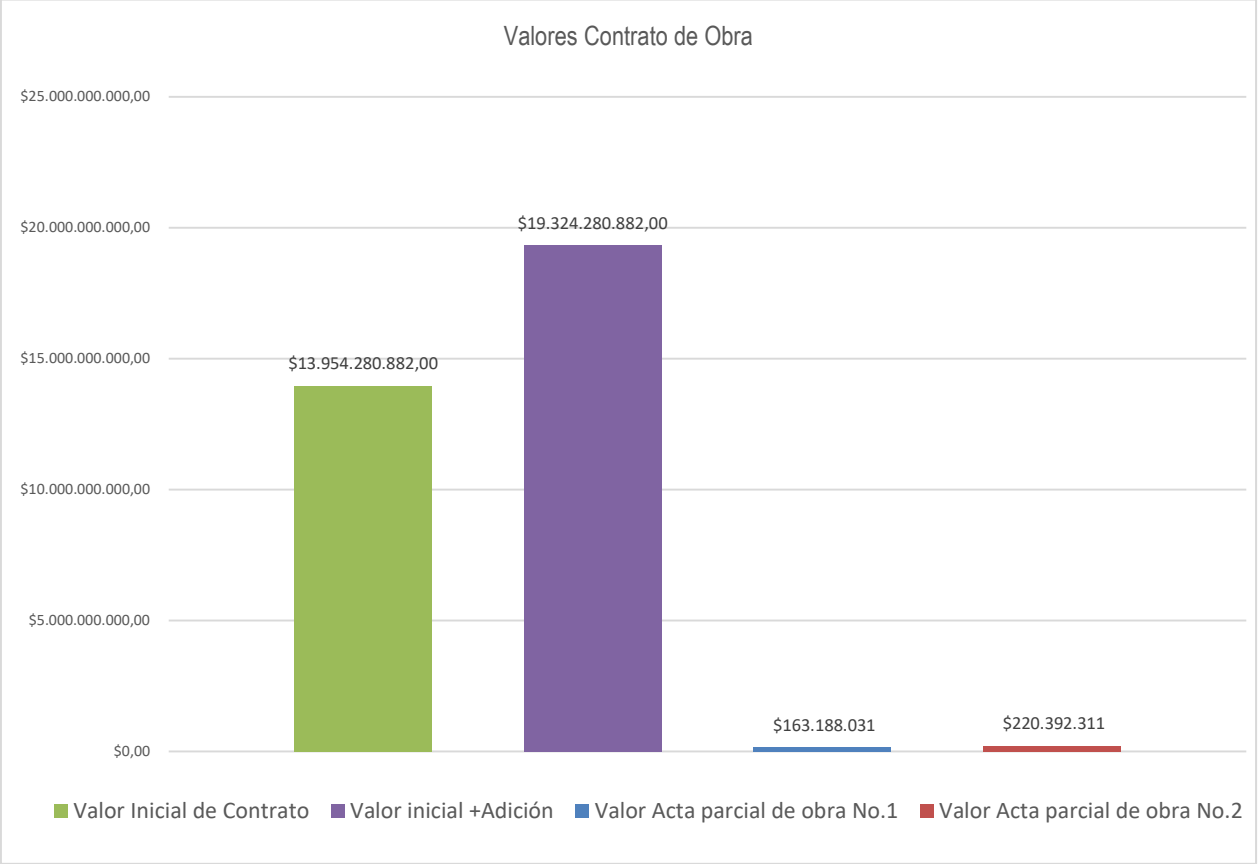

Gráfica 3. Actas parciales de obra.


3.3.1.5. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

De acuerdo con la programación adoptada por SAFRID INGENIERÍA S.A.S., la interventoría realiza seguimiento de acuerdo a las actividades ejecutadas.

Periodo	Del	Al	% Programado	% Ejecutado
Semana 1	11 de enero de 2023	17 de enero de 2023	0,00%	0,00%
Semana 2	18 de enero de 2023	24 de enero de 2023	0,01%	0,07%
Semana 3	25 de enero de 2023	31 de enero de 2023	0,15%	0,30%
Semana 4	1 de febrero de 2023	7 de febrero de 2023	0,52%	0,54%
Semana 5	8 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	1,12%	0,78%
Semana 6	15 de febrero de 2023	21 de febrero de 2023	1,73%	1,45%
Semana 7	22 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	2,30%	1,61%
Semana 8	1 de marzo de 2023	7 de marzo de 2023	2,97%	1,90%

Semana 9	8 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	4,32%	2,37%
Semana 10	15 de marzo de 2023	21 de marzo de 2023	5,90%	2,67%
Semana 11	22 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	7,55%	3,02%
Semana 12	29 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	9,20%	3,56%
Semana 13	5 de abril de 2023	11 de abril de 2023	11,14%	6,31%

Tabla 62. Tabla de valores programados y ejecutados del contrato de obra.

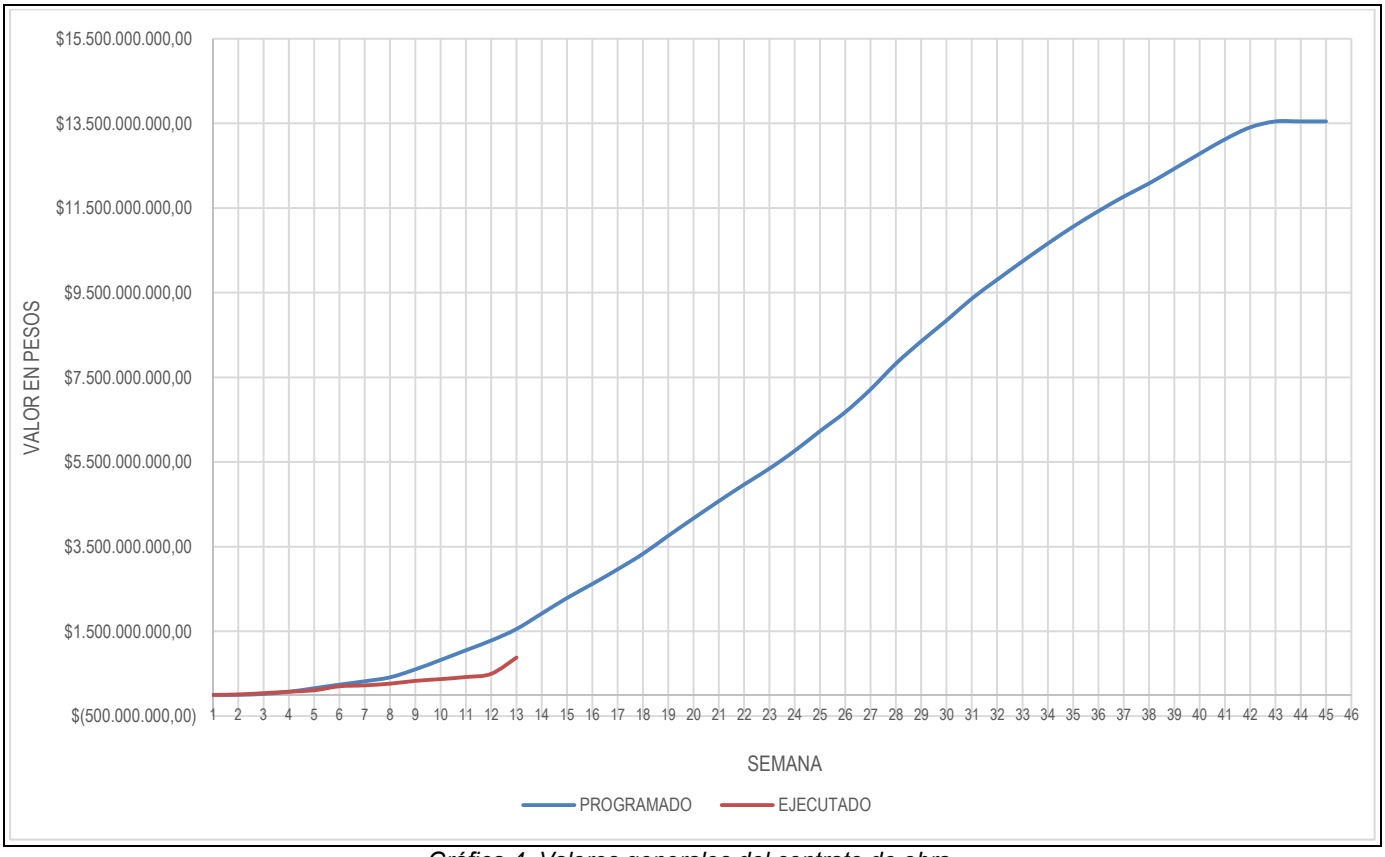

Gráfica 4. Valores generales del contrato de obra.

3.3.2. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A continuación, se relaciona el control financiero del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

3.3.2.1. VALORES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

Descripción	Valor Inicial
Costo directo	$ 799.276.737,00

Descripción	Valor Inicial
I.V.A. (19%)	$ 151.862.580,00
Valor total inversión	**$ 951.139.317,00**

Tabla 63. Valores del contrato de interventoría.




Gráfica 5. Valor del contrato de interventoría.

3.3.2.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 – 2022.

A la fecha de cierre del presente informe se tramito el acta de recibo parcial de obra No.1 y No. 2.

Descripción	Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	% Avance	Valor con AIU
Acta parcial de interventoría No.1	2409	5440	1.17	$ 10.571.908,0
Acta parcial de interventoría No.2	2409	5440	1.58	$ 14.276.593,00
Valor Total			2.75	$ 24.848.501,00

Tabla 64. Actas de recibo parcial de contrato de interventoría.

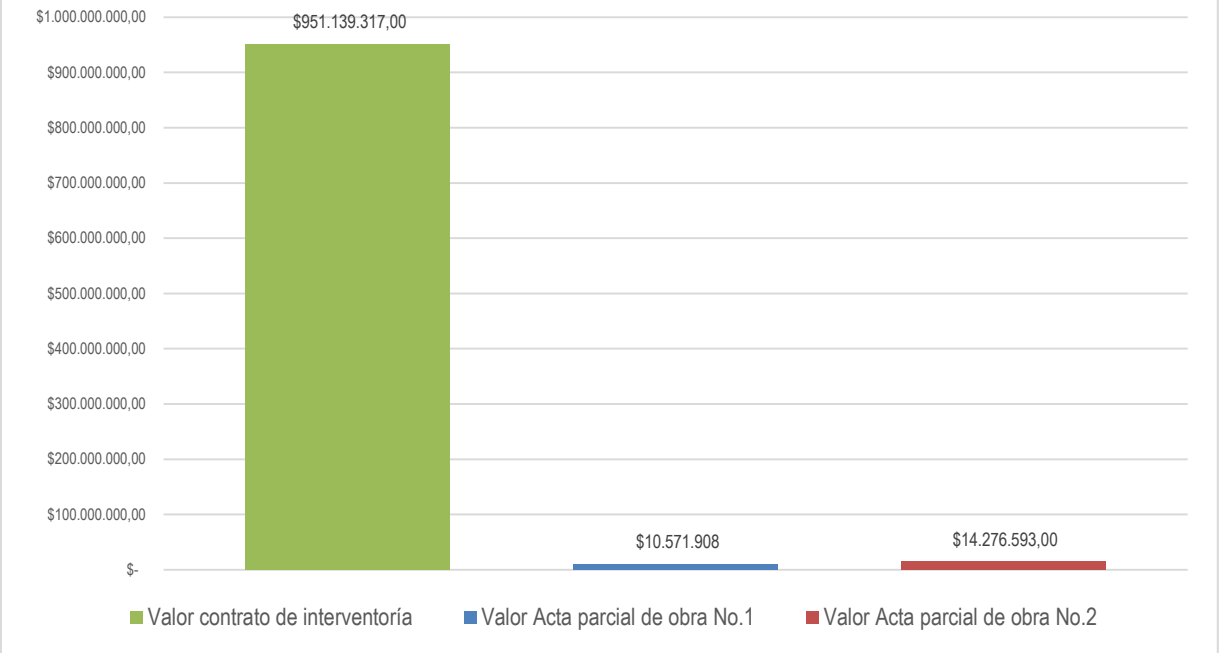

Gráfica 6. Actas parciales de interventoría.

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

En Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022, se firma acta de inicio entre Arq. Luis Antonio Pinzón Parra, director de construcción y conservación de Establecimientos educativos en calidad de Supervisor y Jorge Gómez Falla en calidad de representante legal del Consorcio Inter Colegios 2022.

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S., como Contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato.

3.4.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Obligaciones	Cumplimiento
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	
1. Obligaciones previas para la suscripción del contrato	Cumplido.
2. Obligaciones relacionadas con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio generada por enfermedades contagiosas reguladas por emergencias sanitarias.	En proceso.
3. Obligaciones conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020	En proceso.
4. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental	En proceso.
5. Obligaciones administrativas	En proceso.

Obligaciones	Cumplimiento
6. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra.	En proceso.
7. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.	En proceso.
8. Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar)	En proceso.
9. Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	En proceso.
10. Obligaciones en Materia de Servicios Públicos.	En proceso.
11. Obligaciones de información.	En proceso.
12. Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato.	En proceso.
13. Obligaciones especiales.	En proceso.
14. Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación.	En proceso.
15. Obligaciones de trámites y permisos	En proceso.
16. Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato.	En proceso.
17. Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista	En proceso.

Tabla 65. Control de cumplimiento del contrato de obra.

3.4.2. CORRESPONDENCIA

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_039	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES CRONOGRAMA, PRESUPUESTO E INFORMES DE DIAGNÓSTICO.
CIC_BTA_SED_050_2022_040	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_041	24 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 023-GP2-SED-2022 "REMISION DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
CIC_BTA_SED_050_2022_043	25 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL No. 1 Y 2
CIC_BTA_SED_050_2022_044	26 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACION DE LIBRO DE BITÁCORA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_045	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
CIC_BTA_SED_050_2022_046	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN RCD
CIC_BTA_SED_050_2022_047	31 de enero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD ADICACIÓN DE COMUNICADOS EN FÍSICO Y LINEAMIENTOS GENERALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_048	31 de enero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD APERTURA PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_049	01 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ALCANCE COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_048 SOLICITUD APERTURA PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_050	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 034-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER GAITAN"

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_051	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 032-GP2-SED-2022 "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE COLEGIO NYDIA QUINTERO"
CIC_BTA_SED_050_2022_052	2 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 035-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER Y FLORIDABLANCA "
CIC_BTA_SED_050_2022_053	3 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTA PARCIAL DE ENTREGA FISICA DE OBRA COLEGIO MORISCO IED.
CIC_BTA_SED_050_2022_054	3 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADOS No. 031-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – CUARTO BOMBAS COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE A" Y No. 033-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – PROPUESTA ESCALERA DE GATO COLEGIO NYDIA QUINTERO."
CIC_BTA_SED_050_2022_055	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD REMISIÓN FORMATO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES POR DELISTOS SEXUALES LEY 1918 DEL 2018.
CIC_BTA_SED_050_2022_056	6 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_057	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APERTURA DE PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_058	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 039-GP2-SED-2022 Y OFICIO No. 042-GP2-SED-2022 INGRESOS DE PERSONAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_059	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LINEAMINETOS PARA EL RECIBO COMUNICADOS REMITIDOS A CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_060	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REUNIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SAFRID INGENIERA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_061	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_062	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTACION DE INGRESO Y PARAFISCALES PERSONAL NUEVO – ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CIC_BTA_SED_050_2022_063	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_064	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA AL COMUNICADO No. 049-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES DIAGNÓSTICOS
CIC_BTA_SED_050_2022_065	13 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADOS No. 044-GP2-SED-2022 055-GP2-SED-2022 SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS COLEGIOS Y AULAS MODULARES.
CIC_BTA_SED_050_2022_066	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 051-GP2-SED-2022 REUNIÓN ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES
CIC_BTA_SED_050_2022_067	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_068	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 048-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_069	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 047-GP2-SED-2022 APROBACIÓN BOBCAT Y OPERARIO.
CIC_BTA_SED_050_2022_070	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 052-GP2-SED-2022 RADICACIÓN CONCEPTO ESTRUCTURALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_071	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 059-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_072	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 060-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_073	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 053-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL E INFORME MENSUAL SST
CIC_BTA_SED_050_2022_074	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No.017-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENVÍO ACTAS DE VECINDAD"
CIC_BTA_SED_050_2022_075	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 063-GP2-SED-2022, No. 055-GP2-SED-2022 y No. 054-GP2-SED-2022, DISEÑOS AULAS MODULARES Y PLANOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_076	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_076 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_077	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 064-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_078	21 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 049-GP2-SED-2022 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_079	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_080	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.001 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_051	01 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 032-GP2-SED-2022 "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE COLEGIO NYDIA QUINTERO"
CIC_BTA_SED_050_2022_052	2 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 035-GP2-SED-2022 "REMISIÓN DE DOCUMENTOS PERSONAL OPERATIVO SEDE JORGE ELIECER Y FLORIDABLANCA "
CIC_BTA_SED_050_2022_053	3 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	REMISIÓN ACTA PARCIAL DE ENTREGA FISICA DE OBRA COLEGIO MORISCO IED.
CIC_BTA_SED_050_2022_054	3 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA A COMUNICADOS No. 031-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – CUARTO BOMBAS COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE A" Y No. 033-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – PROPUESTA ESCALERA DE GATO COLEGIO NYDIA QUINTERO."
CIC_BTA_SED_050_2022_055	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S. C.	SOLICITUD REMISIÓN FORMATO AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES POR DELISTOS SEXUALES LEY 1918 DEL 2018.
CIC_BTA_SED_050_2022_056	6 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_057	6 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APERTURA DE PIN AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_058	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 039-GP2-SED-2022 Y OFICIO No. 042-GP2-SED-2022 INGRESOS DE PERSONAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_059	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	LINEAMINETOS PARA EL RECIBO COMUNICADOS REMITIDOS A CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_060	7 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REUNIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE SAFRID INGENIERA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_061	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DOCUMENTOS EJECUCIÓN DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_062	8 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTACION DE INGRESO Y PARAFISCALES PERSONAL NUEVO – ENTREGA DE DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO.
CIC_BTA_SED_050_2022_063	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE LISTADO DE PERSONAL AUTORIZADO CONTRATISTA DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_064	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA AL COMUNICADO No. 049-GP2-SED-2022 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES DIAGNÓSTICOS
CIC_BTA_SED_050_2022_065	13 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADOS No. 044-GP2-SED-2022 055-GP2-SED-2022 SOLICITUD PLANOS ARQUITECTONICOS COLEGIOS Y AULAS MODULARES.
CIC_BTA_SED_050_2022_066	13 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO 051-GP2-SED-2022 REUNIÓN ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES
CIC_BTA_SED_050_2022_067	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 1.
CIC_BTA_SED_050_2022_068	14 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 048-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES.
CIC_BTA_SED_050_2022_069	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 047-GP2-SED-2022 APROBACIÓN BOBCAT Y OPERARIO.
CIC_BTA_SED_050_2022_070	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 052-GP2-SED-2022 RADICACIÓN CONCEPTO ESTRUCTURALES.
CIC_BTA_SED_050_2022_071	15 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 059-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_072	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 060-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_073	17 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 053-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL E INFORME MENSUAL SST
CIC_BTA_SED_050_2022_074	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No.017-GP2-SED-2022 CON ASUNTO "ENVÍO ACTAS DE VECINDAD"
CIC_BTA_SED_050_2022_075	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADOS No. 063-GP2-SED-2022, No. 055-GP2-SED-2022 y No. 054-GP2-SED-2022, DISEÑOS AULAS MODULARES Y PLANOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_076	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_076 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 1.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_077	20 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 064-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_078	21 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 049-GP2-SED-2022 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_079	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ENTREGA DE INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_080	21 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.001 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_081	22 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE VISITA DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_082	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 067-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR
CIC_BTA_SED_050_2022_083	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACORDE A DIRECTIRCES DETERMINADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
CIC_BTA_SED_050_2022_084	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL DE OBRA.
CIC_BTA_SED_050_2022_085	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	TRASLADO MEMORANDO FECHAS DE RADICACION Y PROGRAMACION PAC 2023 CUENTAS DCCEE.
CIC_BTA_SED_050_2022_086	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 066-GP2-SED-2022 - ENTREGA INFORME RECOMENDACIONES JORGE ELIECER GAITAN SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_087	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 069-GP2-SED-2022 - CITACIÓN MESA DE TRABAJO.
CIC_BTA_SED_050_2022_088	22 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL No.6
CIC_BTA_SED_050_2022_089	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 070-GP2-SED-2022 - TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_090	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 071-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN DE PERSONAL IED VICTOR CHARRY, BERNAL JIMENEZ Y JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_091	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 072-GP2-SED-2022 - PERSONAL CONTRATISTA COLEGIO REPÚBLICA DE PANAMÁ
CIC_BTA_SED_050_2022_092	23 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN DE ENTREGA DE DESGLOSE AIU Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_093	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO ACTUALIZACIÓN BALANCE PRESUPUESTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_094	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 075-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN ANDAMIO ESCALERA PARA ACCESO IED JUAN DEL CORRAL.
CIC_BTA_SED_050_2022_095	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 076-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_096	24 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 077-GP2-SED-2022 - APROBACIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_097	24 de febrero de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORMES SEMANALES
CIC_BTA_SED_050_2022_098	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 065-GP2-SED-2022 - RADICADO – DIAGNOSTICOS ESTRUCTURALES, PLAN LOCAL, ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y MEMORIAS DE LAS CORREAS
CIC_BTA_SED_050_2022_099	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 078-GP2-SED-2022 - NO AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES FINES DE SEMANA
CIC_BTA_SED_050_2022_100	27 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CIC_BTA_SED_050_2022_101	28 de febrero de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL PARA IED RAFAEL BERNAL Y MIGUEL ANTONIO CARO
CIC_BTA_SED_050_2022_102	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD PENDIENTES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_103	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES
CIC_BTA_SED_050_2022_104	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN INFORME SEMANAL No.7
CIC_BTA_SED_050_2022_105	01 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN INFORME NO. 1 DE SST Y AMBIENTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_106	2 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 082-GP2-SED-2022 RADICADO CÁLCULO DE PLACAS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE A
CIC_BTA_SED_050_2022_107	2 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	TRASLADO COMUNICADO No. 085-GP2-SED-2022 - SOLICITUD AUTORIZACION APLICACIÓN DE COLOR AMARILLO REAL ESTRUCTURA CUBIERTA
CIC_BTA_SED_050_2022_108	3 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 087-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR IED JUAN DEL CORRAL
CIC_BTA_SED_050_2022_109	3 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DIRECTOR DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_110	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 093-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES
CIC_BTA_SED_050_2022_111	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 080-GP2-SED-2022 ELEMENTOS QUE FUERON DADOS DE BAJA
CIC_BTA_SED_050_2022_112	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. OFICIO No. 090-GP2-SED-2022 CONCEPTOS GEOTÉCNICOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORGE ELIECER GAITÁN Y FLORIDA BLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_113	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REITERACIÓN COMUNICADO CIC_BTA_SED_050_2022_078 OBSERVACIONES PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.
CIC_BTA_SED_050_2022_114	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA OFICIO No. 083-GP2-SED-2022 - ENTREGA CORTE DE OBRA No. 001 CON SUS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES
CIC_BTA_SED_050_2022_115	6 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_116	8 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 097-GP2-SED-2022 NO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE OPERADOR Y RETROEXCAVADORA SEDE FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_117	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.1
CIC_BTA_SED_050_2022_118	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 094-GP2-SED-2022 - RADICADO CONCEPTOS ESTRUCTURALES #2
CIC_BTA_SED_050_2022_119	9 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 095-GP2-SED-2022 RADICADO DIAGNOSTICOS Y RECOMENDACIONES COLEGIOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JORGE ELIECER GAITÁN Y FLORIDA BLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_120	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.8
CIC_BTA_SED_050_2022_121	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_122	9 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_123	10 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S	RESPUESTA COMUNICADO No. 102-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED MIGUEL ANTONIO CARO, GARCES NAVAS Y SIMÓN BOLIVAR SEDE A.
CIC_BTA_SED_050_2022_124	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 104-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED SAN JOSE NORTE
CIC_BTA_SED_050_2022_125	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 105-GP2-SED-2022 NO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE EXCAVADORA Y OPERARIO IED FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_126	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INGRESO DE PERSONAL
CIC_BTA_SED_050_2022_127	14 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 88-GP2-SED-2022 DISCRIMINACIÓN AIU.
CIC_BTA_SED_050_2022_128	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 89-GP2-SED-2022 AJUSTE A CALCULOS ESTRUCTURALES FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_129	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 088-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES DISCRIMINACIÓN A.I.U.
CIC_BTA_SED_050_2022_130	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 106-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST 2
CIC_BTA_SED_050_2022_131	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 113-114-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INGRESO PERSONAL Y MAQUINARIA
CIC_BTA_SED_050_2022_132	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 110-GP2-SED-2022 RADICADO CONCEPTO ESTRUCTURAL COLEGIO SAN JOSÉ NORTE.
CIC_BTA_SED_050_2022_133	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 100-GP2-SED-2022 RADICADO ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ.

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_134	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 107-GP2-SED-2022 RADICADO FICHA TÉCNICA DE TEJA Y PERFILERÍA.
CIC_BTA_SED_050_2022_135	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 099-116-GP2-SED-2022 DOCUMENTACIÓN TALA ÁRBOLES COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_136	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 118-GP2-SED-2022 OPERARIO EXCAVADORA FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_137	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REMISIÓN HOJA DE VIDA CAMBIO ASESOR AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_138	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL 2
CIC_BTA_SED_050_2022_139	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	BALANCE GENERAL DE CONTRATO, CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FORMA DE PAGO.
CIC_BTA_SED_050_2022_140	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 115-GP2-SED-2022 RADICADO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_141	22 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REPROGRAMACIÓN REUNIÓN COMPONENTE ELÉCTRICO SOLICITADO POR SAFRID INGENIERÍA SAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_142	22 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 122-GP2-SED-2022 AUTORIZACIÓN TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
CIC_BTA_SED_050_2022_143	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	DATOS DE INGRESO AL "WEBFILE SDA" CARGUE DE RCD DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_144	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 125-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR A LA IED GARCES NAVAS Y IED SIMON BOLIVAR.
CIC_BTA_SED_050_2022_145	23 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_146	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 120-GP2-SED-2022 RESPUESTA A OFICIO CIC_BTA_SED_050_2022_128 CÁLCULOS
CIC_BTA_SED_050_2022_147	24 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	APROBACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS EMERGENCIAS EDUCATIVAS.
CIC_BTA_SED_050_2022_148	24 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO ENTREGA DE ACTA PARCIAL No. 1
CIC_BTA_SED_050_2022_149	24 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.10
CIC_BTA_SED_050_2022_150	27 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_151	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APROBACIÓN INFORME NO. 2 DE SST
CIC_BTA_SED_050_2022_152	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S..	RESPUESTA COMUNICADO No. 128-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJ O NOCTURNO
CIC_BTA_SED_050_2022_153	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 131-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJADOR IED GARCES NAVAS

Consecutivo oficio	Fecha	Dirigido a	Asunto
CIC_BTA_SED_050_2022_154	28 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE OBRA
CIC_BTA_SED_050_2022_155	28 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CIC_BTA_SED_050_2022_156	29 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	REQUERIMIENTO DE PENDIENTES
CIC_BTA_SED_050_2022_157	29 de marzo de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.11
CIC_BTA_SED_050_2022_158	30 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 132 Y 133-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED GARCES NAVAS Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CIC_BTA_SED_050_2022_159	31 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	CRONOGRAMA REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL
CIC_BTA_SED_050_2022_160	03 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	APREMIO INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO No.11
CIC_BTA_SED_050_2022_161	04 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 136-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y JORGE ELIECER
CIC_BTA_SED_050_2022_162	05 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD Y REITERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No.1 Y NO. 2 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_163	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME MENSUAL No.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022
CIC_BTA_SED_050_2022_164	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA INFORME SEMANAL No.12
CIC_BTA_SED_050_2022_165	10 de abril de 2023	SAFRID INGENIERIA S.A.S.	RESPUESTA COMUNICADO No. 142-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FLORIDABLANCA
CIC_BTA_SED_050_2022_166	05 de abril de 2023	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.1 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077642 DE 2022

Tabla 66. Control correspondencia.

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

3.5.1. ACTIVIDADES DE OBRA DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.

Las actividades adelantadas por parte de Contratista de obra en el periodo de 11 de marzo a 10 de abril de 2023, se enfocaron en labores de orden administrativo y técnico como se presenta a continuación:

3.5.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

3.5.2.1. Colegio República de Guatemala, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.

3.5.2.2. Colegio Nidia Quintero de Turbay, sede B, Florencia

- Ejecución de informe diagnóstico.

3.5.2.3. Colegio Tomás Carrasquilla IED, sede B, Panamericana

- Ejecución de informe diagnóstico.


3.5.2.4. Colegio Miguel Antonio Caro IED, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de placa maciza.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual, relleno en recebo común.
- Concretos: Fundición de concreto corriente.
- Refuerzos: Instalación de malla electro soldada.
- Redes de alcantarillado: suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 4".
- Alistado de piso: Concreto de limpieza para caja de inspección.
- Acabado de piso: Instalación de bordillo prefabricado.
- Cubiertas e impermeabilizaciones: Suministro e instalación de teja termo acústica y mantenimiento de canales y bajantes.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Miguel Antonio Caro		07/02/2023	15/07/2023	37,97%	71,40%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-33,43%
1	Preliminares	07/02/2023	02/05/2023	28,82%	20,14%	Cerramiento, demolición placa.	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	0,00%	27,95%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, instalación malla electro soldada.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	0,00%	10,71%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4"	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	08/06/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	0,00%	1,13%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado	

16	Obras exteriores	11/04/2023	09/05/2023	0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	4,26%	11,46%	Suministro e instalación de teja termo acústica UPVC.
20	Aseo y disposición final	07/03/2023	12/07/2023	4,89%	0,00%	

Tabla 67. Avance de obra Miguel Antonio Caro.

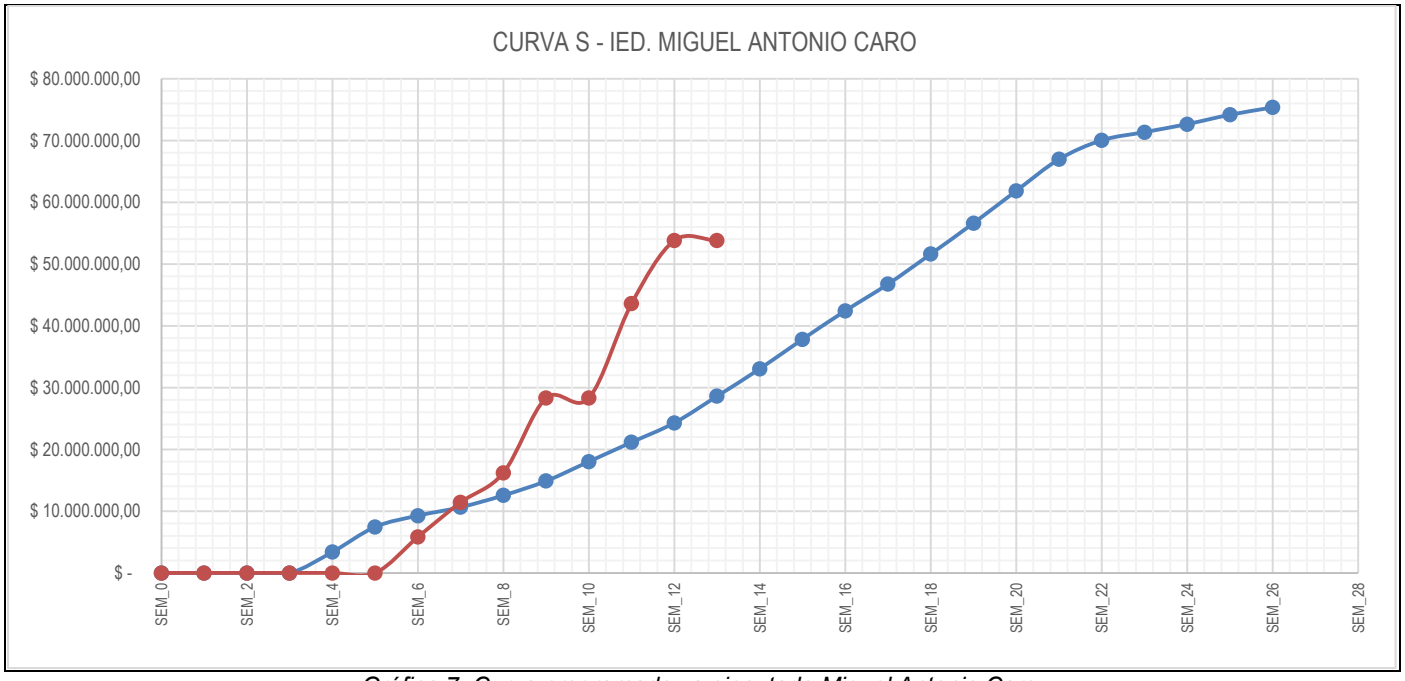

Gráfica 7. Curva programado vs ejecutado Miguel Antonio Caro.

3.5.2.5. Colegio Francisco José de Caldas, sede B, Ciudad de Honda

- Ejecución de informe diagnóstico.

3.5.2.6. Colegio República de Colombia, sede C, Nueva Estrada

- Ejecución de informe diagnóstico.


3.5.2.7. Instituto Técnico Juan del Corral, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cieloraso, desmonte de lámparas y picado de membrana y placa en terrazas, demolición de acabado y alistado de piso.
- Elementos estructurales: Anclajes de varillas 3/8".

- Instalaciones sanitarias: Suministro e instalación de tubería de 4".
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero impermeabilizado, mediacaña en mortero.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Instituto técnico Juan del Corral		15/02/2023	12/09/2023	1,46%	3,86%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	-2,40%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	1,17%	3,86%	Cerramiento, retiro de tuberías, desmonte de cielo raso, lámparas y picado de membrana y placa, demolición de acabado y alistado de piso.	
3	Mampostería	03/07/2023	31/07/2023	0,00%	0,20%	Anclajes varillas 3/8"	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	04/05/2023	0,00%	0,50%	Suministro e instalación de tubería 4".	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	0,00%	2,62%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña	
8	Mampostería seca	17/05/2023	02/06/2023	0,00%	0,00%		
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	0,00%	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	0,00%	0,00%		
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	08/08/2023	0,29%	0,00%		

Tabla 68. Avance de obra Instituto técnico Juan del Corral

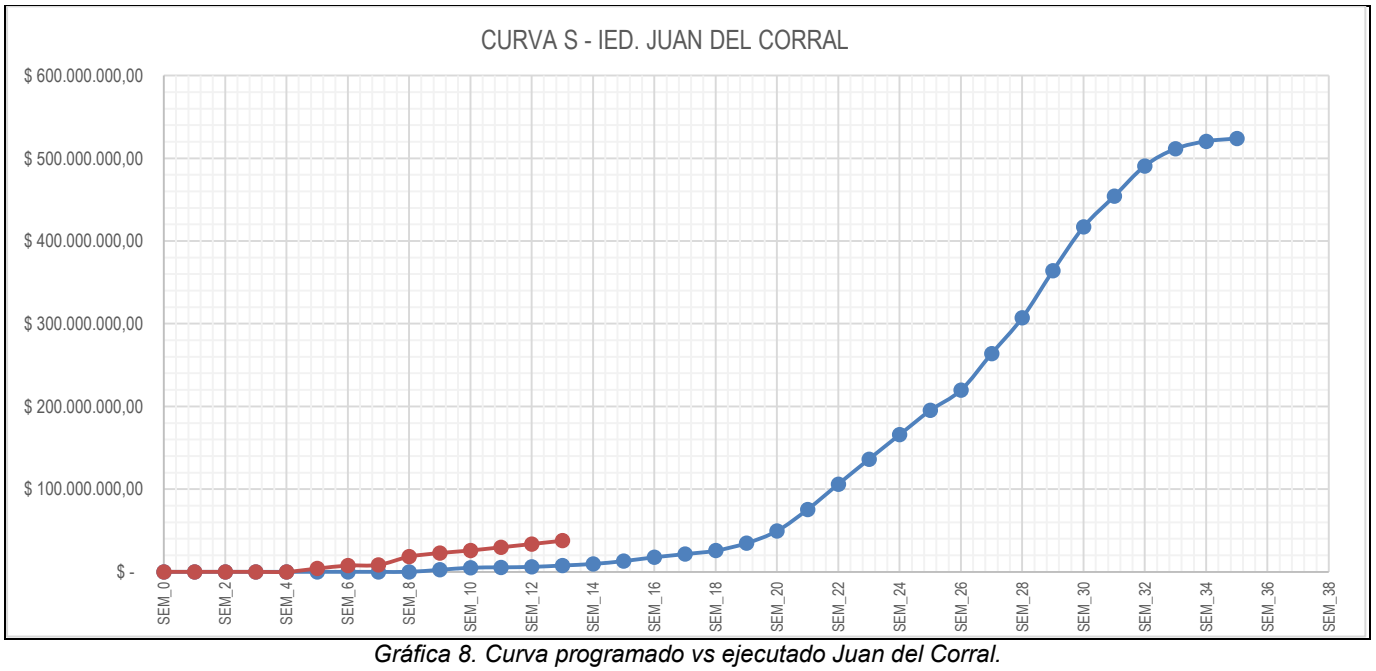

Gráfica 8. Curva programado vs ejecutado Juan del Corral.

3.5.2.8. Colegio Francisco Primero, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.

3.5.2.9. Colegio Manuela Ayala de Gaitán, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.


3.5.2.10. Colegio Francisco José de Caldas, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: demolición de acabado y alistado de piso, demolición de muro en mampostería y enchape de muro y pega, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, desmonte de cieloraso, red eléctrica, lámparas y tuberías hidrosanitarias.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno con material seleccionado y recebo común compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Refuerzos: Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro de malla electrosoldada 6mm y estructura metálica.
- Mampostería: Resane de fisuras en muros.
- Instalaciones hidrosanitarias: Suministro e instalación de tubería Novafort de 8” y tubería PVC-S 2”, sondeo y revisión de desagües.
- Redes de drenaje aguas de infiltración: Suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
- Pañete y pintura: pañete muro 1:4 incluye filos y dilataciones.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	35,11%	11,15%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	23,96%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	13,32%	3,32%	Cerramiento, demolición de pisos, muros, pañete, desmonte de puertas, ventanas, cieloraso, aparatos sanitarios, lámparas, salidas eléctricas, tubería eléctrica	
2	Estructura	04/03/2023	23/09/2023	0,95%	4,31%	Excavación manual en recebo compactado y en material común, suministro e instalación de subbase B-400, suministro de estructura metálica y acero de refuerzo	
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	1,36%	0,05%	Resane de fisuras en muros	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas	14/04/2023	20/09/2023	0,00%	0,43%	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2”, sondeo y revisión de desagües y suministro e instalación de geotextil tejido 1700	

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	y de control de incendio					
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	0,00%	0,00%	
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	2,61%	0,00%	
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	8,76%	0,00%	
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	2,27%	3,05%	Pañete en muros y filos en ventanas
16	Obras exteriores	01/09/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	5,83%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%	

Tabla 69. Avance de obra Francisco José de Caldas, Sede A

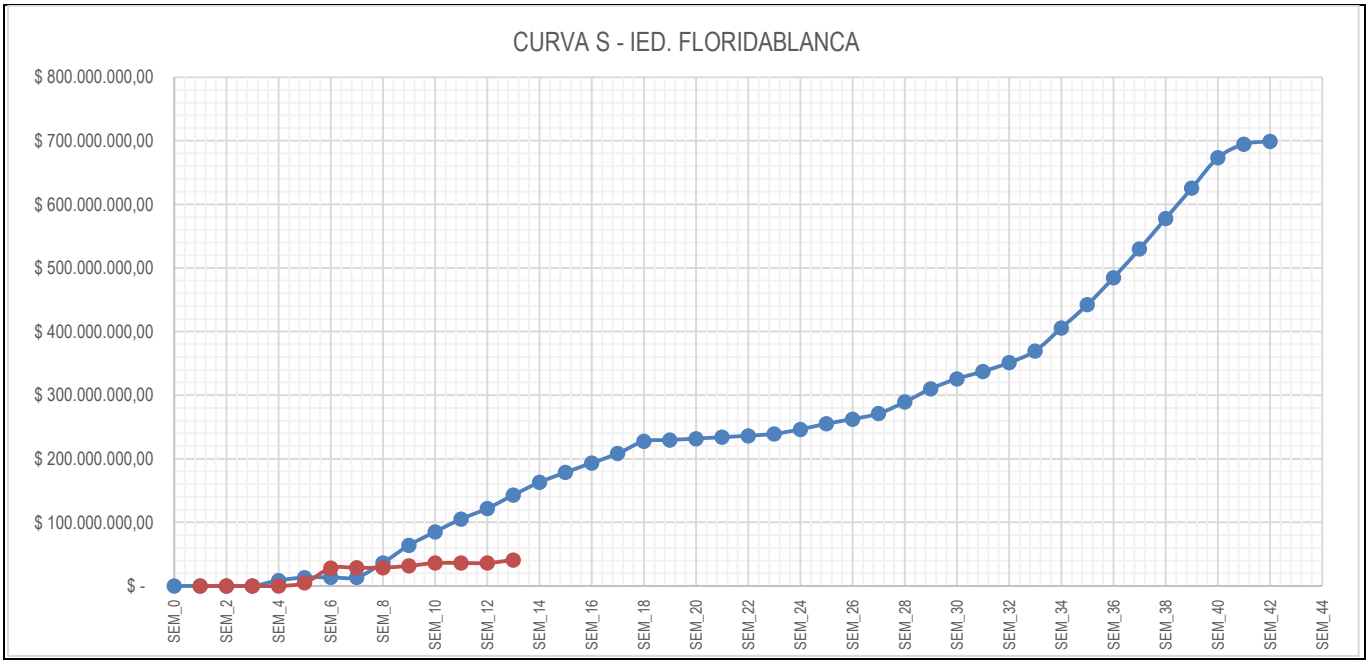


Gráfica 9. Curva programado vs ejecutado Francisco José de Caldas, sede A.

3.5.2.11. Colegio Florida Blanca, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y localización y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición pavimento asfáltico, desmonte de canecas y limpieza y mantenimiento a cárcamo.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Floridablanca		06/02/2023	31/10/2023	20,46%	5,86%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	14,60%
1	Preliminares	06/02/2023	17/07/2023	9,41%	5,86%	Cerramiento, demolición pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, limpieza y mantenimiento cárcamos.	
2	Estructura	06/03/2023	13/05/2023	10,54%	0,00%		
3	Mampostería	08/05/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	08/05/2023	0,00%	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	08/05/2023	08/09/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	06/09/2023	30/10/2023	0,00%	0,00%		
9	Carpintería metálica	06/09/2023	30/10/2023	0,00%	0,00%		
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	0,00%	0,00%		
16	Obras exteriores	06/03/2023	29/06/2023	0,51%	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	0,00%	0,00%		
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%		

Tabla 70. Avance de obra Colegio Floridablanca

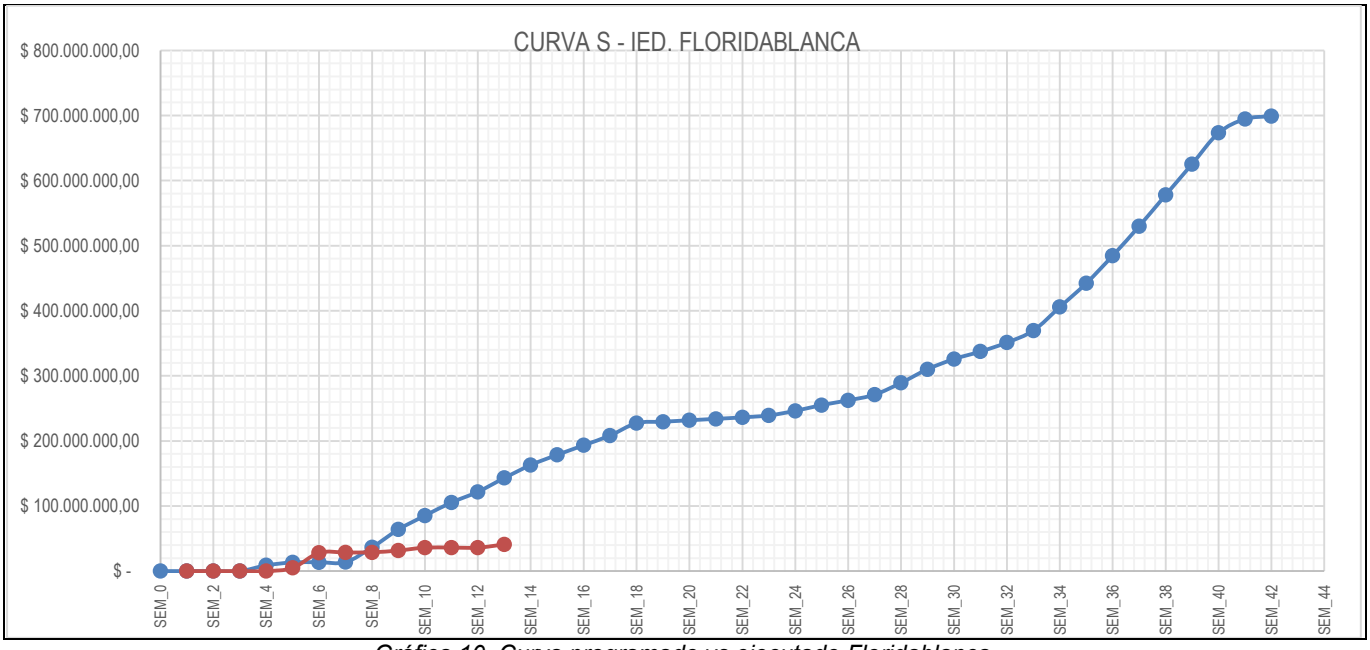

Gráfica 10. Curva programado vs ejecutado Floridablanca.


3.5.2.12. Colegio Jorge Eliecer Gaitán, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en lona y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiros: demolición de estructuras en concreto, acabado y alistado de piso, muro en mampostería y enchape de muros, desmonte de puertas y ventanas, desmonte y desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cieloraso y lámparas, picado de muros de mampostería y corte en concreto.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común, suministro e instalación de subbase granular B-400.
- Refuerzos: Suministro e instalación de malla electro soldada 6mm.
- Mampostería: Muro divisorio en bloque No. 4.
- Instalaciones hidrosanitarias: Suministro e instalación de tubería PVCP RDE 9 de ½", punto de agua fría sanitario lavamanos ½".
- Redes de drenaje de aguas de infiltración: Suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
- Pisos: Alistado de pisos en mortero.
- Pañete y pintura: pañete en muro 1:4 incluye filos y dilataciones.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Jorge Eliecer Gaitán		25/01/2023	31/10/2023	19,88%	7,56%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	12,31%
1	Preliminares	25/01/2023	28/07/2023	16,39%	2,54%	Cerramiento en lona, demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto	
2	Estructura	17/06/2023	12/10/2023	0,00%	3,26%	Excavación manual en material común, instalación subbase y malla electro soldada	
3	Mampostería	13/10/2023	18/10/2023	0,00%	0,01%	Muro divisorio en bloque No. 4	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	02/08/2023	24/08/2023	0,00%	0,00%	Suministro e instalación de tubería hidrosanitaria y geotextil tejido T1700	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	22/07/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	20/06/2023	28/08/2023	0,00%	0,73%	Alistado de pisos en mortero	
8	Mampostería	25/07/2023	04/08/2023	0,00%	0,00%		
9	Carpintería metálica	05/08/2023	02/09/2023	0,00%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	06/09/2023	0,00%	0,00%		

12	Aparatos y equipos especiales	07/09/2023	23/09/2023	0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura	05/04/2023	06/11/2023	0,81%	1,03%	Aplicación de pañete muro, incluye filos
16	Obras exteriores	05/07/2023	19/09/2023	0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	2,68%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	0,00%	0,00%	

Tabla 71. Avance de obra Colegio Jorge Eliecer Gaitán

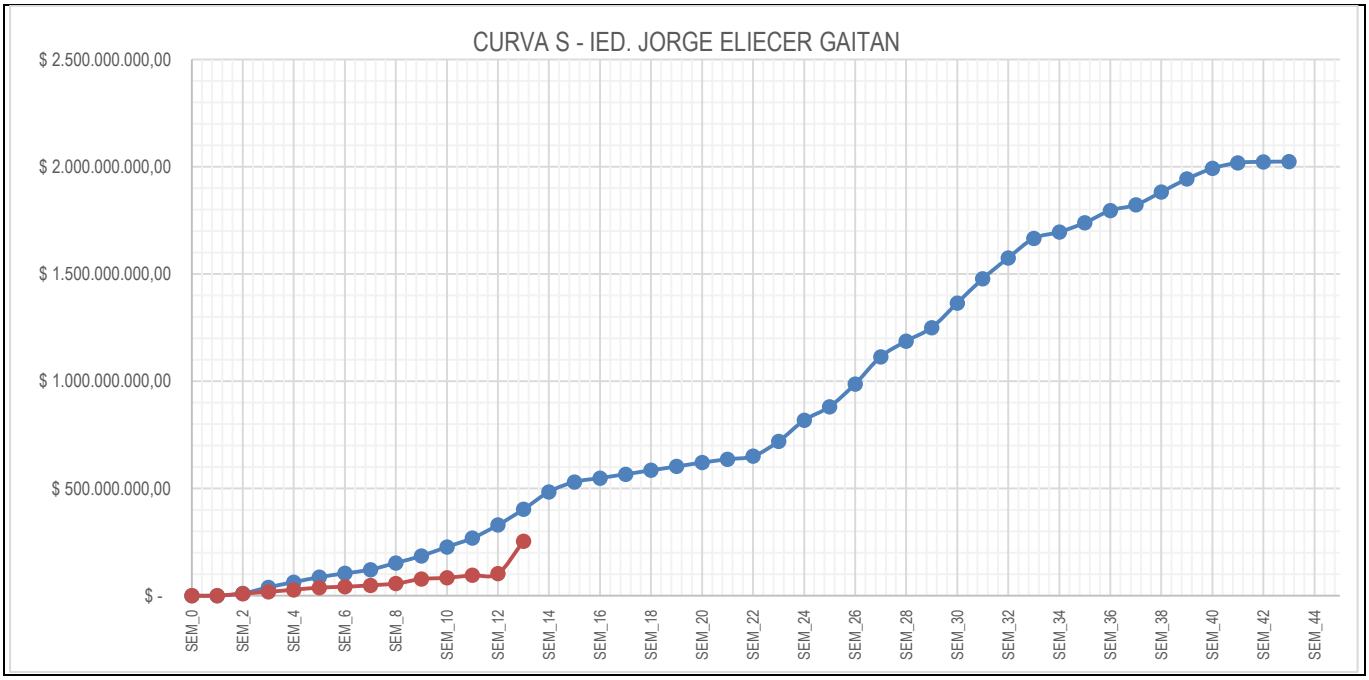

Gráfica 11. Curva programado vs ejecutado Jorge Eliecer Gaitán.

3.5.2.13. Colegio José Asunción Silva, sede B, Sidauto

- Ejecución de informe diagnóstico.


3.5.2.14. Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Realización de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Cerramiento en teja de zinc y replanteo.
- Demoliciones, desmontes y retiro: Demolición de acabado de piso y placa maciza, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso y cubierta.
- Excavaciones y rellenos: Excavación manual en material común.
- Alistado de pisos: Alistado de pisos en mortero.
- Pintura: Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta.

- Cubiertas e impermeabilizaciones: Instalación de lámina de policarbonato.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Rafael Bernal Jiménez		25/01/2023	22/08/2023	15,47%	20,06%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-4,59%
1	Preliminares	07/02/2023	17/05/2023	9,90%	4,62%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas y cieloraso	
2	Estructura	23/02/2023	05/05/2023	0,15%	0,28%	Excavación manual en material común	
3	Mampostería	01/05/2023	17/05/2023	0,00%	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	09/03/2023	11/03/2023	0,03%	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	0,00%	0,00%		
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	0,00%	0,67%	Alistado de piso en mortero	
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	0,00%	0,00%		
9	Carpintería metálica	06/05/2023	21/06/2023	0,00%	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	04/07/2023	08/07/2023	0,00%	0,00%		
13	Pañete y pintura	01/04/2023	25/07/2023	0,00%	2,14%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta	
16	Obras exteriores	04/03/2023	08/03/2023	0,07%	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	08/07/2023	5,18%	12,35%	Instalación de lámina de policarbonato	
20	Aseo y disposición final	05/04/2023	29/07/2023	0,14%	0,00%		

Tabla 72. Avance de obra Colegio Rafael Bernal Jiménez

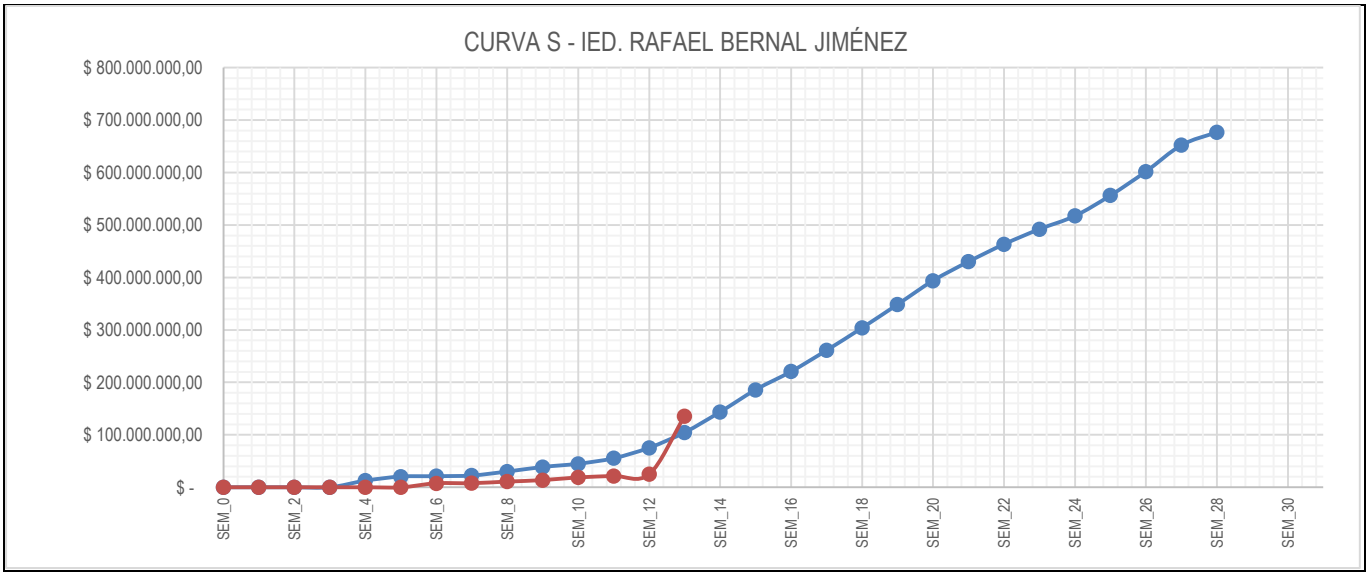


Gráfica 12. Curva programado vs ejecutado Rafael Bernal Jiménez.

3.5.2.15. Colegio Justo Víctor Charry, sede A, Garcés Navas

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuestos.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Replanteo y cerramiento en lona.
- Demoliciones, desmontes y retiros: Demolición de muros y mesón de lavamanos y placa, desmonte de puertas, aparatos sanitarios, baranda metálica y tubería existente y cortes y regatas en concreto para instalación de tubería.
- Red hidrosanitaria: Suministro e instalación de tubería PVC-S 2", sondeo y revisión de desagües, instalación de puntos de agua para lavamanos.
- Mampostería seca: Suministro e instalación de enchape cerámico para muros.
- Pañete y pintura: Aplicación de pañete incluido filos y estuco sobre pañete.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
Colegio Justo Víctor Charry		13/02/2023	15/07/2023	12,09%	6,80%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 5,29%
1	Preliminares	13/02/2023	08/04/2023	3,94%	1,77%	Cerramiento. Demolición de muros, enchape y placa, desmonte de aparatos sanitarios, puertas, baranda metálica y tubería existente y cortes y regatas en concreto para instalación de tubería.
3	Mampostería	31/03/2023	08/04/2023	5,94%	0,00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	0,00%	0,00%	
7	Pisos	27/04/2023	01/05/2023	0,00%	0,02%	
8	Mampostería seca	04/04/2023	26/04/2023	2,21%	3,32%	Suministro e instalación de enchape cerámico
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	0,00%	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	0,00%	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	0,00%	1,68%	Pañete muro incluye filos, estuco sobre pañete.
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	01/07/2023	0,00%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	0,00%	0,00%	

Tabla 73. Avance de obra Colegio Justo Víctor Charry

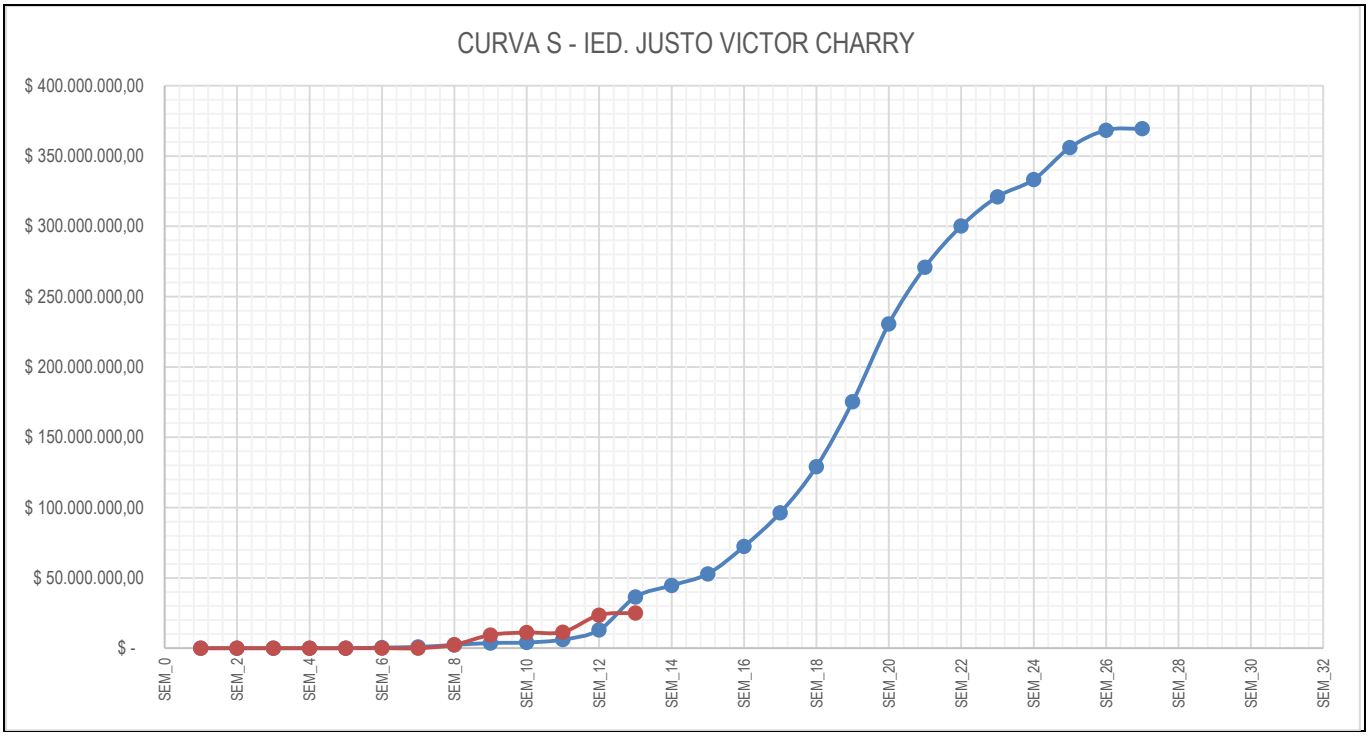

Gráfica 13. Curva programado vs ejecutado Justo Víctor Charry.

3.5.2.16. Colegio Robert F Kennedy, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.

3.5.2.17. Colegio Distrital Simón Bolívar, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.


3.5.2.18. Colegio Garcés Navas, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.
- Ejecución de presupuesto.
- Actas de vecindad.
- Obras preliminares: Replanteo y cerramiento en teja de zinc.
- Demoliciones, desmontes y retiro
- Desmonte de cieloraso, lámparas y red eléctrica
- Mantenimiento de ventanas y puertas.
- Estructura metálica: Suministro de estructura metálica, para soporte de cubierta.

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	% Avance programado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Garcés Navas		01/02/2023	31/07/2023	46,99%	14,15%	Atraso (Rojo) - Avance (Verde)	32,84%

1	Preliminares	01/02/2023	03/05/2023	16,25%	8,02%	Pintura en carpintería metálica, desmonte de cieloraso, lámparas y cableado eléctrico
2	Estructura	08/04/2023	19/04/2023	0,00%	6,13%	Suministro e instalación de estructura metálica
3	Mampostería	04/03/2023	15/03/2023	1,04%	0,00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	2,22%	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	0,00%	0,00%	
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	0,00%	0,00%	
16	Obras exteriores	04/05/2023	20/05/2023	0,00%	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	03/02/2023	29/07/2023	25,50%	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	05/06/2023	1,97%	0,00%	

Tabla 74. Avance de obra Colegio Garcés Navas

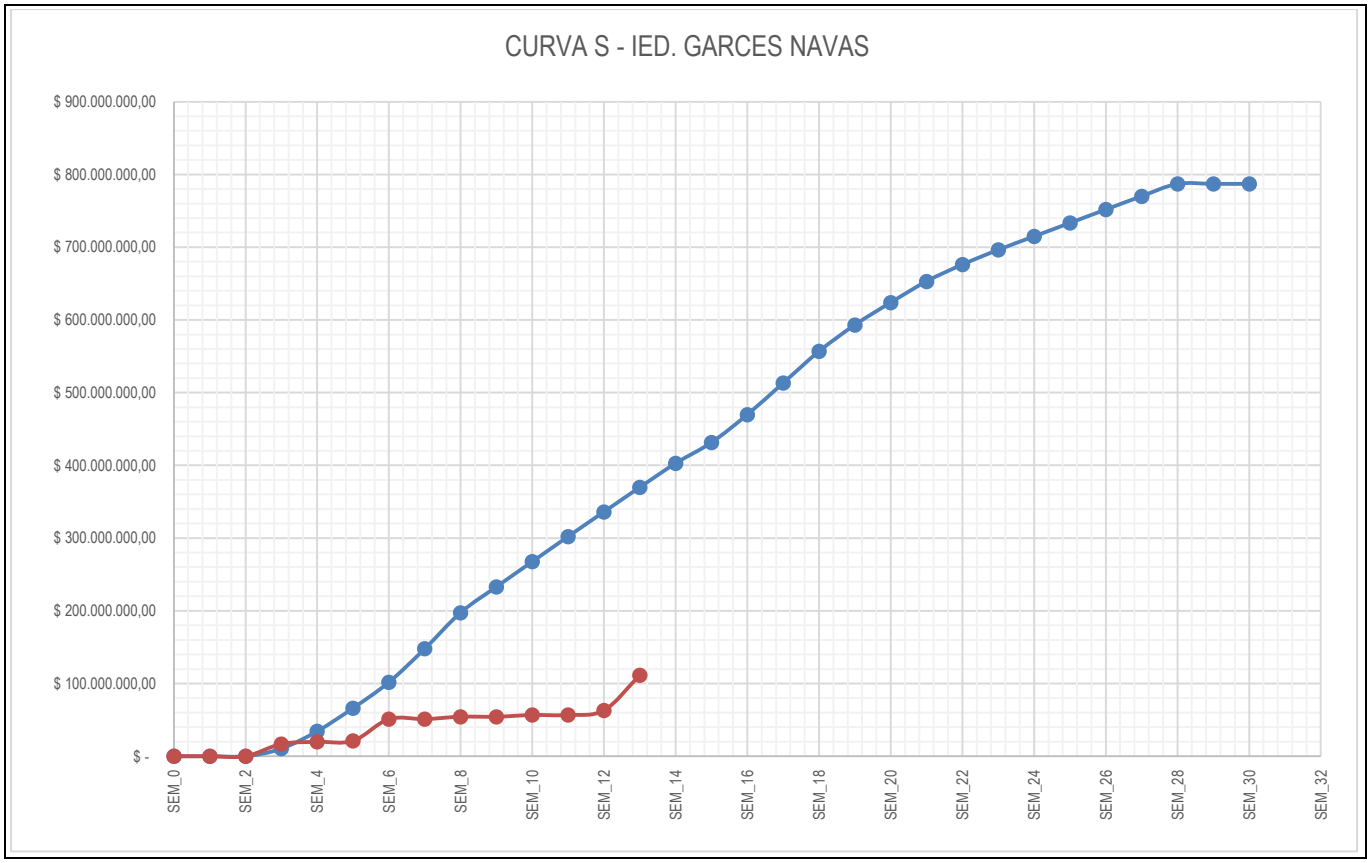

Gráfica 14. Curva programado vs ejecutado Garcés Navas.

3.5.2.19. Colegio República de Panamá, sede A

- Ejecución de informe diagnóstico.

3.5.3. ATENCIÓN EMERGENCIAS EDUCATIVAS

3.5.3.1. IED Morisco

Se interviene la red hidrosanitaria del colegio Morisco mediante sondeo de tuberías, limpieza de sifones, mantenimiento y limpieza de cajas, demolición de enchape de piso, pañete y afinado de caja de paso exterior, alistamiento para enchape, instalación de enchape de piso y elaboración de tapas de cajas de Inspección; dejando en funcionamiento la batería sanitaria afectada.

3.5.3.2. IED Rafael Bernal Jiménez, sede B

Se realiza intervención en IED Rafael Bernal Jiménez, sede B en zonas afectadas; se realiza prueba de geofonía para encontrar fugas de agua, reparaciones en concreto, instalación de una universal y se retiran dos uniones de reparación.

3.5.3.3. IED Nydia Quintero de Turbay Sede A

Se efectúa la intervención de tanque de almacenamiento de la institución educativa con la impermeabilización de tanque de almacenamiento con geomembrana e instalación escalera para acceso al mismo.

3.5.3.4. IED República de Panamá

De acuerdo a la situación reportada en la ficha técnica enviada por la entidad de la institución educativa, se realizó la instalación de tubería, moto bomba, tanque hidroacumulador, tableros eléctricos y de control en cuarto de máquinas. Pendiente entrega.

3.5.3.5. Dirección Local de Engativá

Se realiza visita de inspección de emergencia, evidenciando en tanques de agua, fuga en el sello del acople, déficit en presión de agua, deterioro de pintura por posibles filtraciones de agua y daño en manto asfáltico en placa de tanques.

3.5.3.6. IED Laureano Gómez

Se encuentra en proceso de revisión para efectuar la insonorización de aula (pendiente).

3.5.3.7. IED Thomas Carrasquilla sede A

Se realiza revisión de equipos de presión de agua potable en cuarto de bombas, identificando que el tanque hidro acumulador expulsa agua por su válvula de aire y presenta signos de corrosión generalizada; se encuentran dos motobombas trabajando correctamente, sin embargo, sus conexiones eléctricas no tienen los terminales adecuados evidenciando cableado expuesto; las tuberías galvanizadas presentan corrosión externa e interna y filtraciones considerables.

3.5.3.8. IED Tomas Cipriano de Mosquera

En atención a emergencias se realiza revisión de fallos en circuitos eléctricos, a la fecha se encuentra pendiente de aprobación de actividades para ejecución

3.5.3.9. Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo

En atención a emergencias se realiza visita por parte de interventoría y contratista de obra a fin de verificar y realizar un diagnóstico del tanque subterráneo de agua potable el cual cuenta con afectaciones (posibles fugas).

3.5.3.10. IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D

En atención a emergencias se realiza visita técnica el día 08 de marzo de 2023 a IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D en aras de identificar las posibles causas de las fallas presentadas en la infraestructura de la institución educativa y tomar las medidas sanitarias correspondientes; durante la inspección se observa lámina de agua en pasillo y acceso a aula 101D, levantamiento de acabado de piso, taponamiento y desbordamiento de canales existentes, filtración de agua lluvia en unión de placa tanque – cubierta, falta de guardaescobas en aulas ocasionando falta de continuidad y protección de muros y falla en la impermeabilización de placa en tanque, se realiza limpieza e impermeabilizado de canales, instalación de malla y desmonte y cambio de tanque en zona de cubierta, además de aplicación de alistado en aula, enchape y emboquillado de pisos de aula afectada.

3.5.4. AVANCE GENERAL DE CONTRATO

PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	Valor programado semanal	%	Acumulado	%	No.	Valor ejecutado semanal	%	Acumulado	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,14%	$ 21.222.394,68	0,15%	3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 50.914.718,24	0,36%	$ 72.137.112,92	0,52%	4	$ 33.373.547,10	0,24%	$ 74.658.206,89	0,54%
5	$ 84.783.311,22	0,61%	$ 156.920.424,14	1,12%	5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 108.239.788,20	0,78%

6	$ 84.520.694,84	0,61%	$ 241.441.118,98	1,73%	6	$ 94.518.500,86	0,68%	$ 202.758.289,06.	1,45%
7	$ 79.994.302,15	0,57%	$ 321.435.421,13	2,30%	7	$ 22.218.182,48	0,16%	$ 224.976.471,55	1,61%
8	$ 92.371.183,17	0,66%	$ 413.806.604,30	2,97%	8	$ 40.324.809,10	0,29%	$265.301.280,65	1,90%
9	$ 188.479.295,83	1,35%	$ 602.285.900,13	4,32%	9	$ 65.485.536,40	0,47%	$330.786.817,05	2,37%
10	$ 221.475.791,25	1,59%	$ 823.761.691,38	5,90%	10	$41.427.564,22	0,30%	$372.214.381,27	2,67%
11	$ 229.916.129,85	1,65%	$ 1.053.677.821,23	7,55%	11	$49.569.565,98	0,36%	$421.783.947,25	3,02%
12	$ 230.178.690,91	1,65%	$ 1.283.856.512,14	9,20%	12	$74.571.439,34	0,53%	$496.355.386,59	3,56%
13	$ 271.119.796,10	1,94%	$ 1.554.976.308,24	11,14%	13	$384.555.815,94	2,76%	$880.911.202,53	6,31%
14	$ 366.181.950,98	2,62%	$ 1.921.158.259,22	13,77%	14				
15	$ 367.035.523,66	2,63%	$ 2.288.193.782,89	16,40%	15				
16	$ 332.730.015,04	2,38%	$ 2.620.923.797,93	18,78%	16				
17	$ 344.526.501,67	2,47%	$ 2.965.450.299,60	21,25%	17				
18	$ 366.678.480,99	2,63%	$ 3.332.128.780,59	23,88%	18				
19	$ 427.752.993,66	3,07%	$ 3.759.881.774,25	26,94%	19				
20	$ 414.353.821,17	2,97%	$ 4.174.235.595,42	29,91%	20				
21	$ 406.649.637,35	2,91%	$ 4.580.885.232,77	32,83%	21				
22	$ 394.471.325,54	2,83%	$ 4.975.356.558,31	35,65%	22				
23	$ 377.462.346,04	2,70%	$ 5.352.818.904,35	38,36%	23				
24	$ 421.102.429,73	3,02%	$ 5.773.921.334,08	41,38%	24				
25	$ 467.126.358,88	3,35%	$ 6.241.047.692,96	44,72%	25				
26	$ 451.567.823,26	3,24%	$ 6.692.615.516,22	47,96%	26				
27	$ 538.474.810,12	3,86%	$ 7.231.090.326,34	51,82%	27				
28	$ 609.647.332,75	4,37%	$ 7.840.737.659,09	56,19%	28				
29	$ 527.681.141,76	3,78%	$ 8.368.418.800,85	59,97%	29				
30	$ 493.959.978,51	3,54%	$ 8.862.378.779,36	63,51%	30				
31	$ 517.384.199,98	3,71%	$ 9.379.762.979,34	67,22%	31				
32	$ 447.896.126,45	3,21%	$ 9.827.659.105,79	70,43%	32				
33	$ 433.840.376,73	3,11%	$ 10.261.499.482,52	73,54%	33				
34	$ 421.086.235,28	3,02%	$ 10.682.585.717,80	76,55%	34				
35	$ 400.956.758,70	2,87%	$ 11.083.542.476,50	79,43%	35				
36	$ 368.762.135,71	2,64%	$ 11.452.304.612,21	82,07%	36				
37	$ 344.084.266,25	2,47%	$ 11.796.388.878,46	84,54%	37				
38	$ 312.891.892,50	2,24%	$ 12.109.280.770,96	86,78%	38				

39	$ 349.386.921,83	2,50%	$ 12.458.667.692,79	89,28%	39				
40	$ 354.111.026,34	2,54%	$ 12.812.778.719,13	91,82%	40				
41	$ 342.265.958,11	2,45%	$ 13.155.044.677,24	94,27%	41				
42	$ 250.155.543,90	1,79%	$ 13.405.200.221,15	96,07%	42				
43	$ 141.994.792,05	1,02%	$ 13.547.195.013,20	97,08%	43				
44	$ 704.475,00	0,01%	$ 13.547.899.488,20	97,09%	44				
45	$ 406.381.393,80	2,91%	$ 13.954.280.882,00	100,00%	45				

Tabla 75. Avance General de Obra

3.5.5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS

Durante el periodo del presente informe se presentó las siguientes contingencias y su respectiva alternativa de subsanación:

Modificación de presupuestos iniciales de instituciones educativas. Safrid ingeniería SAS, adelanta la actualización de balance presupuestal en aras de evitar afectaciones al alcance planificado por la secretaría de Educación del Distrito.

Se encuentran actividades a desarrollar que no están dentro del presupuesto oficial ofertado. Ante la situación, se proyecta por parte de contratista de obra la elaboración de análisis de precios unitarios no previstos, con ello, atender las necesidades que surgen durante el proceso constructivo.

Cumplimiento de línea base de programación de actividades contrato de obra. Contratista de obra presenta plan de contingencia para mitigar los impactos por demoras en la ejecución de actividades.

Demoras en presentación de conceptos de especialistas en el desarrollo de las actividades en las instituciones educativas. Se efectúan mesas de trabajo entre pares de especialistas, con el fin, de efectuar definiciones con celeridad cumpliendo con los parámetros y normas vigentes.

Acopio de cantidades superiores a las permitidas de materiales de escombro en frentes de obra. Se realiza la disposición final de escombros a sitio autorizado conforme a las normas ambientales vigentes.

Afectación de cerramiento en lona para aislamiento de obras. Se realiza inspecciones por parte de los profesionales SSTA a cargo, con ello, mitigar los impactos a la comunidad estudiantil circundante.

3.5.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades llevadas a cabo durante el periodo del presente informe corresponden a:

- Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos que hacen parte integral del mismo.

- Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra.

- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.

- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.

- Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.

- Garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.

- Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.

3.5.7. CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con las actividades que se han realizado en el transcurso de la ejecución de las obras la Interventoría ha verificado, el estado de los equipos e insumos.

3.5.8. REUNIONES EFECTUADAS

3.5.8.1. REUNIONES DE COMITÉ

Acta	Fecha	Compromisos	Responsable	Fecha Propuesta cumplimiento	Fecha real de cumplimiento	Estado
2	24/01/2023	Programación de obra ajustada	Contratista de obra	27/01/2023	Pendiente	Incumplido
		Presupuestos y flujo de inversión	Contratista de obra	27/01/2023	Pendiente	Incumplido
		Informes diagnósticos colegios	Contratista de obra	27/01/23	Pendiente	Incumplido
3	31/01/2023	Presupuestos colegios priorizados	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente	Incumplido
		Diagnósticos subsanados	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente	Incumplido
		APU´s contractuales y NP's	Contratista de obra	31/01/2023	Pendiente	Incumplido

		Programación ajustada	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente	Incumplido
4	07/02/2023	Diagnósticos	Contratista de obra	02/02/2023	Pendiente	Incumplido
		APU's contractuales	Contratista de obra	01/02/2023	Pendiente	Incumplido
		Presupuestos ajustados	Contratista de obra	02/02/2023	03/02/2023	Cumplido
		APU' NP	Contratista de obra	31/01/2023	31/01/2023	Cumplido
5	14/02/2023	Presupuestos y flujo de inversión	Contratista de obra	18/02/2023	Pendiente	Incumplido
		Subsane de observaciones de diagnósticos	Contratista de obra	15/02/2023	Pendiente	Incumplido
		APU´s contractuales	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente	Incumplido
		Documentación autorización de ingreso de personal	Contratista de obra	14/02/2023	16/02/2023	Cumplido
		Actas de vecindad Jorge Eliecer Gaitán	Contratista de obra	16/02/2023	Pendiente	Incumplido
		Balance actualizado de frentes de obra iniciales	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente	Incumplido
6	21/02/2023	Concepto geotécnista Floridablanca	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente	En proceso
		Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente	En proceso
		Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	27/02/2023	Pendiente	En proceso
		APU´s contractuales	Contratista de obra	24/02/2023	Pendiente	En proceso
		Concepto estructural Instituciones educativas	Contratista de obra	24/02/2023	24/02/2023	Cumplido
		Subsane diagnósticos	Contratista de obra	21/02/2023	21/02/2023	Cumplido
		Informe técnico mensual	Contratista de obra	22/02/2023	Pendiente	En proceso
		Visita de personal social SED	Secretaría de Educación	01/03/2023	01/03/2023	Cumplido
		Visita especialistas estructurales	Contratista de obra	28/02/2023	28/02/2023	Cumplido
		Inicio actividades Justo Victor Charry	Contratista de obra	23/02/2023	27/02/2023	Cumplido
		Instalación bombas República de Panamá	Contratista de obra	23/02/2023	22/02/2023	Cumplido
		Entrega concepto Juan del Corral	Contratista de obra	24/02/2023	24/02/2023	Cumplido
		Instalación de programación en frentes de obra	Contratista de obra	Inmediato	Pendiente	En proceso
7	28/02/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	06/03/2023	Pendiente	En proceso
		Subsane diagnósticos	Contratista de obra	03/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Informe mensual No. 1	Contratista de obra	17/03/2023	02/03/2023	Cumplido
		Concepto estructural Instituciones educativas	Contratista de obra	03/03/2023	03/03/2023	Cumplido
		Entrega emergencia República de Panamá	Contratista de obra	02/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Concepto especialista eléctrico	Contratista de obra	21/02/2023	Pendiente	Cumplido
		Motivación adición de obra	Secretaría de Educación	03/03/2023	Pendiente	En proceso
		Radicación informe semanal No. 7	Interventoría	03/03/2023	01/03/2023	Cumplido
		Toma de densidades	Contratista de obra	28/02/2023	02/03/2023	Cumplido
		Entrega caracterización de granulares	Contratista de obra	03/03/2023	Pendiente	Cumplido
8	07/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	15/03/2023	Pendiente	En proceso
		Concepto especialista eléctrico	Contratista de obra	14/03/2023	Pendiente	Cumplido

		Balance presupuestal actualizado	Contratista de obra	107/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Entrega emergencia República de Panamá	Contratista de obra	08/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Entrega caracterización materiales cantera	Contratista de obra	10/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Concepto geotecnia instituciones	Contratista de obra	08/03/2023	02/03/23	Cumplido
		Visita emergencia IED Francisco José de Caldas	Contratista, interventoría, SED	09/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Radicación informe semanal No. 9	Interventoría	15/03/2023	15/03/2023	Cumplido
9	15/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	17/03/2023	Pendiente	En proceso
		Visita especialistas eléctricos	Contratista de obra	177/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Concepto estructural Instituciones educativas	Interventoría	15/03/2023	15/03/2023	Cumplido
		Mesa de trabajo / revisión presupuestos	Contratista de obra	16/03/2023	17/03/2023	Cumplido
		Caracterización granulares	Contratista de obra	23/03/2023	21/03/2023	Cumplido
		Ficha técnica emergencia Juan del Corral	Secretaría de Educación	23/03/2023	Pendiente	En proceso
		Radicación informe semanal No. 7	Interventoría	03/03/2023	01/03/2023	Cumplido
		Toma de densidades	Contratista de obra	28/02/2023	02/03/2023	Cumplido
		Acta de entrega de emergencia (República de Panamá, Bernal Jiménez)	Contratista de obra	23/03/2023	08/03/2023	Cumplido
10	23/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	21/03/2023	Pendiente	En proceso
		Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	217/03/2023	Pendiente	Cumplido
		Entrega de emergencia República de Panamá y Domingo Faustino	Contratista de obra, interventoría	15/03/2023	15/03/2023	Cumplido
		Entrega informe semanal No. 10	Interventoría	21/03/2023	217/03/2023	Cumplido
		Fichas técnicas emergencias	Secretaría de Educación	21/03/2023	Pendiente	En proceso
11	28/03/2023	Niveles topografía Floridablanca	Contratista de obra	30/03/2023	03/04/23	Cumplido
		Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo	Contratista de obra	04/03/2023	Pendiente	En proceso
		Concepto eléctrico Instituciones educativas	Contratista de obra	28/03/2023	Pendiente	En proceso
		Plan de contingencia por cada institución	Contratista de obra	31/03/2023	037/04/2023	Cumplido
		Fichas técnicas de emergencias	Secretaría de Educación del Distrito	28/03/2023	Pendiente	En proceso
		Especificación técnica teja - APU	Contratista de obra	31/03/2023	037/04/2023	Cumplido
12	04/04/2023	Concepto estructural Rafael Bernal/ salón de Judo	Contratista de obra	05/04/2023	Pendiente	En proceso
		Concepto eléctrico Instituciones educativas	Contratista de obra	057/04/2023	Pendiente	Cumplido
		Concepto estructural – cimentación y cubierta de Jorge Eliecer Gaitán.	Interventoría	07/04/2023	15/03/2023	Cumplido

Tabla 76. Relación de reuniones y seguimiento de compromisos.

3.5.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

En el anexo registro fotográfico se presentan los avances de obra de las actividades realizadas en el periodo del presente informe.

3.5.10. ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

No se registran ensayos de laboratorio durante este periodo.

3.6. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las gestiones realizadas en seguridad y salud en el trabajo se presentan en anexo 7 – Informe SSTA

3.7. ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL.

Se realiza acompañamiento a estas actividades ya que en la propuesta no se establece por parte de la SED, este profesional.

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. OBSERVACIONES

De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 32% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 24% para IED Francisco José de Caldas; 13,06% para Garcés Navas IED; 20% para IED Floridablanca; 80% para IED Miguel Antonio Caro; 15% para Justo Victor Charry; 17,40% para Rafael Bernal Jiménez y 18% para Juan del Corral.

A la fecha del presente informe se encuentran activos los frentes de obra en IED Garcés Navas, IT. Francisco José de Caldas, sede A, IED Floridablanca, IED Jorge Eliecer Gaitán, IED Miguel Antonio Caro, IED Justo Víctor Charry, IED Bernal Jiménez y IED Juan del Corral.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos se realiza atención de emergencias en IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D, IED Juan Francisco Berbeo, IED Francisco José de Caldas, sede A; esto mediante intervención de sus instalaciones físicas con obras de mantenimiento correctivo, con el fin, de subsanar afectaciones en las instalaciones y adecuarlos para su correcto funcionamiento.

Con base en el atraso evidenciado, se implementa por parte de contratista de obra plan de contingencia en los frentes de obra, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

4.2. CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión de actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, al cierre del presente informe se presenta un avance ejecutado de obra de 5,59% en comparación de un avance programado de 11,14%, teniendo una diferencia de 5,55% de atraso en la ejecución del contrato.

Por parte de esta interventoría, a la fecha se ha efectuado el oportuno proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables por parte del contratista de obra.

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría ha emitido y exigido el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras en cuanto a calidad, presupuesto y programación.

Esta interventoría continúa a la espera del balance actualizado, programación de obra y plan de trabajo de los frentes pendientes, de acuerdo a los compromisos adquiridos, con el fin, de continuar con el seguimiento riguroso

4.3. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Secretaria de Educación del Distrito de sus buenas gestiones para adelantar las visitas a las instituciones educativas que se encuentran pendientes por iniciar, en aras de efectuar, las actas de recibo de espacios para desarrollar la intervenciones.

Se encarga a la entidad contratante la entrega de los planos existentes de las instituciones educativas, con el fin de identificar los elementos estructurales, eléctricos, Arquitectónicos, hidrosanitarios y demás que hacen parte de los colegios contractuales.

Se solicita de las buenas gestiones de la entidad para acelerar los trámites de adición y prórroga de contrato de interventoría, en aras de cumplir con el objeto contractual.

Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.

ANEXOS

ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ
ANEXO 2. BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 3. INFORME SSTA
ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 5. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

Anexo 1. ACTAS DE COMITÉ

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
09	14/03/2023	11:00		IED. SAN JOSE NORTE SEDE
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Niveles de topografía colegio Floridablanca	Contratista de obra	06 de marzo de 2023	Pendiente
2	Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	27 de febrero de 2023	Pendiente
3	Subsane diagnósticos	Contratista de obra	03 de marzo de 2023	08 de marzo de 2023
4	Instalación de cronogramas en frentes de obra	Contratista de obra	07 de marzo de 2023	Pendiente
5	Concepto estructuras instituciones educativas.	Contratista de obra	03 de marzo de 2023	03 de marzo de 2023
6	Balance presupuestal actualizado	Contratista de obra	03 de marzo de 2023	Pendiente
7	Entrega de emergencia República de Panamá	Contratista de obra	02 de marzo de 2023	Pendiente
8	Concepto especialista eléctrico	Contratista de obra	06 de marzo de 2023	Pendiente
9	Motivación adición de contrato obra	SED	03 de marzo de 2023	09 de marzo de 2023
10	Entrega de presupuestos colegios Francisco José de Caldas, sede B, República de Colombia, José Asunción Silva y Simón Bolívar.	Contratista de obra	03 de marzo de 2023	Pendiente
11	Toma de densidades	Contratista de obra	02 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023

12	Entrega caracterización de granulares	Contratista de obra	03 de marzo de 2023	Pendiente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- Interventoría realiza solicitud de adición y prórroga al contrato de interventoría No. CO1. PCCNTR.4146207 en atención a la solicitud efectuada por contratista de obra mediante oficio No. 101-GP2-SED-2022 del 09 de marzo de 2023 con asunto solicitud de adición y prórroga No. 1.

- Se remite por parte de Safrid Ingeniería solicitud de adición y prórroga No. 1, radicado de informe ambiental No. 2, Remisión de documentos para ingreso de personal, radicado de programación de obra ajustada a solicitud de adición y Prórroga No. 1.

- Consorcio Intercolegios 2022, en reiteradas ocasiones se ha requerido a contratista de obra cumplir con las obligaciones contractuales derivadas del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicitó a contratista la ejecución de actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito.

- Consorcio Intercolegios 2022 requirió a contratista la actualización de presupuestos de los colegios en donde se vienen adelantando actividades, así mismo, aquellos que se encuentran dentro de los asignados en el anexo técnico.

- Se solicita de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, esto en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Jorge Eliecer Gaitán

Durante la presente semana se realizan filos y afinados en ventanas, excavación en aulas de dibujo y disfraces, instalación de alistado en aulas 2 y 3 de segundo piso, relleno y compactación de material, mejoramiento de material, instalación de geotextil y trasiego de escombros a sitio de acopio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 3,76%, con base en la programación presentada un avance programado de 9,15%, teniendo una diferencia de 5,39% para el colegio en mención.

Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realiza aplicación de pañete en muros culata y baños de oficinas de segundo piso, filos en ventanas y puertas, excavación en aulas y oficinas de primer piso y trasiego de material a sitio de acopio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 4,56%, con base en la programación presentada un avance programado de 13,19%, teniendo una diferencia de 8,63% para el colegio en mención.

Garcés Navas

Durante la semana no se realizan actividades en el frente de obra; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 6,90%, con base en la programación presentada un avance programado de 29,60%, teniendo una diferencia de 22,70% para el colegio en mención.

Floridablanca

Durante la semana se realiza mantenimiento de arcos y aseo general en área de canchas; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 4,53%, con base en la programación presentada un avance programado de 9,15%, teniendo una diferencia de 4,62% para el colegio en mención.

Miguel Antonio Caro

Durante la semana se realiza excavación en zanja para tubería, relleno y compactación de material, demolición de placa en zanja y trasiego de material al punto de acopio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 37,57%, con base en la programación presentada un avance programado de 19,75%, teniendo una diferencia de -17,82% para el colegio en mención.

Rafael Bernal Jiménez

Durante la semana se realiza fundición de alistado en salón de Karate, retiro de caseta existente y cerramiento del área; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 2,02%, con base en la programación presentada un avance programado de 4,43%, teniendo una diferencia de 2,42% para el colegio en mención.

Juan del Corral

Durante la semana se realiza desinstalación y mantenimiento de bombas, instalación de alistado en terraza comedor y trasiego de escombros a sitio de acopio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 2,99%, con base en la programación presentada un avance programado de 0,00%, teniendo una diferencia de -2,99% para el colegio en mención.

Justo Victor Charry

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Durante la semana se realiza demolición de enchape y muros y desmonte de puertas, espejos y aparatos sanitarios en a baño de niños preescolar, aplicación de pañete en baños de niños y trasiego de escombro a punto de acopio; de acuerdo esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de 2,56%, con base en la programación presentada un avance programado de 1,10%, teniendo una diferencia de -1,46% para el colegio en mención.

Aspectos Generales

De acuerdo con el informe semanal No. 9, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 2,37%, con base en la programación presentada un avance general programado de 4,32%, teniendo una diferencia de 1,95% en el contrato.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 5 de 8 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en Incumplimientos al contrato.

Emergencias Educativas

IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D

Se realiza visita técnica el día 08 de marzo de 2023 a IED Domingo Fausto Sarmiento, sede D en aras de identificar las posibles causas de las fallas presentadas en la infraestructura de la institución educativa y tomar las medidas sanitarias correspondientes; durante la inspección se observa lámina de agua en pasillo y acceso a aula 101D, levantamiento de acabado de piso, taponamiento y desbordamiento de canales existentes, filtración de agua lluvia en unión de placa tanque impermeabilización de placa en tanque.

IT Francisco José de Caldas, sede A

Se realiza mesa de trabajo en instalaciones de IT Francisco José de Caldas, sede A, a fin de dar a conocer la necesidad de atender emergencia de tala de árboles ante los cambios climatológicos presentados y el inminente peligro que presentan estos en la institución educativa, ante esto, se solicita la ejecución de la actividad lo antes posible teniendo en cuenta toda la normatividad del caso.

En frente de obra Francisco José de Caldas sede A, se requiere realizar balance presupuestal definitivo, en aras, de cumplir con las metas trazadas, con ello, tener el horizonte del contrato de obra; es necesario efectuar las reuniones a que haya lugar de todos los colegios incluidos en el objeto contractual.

- Se viene adelantando revisión de estructura de instituciones educativas (diseño) V4, de manera, que se enviará las observaciones para ser subsanados por contratista de obra.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

- Se requiere por parte de SED, adelantar obras en colegio Garcés Navas debido a los avances evidenciados en la semana, los cuales son inferiores a programados.
- Se evidenció la contingencia de bombas en colegio Juan del corral, allí, se presentó inundación que genero afectación al cuarto de bombas; por lo tanto, SED remitirá ficha técnica para mitigar la situación.
- Se requiere para institución José Victor Charry realizar revisión de redes y equipos que hacen parte del suministro de agua., con ello, presupuestar la intervención
- Emergencias educativas: Domingo Faustino Sarmiento: Se solicita remitir presupuesto de la intervención, se vienen adelantando actividades de cubierta y limpieza de canales
- Colegios Panamá, Bernal Jimenez Sede ( ) se requiere efectuar acta de entrega de las instituciones intervenidas
- Se solicita ser diligentes en la atención de emergencias cumpliendo con los pliegos de condiciones.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal Operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

TEMAS SOCIAL

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

TEMAS VARIOS

Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.

Se insta a contratista de obra realizar los acabados acorde a las especificaciones técnicas pertinentes.

Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas.

TEMAS VARIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Niveles de topografía colegio Floridablanco.	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 17/03/23
2	Visita con especialistas eléctricos	Responsable: Contratista de Obra Fecha: 17/03/23
3	Conceptos estructurales.	Responsable: Interventoría. Fecha: 15/03/23
4	Mesa de trabajo revisión presupuestos	Responsable: contratista, interventoría. Fecha: 16/03/23
5	Entrega caracterización de granulares.	Responsable: Contratista de obra. Fecha: 23/03/23
6	Ficha técnica emergencia en Juan del Corral.	Responsable: Supervisión SED. Fecha: 23/03/23
7	Acta entrega emergencia (República Panamá, Bernd Jiménez).	Responsable: contratista obra. Fecha: 28/03/23
8		Responsable: Fecha:
9		Responsable: Fecha:
10		Responsable: Fecha:
11		Responsable: Fecha:
12		Responsable: Fecha:
13		Responsable: Fecha:
14		Responsable: Fecha:
15		Responsable: Fecha:
16		Responsable: Fecha:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá a los 14 días del mes de marzo del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

ANGECA CAÑON
Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

CAMILO ANTONIO JAMAGA PESCA
Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	15/03/2023	**Lugar:**	IED San Jose Norte Sede A	**Acta de seguimiento No:**	9
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	**Contrato de interventoría:**	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
Freddy G. Rodriguez S.	Director Interventoria	Consorcio inter colegios 2022	freddy.rodriguez.gng@gmail.com	6015202359	
Camilo A. Sanabria Rojas	Residente Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	residente1.cic2022equal.com	3163340746	
Angela Carion R	Residente de obra	Safrid	Proyecto sedgrupo2@gmail.com	3102532159	
Jessica Alvarez H.	Inspector tecnico	Safrid.	Alvarezcarolina615@gm	3115548608	
Henry Ortigoza M	" "	" "	o-r-tigoza@hotmail.com	3124598539	
Natalia Calderón	Inspector Interventoria	Consorcio Inter Colegios 2022	interventoria050@gmail.com	3028328214	
Alejandro Herrera	Insp. de Obra	SAFRID		3135706334	
Edwin Sanabria R	Prof Especializado	DCEGC-SED	evanfanc@educacionbta	371000 & 3199	
Juan Carlos Valencia	Apoyo supervisor	DCEE - SED		3147175636	
Christian Barros L	Apoyo obra	Safrid.		3202331302	
Angela Carion	Residente de Obra	Safrid	Proyecto sedgrupo2@gmail.com	3102532159	
Luis Eduardo Montes	Director Obra	Safrid	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3006613168	
Manuel Gonzalez	Coord. Interventoria	Consorcio Inter colegios 2022	manuel.gonzalez.gng@gmail.com	3008445316	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
11	28/03/2023	**9:30 am**		**IED RAFAEL BERNAL JIMENEZ**
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Niveles de topografía colegio Floridablanca	Contratista de obra	~~06 de marzo de 2023~~ 30/03/23.	Pendiente
2	Concepto especialista eléctrico Floridablanca	Contratista de obra	27 de febrero de 2023	Pendiente
3	Subsane diagnósticos Patton	Contratista de obra	03 de marzo de 2023	08 de marzo de 2023
4	Entrega de emergencia República de Panamá y Domingo Faustino	Contratista de obra	27 de marzo de 2023	27 de marzo de 2023 ✓
5	Visita especialistas eléctricos	Contratista de obra	22 de marzo de 2023	
6	Entrega de presupuestos colegios pendientes (X)	Contratista de obra	27 de marzo de 2023	Pendiente
7	Entrega caracterización de granulares (X)	Contratista de obra	~~27~~ 31 de marzo de 2023	Pendiente
8	Entrega informe semanal No. (7) 11.	Interventoría	~~24~~ de marzo de 2023 11/04/28	24 de marzo de 2023
9	Fichas técnicas emergencias.	SED.	Están elaborando depende de	
10				
11				
12				
13				
14				

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- Consorcio Intercolegios 2022, en reiteradas ocasiones ha requerido a contratista de obra cumplir con las obligaciones contractuales derivadas del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicitó a contratista la ejecución de actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito.

- En aras de establecer un mejor control y seguimiento al contrato y dar cumplimiento a los procesos técnicos y administrativos en el menor tiempo posible, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría.

- Consorcio Intercolegios 2022 solicitó de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, esto en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos

- Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato en las Instituciones Educativas.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- A fin de dar el pertinente avance al contrato, se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Jorge Eliecer Gaitán

Durante la presente semana se realiza instalación y compactación de subbase y material mejorado, filos en puertas y ventanas, trasiego de escombros a punto de acopio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **4,62%**, con base en la programación presentada un avance programado de **13,25%**, teniendo una diferencia de **8,63%** para el colegio en mención.

Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realiza filos en puertas y ventanas, excavación manual en recebo y material común, instalación de geotextil, compactación de subbase y aplicación de pañete en área de tableros y parte inferior de muros en aulas de primer piso; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **6,31%**, con base en la programación presentada un avance programado de **26,14%**, teniendo una diferencia de **19,83%** para el colegio en mención.

Garcés Navas

Durante la semana se realiza desmonte de manto de cubierta en bloque B; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **7,20%**, con base en la programación presentada un avance programado de **38,39%**, teniendo una diferencia de **31,19%** para el colegio en mención.

Floridablanca

Durante la semana se realiza escarificado, mejoramiento y compactación de material en canchas y limpieza y mantenimiento de cárcamos y cajas eléctricas; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **5,16%**, con base en la programación presentada un avance programado de **15,07%**, teniendo una diferencia de **9,91%** para el colegio en mención.

Miguel Antonio Caro 15/04/23 - termi

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Durante la semana se realiza mantenimiento en cubierta, instalación de perfileria para reforzamiento de estructura, instalación de marco de caja de paso y fundición de placa de contrapiso; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **57,88%**, con base en la programación presentada un avance programado de **28,08%**, teniendo una diferencia de **-29,81%** para el colegio en mención.

Justo Victor Charry Definitivas + fosas Sanitaria

Durante la semana se realiza aplicación de estuco en parte superior de baños, demolición de mesón de lavamanos y muros de división e instalación de enchape en baño de niños de secundaria; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **3,12%**, con base en la programación presentada un avance programado de **3,53%**, teniendo una diferencia de **0,41%** para el colegio en mención.

Rafael Bernal Jiménez

Durante la semana se realiza demolición de alistado, acabado de piso y placa de cponcreto en aula múltiple; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **3,19%**, con base en la programación presentada un avance programado de **8,18%**, teniendo una diferencia de **4,99%** para el colegio en mención.

Juan del Corral

Durante la semana se realiza instalación de alistado en terraza de biblioteca y comedor y regata en muro para manto de aluminio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **3,10%**, con base en la programación presentada un avance programado de **1,04%**, teniendo una diferencia de **-2,06%** para el colegio en mención.

Aspectos Generales

De acuerdo con el informe semanal No. 11, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **3,02%**, con base en la programación presentada un avance general programado de **7,55%**, teniendo una diferencia de **4,53%** en el contrato.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 6 de 8 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas se realiza acta de entrega de emergencias en colegio República de Panamá y colegio Domingo Faustino Sarmiento.

Emergencias Educativas

IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D

En atención a emergencias se realiza instalación de enchape y emboquillado de pisos de aula afectada de institución educativa cumpliendo a cabalidad con las actividades de emergencia en la institución.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

LISTA DE ASISTENCIA. COMITÈ SEMANAL DE OBRA.

NOMBRE	CARGO	EMPRESA.	FIRMA.
Adriana Rondon	Residente obra	Safrid.	
Jaime Alejandro Moreno	Insp. de obra	SAFRID	
Angela Cañón R.	Residente de obra	Safrid	
LUIS EDUARDO MONTES	DIRECTOR OBRA		
SANDRA HUERTAS	INSP. SST.	SAFRID	
Jessica Alvarez.	INSP. TECNICO	SAFRID.	
Henry Artigoza	Insp Tecnico	SAFRID	
Juan Carlos Valencia	Apoyo-Supervisor	DCEE	
Manuel Gonzalez R.	C. Interventoria	Cons. Intercolegios	
Natalia Calderon Acevedo	Inspector interventoria.	Consorcio Intercolegios.	

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

* Bernal Jiménez

Se realizo recorrido de obra en instalaciones de Bernal Jiménez. en donde se evidenció hundimiento en placa de piso de aula múltiple y se recomienda resanar sin demoler placa, así mismo, en el salón de Judo se solicita por parte de secretaría de Educación concepto estructural acerca de la viabilidad de realizar la actividad física en el aula ya que se evidenció filtración en cocina al momento de instalar alistado de pisos; Para los espacios ubicados al lado de las ventanas se recomienda igualmente poner copar más plantilla de alistado, para tanque de agua se solicita verificar presupuesto balanceado a fin de decidir las adecuaciones a realizar para ubicación del mismo.

* Francisco José de Caldas, sede A.

Se manifiesta que el concepto estructural para la viga cinta cuenta con perfil en C de 30 cm y la viga sugerida es de 25 x 12 por lo que en aras de asegurar confinamiento se solicita ejecutar viga de 30 x 15 cm.

* Jorge Eliecer Gaitán.

Se solicita por parte de la SED priorizar la adecuación de la cancha, realizar balance presupuestal a fin de ejecutar esta actividad con seguridad.

* Garcés Navas.

Se solicita priorizar tema eléctrico de acuerdo a concepto realizado por especialista, definir balance presupuestal conforme a alcance de la institución.

* Florida blanca.

Se informa que para el día jueves 30 de marzo se programa topografía para verificar niveles en canchas, se solicita nuevamente concepto eléctrico a fin de balancear

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

adecuadamente balance presupuestal, Así mismo, se solicita viabilizar cambio de cubierta en bloque SENA (almacen) así como intervención en parqueadero de acuerdo a las condiciones estructurales evidenciadas en obra.

* Miguel Antonio Caro.

se informa que de acuerdo a las condiciones evidenciadas en cubierta se hace necesario realizar pendientes a fin de desagüar adecuadamente en este punto así mismo se informa que de acuerdo al avance se encuentra próximo a terminar.

* Justo Victor Charry.

Se manifiesta que se está realizando el avance de la obra conforme a programación y disponibilidad de materiales.

* Juan del Corral.

Pendiente UP de poliurea.

- Para intervención en pasillo y portería (cubierta) se solicita por parte de interventoría realizar cerramiento con tubo metálica y polisombra a fin de asegurar al personal y terceros que transiten por la zona.

TEMAS VARIOS

Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.

Se insta a contratista de obra realizar los acabados acorde a las especificaciones técnicas pertinentes.

* Se solicita a contratista de obra realizar plan de contingencia por cada institución, en vista de atraso general evidenciado para la presente semana, esto en aras de evitar procesos administrativos y atrasos en el contrato en ejecución.
* Se solicita realizar los respectivos actos de entrega de los materiales entregados a las Instituciones educativas, teniendo en cuenta que los tejas de asbesto cemento no tienen autorización para entrega por sus condiciones contaminantes.
* De acuerdo con la disponibilidad de material se dispone por parte de contratista de obra teja para domo de colegio Bernal Jiménez, es revisada y aulada en aras de iniciar con instalación de la misma.

TEMAS VARIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS

1	Concepto estructural Raca el Bernal Jiménez / salón Judo	Responsable:	Contratista de obra.
		Fecha:	
2	Plan de contingencia. por cada Institución	Responsable:	Contratista de obra.
		Fecha:	31/03/23.
3	Balance presupuestal Instituciones	Responsable:	Contratista de obra.
		Fecha:	31/03/23
4	Concepto especialista eléctrico. Instituciones.	Responsable:	Contratista de obra.
		Fecha:	28/03/23
5	Niveles topografía Floridablanca.	Responsable:	Contratista de obra.
		Fecha:	30/03/23.
6	Fichas técnicas emergencias.	Responsable:	SED.
		Fecha:	04/04/23.
7	Diagnósticos, presupuestos Instituciones contractuales. restantes.	Responsable:	Contratista de obra.
		Fecha:	
8		Responsable:	
		Fecha:	
9		Responsable:	
		Fecha:	
10		Responsable:	
		Fecha:	
11		Responsable:	
		Fecha:	
12		Responsable:	
		Fecha:	
13		Responsable:	
		Fecha:	
14		Responsable:	
		Fecha:	
15		Responsable:	
		Fecha:	
16		Responsable:	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

		Fecha:
17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá a los 28 días del mes de marzo del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

ANGELA CAÑON RIVERA
Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

Acta No.	Fecha	Hora inicio	Hora Fin	Lugar
12	04/04/2023	10:30 am	1:30 pm	IED. JUSTO VICTOR CHARRY
Objeto de la reunión:	Comité de seguimiento técnico integral de obra			

INFORMACIÓN DE CONTRATOS

Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.4077642	***Contrato de Interventoría No.***	CO1.PCCNTR.4146207
Objeto del Contrato de obra	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas grupo 2.	***Objeto Contrato Interventoría***	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo.
Contratista de obra	SAFRID INGENIERÍA SAS	***Contratista de Interventoría***	CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha propuesta cumplimiento	Fecha Real cumplimiento
1	Niveles de topografía colegio Floridablanca	Contratista de obra	30 de marzo de 2023	03 de abril de 2023
2	Concepto estructural Rafael Bernal Jiménez – Salón Judo	Contratista de obra	04 de abril de 2023	Pendiente
3	Balance presupuestal Instituciones educativas	Contratista de obra	31 de marzo de 2023	03 de abril de 2023
4	Concepto eléctrico Instituciones Educativas	Contratista de obra	28 de marzo de 2023	Pendiente
5	Especificación técnica Teja - APU	Contratista de obra	31 de marzo de 2023	03 de abril de 2023
6	Plan de contingencia	Contratista de obra	31 de marzo de 2023	03 de abril de 2023
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- Consorcio Intercolegios 2022, en reiteradas ocasiones ha requerido a contratista de obra cumplir con las obligaciones contractuales derivadas del proceso de licitación pública No. SED-LP-DCCEE-039-2022.

- Por parte de interventoría se solicitó a contratista la ejecución de actividades acorde a directrices determinadas por la Secretaria de Educación del Distrito.

- En aras de establecer un mejor control y seguimiento al contrato y dar cumplimiento a los procesos técnicos y administrativos en el menor tiempo posible, se realiza semanalmente mesas de trabajo y reuniones de los diferentes componentes en conjunto con contratista de obra e interventoría.

- Consorcio Intercolegios 2022 solicitó de las buenas gestiones por parte del contratista de obra para realizar las actividades acorde a lo planteado en la programación, esto en aras de evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos

- Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato en las Instituciones Educativas.

- Se notifica a contratista de obra que es indispensable realizar diligentemente la ejecución de las actividades aprobadas por parte de la interventoría, toda vez que los atrasos que se presenten en la ejecución de las mismas serán responsabilidad del mismo.

- A fin de dar el pertinente avance al contrato, se solicita a contratista de obra subsanar las observaciones y requerimientos establecidos por interventoría de manera diligente.

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Jorge Eliecer Gaitán

Durante la presente semana se realiza desmonte de cubierta en cuarto de refrigerios y cooperativa, resanes en muros de segundo piso, suministro y compactación de material mejorado, instalación de mampostería, armado de hierro para viga aérea, instalación de enchape de baño y trasiego de materiales a punto de acopio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **4,80%**, con base en la programación presentada un avance programado de **16,27%**, teniendo una diferencia de **11,47%** para el colegio en mención.

Francisco José de Caldas, sede A

Durante la semana se realiza desmonte de adoquín, excavación manual, demolición de placa, retiro de tubería en gres e instalación de tubería Novafort 8" en zona de parqueadero, así mismo, se realiza en el primer piso de bloque L filos en puertas y ventanas, demolición de cajas de inspección y muros de baños en zona de oficinas, desmonte de aparatos sanitarios, instalación de geotextil y relleno y compactación de subbase; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **7,88%**, con base en la programación presentada un avance programado de **31,88%**, teniendo una diferencia de **24,00%** para el colegio en mención.

Garcés Navas

Durante la semana se realiza desmonte de manto de cubierta en bloque B, cerramiento en lona para punto de acopio en zona de cancha, trasiego de material a punto de acopio y desmonte de manto y limpieza de canales; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **8,02%**, con base en la programación presentada un avance programado de **42,70%**, teniendo una diferencia de **34,68%** para el colegio en mención.

Floridablanca

Durante la semana se realiza mantenimiento de adoquín en sendero peatonal; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

un avance ejecutado de **5,16%**, con base en la programación presentada un avance programado de **17,42%**, teniendo una diferencia de **12,26%** para el colegio en mención.

Miguel Antonio Caro

Durante la semana se realiza desmonte e instalación de teja termo acústica en parte posterior del colegio, corte de placa de contrapiso y aplicación de alistado en placa; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **71,40%**, con base en la programación presentada un avance programado de **32,24%**, teniendo una diferencia de **-39,16%** para el colegio en mención.

Justo Victor Charry

Durante la semana se realiza instalación de enchape en baño de niños preescolar y secundaria y reparación de tubería en mal estado; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **6,38%**, con base en la programación presentada un avance programado de **8,47%**, teniendo una diferencia de **2,09%** para el colegio en mención.

Rafael Bernal Jiménez

Durante la semana se realiza demolición de acabado de piso en aula múltiple y demolición y excavación en placa de tarima; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **3,69%**, con base en la programación presentada un avance programado de **11,14%**, teniendo una diferencia de **7,44%** para el colegio en mención.

Juan del Corral

Durante la semana se realiza instalación de alistado en terraza de comedor, instalación de media caña y trasiego de material y escombro a sitio de acopio; de acuerdo a esto, a la fecha se presenta un avance ejecutado de **3,10%**, con base en la programación presentada un avance programado de **1,14%**, teniendo una diferencia de **-1,95%** para el colegio en mención.

Aspectos Generales

De acuerdo con el informe semanal No. 12, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de **3,56%**, con base en la programación presentada un avance general programado de **9,20%**, teniendo una diferencia de **5,64%** en el contrato.

Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 6 de 8 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.

Emergencias Educativas

IED Francisco José de Caldas, sede A

En atención a emergencias se realiza intervención el día jueves 30 de marzo en cerramiento de Instituto Técnico Francisco José de Caldas, sobre carrera 68, con instalación y aplicación de pintura de dos módulos de rejas de seguridad.

Colegio Distrital Juan Francisco Berbeo

En atención a emergencias se realiza visita el día 01 de abril por parte de interventoría y contratista de obra a fin de verificar y realizar un diagnóstico del tanque subterráneo de agua potable el cual cuenta con afectaciones (posibles fugas).

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Revisadas las condiciones del contrato de obra. se presenta por parte de contratista la solicitud de tener en cuenta el suministro de materiales en las sedes de Garces Navas (A), Francisco José de Caldas, y Jorge Eliecer Gaitan, lo anterior, respecto a las actividades de suministro e instalación de pisos y Cubierta., por lo tanto, se manifiesta que en el avance de la obra se genera parte del rendimiento al contar con dichos materiales, en obra. De acuerdo a lo anterior, Apoyo a la supervision de contrato requiere de parte de Interventoría verificar las cantidades dispuestas allí.

- Se presentó plan de contingencia por parte de SAFRO Ingeniería SAS, en donde se consigno las actividades que tuvieron atraso y su respectiva acción correctiva. Se incluye materiales, personal y horarios para mitigar atrasos.
- Se solicita por parte de Apoyo Supervisor SED revisar los presupuestos conforme a los alcances entregados.
- Conforme al proceso de legalización de OTROSI MODIFICATORIO N°1 adición y prórroga de contratos, se sugiere analizar la manera de intervención de las posibles instituciones educativas; San Jose Norte sede (A) por la necesidad de adecuación a bachillerato

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

Internacional. y Rafael Bernal Jimenez Sede (B) para adecuación de patios en aras de invertir rubros asignados por la alcaldía local. Lo anterior supeditado a los trámites que se vienen adelantando en SED.

- IED justo Victor Charry presenta situación en conexión de tubería con sanitario, teniendo en cuenta, las especificaciones que se tienen para el funcionamiento de los aparatos. Se requiere efectuar la revisión de los elementos a instalar para el correcto funcionamiento. y el respectivo análisis de precios unitarios de requerirse.
- IED Rafael Bernal Jimenez Sede (A), se presenta fisura en zona de tarima, por lo cual, especialista estructural de Sanral ingeniería SAS requiere realizar apique para verificación de capa de soporte, de allí se evidencia, Socavación de la estructura granular, por lo tanto, se solicita reconformar y realizar compactación del material existente. en aras de evitar afectación en la placa a intervenir. Por otra parte se requiere por parte de la supervisión del contrato intervenir la cubierta del pasillo de colegio tercer piso, además efectuar la adecuación y pintura de carpintería metálica existente, por lo tanto se define la utilización de teja en colores azul y blanco, acorde a las dimensiones tomadas en obra. Se solicita efectuar

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

la intervención de manera inmediata, aprovechando el receso por semana Santa.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS COMPONENTE SST - MA

Se permite solicitar el estricto cumplimiento en la entrega de documentación para ingreso de personal operativo previa al inicio de ejecución de actividades, así mismo, contar con el equipo de protección personal tanto en personal operativo como administrativo para la ejecución de las obras.

TEMAS SOCIAL

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

TEMAS FRENTES DE OBRA EN EJECUCIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

TEMAS VARIOS

Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra.

Se solicita al contratista de obra realizar las gestiones y acciones pertinentes a fin de definir el horizonte del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077642 de 2022 y cumplir con el objeto contractual.

TEMAS VARIOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

COMPROMISOS		
1	Concepto estructural - Rafael Bernal - Salon Judo - Cubierta	Responsable: Contratista de obra. Fecha: 05 de abril. 2023.
2	Concepto eléctrico Instituciones	Responsable: Contratista de obra. Fecha: 05 de abril 2023.
3	Concepto estructural - Cimentación y cubierta cuerpo de disfraces Jorge Eliecer Gaitán.	Responsable: Contratista de obra. Fecha:
4		Responsable: Fecha:
5		Responsable: Fecha:
6		Responsable: Fecha:
7		Responsable: Fecha:
8		Responsable: Fecha:
9		Responsable: Fecha:
10		Responsable: Fecha:
11		Responsable: Fecha:
12		Responsable: Fecha:
13		Responsable: Fecha:
14		Responsable: Fecha:
15		Responsable: Fecha:
16		Responsable:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

		Fecha:
17		Responsable: Fecha:
18		Responsable: Fecha:
19		Responsable: Fecha:
20		Responsable: Fecha:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá a los 04 días del mes de abril del 2023.

CONTRATISTA

Luis Eduardo Montes Álvarez
Director de obra

Residente de obra

INTERVENTORIA

Fredy Giovanni Rodríguez Salazar
Director de interventoría

Residente de interventoría

SUPERVISOR

Edwin Alexander Santana Rodríguez
Supervisor Secretaria de Educación del Distrito Capital

Juan Carlos Valencia Gamba
Apoyo Supervisión Secretaria de Educación del Distrito Capital

Nota:
1. En caso de requerirse anexar más casillas para el diligenciamiento se podrá realizar sin problema alguno, siempre y cuando no se modifiquen los espacios de color.
2. Favor anexar a este formato, el registro de ORDEN DEL DIA y LISTA DE ASISTENCIA (___ folios).

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CODIGO	FR-PRO-001	
		F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
		10/08/2017	26/01/2018	02

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:	04/04/2023	Lugar:	IED. JUSTO VICTOR CHARRY	Acta de seguimiento No:	12
Contrato de obra:	CO1.PCCNTR.4077642	Contrato de interventoría:	CO1.PCCNTR.4146207		

Nombre	Cargo	Empresa	Correo	Teléfono	Firma
Jessica Alvarez M.	Insp. Tecnico.	Safrid	Alvarezcarolina615@	3115548608	
Jaime Alejandro Moreno Méndez	Insp. de Obra	SAFRID	moreno.mendez.alejandro@hotmail.com	3138706334	
Luis Fernando Montes	Director Obra	Safrid	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3006613168	
Henry Ortegon M	Insp de Obra.	SAFRID	o-r-tigoza@hotmail.com	3124598539	
Adriana Pada Mendez	Residente obra	Safrid.	adimen2010@gmail.com	3115395011	
Sandra Huertas	Insp. SST.	SAFRID	Sathuertas6@hotmail.com	3164985903	
Angela Cañon R.	Residente de obra	Safrid Ing.	Proyectosedgrupo2@gmail.com	3102532159	
Christian Barros Leon	Insp. de Obra.	Safrid	ingchristianObras@gmail.com	3202331302	
Adriana Castelblanco	Gerente Obra	"	proyectosedgrupo2@gmail.com	3218756901	
Juan Carlos Valencia	DCEF-JFD-Sperú	SED		314212J636	
Natalia Calderón A.	Insp. Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022.	interventoria050@gmail.com	3028328214.	
Manuel Gonzalez R	Coord. Proyectos	"	Director1.gng@gmail.com	3008445316	
Camilo A. Jamaca Pesa	Residente Interventoría	Consorcio Inter Colegios 2022	residente1.cic2022@gmail.com	3163310746	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada/ Sindy Puello	Andrés Flechas/ Mileth Escalante Tapias	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coordinador de Proyectos	Cargo: Profesional RUC y/o Calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente

Anexo 2. BITÁCORA DE OBRA

IED. JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE A

aulas de dibujo y disfraces
Replanteo, nivelación y compactación piso aula 116-2A
Afinado de pisos Aulas 1 y 2 2° piso.

Inspector Interventoría. Inspector.

10-03-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal Obra: Inspector obra
Maestro (1)
Oficial (3)
Ayudantes (6)
Personal interventoría: inspector
Equipos y herramienta: Rodillo Compactador
Mezcladora
Andamio tubular
Actividades: Excavación en aulas de dibujo.
Informática y fotografía,
Toma de niveles y compactación aula 116-2A
instalación de geotextil, Retiro de escombros
Nota: Se requiere del contratista fichas tecnicas
y certificaciones de materiales que se estan
instalando en obra. como requerimiento de
interventoría. Inspector Interventoría Inspector.

11-03-2023 Estado del clima: Mañana. Nublado con lluvias.
Continuos.
Personal de obra. inspector.
Maestro (1)
Oficial (5)
Ayudantes (6)
Personal interventoría: Sst
Inspector.
Equipos y herramientas: Rodillo compactador
Mezcladora

Powered by CamScanner

Herramienta menor
Actividades: instalacion de material mejorado en piso aula 116-2A y compactacion
Excavacion pisos aula informatica.

Inspector interventoria.

Inspector.

13-03-2023 Estado del clima: Mañana. Nublado con lloviznas
Tarde: Nublado con lloviznas
Personal en obra: inspector contratista
Maestro
Oficiales (5)
Ayudantes (5)
Personal interventoria: inspector.
Equipos y herramientas: Rodillo compactador
Mezcladora. 1/2 bulto
Andamio tubular
Salida de material: Viaje de escombros (1)
Actividades: Demolicion piso aula 115 y entrada
cion, desmonte de cielo raso
recepcion
Desmonte de ventana cuarto refrigerio
instalacion de material mejorado y compactacion
aula 116-2A,
Demolicion de pañete cuarto de refrigerio
instalacion de geotextil T-140

Inspector-interventoria

Inspector.

14-03-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado con lloviznas
Tarde: Nublado
Personal obra: Maestro
Oficial (5)
Ayudantes (4)
Personal interventoria: inspector
Equipos y herramientas: Rodillo Compactador (bovita)

Powered by CamScanner

Mezcladora
Andamio tubular
Herramiento menor
Entrada de material: Viaje de B-400 (2)
salida material: (3) Viajes de escombros
Actividades - Demolición pañete aula refrigeria
instalación de material mejorado en
aula 116-2A y compactación.
Nota: Visita del director y residente interventoria.
recorrido de obra.

Inspector interventoria — Inspector.

15-03-2023 Estado del clima: Mañana. Nublado
Tarde: Nublado
Personal obra: inspector tecnico
Inspector sst.
Maestro (1)
oficial (6)
Ayudantes (4)
Personal interventoria: Inspector sst
Inspector tecnico.
Equipos y herramientos: Rodillo compactador
Mezcladora.
Andamios tubulares
Actividades: instalación de material mejorado.
y compactacion aula 116-2A y aula
de informatica.
Excavación aula 113-2A

Inspector interventoria. — Inspector.

16-03-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Persona (obra: Inspector tecnico.
Maestro (1)

oficiales (5)
Ayudantes (5)
Personal interventoria : Inspector.
Equipos y herramientas: Rodillo Compactador -
Mezcladora
Andamio tubular -
Actividades: se termina de demoler pared
en cuarto de refrigerio
se termina excavación cuba 115-2A
se hace instalación aislado pasillo escalera
Excavación cuba fotografia.
Nota: No hay avance de obra.

Inspector interventoria — Inspector.

17-03-2023 Estado del clima : Mañana: soleado-
Tarde: Nublado - lluvias
Personal obra: Maestro (1)
Oficiales (5)
Ayudantes (5)
Personal interventoria : Inspector
Equipos y herramientas: Mezcladora
Andamio tubular.
Rodillo Compactador
Actividades: se continua excavación cuba fotografia
se instala pared en cuarto de
refrigerio
Instalación aislado en estantes y bajo
pared en filos puerta y ventana respectivo
Nota: se hace la observación al contratista.
de que se debe hacer prueba de presión
a la tubería hidraulica instalada en bajo
2 piso

Inspector interventoria — Inspector

18-03-2023 Estado del tiempo: mañana: soleado
Personal obra: Maestro (1)
Oficiales (5)
Ayudantes (6)
Personal interventoria: Inspector.
Equipos y herramientos: Mezcladora
Andamio tubular
Rodillo Compactador.
Actividades: Desmonte de puerta cocla 201
Apinado piso pasillo escalera
instalacion de puñete Cuarto de refrigerio

Inspector interventoria.

Inspector.

21-03-2023 Interventoria solicita de manera inmediata la entrega de la caracterizacion y ensayos del material usado para los rellenos, es primordial que antes de realizar la actividad se remitan estos ensayos ya que interventoria podra realizar verificacion y si no comple se debe retirar a cuenta y riesgo del contratista de obra, de igual manera se debe imprimir la programacion y estar en la obra

Director Interv.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Estado del tiempo: Mañana: soleado
Tarde soleado.
Personal obra: Maestro 4)
Oficial (5)
Ayudantes (5)
Personal interventoria: Inspector.
Equipos y herramientos: Rodillo Compactador
Mezcladora
Andamios tubulares
Entrada material (1) viaje de Bloques
Salida material (1) viaje de escombro

Powered by CamScanner

Actividades: Traslado de material B-400 - filos en ventanas y puertas.
Compactación piso aula fotografía.
Nota: visita y recorrido director y residente interventoría

Inspector interventoría.
Inspector.

22-03-2023 Estado del clima: Mañana : soleado.
Tarde - soleado
Personal obra: Maestro (1)
Oficial (5)
Ayudantes (6)
Personal interventoría: inspector sst
Inspector técnico
Equipos y herramientas - Rodillo compactador
vibradora -
Andamio tubular
Entrada de material: (1) viaje de Material B-400
Salida de material : (1) viaje de escombro.
Actividades: Mezclado de material B-400 + cemento
Instalación de material mejorado en aula informática y aula 115-2A y compactación
Nota: se le remueda al contratista realizar prueba de presión en tubería hidráulica instalada en baño, así mismo se le remueda remitir a interventoría los ensayos realizados y caracterización de materiales usados para rellenos previos a la actividad.

Inspector interventoría.
Inspector.

23-03-2023 Estado del clima: Mañana. soleado
Tarde: Nublado.
Personal de obra: Inspector sst.
Inspector técnico

Powered by CamScanner

Maestro (1)
Oficial (5)
Ayudantes (4)
Personal de interventoria: inspector
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Actividades: Traslado de material y escombros
Nota: entra enchape para baños.
se toman densidades en aulas 116-2A, aula informatica
se hace la observacion de que se debe entregar la caracterizacion y ensayos del material usado para los rellenos previos a la siguiente actividad

Inspector interventoria — Inspector.

24/03/2023 Mañana y tarde Nublo

Personal Obra → Oficial 5 — Personal Interventoria
- Ayudantes 5 — -Inspector
- Maestro 1
- Inspector.

Equipos y Herramientas - Rodillo Compactador
- Herramienta Menor.
- Entrada Material 1 viaje B400.

Actividades - mezcla de material mejorado B400 y compactado en aulas 115 2A.

Nota: No hay avance de obra

Inspector. — Inspector interventoria

29/03/2023. Mañana Nublado
Sabado

Personal Obra - Oficial
- Ayudantes 4
- Inspector.

Personal Interventoria → Inspector.
Equipos y Herramientas - Herramienta Menor y bareton

Actividades - Mezcla de material y compactación
- Demolición de pared lineal en piso 2 (Hall)

Inspector.

Nota: se realizan actividades menores.
No hay avance de obra

Inspector Interventoría

27-03-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado Lluvia 1 hora.

Personal obra: Maestro (1), Inspectora sst
Oficial (5)
Ayudante (5)

Actividades: Desmonte de cubierta cuarto refrigerio y cooperativa, remate de empaste.
Corona muros aula del 2° piso y pared 2 piso.
Embalaje de tejas.

Personal de oficina y porteria: Inspector, sst

Inspector Interventoría Inspector.

28-03-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado 1 hora Lluvia

Personal de obra: Inspector técnico
Maestro (1)
Oficial (5)
Ayudantes (5)

Equipos y herramientas: Bodillo Compactador
Andamio tubular
Herramienta menor.

Entrada de materiales: Viaje de B-400 (1)
Salida de material: Viajes de escombro (1)

Actividades: Mampostería en cuarto refrigerio y cooperativa, Alistado de material (B-400 + cemento e instalación en aula 115-2A y ajustes)

Compactación Inspector Interventoría Inspector.

29-02-2023 Estado del clima: Mañana: soleado.
Tarde: Nublado
Personal obra: inspector tecnico
electrico 4)
Oficial (5)
Ayudantes (5)
Personal interventoria: inspector sst.
Equipos y herramientas: Rodillo compactador
Andamio certificado
Herramienta menor
Entrada de material: Viaje de B-400 (1)
salida de material: viaje de escombro (1)
Actividades: Mezclado de material alquetado e instalado
y compactado aulas de disfraces y fotografias
Mantenimiento en cuarto de refrigerio y cooperativa.
Nota: se realizo prueba de presion tuberia hidraulica
baño 2 piso, se encontro una fuga, se
debe arreglar y realizar de nuevo la prueba.

Inspector.

Inspector interventoria.

30-02-2023 Estado del tiempo: Mañana: soleado
Tarde: soleado.
Personal obra: inspector tecnico
electrico 4)
oficial (5)
Ayudantes (4)
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Rodillo compactador.
Andamio tubular
Herramienta menor.
Entrada de material: Viaje de B-400 (1)
salida de material: Viaje de escombros (1)
Actividades: Mezclado de materia(, instalado
y compactado en aulas de fotografia.

Powered by CamScanner

Armado de baseno. conexión viga muro cooperativa
y refuerzos.
se realiza prueba de presión hidraulica baño.
Compactación Aulas.

Inspector interv. Inspector.

31-03-2023 Estado del clima: Mañana: Nublado
Tarde: Soleado

Personal obra: Maestro.
Oficial (6)
Ayudante (4)

Personal interventoria: inspector tecnico.
Equipos y herramientas: Rodillo compactador.
Andamio Multidireccional
Andamio tubular.
Herramienta menor.

Entrada de material (2) Viajes de B-200
Salida de material (1) Viaje de escombro.
Actividades: Instalación de entrepe en baño
Corte, figurado y armado bastos vigas para
cubierta cuarto refuerzos y cooperativa.
Mezclado de material mejorado e instalado en
cuarto de fotocopia y diseño
Nota: Revisadas las condiciones del material granular
instalado en las aulas de informatica, 116-2A, 115-2A
disfraces y fotografia, se evidencia que los niveles de
terminado no se encuentran acordes a los estipulados en el
concepto presentado por el contratista de obra. En consideración
a lo expuesto se requiere efectuar la nivelación de la
capa del material granular mejorado, en aras de cumplir
con los espesores de la estructura planificada.
Finalmente, ante la omisión de lo mencionado, cualquier
sobreespesor de la placa será asumido por Sagrid Ingeniería
SAS

Inspector interv.

01-04-2023 Estado del clima: Mañana. soleado
Personal obra: Maestro (1)
Oficial (3)
Ayudantes (4)
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientos: Rodillo compactador
Andamio multi-direccional
Herramienta menor
Entrada de material: (1) viaje de B-400
salida de material: (1 viaje de escombros)
Actividades: Mezclado de material granular con cemento, e instalado y compactado
cuela de dibujo.
Instalación de enchape en baño

Inspector interventoria

Inspector.

03-04-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Maestro
oficial (4)
Ayudantes (4)
Personal: interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientos: Andamios tubulares
Andamio multi-direccional
Herramienta menor
Entrada de material: Perfiles de 305mm x 80mm.
Perfiles de 160x60mm.
Actividades: Desmonte de teja cubierta 2° piso cuela
Encofrado vigas en cuarto refrigerios y
Cooperativo.
Picado de muro lateral concreto 2° piso
Instalación de enchape baño

Inspector interventoria

Inspector.

4-04-2023 Interventoria. Se solicita Antes de Realizar Actividades Aplicar la documentacion. ATS. Permiso de Trabajo en Altura. Inspecciones de Equipos. Herramientas.

Lobs SST Inspector Interventorial.

Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: soleado

Personal obra: soldador (1)
Maestro (1)
oficial (0)
Ayudantes (4)

Personal Interventoria: Inspector sst.
inspector tecnico

Equipos y herramientas: Andamio de Madera.
Andamio tubular
Equipo soldadura
Herramienta menor

Entrada de material: Viaje de Arena lavada (1)
salida de material: Viaje de escombro (1)
Actividades: Desmonte teja cubierta 2° piso.
Aula 1
Perforación y anclaje varillas Vigas cintas
cuarto refrigerios y cooperativa
soldadura perfiles.
Trasiego materiales.

Inspector interventoria.

Inspector.

5-04-2023 Miercoles. El dia de hoy se efectuo Visita tecnica del especialista Estructural Ing. Arejer para la finalidad de Validar Conceptos y diseños Planteados en las areas intervenidas.
- Aulas Dibujo tecnico, Fotografia y Disfraces.
- Sector del Segundo piso.
- Aulas 201 A.

Powered by CamScanner

-Aula 3 - Segundo piso.
Validando actividades de obra y Ajustes de diseño en obra.

D. Obra.

Inspector.

Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado con lluvias.

Personal obra: Director obra.
inspector tecnico.
Maestro
Soldador
Oficial (5)
Ayudantes (3)

Personal de interventoria: inspector tecnico

Equipos y herramientas: Andamio tubular
Andamio multidireccional
soldadora, pulidora, taladro, vibrador electrico
Salida de material: Ventaneria, rejas y demas elementos metalicos

Actividades: Fundida viga aerea cuartos refrigerio y cooperativa
Soldadura e instalación de perfiles metalicos de 160mm x 60 mm en cubierta 2° piso
Desmonte de teja cubierta 2° piso
Instalación de enchape baño
Instalación de teja nueva aula 1 2° piso.
Nota: Llovio fuerte despues de las 4:45 pm.

Inspector.

inspector tecnico

06-04-2023 Estado del clima: Mañana. Nublado
Tarde: Nublado con lluvias.

Personal obra: Maestro
Oficial (4)
Ayudantes (4)

Equipos y herramientas: Andamio multidireccional

Compresor, Equipo soldadura,
Herramienta menor
Actividades: Desmonte de teja 2° piso aulas
2 y 3
Instalación de perfiles Cubierta. 2° piso.
desencofrado de viga e inicio pared
Culatas cuarto cooperativa y refrigerios.
Nota: lluvias fuertes de 3:00pm a 5:00pm
se paralizan actividades

Inspector intervención — Inspector.

08-04-2023 Estado del clima: Mañana Nublado
Personal obra: Maestro
Oficial (3)
Ayudante (4)
Equipos y herramientas: Andamio multidireccional
Equipo de soldadura, Compresor
Andamio tubular
Herramienta menor.
Actividades: instalación de endoape bajo
Desmonte de teja cubierta 2° piso
aulas 1, 2 y 3
Instalación de perfiles y tejas cubierta-
2° piso aula 1 y 2.
Instalación de pared en culatas muros
cuarto cooperativa y refrigerios.
Nota: No se realizo fundida de pisos
como se tenía programado.

Inspector intervención — Inspector.

10-04-2023 Estado del clima: Mañana. soleado
Tarde: Nublado
Personal obra: Inspector técnico

NKB

Powered by CamScanner

Maestro obra (1)
Oficiales (5)
Ayudantes (4)
Personal de interventoria
Inspector tecnico
Equipos y herramientas
Equipo de soldadura
Compresor
Andamio multidireccional
Equipo de bombeo concreto
Herramienta menor
Entrada de material: Concreto premezclado de 3000 psi para pisos aulas de informatica, 116-2A, 115-2A, dibujo artisticas y fotografia
Actividades: fundida de pisos aulas 1er piso suministro e instalacion de perfiles y tejas UVPC en cubierta 2 piso aulas 1, 2 y 3
Nota: se realiza actividad de fundida de pisos sin previo aviso a interventoria

Contratista Inspector.

11-04-208 Interventoria reitera el concepto de la cubierta en el area donde se va unir con la cubierta existente, se reitera la solicitud del presupuesto balanceado y el concepto de las canales existentes si cumplen con lo especificado de acuerdo a las areas aferentes, no se encuentra programacion

Director Interventoria. Inspector. RESIDENTE INTERVENTORIA

Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: Nublado

Personal de obra: Maestro
Oficial (5)
Ayudantes (4)

NKB

Powered by CamScanner

Personal interventoria: Inspector tecnico.
Equipos y herramientos: Compresor.
Equipo de soldadura.
Andamio multidireccional
Andamio tubular
Taladro
Herramienta menor.
Actividades: Suministro e instalación de
Perfiles y teja UVPC en 2° piso
cubierta aulas 1 y 2.
Pañete en muro de repriseria y cooperativa
Desmonte de cubierta aulas de dibujo e ingles
Instalación de enchape en baño.
Nota: Visita y recorrido de obra por parte
del director, coordinador y residente
de interventoria.

Inspector interventoria

Inspector.

IT. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE A

Se continúa con excavación en aulas de primer piso, aplicación de pañete, filos en puertas y ventanas de segundo piso. y trasiego de escombro o punto de acopio.

Residente obra. Residente interventoría.

10 de marzo - 2023 (Viernes)

Clima: Mañana: Nublada. Tarde: Nublada.

Personal de obra:
1 Residente
1 SST.
1 Maestro.
3 oficiales.
4 Ayudantes.

Personal interventoría:
1 Residente.
1 Inspector.
1 SST.

Equipo: Herramienta menor, rotomartillo, andamio tubular.

Se continúa con excavación en aulas de primer piso, aplicación de pañete, filos en puertas y ventanas de segundo piso y retiro de escombro (1 viaje).

NOTA = SE NOTA A CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERTINENTES.

Residente de obra Residente interventoría

11 de marzo - 2023 (Sábado).

Clima: Mañana: Lluvias fuertes (7:00 am - 12:00 pm)

Personal de obra:
1 Residente
1 SST.
1 Maestro
3 Oficiales
4 Ayudantes.

Personal interventoría:
1 Residente.
1 Inspector.

Equipo: Herramientamenor, andamio tubular.

Escaneado con CamScanner

Nota: Se realiza visita con el ingeniero electrico Hamer Arevalo de la empresa contratista Satrid: Teniendo en cuenta que cuando se solicita Traslado del Medidor es Enel Codensa quien Autoriza y Ejecuta el Retiro y Colocación de los sellos de Protección del Medidor. Es muy probable que Enel exija Normalización de la medida. con nuevo contador y Caja de Medidor Estandar y por ello un posible diseño electrico para levantar Cargas Electricas Actualizadas. Hamer Arevalo R I.E.

Se continúa con excavación manual en primer piso y aplicación de pañete / filos en aulas de bloque L.

Residente de obra

Residente interventoría.

15 de marzo - 2023 (Miércoles)

Clima: Mañana: Soleada. Tarde: Nublado.

Personal de obra.	Personal interventoría
1 Residente.	1 Residente
1 SST.	1 Inspector.
1 Maestro.	
3 Oficiales	
6 Ayudantes	

Equipo: Herramienta menor, andamio tubular.

Actividades: se realiza demolición de pañete en área de tableros y parte inferior de aulas de primer piso, filos en ventanos y aplicación de pañete en primer piso e igualmente excavación y retiro de material en primer piso de bloque L

Nota: se realiza visita de especialista estructural de parte de contratista de obra.

Escaneado con CamScanner

- Se realizo ingreso de (2) ayudantes de obra.
- Se realizo retiro de escombro (2 viajes).

Residente de obra. Residente interventoría. Natalia C.

16 de marzo - 2023 (Jueves).

Clima: Mañana: Soleado. Tarde:

Personal de obra:	Personal interventoría:
1 Residente.	1 Residente
1 SST.	1 Inspector.
1 Maestro.	
3 Oficiales	
6 Ayudantes	

Equipo: Herramienta tubular, Andamio tubular.

Actividades: Se continúa con excavación manual en primer piso (cerca aulas y pasillo), aplicación de pañete incluido filos en aulas de primer piso y trasiego y retiro de escombro (2 viajes).

NOTA: SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA PRESENTAR BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO, ASI MISMO, REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAJAS Y TUBERIA ENCONTRADA EN ÁREA DE OFICINAS A FIN DE TENER TRAZADO DE RED Y DEFINIR ACCIONES A REALIZAR RESPECTO A LAS MISMAS.

Residente de obra. Residente interventoría. Natalia C.

17 de marzo - 2023 (Viernes)

Clima: Mañana: Soleado. Tarde:

Personal de obra:	Personal interventoría:
1 Residente.	1 Residente
1 Maestro.	1 Inspector.
3 Oficiales	
5 Ayudantes	

Equipo: Herramienta menor, Andamio tubular, Vibro compactador.

Escaneado con CamScanner

Actividades: Se continúa con excavación manual en primer piso, trasiego de escombro, filos y aplicación de pañete en ventanas, puertas, tableros, muros inferiores y entrepaños en aulas de primer piso.

Natalia

Residente obra.

Residente interventoría

18 de marzo - 2023 (sábado).

Clima: Mañana: Soleado.

Personal de obra:

1 Residente

1 Maestro

3 Oficiales

5 Ayudantes

Personal interventoría:

1 Residente.

1 Inspector

Equipo: Herramienta menor, andamio tubular, vibro compactador.

Actividades: Se continúa con mejoramiento, instalación de geotextil, compactación de material, aplicación de pañete y filos y excavación manual en primer piso de bloque L.

Natalia.

Residente obra

Residente interventoría.

21 de marzo - 2023 (Martes).

Clima: Mañana: Soleado.

Tarde:

Personal de obra:

1 Residente.

1 Maestro

3 Oficiales

5 Ayudantes.

Personal interventoría:

1 Residente

1 Inspector

1 Director

Equipo: Herramienta menor, vibro compactador

Actividades: se continúa con compactación de subbase, instalación de geotextil, aplicación de pañete incluido filos, excavación manual de recebo compactado y material común en primer

Escaneado con CamScanner

Piso de bloque L

Interventoría requiere al contratista de obra por la entrega de los laboratorios y caracterización de materiales de los veileros ya que se evidencia plasticidad en el agregado, es pertinente que se entregue antes de la instalación del agregado en obra, de igual manera no se evidencia programación impresa.

Director Interv.

22 de marzo - 2023 (Miércoles)

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Nublado

Personal de obra:

1 Residente.

1 Maestro

3 Oficiales

5 Ayudantes

Personal interventoría:

1 Residente

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador.

Actividades: Se continúa con compactación de subbase en ejes de primer piso, excavación manual en recebo y material común, aplicación de pañete incluido filos.

Se recibe un viaje de subbase B-400

Residente de obra.

Residente de interventoría

23 de marzo -2023 (Jueves)

Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Nublado.

Personal de obra:

1 Residente.

1 Maestro

3 Oficiales

5 Ayudantes

Personal interventoría:

1 Residente

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, vibro compactador.

Escaneado con CamScanner

Actividades: Se continúa con compactación de subbase, aplicación de pañete incluido filos y excavación manual en material común y recebo en primer piso de bloque L.

Residente obra

Residente interventoría.

Natalia

24 de marzo - 2023 (viernes)

Clima: mañana: soleado. Tarde: Nublado Llovizna 3:00pm a 4:00pm.

Personal de obra:
1 Residente
1 Maestro
3 Oficiales
5 Ayudantes
1 SST

Personal interventoría:
1 Residente.
1 Inspector

Equipo: Herramiento menor, vibro compactador.

Actividades: Se continúa con instalación de geotextil tejido T1700, compactación de subbase., filos en puertas y ventanas y aplicación de pañete en muros de aulas y oficinas de primer piso.

Residente de obra

Residente interventoría.

Natalia.

25 de marzo - 2023 (sábado).

Clima: Mañana: Nublado.

Personal de obra:
1 Residente
1 Maestro
3 Oficiales
5 Ayudantes.

Personal interventoría:
1 Inspector

Equipo: Herramiento menor, vibro compactador.

Actividades: Se continúa con instalación de geotextil en aulas, compactación de subbase, filos en puertas y ventanas y aplicación de pañete en muros de oficinas.

Escaneado con CamScanner

Se evidencia reboscamiento de aguas negras en cajas de inspección de oficinas, por lo que se inicia con intervención en cajas para cambio de tubería, limpieza y mantenimiento.

Residente obra. Residente interventoría.

27 de marzo de 2023 (Lunes)

Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Nublado.

Personal de obra:
1 Residente
1 Maestro
3 Oficiales
4 Ayudantes.

Personal interventoría:
1 Residente.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador.

Actividades: Se realiza desmonte de adoquín, excavación manual y demolición de placa para retiro de tubería y cambio de la misma desde oficinas a caja de inspección ubicada en zona verde. Se continúa con relleno de subbase y compactación de la misma, instalación de geotextil, filos en puertas y ventanas en primer piso. adicionalmente, se realizo demolición de acabado de piso en aula restante en primer piso.

Residente de obra. Residente interventoría.

NOTA: SE SOLICITA SUBSANAR BACHES EVIDENCIADOS EN COMPACTACIÓN DE SUBBASE EN AULAS, ASÍ COMO LOS NIVELES DE LOS MISMOS.

28 de marzo de 2023 (Martes).

Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Nublado.

Personal de obra:
1 Residente
1 Maestro.
3 Oficiales

Personal de interventoría:
1 Residente.
1 Inspector.

Escaneado con CamScanner

5 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Vibrocompactador.

Actividades: Se continúa con excavación, demolición de placa para retiro y cambio de tubería de aguas negras, así mismo, se continúa con demolición y excavación de piso en pasillo de primer piso, relleno y compactación de rebbece en aulas y aplicación de pañete en primer piso.

Residente de obra. Residente Interventoría.

29 de marzo - 2023 (Miércoles)

Clima: Mañana: Nublado. Tarde:

Personal de obra:
1 Residente
1 Maestro
3 Oficiales
5 Ayudantes

Personal interventoría:
1 Director
1 Residente.
1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, Vibrocompactador.

Actividades: Se realiza demolición de cajas de inspección en oficina 1 de primer piso, demolición de caja encontrada durante excavación para cambio de tubería Novafort 8", excavación para tubería y caja, cambio de tubería de gress a tubería novafort, relleno de recebo y material común, asimismo se continúa con excavación en aula 6 de primer piso y pasillo.

Residente de obra Residente interventoría.

30 de marzo - 2023 (Jueves).

Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Nublado

Personal obra:
1 Residente.
1 Maestro

Personal interventoría
1 Residente
1 Inspector

Escaneado con CamScanner

3 Oficiales

5 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador.

Actividades. Se realiza instalación de tubería Novafort 8", relleno y compactación de recebo en zanja, Excavación para tubería sanitaria en oficinas de primer piso. Relleno y compactación de subbase en aulas de primer piso y aplicación de pañete en muros de aulas.

Residente obra

Natalia C.
Residente Interventoría.

31 de marzo - 2023 (Viernes)

Clima: Mañana: Nublado tarde: Soleado.

Personal de obra:	Personal interventoría:
1 Residente.	1 Residente.
1 SST	1 Inspector.
1 Maestro	
3 Oficiales	
5 Ayudantes	

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador.

Actividades: Se continúa con aplicación de pañete, filos en ventanas y puertas de primer piso, excavación para tubería sanitaria, excavación en aula 6 de material común y traslado de escombros a punto de acopio.

Residente obra

Natalia C.
Residente Interventoría.

01 de abril - 2023 (Sábado)

Clima: mañana: Nublada.

Personal obra:	Personal Interventoría:
1 Residente.	1 Residente.
1 Maestro.	1 Inspector.

Escaneado con CamScanner

3 Oficiales

5 Ayudantes

1 SST

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador.

Actividades: Se continúa con excavación manual en material común en aula 6. de primer piso, excavación para tubería sanitaria en oficinas de primer piso y anden perimetral (zona sur), adicionalmente se continúa con aplicación de pañete en muros de aulas.

NOTA = DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL MATERIAL INSTALADO EN AULAS DE PRIMER PISO, SE EVIDENCIA QUE LOS NIVELES DE TERMINADO NO SE ENCUENTRAN ACORDE CON LOS ESTIPULADOS POR EL ESPECIALISTA DE CONTRATISTA DE OBRA. EN CONSIDERACIÓN A LO EXPUESTO SE REQUIERE EFECTUAR LA NIVELACIÓN DE LA CAPA DE MATERIAL GRANULAR MEJORADO, EN ARAS DE CUMPLIR CON LOS ESPESORES DE LA ESTRUCTURA PLANIFICADA. ANTE LA OMISIÓN DE LO MENCIONADO, CUALQUIER SOBRE ESPESOR DE LA PLACA SERÁ ASUMIDO POR CONTRATISTA DE OBRA.

Residente Obra.

Residente Interv.

03 de abril - 2023 (Lunes).

Clima: mañana: soleado. Tarde: Soleado.

Personal obra:

1 Residente.

1 SST

1 maestro

3 Oficiales.

5 Ayudantes.

Personal Interventoría:

1 Residente

1 Inspector.

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador.

Actividades: Se continúa con aplicación de pañete en tableros, filos de puertas y ventanas, excavación manual en pasillo de primer piso, Se recibe perfilería, malla electrosoldada), instalación y compactación de subbase en primer piso.

Escaneado con CamScanner

Residente obra. Natalia C. Residente Interventoría.

04 de abril - 2023 (Martes).

Clima: mañana: soleado. Tarde: soleado.

Personal obra: Personal interventoría:

1 Residente 1 Residente

1 SST 1 Inspector.

1 Maestro.

3 Oficiales

5 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador, rotomartillo

Actividades: Se inicia con amarre de hierros, se continúa con excavación manual en pasillo de primer piso, instalación y compactación de subbase en aulas, aplicación de pañete en muros y filos en vanos, así como excavación para tubería sanitaria.

Se recibe ángulos y bloque No. 4.

Residente obra. Natalia C. Residente Interventoría.

05 de abril - 2023 (Miércoles).

Clima: Mañana: Soleado. Tarde:

Personal obra: Personal interventoría:

1 Residente. 1 Residente.

1 maestro. 1 Inspector.

3 Oficiales.

5 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor, vibrocompactador, rotomartillo.

Actividades: Se continúa con amarre de hierros, excavación en pasillo de primer piso, compactación de subbase, instalación de geotextil tejido en área de oficinas, aplicación de pañete en muros y filos en vanos.

Escaneado con CamScanner

Natalia C.
Residente Interv.

Residente obra.

06 de abril - 2023 (Jueves)
Clima: Mañana: Soleado
Personal obra:
1 Residente
1 Maestro
3 Oficiales
5 Ayudantes
Equipo: Herramienta menor, vibro compactador.
Actividades: Por parte de subcontratista se decide realizar media jornada laboral (7:00 am a 12:00pm) en donde se continúa con excavación en pasillo, instalación de geotextil, instalación y compactación de subbase y aplicación de pañete, así como amarre de hierro para vigas de confinamiento.

Residente obra

Natalia C.
Residente Interv.

07 de abril - 2023 (Viernes).
Nota= No se labora en el frente de obra por festividad (Día Santo)

08 de abril - 2023 (Sábado).
Nota= No se ejecutan actividades en el frente de obra.

10 de abril - 2023 (Lunes).
Clima. Mañana. Nublado
Personal obra:
1 Residente.
1 Maestro.
3 Oficiales
4 Ayudantes.

Tarde:
Personal Interventoría.-
1 Residente
1 Inspector.

Escaneado con CamScanner

GARCÉS NAVAS IED., SEDE A

13-03-2023 LUNES

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA : LLUVIA FUERTE

TARDE : LLUVIA FUERTE

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (3)
- INSPECTOR SST (1)

PERSONAL INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)
INSPECTOR SST (1)

* PERSONAL DE OBRA
* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES
- INICIAN CON DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURADO, LAMPARAS, CABLEADO (ZONA AULA MÚLTIPLE).

CAMILO FANDIÑO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Inspector

14-03-2023 MARTES

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA : SOLEADO


TARDE : NUBLADO

* CONTRATISTA
- PERSONAL DE OBRA
OFICIAL (3)
INSPECTOR SST (1)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO

1 ACTIVIDADES

- ASEO GENERAL
- CONTINUAR CON EL DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURAS, LAMPARAS, CABLEADO



CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA




Inspector.

18-03-2023 Mañana y Tarde lluvia
Miercoles. Actividades → No se realiza ninguna actividad




Inspector.




INSPECTOR DE INTERVENTORIA
CAMILO FONSECA

16-03-2023 Mañana y Tarde lluvia.
Jueves. Actividades → No se realiza ninguna actividad.




Inspector.

17-03-2023 Mañana = Nublado Tarde = lluvia.
Actividades → No se realiza ninguna actividad.



Inspector.




INSPECTOR DE INTERVENTORIA
CAMILO FONSECA

18-03-2023 SABADO

ACTIVIDADES

- NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.



INSPECTOR DE INTERVENTORIA

21-03-2023 MARTES

ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA = SOLEADO
TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA OFICIAL (3)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA INSPECTOR (1)

EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
. INICIAN CON DESMONTE DE MAMO EN CUBIERTA
Interventoria solicita que se realice el mantenimiento de la carpinteria metalica de reja adherida ya que se evidencia que en algunas partes solo se realiza pintura y no se eliminan cintas tampoco se remplazan platinas dañadas o con oxido, no se evidencia programación impresa

Inspector Interv.

Inspector.

INSPECTOR DE INTERVENTORIA
CAMILO FAJARDO

Nota: se instala la programación de obra en el salon B203.

2-03-2023 MIERCOLES
*ESTADO DEL CLIMA
.MAÑANA : SOLEADO
* ACTIVIDADES
. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Inspector

INSPECTOR DE INTERVENTORIA
CAMILO FAJARDO

3-03-2023 JUEVES
*ESTADO DEL CLIMA
. MAÑANA . SOLEADO
*, ACTIVIDADES
. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Inspector.

24-03-2023 VIERNES
* ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA: SOLEADO
* ACTIVIDADES
. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD P
PARTE DEL CONTRATISTA.

Inspector.

1
25-03-2023 SABADO
* ESTADO DEL CLIMA
. MAÑANA: NUBLADO
* ACTIVIDADES
. NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD P
PARTE DEL CONTRATISTA.

Inspector

27-03-2023 LUNES
1[illegible] * ESTADO DEL CLIMA
. MAÑANA: SOLEADO TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA * PERSONAL DE INTERVENTORIA
. OFICIALES (3) . INSPECTOR (1)
. INSPECTOR (1)
2 . INSPECTOR SST (1)
* EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES
. CONTINUÓ CON DESMONTE DE MANTO EN CUBIERTA (BLOQUE B)

Inspector.

28-03-2023 MARTES

* ESTADO DEL CLIMA
. MAÑANA: SOLEADO TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA * PERSONAL DE INTERVENCIÓN.
. OFICIALES: (3) INSPECTOR (1)
. INSPECTOR SST (1)
* EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES
. SE REALIZÓ EL TRASIEGO DE MATERIAL QUE LLEGO A OBRA EN LAS HORAS DE LA MAÑANA (CEMENTO, ARENA, GRAVILLA)

Inspector.

29-03-2023 MIERCOLES

* ESTADO DEL CLIMA
* MAÑANA: SOLEADO TARDE NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA * PERSONAL DE INTERVENCIÓN
. OFICIALES (3) (INSPECTOR) = 1
* EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES
. CONTINUÁN CON EL TRASIEGO DE MATERIAL QUE LLEGO A OBRA EN LAS HORAS DE LA MAÑANA (CEMENTO, ARENA, GRAVILLA).
. INICIÁN CON CERRAMIENTO PARA PONER DE ACOPIO DE MATERIALES (ZONA CANCHA).

Inspector.

30-03-2023 JUEVES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: SOLEADO TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
- OFICIALES (3)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)
* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES
- CONTINÚAN CON EL TRASIEGO DE MATERIAL QUE LLEGO A LA OBRA EN LAS HORAS DE LA MAÑANA (180 PHR 305 X 80 X 2M) AL PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL ZONA CANCHA)

Inspector

31-03-2023 VIERNES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: SOLEADO TARDE: NUBLADO
* PERSONAL DE OBRA
- OFICIALES (3)
- INSPECTOR (1)
* PERSONAL INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)
* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
* ACTIVIDADES
- INGRESO DE EQUIPOS (Retropo y COLTADORA DE HIERBA)
- RECORRIDO MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE DESMONTE DE MANTO Y LIMPIEZA DE CANALES.

Inspector

01-04-2023 SABADO

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIALES (3)
- INSPECTOR (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
- INGRESO Y TRASIEGO DE CUBIERTA AL PUNTO DE ACOPIO (ZONA CANCHA)

Inspector

03-04-2023 LUNES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: SOLEADO
- TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (2)
- INSPECTOR (1)
- RESIDENTE (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- (INSPECTOR) = 1

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- COMPRESOR = 100 lb

* ACTIVIDADES
- INICIAN CON CERRAMIENTO EN TEJA (ZONA DE LA CANCHA)
- INICIAN CON LA APLICACION DE PINTURA EN PERFILERIA COLOR AMARILLO. (ZONA CANCHA)

Inspector.

10-04-23 Intervención. Se evidencia que están Realizando
Lunes = Actividades en Altura - Instalación de Formaleta
de Viga Cinta Para Fund.. Sin Permiso en Altura..
ATS.. y Equipos de contra caida. Leído Inspector SST.

4-04-2023 Mañana Nublado Tarde Lluvia
Martes. Personal Obra = Oficiales 3
Ayudantes 2
Inspector.

Herramienta Menor. = Compresor.
Actividades → Pintura de perfilería Metalica
Inspector. Perfil 305 x 80 x 25 (2mm)

5-04-2023 Mañana - Nublado Tarde = Lluvia.
Miercoles. Personal Obra = Oficiales 3.
Ayudantes 2.
Inspector

Equipos y Herramientas - Herramienta Menor.
- Compresor.

Actividades - Aplicacion Pintura 3 en 1.
Perfil 305 x 80 x 25 (2mm).

Nota: Se realiza Mantenimiento al compresor.
Inspector

8-04-2023 Mañana - Lluvia.
Sabado. Personal Obra = Oficiales 3.
Ayudantes 2.
Inspector.

Equipos y Herramientas. - Herramienta Menor.
- Compresor.

Actividades. - Aplicacion Pintura 3 en 1
Perfil 305 x 80 x 25 (2mm).
Perfil 760 x 60 x 20 (2mm).

Inspector.

0-04-2023 Mañana y Tarde Nublado.
Lunes Personal de Obra =Oficiales 3
- Ayudantes 2
- Inspector.

Equipos y Herramientas.- Herramienta Menor.
- Equipo Soldadora.
- Compresor.

Actividades - Replantes viga confinamiento.
- Encofrado Vigacinta.
- Pintura Perfilería Metalica.

Inspector.

1-04-2023 Mañana - Soleado.
Martes.

IED. FLORIDABLANCA, SEDE A

-Herramienta menor
Actividades de obra=
- Continuan Con mantenimiento de arcos en Canchas.
- Se Presentan fuertes lluvias en horas de la tarde (04=00 Pm-04=40 Pm).
- Se terminan labores a las 05=00 Pm

ING ANGELA CAÑON
SAFRID INGENIERIA

Natalia C
Insp. Inter

08/03/2023 Miércoles
-Estado del Clima=
Mañana = Opaco Tarde = Nublado
-Personal de obra=
Oficial (1)
Ayudante de obra=(1)
Residente de obra-Director de obra
-Herramienta menor
-Actividades de obra:
Se realiza adecuación de cerramiento debido a que los estudiantes dañan la lona o se cuelgan de ella.
- Continúan con mantenimiento de arcos en Canchas.
- Se terminan labores a las 05=00 Pm

ING ANGELA CAÑON
SAFRID INGENIERIA

Natalia C
Insp. Inter

09/03/2023 Jueves
-Estado del Clima:
Mañana: Se pretentan fuertes lluvias 7:00 am a 12:00 pm
Tarde = Lloviznas de 1:00 pm a 5:00 pm

Powered by CamScanner

- Personal de obra:
Oficial (1)
Ayudante (1)
Inspector Interventoría
Residente interventoría.
Residente de obra. - Director de obra.
- A causa de las fuertes lluvias presentadas en el día y las actividades programadas únicamente en exteriores, no se realizan actividades en el día.

ING. ANGELA CAÑÓN
SAFRID INGENIERIA

Natalia C
Insp. Inter

10/03/2023 Viernes.
- Estado del clima:
Mañana: Nublado. Tarde: Nublado.
- Personal de obra: - Personal interventoría:
Oficial (1) Residente (1).
Ayudante (1) Inspector (1)
Residente de obra Director de obra
- Equipo: Herramienta menor.
- Actividades de obra:
Se continúa con mantenimiento de arcos en concha a. y se realiza aseo general.
A la espera de aprobación de ingreso para maquinaria (retro excavadora), Por Parte de interventoría.

ING ANGELA CAÑÓN
SAFRID - INGENIERIA.

Natalia C
Insp Inter

11/03/2023 Sábado.
- Estado del clima:
Mañana: Lluvias fuertes 7:00 am a 12:00 pm.

Por fuertes lluvias Presentadas, no se realizan actividades de obra.
Se terminan labores a las 12=00 Pm.



INGANGELA CAÑON
SAFRID-INGENIERIA.



Natalia
Insp. Inter

13/03/2023 Lunes.

- Estado del Clima
  Mañana = OPaco-lluvioso Tarde: OPaco.
- Personal de obra:
  Oficial (1)
  Auxiliar de obra (1)
  Residente de obra
  Director de Obra
- Herramienta menor =
- Actividades de obra:
  Continuan con mantenimiento de arcos en cancha
  Se organiza acceso de maquinaria.
  Se terminan actividades a las 05=00 Pm

Personal de Interventoria
Inspector (1)



INGANGELA CAÑON
SAFRID INGENIERIA



Natalia
Insp. Inter.

14/03/2023 Martes

- Estado del Clima
  Mañana. Soleado Tarde = Soleado
- Personal de obra
  Oficial (1)
  Auxiliar de obra (1)
  Residente de Obra
  Director de obra
- Herramienta menor

- Personal de Interventoria
- inspector (1).

Powered by CamScanner

-Actividad de obra:
Continuan con mantenimiento de arcos en Cancha.
Se terminan labores a las 05:00 pm
A la espera de aprobación por parte de interventoria de la maquinaria.

Ing. Angela Cañón
SATRID INGENIERIA.

Natalia C.
Insp. Interv.

15/08/2023 Miercoles
-Estado del Clima
Mañana: Opaco. Tarde: Opaco.
- Personal de obra
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra
Director de obra
- Personal de Interventoria
- Inspector (1).
- Herramienta menor.
- Actividad de obra.
Continuan con mantenimiento de arcos en cancha.
Se terminan labores a las 05:00 pm.
Se da autorización y aprobación por parte de inventoria de la maquina.

ING ANGELA CAÑÓN
SATRID INGENIERIA

Natalia C.
Insp. Interv.

16/08/2023 Jueves
-Estado del Clima
- Mañana = Opaco Tarde: Opaco

Powered by CamScanner

-Personal de obra= Personal Interventoria
-Oficial (1) Inspector (1)
Auxiliar de Obra (1)
Ing. Residente
Director de obra
- Herramienta menor
-Actividades de obra
Continuan con mantenimiento de arcos en cancha-
En horas de la tarde se realizan 2 apiques en Parqueadero.
Se terminan labores a las 05:00 Pm.

Ing. Angela Cañon
Safrid Ingenieria

Insp. Inter.

17/03/2023 Viernes
-Estado del Clima=
Mañana: Soleado Tarde: Soleado
-Personal de obra: -Personal Interventoria
Oficial (1) Inspector (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra, Operario bob-cat
Director de obra, Operario retro, Operario vibrocomp.
- Herramienta menor - Vibro-compactador, mini-cargador, retro.
- Actividades de obra=
- Se realiza la autorización del ingreso de maquinaria amarilla (vibro-compactador - mini-cargador y retro oruga), Se realiza el mejoramiento del recebo, Se escarifica los 15 cm de la capa de Subbase, Se mezcla en sitio con cemento hidráulico al 3% con el fin de disminuir la Plasticidad (Suelo-cemento),

Powered by CamScanner

Se terminan labores a las 05:00 Pm.

ING. ANGELA CAÑON
SAFPID-INGENIERIA

Oficial.
Insp. Inter

18/03/2023 Sábado

-Estado del Clima:

Mañana: Tarde:

-Personal de obra: - Personal Interventoria

Oficial (1), Auxiliar de obra (1) Inspector (1)

Residente de obra - Director de obra

-Operario bob-cat, Operario vibro, Operario retro-excavadora

-Herramienta menor, vibro-compactador, mini-cargador, retro.

-Actividades de obra: Se nivela, conforme a la capa del Proyecto, se instala y compacta con vibrocompactador, Se terminan labores a las 05:00 Pm

ING. ANGELA CAÑON.

21.03.2023 Interventoria de obra. SST.

Se solicita ante de Realizar Actividades de maquinaria Amarilla. aplicar los Procedimientos y ATS. de los Operadores en campo. Interventor. SST.

Interventoria solicita verificacion de niveles en placa de la cancha para proceder a la fundida de la placa deben traerse en claro los desagües de la cancha

Director Inter.

ING. ANGELA CAÑON
SAFPID-INGENIERIA

Residente Interventoria

21/03/2023 Martes

-Estado del Clima

Mañana: Soleado Tarde: Nublado.

-Personal de obra

Oficial (0), Auxiliar de obra (1)

Residente de obra, Director de Obra

Operario bob-cat, Operario vibrocompactador

Operario retro.

-Personal Interventoria: Ing. Residente y

Director de obra.

- Herramienta menor, vibro compactador, bob-cat, retro.
- Actividades de obra:
- Continuan con la compactación de las canchas.
- Se realiza nuevamente limpieza de los Cárcamos.
- Siendo las 11:00 am llegan laboratorios Para realizar apiques en Parqueadero y tomar Pruebas de densidades. en canchas.

ING. ANGELA CANON
SAFRID INGENIERIA

Natalia
Insp Inter

22/03/2023 Miércoles

- Estado del clima:

Mañana = Nublado. Tarde = Soleado

- Personal de obra:

Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra (1)

Personal interventoría:
Inspector (1).

- Equipo: Herramienta menor.
- Actividades de obra:

Se continúa con limpieza y mantenimiento de cárcamos y cajas eléctricas ubicadas en canchas

ING. ANGELA CANON
SAFRID INGENIERIA

Natalia.
Insp. Inter

23/03/2023 Jueves

- Estado del clima:

Mañana: Soleado Tarde = Nublado

Powered by CamScanner

- Personal de obra =
Residente de obra
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1).
- Personal interventoría =
Residente interventoría
Inspector interventoría.
- Equipo = Herramiento menor.
- Actividades de obra = Se continúa con mantenimiento y limpieza de cárcamos

ING. ANGELA CANTÓN
SAFRID - INGENIERIA

Natalia.
Insp. Inter

24/03/23 Viernes.
- Estado del clima =
Mañana = Soleado. Tarde: Lloviznas de 3:00 pm a 4:00 pm.
- Personal de obra =
Residente obra
Oficial (1)
Ayudante (1).
- Personal interventoría:
Residente interventoría
Inspector interventoría.

Herramienta menor
Actividades de obra =
④ Se realiza limpieza de carcamo.
⑤ Aseo general de obra.
Se terminan labores a las 05:00 pm

ING. ANGELA CANTÓN
SAFRID - INGENIERIA

Natalia.
Insp. Inter

25/03/2023 Sábado
- Estado del Clima =
Mañana = Soleado Tarde = Soleado
Personal de obra =
- Oficial = 1
- Auxiliar de obra = 1
- Residente de Obra -
- Director de Obra

Powered by CamScanner

-Herramienta menor
- Actividades de obra
Se realiza limpieza de cajas de aguas lluvias
Se terminan labores a las (05:00 Pm) 12:00

ING. ANGELA CAÑON
SAFRID-INGENIERIA.

Natalia C.
Insp. Inter

27/03/2023 Lunes
Estado del Clima
Mañana = Soleado Tarde = Soleado
-Personal de obra
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra
Director de obra.
- Herramienta menor
-Actividades de obra:
* Se realiza limpieza de adoquin - Andenes.
Se terminan labores a las 05:00 PM

ING. ANGELA CAÑON
SAFRID-INGENIERIA

Natalia C.
Insp. Inter

28/03/2023 Martes
-Estado del Clima
Mañana = Soleado Tarde = O Paco
-Personal de obra:
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1).
Residente de obra:
Director de obra:
- Herramienta menor
- Actividades de obra:

Powered by CamScanner

Continuan con limpieza y aseo de obra.
Se terminan labores a las 05:00 Pm.

ING. ANGEL CAÑON
SAFRID-INGENIERIA

Natalia.
Insp. Intern.

24/08/2023 Miercoles
- Estado del Clima=
Mañana= Soleado Tarde= OPaco
Personal de Obra=
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra
Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra=
* Continuan Con limpieza de adoquines, Orden y aseo de Obra.
* Se terminan labores a las 05:00 pm.

ING. ANGEL CAÑON
SAFRID-INGENIERIA

Natalia.
Insp. Intern.

30/04/2023 Jueves
- Estado del Clima
Mañana = Soleado Tarde= OPaco.
- Personal de obra
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra
Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de Obra=
* Continuan con orden y aseo de obra.
* Limpieza y organitación de adoquines

Powered by CamScanner

andenes.

Se terminan labores a las 05:00 Pm.

Se realiza Verificacion medidas con Interventoría

INGANGELA CAÑON
SAFRID-INGENIERIA

Natalrac.
Insp. Inter

31/04/2023 Viernes

- Estado del Clima:
Mañana: OPaco Tarde: OPaco
- Personal de obra-
Oficial (1)
- Auxiliar de obra (1)
- Residente de obra
Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra:

Continuan con aseo general de obra, limpieza de cajas.

Se terminan labores a las 05:00 Pm.

INGANGELA CAÑON
SAFRID-INGENIERIA

Natalrac.
Insp Inter

01/04/2023 Sábado

- Estado del Clima:
Mañana: Soleado
Personal de obra
Oficial (1)
Auxiliar de Obra (1)
Residente de obra
Director de obra
Topografo de obra
- Herramienta menor, Estación total y sus respectivos aparatos de medición.

NKB

- Actividades de obra.
Se realiza el levantamiento Topografico de las Canchas.
- Se dejan niveles cada 5 metros.
- Se realiza absisado en Canchas.
- Se terminan labores a las 12:40 Pm.



ING ANGEL CAÑON
SAFED-INGENIERIA



Natalia C.
Insp. Inter

03/04/2023 Lunes.
Estado del Clima
Mañana: Opaco Tarde: Soleado
Personal de obra:
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra.
Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra.
Se realiza verificación de niveles, Se Procede a nivelar el terreno en las Partes donde se encuentre alto.
Se terminan labores a las 05:00 Pm.



ING. ANGEL CAÑON
SAFED-INGENIERIA




Natalia C.
Insp. Inter

04/04/2023 Martes
Estado del Clima
Mañana = Soleado Tarde = Soleado
Personal de obra
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)

NKA

Powered by CamScanner

Residente de obra
Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra
* Continuan con nivelación del terreno
* Se terminan labores a las 05:00 pm




ING. ANGEL A CAÑON
SAFRID-INGENIERIA

Natalia C.
Insp. Inter



05/04/2023 Miércoles
- Estado del Clima
Mañana: Opaco Tarde: Soleado
- Personal de obra=
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra
Director de obra
- Herramienta menor, bob-cat
- Actividades de obra=
Se realiza nivelación en canchas con minicargador.
- Se desmonta rejilla del carcamo de 1 medio de las 2 canchas.
- Se inicia demolición del cárcamo del medio de las dos canchas.
- Se terminan labores a las 05:00 pm



ING. ANGEL A CAÑON
SAFRID-INGENIERIA.

Natalia C.
Insp. Inter



06/04/2023. Jueves
Nota: No se ejecutan labores en el frente de obra por día festivo.

Powered by CamScanner

07/04/2023 Viernes.

Nota: No se ejecutan labores en el frente de obra por día festivo.

08/04/2023 Sábado

Nota: El día de hoy no se realizan labores en el frente de obra.

10/04/2023 Lunes

Estado del clima.

Mañana: Nublado Tarde: Soleado

Personal de obra: Personal Interventoría:

Oficial (1) Residente (1)

Auxiliar de obra (1). Inspector (1)

Residente (1)

Equipo: Herramienta menor, BobCat.

Actividades: Se continúa con nivelación en canchas con mini cargador. y demolición de cárcamo central en canchas.

Se terminan labores a las 05:00 Pm.

Natalia.
Insp. Interv.

ING. ANGELICA CAÑÓN
SAFRID-INGENIERIA

11/04/2023 Martes

Estado del clima

Mañana: Soleado Tarde: Opaco

Personal obra: Personal Interventoría

Maestro (1)

Oficial (1)

Ayudantes (3)

Residente (1)

Equipo: Herramienta menor. — Minicargador.

Inf. inventaria retiro la nivelación de las dos canchas en visita efectuado no se evidencia un manejo adecuado de los niveles de material granular

IED. RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, SEDE A

Equipos y herramientas: Andamios
Herramienta menor.
Actividades: instalación de entablado en placa salón de karate.
Nota: Durante la actividad de instalación de entablado sobre placa salón de karate, el personal de la cocina nos informa que esta filtrando agua sobre la campana y que debido a esto se esta desprendiendo el cielo raso que esta en drywall, por lo tanto el contratista para la actividad
- Se hace la observación al contratista nuevamente que debe remitir ante la interventoría el concepto de especialista para realizar actividades de demolición de pisos en aula multiple y de cualquier otra actividad que requiera el concepto de especialista

Contratista
Interventoría

09-Marzo-2023 Se continua con adecuación de salón de Judo con sobrepiso en madera y traslado de materiales; llegan materiales para estructura liviana para shut de basuras. Clima nublado con lluvias en horas de la tarde. Personal en obra: 01 Inspector de obra; 01 Oficial y 01 ayudante

Alejandra Moreno SAFFIO
Insp. de Obra.

10-Marzo-2023 No se realizan actividades.

Alejandra Moreno SAFFIO
Insp. de Obra.

11-Marzo-2023 Hoy se realizaron actividades de obra

13-Marzo-2023 Intervención: en recorrido realizado por obra se evidencia que se encuentra el sr. Wilber Chaparo los

C.C. 1078880250 quien aun no se encuentra autorizado para realizar actividad laboral, se hace nuevamente la observación al contratista sobre que se requiere la revisión y aprobación de paraficales del personal antes de proceder a la realización de actividades

Contratista

Por parte de la señora Rectora Zoraya Flores Alvarez autoriza retirar los afiches del salón de judo para la actividad de estuco y pintura del muro.

Zoraya Flórez Alvarez
Rectora
Colegio Rafael Bernal Jiménez
I.E.D

14-Marzo-2023 Se continua con sobrepiso en aula de judo; se retira enchape granito pulido en aula múltiple. Clima Sabado. Personal en Obra: 01 Inspector de Obra; 01 Oficial y 01 Ayudante.

Alejandro Florero
SAFRID
Insp. de Obra.

15-Marzo-2023 Estado del clima: Mañana Nublado-
Tarde:
Personal obra: Inspector
Maestro (1)
Ayudantes (4)
Personal salvaguardia: Inspector
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Actividades: Demolicion piso aula multiple
instalacion aislado pasillo escalera
2° piso
Excavacion piso aula.
Nota: se hace la observacion al contratista que se debe tener en cuenta las especificaciones tecnicas para pisos, en los cuales se debe tener en cuenta las superficies y acabados totalmente

niveladas libres de resaltos y solventes en uniones y juntas, que se presente una superficie uniforme y continua.

Interventoría
Inspector

16-03-2023 Estado del clima: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal obra: Inspector
Oficial (1)
Ayudantes (2)
Personal interventoría: inspector
Equipos y herramientas: Herramienta menor.
Actividades: Demolición piso aula multiple.

Interventoría.

Se le realiza solicitud al señor Edison Maestro de Interventoría que nos ayude a definir el acabado del Aula de Judo para determinar el siguiente proceso constructivo a lo cual me reporta que eso lo va a preguntar al residente de Interventoría; se continua con demolición de pisos en aula múltiple.

Inspector de obra
SAFRID
Alejandro Florero.

7-Marzo-2023. Se continua con demolición de piso en Aula multiple; afinado de pasillo en ingreso a Salón de Judo. Clima Nublado; personal en obra: 01 Inspector de Obra; 01 Oficial y 02 ayudantes.

Alejandro Florero
SAFRID
Insp. de Obra.

8-Marzo-2023 Se continua con demolición de piso en Aula múltiple, recogida de escombros. Clima Soleado. Personal en Obra: 01 Inspector de Obra; 01 Oficial y 02 ayudantes

Alejandro Florero
SAFRID
Insp. de Obra.

21-Marzo-2023 Estado del clima: Mañana soleado
Tarde: soleado
Personal obra: inspector (1)
Ayudantes (2)
Personal interventoria: inspector
Equipos y herramientas: Rotomartillo.
Herramienta menor
Actividades: Demolición piso aula multiple

Inspector interventoria

22-Marzo 2023 Se continua con demolición de (placa) alistado y acabados de pisos en Aula múltiple; recogida de escombro. Clima soleado. Personal en Obra: 01 Inspector de obra; 01 Oficial y 02 ayudantes.

Alejandro Moreno
SAFRIO.
Insp. de Obra.

23-Marzo-2023 Se continua con demolición de pisos en aula múltiple; llega material de recebo y arena para actividad de alist. Clima: Soleado; Personal en obra: 01 Inspector de Obra; 01 Encargado y 01 Oficial.

Alejandro Moreno
SAFRIO.
Insp. de Obra.

24-Marzo-2023 Se inicia demolición de placa fracturada en tarima para mejoramiento del suelo. Clima Soleado; Equipo: Rotomartillo; Personal en Obra: 01 Inspector de Obra, 01 Oficial y 01 Encargado.

Alejandro Moreno
SAFRIO
Insp. de Obra.

25-Marzo-2023 Se continua con demolición de placa maciza en tarima y recolección de escombros. Dia Soleado; equipo: rotomartillo eléctrico. Personal en obra: 01 Inspector, 02 operarios

Alejandro Moreno
SAFRIO
Insp. de Obra.

27-Marzo-2023 Se continua con demolición de placa maciza en tavima; enlonado del escombro. Clima Nublado; Equipos: Rotomartillo eléctrico. Personal en Obra: 01 Inspector de Obra; 01 Encargado; 01 Ayudante.

Alejandro Moreno
SAFRID
Insp de Obra

28-Marzo-2023 Estado del clima: Mañana, Nublado

Tarde: Nublado

Personal obra: inspector técnico

oficiales 2

Ayudantes 2

Personal Interventoria: inspector técnico

Equipos y herramientas: Herramienta menor

Actividades: Demolición piso aula multiple

Demolición placa maciza tavima

Nota: se realiza comite de obra y asi mismo se hace recorrido por los puestos de obra con la participación de supervisor de la sed, interventoria y contratistas.

Inspector Interventoria

29-Marzo-2023 Estado del clima: Mañana: soleado

Tarde: Nublado

Personal obra: inspector técnico.

oficiales (1)

ayudantes (1)

Personal interventoria: inspector sst.

Equipos y herramientas: Herramienta menor

Actividades: Demolición piso aula multiple

Demolición Placa maciza

Inspector Interventoria

30-Marzo-2023 Estado del clima: Mañana. soleado

Tarde: Soleado

Personal obra: oficial (1)
Ayudante (1)
Personal interventoria: inspector tecnico
Equipos y herramientas: Herramienta menor.
Actividades: Excavacion longitudinal (torimo.

Inspector interventoria

31-Marzo-2023 Se continua con excavación de recebo en torimo, para mejoramiento; se encontraron vacios en capas inferiores. Clima Soleado; personal en obra: 01 Inspector de obra; 01 Aux. sst; 02 operativos.
Alejandro Herrera
SAFRID
Ingº de Obra.

01-04-2023 Estado del tiempo: Mañana: soleado
Personal obra: oficial (1)
Actividades: Excavacion piso torimo.
Nota: No se ve adelanto en obra
Personal interventoria: inspector tecnico
Inspector interventoria

03-Abril-2023 Estado del clima: Mañana soleado
Tarde- soleado
Personal obra: inspector tecnico.
Encargado (1)
oficial (1)
Ayudante (1)
Personal interventoria: inspector tecnico.
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Retromartillo.
Actividades: Demolicion piso Asfalto multiple
Recogida de material excavado y
traslado a acopio y relleno con mismo material

Inspector interventoria

04-Abril-2023 En visita de obra se evidencia labores de demolicion,

excavación y relleno en terreno 125 obreros

05- Abril- 2023 Se continua con excavacion de terreno y compactacion de material proveniente de excavaciones y demolición para mejoramiento del suelo de la terraza. Personal en obra: 01 Inspector de obra; 02 ayudantes. Clima nublado; llegan las tapas para cubierta 3er piso.

Alejandro Moreno
SAFRID
Insp. de Obra.

06- Abril- 2023 Se inicia actividad de desmonte de cubierta de policarbonato en tercer piso; limpieza de estructura metalica; pintura en estructura e instalación de tapa alveolar antigranizo; las actividades se realizan por zonas. Clima Nublado con lluvias leves; Personal en obra: 01 Inspector de obra; 02 cubiertas; 04 ayudantes. Equipos: Andamio certificado y EPCC.

Alejandro Moreno
SAFRID
Insp. de Obra.

07- Abril- 2023 Se continua con desmonte de cubierta; limpieza de estructura; pintura de estructura, instalación de cubierta alveolar; limpieza de viga canal; adecuación de material en terraza y compactación por capas. Clima nublado con lluvias en la mañana; Personal en obra: 02 Oficiales de cubiertas; 04 ayudantes.

Alejandro Moreno
SAFRID
Insp. de Obra.

08- Abril- 2023 Se continua con limpieza y pintura de estructura metálica en 3er piso; desmonte de cubierta en policarbonato e instalación de tapa alveolar antigranizo; se inicia traslado de cubierta a punto de acopio. Clima nublado, lluvias leves desde las 08:00 hrs a 09:30 hrs. Personal en obra: 01 inspector de obra; 02 Oficiales de Cubierta.

Alejandro Moreno
SAFRID
Insp. de Obra

09-Abril-2023 Se continua con último tramo de cubierta; se realiza limpieza y pintura de estructura metálica; se realiza cubierta de lámina de policarbonato y se instala tapa almolar antigranizo; se retira material proveniente de la desinstalación de cubierta a punto de limpia; Queda instalada la cubierta en domo del 3er piso. Personal en obra: 01 Inspector de Obra; 02 oficiales de obra y 02 ayudantes. Clima Soleado.

Alejandro Flores
SAFBIQ
Insp. de Obra.

10-Abril-2023 Estado del clima cálido soleado

Tarde:

Personal obra: inspector técnico
Oficiales (2)
Ayudantes (2)

Personal intervención: inspector técnico

Equipos y herramientas: Andamio multidireccional
herramienta menor

Actividades: Instalación de tubería sanitaria e hidráulica zona abast. bodega.

Replanteo y nivelación piso terraza para recibo.

Instalación de recibo B-400 terraza.

Nota: se observa personal en alturas sin elementos de protección

Jefe de Intervención.

IED. JUAN DEL CORRAL, SEDE A

la biblioteca.

Inspector interventoria

Inspector.

10-03-2023.

clima: nubado - lluvia.

Personal en obra. = 1 inspector tecnico

- 1 maestra
- 1 oficial
- 2 ayudantes.

personal. de interventoria = 1 inspector tecnico

Herramienta y equipos.

herramienta menor y trompo.

Actividades.

- se continua con. Fundida de. alistado. en Placa de biblioteca. y maestras e. Instalacion de malla gallinero.
- se continua con. traslego de material,

Inspector interventoria

Inspector.

11-03-2023

clima: Nubado - Lluvioso.

15/04/2023 08:49:42
#IED Juan del corral
Numero de índice: 154

15/04/2023 08:51:00
#IED Juan del corral
Número de índice: 155

Personal en Obra: 1 Inspector tecnico.
1 maestro
2 Oficiales.
1 ayudante.
actividades:
- Se continua con alistado en la Placa. de la biblioteca.
- Se continua con trasiego de material. del tercer piso a la zona de acopio.

Inspector interventoria Inspector.

13-03-2023.
Clima: Nubado
Personal en Obra: 1 Inspector tecnico.
1 maestro.
1 Oficial
2 ayudantes.
Nota: El cuarto de bombas amance Inundado. Se atiende la emergencia se llama a los. bomberos, se saca el agua y el. cuarto queda. seco.
- Se continua con. alistado en zona de biblioteca. Y trasiego

Inspector interventoria Inspector.

14-03-2023 Interventoria, solicita de acuerdo a la temporada de lluvias se tomen las medidas pertinentes para la proteccion de las aceras debajo de las placas donde se estan realizando las obras, de igual manera es pertinente ajustar el bolance.

Clima soleado.
Personal en Obra: 1. Inspector tecnico.

15/04/2023 08:57:45
#IED Juan del corral

1 maestro. 1 Inspector sst.
2 Oficiales
3 ayudantes.
- Personal Interventoria
1 Inspector tecnico
1 Inspector sst
Nota: Se realiza mesa de trabajo con Interventoria. Para revisar el corte2 del mes de marzo.
asisten. Por Parte de interventoria.
Arquitecto Fredy.
Ingeniero camilo.
Los Inspectores natalia y edinson.
contratistas.
Arquitecto Luis eduardo
Ingeniera angela.
Inspectores. Henry, Alejandro y Jessica.
Actividades:
- Se continua con alistado de la. Placa de la biblioteca.
- Se empleza con media caña. en Placa de la biblioteca.
- Se realiza hizada de material. ala Placa de biblioteca.

Inspector

15 de marzo de 2023.
Clima Soleado
Personal en Obra
1 maestro
1 Oficial
2 ayudantes.
actividades.
-Se continua con. alistado de Aso en la Placa de biblioteco

15/04/2023 08:51:54
#IED Juan del corral
Número de índice: 157

- se continua con media caña perimetral
- traslego de material

Inspector

16- marzo de 2023.
Clima Soleado
Personal en obra.
1 maestro
1 OFICIAL
1 ayudante.
1 Inspector tecnico.
Personal Interventoria.
1 inspector tecnico.
actividades.
- se continua con media caña.
Perimetral.
- traslego de material.

Inspector

17- marzo de 2023.
clima nubado - lluvioso.
Personal en obra.
1 maestro.
1 OFICIAL
1 ayudante.
1 inspector tecnico.
actividades.
- se continua con. media caña.
Perimetral
- Traslego de material.

Inspector.

18- marzo de 2023.
Clima: Soleado.
Personal de Obra:
1 oficial
1 Ayudante

Personal Interventoría: Inspector técnico; Residente

Actividades

- Instalación de media Caña

RESIDENTE INTERVENTORIA.

21-03-2023 Interventoría requiere celeridad en las actividades de retiro de nivelación por la epoca de lluvias, de igual manera la programacion no se encuentra impresa

clima : soleada

Personal en Obra:

1 maestro

1 OFICIAL

1 ayudante.

- actividades.

-Se continua con media caña, en la zona de biblioteca.

- Se continua contrasiego de material del tercer piso al zona de acopio.

Inspector interventoría

Inspector tec.

22- marzo de 2023.

clima soleado.

Personal en Obra.

1 inspector tecnico

1 maestro

1 OFICIAL

1 ayudante.

actividades.

- Se continua con alistado

comedor.

15/04/2023 08:54:12
#IED Juan del corral
Número de índice: 158

- Traslego de material del tercer piso a zona de acopio.

Personal de interventoria
1. Inspector tecnico.

Inspector tecnico.

Inspector Interventoria

23- marzo de 2023.
clima soleado.
Personal en obra.
- 1 Inspector tecnico
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 1 ayudante.

actividades.
- Se continua con las lineas maestras. de la Placa del comedor.
- Se con aliotado Parcial de la Placa del comedor.
- Se realiza corte con Polidora en zona de la Biblioteca, donde va el. manto asfaltico.
- Se continua con traslego de materia. del tercer piso a zona de acopio.

Inspector Interventoria

Inspector.

24- marzo de 2023.
clima soleado - Nubado - Lluvioso.
Personal en obra.
1 Inspector tecnico
1 maestro.
1 Oficial
1 ayudante.
Personal de interventoria.
1 Inopector tecnico.

15/04/2023 08:54:22
#IED Juan del corral
Número de índice: 159

actividades
- actividad de alistado de piso en zona del comedor.
- llega materal de arena de rio
- se realiza trasiego de material.

Inspector. Inspector interventoria

25-marzo 2023
clima soleado:
personal en obra.
1 inspector tecnico
1 maestro
1 oficial
2 ayudantes.
actividades.
-se continua con alistado de piso.
en la placa del comedor.
- Se realizan lineas maestras en.
la misma placa.
- se continua con trasiego de material de tercer piso ala zona de acopio y de la zona de acopio hacia el tercer piso

Inspector interventoria Inspector.

27-03-2023.
clima soleado.
personal en obra.
1 inspector tecnico
1 inspector sst.
1 maestro
1 oficial
2. ayudantes
actividades:
-se continua con alistado de piso en la placa del comedor.

15/04/2023 08:54:44
#IED Juan del corral
Número de índice: 160

- Se continua con traslego de material del tercer piso a la zona de acopio de la zona de acopia del tercer.

Inspector

28-03-2023.
clima: Nubado.
- Personal en Obra.
1 Inspector tecnico
1 maestro.
2 Oficial
2. ayudante.

actividades.
- Se continua con. alistado en zona de. la biblioteca. -
- Se continua con traslego de material. del tercer piso a zona de acopio.
- Se empieza a reembogullar en las. muros internos del salon de musica.
- Se empieza a hacer muro para completar. en el salon de musica.

Inspector.

29-03-2023.
clima: Nubado.
- Personal en Obra.
1. Inspector tecnico
1. Inspector SST.
1 maestro
2 Oficiales
2 ayudantes.

actividades
- Se continua con alistado de piso en placa del comedor.

15/04/2023 08:54:54
#IED Juan del corral
Número de índice: 161

- Se continua con reemboquillado. de muros internos del salon de musica.
- Se continua con muro en el salon de musica
- Se continua con trasiego de material. de la zona de acopio al tercer Piso.

30 - marzo de 2023. Inspector. Inspector interventoria
Clima. Soleado.
- Personal en Obra: 1. Inspector tecnico. 1 maestro, 2 Oficiales, 2 ayudantes.
-

- Actividades.
- Se continua con alistado de Piso en la zona del comedor
- Se continua con reemboquillade en muros ieternos del salon de musica.
- Se empieza. encorozado de muros. en el salon de musica.
- Se continua con trasiego de material de la zona de acopio al tercer Piso.

31-Marzo-2023 Estado del clima: Mañana. Nublado-
Tarde: soleado.
Personal obra = 1 maestro
oficial (2)
Ayudante (1)
Personal interventoria: Inspector sst
Inspector tecnico
Equipos y herramientas: Herramienta menor
Actividades: reemboquillado muros internos salón de musica
instalacion de medicación tercera comedor
Trasiego de materiales. Entrar (1) viaje de arena

Inspector. Inspector interventoria

24-04-2023

15/04/2023 08:55:09
#IED Juan del corral
Número de índice: 162

01- abril - 2023.
clima : soleado.
Personal en obra. 1 Inspector Tecnico.
1 maestro.
2 OFiciales
2 ayudantes

- actividades.
- Se continua con media caña perimetral en la Placa del comedor.
- Se continua con Reemboquillado, en muros. internos de salon de musica.
- Se continua con trasiego de material de la zona de acopio hacia el tercer piso.

Inspector interventoria

03-04-2023.
clima soleado.
Personal en obra. 1 Inspector tecnico
1 OFicial.
1 ayudante
1 maestro.

actividades.
- se continua con. reemboquillado en muros. internos del salon de musica.
- se empleza a. pañetar muros. en el salon de. musica.
- Se empleza con cerramiento del puente.

04-04-2023 Estado del clima: soleado en la mañana
Tarde : soleado.
Personal obra: 1 maestro
oficial (1)
Ayudantes (2)
Personal interventoria: Inspector tecnico

15/04/2023 08:55:19
#IED Juan del corral
Número de índice: 163

Equipos y herramientas: Retromartillo
Andamio multidireccional
Actividades: instalación de alistado terraza-comedor.
Demolición de alistado Cubierta puente peatonal.

Inspector interventoría

Inspector

05- abril - 2023.
Clima: Soleado. - LLUVIOSO.
Personal en obra: 1 Inspector tecnico.
1 Oficial
1 maestro.
2 ayudantes.
- actividades.
- Se termina de fundir la placa del comedor.
- se continua con demolicion del alistado del del Puente.
- Se continua con traslego dematerial.

Inspector interv.

Inspector

06- abril. 2023.
Clima soleado.
- Personal en obra
1 maestro
2 ayudantes.
- actividades.
- Secontinua con demolicion del alistado en el Puente.
- se continua - con traslego de material.
- afinado dela Placa del comedor.

Inspector interv.

08- Abril - 2023.
Clima: Soleado - LLUVIOSO.
- Personal enobra.
- 1 maestro.

15/04/2023 08:55:36
#IED Juan del corral
Número de índice: 164

2 ayudantes.
actividades.
- Se pasan niveles e hilos para garantizar la evacuacion del agua. en el puente.
- Se empieza a fundir. alistado en el Puente.
- Se continua con trasiego de material.

Inspector interventor. Inspector

10 abril - 2023.
Clima: nubado.
- Personal en obra.
- 1 inspector tecnico
- 1 maestro
- 1 oficial.
- 2 ayudantes.
actividades.
- Se continua con alistado de piso en el puente.
- se ~~afina~~ el alistado. instalado el sabado.
- se continua con trasiego.

Inspector interv.

11-abril-2023.
Clima: soleado.
- Personal en obra.
1 inspector tecnico.
1 maestro.
2 oficial
1 ayudante
1 inspector tecnico de interventoria. 1 insp SST
actividades
Interventoria solicita la entrega del presupuesto ajustado a las condiciones actualizadas del contato a fin de estableces con la entidad la ejecucion

15/04/2023 08:55:54
#IED Juan del corral
Número de índice: 165

IED. JUSTO VICTOR CHARRY, SEDE A

de baños de niños de secundaria y preescolar.

Residente obra. Residente interventoría.

11/03/23 Sábado.

Clima: Mañana: Lluvias fuertes de 7:00am a 12:00pm.

Personal obra: Personal interventoría:

1 Residente. 1 Residente.

2 Oficiales 1 Inspector.

2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con aplicación de pañete en baños, así mismo se realiza sondeo de tuberías existentes.

Residente obra. Residente interventoría.

13/03/23 Lunes

Clima: Mañana: Nublado con llovizna intermitentes.

Tarde: Nublado con llovizna intermitentes.

Personal de obra: Personal interventoría.

1 Residente. 1 Residente.

2 Oficiales. 1 Inspector.

2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con aplicación de pañete en muros de baños de niños (secundaria y preescolar).

Residente obra Residente interventoría.

14/03/23 Martes.

Clima: Mañana: Soleado Tarde Soleado.

Escaneado con CamScanner

Actividades: El dia de hoy no se realizan actividades en el frente de obra a la espera de material (enchapes) para intervención en baño de niños preescolar y secundaria.

Residente obra | Residente interventoría.

15/03/23 Miércoles

Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Nublado.

Actividades: El dia de hoy no se realizan actividades en el frente de obra a la espera de material para intervención en baños.

Residente obra | Residente interventoría.

16/03/23 Jueves.

Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Nublado.

Actividades: El dia de hoy no se realizan actividades en el frente a la espera de material para intervención en baños.

Residente obra | Residente interventoría

17/03/23 Viernes

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Nublado.

Personal de obra: Personal interventoría:

1 Residente.

1 Cadenero

2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza aplicación de estuco en parte superior de muro de baños de niños de secundaria y preescolar.

Residente obra | Residente interventoría

Escaneado con CamScanner

18/03/23.	Sábado. Clima: Mañana: Soleado. Personal obra: / Personal interventoría: 1 Residente. / 1 Residente. 2 Oficiales / 1 Inspector. 2 Ayudantes. Equipo: Herramienta menor. Actividades: se continúa con aplicación de estuco para parte superior de muros de baños de niños secundaria y preescolar.  /  Residente obra. / Residente interventoría.
21/03/23	Martes. Clima: Mañana: Soleado. / Tarde: Nublado. Personal de obra: / Personal interventoría. 1 Residente. / 1 Residente. 2 Oficiales / 1 Inspector. 2 Ayudantes. Equipo: Herramienta menor. Actividades: Se realiza sondeo a tuberías existentes y cambio de red de tubería afectada.  /  Residente obra / Residente interventoría
22/03/23	Miércoles. Clima: Mañana: Soleado. / Tarde: Nublado. Personal obra: / Personal interventoría: 1 Residente. / 1 Residente. 2 Oficiales / 1 Inspector. 2 Ayudantes. Equipo: Herramienta menor. Actividades: (Por orden de Supervisión de la Secretaría de Educación

Escaneado con CamScanner

	Distrital, se realizo demolición de mesón de lavamanos y muro de división en baño de niños secundaria debido a que por su altura no era funcional para la institución).
	Residente obra — Residente Interv
23/03/23	Jueves
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Nublado.
	Personal de obra: — Personal interventoría:
	2 Oficiales — 1 Residente
	2 Ayudantes — 1 Inspector
	1 Residente.
	Equipo: Herramienta menor.
	Actividades: Se realiza ingreso de material para enchape de baños, de acuerdo a esto, se inicia con instalación de enchape en baños de niños.
	Residente obra — Residente interventoría
24/03/23	Viernes.
	Clima: Mañana: Soleado — Tarde: Lluvias de 3:00pm a 4:00pm.
	Personal de obra: — Personal interventoría:
	1 Residente — 1 Residente.
	1 Oficiales — 1 Inspector.
	2 Ayudantes.
	Equipo: Herramienta menor
	Actividades: Se continúa con instalación de enchape en baño de niños y demolición de mesón de lavamanos.
	Residente obra — Residente Interventoría.

Escaneado con CamScanner

25/03/23 Sábado.

Clima: Mañana: Nublada.

Personal de obra: Personal interventoría.

1 Residente. 1 Residente.

2 Oficiales. 1 Inspector.

2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza cambio de puntos para lavamanos en baño de niño secundaria, se continúa con enchape y se realizo el respectivo resane en cuñete para los tuberos

Residente obra Residente interventoría.

27/03/23 Lunes.

Clima: Mañana: Soleada. Tarde: Nublada.

Personal de obra: Personal Interventoría:

1 Residente. 1 Residente.

2 Oficiales. 1 Inspector.

2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con instalación de enchape de baños de niños en preescolar y secundaria.

NOTA= SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA VERIFICAR QUE EL ENCHAPE INSTALADO QUEDE PERFECTAMENTE NIVELADO Y LAS HILADAS HORIZONTALES A NIVEL PARA SU CORRECTA ENTREGA.

Residente obra Residente Interventoría.

28/03/23 Martes.

Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Nublado

Personal de obra: Personal Interventoría

1 Residente 1 Residente.

Escaneado con CamScanner

	1 Inspector 2 Ayudantes 2 Oficiales Equipo: Herramienta menor. Actividades: Se continúa con instalación de enchape en muros de baños de niños (preescolar y secundaria). Residente obra. Residente Interventoría.
29/03/23	Miércoles Clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado. Personal de obra: Personal interventoría. 1 Residente. 2 Oficiales. 2 Ayudantes. Equipo: Herramienta menor. Actividades: Se continúa con instalación de enchape en muros de baños de niños (preescolar y secundaria). Residente obra Residente Interventoría.
30/03/23	Jueves. Clima: Mañana: Soleado. tarde: Nublado. Personal obra: Personal interventoría: 1 Residente. 1 Residente. 2 Oficiales 1 Inspector. 2 Ayudantes Equipo: Herramienta menor. Actividades: Se continúa con instalación de enchape en muros de baños de niños Residente obra Residente Interv.

Escaneado con CamScanner

31/03/23 Viernes

Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Soleada.

Personal de obra: Personal Interventoría:

1 Residente. 1 Residente

2 Oficiales 1 Inspector

2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: Se continúa con instalación de enchape en muros de baños de niños en preescolar y secundaria, adicionalmente, se encuentra accesorio tapado y con afectaciones (rotos), por lo que, se procede al cambio del accesorio en este punto.

Residente obra Natalia C. Residente Interventoría

01/04/23 Sábado.

Clima: Mañana: Nublado.

Personal de obra: Personal Interventoría:

1 Residente. 1 Residente.

2. Oficiales. 1 Inspector.

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: Se continúa con instalación de enchape en muros de baño de niños de bachiller y se continúa con cambio de tubería afectada.

NOTA: SE SOLICITA A CONTRATISTA DE OBRA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTE TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FIN DE EVITAR AFECTACIONES AL ALCANCE DISPUESTO PARA LA PRESENTE INSTITUCIÓN.

Residente de obra Natalia C. Residente de Interventoría.

03/04/23 Lunes.

Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.

Personal de obra: Personal de Interventoría:

1. Residente. 1. Residente.

Escaneado con CamScanner

1 Inspector.

2 Oficiales

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, pulidora

Actividades: Se continúa con instalación de enchape en baño de niños de bachillerato zona orinales

Natalrac

Residente obra

Residente Interventoría.

104/23 Martes

Clima: Mañana: soleado Tarde:

Personal Obra: Personal Interventoría:

1 Residente. 1 Director.

1 Director. 1 Residente

2 Oficiales. 1 Inspector.

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: Se continúa con instalación de enchape en muros de zona orinal de baños de niños secundaria.

Se realiza comité semanal de obra en instalaciones de Institución Educativa en compañía de Supervisión de la Secretaría de Educación Distrital, Contratista de Obra e Interventoría.

Natalrac

Residente obra Residente Interventoría.

'04/23. Miércoles

Clima: Mañana: Nublado. Tarde:

Personal obra: Personal Interventoría:

1 Residente. 1 Residente.

2 Oficiales. 1 Inspector.

1 Ayudante.

Equipo: Herramienta menor, pulidora.

Actividades: Se continúa con instalación de enchape en muros

Escaneado con CamScanner

	de baños de niños, así mismo se realiza orden y aseo y trasiego de escombro a punto de acopio, así como instalación de wing metálico.
	Residente obra — Residente Interventoría — Natalia C.
06/04/23	Jueves. No se ejecutan actividades en el frente de obra por día festivo (día Santo).
07/04/23	Viernes. No se ejecutan actividades en el frente de obra por día festivo (día Santo).
08/04/23.	Sábado. No se ejecutan actividades en el frente de obra por día festivo.
10/04/23	Lunes.
	Clima: Mañana: Nublado. Tarde: Soleado.
	Personal obra: 1 Residente. 2 Oficiales 1. Ayudante.
	Personal interventoría: 1. Residente 1 Inspector.
	Equipo: Herramienta menor.
	Actividades: Se recibe material (Pintura epóxica) y se inicia con pintura en muros de baños de niños secundaria y preescolar.
	Residente obra. — Residente Interventoría. — Natalia C.
11/04/23.	Martes.
	Clima: Mañana: Soleado. Tarde: Nublado.
	Personal obra. 1 Residente. 2 Oficiales
	Personal Interv. 1 Residente. 1 Inspector.

Escaneado con CamScanner

IED. MIGUEL ANTONIO CARO, SEDE A

09-03-2023 JUEVES

* ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA = LLUVIA FUERTE (7 AM a 10 AM) (11 a 12pm)
TARDE : LLUVIA FUERTE (12 pm a 4 : 30pm)
* PERSONAL DE OBRA
. OFICIAL (1) RESIDENTE (1)
. AYUDANTE (1)
* PERSONAL DE INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)
*[ACTIVIDADES] EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
. COMPACTACIÓN DE TERRENO (7 AM a 7.30M)
. INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM
NOTA
DEBIDO A LAS LLUVIAS FUERTES Y A LA CONDICIÓN CLIMATOLOGICA QUE AFECTAN EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS el PERSONAL DE OBRA DECIDE PARAR ACTIVIDADES A LAS 11:30 AM.

ING. ANGELA CAÑON
SAFID-INGENIERIA.

CAMILO FONOLSO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

10-03-2023 Viernes

* Estado del Clima =
Mañana = Opaco Tarde =
* Personal de obra = Personal Interventoria
Oficial (1) Inspector (1)
Ayudante (1)
Residente de obra - Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra = Se funde un tramo de Placa Frenta a Salones de Laboratorio.

NKB

- Se funde zanja Por donde va instalado la tuberia de 4".
- Se funde con autorización y liberación de la interventoria.

ING. ANGELA CAÑON SAFRID INGENIERIA — CAMILO FONSECA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

11/03/2023 Sábado

-Estado del Clima
mañana=lluvia-Sol Tarde:
-Personal de Obra — personal de interventoria
Residente de obra — INSPECTOR (1)
Oficial (1)
Auxiliar de obra (2)
Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra=
- Se funde caja de 80x80
- Se realiza aseo general de obra.
-Se terminan labores a las 12=30 Pm

ING ANGELA CAÑON SAFRID - INGENIERIA — CAMILO FONSECA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

13/03/2023 Lunes

Se realizan actividades administrativas, y se espera Pedido de material.

ING. ANGELA CAÑON SAFRID-INGENIERIA — CAMILO FONSECA. INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

14/03/2023 Martes
Se realizan actividades administrativas, a la espera de material de obra.

ING. ANGELA CAÑÓN
SAFRID-INGENIERIA

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

15/03/2023 Miercoles
Se realizan actividades administrativas.

ING. ANGELA CAÑÓN
SAFRID-INGENIERIA

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

16/03/2023 Jueves.
- Estado del Clima
Mañana = Soleado Tarde = Soleado.
- Personal de obra
- Oficial (1)
- Auxiliar de obra (2)
Residente de obra, Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra

PERSONAL DE INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)

* En horas de la mañana se realiza la aplicación de Pintura azul en tubería Sanitaria de 4" Para ser instalada en Fachada Principal - Norte SUR.
* En horas de la tarde se arma andamios en Fachada Principal Norte - SUR.
* Se terminan labores a las 05:00 PM.

ING. ANGELA CAÑÓN
SAFRID-INGENIERIA.

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

17/03/2023 Viernes

- Estado del Clima
  Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal de obra: PERSONAL DE INTERVENTORIA
  Oficial (1) INSPECTOR (1)
  Auxiliar de obra (2)
  Residente de obra
  Director de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra:
  ① Se realiza el cambio de la tubería Sanitaria instalada en la fachada Principal Norte-Sur del colegio.
  ② Se terminan labores a las 05:00 Pm
  ③ Llegan Cunetas Prefabricadas en ccto.

ING. ANGELA CATIÓN SAFRID-INGENIERIA

CAPITÁN FONSECA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

18/03/2023 Sábado

- Estado del Clima
  Mañana: Soleado
- Personal de obra: PERSONAL INTERVENTORIA
  Oficial (1) INSPECTOR (1)
  Auxiliar de Obra (2)
  Residente de obra
- Herramienta menor
- Actividades de obra
  ④ Se realiza la limpieza de canales en fachada Principal Norte-Sur, allí se observa que el agua se encuentra empozada en toda la viga canal, y no tiene desnivel generando así daños en la canal, se informa a interventoría si se va a realizar el mejoramiento de la misma.

Powered by CamScanner

*Se terminan labores a las 05) 12:40 Pm

ING ANGELA CAÑON
SAFED INGENIERIA

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

21/03/2023 Martes
Estado del Clima:
Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal de obra: PERSONAL DE INTERVENTORIA
Oficial (1) INSPECTOR (1)
Auxiliar de obra (1)
Residente de obra
Director de obra
- Herramienta Menor
- Actividades de obra:
Se realiza la instalación de Perfil en estructura de Cubierta localizada en la Parte Posterior del Colegio, Con su respectiva Soldadura.
*Siendo las 04:45 Pm, llegan laboratorios Para realizar densidad método Cono de arena en Fachada Principal norte-sur, las densidades dieron dentro del margen establecido - fueron aProbadas.

ING. ANGELA CAÑON
SAFED-INGENIERIA

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

22/03/2023 Miercoles
Estado del Clima:
Mañana: Soleado Tarde: Soleado
- Personal de Obra: PERSONAL INTERVENTORIA
Oficial (1) INSPECTOR (1)
Auxiliar de Obra (1)
Residente de obra - Director de obra.

Powered by CamScanner

- Herramienta menor
- Actividades de obra:
  * Continuan Con instalación y Soldadura de Perfil metálico en la Parte Posterior del Colegio.
  * En horas de la tarde se realiza la aplicación de Pintura azul en Perfil metálico.
  * Se realiza descargue de material:
  * Se terminan labores a las 05:00 Pm.

ING ANGELA CAÑON
SAFED - INGENIERIA

CAMILO FAVIO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

23/03/2023 Jueves

Estado del Clima
Soleado Tarde: Soleado

- Personal de obra: PERSONAL DE INTERVENTORIA
  Oficial (1) INSPECTOR (1)
  Auxiliares de obra (3)
  Ing. Residente de Obra
  Director de obra
- Herramienta Menor
- Actividades de obra:
  * Se realiza la desistalación del andamio localizado en la fachada Ppal del Colegio.
  * Se deja listo el material Para fundir Placa de 10 cm de 3000 PSI, la Interventoria libera Fundida
  * Se instala marco de tapa Caja de 80 x 80
  * Se terminan labores a las 05:00pm.

ING. ANGELA CAÑON
SAFED - INGENIERIA

CAMILO FAVIO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

24/03/2023 Viernes

- Estado del Clima
mañana = Soleado
tarde = Lluvias fuertes (02:00 Pm - 03:00 Pm)
Lluvias fuertes (03:15 Pm - 04:50 Pm)

Personal de obra
Oficial (1)
Auxiliar de obra (3)
Ing. Residente
Director de obra.

Personal Interventoria
Inspector (1)

- Herramienta menor, Mezcladora, Vibro concreto
- Actividades de obra:

① Se realiza la instalación de Plastico negro
② Se realiza la instalación de malla 6 mm,
③ Se realiza la instalación de Separadores de malla (Panelitas en cto).
④ la interventoria libera malla Para Proceder a Fundir Placa de 10 cm de 3000 PSI.
⑤ Siendo las 02:00 Pm Inician fuertes lluvias.
⑥ Se Paran lluvias a las 03:00 Pm.
⑦ Se Presentan lluvias a las 03:15 Pm.
⑧ Por lluvias Se Paran actividades.

NOTA INTERVENTORIA

. POR DAÑO DEL TROMPO, SE EMPIEZAN A REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA FUNDIDA DE LA PLACA A MANO, DEJANDO CLARO QUE EL CONCRETO YA PEDIDO PROPIEDADES Y NECESITARIA AGREGAR UN POCO MAS DE CEMENTO PARA QUE CONSERVE LAS 3.000 psi.

Se aclara que las condiciones del Concreto fueron mejoradas al momento de que la Mezcladora dejó de funcionar, Para garantizar la estabilidad del mismo, Se reali-

Powered by CamScanner

7a Cotizaciones y llamados para alquilar otra mezcladora.
Se terminan labores a las 05=00 Pm.

ING. ANGEA CATON SAFRID INGENIERIA — CAMILO ERNESTO INSPECTOR DE INTERVENTORIA

25/03/2023 Sábado

- Estado del Clima — Lluvias (02=00 Pm - 03=00 Pm)
Mañana-OPaco — Tarde: lluvias fuertes (03=00 Pm - 07=00 Pm)
- Personal de obra: — personal INTERVENTORIA
Oficial (1) — INSPECTOR (1)
Auxiliar de obra (3)
Residente de obra
Director de obra
- Herramienta Menor
- Actividades de obra:
* Debido a que no se logra alquilar una mezcladora, Continuan con el Proceso constructivo manual, Para fundicion de placa.
* Siendo las 02=00 Pm inician lluvias leves incrementandos Poco a Poca la intensidad.
* A las 04=00 Pm (llueve fuertemente) llueve fuertemente hasta las 07=00 Pm, Se toman muestras acto.
* La Placa se debia fundir ya que esta actividad se retomó, el Clima no ayudo, Sin embargo Se Funde la Placa, Escobiada y Curada
* Se terminan labores a las 07=00 Pm.

ING. ANGEA CATON SAFRID INGENIERIA — CAMILO ERNESTO INSPECTOR DE INTERVENTORIA

27/03/2023 Lunes

- Estado del Clima:
Mañana: Soleado Tarde: OPaco

Powered by CamScanner

-Personal de obra
Auxiliar de Obra (1)
Ing. Residente de obra
Director de obra
- Personal Interventoria
Inspector (1)
- Actividades de obra:
* Por las fuertes lluvias presentadas el dia sábado (la placa) se debe (a) realizar un afinado de piso.
* Se realiza Curado de placa.
* Se sacan los cilindros de las camisas y se Ponen en agua.
* En horas de la tarde llega material teja UPVC 2mm.
* Laboratorios recogen cilindros en ccto Para roturar.
* Continuan con curado de Placa.
* Se terminan labores a las 05:00 Pm.

ING. ANGELA CAÑON
CAFRID-INGENIERIA

CAMILO FRANCO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

28/03/2023. Martes
-Estado del Clima
Mañana: OPaco Tarde: Lluvias Leves (03:00 Pm - 05:00 Am)
- Personal de obra: Personal Interventoria
Oficial (1) Inspector (1)
Auxiliar de Obra (1)
Ing. Residente de Obra
Director de obra.
- Herramienta menor
- Actividades de obra:
* Se realiza la instalación de la teja UPVC 2 mm Blanca.
- En horas de la tarde Se Presentan

lluvias leves. -
* Se terminan labores a las 05:00 Pm.

ING. ANGELA CAÑON
SATRID INGENIERIA

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

29/03/2023 Miercoles
- Estado del Clima:
Mañana: OPACO Tarde: NUBLADO
- Personal de obra:
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Ing. Residente de obra
Director de Obra

PERSONAL INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)

- Herramienta menor
- Actividades de obra:
* Continuan Con la instalación de teja UPVC 2mm blanca.
* Se realiza el Simbrado. Placa-Anden Para Corte.
* Se realiza Corte en Placa-Andén fachada Principal.
* Debido a las lluvias Presentadas el dia sábado, se ve la necesidad de realizar un afinado de Piso de 4 cm, nuevamente escobiado, Guallado.
* Se instalan listones en cuadriculas de 2,5 * 2,5.
* Se terminan labores a las 05:00 Pm.
* Se deja material listo Para Iniciar afinado a Primera hora.

ING ANGELA CAÑON
SATRID - INGENIERIA

CAMILO FONSECA
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

30-03-2023 JUEVES

* ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA: NUBLADO Tarde: Nublado
TARDE:

* PERSONAL DE OBRA
OFICIAL (1)
AYUDANTE (1)
RESIDENTE (1)

* PERSONAL INTERVENTORIA
INSPECTOR (2)
RESIDENTE (1)

* EQUIPO
. HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES DE OBRA
. RECORRIDO DE OBRA CON LA INTERVENTORIA PARA REVISAR CANTIDADES DE OBRA Y MEDICIONES.
. INICIAN CON CARGUE DE PISO EN PLACA FACHADA CANCHA.
(*) Se terminan labores a las 05:00 Pm.
(*) Se deja aseo realizado en Cancha.

ING. ANGELA PEÑA
SAIRD INGENIERIA.

CAMILO FANOSINO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

31-03-2023 Viernes
- Estado del Clima
Mañana: Opaco Tarde:
- Personal de obra:
Oficial (1)
Auxiliar de obra (1)
Ing. Residente de obra
Director de obra
- PERSONAL DE INTERVENTORIA
INSPECTOR (1)
- Herramienta Menor
- Actividades de obra:
(*) Continuan Con Cargue de Piso en fachada Principal Norte-Sur.

• TERMINAN LABORES A LAS 5 PM



ING ANGELA CAÑON
SAFRID INGENIERIA

INSPECTOR DE INTEGRATORIA
CAMILO FANDIÑO

2

01-04-2023 SABADO

* ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA: SOLEADO


* PERSONAL DE OBRA
• OFICIAL (1)
• AYUDANTE (1)
• RESIDENTE (1)

* PERSONAL DE INTEGRATORIA
INSPECTOR. (1)

* EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR

* ACTIVIDADES
• CONTINUAN CON EL CARBUE DE PISOS D
LA PLACA ZONA CANCHA

* TERMINAN LABORES A LAS 12 PM.



ING ANGELA CAÑON
SAFRID-INGENIERIA



CAMILO FANDIÑO
INSPECTOR DE INTEGRATORIA

03-04-2023 LUNES

* ESTADO DEL CLIMA
• MAÑANA: SOLEADO
• TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
• AYUDANTE (1) RESIDENTE (1)
• OFICIAL (1)

Powered by CamScanner

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
• INSPECTOR (1)

* EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR

• ACTIVIDADES
. CONTINUAN CON EL CARGUE DE PISOS ENCIMA DE PLACA (ZONA CANCHA)
. TRASIEGO DE MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO
. INICIAN CON EL CORTE DE PLACA Y SIMBRADO DE CUNETA (ZONA CANCHA)

.SE TERMINAN LABORES A LAS 5 pm.

ING. APLICACIÓN
SAFRO-INGENIERIA

INSPECTOR DE INTERVENTORIA
CAMILO FANDIÑO

04-04-2023 MARTES

* ESTADO DEL CLIMA
• MAÑANA: SOLEADO
• TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
. AYUDANTE (1)
. OFICIAL (4)
. RESIDENTE (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
INSPECTOR (4)

* EQUIPO
• HERRAMIENTA MENOR
• ANDAMIOS CERTIFICADOS

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON EL CARBUE DE PISOS EN PLACA (ZONA CANCHA)
- INICIAN CON EL DESMONTE DE TEJAS EN MAL ESTADO (AULA MULTIPLE)
- TRASIEGO DE MATERIAL AL PUNTO DE ACOPIO

* TERMINAN LABORES A LAS 5 PM.

INGANGELA CANON
SAFID-INGENIERIA

CAMILO FANDIÑO
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

6-04-2023 MIERCOLES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: SOLEADO
- TARDE: SOLEADO

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIOS CERTIFICADOS

* PERSONAL DE OBRA
- AYUDANTE (1)
- OFICIAL (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
(1) INSPECTOR

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON CARBUE DE PISOS EN PLACA (ZONA CANCHA)
- INICIAN CON LA INSTALACION DE TUBERIA EMT, BALAS, CABLEADO EN SUBIDA (ZONA PARQUE INFANTIL)
- TERMINAN LABORES A LAS 5 PM

* En horas de la tarde se realiza fumigación del Colegio.

INGANGELA CANON
ING. SAFID.

CAMILO FANDIÑO
INSPECTOR

10-04-2023 LUNES

* ESTADO DEL CLIMA
- MAÑANA: NUBLADO
- TARDE: SOLEADO

* PERSONAL DE OBRA
- OFICIAL (2)
- AYUDANTE (1)
- RESIDENTE (1)

* PERSONAL DE INTERVENTORIA
- INSPECTOR (1)

* EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO CERTIFICADO

* ACTIVIDADES
- CONTINUAN CON EL CARDEL DE PISOS (ZONA CANCHA)
- INSTALACIÓN DE MARCO DE CAJA DE PASO Y SOLDADURA
- TRASIEGO DE ESCOMBROS AL PUNTO DE ACOPIO.
- TERMINAN LABORES A LAS 5 PM

INGENIERO RESIDENTE SAFRID-INGENIERIA

CAMILO FONSECA INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo 3. INFORME SSTA

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022



"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022

INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No. 003

PERIODO DE EJECUCIÓN:
11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2023

VERSIÓN 0
ORIGINAL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del supervisor Arq. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED.	Original
Biblioteca del Proyecto	1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	N/A	N/A	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




Titulo Documento		**INFORME MENSUAL SSTA DE INTERVENTORÍA No.03**		
Revisión		**0**	**1**	**2**
Responsable elaboración	Nombre	Ing. Mónica Marcela de los Ángeles Gómez Rodríguez		
	Firma			
	Fecha	13 de abril de 2023		
Responsable revisión	Nombre	Ing. Manuel Antonio González Romero		
	Firma			
	Fecha	14 de abril de 2023		
Responsable aprobación	Nombre	Arq. Fredy Giovanni Rodríguez Salazar		
	Firma			
	Fecha	15 de abril de 2023		

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
ÍNDICE DE MODIFICACIONES 2
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS. 5
3. GESTIÓN DOCUMENTAL 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 7
4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO 7
4.2. MANEJO DE RESIDUOS 8
4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 10
4.4. MANEJO DE AGUA 11
4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA 13
4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 14
4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 18
4.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 23
4.9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 25
4.10. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 26
4.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES 27
4.12. INSPECCIONES AMBIENTALES 28
4.13. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 29
5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 30
5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 30
5.2. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 31
5.3. INDUCCIONES 31
5.4. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL 31
5.5. HIGIENE INDUSTRIAL 31
5.6. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO 34
5.6.1. Actividades realizadas en el transcurso del periodo 34
5.6.2. Brigada de emergencias 38

5.6.3. Accidentes de trabajo 39
5.6.4. Capacitaciones SST 39
5.6.5. Inspección SST 44
5.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 46
5.8. PERSONAL INTERVENTORÍA 48
6. CONCLUSIONES 50
7. ANEXOS 50

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED, puso a disposición de los interesados el Proceso de Contratación No. SED-LPDCCEE-039-2022 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública para "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.", la cual fue adjudicada a la firma SAFRID INGENIERÍA SAS con NIT. No.900.520.848-4, representado legalmente por MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No.1.081.774.968, dando origen al Contrato No CO1.PCCNTR.4077642 de 06 de octubre de 2022, el cual fue firmado el día 06 de diciembre de 2022; con un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 13.954.280.882)** incluido AIU. El plazo total previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, la cual se firmó el día 11 de enero de 2022.

Por tanto, el informe mensual de interventoría No.3 presenta un resumen de las actividades realizadas por el contratista y la interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril de 2023.

2. OBJETIVOS.

- ✓ Informar las actividades del contratista SAFRID INGENIERÍA SAS desde el componente SSTA.
- ✓ Presentar las acciones de gestión realizadas por la interventoría de Inter Colegios 2022 desde el componente SSTA.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

En el periodo se presentó la siguiente trazabilidad documental:

Oficio	Consecutivo Oficio	Fecha	Dirigido A	Asunto
1	CIC_BTA_SED_050_ 2022_123	10 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 102-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED MIGUEL ANTONIO CARO, GARCES NAVAS Y SIMÓN BOLIVAR SEDE A.

2	CIC_BTA_SED_050_ 2022_124	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 104-GP2-SED-2022 NO APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL IED SAN JOSÉ NORTE
3	CIC_BTA_SED_050_ 2022_125	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 105-GP2-SED-2022 NO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE EXCAVADORA Y OPERARIO IED FLORIDABLANCA
4	CIC_BTA_SED_050_ 2022_126	13 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	OBSERVACIONES INGRESO DE PERSONAL Y MAQUINARIA
5	CIC_BTA_SED_050_ 2022_130	15 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 106-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST
6	CIC_BTA_SED_050_ 2022_131	16 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 113-114-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INGRESO PERSONAL Y MAQUINARIA
7	CIC_BTA_SED_050_ 2022_135	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 099-116-GP2-SED-2022 DOCUMENTACIÓN TALA ÁRBOLES COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
8	CIC_BTA_SED_050_ 2022_136	17 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 118-GP2-SED-2022 OPERARIO EXCAVADORA FLORIDABLANCA
9	CIC_BTA_SED_050_ 2022_138	21 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 2
10	CIC_BTA_SED_050_ 2022_142	22 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 122-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES TRABAJO NOCTURNO GARCES NAVAS
11	CIC_BTA_SED_050_ 2022_143	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	DATOS DE INGRESO AL "WEBFILE SDA" CARGUE DE RCD DE OBRA
12	CIC_BTA_SED_050_ 2022_144	23 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 125-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADOR A LA IED GARCES NAVAS Y IED SIMÓN BOLÍVAR.
13	CIC_BTA_SED_050_ 2022_151	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	APROBACIÓN INFORME NO. 2 DE SST
14	CIC_BTA_SED_050_ 2022_152	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO NO. 128-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJO NOCTURNO
	CIC_BTA_SED_050_ 2022_153	28 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO NO. 131-GP2-SED-2022 APROBACIÓN TRABAJADOR IED GARCES NAVAS

15	CIC_BTA_SED_050_ 2022_158	30 de marzo de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO NO. 132 Y 133-GP2-SED-2022 OBSERVACIONES INGRESO DE TRABAJADORES IED GARCES NAVAS Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
16	CIC_BTA_SED_050_ 2022_161	03 de abril de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 136-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y JORGE ELIECER
17	CIC_BTA_SED_050_ 2022_1615	08 de abril de 2023	SAFRID INGENIERÍA S.A.S. MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA Representante Legal	RESPUESTA COMUNICADO No. 142-GP2-SED-2022 APROBACIÓN INGRESO DE TRABAJADORES IED FLORIDABLANCA

4. COMPONENTE AMBIENTAL

4.1. MANEJO DE CAMPAMENTO

El contratista cuenta hasta el momento con los siguientes campamentos (Francisco José de Caldas, Garces Navas y Jorge Eliecer Gaitán Sede A) para aspectos administrativos y para uso del personal. Sin embargo, en los siguientes colegios no fueron asignadas aulas para el desarrollo de las actividades, por tanto, se dieron algunos espacios dentro del colegio en la IED Rafael Bernal, Juan del corral, Florida Blanca, Miguel Antonio Caro, Justo Víctor Charry y San José Norte.

<table>
<tr><td colspan="3">COLEGIOS CON CAMPAMENTO</td></tr>
<tr><td>Francisco José de Caldas</td><td>Garces Navas</td><td>Jorge Eliecer Gaitán</td></tr>
<tr><td>


</td><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Floridablanca</td><td>Justo Víctor Charry</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">COLEGIOS SIN CAMPAMENTO</td></tr>
<tr><td>Juan del Corral</td><td>Rafael Bernal</td><td>Miguel Antonio Caro</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">San José Norte</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

4.2. MANEJO DE RESIDUOS

- ✓ Se realiza disposición final de residuos ordinarios por la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.
- ✓ En los colegios Juan del Corral, Francisco José de Caldas y Garces Navas, Jorge Eliecer, Justo Víctor Charry, Floridablanca, San José Norte se cuenta con la carta del préstamo de un punto ecológico, sin embargo, en el colegio Rafael Bernal la solicitud no fue aprobada, por tanto, se les indico realizar la adquisición de este, con el fin de garantizar la disposición adecuada de los residuos aprovechables.

PUNTOS ECOLÓGICOS		
Francisco José de Caldas	Garcés Navas	Juan del Corral
	 	
Jorge Eliecer Gaitán	Justo Víctor Charry	Floridablanca
		
San José Norte		Rafael Bernal Jiménez

	No cuentan con un punto ecológico

4.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

- ✓ Hubo ingreso de volquetas. Se solicitó al contratista remitir la documentación con antelación para aprobación de interventoría.
- ✓ Se presentan actividades de cargue de RCD y de descargue de material, en las cuales se evidencia un manejo adecuado en la protección de estos, con el fin de evitar la dispersión de las partículas en el aire, de igual manera, no se han operado herramientas o maquinaria que genere ruido por encima de lo permitido.
- ✓ Para la prevención de emisiones atmosféricas provocadas por la dispersión de material particulado procedente de las actividades de cada frente de obra, se mantiene el cerramiento con poli sombra.
- ✓ Los vehículos que ingresan a los frentes de obra tienen una velocidad máxima de 20km/h, con esto se evitan accidentes y el arrastre de material particulado.
- ✓ Se controlará la debida movilización de los materiales a fin de verificar el cumplimiento para dicha actividad, como es de contar con vehículos carpados que cubran los materiales RCD a fin de evitar dispersiones y emisiones al ambiente.







		
I.E.D Francisco José de Caldas	I.E.D Garces Navas	I.E.D Rafael Bernal Jiménez Sede A
		 
Miguel Antonio Caro	Justo Víctor Charry	San José Norte

4.4. MANEJO DE AGUA

El contratista está haciendo uso de los baños fijos de las instalaciones de los colegios, por lo cual no se hace seguimiento disposición de residuos líquidos o vertimientos.

COLEGIOS CON BAÑOS FIJOS		
Francisco José de Caldas	Garces Navas	Juan Del Corral







Jorge Eliecer Gaitán

Justo Víctor Charry





COLEGIOS CON BAÑO PORTÁTIL

Miguel Antonio Caro

Rafael Bernal

Florida Blanca







San José Norte



4.5. MANEJO DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA

En el área de influencia del colegio Francisco José de Caldas, se cuentan con 8 individuos arbóreos, los cuales representan una emergencia para la población, no obstante, uno de estos presento caída y fue evaluado por los bomberos, sin causar ninguna lesión o daño material. Para el restante de individuos arbóreos se solicitó acompañamiento por parte de la Ing. Forestal Andrea Suarez de la Secretaria Distrital, cuya visita se hizo el 10 de marzo, en la cual se establecieron los árboles que serían talados y se definieron los formatos que se deben diligenciar antes y después de la actividad, se envió el informe de avifauna a la forestal el 03 de abril de 2023 para su revisión, en el cual se menciona que no hay presencia de nidos, huevos y/o polluelos. Por tal motivo, se procedió a realizar la tala de los árboles el 03 de abril de 2023, al finalizar la actividad el contratista remitirá la ficha de atención silvicultural, ficha de geolocalización y formato de ejecución de actividades silviculturales.

Como se mencionó anteriormente una vez aprobado el inventario de avifauna se procedió a realizar la ejecución de la actividad sobre los individuos arbóreos, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:

<table>
<tr><td colspan="3">Registro Fotográfico Francisco José de Caldas</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Personal que realizara la actividad</td><td>Individuo arbóreo 1 sin intervenciones a la fecha.</td><td>Evidencia fotográfica individuo arbóreo 2 para poda controlada, sin intervenciones a la fecha.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Individuo arbóreo 3 a la fecha presenta tala parcial a una de sus ramificaciones, los residuos resultantes de la actividad son acopiados de tal forma que se separe el material vegetativo del material para chipeado.	Individuos arbóreos 4 y 5, se realiza tala completa desde el cimiento del árbol.	Los residuos resultantes de los individuos 4 y 5 son acopiados de tal forma que se separe el material vegetativo del material para chipeado.
		
Individuo arbóreo 7 a la fecha presenta tala parcial a una de sus ramificaciones, los residuos resultantes de la actividad son acopiados de tal forma que se separe el material vegetativo del material para chipeado.	Individuo arbóreo 6 y 8 sin intervenciones a la fecha.	

4.6. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En el presente periodo, se presentó ingreso de materiales en el Francisco José de Caldas (Cemento, Sub-base B-400, Geotextil, Tubería Sanitaria y Acero), en el Rafael Bernal Jiménez (Arena, Cemento, Recebo B-400, Grava de ½"), en el Juan del Corral (Cemento), en el San José Norte (Arena, Cemento, Recebo B400, Gravilla, Bloque No.5, Alambre, Rollo Polisombra Verde), en el Justo Víctor Charry (Arena, Cemento), en el Garces Navas (Arena, Gravilla, Cemento, Varillas 3/8 Lisas), en el Jorge Eliecer Gaitán (Recebo B400, PHR 305*80, PHR 160*60) y en el Miguel Antonio Caro (Recebo, Arena, Cemento, Grava).

IED Jorge Eliecer Gaitán	IED Juan del Corral
	

	
IED Garces Navas	IED Francisco José de Caldas
  	  

A continuación, se relacionan los materiales utilizados para las fechas de corte del informe.

- Colegio I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m³)	VOLUMEN (m³)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	CEMENTO TEQUENDAMA	100	5.000	5,00	1648,85	3,03
	RECEBO	9	89.038	89,04		54,00
Total, m³ de materiales usados en obra:					**57,03**	
Total, TON de materiales usados en obra:					**94,04**	

- Colegio I.E. RAFAEL BERNAL JIMENEZ.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m³)	VOLUMEN (m³)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	ARENA	912	62.656	62,66	1648,85	38,00
	CEMENTO	235	11.750	11,75		7,13
	RECEBO B400	216	14.840	14,84		9,00
	GRAVA DE 1/2"	96	6.595	6,60		4,00
Total, m³ de materiales usados en obra:					**58,13**	
Total, TON de materiales usados en obra:					**95,84**	

- Colegio I.E. JUAN DEL CORRAL.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m³)	VOLUMEN (m³)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	CEMENTO	60	3.000	3,00	1648,85	16,00
Total, m³ de materiales usados en obra:					**16,00**	
Total, TON de materiales usados en obra:					**3,00**	

- Colegio I.E. SAN JOSE NORTE.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m³)	VOLUMEN (m³)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	ARENA	912	19.786	19,79	1648,85	12,00
	CEMENTO	90	4.500	4,50		2,73
	RECEBO B400	216	14.840	14,84		9,00
	GRAVILLA	96	13.191	13,19		8,00
	BLOQUE #5	100	600	0,60		0,36
NO PELIGROSOS	LONAS DE ESCOMBRO	200	10	0,010	698,88	0,01
	ROLLO POLISOMBRA VERDE	1	13	0,013		0,02
METALICOS	ALAMBRE	1	7	0,007	7307,67	0,0010
Total, m³ de materiales usados en obra:					**32,13**	
Total, TON de materiales usados en obra:					**52,95**	

- Colegio I.E. JUSTO VICTOR CHARRY.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m³)	VOLUMEN (m³)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	ARENA	912	6.595	6,60	1648,85	4,00
	CEMENTO	20	1.000	1,00		0,61
Total, m³ de materiales usados en obra:					**4,61**	
Total, TON de materiales usados en obra:					**7,60**	

- Colegio I.E. GARCES NAVAS.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m³)	VOLUMEN (m³)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	ARENA	2	22.259	22,26	1648,85	13,50
	GRAVILLA	1	2.473	2,47		1,50

	CEMENTO	105	5.250	5,25		3,18
METALICOS	VARILLAS 3/8 LISAS	479	268	0,27	7307,67	0,04
Total, m^3 de materiales usados en obra:					18,22	
Total, TON de materiales usados en obra:					30,25	

- Colegio I.E. JORGE ELIECER GAITAN.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m^3)	VOLUMEN (m^3)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	RECEBO B400	6	59.359	59,36	1648,85	36,00
METALICOS	PHR 305 X 80 X (2 mm)-6 ML	60	168.876	168,88	7307,67	23,11
	PHR 160 X 60 X (2 mm)-6 ML	26	19.361	19,36		2,65
Total, m^3 de materiales usados en obra:					61,76	
Total, TON de materiales usados en obra:					247,60	

- Colegio I.E. MIGUEL ANTONIO CARO.

TIPO MATERIAL	MATERIAL	CANTIDAD	PESO (Kg)	TONELADAS (TON)	ρ DENSIDAD (Kg/m^3)	VOLUMEN (m^3)
11 de Marzo - al 10 Abril - 2023						
PETREOS	RECEBO	5	26.382	26,38	1648,85	16,00
	ARENA	4	19.786	19,79		12,00
	CEMENTO	95	4.750	4,75		2,88
	GRAVA	3	150	0,15		8,00
Total, m^3 de materiales usados en obra:					38,88	
Total, TON de materiales usados en obra:					51,07	

4.7. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Mediante el oficio CIC_BTA_SED_050_2022_057, se le notificó al contratista la apertura del pin ambiental con el No. 22524 el día 06 de febrero. Sin embargo, con relación a las cantidades de materiales, el contratista reporto en el informe No. 3 que hubo movilización de los residuos asfalticos generados en las instituciones educativas Jorge Eliecer Gaitán, Francisco José de Caldas, Juan del Corral y San José Norte, durante las fechas de corte del presente informe, los cuales se han llevado a procesos de disposición final a la escombrera autorizada.

A continuación, se relaciona los sitios de disposición que están siendo usados para los residuos de construcción y demolición.

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES		
SITIO DE DISPOSICION	AUTORIDAD AMBIENTAL	RESOLUCION DE APROBACION
CEMEX	ANLA	Res. N° 1506 – 2006 y N° 1480 – 2014
GRECO	CAR MIN AMBIENTE	Res. 0472 de 2017.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>IED Jorge Eliecer Gaitán</td><td>IED San José Norte</td></tr>
<tr><td>


</td><td></td></tr>
<tr><td>IED Jorge Eliecer Gaitán</td><td>IED San José Norte</td></tr>
</table>

COLEGIO SAN JOSÉ NORTE							
FECHA	# VIAJES	TIPO DE MATERIAL	CAPACIDAD VOLQUETA	PLACA	NÚMERO DE VALE	PIN	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
28/03/2023	1	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	GRE VD A002349-002-2023	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
TOTAL, VIAJES					1		
TOTAL, m³					7		

COLEGIO JUAN DEL CORRAL							
FECHA	# VIAJES	TIPO DE MATERIAL	CAPACIDAD VOLQUETA	PLACA	NÚMERO DE VALE	PIN	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
04/04/2023	1	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	GRE VD A002349-0663-2023	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
TOTAL, VIAJES					1		
TOTAL, m³					7		

COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS							
FECHA	**# VIAJES**	**TIPO DE MATERIAL**	**CAPACIDAD VOLQUETA**	**PLACA**	**NÚMERO DE VALE**	**PIN**	**SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL**
2/03/2023	1	Excavación sencilla	7 m³	AJB274	225670220	1945	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
3/03/2023	2	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	228729473	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
6/03/2023	3	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	228809806	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
7/03/2023	4	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	228888950	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
8/03/2023	5	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	228978806	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
9/03/2023	6	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	229054273	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
15/03/2023	7	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	229327142	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
27/03/2023	8	Excavación sencilla	7 m³	AJB274	229907810	1945	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
28/03/2023	9	Excavació sencilla			8	1945	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
TOTAL, VIAJES						9	
TOTAL, m³						63	

Imagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamente

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN							
FECHA	# VIAJES	TIPO DE MATERIAL	CAPACIDAD VOLQUETA	PLACA	NÚMERO DE VALE	PIN	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
1/03/2023	1	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	228610236	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
10/03/2023	2	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	229113188	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
13/03/2023	3	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	229202854	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
14/03/2023	4	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	229258681	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
23/03/2023	5	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	229721691	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
30/03/2023	6	Excavación sencilla	7 m³	UUJ669	230093239	1357	CO-ESCOMBRERA TUNJUELO
TOTAL, VIAJES					6		
TOTAL, m³					42		

- **Residuos peligrosos**

Dentro de las actividades contractuales se encuentra el desmonte y reemplazo de tejas de asbesto cemento (se relaciona evidencia fotográfica). Es importante señalar que, dadas las características de peligrosidad que contiene este tipo de residuo es indispensable que se dé el debido manejo para su proceso de disposición final; este proceso se realiza de acuerdo con la normatividad vigente y los diferentes protocolos de manejo de este residuo altamente contaminante.

Así las cosas, la actividad se realiza con personal capacitado que cuente con los debidos elementos de protección personal EPP, posteriormente, una vez retirado el producto, se procede a envolver en plástico resistente las tejas en asbesto para su disposición final. Los residuos de asbesto pueden ser almacenados al aire libre o en superficies cubiertas, debidamente identificados y con su respectivo aislamiento o cercado, para lo cual dentro del frente de obra se dispone del respectivo acopio.

Es importante señalar que este tipo de residuo no se reutilizará, ni será dispuesto como residuo ordinario de construcción en escombreras o rellenos sanitarios, se llevará a proceso de disposición final a través de gestor autorizado por la autoridad ambiental,

sin embargo, el mismo se almacenará dentro del punto de acopio a fin de contener el volumen de desmonte considerable para efectos de disposición final de dicho residuo.

I.E.D. Jorge Eliecer Gaitán	I.E.D Garcés Navas
	

4.8. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

En el periodo hubo ingreso de volquetas, se realizó verificación de PIN

Placa	Fecha vencimiento SOAT	Fecha vencimiento RTM	Pin Activo
EYB520	26/07/2023	21/08/2023	11511
CAV916	10/12/2023	11/12/2023	1580
AJB574	04/12/2023	06/10/2023	1945
OBA246	31/05/2023	15/02/2024	1272
UUJ669	11/02/2024	12/02/2024	1357

IED Jorge Eliecer Gaitán	IED Francisco José de Caldas

Se aprobó el ingreso del minicargador BOBCAT con No. de serie 512259677

	
	
IED Floridablanca	

- Equipos

Descripción	Identificación
Arnés de seguridad Safety Systems	Serial 16-21-41-71
Eslinga De Seguridad Safety Systems	Serial 29-55-83-59
Taladro Percutor Makita Azul	Serial N 1
BOBCAT 767	Serial 512259277
Cilindro Vibro Compactador (Equipo Nuevo)	Serial 375811122974
Arnés De Seguridad SOEFEC	Serie 00071
Eslinga SOEFEC	Serie 00042
Arnés De Seguridad SOEFEC	Serie 00190
Eslinga SOEFEC	Serie 00102
Línea De Vida Ep Nueva	Serial 29384
Arnés De Seguridad #1	Serial 410022020085
Eslinga #1	Serial Aa500842 - Pveeo
Arnés De Seguridad #2	Serial7795

Eslinga De Seguridad #2	Serial Aa102882/398
Arnés #3	Serial 7654
Eslinga#3	Serial 1244412
Línea De Vida Nueva	13mm
Equipo De Soldadura	Nom-003-Scfi
Careta Electrónica Automática	Falcom Fw 44

4.9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

✓ En el presente periodo, se relacionan los siguientes indicadores de seguimiento.

- Indicador de eficiencia

$$Eficiencia = \frac{Gastos\ mensuales\ de\ la\ implementación\ del\ PGRCD\ (\$)}{Presupuesto\ planteado\ para\ el\ PGRCD\ (\$)} * 100$$

$$Eficiencia = \frac{0}{0} * 100$$

$$Efiencia = 0\%$$

Durante el mes de febrero en la obra, se invirtió el 0% del presupuesto que se proyectó para la gestión de RCD.

✓ Indicador de eficacia

$$Eficacia = \frac{Cantidad\ de\ residuos\ aprovechados\ en\ la\ obra\ por\ mes\ (ton)}{Cantidad\ de\ material\ usado\ para\ la\ ejecución\ de\ la\ obra\ (ton)} * 100$$

$$Eficacia = \frac{0}{0} * 100$$

Eficacia= 0 %

Durante el mes de febrero hubo una eficiencia del 0%, debido a que no hubo aprovechamiento ni reutilización de materiales durante este mes.

✓ Indicador de efectividad

$$Efectividad\ \frac{Cantidad\ de\ RCD\ dispuestos\ en\ sitios\ autorizados\ en\ el\ mes\ (ton)}{Cantidad\ estimada\ a\ generar\ de\ RCD\ en\ el\ mes\ (ton)} * 100$$

$$Efectividad = \frac{0}{0} * 100$$

Efectividad = 0%

Aún no se recibe certificados de disposición final puesto que se revisa mes vencido.

- ✓ Aprovechamiento a la fecha

$$\% \, Reutilización = \frac{Cantidad \, de \, material \, reutilizado \, a \, la \, fecha \, (ton)}{Cantidad \, de \, material \, usado \, a \, la \, fecha \, (ton)} * 100$$

$$\% \, Reutilización = \frac{0}{0} * 100$$

$$\% \text{ Reutilización} = 0\%$$

4.10. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

El contratista realizo el inventario de los sumideros aledaños al área de influencia, los cuales están siendo intervenidos haciendo uso de una malla azul. Se espera que en el próximo periodo se evidencia su protección, para evitar arrastre de materiales de volquetas y vehículos.


Ubicación Geográfica De Sumideros Pluviales Colegio Floridablanca	
	

Ubicación Geográfica De Sumideros Pluviales Colegio Juan Del Corral	
	



Ubicación Geográfica De Sumideros Pluviales Colegio Rafael Bernal Jiménez



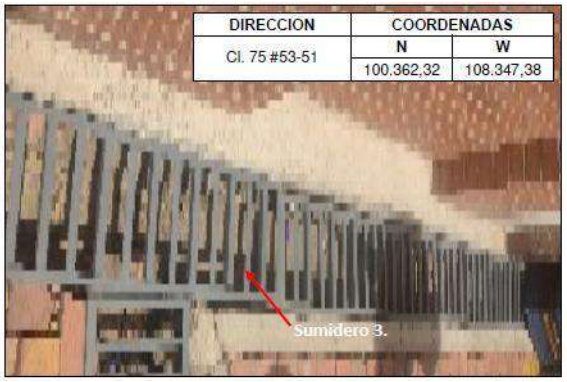

4.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Según lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del Contratista se socializan temas como: Primeros auxilios, correcto lavado de manos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, orden y aseo, uso adecuado de EPI, exposición a vibraciones, enfermedades generales por el ruido, acopio de bolsas de cemento, almacenamiento adecuado de herramientas, ascenso y descenso por escaleras, protección del cuerpo contra el cemento, riesgo eléctrico, movimientos giratorios (maquinas), que es un accidente ambiental, divulgación de la matriz de riesgos y manipulación adecuada de sustancias químicas.



Jorge Eliecer Gaitán



Garces Navas

	
Juan del Corral	Miguel Antonio Caro
	
Floridablanca	San José Norte
	
Francisco José de Caldas	Rafael Bernal Jiménez

4.12. INSPECCIONES AMBIENTALES

Se realizaron recorridos en conjunto con el contratista e interventoría, donde se identificó el correcto almacenamiento de los residuos sólidos y de construcción – demolición.

4.13. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

Obligaciones	Cumple		
	SI	NO	No Aplica
Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental			
Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED.	X		
Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	X		
Implementar jardines verticales u horizontales ofrecidos si es el caso, para lo que, de manera previa, el contratista deberá presentar los diseños a la Entidad contratante, para su respectiva aprobación.			X
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.	X		
Gestión Integral de Residuos			
Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.	X		
Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.		X	
Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.	X		
Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro.	X		
Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador.	X		
El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS.	X		
Verificar la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando su fácil movilización.	X		
Fijar los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS	X		

Residuos de construcción y demolición RCD			
Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED.	X		
Deberá revisar y dar aval al PGRCD, formatos RCD, informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD y garantizar el adecuado cargue mensual en aplicativo web de la SDA de los reportes RCD; desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado.	X		
Uso Eficiente del Agua			
Garantizar la implementación al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.		X	
Garantizar la implementación de un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores.			X
Garantizar la implementación al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.		X	
Uso Eficiente de la Energía			
Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural.		X	
Garantizar la implementación al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento al Decreto 177 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Resolución 180606 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía.		X	
Garantizar la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar), como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.			X

5. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Contratista

- ✓ No. de trabajadores nuevos: 17
- ✓ No. de trabajadores antiguos: 60
- ✓ No. de trabajadores rotativos: 23
- ✓ No. de trabajadores retirados: 6

Interventoría

Se dio cumplimiento con los pagos de seguridad del personal.

- ✓ No. de trabajadores nuevos: 0
- ✓ No. de trabajadores antiguos: 7
- ✓ No. de trabajadores retirados: 0

Se presentan los pagos de seguridad social del personal en los anexos.

5.2. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

- ✓ Previamente el contratista había remito actas del COPASST y del CCL, sin embargo, sus fechas estaban del 2019, por ende, se remitieron observaciones para que realizaran nueva reunión, la cual quedo del 20 de enero de 2023.

5.3. INDUCCIONES

- ✓ Se realizaron inducciones en el periodo en curso

5.4. MEDICINA PREVENTIVA Y LABORAL

- ✓ Del personal aprobado se cuenta con exámenes ocupacionales; estos documentos fueron aprobados por interventoría.
- ✓ Se ha evidenciado actividades de promoción y prevención como jornadas de pausas activas.

		
Francisco José de Caldas	Jorge Eliecer Gaitán	Garces Navas

5.5. HIGIENE INDUSTRIAL

- ✓ El contratista está haciendo uso de los baños fijos que fueron previamente aprobados por rectoría dentro de los cuales se tiene a la IED Juan del Corral, Francisco José de Caldas, Garces Navas, Jorge Eliecer Gaitán y Justo Víctor Charry, a los cuales se les está realizando un control de orden y aseo.
- ✓ La empresa Saniport realiza la limpieza y mantenimiento de los baños portátiles dos veces a la semana en las Instituciones Educativas Rafael Bernal, Floridablanca, San José Norte y Miguel Antonio Caro.

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>IED Justo Victor Charry</td><td>IED Francisco José de Caldas</td></tr>
<tr><td></td><td> </td></tr>
<tr><td>IED San Jose Norte</td><td>IED Miguel Antonio Caro</td></tr>
</table>

	
IED Rafael Bernal Jiménez	IED Juan Del Corral
	
IED Garces Navas	IED Jorge Eliecer Gaitán


IED Florida Blanca

5.6. ACTIVIDADES EN EL TRABAJO

5.6.1. Actividades realizadas en el transcurso del periodo

Se realizaron actividades de compactación en el piso de aula con el equipo Rana, excavación, desmonte de cielo raso, demolición del piso con taladro demoledor, desmonte de manto en cubierta, compactación de material con equipo benitin, fundida del piso, demolición de lavamos, instalación de tubería PVC, se realizó pañete de filo de ventanas, desmonte de teja de asbesto, desmonte de ventanas, actividades de mampostería, armado de andamios, instalación de geotextil T1600, pintado de ángulos con comprensor, demolición de cárcamo central de canchas.

Francisco José de Caldas	Garces Navas
	





Rafael Bernal Jiménez Sede A





San José Norte









Garces Navas	Jorge Eliecer Gaitán















Juan del Corral sede A	Floridablanca











Miguel Antonio Caro

Justo Victor Charry












Rafael Bernal Jiménez



5.6.2. Brigada de emergencias

El día 06 de marzo de 2023 se conformó la brigada de emergencia se presentó el respectivo soporte de la reunión y de la capacitación realizada.

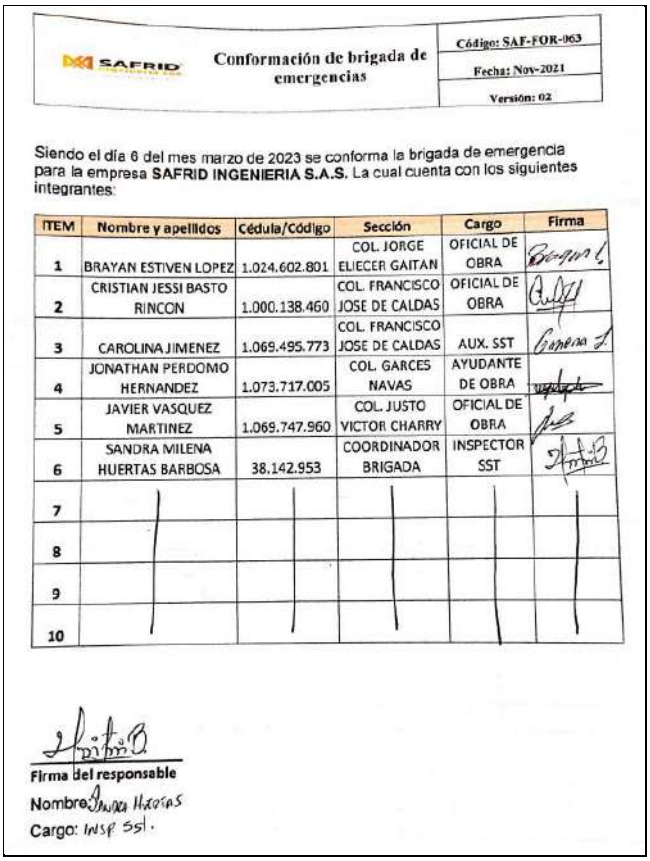

SAFRID — Conformación de brigada de emergencias

Código: SAF-FOR-063
Fecha: Nov-2021
Versión: 02

Siendo el día 6 del mes marzo de 2023 se conforma la brigada de emergencia para la empresa **SAFRID INGENIERIA S.A.S.** La cual cuenta con los siguientes integrantes:

ITEM	Nombre y apellidos	Cédula/Código	Sección	Cargo	Firma
1	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ	1.024.602.801	COL. JORGE ELIECER GAITAN	OFICIAL DE OBRA	
2	CRISTIAN JESSI BASTO RINCON	1.000.138.460	COL. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	OFICIAL DE OBRA	
3	CAROLINA JIMENEZ	1.069.495.773	COL. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	AUX. SST	
4	JONATHAN PERDOMO HERNANDEZ	1.073.717.005	COL. GARCES NAVAS	AYUDANTE DE OBRA	
5	JAVIER VASQUEZ MARTINEZ	1.069.747.960	COL. JUSTO VICTOR CHARRY	OFICIAL DE OBRA	
6	SANDRA MILENA HUERTAS BARBOSA	38.142.953	COORDINADOR BRIGADA	INSPECTOR SST	
7					
8					
9					
10					

Firma del responsable
Nombre: Sandra Huertas
Cargo: Insp SSI.

5.6.3. Accidentes de trabajo

No se presentaron accidentes de trabajo en ninguno de los colegios que se han realizado socialización de obra.

5.6.4. Capacitaciones SST

Para este periodo el contratista registra en el informe las charlas realizadas:

- ✓ Acopio de bolsas de cemento
- ✓ Almacenamiento adecuado de herramientas para evitar accidentes
- ✓ Ascenso y descenso por escaleras
- ✓ Protección del cuerpo contra el cemento (caída)
- ✓ Riesgo eléctrico
- ✓ Movimientos giratorios
- ✓ Uso adecuado de EPI para trabajo seguro en altura
- ✓ Cómo prevenir caídas de personas
- ✓ Recomendaciones de seguridad para usar los andamios
- ✓ La manipulación segura de cargas de trabajo
- ✓ El exceso de confianza y la seguridad en el trabajo

- ✓ Que es un incidente ambiental
- ✓ Divulgación de la matriz de riesgos y peligros
- ✓ Manejo de estrés
- ✓ Nutrición y estilos saludables
- ✓ Manipulación adecuada de sustancias químicas
- ✓ Recomendaciones para evitar accidentes en obra
- ✓ Correcto lavado de manos
- ✓ Uso correcto del arnés
- ✓ Hoja de datos de seguridad de los materiales (HDSM)
- ✓ La unión familiar
- ✓ Cuando se debe utilizar un casco de seguridad
- ✓ La técnica del levantamiento seguro de cargas

Charlas de seguridad


















- ✓ Divulgación de la cartelera informativa

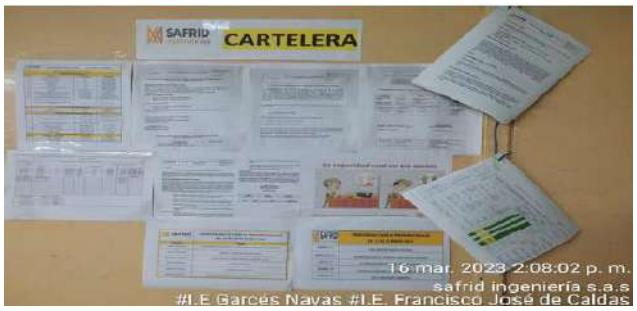Francisco José de Caldas	Jorge Eliecer Gaitán
	
Juan del corral	**Florida Blanca**
	

Miguel Antonio Caro	Justo Víctor Charry
	
San José Norte	**Garces Navas**
	
Rafael Bernal	
	

Por parte de interventoría se dieron las siguientes charlas:

- ✓ Charla inspección de equipos contra caída “Trabajo Seguro en Alturas”
- ✓ Manejo de sustancias químicas
- ✓ Importancia del diligenciamiento de los ATS

Garces Navas	Floridablanca	Jorge Eliecer Gaitán
 	 	

Justo Víctor Charry	San José Norte
 	 

5.6.5. Inspección SST

- **Elementos de atención de emergencia:** El contratista menciona que está en el proceso de compra de los elementos como el botiquín, extintor y camilla.

Colegio Jorge Eliecer Gaitán	Colegio Garces Navas
	
Colegio Francisco José de Caldas	Colegio Juan Del Corral
	
Colegio Floridablanca	Miguel Antonio Caro
	
San José Norte	Rafael Bernal Jiménez

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Justo Víctor Charry</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

- **Dotación y EPP:** Se evidencia uso de dotación y elementos de protección personal del personal, durante este periodo, se realizó entrega de elementos de protección personal correspondientes para el personal nuevo. Además, en los oficios se les recalca que se requiere que todo el personal operativo cuente con elementos de protección individuales (EPI) y dotación de acuerdo a lo indicado en el MANUAL DE USO DE MARCA ALCALDÍA DE BOGOTÁ, páginas 169, 170 y 171 “Indumentaria personal de obra y operarios”.

Colegio Juan del Corral	Colegio Floridablanca	Colegio Rafael Bernal Jiménez
		

- **Señalización:**

Garces Navas	Juan del Corral
	 
Francisco José de Caldas	**Jorge Eliecer Gaitán**
	 

Interventoría

Se realizo inspección de EPP de los profesionales contractuales y se verifico que los elementos se encuentran en buen estado.

5.7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Contratista

El contratista presenta los indicadores y estadísticas de seguimiento

- Accidentalidad: 0
- Seguimiento SST: se realizó el seguimiento y gestión por parte del contratista principalmente en obra.

Nombre del Indicador	Formula	Indicador
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	$\frac{0}{100} * 100 = 0\%$
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	$\frac{0}{100} * 100 = 0\%$
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	$\frac{0}{0} * 100 = 0\%$
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{100} * 100.000 = 0\%$
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{100} * 100.000 = 0\%$
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	$\frac{0}{25} * 100 = 0\%$
Inducciones	(No. de trabajadores con inducción/ No. de total de trabajadores nuevos) *100	$\frac{0}{0} * 100 = xx\%$
Capacitaciones	(No. de capacitaciones ejecutadas en el periodo/ No. total, de capacitaciones programadas) *100	$\frac{0}{0} * 100 = 100\%$

Interventoría



Nombre del Indicador	Formula	Indicador
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	$\frac{0}{7} * 100 = 0\%$
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de	$\frac{0}{7} * 100 = 0\%$



	días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	$\frac{0}{0} * 100 = 0\%$
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{7} * 100.000 = 0\%$
Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	$\frac{0}{7} * 100.000 = 0\%$
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	$\frac{0}{25} * 100 = 0\%$



5.8. PERSONAL INTERVENTORÍA

✓ A continuación, se presenta relación de personal de interventoría:

Tabla de control de personal para el periodo entre el 11 de marzo al 10 de abril de 2023

PERSONAL CONTRACTUAL					
Nombre	Cedula	Cargo	Salario	Vínculo Laboral	Firma
Fredy Giovanni Rodríguez Salazar	80.539.072	Director De Interventoría	$6.500.000	Fijo	
Camilo Antonio Samacá Pesca	1.051.474.958	Residente De Interventoría 1	$4.954.666	Fijo	
Rodolfo Castro Ortegón	1.015.410.729	Residente De Interventoría 2	$4.000.000	Fijo	
Jairo Andrés Meza Rosas	13.874.430	Asesor Estructural	1.160.000	Fijo	
Mónica Marcela De Los Ángeles Gómez Rodríguez	1.069.099.276	Asesor De Ambiental Y Seguridad Industrial	$4.020.000	Fijo	

Hernando Gómez Casas	17.069.465	Asesor En Redes Eléctricas, Telefónicas Voz Y Datos	$1.160.000	Fijo	
Guillermo Emilio Narváez Vélez	72.201.382	Asesor En Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios Y Gas	$26.789.981	Fijo	
Enrique Luis Monroy Maldonado	1.026.264.858	Asesor De Costos, Presupuestos Y Programación De Obras	$6.862.320	Fijo	
Milena Mercedes Albornoz Villota	1.085.250.609	Asesoría Jurídica	8.750.000	Fijo	
Camilo Fandiño Hernández	1.075.627.522	Inspector De Interventoría	$1.825.000	Fijo	
Edison Calderón Castañeda	79.403.208	Maestro De Obra	$2.173.333	Fijo	
Luis Carlos Tovar Núñez	72.257.557	Tecnólogo SST 1	$2.173.333	Fijo	
Natalia Vanessa Calderón Acevedo	1.015.474.687	Inspector De Interventoría	$ 1.825.000	Fijo	

PERSONAL DE APOYO					
Nombre	Cedula	Cargo	Salario	Vínculo Laboral	Firma
Manuel Antonio González Romero	1.152.447.887	Coordinador	$3.800.000	Fijo	
Luis Felipe Lavado Alfonso	1.014.264.625	Auxiliar de interventoría	$1.800.000	Fijo	
María Alejandra Africano Barrera	1.057.606.856	Auxiliar SSTA	$1.800.000	Fijo	

6. CONCLUSIONES

- ✓ Se ha reiterado el uso de señalización, EPP y dotación en obra.
- ✓ Se encuentra pendiente el registro fotográfico de la protección de los sumideros.
- ✓ Se ha realizado la protección de los sumideros de la I.E.D. Rafael Bernal y Floridablanca.
- ✓ Se tiene pendiente certificados de proveedor de sitios de disposición final de RCD.
- ✓ No se da aprobación de los informes del contratista No.3, puesto que, del componente de Seguridad y salud en el trabajo hacen falta remitir la subsanación de las observaciones compartidas mediante el oficio CIC_BTA_SED_050_2022_169 el día 12 de abril de 2023. Por otra parte, del componente ambiental se envió oficio CIC_BTA_SED_050_2022_189, respondiendo a la subsanación del informe enviado el día 27 de abril de 2023.
- ✓ Se da aprobación del informe del contratista No. 3, el día 10 de mayo de 2023, en el cual se evidencia que se subsanaron las observaciones realizadas.

7. ANEXOS

A continuación, se presenta relación de anexos:

1) Soportes pagos de seguridad social interventoría

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 72227511de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 identificado con NIT No.901649961-8, certifico que durante los últimos seis (06) meses correspondientes la empresa ha realizado los pagos correspondientes a las obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscal exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los trece (13) días del mes de abril de 2023.



Firma del Representante Legal.
ANTONIO RAFAEL GONZALEZ
C.C. 72227511 de Barranquilla
Representante legal

GNG PROYECTOS SAS BIC
Nit. 901477828-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal Suplente de **GNG PROYECTOS S.A.S. B.I.C** identificada con Nit. 901477828-7, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) día del mes de abril de 2023.

FIRMA_____
JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 901.383.717-3

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. 901.383.717-3, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) día del mes de abril de 2023

JORGE GOMEZ F
ALLA C.C. 72.007.216

Yo, **EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.073.323.194 de Puerto Salgar, Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 229728-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. 901.383.717-3, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las NIAS: Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, certifico que durante los últimos seis (06) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con5dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2 002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) día del mes de abril de 2023

EDISON ALEJANDRO CARDONA RODRIGUEZ
Cc.1.073.323.194
T.P. 229728-T

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65846180	$2.085.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.000	0		0		0	3	1.000	0	261.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	32.500	32.500	3	3.800	400	1.109.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	452.400				452.400	3	1.700	454.100			4.524	454.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	260.000	3	1.000	261.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.000	261.000
Pensión	1	1.105.000	1.109.200
Riesgos Laborales	1	452.400	454.100
CCF	1	260.000	261.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.077.400	2.085.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG104	GNG104	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65846180	$2.085.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80539072	RODRIGUEZ SALAZAR FREDY GIOVANNI	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS017	6.500.000	260.000	14-25	6.500.000	5	452.400	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V 003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65896496	$6.745.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	160.800	0		0		0	3	600	0	161.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	301.200	0		0		0	3	1.100	0	302.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	480.000	0		0		0	3	1.800	0	481.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.203.200	0	0	0	0	3	4.400	0	1.207.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.528.000	0	0	0	0	3	5.600	0	1.533.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	1.036.800	0	0	32.400	32.400	3	3.800	400	1.105.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.359.400				1.359.400	3	5.000	1.364.400			13.594	1.364.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	585.900	3	2.200	588.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	942.000	945.500
Pensión	3	3.832.800	3.847.000
Riesgos Laborales	1	1.359.400	1.364.400
CCF	1	585.900	588.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	6.720.100	6.745.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CAJA V	003	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65896496	$6.745.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013630567	IBARRA SANABRIA STEVEN ALEXANDER	1	0			S										X							230201	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS001	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	0	CCF24	4.020.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1018402224	CARDENAS LORA VANESSA PAOLA	1	0			S																	230301	4.020.000	643.200	0	0	0	0	EPS017	4.020.000	160.800	14-25	4.020.000	5	279.800	CCF24	4.020.000	120.600	0	0	0	0	0
3	CC	1069099276	GOMEZ RODRIGUEZ MONICA MARCELA DE LOS ANGELES	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-25	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	105.000	0	0	0	0	0
4	CC	1109491513	CANDIA MARIN LINER FABIAN	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
5	CC	52882446	JIMENEZ GOMEZ ADRIANA FERNANDA	1	0			S																	231001	6.480.000	1.036.800	0	0	32.400	32.400	EPS017	6.480.000	259.200	14-25	6.480.000	5	451.100	CCF24	6.480.000	194.400	0	0	0	0	0
6	CC	92188831	BENITEZ ARCOS JADER WADITH	1	0			S																	230301	4.030.000	644.800	0	0	0	0	EPS008	4.030.000	161.200	14-25	4.030.000	5	280.500	CCF24	4.030.000	120.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS	CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y	09/03/2023	65860115	$162.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	161.600				161.600	3	600	162.200			1.616	162.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	161.600	162.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	161.600	162.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTES	025	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y	09/03/2023	65860115	$162.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13874430	MEZA ROSAS JAIRO ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	17069465	GOMEZ CASAS HERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	04/04/2023	66571396	$7.191.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.200.000	0	0	37.500	37.500	0	0		1.275.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	0	0		2.550.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.566.000				1.566.000	0	0	1.566.000			15.660	1.566.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	300.000	0	0	300.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	0	0	600.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	900.000	900.000
Pensión	2	3.825.000	3.825.000
Riesgos Laborales	1	1.566.000	1.566.000
CCF	2	900.000	900.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.191.000	7.191.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 37	PRIN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	04/04/2023	66571396	$7.191.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	72007216	GOMEZ FALLA JORGE	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
2	CC	72201382	NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	1	0			S																	230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS010	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF06	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
3	CC	72227511	GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	1	0			S																	25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-25	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65852289	$4.795.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	202.200	0		0		0	3	800	0	203.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	460.200	0		0		0	3	1.700	0	461.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	3	300	0	68.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	3	600	0	145.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	542.400	0	0	0	0	3	2.000	0	544.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	808.800	0	0	25.300	25.300	3	3.000	200	862.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.585.600	0	0	43.800	43.800	3	5.800	400	1.679.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	95.500				95.500	3	400	95.900			955	95.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	731.400	3	2.700	734.100	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	875.400	878.800
Pensión	3	3.075.000	3.086.400
Riesgos Laborales	1	95.500	95.900
CCF	1	731.400	734.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.777.300	4.795.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830515117-5	GNG INGENIERIA SAS		CRA 49 No. 104 B -49	7122685	gerencia@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GNG 02	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65852289	$4.795.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023018000	CHAPARRO GALINDO FRANCY ALEXANDRA	1	0			S	X	X															230201	540.000	86.400	0	0	0	0	EPS008	540.000	21.600	14-25	540.000	1	2.900	CCF24	562.800	22.600	0	0	0	0	0
2	CC	1075211095	MURCIA CORTES MARTHA MARIA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1085250609	ALBORNOZ VILLOTA MILENA MERCEDES	1	0			S																	25-14	8.750.000	1.400.000	0	0	43.800	43.800	EPS005	8.750.000	350.000	14-25	8.750.000	1	45.700	CCF24	8.750.000	350.000	0	0	0	0	0
4	CC	24218926	APONTE PAEZ NUBIA INES	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	35251942	ROMERO GALINDO LIDA GIOVANNA	1	0			S																	230201	2.755.000	440.800	0	0	0	0	EPS005	2.755.000	110.200	14-25	2.755.000	1	14.400	CCF24	2.755.000	110.200	0	0	0	0	0
6	CC	35251942	ROMERO GALINDO LIDA GIOVANNA	1	0			S									X								230201	95.000	15.200	0	0	0	0	EPS005	95.000	0	14-25	95.000	1	0	CCF24	95.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	36312425	SANDINO PUENTES LILIANA	1	0			S																	230301	5.054.400	808.800	0	0	25.300	25.300	EPS002	5.054.400	202.200	14-25	5.054.400	1	26.400	CCF24	5.054.400	202.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S	CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 03	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66029975	$13.489.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	194.500	0		0		0	0	0	0	194.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	152.900	0		0		0	0	0	0	152.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.015.000	0		0		0	0	0	0	1.015.000	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	202.200	0		0		0	0	0	0	202.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	226.400	0		0		0	0	0	0	226.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	174.400	0		0		0	0	0	0	174.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.811.200	0	0	24.300	24.300	0	0		1.859.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.210.500	0	0	40.100	40.100	0	0		3.290.700	9
230901	Old Mutual	800253055-2	808.800	0	0	25.300	25.300	0	0		859.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.449.700	0	0	24.400	24.400	0	0		1.498.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.178.700				2.178.700	0	0	2.178.700			21.787	2.178.700	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.836.500	0	0	1.836.500	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 03	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66029975	$13.489.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.965.400	1.965.400
Pensión	4	7.508.400	7.508.400
Riesgos Laborales	1	2.178.700	2.178.700
CCF	1	1.836.500	1.836.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	13.489.000	13.489.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 03	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					18	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66029975	$13.489.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014290968	MUÑOZ GARCIA LADY JULIANA	1	0			S																	230301	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS008	1.586.667	63.500	14-25	1.586.667	5	110.500	CCF24	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
2	CC	1014290968	MUÑOZ GARCIA LADY JULIANA	1	0			S										X							230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS008	113.334	4.600	14-25	113.334	5	0	CCF24	113.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1016018627	ROJAS VASQUEZ RONNY JOHAN	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	1	0			S							X										230301	7.466.667	1.194.700	0	0	37.400	37.400	EPS008	7.466.667	298.700	14-25	7.466.667	5	519.700	CCF24	7.466.667	298.700	0	0	0	0	0
5	CC	1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	1	0			S										X							230301	533.334	85.400	0	0	2.700	2.700	EPS008	533.334	21.400	14-25	533.334	5	0	CCF24	533.334	0	0	0	0	0	0
6	CC	1026591904	ARIAS CASTILLO YURLEY VIVIANA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-25	1.450.000	1	7.600	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
7	CC	1026591904	ARIAS CASTILLO YURLEY VIVIANA	1	0			S													X				230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-25	50.000	1	0	CCF24	50.000	2.000	0	0	0	0	0
8	CC	1032450928	PORRAS HOLGUIN JULIETH ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	3.726.000	596.200	0	0	18.700	18.700	EPS001	3.726.000	149.100	14-25	3.726.000	5	259.400	CCF24	3.726.000	149.100	0	0	0	0	0
9	CC	1032450928	PORRAS HOLGUIN JULIETH ALEJANDRA	1	0			S													X				25-14	1.134.000	181.500	0	0	5.700	5.700	EPS001	1.134.000	45.400	14-25	1.134.000	5	0	CCF24	1.134.000	45.400	0	0	0	0	0
10	CC	1032488511	HERNANDEZ GARCIA TANIA ALEXANDRA	1	0			S	X																25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.462.778	98.600	0	0	0	0	0
11	CC	33365593	APONTE PAEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS005	966.667	38.700	14-25	966.667	5	67.300	CCF24	966.667	38.700	0	0	0	0	0
12	CC	33365593	APONTE PAEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																5	230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-25	193.334	5	0	CCF24	193.334	0	0	0	0	0	0
13	CC	52353552	ARCINIEGAS DIAZ JOHANNA	1	0			S																	230901	5.054.400	808.800	0	0	25.300	25.300	EPS010	5.054.400	202.200	14-25	5.054.400	1	26.400	CCF24	5.054.400	202.200	0	0	0	0	0
14	CC	52914317	PORRAS ALVAREZ NINI YOJANA	1	0			S										X							230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	1	0	CCF24	1.160.000	0	0	0	0	0	0
15	CC	53051265	ORDOÑEZ CASTIBLANCO DIANA PAOLA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
16	CC	80194987	PINZON PEDRAZA JAVIER	1	0			S																	230201	4.860.000	777.600	0	0	24.300	24.300	EPS008	4.860.000	194.400	14-25	4.860.000	5	338.300	CCF24	4.860.000	194.400	0	0	0	0	0
17	CC	1018423519	PEREZ MADRID IVAN ROGELIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1103950598	PEREZ ORTEGA YESICA VIRGINIA	1	0			S	X																230301	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS008	1.083.334	43.400	14-25	1.083.334	1	5.700	CCF24	3.225.001	129.100	0	0	0	0	0
19	CC	1018413751	ALMANZAR BONILLA FANNY	1	0			S																	230201	2.160.000	345.600	0	0	0	0	EPS037	2.160.000	86.400	14-25	2.160.000	5	150.400	CCF24	2.160.000	86.400	0	0	0	0	0
20	CC	1000603023	SANCHEZ GONZALEZ SERGIO ANDRES	1	0			S							X										230201	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS008	1.740.000	69.600	14-25	1.740.000	1	9.100	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
21	CC	1000603023	SANCHEZ GONZALEZ SERGIO ANDRES	1	0			S													X				230201	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS008	60.000	2.400	14-25	60.000	1	0	CCF24	60.000	2.400	0	0	0	0	0
22	CC	1057606856	AFRICANO BARRERA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
23	CC	1073323194	CARDONA RODRIGUEZ EDISON ALEJANDRO	1	0			S																	230201	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS008	2.250.000	90.000	14-25	2.250.000	1	11.800	CCF24	2.250.000	90.000	0	0	0	0	0
24	CC	1073323194	CARDONA RODRIGUEZ EDISON ALEJANDRO	1	0			S													X				230201	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS008	250.000	10.000	14-25	250.000	1	0	CCF24	250.000	10.000	0	0	0	0	0
25	CC	1010134383	ALGOMEDO PALOMEQUE GLADYS MARIA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65918822	$4.060.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	87.000	0		0		0	0	0	0	87.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	73.000	0		0		0	0	0	0	73.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	73.000	0		0		0	0	0	0	73.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	285.200	0		0		0	0	0	0	285.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.072.400	0	0	24.800	24.800	0	0		2.122.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	901.700				901.700	0	0	901.700			9.017	901.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	518.200	0	0	518.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	518.200	518.200
Pensión	1	2.122.000	2.122.000
Riesgos Laborales	1	901.700	901.700
CCF	1	518.200	518.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.060.100	4.060.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901649961-8	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022		CRA49 104B-49	7122685	RHUMANOS@GNG.COM.CO
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					5	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	65918822	$4.060.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79403208	CALDERON CASTAÑEDA EDISON	1	0			S																	230301	2.173.333	347.800	0	0	0	0	EPS037	2.173.333	87.000	14-25	2.173.333	5	151.300	CCF24	2.173.333	87.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015474687	CALDERON ACEVEDO NATALIA VANESSA	1	0			S																	230301	1.825.000	292.000	0	0	0	0	EPS008	1.825.000	73.000	14-25	1.825.000	5	127.100	CCF24	1.825.000	73.000	0	0	0	0	0
3	CC	1051474958	SAMACA PESCA CAMILO ANTONIO	1	0			S																	230301	4.954.666	792.800	0	0	24.800	24.800	EPS037	4.954.666	198.200	14-25	4.954.666	5	344.900	CCF24	4.954.666	198.200	0	0	0	0	0
4	CC	1075627522	FANDIÑO HERNANDEZ CAMILO	1	0			S																	230301	1.825.000	292.000	0	0	0	0	EPS017	1.825.000	73.000	14-25	1.825.000	5	127.100	CCF24	1.825.000	73.000	0	0	0	0	0
5	CC	72257557	TOVAR NUÑEZ LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	2.173.333	347.800	0	0	0	0	EPS002	2.173.333	87.000	14-25	2.173.333	5	151.300	CCF24	2.173.333	87.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	013	013	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65342514	$12.428.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	128.000	0		0		0	1	200	0	128.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	481.700	0		0		0	1	600	0	482.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	310.000	0		0		0	1	400	0	310.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	180.000	0		0		0	1	300	0	180.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	272.200	0		0		0	1	400	0	272.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	324.200	0		0		0	1	400	0	324.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	600.100	0	0	0	0	1	800	0	600.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	4.336.300	0	0	0	0	1	5.200	0	4.341.500	12
231001	Colfondos	800227940-6	560.000	0	0	0	0	1	700	0	560.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.286.400	0	0	0	0	1	1.600	0	1.288.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.661.300				2.661.300	1	3.200	2.664.500			26.613	2.664.500	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.272.600	1	1.600	1.274.200	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	013	013	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65342514	$12.428.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.696.100	1.698.400
Pensión	4	6.782.800	6.791.100
Riesgos Laborales	1	2.661.300	2.664.500
CCF	1	1.272.600	1.274.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	12.412.800	12.428.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901383717-3	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS		CRA 49 104B-49	7122685	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	013	013	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65342514	$12.428.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007650741	VARGAS BERNAL JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007650741	VARGAS BERNAL JENNIFER PAOLA	1	0			S												X					230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS002	200.000	8.000	14-25	200.000	5	0	CCF24	200.000	6.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007846773	PERDOMO JARAMILLO LUISA FERNANDA	1	0			S												X					230301	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS005	1.560.000	62.400	14-25	1.560.000	5	108.600	CCF24	1.560.000	46.800	0	0	0	0	0
4	CC	1007846773	PERDOMO JARAMILLO LUISA FERNANDA	1	0			S												X					230301	240.000	38.400	0	0	0	0	EPS005	240.000	9.600	14-25	240.000	5	0	CCF24	240.000	7.200	0	0	0	0	0
5	CC	1015410729	CASTRO ORTEGON RODOLFO	1	0			S																	230301	2.933.334	469.400	0	0	0	0	EPS017	2.933.334	117.400	14-25	2.933.334	5	204.200	CCF24	2.933.334	88.100	0	0	0	0	0
6	CC	1015410729	CASTRO ORTEGON RODOLFO	1	0			S												X					230301	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS017	1.066.667	42.700	14-25	1.066.667	5	0	CCF24	1.066.667	32.100	0	0	0	0	0
7	CC	1015433479	LUGO BUITRAGO KAROL STEFANY	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-25	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0
8	CC	1019092980	FONSECA SUPELANO MILDRED MARCELA	1	0			S							X										230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	51.000	0	0	0	0	0
9	CC	1024547827	COBOS GARZON JENNIFER KATHERINE	1	0			S																	230301	2.146.667	343.500	0	0	0	0	EPS037	2.146.667	85.900	14-25	2.146.667	5	149.500	CCF24	2.146.667	64.500	0	0	0	0	0
10	CC	1024547827	COBOS GARZON JENNIFER KATHERINE	1	0			S												X					230301	653.334	104.600	0	0	0	0	EPS037	653.334	26.200	14-25	653.334	5	0	CCF24	653.334	19.700	0	0	0	0	0
11	CC	1123323637	TONGUINO CUASIALPUD LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.386.667	221.900	0	0	0	0	EPS037	1.386.667	55.500	14-25	1.386.667	5	96.600	CCF24	1.386.667	41.700	0	0	0	0	0
12	CC	1123323637	TONGUINO CUASIALPUD LUIS ALBERTO	1	0			S												X					230301	213.334	34.200	0	0	0	0	EPS037	213.334	8.600	14-25	213.334	5	0	CCF24	213.334	6.500	0	0	0	0	0
13	CC	52774285	IPUZ FORERO NANCY CONSTANZA	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	66.000	0	0	0	0	0
14	CC	7314136	CASAS SOLANO ALEX VLADIMIR	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	120.000	0	0	0	0	0
15	CC	80727713	SERRANO CASTILLO JUAN PABLO	1	0			S																	25-14	2.423.639	387.800	0	0	0	0	EPS005	2.423.639	97.000	14-25	2.423.639	5	168.700	CCF24	2.423.639	72.800	0	0	0	0	0
16	CC	80727713	SERRANO CASTILLO JUAN PABLO	1	0			S												X					25-14	1.615.759	258.600	0	0	0	0	EPS005	1.615.759	64.700	14-25	1.615.759	5	0	CCF24	1.615.759	48.500	0	0	0	0	0
17	CC	1031174194	BOHORQUEZ SOTELO DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
18	CC	1069099276	GOMEZ RODRIGUEZ MONICA MARCELA DE LOS ANGELES	1	0			S	X																230201	2.450.000	392.000	0	0	0	0	EPS008	2.450.000	98.000	14-25	2.450.000	5	170.600	CCF24	2.450.000	73.500	0	0	0	0	0
19	CC	1073527297	QUEVEDO GARAY GERALDINE DANIELA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0
20	CC	1074486578	CHACON CHARCAS SUSAN BIBIANA	1	0			S																	230201	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS017	1.126.667	45.100	14-25	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	33.900	0	0	0	0	0
21	CC	1074486578	CHACON CHARCAS SUSAN BIBIANA	1	0			S												X					230201	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS017	173.334	7.000	14-25	173.334	5	0	CCF24	173.334	5.300	0	0	0	0	0
22	CC	1075662443	VEGA VASQUEZ YEISON ANDRES	1	0			S																	231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-25	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	105.000	0	0	0	0	0
23	CC	1075670671	MONROY REYES IVON NATALIA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	54.000	0	0	0	0	0
24	CC	1105673494	QUIMBAYO ORTIZ LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	3.700.000	592.000	0	0	0	0	EPS037	3.700.000	148.000	14-25	3.700.000	5	257.600	CCF24	3.700.000	111.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S	CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 03	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66029975	$13.489.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	194.500	0		0		0	0	0	0	194.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	152.900	0		0		0	0	0	0	152.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.015.000	0		0		0	0	0	0	1.015.000	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	202.200	0		0		0	0	0	0	202.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	226.400	0		0		0	0	0	0	226.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	174.400	0		0		0	0	0	0	174.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.811.200	0	0	24.300	24.300	0	0		1.859.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.210.500	0	0	40.100	40.100	0	0		3.290.700	9
230901	Old Mutual	800253055-2	808.800	0	0	25.300	25.300	0	0		859.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.449.700	0	0	24.400	24.400	0	0		1.498.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.178.700				2.178.700	0	0	2.178.700			21.787	2.178.700	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.836.500	0	0	1.836.500	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 03	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66029975	$13.489.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.965.400	1.965.400
Pensión	4	7.508.400	7.508.400
Riesgos Laborales	1	2.178.700	2.178.700
CCF	1	1.836.500	1.836.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	13.489.000	13.489.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 03	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					18	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66029975	$13.489.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014290968	MUÑOZ GARCIA LADY JULIANA	1	0			S																	230301	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS008	1.586.667	63.500	14-25	1.586.667	5	110.500	CCF24	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
2	CC	1014290968	MUÑOZ GARCIA LADY JULIANA	1	0			S										X							230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS008	113.334	4.600	14-25	113.334	5	0	CCF24	113.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1016018627	ROJAS VASQUEZ RONNY JOHAN	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-25	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
4	CC	1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	1	0			S							X										230301	7.466.667	1.194.700	0	0	37.400	37.400	EPS008	7.466.667	298.700	14-25	7.466.667	5	519.700	CCF24	7.466.667	298.700	0	0	0	0	0
5	CC	1026264858	MONROY MALDONADO ENRIQUE LUIS	1	0			S										X							230301	533.334	85.400	0	0	2.700	2.700	EPS008	533.334	21.400	14-25	533.334	5	0	CCF24	533.334	0	0	0	0	0	0
6	CC	1026591904	ARIAS CASTILLO YURLEY VIVIANA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-25	1.450.000	1	7.600	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
7	CC	1026591904	ARIAS CASTILLO YURLEY VIVIANA	1	0			S													X				230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-25	50.000	1	0	CCF24	50.000	2.000	0	0	0	0	0
8	CC	1032450928	PORRAS HOLGUIN JULIETH ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	3.726.000	596.200	0	0	18.700	18.700	EPS001	3.726.000	149.100	14-25	3.726.000	5	259.400	CCF24	3.726.000	149.100	0	0	0	0	0
9	CC	1032450928	PORRAS HOLGUIN JULIETH ALEJANDRA	1	0			S													X				25-14	1.134.000	181.500	0	0	5.700	5.700	EPS001	1.134.000	45.400	14-25	1.134.000	5	0	CCF24	1.134.000	45.400	0	0	0	0	0
10	CC	1032488511	HERNANDEZ GARCIA TANIA ALEXANDRA	1	0			S	X																25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.462.778	98.600	0	0	0	0	0
11	CC	33365593	APONTE PAEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS005	966.667	38.700	14-25	966.667	5	67.300	CCF24	966.667	38.700	0	0	0	0	0
12	CC	33365593	APONTE PAEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																5	230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-25	193.334	5	0	CCF24	193.334	0	0	0	0	0	0
13	CC	52353552	ARCINIEGAS DIAZ JOHANNA	1	0			S																	230901	5.054.400	808.800	0	0	25.300	25.300	EPS010	5.054.400	202.200	14-25	5.054.400	1	26.400	CCF24	5.054.400	202.200	0	0	0	0	0
14	CC	52914317	PORRAS ALVAREZ NINI YOJANA	1	0			S										X							230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	1	0	CCF24	1.160.000	0	0	0	0	0	0
15	CC	53051265	ORDOÑEZ CASTIBLANCO DIANA PAOLA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
16	CC	80194987	PINZON PEDRAZA JAVIER	1	0			S																	230201	4.860.000	777.600	0	0	24.300	24.300	EPS008	4.860.000	194.400	14-25	4.860.000	5	338.300	CCF24	4.860.000	194.400	0	0	0	0	0
17	CC	1018423519	PEREZ MADRID IVAN ROGELIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1103950598	PEREZ ORTEGA YESICA VIRGINIA	1	0			S	X																230301	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS008	1.083.334	43.400	14-25	1.083.334	1	5.700	CCF24	3.225.001	129.100	0	0	0	0	0
19	CC	1018413751	ALMANZAR BONILLA FANNY	1	0			S																	230201	2.160.000	345.600	0	0	0	0	EPS037	2.160.000	86.400	14-25	2.160.000	5	150.400	CCF24	2.160.000	86.400	0	0	0	0	0
20	CC	1000603023	SANCHEZ GONZALEZ SERGIO ANDRES	1	0			S							X										230201	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS008	1.740.000	69.600	14-25	1.740.000	1	9.100	CCF24	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
21	CC	1000603023	SANCHEZ GONZALEZ SERGIO ANDRES	1	0			S													X				230201	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS008	60.000	2.400	14-25	60.000	1	0	CCF24	60.000	2.400	0	0	0	0	0
22	CC	1057606856	AFRICANO BARRERA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
23	CC	1073323194	CARDONA RODRIGUEZ EDISON ALEJANDRO	1	0			S																	230201	2.250.000	360.000	0	0	0	0	EPS008	2.250.000	90.000	14-25	2.250.000	1	11.800	CCF24	2.250.000	90.000	0	0	0	0	0
24	CC	1073323194	CARDONA RODRIGUEZ EDISON ALEJANDRO	1	0			S													X				230201	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS008	250.000	10.000	14-25	250.000	1	0	CCF24	250.000	10.000	0	0	0	0	0
25	CC	1010134383	ALGOMEDO PALOMEQUE GLADYS MARIA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 60	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66005987	$1.458.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	258.000				258.000	0	0	258.000			2.580	258.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	200.000	0	0	200.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	200.000	200.000
Pensión	3	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	258.000	258.000
CCF	1	200.000	200.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.458.000	1.458.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 60	3	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66005987	$1.458.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014264625	LAVADO ALFONSO LUIS FELIPE	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030653585	ALZATE QUEZADA VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
3	CC	1090514015	MARQUEZ DIAZ PAOLA STEFANIA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 16	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66003701	$6.760.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	420.300	0		0		0	0	0	0	420.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	607.700	0	0	0	0	0	0		607.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.707.200	0	0	0	0	0	0		1.707.200	3
230901	Old Mutual	800253055-2	1.141.900	0	0	35.700	35.700	0	0		1.213.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.503.900				1.503.900	0	0	1.503.900			15.039	1.503.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	864.300	0	0	864.300	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	864.300	864.300
Pensión	3	3.528.200	3.528.200
Riesgos Laborales	1	1.503.900	1.503.900
CCF	1	864.300	864.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.760.700	6.760.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901047254-5	GNG INGENIERÍA SERVICIOS S.A.S		CRA 49 104B-49	2360929	rhumanos@gng.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	GNG 16	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66003701	$6.760.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018512259	PRADA ESPITIA NICOLAS	1	0			S																	230201	3.798.000	607.700	0	0	0	0	EPS017	3.798.000	152.000	14-25	3.798.000	5	264.400	CCF24	3.798.000	152.000	0	0	0	0	0
2	CC	1085165066	HERNANDEZ ALARCON LEONAR JOSE	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-25	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
3	CC	1152447887	GONZALEZ ROMERO MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS010	3.800.000	152.000	14-25	3.800.000	5	264.500	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
4	CC	52073626	BELLO MACCHI MARTHA PATRICIA	1	0			S																	230301	3.369.600	539.200	0	0	0	0	EPS005	3.369.600	134.800	14-25	3.369.600	5	234.600	CCF24	3.369.600	134.800	0	0	0	0	0
5	CC	79321604	GUTIERREZ ARGUELLO JUAN JOSE	1	0			S																	230901	7.136.813	1.141.900	0	0	35.700	35.700	EPS005	7.136.813	285.500	14-25	7.136.813	5	496.800	CCF24	7.136.813	285.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá, 14 de abril de 2023

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CERTIFICA QUE:

Para El Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 De 2022, “Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Física Para La Prestación Del Servicio Educativo”, se evidencia la correcta implementación de medidas para la protección de los sumideros.

En constancia, se firma por solicitud del interesado, a los catorce (14) días del mes de abril de 2023.

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN CERO (0) FOLIOS.

Elaboro: **MAAB**
Reviso: **MAGR - FGRS**
Aprobó: **ARGF - FGRS**

Bogotá, 14 de abril de 2023

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CERTIFICA QUE:

Para El Contrato De Obra No. CO1.PCCNTR.4077642 De 2022, “Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Física Para La Prestación Del Servicio Educativo”, se evidencia los correctos cerramientos realizados en obra, que han permitido la protección de las zonas verdes aledañas, además, por parte del contratista se ha verificado las gestiones que han hecho con respecto a la tala de los arboles en el colegio Francisco José de Caldas.

En constancia, se firma por solicitud del interesado, a los catorce (14) días del mes de abril de 2023.

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN CERO (0) FOLIOS.

Elaboro: MAAB
Reviso: MAGR - FGRS
Aprobó: ARGF - FGRS

Anexo 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (1)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Compactación de material mejorado en aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (2)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Excavación manual en aulas de primer piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (3)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Demolición de enchape en cuarto de refrigerios.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (4)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Disposición final de escombros a punto de acopio.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (5)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Desmonte de cubierta de cuarto de refrigerios y cooperativa.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (6)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación de malla electro soldada en aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (7)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Desmonte de cubierta en aulas de segundo piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (8)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – Instalación de perfilería y teja en aulas de segundo piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (9)



Descripción:
IED Jorge Eliecer Gaitán – fundición de vigas aéreas en cuarto de cooperativa y refrigerios.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (10)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Filos en ventanas de aulas de primer piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (11)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Compactación de subbase en aulas de primer piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (12)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Aplicación de pañete en aulas de primer piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (13)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Instalación de tubería Novafort de 8” en zanja zona parqueadero.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Sindy Puello/ Liliana Sánchez	Andrés Flechas/ Mileth Escalante	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coord. Proyectos/ Subgerente	Cargo: Profesional RUC y/o calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente
Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (14)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Instalación de geotextil tejido T1700 en oficinas de primer piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (15)



Descripción:
IED Francisco José de Caldas – Excavación manual en pasillo de primer piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (16)



Descripción:
IED Garcés Navas – Desmonte de teja y demolición de encorozado en aulas de segundo piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (17)



Descripción:
IED Garcés Navas – Desmonte de cielo raso en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (18)



Descripción:
IED Garcés Navas – Suministro de material a punto de acopio.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Sindy Puello/ Liliana Sánchez	Andrés Flechas/ Mileth Escalante	Lina Díaz/ Guillermo Narváez
Cargo: Coord. Proyectos/ Subgerente	Cargo: Profesional RUC y/o calidad	Cargo: Coordinador SSTAC/ Gerente
Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (19)



Descripción:
IED Garcés Navas – Cerramiento en teja para punto de acopio.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (20)



Descripción:
IED Garcés Navas – Aplicación de pintura sobre perfilería.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (21)



Descripción:
IED Garcés Navas – Desmonte de cubierta en bloque B.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (22)



Descripción:
IED Floridablanca – Mejoramiento de material existente en canchas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (23)



Descripción:
IED Floridablanca – Compactación de material en canchas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (24)



Descripción:
IED Floridablanca – Limpieza de cárcamos en canchas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (25)



Descripción:
IED Floridablanca – Mantenimiento de adoquín en sendero peatonal.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (26)



Descripción:
IED Floridablanca – Marcación de niveles en canchas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (27)



Descripción:
IED Miguel Antonio Caro – Mantenimiento de cubierta.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (28)



Descripción:
IED Miguel Antonio Caro – Instalación marco para caja de paso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (29)



Descripción:
IED Miguel Antonio Caro – Fundición de placa de contrapiso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (30)



Descripción:
IED Miguel Antonio Caro – Corte de placa de contrapiso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (31)



Descripción:
IED Miguel Antonio Caro – Aplicación de alistado sobre placa de contrapiso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (32)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez – Aplicación de alistado en aula de Judo.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (33)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez – Demolición de acabado en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (34)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez – Alistado de piso pasillo de aula de Judo.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (35)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez – Demolición placa de tarima en aula múltiple.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (36)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez – Demolición de placa y excavación para mejoramiento en shut de basuras.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (37)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez – Relleno en excavación de tarima.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (38)



Descripción:
IED Rafael Bernal Jiménez – Instalación de domo en bloque de aulas.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (39)



Descripción:
IED Juan del Corral – Instalación de alistado en terraza.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (40)



Descripción:
IED Juan del Corral – Trasiego de material a terraza biblioteca.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (41)



Descripción:
IED Juan del Corral – Regata en muro de terraza.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (42)



Descripción:
IED Juan del Corral – Instalación de media caña en terraza de biblioteca.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (43)



Descripción:
IED Juan del Corral – Demolición de alistado en placa de cubierta de peatonal.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023


FOTOGRAFÍA (44)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Demolición de enchape y desmonte de puertas en baño de niños secundaria.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (45)

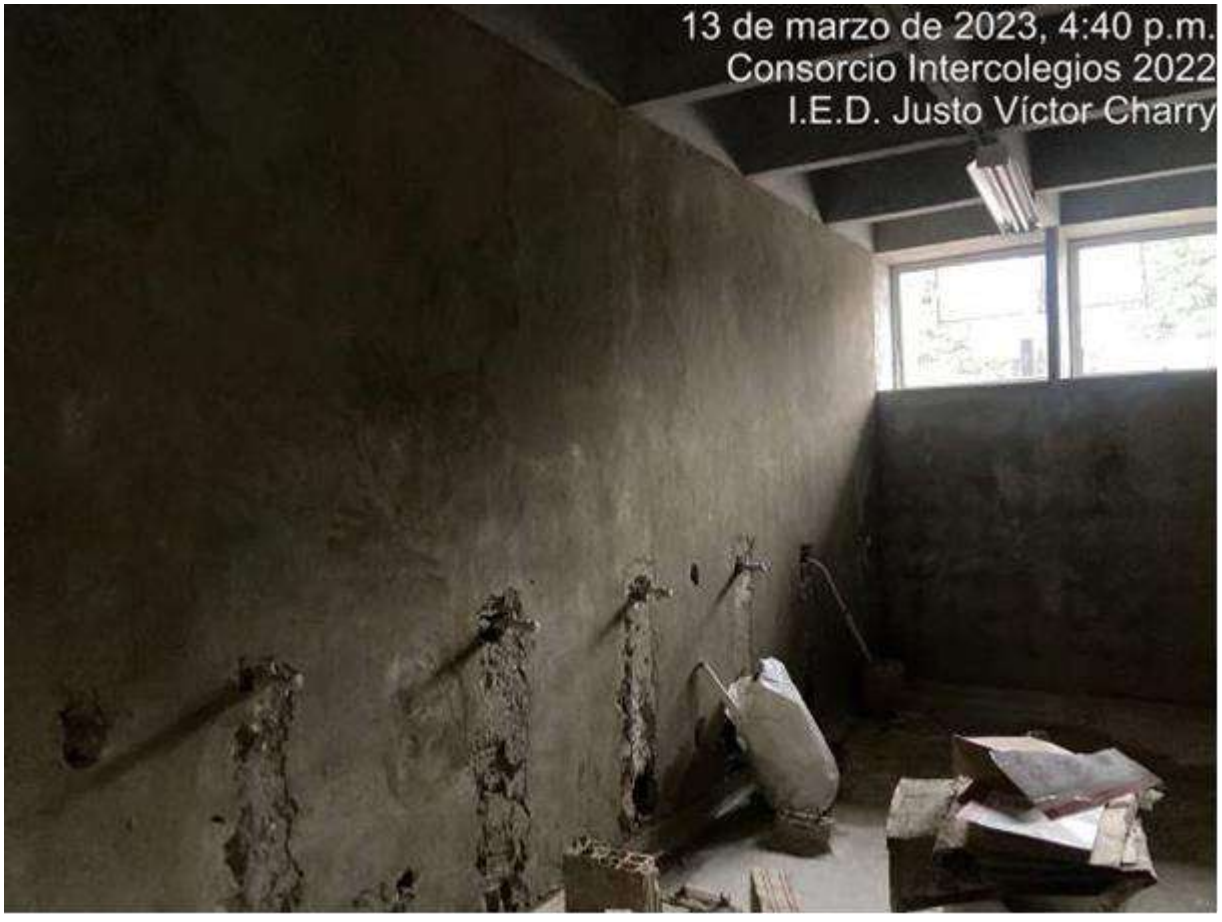

Descripción:
IED Justo Victor Charry – Demolición de enchape en baño de niños secundaria.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (46)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Desmonte de lavamanos en baño de niños secundaria.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (47)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Aplicación de estuco en parte superior de muros en baño de niños.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (48)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Demolición de mesón de lavamanos en baño de niños secundaria.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (49)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de enchape en muros de baño de niños.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (50)



Descripción:
IED Justo Victor Charry – Instalación de enchape en muros de baño de niños preescolar.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (51)



Descripción:
Comité semanal de obra / IED San José Norte.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (52)



Descripción:
Comité semanal de obra / IED Rafael Bernal Jiménez.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (53)



Descripción:
Comité semanal de obra/ IED Justo Victor Charry.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (54)



Descripción:
Emergencia – IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D – Demolición de enchape de piso.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (55)



Descripción:
Emergencia – IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D – Instalación de alistado.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (56)



Descripción:
Emergencia – IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D – Instalación de enchape.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (57)



Descripción:
Emergencia – IED Domingo Faustino Sarmiento, sede D – Mantenimiento de cubierta – Viga Canal.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (58)



Descripción:
Emergencia – IED Juan Francisco Berbeo – Visita técnica tanque de almacenamiento.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (59)



Descripción:
Emergencia – IED. Francisco José de Caldas, sede A – Instalación de cerramiento.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (60)



Descripción:
Emergencia – IED. Francisco José de Caldas, sede A – Tala de árboles.

OBJETO DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Bogotá, localidades de Engativá y Barrios Unidos.
CONTRATO DE OBRA No.:	No. CO1.PCCNTR.4077642 – 2022
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	11 de marzo a 10 de abril - 2023

FOTOGRAFÍA (61)



Descripción:
Emergencia – IED. Francisco José de Caldas, sede A – Tala de árboles.

Anexo 5. PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 18pogRFy/WaypP3gtibEHQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71475957	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.649.961-8
DIRECCIÓN	CR 49 104 B 49	**TELÉFONO**	7122685
ASEGURADO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A 44	**TELÉFONO**	3581600
BENEFICIARIO	BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CALLE 71 NO 73 A 44	**TELÉFONO**	3581600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE ECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.4146207 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 22/07/2024	190.227.747,60	542.227,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 21/01/2027	47.556.936,90	291.400,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 21/01/2024	24:00 Horas Del 21/01/2029	190.227.747,60	1.713.926,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 428.012.432,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2.547.553,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.547.553,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	484.985,07
TOTAL A PAGAR	$	3.037.538,07

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100235369	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71475957	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/12/2022	24:00 Horas Del	21/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

GRUPO 2
.
TOMADOR DE LA POLIZA CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022 CONFORMADO POR
GNG PROYECTOS SAS BIC NIT 901477828-7 (50%) Y GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS NIT 901383717-3 (50%)
-
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UN VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011. (DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100235369** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION / BOGOTA DC - SECRETARIA DE EDUCACION** , expedida por la Compañía en **27/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF
