CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
901649961

CIC_BTA_SED_050_2022_172

Bogotá, 14 de abril de 2023

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Arq. Luis Antonio Pinzón Parra
Supervisor de Contrato
Avenida El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022, "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME SEMANAL No. 13**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, el CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 remite a su dependencia el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- Informe semanal No.13 – 02 de abril de 2023 a 08 de abril de 2023.

Agradecemos la atención prestada, cualquier duda y/o inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN NUEVE (9) FOLIOS.

Elaboro: CASP
Reviso: MAGR - FGRS
Aprobó: ARGF - FGRS

Copia: P:\SECRETARIA_EDUCACION\EN_EJECUCION\CIC_SED_050_2022_COLEGIOS\CORRESPONDENCIA\OFICIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13,954,280,882.00	**Valor Inicial**	$ 951,138,738.00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	martes, 17 de enero de 2023	**Fecha aprobación**	martes, 27 de diciembre de 2022


* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	11/01/2023 - 12/07/2024	$ 2,790,856,176.40	Cumplimiento	22/12/2022 - 22/07/2024	$ 190,227,747.60
Estabilidad y Calidad de la obra	11/01/2024 - 11/01/2026	$ 2,790,856,176.40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	22/12/2022 - 21/01/2027	$ 47,556,936.90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/01/2023 - 11/101/2027	$ 1,395,428,088.20	Calidad del servicio	21/01/2024 - 21/01/2029	$ 190,227,747.60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	11/01/2023 - 11/01/2024	$ 697,714,044.10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Colegio Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	31/10/2023	$ 2,024,236,834.00	19.88%	$ 253,447,040.09	7.56%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 12.31%
1	Preliminares	25/01/2023	28/07/2023	$ 331,728,618.64	16.39%	$ 51,503,032.01	2.54%	Cerramiento en lona, demolición de pisos, muros, enchape, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto
2	Estructura	17/06/2023	12/10/2023	$ -	0.00%	$ 65,962,269.32	3.26%	Excavación manual en material común, instalación subbase y malla electro soldada
3	Mampostería	13/10/2023	18/10/2023	$ -	0.00%	$ 158,105.80	0.01%	Muro divisorio en bloque No. 4
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	24/08/2023	$ -	0.00%	$ 5,422,304.68	0.00%	Suministro e instalación de tubería hidrosanitaria y geotextil tejido T1700
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	22/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/08/2023	$ -	0.00%	$ 14,704,803.97	0.73%	Alistado de pisos en mortero
8	Mampostería	25/07/2023	4/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
9	Carpintería metálica	5/08/2023	2/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ 16,405,797.35	0.81%	$ 20,770,255.82	1.03%	Aplicación de pañete muro, incluye filos
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ 54,224,696.91	2.68%	$ 94,926,268.48	0.00%	
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	

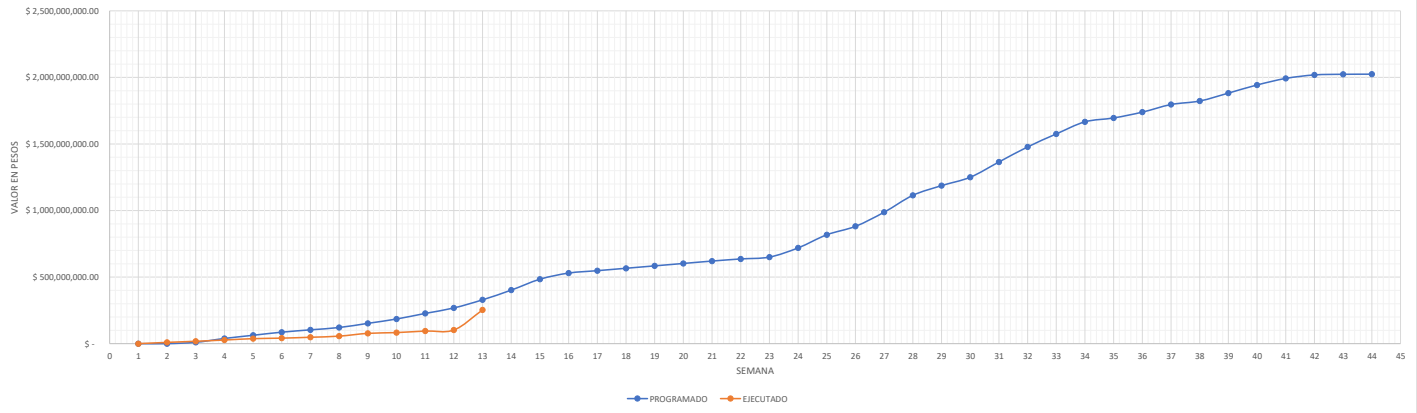


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Colegio Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1,962,546,144.54	35.11%	$ 218,920,388.41	11.15%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	23.96%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 261,371,027.77	13.32%	$ 65,100,755.42	3.32%	Cerramiento, demolición de pisos, muros, pañete, desmonte de puertas, ventanas, cieloraso, aparatos sanitarios, lámparas, salidas eléctricas, tubería eléctrica	
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ 18,631,948.37	0.95%	$ 84,683,394.15	4.31%	Excavación manual en recebo compactado y en material común, suministro e instalación de subbase B-400, suministro de estructura metálica y acero de refuerzo	
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ 26,761,784.40	1.36%	$ 990,871.49	0.05%	Resane de fisuras en muros	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ -	0.00%	$ 8,383,231.32	0.43%	Suministro e instalación de geotextil tejido 1700	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ 51,290,042.61	2.61%	$ -	0.00%		
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	$ 171,955,327.50	8.76%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ 44,632,974.90	2.27%	$ 59,762,136.04	3.05%	Pañete en muros y filos en ventanas	
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ 114,464,440.00	5.83%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

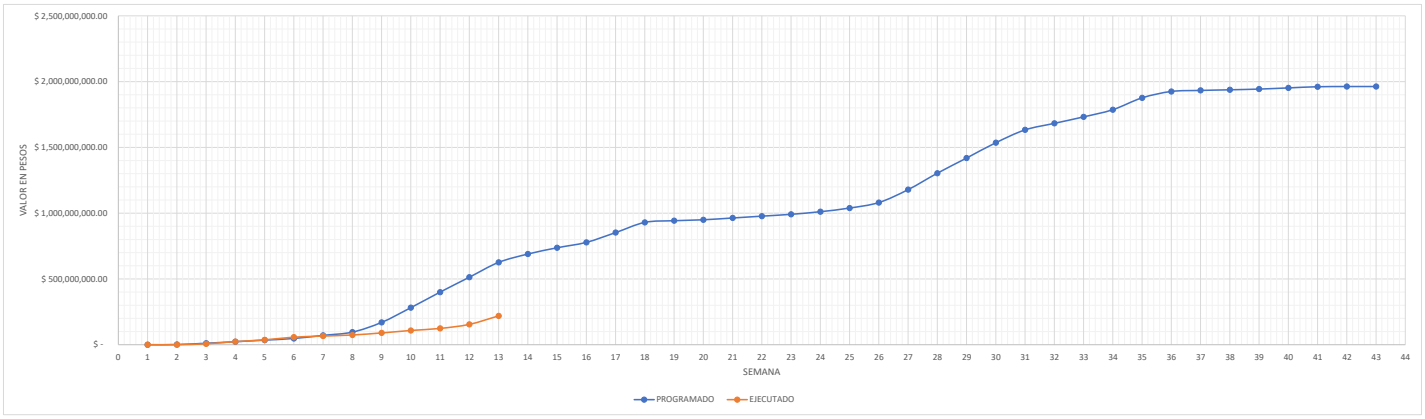

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787,083,405.50	46.99%	$ 111,347,796.98	14.15%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	32.84%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 127,904,814.93	16.25%	$ 63,108,303.36	8.02%	Pintura en carpintería metálica, desmonte de cieloraso, lámparas y cableado eléctrico	
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ -	0.00%	$ 48,239,493.62	6.13%	Suministro e instalación de estructura metálica	
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ 8,208,415.00	1.04%	$ -	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ 17,506,804.44	2.22%	$ -	0.00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ 200,683,876.50	25.50%	$ -	0.00%		
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ 15,535,519.40	1.97%	$ -	0.00%		

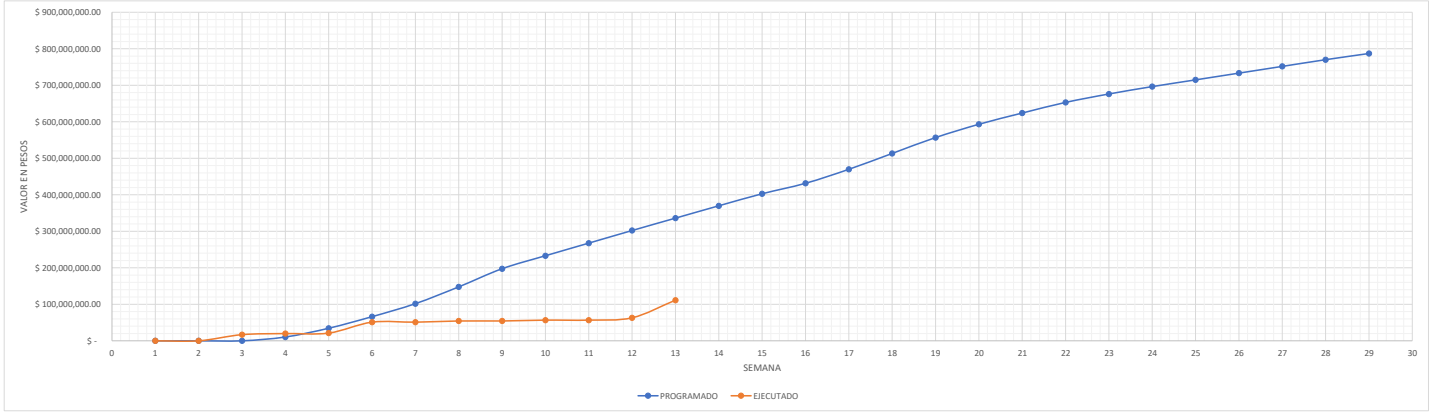


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Floridablanca		6/02/2023	31/10/2023	$ 699,153,025.00	20.46%	$ 40,952,178.66	5.86%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	14.60%
1	Preliminares	6/02/2023	17/07/2023	$ 65,790,856.99	9.41%	$ 40,952,178.66	5.86%	Cerramiento, demolición pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, limpieza y mantenimiento cárcamos.	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ 73,680,068.00	10.54%	$ -	0.00%	
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ 3,552,417.40	0.51%	$ -	0.00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	

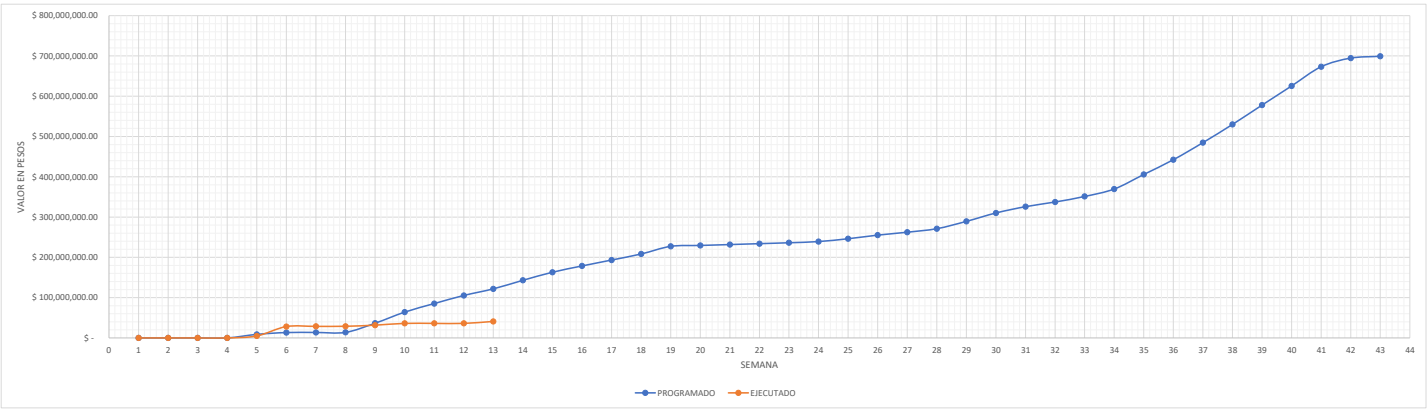

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Miguel Antonio Caro	7/02/2023	15/07/2023	$ 75,339,260.00	37.97%	$ 53,793,369.29	71.40%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-33.43%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 21,711,063.14	28.82%	$ 15,176,665.15	20.14%	Cerramiento, demolición placa.	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ -	0.00%	$ 21,060,795.56	27.95%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, instalación malla electro soldada.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ -	0.00%	$ 8,069,050.94	10.71%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4"	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ -	0.00%	$ 851,555.10	1.13%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado	
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$ 3,211,123.00	4.26%	$ 8,635,302.54	11.46%	Suministro e instalación de teja termoacustica UPVC 2mm	
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$ 3,687,824.22	4.89%	$ -	0.00%		

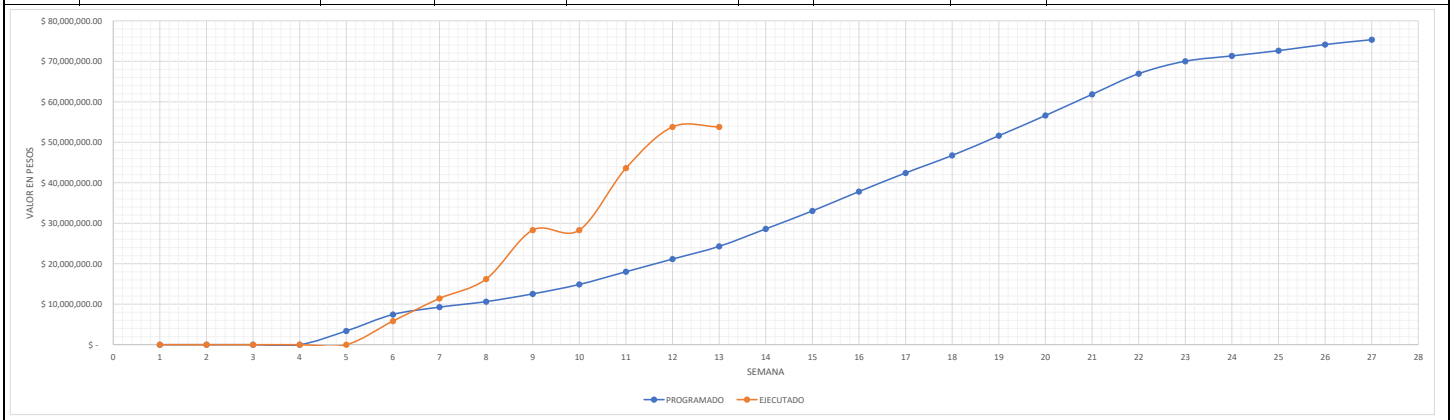


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369,424,312.00	12.09%	$ 25,114,701.14	6.80%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	5.29%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 14,545,302.06	3.94%	$ 6,556,677.69	1.77%	Cerramiento. demolición de muros, enchape, desmonte de aparatos sanitarios, puertas	
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ 21,960,041.00	5.94%	$ -	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ -	0.00%	$ 89,539.34	0.02%		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ 8,154,136.20	2.21%	$ 12,250,451.64	3.32%	Suministro e instalación de enchape cerámico
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ -	0.00%	$ 6,218,032.47	1.68%	Pañete muro incluye filos
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	

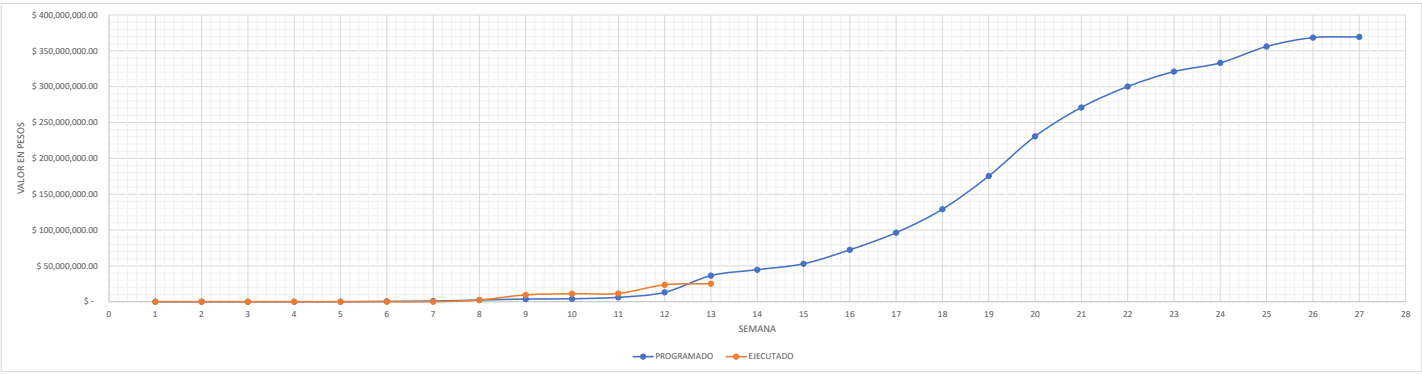

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	22/08/2023	$ 677,034,595.00	15.47%	$ 135,823,677.97	20.06%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-4.59%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$ 67,049,129.80	9.90%	$ 31,266,923.14	4.62%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso, desmonte de puertas, ventanas y cieloraso	
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ 1,017,473.71	0.15%	$ 1,917,838.85	0.28%	Excavación manual en material común	
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ 196,992.00	0.03%	$ -	0.00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ -	0.00%	$ 4,567,040.87	0.67%	Alistado de piso en mortero	
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ -	0.00%	$ 14,468,734.73	2.14%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta	
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/03/2023	$ 450,384.00	0.07%	$ -	0.00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ 35,066,768.33	5.18%	$ 83,603,140.37	12.35%	Instalación de lámina de policarbonato	
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ 950,925.65	0.14%	$ -	0.00%		

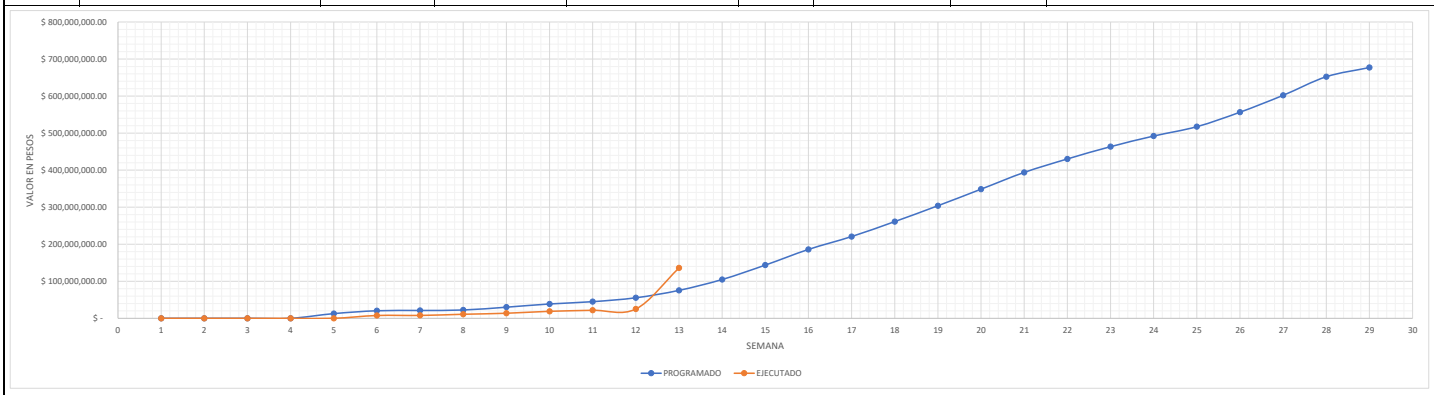


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 524,030,444.00	1.46%	$ 37,598,090.44	3.86%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-2.40%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ 6,131,529.27	1.17%	$ 20,217,879.11	3.86%	Cerramiento, retiro de tuberías, desmonte de cieloraso, lámparas y picado de membrana y placa, demolición de acabado y alistado de piso.	
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ -	0.00%	$ 1,038,507.29	0.20%	Anclajes varillas 3/8"	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ -	0.00%	$ 2,612,813.11	0.50%	Suministro e instalación de tubería	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ -	0.00%	$ 13,728,890.93	2.62%	Alistado de pisos en mortero	
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ -	0.00%	$ -	0.00%	
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ 1,517,418.30	0.29%	$ -	0.00%	

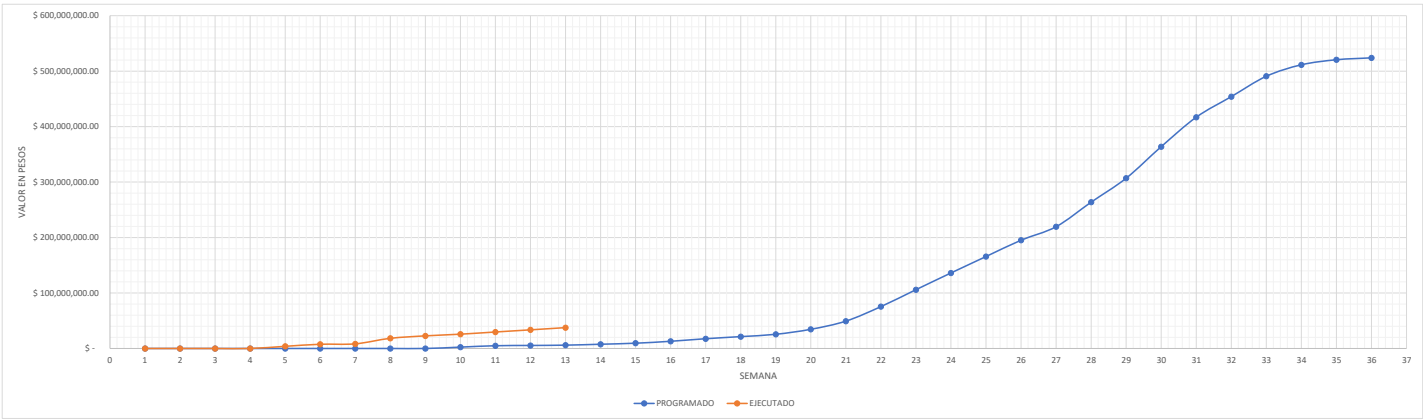

Atención de IED

Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
Colegio Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%
Colegio Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0.00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0.00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023					
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023						
Colegio Nidia Quintero de Turbay	14/02/2023	6/03/2023					
Colegio Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023						
Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	23/02/2023					
Colegio República de Panamá	22/02/2023	27/03/2023					
Colegio Domingo Faustino	8/03/2023	27/03/2023					
Dirección Local de Engativá	8/02/2023						

PROGRAMADO

No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0.00%	$ -	0.00%
2	$ 1,270,756.93	0.01%	$ 1,270,756.93	0.01%
3	$ 19,951,637.75	0.14%	$ 21,222,394.68	0.15%
4	$ 50,914,718.24	0.36%	$ 72,137,112.92	0.52%
5	$ 84,783,311.22	0.61%	$ 156,920,424.14	1.12%
6	$ 84,520,694.84	0.61%	$ 241,441,118.98	1.73%
7	$ 79,994,302.15	0.57%	$ 321,435,421.13	2.30%
8	$ 92,371,183.17	0.66%	$ 413,806,604.30	2.97%
9	$ 188,479,295.83	1.35%	$ 602,285,900.13	4.32%
10	$ 221,475,791.25	1.59%	$ 823,761,691.38	5.90%
11	$ 229,916,129.85	1.65%	$ 1,053,677,821.23	7.55%
12	$ 230,178,690.91	1.65%	$ 1,283,856,512.14	9.20%
13	$ 271,119,796.10	1.94%	$ 1,554,976,308.24	11.14%
14	$ 366,181,950.98	2.62%	$ 1,921,158,259.22	13.77%
15	$ 367,035,523.66	2.63%	$ 2,288,193,782.89	16.40%
16	$ 332,730,015.04	2.38%	$ 2,620,923,797.93	18.78%
17	$ 344,526,501.67	2.47%	$ 2,965,450,299.60	21.25%
18	$ 366,678,480.99	2.63%	$ 3,332,128,780.59	23.88%
19	$ 426,272,890.32	3.05%	$ 3,758,401,670.91	26.93%
20	$ 412,873,717.83	2.96%	$ 4,171,275,388.74	29.89%
21	$ 405,169,534.01	2.90%	$ 4,576,444,922.74	32.80%
22	$ 392,991,222.20	2.82%	$ 4,969,436,144.94	35.61%
23	$ 375,982,242.70	2.69%	$ 5,345,418,387.64	38.31%

EJECUTADO


No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0.00%	$ -	0.00%
2	$ 9,458,499.71	0.07%	$ 9,458,499.71	0.07%
3	$ 31,826,160.08	0.23%	$ 41,284,659.79	0.30%
4	$ 33,373,547.10	0.24%	$ 74,658,206.89	0.54%
5	$ 33,581,581.31	0.24%	$ 108,239,788.20	0.78%
6	$ 94,518,500.86	0.68%	$ 202,758,289.06	1.45%
7	$ 22,218,182.48	0.16%	$ 224,976,471.55	1.61%
8	$ 40,324,809.10	0.29%	$ 265,301,280.65	1.90%
9	$ 65,485,536.40	0.47%	$ 330,786,817.05	2.37%
10	$ 41,427,564.22	0.30%	$ 372,214,381.27	2.67%
11	$ 49,569,565.98	0.36%	$ 421,783,947.25	3.02%
12	$ 74,571,439.34	0.53%	$ 496,355,386.59	3.56%
13	$ 384,555,815.94	2.76%	$ 880,911,202.53	6.31%
14	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
15	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
16	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
17	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
18	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
19	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
20	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
21	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
22	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
23	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

24	$	419,622,326.39	3.01%	$	5,765,040,714.02	41.31%	24	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
25	$	465,646,255.54	3.34%	$	6,230,686,969.56	44.65%	25	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
26	$	450,087,719.92	3.23%	$	6,680,774,689.48	47.88%	26	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
27	$	536,994,706.78	3.85%	$	7,217,769,396.25	51.72%	27	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
28	$	608,167,229.41	4.36%	$	7,825,936,625.66	56.08%	28	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
29	$	526,201,038.42	3.77%	$	8,352,137,664.08	59.85%	29	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
30	$	492,479,875.17	3.53%	$	8,844,617,539.25	63.38%	30	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
31	$	515,904,096.64	3.70%	$	9,360,521,635.88	67.08%	31	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
32	$	446,416,023.11	3.20%	$	9,806,937,658.99	70.28%	32	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
33	$	432,360,273.39	3.10%	$	10,239,297,932.38	73.38%	33	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
34	$	419,606,131.94	3.01%	$	10,658,904,064.31	76.38%	34	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
35	$	399,476,655.36	2.86%	$	11,058,380,719.67	79.25%	35	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
36	$	367,282,032.37	2.63%	$	11,425,662,752.04	81.88%	36	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
37	$	342,604,162.91	2.46%	$	11,768,266,914.94	84.33%	37	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
38	$	311,411,789.16	2.23%	$	12,079,678,704.10	86.57%	38	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
39	$	347,906,818.49	2.49%	$	12,427,585,522.59	89.06%	39	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
40	$	352,630,923.00	2.53%	$	12,780,216,445.58	91.59%	40	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
41	$	340,785,854.77	2.44%	$	13,121,002,300.35	94.03%	41	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
42	$	284,197,920.80	2.04%	$	13,405,200,221.15	96.07%	42	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
43	$	140,525,720.50	1.01%	$	13,545,725,941.65	97.07%	43	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
44	$	704,475.00	0.01%	$	13,546,430,416.65	97.08%	44	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%
45	$	407,850,465.35	2.92%	$	13,954,280,882.00	100.00%	45	$ -	0.00%	$ 880,911,202.53	6.31%

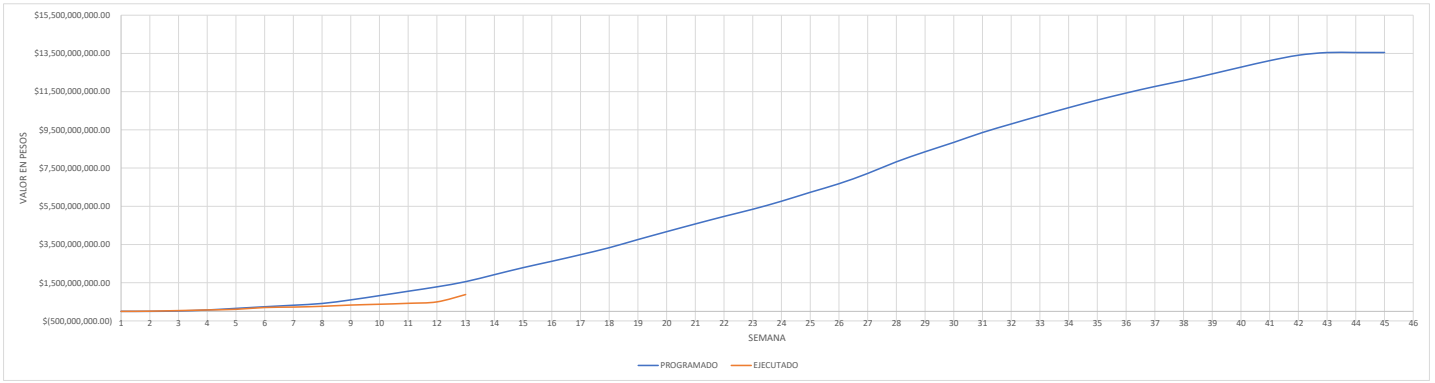

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

Aspecto Financiero

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

A la fecha del presente informe se han tramitado actas de pago No. 1 y No. 2 tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría.

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

Colegio Jorge Eliecer Gaitán



Desmonte de cubierta en aulas de segundo piso



Instalación de malla electro soldada en aulas



Instalación de perfilería y teja en aulas de segundo piso

Colegio Francisco José de Caldas, Sede A



Aplicación de pañete en muros de aulas



Instalación de geotextil en oficinas



Excavación manual en pasillo de primer piso

Colegio Garcés Navas



Instalación de cerramiento en teja para punto de acopio



Pintura sobre perfilería



Pintura sobre perfilería

Colegio Floridablanca



Marcación de niveles en canchas



Marcación de niveles en canchas



Demolición de cárcamo

Colegio Miguel Antonio Caro

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		



Aplicación de alistado



Aplicación de alistado sobre placa



Aplicación de alistado sobre placa

Colegio Juan del Corral



Instalación de alistado en terraza comedor



Demolición de alistado en placa cubierta peatonal



Instalación de alistado en terraza comedor

Colegio Rafael Bernal Jiménez



Demolición de acabado en aula múltiple



Relleno en excavación de tarima de aula múltiple



Suministro e instalación de domo en bloque de aulas

Colegio Justo Victor Charry



Instalación de enchape en baño de niños secundaria



Instalación de enchape en baño de niños secundaria



Instalación de enchape en baño de niños preescolar

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra el día 04 de abril de 2023 en instalaciones de IED Justo Victor Charry.

Aspecto PMT

N/A

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	13	**DEL**	domingo, 2 de abril de 2023	**AL**	sábado, 8 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	87	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
3/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
4/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
5/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
6/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
7/04/2023	7:00 am 5:00 pm	1
8/04/2023	7:00 am 12:00 pm	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Suministro y montaje de estructura metálica y cubierta.
• Colegio Francisco José de Caldas: Desmonte de cubierta existente, instalación acero de refuerzo, alistado de pisos en mortero, esmalte sobre cerchas y manto asfaltico impermeabilizante.
• Colegio Garcés Navas: Desmonte de cubierta, suministro y montaje de estructura metálica y cubierta y orden y aseo general.
• Colegio Floridablanca: Limpieza en cajas de inspección, obras exteriores.
• Colegio Juan del Corral: Instalación de tubería PVC alcantarillado, orden y aseo general.
• Colegio Rafael Bernal Jiménez: demolición de placa de contrapiso, desmonte de cubierta, desmonte de lámparas,
• Colegio Miguel Antonio Caro: Fundición placa de contrapiso, mantenimiento bajantes, orden y aseo.
• Colegio Justo Víctor Charry: Instalación de enchape en baños, resane de fisuras en muros.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 6,31%, con base en la programación presentada un avance general programado de 11,14%, teniendo una diferencia de 4,83% en el contrato.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 5 de 8 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.
• Con base en el atraso evidenciado, se implementa por parte de contratista de obra plan de contingencia en los frentes de obra, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.
• En atención a emergencias:
• Se realiza intervención con tala de árboles en peligro de volcamiento en zona verde de Instituto Técnico Francisco José de Caldas, a la fecha se han intervenido 4 de 7 individuos arbóreos para tala.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 25% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 27% para IED Francisco José de Caldas; 13,06% para Garcés Navas IED; 20% para IED Floridablanca; 80% para IED Miguel Antonio Caro; 15% para Justo Victor Charry; 25% para Rafael Bernal Jiménez y 18% para Juan del Corral. • Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. • Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra. •Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas.	FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
