CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022
901649961

CIC_BTA_SED_050_2022_184

Bogotá, 24 de abril de 2023

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Arq. Luis Antonio Pinzón Parra
Supervisor de Contrato
Avenida El Dorado No. 66 - 63
Bogotá D.C.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146207 DE 2022, "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME SEMANAL No.14**

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4146207 de 2022, el CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022 remite a su dependencia el siguiente documento para su conocimiento y fines pertinentes:

- Informe semanal No.14 – 09 de abril de 2023 a 15 de abril de 2023.

Agradecemos la atención prestada, cualquier duda y/o inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN NUEVE (9) FOLIOS.

Elaboro: **CASP**
Reviso: **MAGR - FGRS**
Aprobó: **ARGF - FGRS**

Copia: P:\SECRETARIA_EDUCACION\EN_EJECUCION\CIC_SED_050_2022_COLEGIOS\CORRESPONDENCIA\OFICIOS

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
Prórroga No.1	Tres (03) meses, quince (15) días.	**Prórroga No.1**	N/A
Adición No.1	$5.370.000.000,00	**Adición No.1**	N/A
Fecha Actualizada de Terminación	25 de abril de 2024	**Fecha Actualizada de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
Valor de Contrato Actualizado	$19.324.280.882,00	**Valor de Contrato Actualizado**	$ 951.138.738,00
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	miércoles, 12 de abril de 2023	**Fecha aprobación**	martes, 27 de diciembre de 2022

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	11/01/2023 - 27/10/2024	$ 3.864.856.176,40	Cumplimiento	22/12/2022 - 22/07/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	11/01/2024 - 11/01/2026	$ 3.864.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	22/12/2022 - 21/01/2027	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/01/2023 - 26/04/2027	$ 1.395.428.088,20	Calidad del servicio	21/01/2024 - 21/01/2029	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	11/01/2023 - 26/04/2024	$ 966.214.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Colegio Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	31/10/2023	$ 2.024.236.834,00	23,91%	$ 311.600.510,87	15,39%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 8,52%
1	Preliminares	25/01/2023	28/07/2023	$ 381.042.349,73	18,82%	$ 106.070.701,79	5,24%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, acabado y alistado de pisos, muros en mampostería, pañete de muros, enchape de muros, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, cubierta, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto y picado de muros en mampostería.
2	Estructura	17/06/2023	12/10/2023	$ -	0,00%	$ 65.962.269,32	3,26%	Excavación manual en material común, suministro e instalación de subbase granular B-400, placa de contrapiso de 10cm, suministro e instalación de acero de refuerzo, malla electro soldada y estructura metálica.
3	Mampostería	13/10/2023	18/10/2023	$ -	0,00%	$ 158.105,80	0,01%	Muro divisorio en bloque No. 4
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	24/08/2023	$ -	0,00%	$ 5.422.304,68	0,27%	Suministro e instalación de tubería PVCS 1-1/2", PVCP RDE 9 de 1/2", suministro e instalación de punto de agua fría sanitario y lavamanos y suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	22/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/08/2023	$ -	0,00%	$ 14.704.803,97	0,73%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero.
8	Mampostería	25/07/2023	4/08/2023	$ -	0,00%	$ 3.585.801,00	0,18%	Suministro e instalación de enchape cerámico brillante.
9	Carpintería metálica	5/08/2023	2/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ 32.811.594,70	1,62%	$ 20.770.255,82	1,03%	Aplicación de pañete muro, incluye filos
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ 70.173.137,17	3,47%	$ 94.926.268,48	4,69%	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica UPVC 2mm.
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	

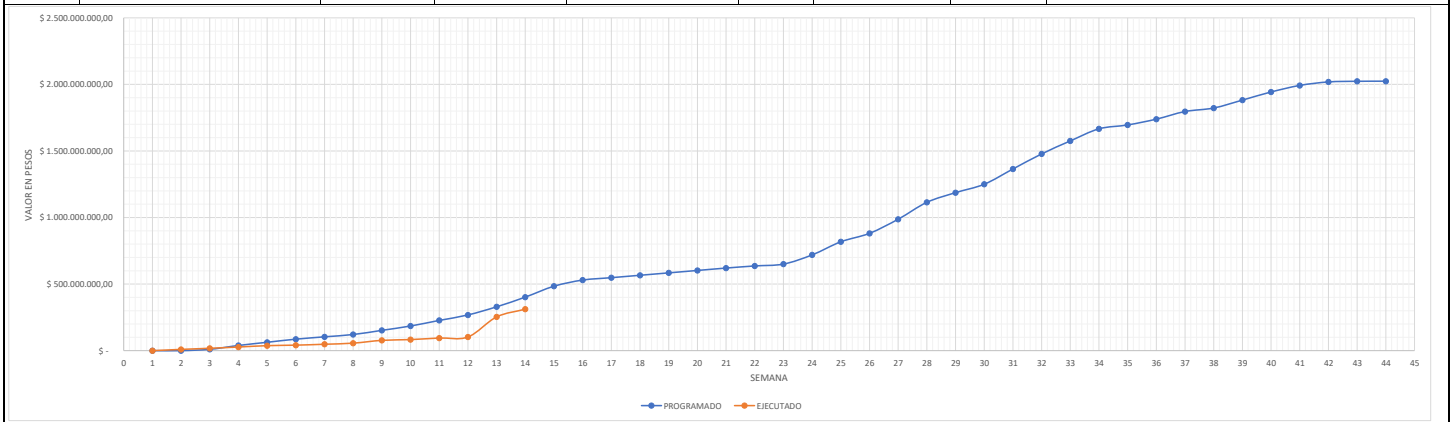


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
Colegio Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1.962.546.144,54	37,46%	$ 245.318.388,35	12,50%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 24,96%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 229.050.904,68	11,67%	$ 70.194.358,68	3,58%	Cerramiento en lona, demolición de acabado de pisos, muros, pañete, enchape de muros, encorozado de cubierta, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso, cubierta, desmonte de aparatos sanitarios, tubería hidrosanitaria existente, lámparas, salidas eléctricas y tubería eléctrica.
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ 21.737.273,10	1,11%	$ 84.683.394,15	4,31%	Excavación manual en material común y recebo compactado, suministro e instalación de subbase B-400, suministro de estructura metálica, acero de refuerzo y malla electro soldada.
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ 44.602.974,00	2,27%	$ 990.871,49	0,05%	Resane de fisuras en muros
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ 129.175,19	0,01%	$ 8.383.231,32	0,43%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", caja de inspección 1.00x1.00, suministro e instalación de geotextil tejido 1700 y sondeo y revisión de desagües.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ 57.396.000,06	2,92%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	$ 191.061.475,00	9,74%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ 56.378.494,62	2,87%	$ 59.762.136,04	3,05%	Pañete en muros y filos en ventanas
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ 134.904.518,60	6,87%	$ 21.304.396,67	1,09%	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica UPVC 2mm.
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
NP	Actividades No previstas	13/03/2023	2/09/2023	$ 1.536.739,80	0,08%	$ -	0,00%	

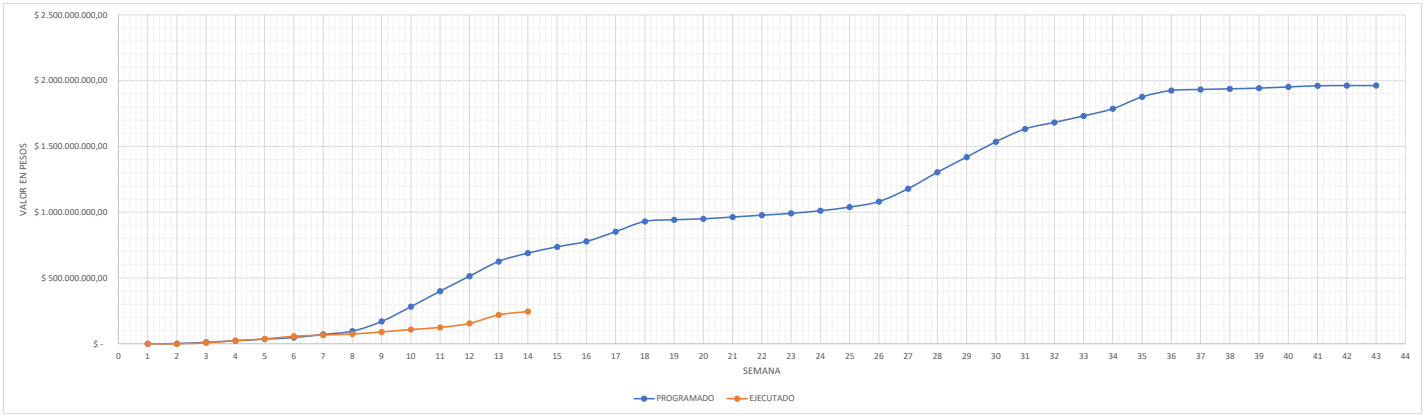

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
Colegio Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787.083.405,50	50,16%	$ 186.140.793,35	23,65%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 26,51%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 126.525.568,86	16,08%	$ 69.302.416,23	8,80%	Cerramiento en teja de zinc, desmonte de cielo raso, desmonte de lámparas y red eléctrica, retiro de manto de aluminio, mantenimiento de ventanería y puertas y limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ 6.726.020,00	0,85%	$ 116.838.377,11	14,84%	Suministro e instalación de estructura metálica.
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ 8.208.415,00	1,04%	$ -	0,00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ 20.633.019,52	2,62%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ 215.887.200,50	27,43%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ 16.852.088,89	2,14%	$ -	0,00%	
NP	Actividades no previstas	28/02/2023	16/03/2023	$ 7.998.792,50	1,02%	$ -	0,00%	

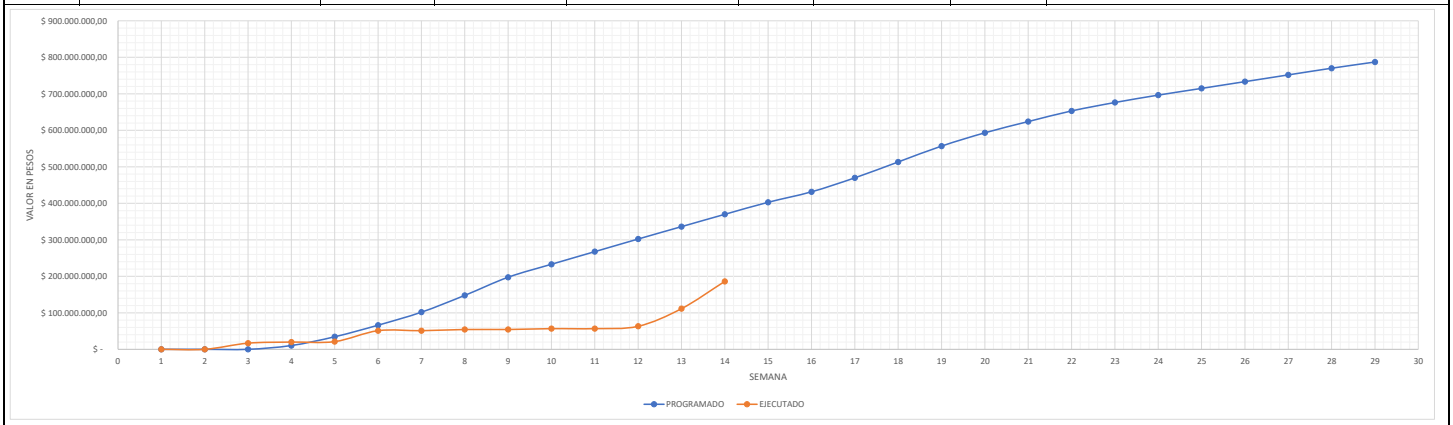


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Floridablanca	6/02/2023	31/10/2023	$ 699.153.025,00	23,32%	$ 41.165.920,53	5,89%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	17,43%
1	Preliminares	6/02/2023	17/07/2023	$ 74.743.021,53	10,69%	$ 40.952.178,66	5,86%	Localización y replanteo, cerramiento en lona, demolición pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, limpieza y mantenimiento cárcamos.	
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ 84.205.792,00	12,04%	$ 213.741,87	0,03%	Excavación manual en recebo compactado.	
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ 9.786,30	0,00%	$ -	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ 4.059.905,60	0,58%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		

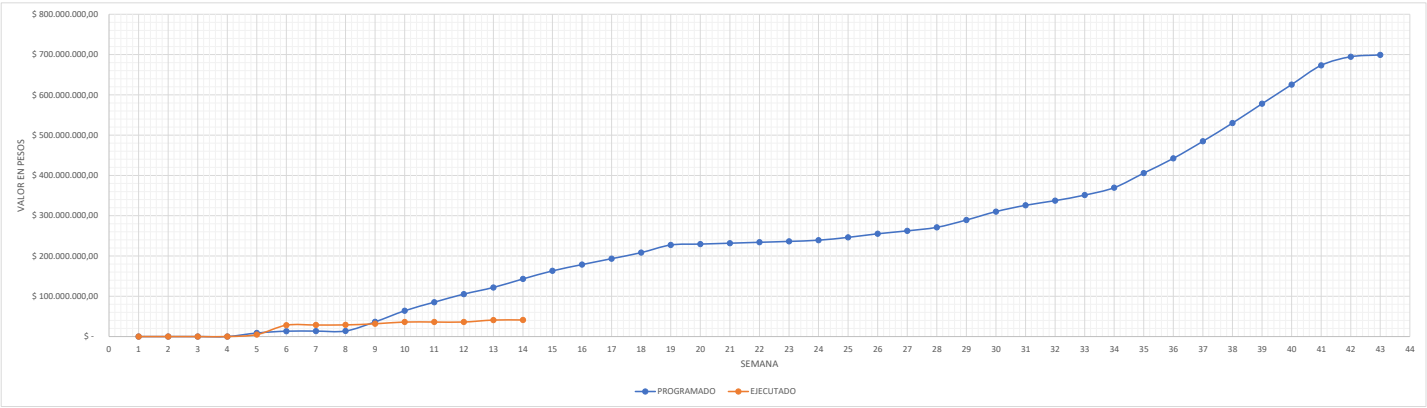

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Miguel Antonio Caro	7/02/2023	15/07/2023	$ 75.339.260,00	43,86%	$ 60.106.161,43	79,78%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-35,92%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 23.380.643,76	31,03%	$ 15.176.665,15	20,14%	Cerramiento en lona, demolición placa maciza, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ 952.113,67	1,26%	$ 21.060.795,56	27,95%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, placa de contrapiso de 10 cm, instalación malla electro soldada.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ -	0,00%	$ 8.069.050,94	10,71%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro y aplicación de pintura para tubería.	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ -	0,00%	$ 6.312.792,14	8,38%	Suministro e instalación de bala led de 18W, suministro e instalación de tubería EMT conduit 2", suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1*10T.	
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ -	0,00%	$ 851.555,10	1,13%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado	
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ 241.060,00	0,32%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$ 4.128.587,75	5,48%	$ 8.635.302,54	11,46%	Suministro e instalación de teja termo acústica UPVC 2mm	
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$ 4.338.616,73	5,76%	$ -	0,00%		

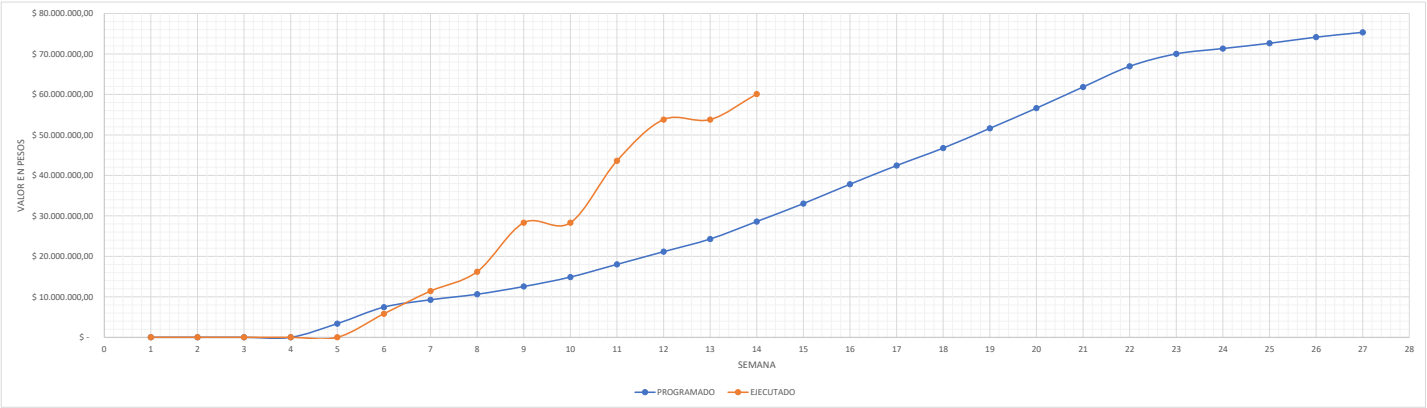


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369.424.312,00	14,32%	$ 28.197.150,47	7,63%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	6,69%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 14.545.302,06	3,94%	$ 6.556.677,69	1,77%	Cerramiento. Demolición de muros, enchape y placa, desmonte de aparatos sanitarios, puertas, baranda metálica y tubería existente y cortes y regatas en concreto para instalación de tubería.	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**		Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez	

3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ 21.960.041,00	5,94%	$ -	0,00%	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ -	0,00%	$ 89.539,34	0,02%	Instalación de wing de aluminio
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ 16.308.272,40	4,41%	$ 12.250.451,64	3,32%	Suministro e instalación de enchape cerámico
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ -	0,00%	$ 9.300.481,80	2,52%	Pañete muro incluye filos
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ 97.289,57	0,03%	$ -	0,00%	

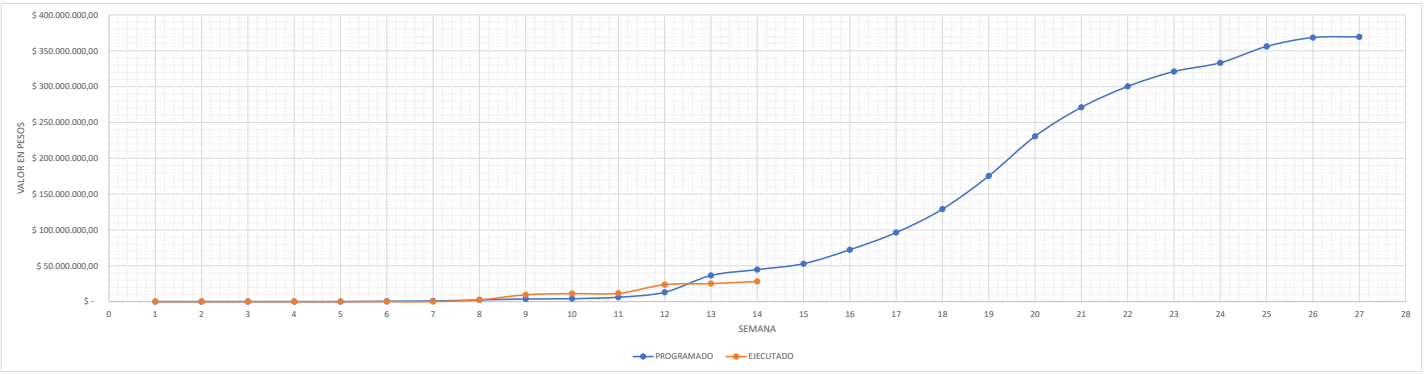

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Colegio Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	22/08/2023	$ 677.034.595,00	21,22%	$ 136.761.344,80	20,20%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 1,02%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$ 79.802.929,84	11,79%	$ 31.266.923,14	4,62%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso y placa maciza, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso y cubierta.
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ 1.017.473,71	0,15%	$ 2.993.258,13	0,44%	Excavación manual en material común, relleno en material seleccionado, placa de contra
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ 196.992,00	0,03%	$ 375.458,63	0,06%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2"
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ -	0,00%	$ 4.567.040,87	0,67%	Alistado de piso en mortero
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ 10.032.360,76	1,48%	$ 14.468.734,73	2,14%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta
16	Obras exteriores	4/03/2023	8/03/2023	$ 450.384,00	0,07%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ 50.095.383,33	7,40%	$ 83.089.929,30	12,27%	Instalación de lámina de policarbonato
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ 2.092.036,43	0,31%	$ -	0,00%	

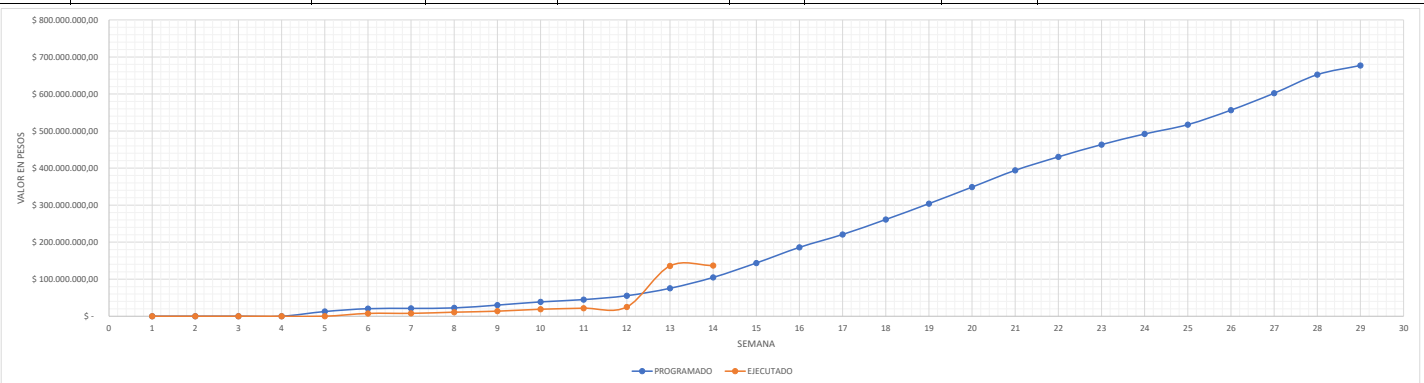


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 524.030.444,00	1,82%	$ 43.549.340,29	8,31%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** -6,49%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ 8.005.195,35	1,53%	$ 20.217.879,77	3,86%	Cerramiento, retiro de tuberías, desmonte de cielo raso, lámparas y picado de membrana y placa, demolición de acabado y alistado de piso.
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ -	0,00%	$ 1.038.507,29	0,20%	Anclajes varillas 3/8"
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ -	0,00%	$ 2.612.813,11	0,50%	Suministro e instalación de tubería 4".
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ -	0,00%	$ 19.680.140,13	3,76%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ 1.517.418,30	0,29%	$ -	0,00%	

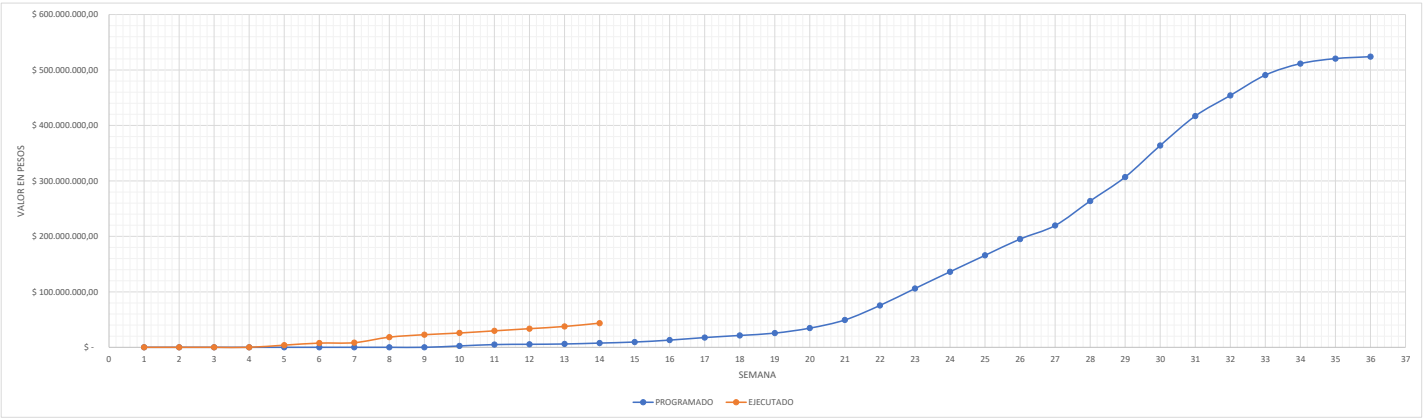

Atención de IED

Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
Colegio Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023					
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023						
Colegio Nidia Quintero de Turbay	14/02/2023	6/03/2023					
Colegio Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023						
Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	23/02/2023					
Colegio República de Panamá	22/02/2023	27/03/2023					
Colegio Domingo Faustino	8/03/2023	27/03/2023					
Dirección Local de Engativá	8/02/2023						


PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%	No.	VALOR EJECUTADO SEMANAL	%	ACUMULADO	%
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,14%	$ 21.222.394,68	0,15%	3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 50.914.718,24	0,36%	$ 72.137.112,92	0,52%	4	$ 33.373.547,10	0,24%	$ 74.658.206,89	0,54%
5	$ 84.783.311,22	0,61%	$ 156.920.424,14	1,12%	5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 108.239.788,20	0,78%
6	$ 84.520.694,84	0,61%	$ 241.441.118,98	1,73%	6	$ 94.518.500,86	0,68%	$ 202.758.289,06	1,45%
7	$ 79.994.302,15	0,57%	$ 321.435.421,13	2,30%	7	$ 22.218.182,48	0,16%	$ 224.976.471,55	1,61%
8	$ 92.371.183,17	0,66%	$ 413.806.604,30	2,97%	8	$ 40.324.809,10	0,29%	$ 265.301.280,65	1,90%
9	$ 188.479.295,83	1,35%	$ 602.285.900,13	4,32%	9	$ 65.485.536,40	0,47%	$ 330.786.817,05	2,37%
10	$ 221.475.791,25	1,59%	$ 823.761.691,38	5,90%	10	$ 41.427.564,22	0,30%	$ 372.214.381,27	2,67%
11	$ 229.916.129,85	1,65%	$ 1.053.677.821,23	7,55%	11	$ 49.569.565,98	0,36%	$ 421.783.947,25	3,02%
12	$ 230.178.690,91	1,65%	$ 1.283.856.512,14	9,20%	12	$ 74.571.439,34	0,53%	$ 496.355.386,59	3,56%
13	$ 271.119.796,10	1,94%	$ 1.554.976.308,24	11,14%	13	$ 384.555.815,94	2,76%	$ 880.911.202,53	6,31%
14	$ 366.181.950,98	2,62%	$ 1.921.158.259,22	13,77%	14	$ 175.842.367,10	1,26%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
15	$ 367.035.523,66	2,63%	$ 2.288.193.782,89	16,40%	15	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
16	$ 332.730.015,04	2,38%	$ 2.620.923.797,93	18,78%	16	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
17	$ 344.526.501,67	2,47%	$ 2.965.450.299,60	21,25%	17	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
18	$ 366.678.480,99	2,63%	$ 3.332.128.780,59	23,88%	18	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
19	$ 426.272.890,32	3,05%	$ 3.758.401.670,91	26,93%	19	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
20	$ 412.873.717,83	2,96%	$ 4.171.275.388,74	29,89%	20	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
21	$ 405.169.534,01	2,90%	$ 4.576.444.922,74	32,80%	21	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

22	$ 392.991.222,20	2,82%	$ 4.969.436.144,94	35,61%	22	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
23	$ 375.982.242,70	2,69%	$ 5.345.418.387,64	38,31%	23	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
24	$ 419.622.326,39	3,01%	$ 5.765.040.714,02	41,31%	24	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
25	$ 465.646.255,54	3,34%	$ 6.230.686.969,56	44,65%	25	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
26	$ 450.087.719,92	3,23%	$ 6.680.774.689,48	47,88%	26	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
27	$ 536.994.706,78	3,85%	$ 7.217.769.396,25	51,72%	27	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
28	$ 608.167.229,41	4,36%	$ 7.825.936.625,66	56,08%	28	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
29	$ 526.201.038,42	3,77%	$ 8.352.137.664,08	59,85%	29	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
30	$ 492.479.875,17	3,53%	$ 8.844.617.539,25	63,38%	30	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
31	$ 515.904.096,64	3,70%	$ 9.360.521.635,88	67,08%	31	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
32	$ 446.416.023,11	3,20%	$ 9.806.937.658,99	70,28%	32	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
33	$ 432.360.273,39	3,10%	$ 10.239.297.932,38	73,38%	33	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
34	$ 419.606.131,94	3,01%	$ 10.658.904.064,31	76,38%	34	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
35	$ 399.476.655,36	2,86%	$ 11.058.380.719,67	79,25%	35	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
36	$ 367.282.032,37	2,63%	$ 11.425.662.752,04	81,88%	36	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
37	$ 342.604.162,91	2,46%	$ 11.768.266.914,94	84,33%	37	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
38	$ 311.411.789,16	2,23%	$ 12.079.678.704,10	86,57%	38	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
39	$ 347.906.818,49	2,49%	$ 12.427.585.522,59	89,06%	39	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
40	$ 352.630.923,00	2,53%	$ 12.780.216.445,58	91,59%	40	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
41	$ 340.785.854,77	2,44%	$ 13.121.002.300,35	94,03%	41	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
42	$ 284.197.920,80	2,04%	$ 13.405.200.221,15	96,07%	42	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
43	$ 140.525.720,50	1,01%	$ 13.545.725.941,65	97,07%	43	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
44	$ 704.475,00	0,01%	$ 13.546.430.416,65	97,08%	44	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
45	$ 407.850.465,35	2,92%	$ 13.954.280.882,00	100,00%	45	$ -	0,00%	$ 1.056.753.569,63	7,57%

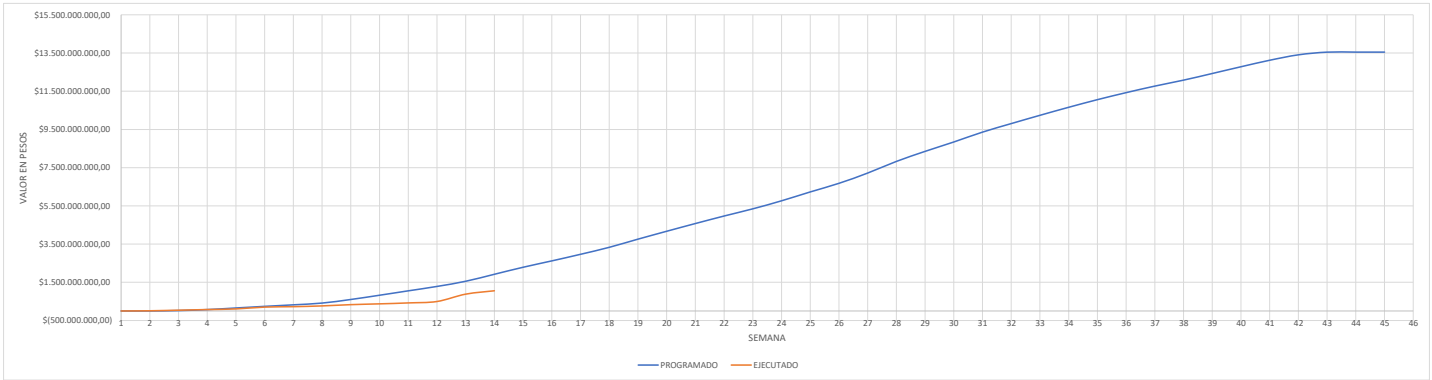

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

El día 05 de abril de 2023 se realizó aprobación de Modificatorio No.1 Adición y Prórroga de Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe se han tramitado actas de pago No. 1 y No. 2 tanto en el contrato de obra como en el contrato de interventoría.

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

Colegio Jorge Eliecer Gaitán



Fundición de placa de contrapiso en aulas.



Instalación de cubierta en aulas de segundo piso.



Aplicación de pañete en cuarto de refrigerios y cooperativa.

Colegio Francisco José de Caldas, Sede A



Desmonte de cubierta.



Compactación de subbase en pasillo de primer piso.




Aplicación de pintura en perfilería.

Colegio Garcés Navas



Aplicación de pintura en perfilería.

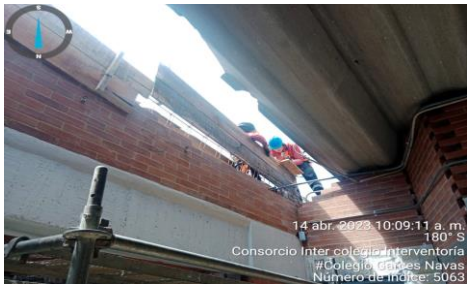

Armado de formaleta para vigas de confinamiento.



Desmonte de cubierta.

Colegio Floridablanca



Demolición de cárcamo central en canchas.



Nivelación de material en canchas.



Excavación manual para viga de cimentación.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Colegio Miguel Antonio Caro



Nivelación de caja de paso.



Verificación de niveles en placa de contrapiso.



Fundición de cuneta en zona de canchas.

Colegio Juan del Corral



Instalación de alistado en cubierta de peatonal.



Lavado de muros en terraza de biblioteca.



Trasiego de escombros a punto de acopio.

Colegio Rafael Bernal Jiménez



.Instalación de tubería sanitaria en shut de basuras



Relleno en tarima de aula múltiple.



Fundida de piso en shut de basuras.

Colegio Justo Víctor Charry



Aplicación de pintura epóxica en muros de baños de niños.



Aplicación de pintura epóxica en placa de techo.



Aplicación de pintura epóxica en muros de baño de niños .

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra el día 13 de abril de 2023 en instalaciones de IED Miguel Antonio Caro.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	14	**DEL**	domingo, 9 de abril de 2023	**AL**	sábado, 15 de abril de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	94	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Aspecto PMT


N/A

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
10/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
11/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
12/04/2023	7:00 am 5:00 pm	2
13/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
14/04/2023	7:00 am 5:00 pm	0
15/04/2023	7:00 am 12:00 pm	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Suministro y montaje de estructura metálica y cubierta, esmalte sobre cerchas.
• Colegio Francisco José de Caldas: Relleno en recebo común compactado, concreto corriente en grava común de 3000 PSI, caja de inspección de 1.00x1.00, sondeo y revisión de desagües, desmonte de cubierta existente, instalación acero de refuerzo, alistado de pisos en mortero, suministro e instalación de enchape, suministro e instalación de puerta metálica y ventana en aluminio, cubiertas e impermeabilizaciones, aseo y disposición final.
• Colegio Garcés Navas: Limpieza de canales y bajantes, suministro e instalación de viga cinta de confinamiento en concreto de 3000 PSI, , suministro y montaje de estructura metálica y cubierta y orden y aseo general.
• Colegio Floridablanca: Placa de contrapiso de 15 cm - concreto de 3000PSI, limpieza de cajas de inspección.
• Colegio Juan del Corral: Instalación de tubería PVC alcantarillado, orden y aseo general.
• Colegio Rafael Bernal Jiménez: demolición de placa de contrapiso, desmonte de cubierta, desmonte de lámparas,
• Colegio Miguel Antonio Caro: Desmonte y retiro de tuberías existentes, desmonte de cubierta, limpieza de canales y bajantes, instalación de canal existente, orden y aseo.
• Colegio Justo Víctor Charry: Suministro e instalación de enchape cerámico, aseo general y limpieza.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 7,57%, con base en la programación presentada un avance general programado de 13,77%, teniendo una diferencia de 6,19% en el contrato.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 6 de 8 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.
• Con base en el atraso evidenciado, se implementa por parte de contratista de obra plan de contingencia en los frentes de obra, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos.
En atención a emergencias:

• Se realiza intervención con tala de árboles en peligro de volcamiento en zona verde de Instituto Técnico Francisco José de Caldas, a la fecha se han intervenido 6 de 7 individuos arbóreos para tala.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 32,67% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 27% para IED Francisco José de Caldas; 30% para Garcés Navas IED; 22% para IED Floridablanca; 85% para IED Miguel Antonio Caro; 18% para Justo Víctor Charry; 17,40% para Rafael Bernal Jiménez y 18% para Juan del Corral. • Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. • Se vienen adelantando visitas a las sedes de los colegios incluidos en otrosí modificatorio del contrato de obra, conforme a la firma de adición y prórroga de contrato de obra CO1.PCCNTR.4077642 – 2022. • Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra. •Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas. •Consorcio Intercolegios 2022 se encuentra pendiente de los trámites de adición y prórroga de contrato de interventoría, con base a la información radicada a la entidad contratante.	FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
