| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C. |
| Unidad Contratante: | DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA |
| Contrato No. | PN DIRAF No. 06 – 3 – 10086 - 22 |
| Fecha suscripción contrato: | 26/05/2022 |
| Objeto del contrato: | "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" |
| Lugar de ejecución de la obra: | Lote Trapichito Nuevo 3 – Kilometro 3 via al sur. |
| Constancia de recibo No. | 5 |
| Contratista: | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE |
| NIT del contratista: | 79.508.558 – 7 |
| Fecha del acta de inicio: | 18/10/2022 |
| Plazo de ejecución: | **Contrato principal:** El plazo de ejecución para la "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", se estima en 6.5 meses, previa aprobación de la garantía única.<br><br>**Con prorroga N°1**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de consultoría PN DIRAF No.06-3-10086-22, por ciento cincuenta (150) días calendario, es decir, hasta el 19 de mayo de 2023.<br><br>**Con prorroga N°2**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de consultoría PN DIRAF No.06-3-10086-22, por ciento cuarenta (140) días calendario, es decir, hasta el 06 de octubre de 2023. |
| Nombre del Interventor del contrato: | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE<br>Interventor contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22. |
| Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña: | MY. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO<br>Supervisor Contrato de consultoría<br>PN DIRAF No. 06-3-10086-22<br>Analista de Seguimiento Proyectos DIRAF |
| Valor del contrato: | Contrato Principal: $ 443.997.728,00 Incluido IVA. |
| Adición No. | N/A |
| Fecha de Suspensión del contrato: | N/A |

Olimpia cedente cesionario acta de ejecución plan de pagos factura

| | |
|---|---|
| Fecha de Reiniciación: | N/A |
| Valor total del contrato: | $ 443.997.728,00 Incluido IVA. |
| Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato: | Entrega parcial SI _X_ Entrega Total: Si____ |
| Periodo de entrega certificado: | Período certificado: Del 24/04/2023 al 28/05/2023 — Acta de corte *: N°5 |
| Forma de Pago: | La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:<br><br>PAGOS PARCIALES:<br>Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben Corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.<br><br>Para cada uno de los pagos parciales, se realizará dentro de los (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno a a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).<br><br>• Factura de venta.<br>• Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.<br><br>Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.<br>Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por Inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al Derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).<br>Los pagos se harán a la siguiente cuenta:<br><br>Nota: Es claro que el valor del contrato de interventoría y su pago, se realizara bajo objetivo ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecución del contrato de obra en el desarrollo de los ítems con su valor contractual, por tal motivo la única forma de realizar una adición presupuestal al contrato de interventoría será siempre y cuando se realiza alguna adición presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecución, para la realización de las actividades contempladas en la adición.<br><br>Los pagos se harán a la siguiente cuenta:<br><br>NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE<br>NIT. 79.598.558<br>ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA<br>NUMERO DE CUENTA: 10543708998<br>TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS |

| | |
|---|---|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2022). | Principal: R.P. 243422 del 20/01/2023 |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRAF | 11 | INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | $ 38.340.927,74 | $ 38.340.927,74 | $0 | $ 38.340.927,74 |

| | |
|---|---|
| Observaciones: | N/A. |

| | |
|---|---|
| Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado. | Acumulado anterior: $ 119.227.132,40<br>Avance parcial recibido: $ 38.340.927,74<br>Total, Acumulado $ 157.568.060,14 |
| Acta de avance parcial o acta final de obra. | Acta de avance parcial de obra Nro. 5 radicada el 29/05/2023 (SECOP II el 30/05/2023). |
| Memorias de cálculo. | Memorias de cantidades del contrato de obra adjuntas al acta de obra Nro.5 del 29/05/2023 (SECOP II el 30/05/2023). |
| En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra: | N/A |
| En el presente corte se presentaron ítems no previstos: | N/A. |
| Documentos requeridos para el trámite de pago: | • Factura de venta (SECOP II el 30/05/2023)<br>• Certificación de pagos parafiscales y seguridad social (SECOP II el 30/05/2023)<br>Los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, ahora Dirección Logística y Financiera (SECOP II el 30/05/2023). |
| Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados: | N/A. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__. | N/A. |

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| pago por el control y supervisión de las actividades descritas en el corte de obra Nro. 5 | $ 38.340.927,74 | El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato. |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| CVN1-2050 | 29/05/2023 | $ 38.340.927,74 | $0,00 | $ 38.340.927,74 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 38.340.927,74 | $0,00 | $ 38.340.927,74 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato en mención, toda vez que el Contratista de interventoría – CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05 y las memorias de cantidades ejecutadas en el periodo de corte comprendido entre el 24/04/2023 al 28/05/2023; donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción y la interventoría efectuó el seguimiento y control adecuado, por lo anterior se considera viable continuar con el reconocimiento del corte 5, toda vez que el interventor cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA y con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de interventoría, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

Lo anterior basado en el principio de eficiencia administrativa y optimización del talento humano.

**NOTA 2:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
Interventor

Mayor **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10086-22
Grupo Seguimiento Proyectos – DIRAF

Bogotá D.C, 29 de Mayo de 2023

Señores:
**POLICIA NACIONAL**
Dirección Administrativa y Financiera
Dir. Carrera 59 No.26-21 Piso 2 CAM
Bogotá D.C., Colombi

CVN-06-3-10086-2022-78

Ref., Contrato de obra **No. 06-6-10178-22 "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".** y Contrato de interventoría No. **06-3-10086-22 "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

**Asunto:** Radicación de corte de obra N°5.

Cordial Saludo.

Mediante el presente CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE en calidad de interventor del contrato de obra en referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de interventoría también en referencia, hace entrega de los documentos del acta parcial N°5 con los respectivos anexos actualizados, según los requerimientos de la Supervisión de la DIRAF, la cual corresponde al corte de obra que va desde el 24 de abril de 2023 hasta el 28 mayo del 2023.

- ACTA PARCIAL No5
- MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES
- INFORME EJECUTIVO DE OBRA
- CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
- FACTURA ELECTRONICA

Dirección: Calle 52 A No. 14-17, Montería – Córdoba
Telefax: (4) 7846589, Celular: 310 654 1925
E – mail: contratoscvn@gmail.com

- AUTORIZACION DE FACTURACION
- CERTIFICACION BANCARIA
- NIT DEL CONTRATISTA
- COMPROBANTE DE PAGO FIC
- CERTIFICADO REVISOR FISCAL DE PAGO PARAFISCALES

Atentamente,

**CARLOS VERGARA NEGRETE**
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
C. Copia GUSTAVO ADOLFO QUIROS

Supervisor.

"interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1- b del comando de policía metropolitana de Neiva y departamento de policía de Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste".

# FACTURA ELECTRÓNICA CVN1-2050

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2aa1e6dc92516ee8389bd936bb64c4144c9f686c81b81989fd2ce005dc9448e4d38036ecc847620982498e2ada9ce282

Número de Factura: CVN1-2050
Fecha de Emisión: 29/05/2023
Fecha de Vencimiento: 28/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
Nombre Comercial: VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
Nit del Emisor: 79508558
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE
Teléfono / Móvil: 6047846589
Correo: CONTRATOSCVN@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141397
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: KR 59 26 - 21
Teléfono / Móvil: 6015159681
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 713100004 | Servicios de consultoría en ingeniería y construcción | 94 | 1,00 | $ 32.219.267,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.121.660,73 | 19.00 | | | $ 32.219.267,01 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$16-01-01-000;06-3-10086-22;gustavo.quiroz@correo.policia.gov.co#$

Cobro de Acta Parcial No. 5 del Contrato de Interventoría No. 06-3-10086-22 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-05-29 17:14:19**
**Documento generado el: 2023-05-29 17:14:18**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 32.219.267,01 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 32.219.267,01 |
| IVA | | 6.121.660,73 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 6.121.660,73 |
| **Total neto factura (=)** | | 38.340.927,74 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 38.340.927,74 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764048674078 Rango desde: 2046 Rango hasta: 2100 Vigencia: 2023-11-08

"interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1- b del comando de policía metropolitana de Neiva y departamento de policía de Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste".

# CERTIFICADO DE FACTURACIÓN

Bogotá D.C, 29 de mayo de 2023

**Señores**
Policía Nacional – Dirección Logística y Financiera.
Carrera 59 No 26 – 21
Bogotá Dirección general de la Policía Nacional

Ref., **Contrato de interventoría No. 06-3-10086-22– "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"**

**Asunto:** Anexo factura CVN1-2050

Cordial saludo,

De acuerdo al acta parcial de obra No.5 con corte de fecha (28) de mayo de 2023 y EL informe mensual de interventoría N°6 correspondientes al mes de abril de 2023, donde se reportan las actividades ejecutadas, las cuales son facturadas a través de factura electrónica CVN1-2050 por un valor de $ 38.340.927,74) TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L. valor correspondiente al porcentaje del 8,63538827412515% del valor del acta de obra N°5 por valor de $ 602.283.091,51. cobrado por el contratista de obra consorcio PONAL LYM.

Los valores se detallan a continuación.

| **VALOR COBRADO ACTA DE OBRA N°5** | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO DE OBRA | $ 6.974.591.904,74 |
| VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA N°5 | $ 602.283.091,51 |
| PORCENTAJE COBRADO | 8,63538827412515% |
| **VALORES ACTA N°5 DE INTERVENTORIA.** | |
| VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | $ 443.997.728,00 |
| VALOR DEL PRESENTE CORTE DE ACUIERDO AL PORCENTAJE COBRADO POR EL CONTRATISTA | $ 38.340.927,74 |
| PORCENTAJE COBRADO | 8,63538827412515% |
| SUBTOTAL | $ 32.219.267,01 |

| | |
|---|---|
| IVA 19% | $ 6.121.660,73 |
| **TOTAL, FACTURADO ACTA N°5** | **$ 38.340.927,74** |

Atentamente,

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.

"interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1- b del comando de policía metropolitana de Neiva y departamento de policía de Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste".

# CERTIFICADO DE APORTES Y DOCUMENTOS DEL CONTADOR

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES**

Montería,29 de mayo del2023

Señores:
**POLICIA NACIONAL — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**Ref.:** Contrato de Interventoría No 06-3-10086-22 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Respetados Señores.

Yo, **JAIRO ALBERTO ARGEL MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No 1.063.151.436 de Lorica y tarjeta profesional No. 246221-T en calidad de Contador Público, certifico que la persona natural **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**, identificado con C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C. ha cumplido y se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

**JAIRO ARGEL MARTINEZ**
C.C. 1.063.151.436 de Lorica
T.P. **246221-T**
Contador Público

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.
Contratista

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.063.151.436**

**ARGEL MARTINEZ**

APELLIDOS

**JAIRO ALBERTO**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-SEP-1989**

**LORICA**
**(CORDOBA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75** **O-** **M**


ESTATURA G.S. RH SEXO

**26-NOV-2007 LORICA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1302200-00849191-M-1063151436-20160915 0051179060A 1 7514049363



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


246221-T

JAIRO ALBERTO
ARGEL MARTINEZ
C.C. 1053151436
RES. INSCRIPCION 701 DEL 17/08/2018
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

253614 2743151

---



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 4 C F 4 6 2 7 2 0 3 F 1 A B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIRO ALBERTO ARGEL MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1063151436 de LORICA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 246221-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

"interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1- b del comando de policía metropolitana de Neiva y departamento de policía de Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste".

# RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048674078

(415)7707212489984(8020) 018764048674078 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 9 5 0 8 5 5 8 | 7 | VERGARA | NEGRETE | CARLOS | ARTURO |

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería — Cód. 1 2

24. Dirección
CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Córdoba | Montería |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-05-08 / 09:38:03 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79508558 1004. DV 7
1005. Cod. Representación
1006. Organización VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-05-08/09:38:03

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

1876



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048674078

(415)7707212489984(8020) 001876404867407 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 79508558 | 7 | VERGARA | NEGRETE | CARLOS | ARTURO |

11. Razón social

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE CL 52 A 1417 BRR MONTEVERDE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | CVN1 | 2,046 | 2,100 | 6 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7223489
## DESDE MAYO 2023 HASTA MAYO 2023

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900437731 |
| NOMBRE Ó (RAZÓN SOCIAL: | | | COYOTIBAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | AV CRA 70 NO. 65 A - 71 OF 106 | TELÉFONO: | 5492840 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 250 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS DEL COTIZANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 7223489 |
| APELLIDOS: | MARTINEZ CELY | NOMBRES: | JUAN CARLOS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

PLANILLA No: **75815411159** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: abril - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo - 2023 | FECHA DE PAGO: 11/05/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: ÚNICO

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | IRO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00000 | $ 250.000 | EPS001-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.650.000 | $ 64.000 | $ 0 | $ 64.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 1.650.000 | | $ 171.600 | 30 | $ 1.650.000 | CCF21-CAFAM | $ 64.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 495.400** |

Entregado por:

Recibido por:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5107680
## DESDE ABRIL 2023 HASTA MAYO 2023

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | | 901459068 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | JVM INGENIERIA S.A.S, BIC |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA DEPARTAMENTO: | | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 52A NO.14-17 TELÉFONO: | | 7841521 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: | | Construcción de edificios no residenciales. |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | | 5107680 |
| APELLIDOS: | PADILLA DE LA PEÑA NOMBRES: | | JOSÉ SEBASTIAN |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: | | ATLANTICO |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND SUSTPO COTIZANTE: | | REQ/UMP PENS |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 78611317070 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | abril - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | mayo - 2023 | FECHA DE PAGO: | 12/05/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1,160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1,160,000 | | $ 69,600 | 30 | $ 1,160,000 | COF06-COMBARRANQUILLA | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 173.600 |
|---|---|

| PLANILLA No: | 78780355579 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | marzo - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | abril - 2023 | FECHA DE PAGO: | 18/04/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1,160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1,160,000 | | $ 69,600 | 30 | $ 1,160,000 | COF06-COMBARRANQUILLA | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 173.600 |
|---|---|

Entregado por:

Recibido por:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1067404725
## DESDE ABRIL 2023 HASTA MAYO 2023

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 78598556 | TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1067404725 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ARTURO | APELLIDOS: | CARDENAS BENITEZ | NOMBRES: | DIDRA CARLETH |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | MONTERIA DEPARTAMENTO: | CORDOBA | CIUDAD/MUNICIPIO: | | MONTERIA DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | KR 92 A NO 14 17 BR MONTE VERDE | TELÉFONO: | 7846983 | TIPO COTIZANTE: | | DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: | |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE | COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | | NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO EMPRESA: | | PRIMARIA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales, | TIPO DE SALARIO: | | FIJO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI | COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

PLANILLA No: **78613568556** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: abril - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo - 2023 | FECHA DE PAGO: 12/05/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1.250.000 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.250.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 200.000 | EPS365-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.250.000 | $ 50.000 | $ 0 | $ 50.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.250.000 | 79598556 | $ 87.000 | 30 | $ 1.250.000 | CCF16-COMFACOR | $ 50.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 387.000**

PLANILLA No: **78781101741** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: marzo - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: abril - 2023 | FECHA DE PAGO: 10/31/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1.250.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.250.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 200.000 | EPS337-NUEVA EPS | 30 | $ 1.250.000 | $ 50.000 | $ 0 | $ 50.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.250.000 | 79598556 | $ 87.000 | 30 | $ 1.250.000 | CCF16-COMFACOR | $ 50.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 387.000**

Entregado por:

Recibido por:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 10966065
## DESDE ABRIL 2023 HASTA MAYO 2023

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 78906555 | TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 10966065 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ARTURO | APELLIDOS: | OVIEDO MARTINEZ | NOMBRES: | DIEGO ALEJANDRO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA | CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | KR 52 A NO 14 17 DR MONTE VERDE | TELÉFONO: | 7846589 | TIPO COTIZANTE: | | DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: | |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE | COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | | NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales, | TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | m | COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

PLANILLA No: **78813568556** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: abril - 2023 | PERIODO COTIZACION SALUD: mayo - 2023 | FECHA DE PAGO: 12/05/2023 | FORMA DE PRESENTACION APORTANTE: UNICO

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1,160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1,160,000 | $ 139,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139,200 | 5037-NUEVA EPS | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1,160,000 | 78505555 | $ 69,600 | 30 | $ 1,160,000 | CCF16-COMFACOR | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 359.200**

PLANILLA No: **78781011741** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: marzo - 2023 | PERIODO COTIZACION SALUD: abril - 2023 | FECHA DE PAGO: 10/04/2023 | FORMA DE PRESENTACION APORTANTE: UNICO

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADREG | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1,160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1,160,000 | $ 139,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139,200 | 50037-NUEVA EPS | 30 | $ 1,160,000 | $ 46,400 | $ 0 | $ 46,400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1,160,000 | 78505555 | $ 69,600 | 30 | $ 1,160,000 | CCF16-COMFACOR | $ 46,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 359.200**

Entregado por: _____

Recibido por: _____

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 45561087
## DESDE ABRIL 2023 HASTA MAYO 2023

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 78561356556 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ARTURO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE | TELEFONO: | 7845849 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS DEL COTIZANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 45561087 |
| APELLIDOS: | CONTRERAS SUAREZ | NOMBRES: | CARMEN CECILIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 78561356556 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | abril - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | mayo - 2023 | FECHA DE PAGO: | 12/05/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | INC | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CON | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1.000.000 | 03 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 1 | $ 50.000 | $ 8.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 8.000 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 50.000 | $ 2.000 | $ 0 | $ 2.000 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 50.000 | 79598558 | $ 3.500 | 1 | $ 50.000 | CCF15-COMFACOR | $ 2.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| $ 1.000.000 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 14 | $ 700.000 | $ 112.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 112.000 | EPS037-NUEVA EPS | 14 | $ 700.000 | $ 28.000 | $ 0 | $ 28.000 | 14-11 - ARL SURA | 14 | $ 700.000 | 79598558 | $ 49.000 | 14 | $ 700.000 | CCF15-COMFACOR | $ 28.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 232.300** |

Entregado por:

Recibido por:

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 72175262
## DESDE ABRIL 2023 HASTA MAYO 2023

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 78038558 | TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 72175262 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS ARTURO | APELLIDOS: | ARTEAGA ARTEAGA | NOMBRES: | ARGELIO ALBERTO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | MONTERIA DEPARTAMENTO: | CORDOBA | CIUDAD/MUNICIPIO: | | CERETE DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE | TELÉFONO: | 7840589 | TIPO COTIZANTE: | | DEPEND SUBTIPO COTIZANTE: | |
| TIPO APORTANTE: | 03-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | INDEPENDIENTE | COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | | NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO EMPRESA: | | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales, | TIPO DE SALARIO: | | FUO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI | COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

PLANILLA No: **78813506556** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: abril - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo - 2023 | FECHA DE PAGO: 12/05/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.500.000 | 79509558 | $ 104.400 | 30 | $ 1.500.000 | CCF16-COMFACOR | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 464.400**

PLANILLA No: **78781011741** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: marzo - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: abril - 2023 | FECHA DE PAGO: 10/04/2023 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: UNICO

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| $ 1.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 60.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.500.000 | 79509558 | $ 104.400 | 30 | $ 1.500.000 | CCF16-COMFACOR | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 464.400**

Entregado por:

Recibido por:

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830120516-4 | DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS CIVILES LTDA | carrera 7 # 156 - 78 Oficina 701 | 3108626385 | clientes@disenosyestructuras.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 29/05/2023 | 68091066 | $429.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 68.000 | 0 | | 0 | | 0 | 24 | 2.000 | 0 | 70.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.600 | 0 | 279.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 8.900 | | | | 8.900 | 24 | 300 | 9.200 | | | 89 | 9.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 68.000 | 24 | 2.000 | 70.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 68.000 | 70.000 |
| Pensión | 1 | 272.000 | 279.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 8.900 | 9.200 |
| CCF | 1 | 68.000 | 70.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 416.900 | 429.000 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830120516-4 | DISEÑOS Y ESTRUCTURAS INGENIEROS CIVILES LTDA | carrera 7 # 156 - 78 Oficina 701 | 3108626385 | clientes@disenosyestructuras.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 29/05/2023 | 68091068 | $428.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Dependiente | Estudiante | Extranjero sin Cédula de Extranjería | Colombiano en el Exterior | Cotizante | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntaria Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 19420425 | USECHE MACIAS JAIR | 1 | 0 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.700.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.700.000 | 68.000 | 14-23 | 1.700.000 | 1 | 8.900 | CCF24 | 1.700.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Bogotá D.C., |
| Unidad Contratante: | DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA |
| Contrato No. | PN DIRAF No. 06 – 6 - 10178 – 22 |
| Fecha suscripción contrato: | 27/09/2022 |
| Objeto del contrato: | "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" |
| Lugar de ejecución de la obra: | Lote Trapichito Nuevo 3 – Kilometro 3 via al sur. |
| Constancia de recibo No. | 5 |
| Contratista: | CONSORCIO PONAL L Y M. |
| NIT del contratista: | 901.635.603-5 |
| Fecha del acta de inicio: | 18/10/2022 |
| Plazo de ejecución: | **Contrato principal:** El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 20/12/2022, previa aprobación de la garantía única (fecha en al cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoría).<br><br>**Con prorroga N°1**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de obra PN DIRAF No.06-6-10178-22, por ciento cincuenta (150) días calendario, es decir, hasta el 19 de mayo de 2023.<br><br>**Con prorroga N°2**: Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de consultoría PN DIRAF No.06-6-10178-22, por ciento cuarenta (140) días calendario, es decir, hasta el 06 de octubre de 2023. |
| Nombre del Interventor del contrato: | CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE |
| Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña: | MY. GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO<br>Supervisor Contrato de consultoría<br>PN DIRAF No. 06-3-10086-22<br>Analista de Seguimiento Proyectos DIRAF |
| Valor del contrato: | Contrato Principal: $ 6.974.591.904,74 Incluido AIU e IVA. |
| Adición No. | N/A |
| Fecha de Suspensión del contrato: | N/A |

| | |
|---|---|
| Fecha de Reiniciación: | N/A |
| Valor total del contrato: | $ 6.974.591.904,74 Incluido AIU e IVA. |
| Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato: | Entrega parcial SI _X_ Entrega Total: Si____ |
| Periodo de entrega certificado: | Período certificado: Del 24/04/2023 al 28/05/2023 — Acta de corte N°*: 5 |
| Forma de Pago: | La Policía Nacional-Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:<br><br>PAGOS PARCIALES:<br>Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben Corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.<br>Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación.<br>Previo a la presentación de las actas parciales a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.<br>Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:<br>Acta de avance parcial. (Suscrita entre los contratistas de obra e interventoría)<br>• Factura de venta.<br>• Balance de cantidades ejecutadas.<br>• Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.<br>• Certificación pagos FIC.<br>• Memoria de cantidades ejecutadas.<br>Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.<br>Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por Inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al Derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).<br><br>Los pagos se harán a la siguiente cuenta:<br><br>NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO PONAL LYM<br>NIT. 901.635.603-5<br>ENTIDAD FINANCIERA: BBVA.<br>NUMERO DE CUENTA: 0570011064<br>TIPO DE CUENTA: CORRIENTE |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2022).

Principal: RP 406222 del 20/01/2023

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRAF | 11 | "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA" | $ 602.283.091,51 (2022) | $ 602.283.091,51 (2022) | $0,00 | $ 602.283.091,51 (2022) |

Observaciones: N/A.

| | |
|---|---|
| Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado. | Acumulado anterior: $ 1.872.893.800,96<br>Avance parcial recibido: $ 602.283.091,51<br>Totlal, Acumulado $ 2.475.176.892,47 |
| Acta de avance parcial o acta final de obra. | Acta de avance parcial de obra Nro. 5 radicada el 29/05/2023 Ingresada en SECOP II el 30/05/2023. |
| Memorias de cálculo. | Memorias de cantidades de obra del 29/05/2023. Ingresada en SECOP II el 30/05/2023. |
| En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra: | NO__x_SI ___ |
| En el presente corte se presentaron ítems no previstos: | NO_x__ SI |
| Documentos requeridos para el trámite de pago: | • Acta de avance parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría (SECOP II el 30/05/2023).<br>• Factura de venta (SECOP II el 30/05/2023).<br>• Certificación de pagos parafiscales y seguridad social (SECOP II el 30/05/2023).<br>• Certificación pagos FIC (SECOP II el 30/05/2023).<br>• Memoria de cantidades ejecutadas (SECOP II el 30/05/2023). |

| | |
|---|---|
| Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados: | N/A. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_. | N/A. |

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| Pago del acta parcial de obra No. 5 | $ 602.283.091,51 | El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato. |

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| LYM7 | 25/05/2023 | $ 602.283.091,51 | $0,00 | $ 602.283.091,51 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 602.283.091,51 | $0,00 | $ 602.283.091,51 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del Modificatorio No.1 del contrato en mención, toda vez que el Contratista de obra – CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA DE AVANCE PARCIAL No. 5, memorias de cantidades ejecutadas del 24/04/2023 hasta el 28/05/2023; el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por la firma interventora CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor del contrato de obra, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

De acuerdo con la solicitud expresa del CONSORCIO PONAL LYM contratista de la obra, mediante documento CESION DE DERACHOS DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10178-22, suscrita por LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ como representante legal del consorcio contratista y DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO como representante de la firma ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS, donde se requirió la cesión total de los derechos económicos a favor de la firma ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS, y fue aprobada por la Dirección Administrativa y Financiera, ahora Dirección Logística y Financiera, por lo tanto los dineros provenientes del pago de la presente acta N°5 serán consignados a la cuenta del BANCO DE OCCIDENTE N° 512856295 a nombre de la firma ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS.

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
NIT: 79.508.558 – 7
Interventor contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22.

**DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**
Representante Legal obra
CONSORCIO PONAL L Y M.

Mayor **GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
Supervisor Contrato de interventoría PN DIRAF 06-3-10086-22.

# CONSORCIO PONAL LYM

*NIT. NIT: 901.635.603-5*

CI-2022-OF-033
Neiva – Huila, 29 de MAYO 2023

Ingeniero
**CARLOS VERGARA NEGRETE**
Interventor del contrato de obra No 06-6-10178-22

Entidad contratante
Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera
Carrera 59 No 26 – 21
Bogotá Dirección general de la Policía Nacional

**Referencia: Contrato De Obra No 06-6-10178-22**

"Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste "

**Asunto:** Entrega de acta parcial No 5 del contrato de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta (Forma de pago), del contrato de obra en referencia, que tiene por objeto: " *Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste* "

Nos permitimos realizar la entrega formal de los documentos pertinentes para el cobro del acta parcial No 5 de obra.

1-Acta parcial de obra No 5
2-Balance de cantidades
3-Memorias de cálculo
4-Informe ejecutivo de obra
5-Certificado de pagos parafiscales
6-Certificado de pago FIC
7-Autorización de facturación
8-Factura electrónica
9-Rut del consorcio
10-Certificación bancaria

**Ing. Diego Medina Guerrero**
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

Recibí 29/mayo/2023

# ACTA PARCIAL DE OBRA No 5

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE I-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Replanteo y localización | M2 | 15.500,00 | $ 6.987,70 | $ 108.309.350,00 | 15.500,00 | $ 108.309.350,00 | 1.439,00 | $ 10.055.300,30 | 14.011,19 | $ 97.905.992,36 | 15.450,19 | $ 107.961.292,66 |
| 1,2 | Campamento de obra en unidades de contenedores para almacenamiento de herramientas y oficinas | GL | 1,00 | $ 26.163.097,72 | $ 26.163.097,72 | 1,00 | $ 26.163.097,72 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 26.163.097,72 | 1,00 | $ 26.163.097,72 |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 1 | | $ 134.472.447,72 | | $ 134.472.447,72 | | $ 10.055.300,30 | | $ 124.069.090,08 | | $ 134.124.390,38 |
| 2 | ESTRUCTURAS TECNICAS | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | POZO PROFUNDO | | | | | | | | | | | | |
| 2,1,1 | construcción de pozo de 8 1/2" de diámetro con profundidad recomendada en estudio de prospección geoelectrica (80 m) y obras complementarias. incluye equipo de bombeo con caudal de 6,00 l/s y altura dinámica total de 55,36 m, 7,86 hp además tubería y accesorios de impulsión a ptap | UN | 1,00 | $ 351.161.363,52 | $ 351.161.363,52 | 1,00 | $ 351.161.363,52 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 2 | | $ 351.161.363,52 | | $ 351.161.363,52 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 3 | EDIFICIO C | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | RELLENOS Y EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado. | m3 | 626,00 | $ 51.143,72 | $ 32.015.968,72 | 2.873,16 | $ 146.944.090,56 | 105,21 | $ 5.380.830,78 | 2.767,95 | $ 141.563.259,77 | 2.873,16 | $ 146.944.090,55 |
| 3.1.2 | Relleno en Recebo común Compactado | m3 | 274,00 | $ 102.498,05 | $ 28.084.465,70 | 4.148,08 | $ 425.170.111,24 | 153,60 | $ 15.743.700,48 | 3.994,46 | $ 409.424.360,80 | 4.148,06 | $ 425.168.061,28 |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 3.1 | | $ 60.100.434,42 | | $ 572.114.201,80 | | $ 21.124.531,26 | | $ 550.987.620,57 | | $ 572.112.151,83 |
| 3.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 3,2,1 | Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI | kg | 10.039,00 | $ 5.652,48 | $ 56.745.246,72 | 21.104,36 | $ 119.291.972,81 | - | $ - | 19.524,60 | $ 110.362.411,01 | 19.524,60 | $ 110.362.411,01 |
| 3,2,2 | Concreto para Zapatas y Vigas de Cimentación f'c=5000PSI | m3 | 200,00 | $ 875.941,15 | $ 175.188.230,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,3 | Acero para Columnas fy=60000 PSI | kg | 23.832,00 | $ 5.652,48 | $ 134.709.903,36 | 30.949,76 | $ 174.942.899,40 | 1.872,39 | $ 10.583.647,03 | 26.475,81 | $ 149.653.986,51 | 28.348,20 | $ 160.237.633,54 |
| 3,2,4 | Concreto para Columnas f'c=5000PSI | m3 | 80,00 | $ 1.305.949,01 | $ 104.475.920,80 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,5 | Malla electrosoldada para losa contrapiso | kg | 7.972,00 | $ 5.524,67 | $ 44.042.669,24 | 7.972,00 | $ 44.042.669,24 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,6 | Losa de contrapiso en concreto | m3 | 149,00 | $ 584.874,41 | $ 87.146.287,09 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,7 | Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI | kg | 30.834,00 | $ 5.652,48 | $ 174.288.568,32 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,8 | Concreto para vigas aéreas y losa de entrepiso segundo piso f'c=5000PSI | m3 | 318,00 | $ 919.401,32 | $ 292.369.619,76 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,9 | Concreto para vigas aéreas y losa de entrepiso tercer piso f'c=5000PSI | m3 | 2,00 | $ 919.401,32 | $ 1.838.802,64 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,10 | Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI | kg | 727,00 | $ 5.652,48 | $ 4.109.352,96 | 36.925,36 | $ 208.719.858,89 | 25.955,44 | $ 146.712.605,49 | 0,00 | $ - | 25.955,44 | $ 146.712.605,49 |
| 3,2,11 | Concreto para vigas aéreas y losa de Cubierta f'c=5000PSI | m3 | 10,00 | $ 919.401,32 | $ 9.194.013,20 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,2,12 | Acero A-50 para cubierta metálica | kg | 17.207,00 | $ 13.183,74 | $ 226.852.614,18 | 5.378,05 | $ 70.902.786,74 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 3.2 | | $ 1.310.961.228,27 | | $ 617.900.187,08 | | $ 167.296.252,52 | | $ 260.016.397,52 | | $ 417.312.650,04 |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 3 | | $ 1.371.061.662,69 | | $ 1.190.014.388,88 | | $ 178.420.783,78 | | $ 811.004.018,10 | | $ 989.424.801,87 |
| 4 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 25 cm. | M2 | 1.724,46 | $ 114.825,48 | $ 198.012.045,99 | 1.724,46 | $ 198.012.045,99 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.2 | Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 20 cm. | M2 | 367,09 | $ 92.370,53 | $ 33.908.436,41 | 417,44 | $ 38.559.154,04 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.3 | Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 12 cm. | M2 | 228,05 | $ 79.286,68 | $ 18.081.406,66 | 228,05 | $ 18.081.406,66 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.4 | Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 30 cm. | M2 | 9,24 | $ 123.111,25 | $ 1.137.647,95 | 26,51 | $ 3.263.679,24 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.5 | Suministro e instalación de Bordillo ventanas h. 0.15 mts, en concreto 2500 psi 25 cm | ML | 21,20 | $ 91.949,81 | $ 1.949.335,97 | 80,05 | $ 7.360.582,29 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.6 | Suministro e instalación de Bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi,muro de 12 cm | ML | 65,51 | $ 87.817,55 | $ 5.752.927,70 | 65,51 | $ 5.752.927,70 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-70778-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10026-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real, Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 554 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 4.7 | Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm | ML | 538,61 | $ 91.949,81 | $ 49.525.087,16 | 581,16 | $ 53.439.390,58 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.8 | Suministro e instalación de cañuela en concreto 2500 psi | ML | 148,93 | $ 83.607,51 | $ 12.451.666,46 | 148,93 | $ 12.451.666,46 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.9 | Suministro e instalación de bordillo en concreto 2500 psi | ML | 296,26 | $ 88.072,06 | $ 26.092.228,50 | 296,26 | $ 26.092.228,50 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.10 | Suministro e instalacion de pasos, en concreto 2500 psi e=08 cm, ancho 30 cm y largo de acuerdo a detalle de plano por cada | ML | 9,00 | $ 98.917,63 | $ 890.258,67 | 15,00 | $ 1.483.764,45 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.11 | Suministro e instalación de tapas para ductos, en concreto 2500 psi e=8 cm, tapa sin angio, ver detalle de planos | M2 | 39,33 | $ 147.025,46 | $ 5.782.511,34 | 39,33 | $ 5.782.511,34 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.12 | Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 12 cm | ML | 2,65 | $ 114.177,36 | $ 302.570,00 | 2,65 | $ 302.570,00 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.13 | Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 20 cm | ML | 11,44 | $ 116.400,01 | $ 1.331.616,11 | 11,44 | $ 1.331.616,11 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 4.14 | Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 25 cm | ML | 88,48 | $ 118.622,65 | $ 10.495.732,07 | 89,56 | $ 10.622.658,31 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 4 | | $ 365.713.370,99 | | $ 382.536.201,67 | | $ - | | | | $ - |
| 5 | PAÑETES/ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | Suministro e instalacion de Pañete impermeabilizado liso interiores 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm | M2 | 470,00 | $ 42.683,44 | $ 20.061.067,41 | 294,35 | $ 12.563.871,01 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 5.1 | Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm, bordes de vanos | ML | 401,92 | $ 40.826,84 | $ 16.409.123,53 | 1,00 | $ 40.826,84 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 5.2 | Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3. Espesor de 2cm | M2 | 2.284,54 | $ 41.809,13 | $ 95.514.483,52 | 2.572,05 | $ 107.535.172,92 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 5.3 | Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm | M2 | 1.330,37 | $ 43.156,76 | $ 57.414.458,80 | 1.493,70 | $ 64.463.252,41 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 5.4 | Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3 incluye filos y dilataciones e= 2cm, bordes de vanos | ML | 252,40 | $ 44.479,10 | $ 11.226.524,84 | 1,00 | $ 44.479,10 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 5.5 | Suministro e instalación de afinado liso para pisos, escalera y cubierta | M2 | 2.792,88 | $ 25.602,62 | $ 71.505.045,35 | 3.050,27 | $ 78.094.903,71 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 5.6 | Suministro e instalación de manto Morter Plast al 80 para impermeabilización cubiertas | M2 | 1.674,70 | $ 37.363,88 | $ 62.573.289,84 | 1,00 | $ 37.363,88 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 5.7 | Suministro e instalación de aislamiento termico para muros y cubierta | M2 | 1.741,18 | $ 70.615,14 | $ 122.953.669,47 | 1,00 | $ 70.615,14 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 5 | | $ 457.657.662,76 | | $ 262.850.484,91 | | $ - | | | | $ - |
| 6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | RED DE SUMINISTRO | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 218,08 | $ 36.633,00 | $ 7.988.924,64 | 218,08 | $ 7.988.924,64 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 19,65 | $ 28.954,35 | $ 568.952,98 | 19,65 | $ 568.952,98 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 10,06 | $ 20.609,60 | $ 207.332,58 | 10,06 | $ 207.332,58 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL | POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER. | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-8 DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 9a, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407952 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 56,37 | $ 12.736,83 | $ 717.975,11 | 56,37 | $ 717.975,11 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 15,29 | $ 13.108,89 | $ 200.434,93 | 15,29 | $ 200.434,93 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-9 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 57,09 | $ 11.618,62 | $ 663.307,02 | 57,09 | $ 663.307,02 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA / LAVAMANOS 3/4" | UN | 12,00 | $ 27.319,96 | $ 327.839,52 | 12,00 | $ 327.839,52 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P LAVAMANOS / LAVAPLATOS / POCETA / ASEO 1/2" | UN | 11,00 | $ 23.713,49 | $ 260.848,39 | 11,00 | $ 260.848,39 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO DE TANQUE 1/2" | UN | 6,00 | $ 20.837,09 | $ 125.022,54 | 6,00 | $ 125.022,54 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4" | UN | 11,00 | $ 44.320,92 | $ 487.530,12 | 11,00 | $ 487.530,12 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 2" | UN | 4,00 | $ 518.138,58 | $ 2.072.554,32 | 4,00 | $ 2.072.554,32 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2" | UN | 3,00 | $ 349.801,88 | $ 1.049.405,64 | 3,00 | $ 1.049.405,64 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1/2" | UN | 7,00 | $ 86.930,76 | $ 608.515,32 | 7,00 | $ 608.515,32 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PURGA 3/4" | UN | 4,00 | $ 135.854,18 | $ 543.416,72 | 4,00 | $ 543.416,72 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 6.1 | | $ 15.822.059,83 | | $ 15.822.059,83 | | $ - | | | | $ - |
| 6.2. | RED AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 62,61 | $ 59.432,04 | $ 3.721.040,02 | 62,61 | $ 3.721.040,02 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 14,30 | $ 46.235,94 | $ 661.173,94 | 14,30 | $ 661.173,94 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 53,86 | $ 36.689,48 | $ 1.976.095,39 | 53,86 | $ 1.976.095,39 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 30,70 | $ 27.604,39 | $ 847.454,77 | 30,70 | $ 847.454,77 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4" | UN | 17,00 | $ 60.248,74 | $ 1.024.228,58 | 17,00 | $ 1.024.228,58 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3" | UN | 4,00 | $ 40.719,48 | $ 162.877,92 | 4,00 | $ 162.877,92 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2" | UN | 14,00 | $ 32.406,11 | $ 453.685,54 | 14,00 | $ 453.685,54 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2" | UN | 14,00 | $ 50.197,57 | $ 702.765,98 | 14,00 | $ 702.765,98 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3" | UN | 4,00 | $ 68.614,73 | $ 274.458,92 | 4,00 | $ 274.458,92 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110mm | ML | 9,82 | $ 48.784,09 | $ 479.059,76 | 9,82 | $ 479.059,76 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160mm | ML | 33,40 | $ 74.677,94 | $ 2.494.243,20 | 33,40 | $ 2.494.243,20 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 200mm | ML | 28,03 | $ 104.832,38 | $ 2.938.451,61 | 28,03 | $ 2.938.451,61 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.13 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 60X60cm H máx:1.0m | UN | 6,00 | $ 509.764,75 | $ 3.058.588,50 | 6,00 | $ 3.058.588,50 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.14 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 60X60cm H máx:1.5m | UN | 6,00 | $ 681.136,05 | $ 4.086.816,30 | 6,00 | $ 4.086.816,30 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.15 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN SIN CLASIFICAR. INCLUYE TRASIEGO, REPALEO Y DISPOSICION FINAL | M3 | 39,62 | $ 51.444,37 | $ 2.038.225,94 | 39,62 | $ 2.038.225,94 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.16 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. INCLUYE COMPACTACION | M3 | 19,81 | $ 27.035,93 | $ 535.581,77 | 19,81 | $ 535.581,77 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.2.17 | RELLENO CON ARENA PARA TAPAR TUBERIAS ENTERRADAS. INCLUYE COMPACTACION MANUAL | M3 | 19,81 | $ 105.550,89 | $ 2.090.963,13 | 19,81 | $ 2.090.963,13 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 6.2 | | $ 27.545.711,27 | | $ 27.545.711,27 | | $ - | | | | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE I-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 6.3. | RED AGUAS LLUVIAS | | | $ - | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 304,34 | $ 58.369,01 | $ 17.764.024,50 | 304,34 | $ 17.764.024,50 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 6.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 4" (INCLUYE TRAGANTE TIPO CUPULA) | UN | 23,00 | $ 112.748,66 | $ 2.593.219,18 | 23,00 | $ 2.593.219,18 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 6.3 | $ 20.357.243,68 | | $ 20.357.243,68 | | $ - | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 6 | $ 63.725.014,78 | | $ 63.725.014,78 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | ALIMENTADORES BAJA TENSION Y CANALIZACION | | | | | | | | | | | | |
| 7,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION | ML | 120,53 | $ 120.846,57 | $ 14.565.369,55 | 120,53 | $ 14.565.369,55 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION | ML | 290,00 | $ 116.047,85 | $ 33.653.876,50 | 290,00 | $ 33.653.876,50 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION | ML | 698,71 | $ 36.053,99 | $ 25.191.292,26 | 698,71 | $ 25.191.292,26 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION | ML | 233,60 | $ 51.935,52 | $ 12.132.137,47 | 233,60 | $ 12.132.137,47 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION | ML | 120,00 | $ 65.462,44 | $ 7.855.492,80 | 120,00 | $ 7.855.492,80 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION | ML | 113,30 | $ 86.446,15 | $ 9.794.348,80 | 113,30 | $ 9.794.348,80 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION | ML | 123,00 | $ 142.343,38 | $ 17.508.235,74 | 123,00 | $ 17.508.235,74 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 cm, COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION | ML | 31,36 | $ 46.618,67 | $ 1.461.961,49 | 31,36 | $ 1.461.961,49 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION (CAJA DE HALADO) | UN | 15,00 | $ 135.941,19 | $ 2.039.117,85 | 15,00 | $ 2.039.117,85 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE 60 X 10,5 CM FIJACION EN TECHO | ML | 120,00 | $ 236.803,28 | $ 28.416.393,60 | 120,00 | $ 28.416.393,60 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,1,11 | ALIMENTADOR INICIO DE CIRCUITOS ILUMINACIÓN-TOMACORRIENTE EN 3#12 HFFRLS POR TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS | ML | 2.535,00 | $ 43.878,75 | $ 111.232.631,25 | 2.535,00 | $ 111.232.631,25 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 7.1 | $ 263.850.857,31 | | $ 263.850.857,31 | | $ - | | | | $ - |
| 7,2 | TABLEROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 7,2,1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DOCE (12) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA. | UN | 1,00 | $ 472.731,84 | $ 472.731,84 | 1,00 | $ 472.731,84 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA. | UN | 7,00 | $ 853.971,20 | $ 5.977.798,40 | 7,00 | $ 5.977.798,40 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,3 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA. | UN | 10,00 | $ 926.480,19 | $ 9.264.801,90 | 10,00 | $ 9.264.801,90 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,4 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE TREINTA Y SEIS (36) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA. | UN | 1,00 | $ 1.145.569,81 | $ 1.145.569,81 | 1,00 | $ 1.145.569,81 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,5 | TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DE BARRAJE 400-500 A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA | UN | 2,00 | $ 5.194.769,91 | $ 10.389.539,82 | 2,00 | $ 10.389.539,82 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,6 | TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 1663 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA | UN | 2,00 | $ 14.924.592,95 | $ 29.849.185,90 | 2,00 | $ 29.849.185,90 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,7 | PROTECCION TERMOMAGNETICA MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA | UN | 198,00 | $ 32.279,11 | $ 6.391.263,78 | 198,00 | $ 6.391.263,78 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-6 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| CANTIDADES INICIALES | | | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 7,2,8 | PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA | UN | 6,00 | $ 56.765,16 | $ 340.590,96 | 6,00 | $ 340.590,96 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,9 | PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 40A /10KA | UN | 10,00 | $ 65.208,62 | $ 652.086,20 | 10,00 | $ 652.086,20 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,10 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA | UN | 4,00 | $ 108.326,59 | $ 433.306,36 | 4,00 | $ 433.306,36 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,11 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X50A /25KA | UN | 2,00 | $ 258.259,90 | $ 516.519,80 | 2,00 | $ 516.519,80 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,12 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X75A /25KA | UN | 3,00 | $ 274.021,04 | $ 822.063,12 | 3,00 | $ 822.063,12 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,13 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X125A /25KA | UN | 3,00 | $ 595.106,64 | $ 1.785.319,92 | 3,00 | $ 1.785.319,92 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,14 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(12,8-16)/25KA 240V | UN | 12,00 | $ 295.194,73 | $ 3.542.336,76 | 12,00 | $ 3.542.336,76 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,15 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(20-25)/25KA 240V | UN | 4,00 | $ 295.194,73 | $ 1.180.778,92 | 4,00 | $ 1.180.778,92 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,16 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(32-40)/25KA 240V | UN | 3,00 | $ 310.618,13 | $ 931.854,39 | 3,00 | $ 931.854,39 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,17 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(35-50)/25KA 240V | UN | 2,00 | $ 314.108,10 | $ 628.216,20 | 2,00 | $ 628.216,20 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,18 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(50,4-63)/25KA 240V | UN | 3,00 | $ 322.438,98 | $ 967.316,94 | 3,00 | $ 967.316,94 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,19 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(80-100)/25KA 240V | UN | 6,00 | $ 322.438,98 | $ 1.934.633,88 | 6,00 | $ 1.934.633,88 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,20 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(100-125)/25KA 240V | UN | 6,00 | $ 718.381,24 | $ 4.310.287,44 | 6,00 | $ 4.310.287,44 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,21 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(140-200)/40KA 240V | UN | 1,00 | $ 775.606,63 | $ 775.606,63 | 1,00 | $ 775.606,63 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,22 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(160-200)/40KA 240V | UN | 2,00 | $ 765.664,65 | $ 1.531.329,30 | 2,00 | $ 1.531.329,30 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,23 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(200-250)/40 KA 240V | UN | 2,00 | $ 869.610,55 | $ 1.739.221,10 | 2,00 | $ 1.739.221,10 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,24 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(256-320)/60 KA 240V | UN | 1,00 | $ 1.981.783,86 | $ 1.981.783,86 | 1,00 | $ 1.981.783,86 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,25 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(504-630)/65 KA 240V | UN | 2,00 | $ 3.548.190,53 | $ 7.096.381,06 | 2,00 | $ 7.096.381,06 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,26 | PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(500-1250)/65 KA 240V | UN | 1,00 | $ 4.807.730,46 | $ 4.807.730,46 | 1,00 | $ 4.807.730,46 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,27 | DPS CLASE I+II | UN | 1,00 | $ 2.765.790,03 | $ 2.765.790,03 | 1,00 | $ 2.765.790,03 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,28 | DPS CLASE III | UN | 1,00 | $ 431.705,52 | $ 431.705,52 | 1,00 | $ 431.705,52 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 550 A | UN | 2,00 | $ 17.002.145,17 | $ 34.004.290,34 | 2,00 | $ 34.004.290,34 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,2,30 | TABLERO GENERAL RED REGULADA CON ELEMENTOS | UN | 1,00 | $ 5.095.194,86 | $ 5.095.194,86 | 1,00 | $ 5.095.194,86 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 7.2 | $ 141.765.235,50 | | $ 141.765.235,50 | | $ - | | | | $ - |
| 7.3 | SALIDAS ELÉCTRICAS | | | $ - | | | | | | | | | |
| 7,3,1 | SALIDA PARA ILUMINACION, INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 345,00 | $ 222.639,01 | $ 76.810.458,45 | 345,00 | $ 76.810.458,45 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 03<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10055-22 | OBJETO: | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-8 DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 |
| TELÉFONO | 3113407052 |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 |
| TELÉFONO | 310 654 1925 |

| | |
|---|---|
| VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 |
| VR. ADICIONAL | |
| VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO | |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | |
| VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 |
| SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | |

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO ADICIONAL | 280 DIAS |
| TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| CANTIDADES INICIALES | | | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 7,3,2 | SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 55,00 | $ 153.420,98 | $ 8.438.153,90 | 55,00 | $ 8.438.153,90 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 341,00 | $ 194.223,35 | $ 66.230.162,35 | 341,00 | $ 66.230.162,35 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,4 | SALIDA PARA TERMOSTATO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 50,00 | $ 127.623,94 | $ 6.381.197,00 | 50,00 | $ 6.381.197,00 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 189,00 | $ 25.401,96 | $ 4.800.970,44 | 189,00 | $ 4.800.970,44 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 15,00 | $ 86.485,11 | $ 1.297.276,65 | 15,00 | $ 1.297.276,65 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED REGULADA), INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 137,00 | $ 36.716,21 | $ 5.030.120,77 | 137,00 | $ 5.030.120,77 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,8 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x6 Cu + 1x10 T AA | ML | 120,00 | $ 62.822,89 | $ 7.538.746,80 | 120,00 | $ 7.538.746,80 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,9 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x4 Cu + 1x10 T AA | ML | 17,00 | $ 89.663,73 | $ 1.524.283,41 | 17,00 | $ 1.524.283,41 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,10 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x2 Cu + 1x8 T AA | ML | 7,00 | $ 112.693,89 | $ 788.857,23 | 7,00 | $ 788.857,23 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,11 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x1/0 Cu + 1x8 T AA | ML | 55,00 | $ 147.910,04 | $ 8.135.052,20 | 55,00 | $ 8.135.052,20 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,12 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x12 Cu + 1x12 T AA | ML | 24,00 | $ 34.953,62 | $ 838.886,88 | 24,00 | $ 838.886,88 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,13 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x10 Cu + 1x12 T AA | ML | 239,90 | $ 38.414,19 | $ 9.215.564,18 | 239,90 | $ 9.215.564,18 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,14 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x6 Cu + 1x10 TAA | ML | 18,35 | $ 55.177,27 | $ 1.012.502,90 | 18,35 | $ 1.012.502,90 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,15 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x18 Cu BLINDADO CONTROL AA | ML | 1.020,00 | $ 40.658,00 | $ 41.471.160,00 | 1.020,00 | $ 41.471.160,00 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,16 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 EXTRACTORES | ML | 350,00 | $ 40.027,15 | $ 14.009.502,50 | 350,00 | $ 14.009.502,50 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,17 | SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 DESHUMIFICADOR | ML | 180,00 | $ 40.027,37 | $ 7.204.926,60 | 180,00 | $ 7.204.926,60 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,18 | SALIDA BIFASICA COMPLETA MANEJADORA | UN | 48,00 | $ 375.683,03 | $ 18.032.785,44 | 48,00 | $ 18.032.785,44 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,19 | SALIDA COMPLETA MODULO CONTROL MANEJADORA-CONDENSADORA | UN | 48,00 | $ 403.577,43 | $ 19.371.716,64 | 48,00 | $ 19.371.716,64 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,3,20 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA | UN | 19,00 | $ 207.607,89 | $ 3.944.549,91 | 19,00 | $ 3.944.549,91 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 7,3 | $ 302.076.874,25 | | $ 302.076.874,25 | | $ - | | | | $ - |
| 7,4 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 7,4,1 | EXCAVACIÓN MECANICA DE MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS, INCLUYE CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE EMBIENTAL AUTORIZADO | M3 | 268,00 | $ 90.528,68 | $ 24.261.686,24 | 268,00 | $ 24.261.686,24 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10176-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10085-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-8 DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 7,4,2 | RELLENO CON BASE GRANULAR COMPACTADO B600 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE CAUERDO CON ESTUDIO DE SUELOS | M3 | 120,00 | $ 119.009,33 | $ 14.281.119,60 | 120,00 | $ 14.281.119,60 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,3 | RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO | M3 | 125,00 | $ 210.540,76 | $ 26.317.595,00 | 125,00 | $ 26.317.595,00 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,4 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 4Φ4" EN BANCO DE DUCTOS | ML | 170,00 | $ 220.940,87 | $ 37.559.947,90 | 170,00 | $ 37.559.947,90 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,5 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 6Φ6" EN BANCO DE DUCTOS | ML | 260,00 | $ 360.917,41 | $ 93.838.526,60 | 260,00 | $ 93.838.526,60 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,6 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 2Φ3" EN BANCOS DE DUCTOS | ML | 155,00 | $ 88.782,39 | $ 13.761.270,45 | 155,00 | $ 13.761.270,45 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,7 | SUMINISTRO Y MARCACION CON CINTA CS 273 | ML | 585,00 | $ 35.844,36 | $ 20.968.950,60 | 585,00 | $ 20.968.950,60 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,8 | CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SENCILLA CS275. | UN | 7,00 | $ 1.382.424,70 | $ 9.676.972,90 | 7,00 | $ 9.676.972,90 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,9 | CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO DOBLE CS276. | UN | 6,00 | $ 2.579.417,75 | $ 15.476.506,50 | 6,00 | $ 15.476.506,50 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,10 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES XLPE @15kV, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | ML | 280,00 | $ 242.724,48 | $ 67.962.854,40 | 280,00 | $ 67.962.854,40 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,11 | CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.35m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm. | ML | 25,00 | $ 287.100,20 | $ 7.177.505,00 | 25,00 | $ 7.177.505,00 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,12 | CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 1 SEGUN DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 5/8", 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 8 AWG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. NO SE PERMITE NI SALES NI CARBÓN ACTIVADO NI LIMADURA DE HIERRO | UN | 1,00 | $ 10.917.125,89 | $ 10.917.125,89 | 1,00 | $ 10.917.125,89 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO H 300kVA, TAPS: +1 -3 X 2.5%, 13.2/0.208kV, INCLUYE DPS | UN | 1,00 | $ 41.241.378,02 | $ 41.241.378,02 | 1,00 | $ 41.241.378,02 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE TRANSFORMADOR 300kVA, 15/0.6kV SEGUN CTS 518-2 | UN | 1,00 | $ 8.634.028,67 | $ 8.634.028,67 | 1,00 | $ 8.634.028,67 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6 | UN | 1,00 | $ 33.046.772,19 | $ 33.046.772,19 | 1,00 | $ 33.046.772,19 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SALIDA, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6 | UN | 3,00 | $ 25.160.345,21 | $ 75.481.035,63 | 3,00 | $ 75.481.035,63 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6 | UN | 1,00 | $ 24.428.578,18 | $ 24.428.578,18 | 1,00 | $ 24.428.578,18 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,18 | CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SENCILLA CS274. | UN | 5,00 | $ 939.640,28 | $ 4.698.201,40 | 5,00 | $ 4.698.201,40 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA NORMALIZADA LOCAL SUBESTACIÓN | UN | 3,00 | $ 4.386.720,15 | $ 13.160.160,45 | 3,00 | $ 13.160.160,45 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,20 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 15kV USO EXTERIOR | UN | 1,00 | $ 858.482,30 | $ 858.482,30 | 1,00 | $ 858.482,30 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 15kV USO INTERIOR | UN | 3,00 | $ 860.423,32 | $ 2.581.269,96 | 3,00 | $ 2.581.269,96 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,22 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO DE MEDIDA NIVEL 2 CON MODEM TELEFONICO | UN | 1,00 | $ 6.651.217,97 | $ 6.651.217,97 | 1,00 | $ 6.651.217,97 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,23 | ESTRUCTURA DE ARRANQUE | UN | 1,00 | $ 8.655.650,57 | $ 8.655.650,57 | 1,00 | $ 8.655.650,57 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,24 | ESTRUCTURA DE AFLORAMIENTO | UN | 1,00 | $ 7.059.350,28 | $ 7.059.350,28 | 1,00 | $ 7.059.350,28 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS<br>CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real, Piso 3- 301 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 |
| TELÉFONO | 3113407052 |
| | |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 |
| TELÉFONO | 310 654 1925 |

| | |
|---|---|
| VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 |
| VR. ADICIONAL | |
| VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO | |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | |
| VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 |
| SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | |

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 7,4,25 | PRUEVA VLF | UN | 1,00 | $ 3.154.168,25 | $ 3.154.168,25 | 1,00 | $ 3.154.168,25 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 7,4,26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDICIÓN, 13,2kV, INCLUYE 3PT'S Y 3 CT'S. | UN | 1,00 | $ 21.260.444,16 | $ 21.260.444,16 | 1,00 | $ 21.260.444,16 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 7,4 | $ 593.110.799,11 | | $ 593.110.799,11 | | $ - | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 7 | $ 1.300.803.766,17 | | $ 1.300.803.766,17 | | $ - | | | | $ - |
| 8 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Suministro e instalación de Persiana para ventilacion natural antitormenta, modulo de 1 x 1 m , incluye perfil antitormenta en aluminio extruido cal 1/16 espaciado cada 60 cm color blanco mate, incuye elementos de instalacion y alfajia | M2 | 8,00 | $ 273.934,08 | $ 2.191.472,64 | 1,00 | $ 273.934,08 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,2 | Suministro e instalacion de P-4 puerta fisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medlads 75 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 4,00 | $ 1.177.855,23 | $ 4.711.420,92 | 1,00 | $ 1.177.855,23 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,3 | Suministro e instalacion de P-4A puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 60 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 2,00 | $ 1.129.658,56 | $ 2.259.317,12 | 1,00 | $ 1.129.658,56 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,4 | Suministro e instalacion de P-5 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 90 x 300, termocurado por definir kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 7,00 | $ 1.227.233,00 | $ 8.590.631,00 | 1,00 | $ 1.227.233,00 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,5 | Suministro e instalacion de P-6 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 100 x 300, termocurado por definir kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 1,00 | $ 1.258.633,96 | $ 1.258.633,96 | 1,00 | $ 1.258.633,96 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,6 | Suministro e instalacion de P-7 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 70 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 3,00 | $ 1.162.819,06 | $ 3.488.457,18 | 1,00 | $ 1.162.819,06 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,7 | Suministro e instalacion de P-8 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 80 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 1,00 | $ 1.190.489,37 | $ 1.190.489,37 | 1,00 | $ 1.190.489,37 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACION: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10686-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,61 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| CANTIDADES INICIALES | | | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 8,8 | Suministro e instalacion de P-12 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zzra, medidas 100 x 300, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 3,00 | $ 1.703.842,38 | $ 5.111.527,14 | 1,00 | $ 1.703.842,38 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,9 | Suministro e instalacion de P-13 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 60 x 300 ,termocurado por definir,kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac zra | UN | 4,00 | $ 1.129.658,56 | $ 4.518.634,24 | 1,00 | $ 1.129.658,56 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 8,10 | Suministro e instalacion de P-14 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio. Marco m120, ref zzra, medidas 138 x 300,termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas oac | UN | 3,00 | $ 2.028.189,87 | $ 6.084.569,61 | 1,00 | $ 2.028.189,87 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 8 | $ 39.405.153,18 | | $ 12.282.314,07 | | $ - | | | | $ - |
| 9 | PISOS | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | Suministro e instalación de Baldosa de grano de marmol pulido<br>N°1 33x33 cm vibroprensada de espesor 15 mm, perlato claro fondo blanco granulada. Instalación con destroque y pulida juntas con boquilla con polvo del mismo grano, acabado brillante y sellado, diseño según planos de despiece en detalles de pisos. | M2 | 968,27 | $ 93.450,13 | $ 90.484.957,38 | 1,00 | $ 93.450,13 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 9,2 | Suministro e instalación de Guardaescobas recto prefabricado en grano de marmol pulido 10x 33 cm referencia color perlato claro fondo blanco , acabado brillante | ML | 436,94 | $ 71.043,19 | $ 31.041.611,44 | 1,00 | $ 71.043,19 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 9,3 | Suministro e instalación de cereamica Nature de Alfa, de 15 x 120 cm color Bizque., | M2 | 28,63 | $ 156.374,15 | $ 4.476.991,91 | 1,00 | $ 156.374,15 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 9,4 | Suministro e instalación de Piso Corona Mikonos Beige 33.8 x<br>33.8 | M2 | 139,65 | $ 72.618,66 | $ 10.141.195,87 | 1,00 | $ 72.618,66 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 9,5 | Suministro e instalación de Boca puerta en grano de marmol<br>No. 1, fundido, pulido y brillado, color beige, diseño según despiece de pisos. | ML | 4,00 | $ 44.674,77 | $ 178.699,08 | 1,00 | $ 44.674,77 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 9 | $ 136.323.455,68 | | $ 439.160,90 | | $ - | | | | $ - |
| 10 | APARATOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10,1 | Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro petro 20 mm, apoyado sobre mueble de madera. Para baños | ML | 3,60 | $ 139.327,79 | $ 501.580,04 | 1,00 | $ 139.327,79 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,2 | Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro petro 20 mm, apoyado sobre mueble en estructura metalica. Para baños | ML | 7,28 | $ 148.490,41 | $ 1.081.010,16 | 1,00 | $ 148.490,41 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,3 | Suministro e instación de Lavamanos de colgar en porcelana sanitaria, color blanco, dimensiones 47X36,5 cm, con agujeros insinuados, incluye juego de accesorios y elementos de fijación. no incluye grifería | UN | 1,00 | $ 122.265,59 | $ 122.265,59 | 1,00 | $ 122.265,59 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,4 | Suministro e instalación de Orinal ADA en porcelana sanitaria color blanco de entrada posterior antivandálico con esmalte antibacterial, dimensiones 34 X 62 X 36,7 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación | UN | 2,00 | $ 245.218,73 | $ 490.437,45 | 1,00 | $ 245.218,73 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL | POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 03<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACION: | 29 MAYO DE 2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | | | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS | |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 | |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS | |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | | TIEMPO SUSPENDIDO | - | |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS | |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 | |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 10,5 | Suministro e instalación de Taza alongada ada en porcelana sanitaria color blanco, dimensiones 39,7 x 73 x 47 cms para personas con movilidad reducida o adultos mayores de entrada posterior. Incluye fluxómetro. | UN | 1,00 | $ 520.003,49 | $ 520.003,49 | 1,00 | $ 520.003,49 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,6 | Suministro e instalación de Sanitario alongado de una pieza en porcelana sanitaria color blanco de control azul y asiento de cierre suave, medidas 35,7 x x69,4 x x40,8 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación. | UN | 1,00 | $ 477.728,87 | $ 477.728,87 | 1,00 | $ 477.728,87 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,7 | Suministro e instalación de Taza alongada en porcelana sanitaria color blanco línea institucional 36,8 x 73 x 36,2 cms (altura tradicional). Incluye fluxómetro expuesto de palanca y asiento institucional . Incluye juego de accesorios y elementos de fijación. | UN | 4,00 | $ 392.516,54 | $ 1.570.066,16 | 1,00 | $ 392.516,54 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,8 | Suministro e instalación de Lavamanos de sobreponer en porcelana cerámica color blanco 51 x 45 con agujeros insinuados . Incluye accesorios y elementos de fijación, no incluye griferia | UN | 5,00 | $ 175.534,59 | $ 877.672,95 | 1,00 | $ 175.534,59 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,9 | Suministro e instalación de Taza alongada color blanco línea institucional 36,8 x 73 x 36,2 cms (altura tradicional). Incluye valvula de push antibandalica y asiento institucional. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación. | UN | 10,00 | $ 392.516,54 | $ 3.925.165,40 | 1,00 | $ 392.516,54 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,10 | Suministro e instalacion de Llave terminal tipo jardin corriente de 1/2" salida de 3/4"acabado metalico cromado . Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion. Para patios y Zonas humedas | UN | 5,00 | $ 16.801,20 | $ 84.005,99 | 1,00 | $ 16.801,20 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,11 | Suministro e Instalacion de Ceramica para pared Almara beige 30 x 60 | M2 | 356,63 | $ 70.871,45 | $ 25.275.061,82 | 1,00 | $ 70.871,45 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,12 | Suministro e instalacion de Griferia de push para pared, antivandálica, acabado metalico cromado, ref.701320001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, retenidos | UN | 12,00 | $ 229.903,60 | $ 2.758.843,20 | 1,00 | $ 229.903,60 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 10,13 | Suministro e instalacion de Griferia de mesa para lavamanos monocontrol acabado metálico cromado, ref. Th1015551 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, apartamentos y casas fiscales | UN | 6,00 | $ 208.013,10 | $ 1.248.078,60 | 1,00 | $ 208.013,10 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 10 | $ 36.931.919,72 | | $ 3.139.191,90 | | $ - | | | | $ - |
| 11 | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos | ML | 401,92 | $ 22.386,45 | $ 8.997.561,98 | 1,00 | $ 22.386,45 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 11,2 | Suministro e instalación de Koraza gris sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos,dilataciones y carteras vanos | M2 | 205,18 | $ 33.142,29 | $ 6.800.135,06 | 1,00 | $ 33.142,29 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 11,3 | Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos | M2 | 1.094,57 | $ 33.075,52 | $ 36.203.471,93 | 1,00 | $ 33.075,52 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 11,4 | Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre muro interior 3 manos Incluye filos, dilataciones y cartera vanos | M2 | 2.284,54 | $ 23.825,57 | $ 54.430.384,30 | 1,00 | $ 23.825,57 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 11,5 | Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre vanos | ML | 252,40 | $ 19.340,97 | $ 4.881.660,83 | 1,00 | $ 19.340,97 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 11 | $ 111.313.214,10 | | $ 131.770,80 | | $ - | | | | $ - |
| 12 | VIDRIOS Y ESPEJOS | | | | | | | | | | | | |
| | VENTANAS | | | | | | | | | | | | |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACION No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 05-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 05-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 |
| TELÉFONO | 3113407052 |
| | |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 |
| TELÉFONO | 310 654 1925 |

| | |
|---|---|
| VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 |
| VR. ADICIONAL | |
| VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO | |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | |
| VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,61 |
| SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | |

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| CANTIDADES INICIALES | | | | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 12,1 | Suministro e instalacion de ventaneria fija dilatada de muros con cuerpo lateral deslizable según detalle. En perfileria de aluminio, acabado anonizado blanco mate, dimensiones ventana variable cristal con camara low-e 24ram composicion (6mm-knt sep 12ram+6m-nc) bordes pulidos mate (100*1000), incluye elementos de fijacion. | M2 | 10,48 | $ 481.811,85 | $ 5.049.388,19 | 1,00 | $ 481.811,85 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,2 | Suministro e instalacion de Espejo 4 mm borde liso y pulido. Incluye elementos de fijacion, en todos los baños | M2 | 5,53 | $ 64.985,97 | $ 359.656,25 | 1,00 | $ 64.985,97 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,3 | suministro e instalacion de divisiones para orinales en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos). | UN | 2,00 | $ 662.461,84 | $ 1.324.923,68 | 1,00 | $ 662.461,84 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,4 | Suministro e instalacion de divisiones para sanitarios en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye puerta accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos). | UN | 10,00 | $ 861.239,71 | $ 8.612.397,10 | 1,00 | $ 861.239,71 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,5 | Suministro e instalacion de Puerta en vidrio templado de 10mm (doble). incluye sandblasting, herrajes, topes, chapa y elementos de fijación y anclaje. | M2 | 85,20 | $ 955.982,61 | $ 81.449.718,37 | 1,00 | $ 955.982,61 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,6 | Suministro e instalacion de Espejo inclinado 15 gradoas con marco en aluminio. Incluye elementos de fijacion para baño minusválidos | M2 | 0,52 | $ 88.129,56 | $ 45.474,85 | 1,00 | $ 88.129,56 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,7 | Suministro e instalacion de V-1A OAC ventana proyectante vp o- x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=1.0, vidrio 6- 12-6 | UN | 17,00 | $ 1.433.897,85 | $ 24.376.263,45 | 1,00 | $ 1.433.897,85 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,8 | Suministro e instalacion de V-1B OAC ventana proyectante vp o- x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=3.0, b=1.0, vidrio 6-12- 6 | UN | 20,00 | $ 1.607.129,54 | $ 32.142.590,80 | 1,00 | $ 1.607.129,54 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,9 | Suministro e instalacion de V-2 OAC fija o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=2.50, vidrio 6-12-6 | UN | 5,00 | $ 2.787.747,79 | $ 13.938.738,95 | 1,00 | $ 2.787.747,79 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,10 | Suministro e instalacion de V-3 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=2.70, vidrio 6-12-6 | UN | 9,00 | $ 3.001.922,31 | $ 27.017.300,79 | 1,00 | $ 3.001.922,31 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,11 | Suministro e instalacion de V-4 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.5, b=2.70, vidrio 6-12-6 | UN | 4,00 | $ 3.301.009,14 | $ 13.204.036,56 | 1,00 | $ 3.301.009,14 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,12 | Suministro e instalacion de V-5 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=3.0, b=2.35, vidrio 6-12-6 | UN | 3,00 | $ 3.027.589,65 | $ 9.082.768,95 | 1,00 | $ 3.027.589,65 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,13 | Suministro e instalacion de V-6 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=0.90, vidrio 6-12-6 | UN | 1,00 | $ 1.073.756,13 | $ 1.073.756,13 | 1,00 | $ 1.073.756,13 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,14 | Suministro e instalacion de V-7 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.50, b=3.35, vidrio 6-12-6 | UN | 1,00 | $ 3.698.065,21 | $ 3.698.065,21 | 1,00 | $ 3.698.065,21 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,15 | Suministro e instalacion de V-8 OAC fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=3.0, b=1.20, vidrio 6-12-6 | UN | 3,00 | $ 1.601.018,48 | $ 4.803.055,44 | 1,00 | $ 1.601.018,48 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,16 | Suministro e instalacion de V-9 OAC ventana corrediza xxo perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=2.0, b=3.0, vidrio 6- 12-6 | UN | 3,00 | $ 4.141.702,69 | $ 12.425.108,07 | 1,00 | $ 4.141.702,69 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,17 | Suministro e instalacion de V-10 OAC rejilla ventana proyectante alfajia koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.60, b=1.0, vidrio 6-12-6 | UN | 3,00 | $ 589.339,87 | $ 1.768.019,61 | 1,00 | $ 589.339,87 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,18 | Suministro e instalacion de V-11 OAC persiana antitorm perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.50, b=1.20, vidrio 6- 12-6 | UN | 10,00 | $ 180.363,96 | $ 1.803.639,60 | 1,00 | $ 180.363,96 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,19 | Suministro e instalacion de V-12 OAC persiana antitorm perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=1.0, b=0.50 | UN | 1,00 | $ 165.636,54 | $ 165.636,54 | 1,00 | $ 165.636,54 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,20 | Suministro e instalacion de V-13 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño | UN | 3,00 | $ 1.942.522,51 | $ 5.827.567,53 | 1,00 | $ 1.942.522,51 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05**
**BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS**

CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023

| RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|
| FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-8 DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.568-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 12,21 | Suministro e instalacion de V-14 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño | M2 | 1,00 | $ 3.043.179,83 | $ 3.043.179,83 | 1,00 | $ 3.043.179,83 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,22 | Suministro e instalacion de V-15 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño | UN | 1,00 | $ 2.342.409,62 | $ 2.342.409,62 | 1,00 | $ 2.342.409,62 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,23 | Suministro e instalacion de V-16 OAC Rejilla bioclimatica fijo o marco 0047 trat anodizado A3, según planos de diseño | UN | 4,00 | $ 525.412,96 | $ 2.101.651,84 | 1,00 | $ 525.412,96 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,24 | Suministro e instalacion de V-17 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño | UN | 12,00 | $ 1.715.686,68 | $ 20.588.240,16 | 1,00 | $ 1.715.686,68 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 12,25 | Suministro e instalacion de V-18 OAC Fijo o marco 0047 trat. anodizado A3 según planos de diseño | UN | 2,00 | $ 2.971.168,70 | $ 5.942.337,40 | 1,00 | $ 2.971.168,70 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 12 | | $ 282.185.924,92 | | $ 42.264.171,00 | | $ - | | | | $ - |
| 13 | SUBESTRUCTURA Y RELLENOS Y EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 13,1 | Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado. | m3 | 167,00 | $ 51.143,72 | $ 8.541.001,24 | 167,00 | $ 8.541.001,24 | 0,00 | $ - | 83,50 | $ 4.270.500,62 | 83,50 | $ 4.270.500,62 |
| 13,2 | Relleno en Recebo comun Compactado | m3 | 131,00 | $ 102.498,05 | $ 13.427.244,55 | 131,00 | $ 13.427.244,55 | 0,00 | $ - | 68,00 | $ 6.969.867,40 | 68,00 | $ 6.969.867,40 |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 13 | | $ 21.968.245,79 | | $ 21.968.245,79 | | $ - | | $ 11.240.368,02 | | $ 11.240.368,02 |
| 14 | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS | | | | | | | | | | | | |
| 14,1 | Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI | kg | 3.626,00 | $ 5.652,48 | $ 20.495.892,48 | 1,00 | $ 5.652,48 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,2 | Concreto para Zapatas y Vigas de Cimentación f'c=5000PSI | m3 | 34,00 | $ 875.941,15 | $ 29.781.999,10 | 1,00 | $ 875.941,15 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,3 | Acero para Columnas fy=60000 PSI | kg | 6.268,00 | $ 5.652,48 | $ 35.429.744,64 | 1,00 | $ 5.652,48 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,4 | Concreto para Columnas f'c=5000PSI | m3 | 16,00 | $ 1.305.949,01 | $ 20.895.184,16 | 1,00 | $ 1.305.949,01 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,5 | Malla electrosoldada para losa contrapiso | kg | 1.252,00 | $ 5.524,67 | $ 6.916.886,84 | 1,00 | $ 5.524,67 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,6 | Losa de contrapiso en concreto | m3 | 20,00 | $ 584.874,41 | $ 11.697.488,20 | 1,00 | $ 584.874,41 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,7 | Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI | kg | 3.768,00 | $ 5.652,48 | $ 21.298.544,64 | 1,00 | $ 5.652,48 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,8 | Concreto para vigas aereas y losa de Cubierta f'c=5000PSI | m3 | 41,00 | $ 919.401,32 | $ 37.695.454,12 | 1,00 | $ 919.401,32 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,9 | Acero A-50 para cubierta metálica | kg | 14.040,00 | $ 13.183,74 | $ 185.099.709,60 | 1,00 | $ 13.183,74 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 14,10 | Placa en concreto f'c=5000PSI para cubierta metálica | m3 | 204,00 | $ 862.926,18 | $ 176.035.940,72 | 1,00 | $ 862.926,18 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 14 | | $ 545.347.844,50 | | $ 4.584.757,92 | | $ - | | | | $ - |
| 15 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | |
| 15,1 | Suministro e instalación de Mampostería en ladrillo tolete Muros 25 cm. | M2 | 182,38 | $ 114.825,48 | $ 20.941.871,04 | 1,00 | $ 114.825,48 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 15,2 | Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm | ML | 43,60 | $ 91.949,81 | $ 4.009.011,72 | 1,00 | $ 91.949,81 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 15,3 | Suministro e instalación de Poyos muebles h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, fondo 50 cm | ML | 3,00 | $ 118.791,93 | $ 356.375,79 | 1,00 | $ 118.791,93 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 15,4 | Suministro e instalación de cañuela en concreto 2500 psi | ML | 62,00 | $ 83.607,51 | $ 5.183.665,62 | 1,00 | $ 83.607,51 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 15,5 | Suministro e instalación de bordillo en concreto 2500 psi | ML | 123,20 | $ 88.072,06 | $ 10.850.477,79 | 1,00 | $ 88.072,06 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 15,6 | Suministro e instalación de parapetos en concreto 2500 psi, altura y espesor de acuerdo al muro de cada edificio | ML | 41,80 | $ 184.925,20 | $ 7.729.873,36 | 1,00 | $ 184.925,20 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | SUBTOTAL CAPITULO 15 | | $ 49.071.275,32 | | $ 682.171,99 | | $ - | | | | $ - |
| 16 | PAÑETES, ACHIRADOS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 16,1 | Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3. Espesor de 2cm | M2 | 251,60 | $ 41.809,13 | $ 10.519.177,11 | 1,00 | $ 41.809,13 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 16,2 | Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm | M2 | 257,16 | $ 43.156,76 | $ 11.098.192,40 | 1,00 | $ 43.156,76 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 16,3 | Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3 incluye filos y dilataciones e= 2cm, bordes de vanos | ML | 37,70 | $ 44.479,10 | $ 1.676.862,07 | 1,00 | $ 44.479,10 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.635.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Monteria – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.908.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 16,4 | Suministro e instalación de afinado liso para pisos, escalera y cubierta | M2 | 403,66 | $ 25.602,62 | $ 10.334.753,59 | 1,00 | $ 25.602,62 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 16,5 | Suministro e instalación de manto Morter Plast al 80 para impermeabilización cubiertas | M2 | 211,63 | $ 37.363,88 | $ 7.907.317,92 | 1,00 | $ 37.363,88 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 16,6 | Suministro e instalación de aislamiento termico para muros y cubierta | M2 | 194,69 | $ 70.615,14 | $ 13.748.061,61 | 1,00 | $ 70.615,14 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 16 | $ 55.284.364,70 | | $ 263.026,63 | | $ - | | | | $ - |
| 17 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | |
| | PUERTAS | | | | | | | | | | | | |
| 17,1 | Suministro e instalación de Persiana para ventilacion natural antitormenta, modulo de 1 x 1 m , incluye perfil antitormenta en aluminio extruido cal 1/16 espaciado cada 60 cm color blanco mate, incuye elementos de instalacion y alfajia | M2 | 5,10 | $ 273.934,08 | $ 1.397.063,81 | 1,00 | $ 273.934,08 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 17 | $ 1.397.063,81 | | $ 273.934,08 | | $ - | | | | $ - |
| 18 | PISOS | | | | | | | | | | | | |
| 18,1 | Suministro e instalación de Piso esmaltado con endurecedor de quarzo y allanado manual, directamente sobre placa, juntas de dilatación cortadas con discos de pulidor E= 3mm (modulacion según diseño), acabado brillante y sellado. Trafico mediano | M2 | 208,57 | $ 245.961,99 | $ 51.300.292,25 | 1,00 | $ 245.961,99 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 18 | $ 51.300.292,25 | | $ 245.961,99 | | $ - | | | | $ - |
| 19 | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 19,1 | Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos | ML | 19,00 | $ 22.386,45 | $ 425.342,55 | 1,00 | $ 22.386,45 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 19,2 | Suministro e instalación de Koraza gris sobre muro de fachada 3 manos incluye filos,dilataciones y carteras vanos | M2 | 3,60 | $ 33.142,29 | $ 119.312,24 | 1,00 | $ 33.142,29 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 19,3 | Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos | M2 | 253,51 | $ 33.075,52 | $ 8.384.975,08 | 1,00 | $ 33.075,52 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 19,4 | Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre muro interior 3 manos Incluye filos, dilataciones y cartera vanos | M2 | 251,60 | $ 23.825,57 | $ 5.994.513,41 | 1,00 | $ 23.825,57 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| 19,5 | Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre vanos | ML | 18,70 | $ 19.340,97 | $ 361.676,14 | 1,00 | $ 19.340,97 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 19 | $ 15.285.819,42 | | $ 131.770,80 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 20 | VIDRIOS Y ESPEJOS | | | | | | | | | | | | |
| | VENTANAS | | | | | | | | | | | | |
| 20,1 | Suministro e instalacion de V-2 BODE persiana antitorm perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.50, vidrio 6- 12-6 | UN | 2,00 | $ 789.461,88 | $ 1.578.923,76 | 1,00 | $ 789.461,88 | | $ - | 0,00 | | 0,00 | $ - |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 20 | $ 1.578.923,76 | | $ 789.461,88 | | $ - | | $ - | | $ - |
| NP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
| NP 1 | DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | - | $ 15.430,00 | $ - | 10.780,00 | $ 166.335.400,00 | 140,00 | $ 2.160.200,00 | 10.640,00 | $ 164.175.200,00 | 10.780,00 | $ 166.335.400,00 |
| NP 2 | CONCRETO SOLADOS 2500 PSI | M3 | - | $ 575.270,00 | $ - | 23,63 | $ 13.593.630,10 | 2,88 | $ 1.656.777,60 | 18,67 | $ 10.740.290,90 | 21,55 | $ 12.397.068,50 |
| NP 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA ALAMBRE DE PUA 3 HILOS | ML | - | $ 30.400,00 | $ - | 150,00 | $ 4.560.000,00 | 0,00 | $ - | 120,00 | $ 3.648.000,00 | 120,00 | $ 3.648.000,00 |
| NP 4 | MALLA ELECTRO SOLDADA PLACA DE CUBIERTA | KG | - | $ 10.420,00 | $ - | 11.018,24 | $ 114.810.060,80 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL DE SUB BASE TAM MAX 3" | M3 | - | $ 140.000,00 | $ - | 332,50 | $ 46.550.000,00 | 0,00 | $ - | 332,50 | $ 46.550.000,00 | 332,50 | $ 46.550.000,00 |
| NP 6 | CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, ALTAMENTE FLUIDO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 5000 PSI | M3 | - | $ 1.145.827,87 | $ - | 281,88 | $ 322.985.960,00 | 32,83 | $ 37.617.528,97 | 231,63 | $ 265.408.109,53 | 264,46 | $ 303.025.638,50 |

| POLICIA NACIONAL<br>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 05<br>BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS | RADICACIÓN No. | 5 |
|---|---|---|---|
| | CORTE No 5 DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 24 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 | FECHA RADICACIÓN: | 29 MAYO DE 2023 |

| CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22<br>CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10086-22 | OBJETO: | CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM | VR. INICIAL | $ 6.974.591.904,74 | PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 4 DIAS |
| DIRECCIÓN | Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real, Piso 3- 301 | VR. ADICIONAL | | FECHA INICIACIÓN | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| C.C. ó NIT | 901.636.603-5 | VR. ACTUAL | $ 6.974.591.904,74 | FECHA TERMINACIÓN INICIAL | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TELÉFONO | 3113407052 | ANTICIPO | N/A | PLAZO ADICIONAL | 290 DIAS |
| | | ANTICIPO AMORTIZADO | | TIEMPO SUSPENDIDO | - |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | ANTICIPO POR AMORTIZAR | | PLAZO TOTAL | 11 MESES Y 18 DIAS |
| DIRECCIÓN | Calle 52ª No.14-17, Montería – Córdoba | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA | $ 602.283.091,51 | FECHA TERMINACIÓN FINAL | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |
| C.C. ó NIT | 79.508.558-7 | SON: Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil, noventa y un pesos, con cincuenta y un centavos | | | |
| TELÉFONO | 310 654 1925 | | | | |

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 03

| | | | CANTIDADES INICIALES | | | CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | Vr Unitario | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| NP 7 | CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA | M3 | - | $ 1.402.771,16 | $ - | 112,40 | $ 157.671.478,38 | 74,38 | $ 104.338.118,88 | 0,00 | $ - | 74,38 | $ 104.338.118,88 |
| NP 8 | CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI | M3 | - | $ 936.087,61 | $ - | 167,00 | $ 156.326.630,87 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| NP 9 | CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMPACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA | M3 | - | $ 1.353.052,05 | $ - | 471,82 | $ 638.397.018,23 | 100,86 | $ 136.468.829,76 | 0,00 | $ - | 100,86 | $ 136.468.829,76 |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO NO PREVISTOS | $ - | | $ 1.621.230.178,38 | | $ 282.241.455,21 | | $ 490.521.600,43 | | $ 772.763.055,64 |
| | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 5.393.988.785,78 | | $ 5.393.988.785,78 | | $ 470.717.539,29 | | $ 1.436.835.076,63 | | $ 1.907.552.615,91 |
| COSTOS INDIRECTOS | ADMINISTRACION | | 21,00% | | $ 1.132.737.645,01 | | $ 1.132.737.645,01 | | $ 98.850.683,25 | | $ 301.735.366,09 | | $ 400.586.049,34 |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | | $ 53.939.887,86 | | $ 53.939.887,86 | | $ 4.707.175,39 | | $ 14.368.350,77 | | $ 19.075.526,16 |
| | UTILIDADES | | 5,00% | | $ 269.699.439,00 | | $ 269.699.439,00 | | $ 23.535.876,96 | | $ 71.841.753,83 | | $ 95.377.630,80 |
| | IVA SOBRE LA UTILIDAD | | 19,00% | | $ 51.242.893,41 | | $ 51.242.893,41 | | $ 4.471.816,62 | | $ 13.649.933,23 | | $ 18.121.749,85 |
| | | | | SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS | $ 1.507.619.865,28 | | $ 1.507.619.865,28 | | $ 131.565.552,22 | | $ 401.595.403,92 | | $ 533.160.956,15 |
| | | | | SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL | $ 6.901.608.651,06 | | $ 6.901.608.651,06 | | $ 602.283.091,51 | | $ 1.838.430.480,55 | | $ 2.440.713.572,06 |
| 21 | INSPECTORIA Y TRAMITES | | | | | | | | | | | | |
| 21,1 | INSPECTORIA RETIE Y RETILAP | UN | 0,50 | $ 22.127.383,68 | $ 11.063.691,84 | | $ 11.063.691,84 | | | | | | |
| 21,2 | TRAMITE DE CONEXIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED | UN | 1,00 | $ 21.306.000,00 | $ 21.306.000,00 | | $ 21.306.000,00 | | | | | | |
| 21,3 | PROVISIONAL ELECTRICA | UN | 1,00 | $ 28.960.773,44 | $ 28.960.773,44 | | $ 28.960.773,44 | - | $ - | 1,00 | $ 28.960.773,44 | 1,00 | $ 28.960.773,44 |
| | | | | SUBTOTAL CAPITULO 21 | $ 61.330.465,28 | | $ 61.330.465,28 | | $ - | | $ 28.960.773,44 | | $ 28.960.773,44 |
| | COSTOS EQUIPOS + TRÁMITE ANTES DE IVA | | | | $ 61.330.465,28 | | $ 61.330.465,28 | | $ - | | $ 28.960.773,44 | | $ 28.960.773,44 |
| | IVA | 19% | | | $ 11.652.788,40 | | $ 11.652.788,40 | | $ - | | $ 5.502.546,95 | | $ 5.502.546,95 |
| | TOTAL COSTOS EQUIPOS + TRÁMITE | | | | $ 72.983.253,68 | | $ 72.983.253,68 | | $ - | | $ 34.463.320,39 | | $ 34.463.320,39 |
| | | | | VALOR TOTAL PROYECTO | $ 6.974.591.904,74 | | $ 6.974.591.904,74 | | $ 602.283.091,51 | | $ 1.872.893.800,94 | | $ 2.475.176.892,45 |
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | $ 6.974.591.904,74 | 100,00% | $ 6.974.591.904,74 | 8,64% | $ 602.283.091,51 | 26,85% | $ 1.872.893.800,94 | 35,49% | $ 2.475.176.892,45 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | VALOR NETO A PAGAR | | | | $ 6.974.591.904,74 | | $ 6.974.591.904,74 | | $ 602.283.091,51 | | $ 1.872.893.800,94 | | $ 2.475.176.892,45 |

Para constancia se firma el documento por los participantes, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de Mayo del 2023.

EL CONTRATISTA:

ING.DIEGO MEDINA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PONAL LYM
CONTRATISTA DE OBRA

EL INTERVENTOR

ING. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CVN
INTERVENTORÍA

EL CONTRATANTE:

MAYOR - GUSTAVO QUIROZ
SUPERVISOR DIRAF - PONAL

# MEMORIAS DE CÁLCULO

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO N° | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENT ANTE LEGAL: | ING. LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENT ANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | 1.1- REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN | ITEM: | 1,1 — UNIDAD: M2 |


CAPITULO: 1,00 PRELIMINARES

| BLOQUE | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES Largo (m) | Ancho (m) | Área (m2) | Espesor (m) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| A | Zona administraiva | | | | 544,00 | | |
| B | Zona administraiva y cuarto electrico-voz y datos | | | | 463,58 | | |
| C | Centro de atención | | | | 151,17 | | |
| D | Garita de acceso | | | | 15,06 | | |
| E | Cuato de basura 1 | | | | 42,25 | | |
| F | Cuato de basura 2 | | | | 54,29 | | |
| G | Accesos y zonas duras | | | | 6610,52 | | |
| | M-T | | | | | | |
| | Area 1 | | | | 205,54 | | |
| | Area 2 | | | | 754,76 | | |
| | Area 3 | | | | 1135,46 | | |
| | M-AL | | | | | | |
| | Area 1 | | | | 620,39 | | |
| | Area 2 | | | | 959,68 | | |
| | Area 3 | | | | 1256,46 | | |
| | Area 4 | | | | 712,03 | | |
| | Via de acceso a la obra | | 80,00 | 7,00 | 560,00 | | |
| | Via de acceso a Pozo profundo | | 210,00 | 6,50 | 1365,00 | | |
| | TOTAL AREA | | | | 15450,19 | | |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | 1439,00 | | |
| ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES | | | | | 14011,19 | | |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | 15450,19 | | |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

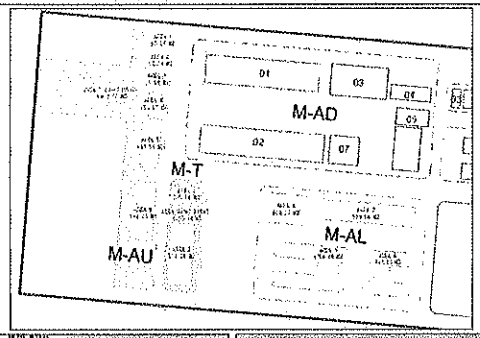

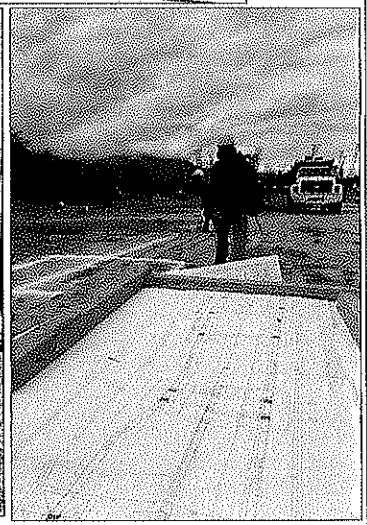

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 15500,00 |
| DIFERENCIA: | 49,81 |
| PORCENTAJE: | 0,32% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

**MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS**

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO | 3- EDIFICIO OAC | | |

| ITEM | 3,1,1 | Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado. | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| BLOQUE | | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Largo (m) | Ancho (m) | Altura (m) | Espesor (m) | Volumen (m3) |
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| OAC | | | | | | | | |
| | BLOQUE D | EXCAVACION PARA ZAPATAS | | | | | | |
| | | TIPO 6 | 6 | 1,90 | 1,90 | 1,60 | | 34,66 |
| | BLOQUE D | EXCAVACION PARA VIGAS CIMENT. | | | | | | |
| | | EJES A, B, C | 3 | 5,00 | 0,50 | 0,60 | 105,21 | 4,50 |
| | | EJES 1 Y 2 | 2 | 9,00 | 0,50 | 0,60 | | 5,40 |
| | BLOQUE E | EXCAVACION PARA ZAPATAS | | | | | | |
| | | TIPO 6 | 8 | 1,90 | 1,90 | 1,60 | | 46,21 |
| | BLOQUE E | EXCAVACION PARA VIGAS CIMENT. | | | | | | |
| | | EJE A | 1 | 4,25 | 0,50 | 0,60 | | 1,28 |
| | | EJES B Y C | 2 | 7,55 | 0,50 | 0,60 | | 4,53 |
| | | EJES 1 Y 5 | 2 | 3,95 | 0,50 | 0,60 | | 2,37 |
| | | EJES 2, 3 Y 4 | 3 | 6,97 | 0,50 | 0,60 | | 6,27 |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | 105,21 | | |
| ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES | | | | | | 2767,95 | | |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | | 2873,16 | | |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA



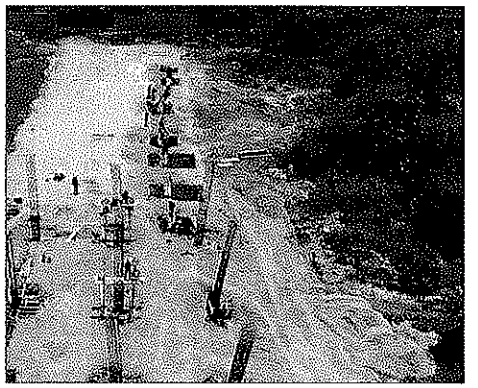



| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 2873,16 |
| DIFERENCIA: | 0,00 |
| PORCENTAJE: | 0,00% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

# MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO | 3- EDIFICIO OAC | | |


| ITEM | 3,1,2 | Relleno en Recebo común Compactado | UNIDAD | M3 |
|---|---|---|---|---|

| BLOQUE | | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES Largo (m) | Ancho (m) | Area (m2) | Espesor (m) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| RELLENOS BAJO PLACA DE | | | | | | | | |
| BLOQUE B | | | 1 | 34,48 | 17,17 | 592,02 | 0,20 | 118,40 |
| BLOQUE C | | | 1 | 16,00 | 11,00 | 176,00 | 0,20 | 35,20 |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | 153,60 | | |
| ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES | | | | | | 3994,46 | | |
| TOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | 4148,06 | | |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

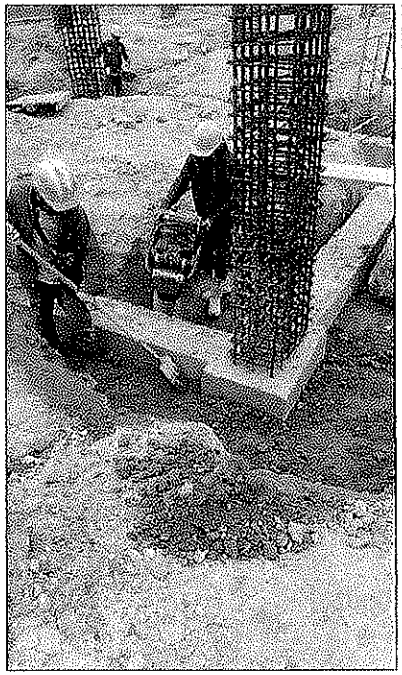



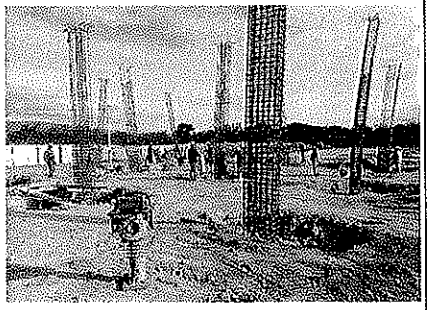

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 4148,08 |
| DIFERENCIA: | 0,02 |
| PORCENTAJE: | 0,00% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCION | 3.2.3- Acero para Columnas fy=60000 PSI | ITEM: 3.2.3 | UNIDAD: KG |

CAPITULO: 3,00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

| BLOQUE | REFERENCIA | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES # De Varillas | # de Acero | Longitud | Repetición | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| C | | ACERO COLUMNAS BLOQUE C | | | | | | |
| | | COLUMNAS A6-A7 | 3,00 | | | | | 453,30 |
| | | COLUMNAS B7-D7 | 2,00 | | | | | 1419,09 |
| TOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 1872,39 |
| ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES | | | | | | | | 26475,81 |
| ACUMULADO TOTAL | | | | | | | | 28348,20 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

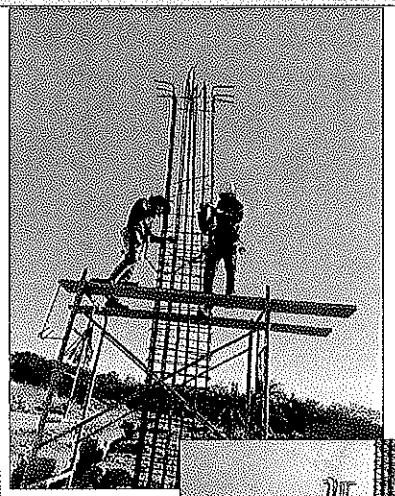

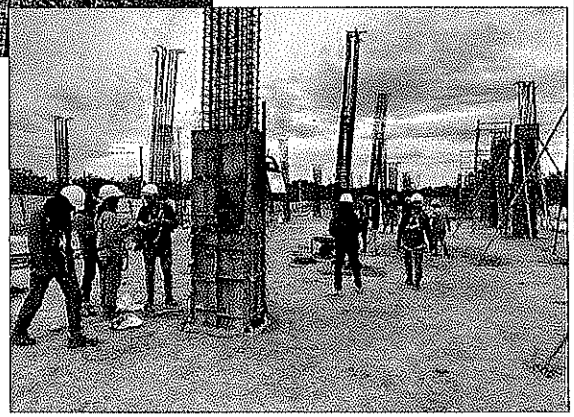

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 30949,76 |
| DIFERENCIA: | 2601,56 |
| PORCENTAJE: | 8,41% |

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA






Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:




COINGEST
CONSULTORIA E INGENIERIA ESTRUCTURAL

# COLUMNAS
# BLOQUE C
# ELEMENTO POR ELEMENTO



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 96 | #3 | 0.70 | 37.6 | |
|   | 5 | #7 | 4.50 | 68.8 | |
|   | 5 | #7 | 6.75 | 103.3 | |
|   | 5 | #7 | 7.95 | 121.6 | |
|   | 5 | #7 | 3.25 | 49.7 | |

A-6, A-7 (Son 2) Peso/Elemento= 226.66Kg Peso 2 elementos=453.32Kg

| DIAGRAMA | CANTIDAD | DIAMETRO | LONGITUD | PESO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 87 | #3 | 1.14 | 55.5 | (Total =174) |
|   | 174 | #3 | 0.50 | 48.7 | (Total =348) |
|   | 8 | #6 | 6.80 | 122.4 | (Total =16) |








B-7, D-7 (Son 2) Peso/Elemento= 709.55Kg Peso 2 elementos=1419.09Kg

| DIAGRAMA | CANTIDAD | DIAMETRO | LONGITUD | PESO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|

COINGEST
CONSULTORIA E INGENIERIA ESTRUCTURAL

# COLUMNAS
# BLOQUE C
# ELEMENTO POR ELEMENTO



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   b=0.32 h=0.62 g=0.13 | 96 | #3 | 2.14 | 115.0 | (Total =192) |
|   h=0.34 g=0.13 | 384 | #3 | 0.60 | 129.0 | (Total =768) |
|   h=0.64 g=0.13 | 96 | #3 | 0.90 | 48.4 | (Total =192) |
|   | 7 | #6 | 4.50 | 70.9 | (Total =14) |
|   | 7 | #6 | 6.75 | 106.3 | (Total =14) |
|   | 7 | #7 | 7.95 | 170.3 | (Total =14) |
|   | 7 | #7 | 3.25 | 69.6 | (Total =14) |

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | 3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI | ITEM: 3,2,10 | UNIDAD KG |

CAPITULO: 3,00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

| BLOQUE | REFERENCIA | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES # De Varillas | # de Acero | Longitud | Repetición | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| A | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE A | | | | | | |
| NIVEL 2 | | VIGA 201 A | 1,00 | | | | | 782,63 |
| | | VIGA 202 A | 1,00 | | | | | 296,54 |
| | | VIGA 203 A | 1,00 | | | | | 307,95 |
| | | VIGA 204 A | 1,00 | | | | | 994,81 |
| | | VIGA 205 A | 1,00 | | | | | 201,52 |
| | | VIGA 206 A | 1,00 | | | | | 201,96 |
| | | VIGA 207 A | 1,00 | | | | | 272,66 |
| | | VIGA 208 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 209 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 210 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 211 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 212 A | 1,00 | | | | | 260,64 |
| | | VIGA 213 A | 1,00 | | | | | 199,91 |
| | | VIGA 214 A | 1,00 | | | | | 236,06 |
| | | VIGA 215 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 216 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 217 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 218 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 219 A | 1,00 | | | | | 260,64 |
| | | VIGA 220 A | 1,00 | | | | | 201,78 |
| A | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE A | | | | | | |
| NIVEL 3 | | VIGA 301 A | 1,00 | | | | | 161,47 |
| | | VIGA 302 A | 1,00 | | | | | 224,91 |
| | | VIGA 303 A | 1,00 | | | | | 269,87 |
| | | VIGA 304 A | 1,00 | | | | | 304,40 |
| | | VIGA 305 A | 1,00 | | | | | 208,07 |
| | | VIGA 306 A | 1,00 | | | | | 268,49 |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 7205,75 |
| ACUMUDADO ANTERIOR | | | | | | | | 0,00 |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | | | | 7205,75 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

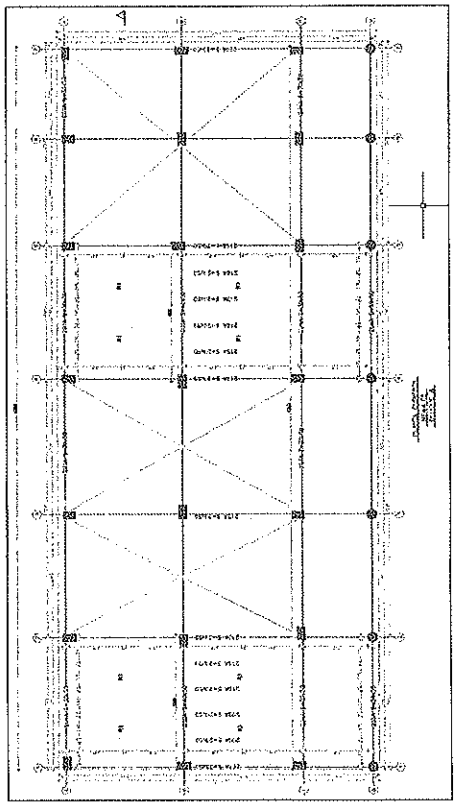

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 36925,36 |
| DIFERENCIA: | 29719,61 |
| PORCENTAJE: | 80,49% |

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10176-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | 3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI | ITEM: 3,2,10 | UNIDAD: KG |

CAPITULO: 3,00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

| BLOQUE | REFERENCIA | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES # De Varillas | # de Acero | Longitud | Repetición | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE A | | | | | | |
| NIVEL 3 | | VIGA 307 A | 1,00 | | | | | 217,10 |
| | | VIGA 308 A | 1,00 | | | | | 323,09 |
| | | VIGA 309 A | 1,00 | | | | | 261,42 |
| | | VIGA 310 A | 1,00 | | | | | 205,74 |
| | | VIGA 311 A | 1,00 | | | | | 199,11 |
| | | VIGA 312 A | 1,00 | | | | | 199,11 |
| | | VIGA 313 A | 1,00 | | | | | 262,91 |
| | | VIGA 314 A | 1,00 | | | | | 294,57 |
| | | VIGA 315 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 316 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 317 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 318 A | 1,00 | | | | | 269,85 |
| | | VIGA 319 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 320 A | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 321 A | 1,00 | | | | | 257,68 |
| | | | | | | | | |
| A | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE A | | | | | | |
| NIVEL 4 | | VIGA 401 A | 1,00 | | | | | 241,13 |
| | | VIGA 402 A | 1,00 | | | | | 318,17 |
| | | VIGA 403 A | 1,00 | | | | | 241,13 |
| | | VIGA 404 A | 1,00 | | | | | 218,62 |
| | | VIGA 405 A | 1,00 | | | | | 157,51 |
| | | VIGA 406 A | 1,00 | | | | | 157,51 |
| | | VIGA 407 A | 1,00 | | | | | 157,51 |
| | | VIGA 408 A | 1,00 | | | | | 157,51 |
| | | VIGA 409 A | 1,00 | | | | | 215,66 |
| | | | | | | | | |
| A | | ACERO VIGAS RIOSTRAS BLOQUE A | 1,00 | | | | | 704,59 |
| | | | | | | | | |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 6029,57 |
| ACUMUDADO ANTERIOR | | | | | | | | 7205,75 |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | | | | 13235,32 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

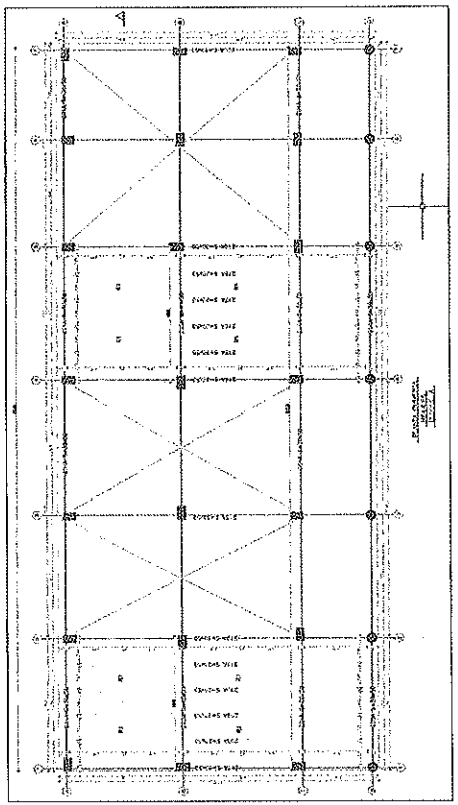

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 36925,36 |
| DIFERENCIA: | 23690,04 |
| PORCENTAJE: | 64,16% |

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | 3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI | ITEM: 3,2,10 | UNIDAD KG |

CAPITULO: 3,00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

| BLOQUE | REFERENCIA | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES # De Varillas | # de Acero | Longitud | Repetición | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| B | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE B | | | | | | |
| NIVEL 2 | | VIGA 201 B | 1,00 | | | | | 248,43 |
| | | VIGA 202 B | 1,00 | | | | | 248,81 |
| | | VIGA 203 B | 1,00 | | | | | 252,86 |
| | | VIGA 204 B | 1,00 | | | | | 289,74 |
| | | VIGA 205 B | 1,00 | | | | | 330,68 |
| | | VIGA 206 B | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 207 B | 1,00 | | | | | 178,72 |
| | | VIGA 208 B | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 209 B | 1,00 | | | | | 257,45 |
| B | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE B | | | | | | |
| NIVEL 3 | | VIGA 301 B | 1,00 | | | | | 132,41 |
| | | VIGA 302 B | 1,00 | | | | | 176,86 |
| | | VIGA 303 B | 1,00 | | | | | 219,24 |
| | | VIGA 304 B | 1,00 | | | | | 132,41 |
| | | VIGA 305 B | 1,00 | | | | | 170,51 |
| | | VIGA 306 B | 1,00 | | | | | 237,51 |
| | | VIGA 307 B | 1,00 | | | | | 159,07 |
| | | VIGA 308 B | 1,00 | | | | | 159,07 |
| | | VIGA 309 B | 1,00 | | | | | 159,07 |
| | | VIGA 310 B | 1,00 | | | | | 257,00 |
| B | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE B | | | | | | |
| NIVEL 4 | | VIGA 401 B | 1,00 | | | | | 305,88 |
| | | VIGA 402 B | 1,00 | | | | | 208,85 |
| | | VIGA 403 B | 1,00 | | | | | 364,21 |
| | | VIGA 404 B | 1,00 | | | | | 340,53 |
| | | VIGA 405 B | 1,00 | | | | | 307,83 |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 5525,00 |
| ACUMUDADO ANTERIOR | | | | | | | | 13235,32 |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | | | | 18760,32 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

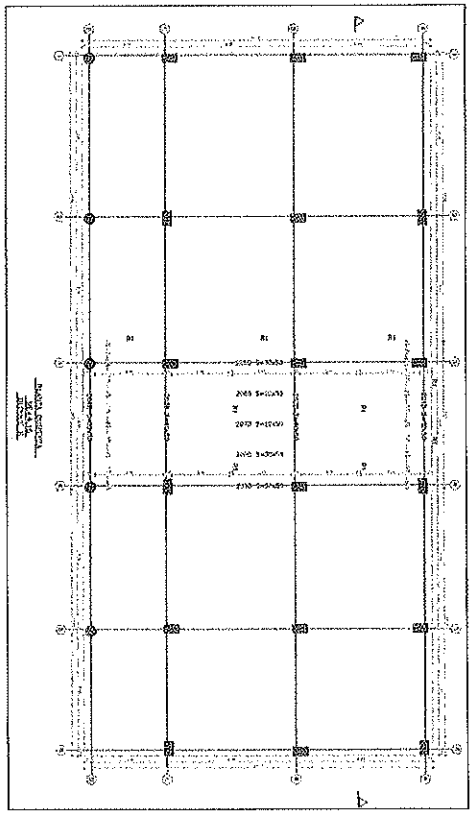

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 36925,36 |
| DIFERENCIA: | 18165,04 |
| PORCENTAJE: | 49,19% |

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | 3.2.10- Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI | ITEM: 3,2,10 | UNIDAD: KG |

CAPITULO: 3,00 EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

| BLOQUE | REFERENCIA | LOCALIZACION | CANTIDAD (Und) | DIMENSIONES # De Varillas | # de Acero | Longitud | Repetición | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| B | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE B | | | | | | |
| NIVEL 4 | | VIGA 406 B | 1,00 | | | | | 274,90 |
| | | VIGA 407 B | 1,00 | | | | | 288,35 |
| | | VIGA 408 B | 1,00 | | | | | 274,71 |
| | | VIGA 409 B | 1,00 | | | | | 341,07 |
| | | VIGA 410 B | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 411 B | 1,00 | | | | | 196,27 |
| | | VIGA 412 B | 1,00 | | | | | 196,27 |
| | | VIGA 413 B | 1,00 | | | | | 196,27 |
| | | VIGA 414 B | 1,00 | | | | | 307,29 |
| | | VIGA 415 B | 1,00 | | | | | 262,59 |
| | | VIGA 416 B | 1,00 | | | | | 196,27 |
| | | VIGA 417 B | 1,00 | | | | | 196,27 |
| | | VIGA 418 B | 1,00 | | | | | 196,27 |
| | | VIGA 419 B | 1,00 | | | | | 196,27 |
| | | VIGA 420 B | 1,00 | | | | | 394,55 |
| B | | ACERO VIGAS AEREAS BLOQUE B | | | | | | |
| NIVEL 5 | | VIGA 501 B | 1,00 | | | | | 311,79 |
| | | VIGA 502 B | 1,00 | | | | | 281,50 |
| | | VIGA 503 B | 1,00 | | | | | 342,03 |
| | | VIGA 504 B | 1,00 | | | | | 314,28 |
| | | VIGA 505 B | 1,00 | | | | | 466,04 |
| | | VIGA 506 B | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 507 B | 1,00 | | | | | 193,93 |
| | | VIGA 508 B | 1,00 | | | | | 190,81 |
| | | VIGA 509 B | 1,00 | | | | | 190,81 |
| | | VIGA 510 B | 1,00 | | | | | 329,73 |
| B | | ACERO VIGAS RIOSTRAS BLOQUE B | 1,00 | | | | | 668,99 |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 7195,12 |
| ACUMUDADO ANTERIOR | | | | | | | | 18760,32 |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | | | | 25955,44 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

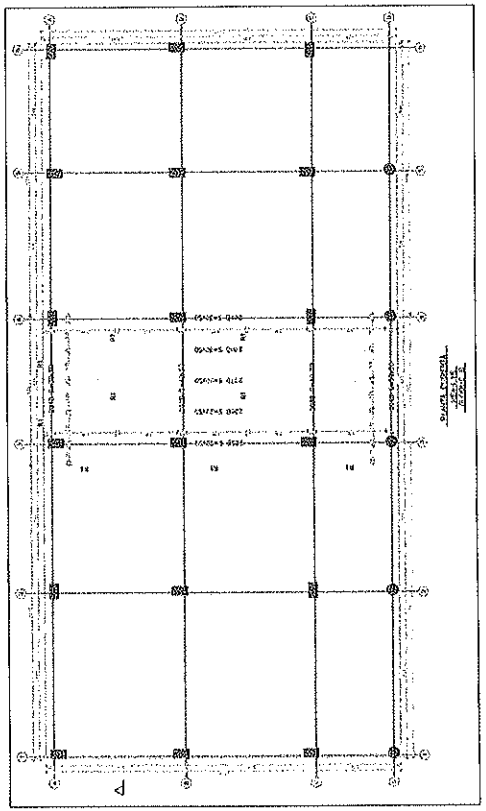

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 36925,36 |
| DIFERENCIA: | 10969,92 |
| PORCENTAJE: | 29,71% |

SE ADJUNAN CARTILLAS DE DESPIECE POR ELEMENTO Y ESQUEMAS AMPLIADOS DE LOS BLOQUES RELACIONADOS EN LA MEMORIA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:


DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:


DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

# BLOQUE A

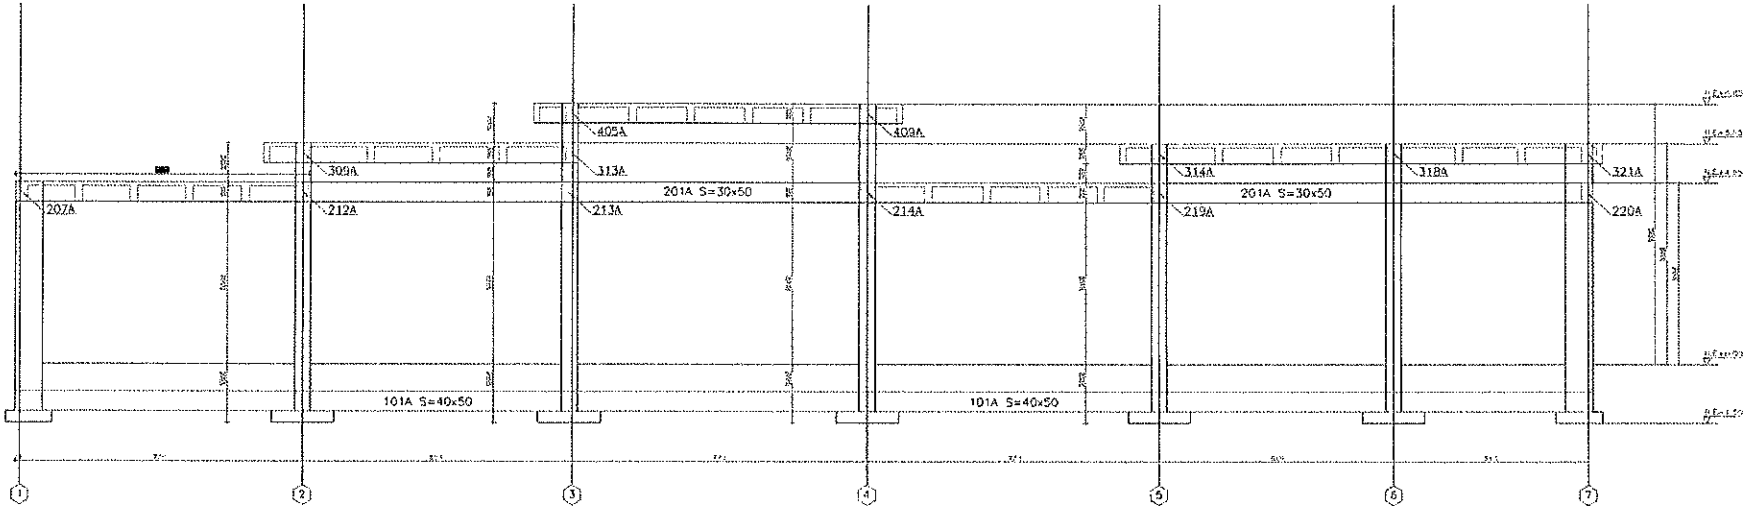



CORTE A–A

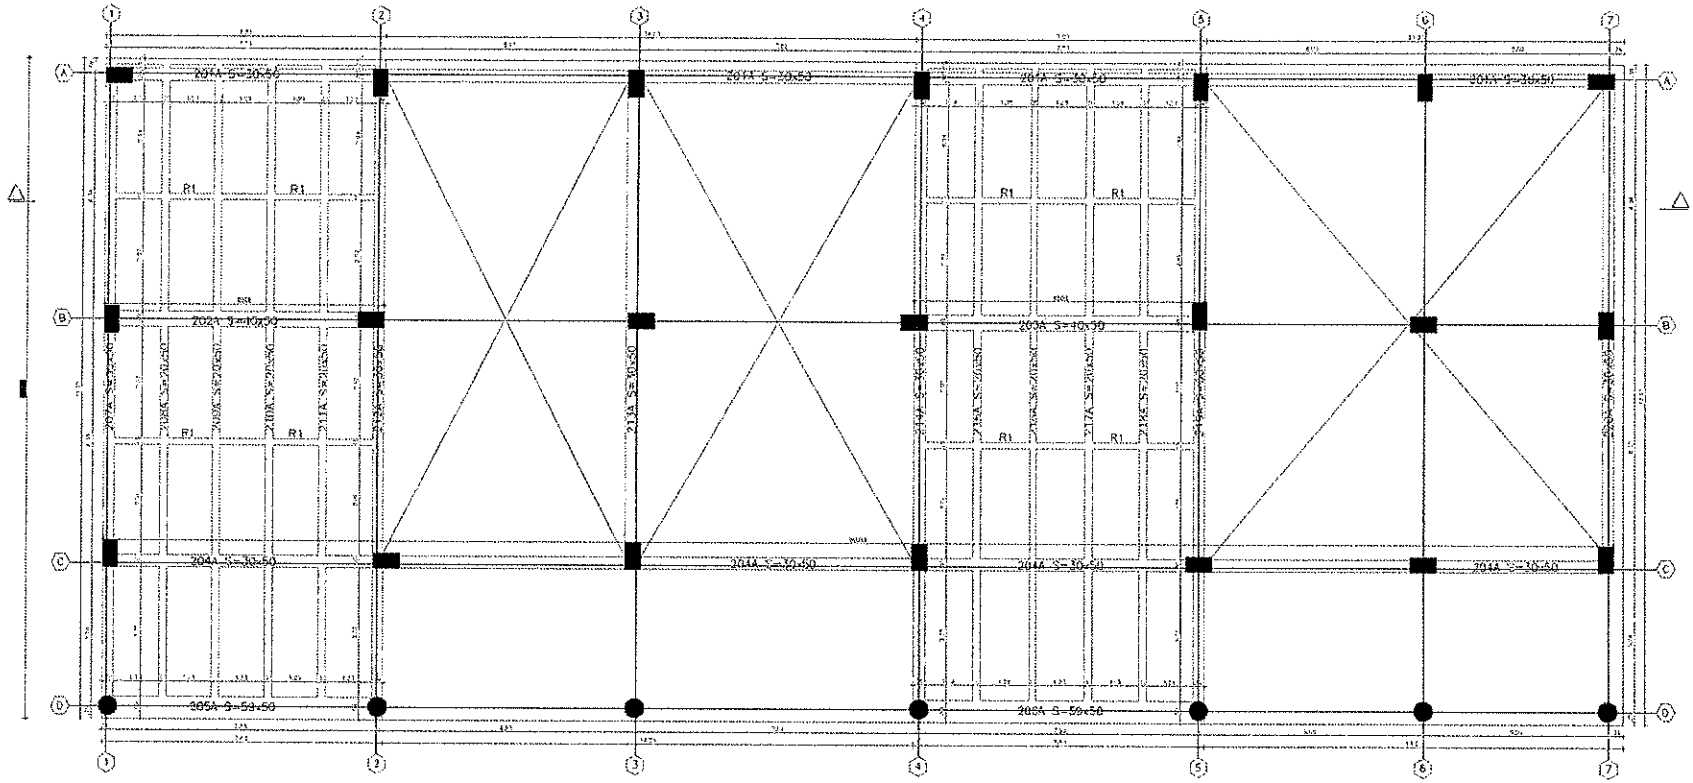
R1
R1
R1

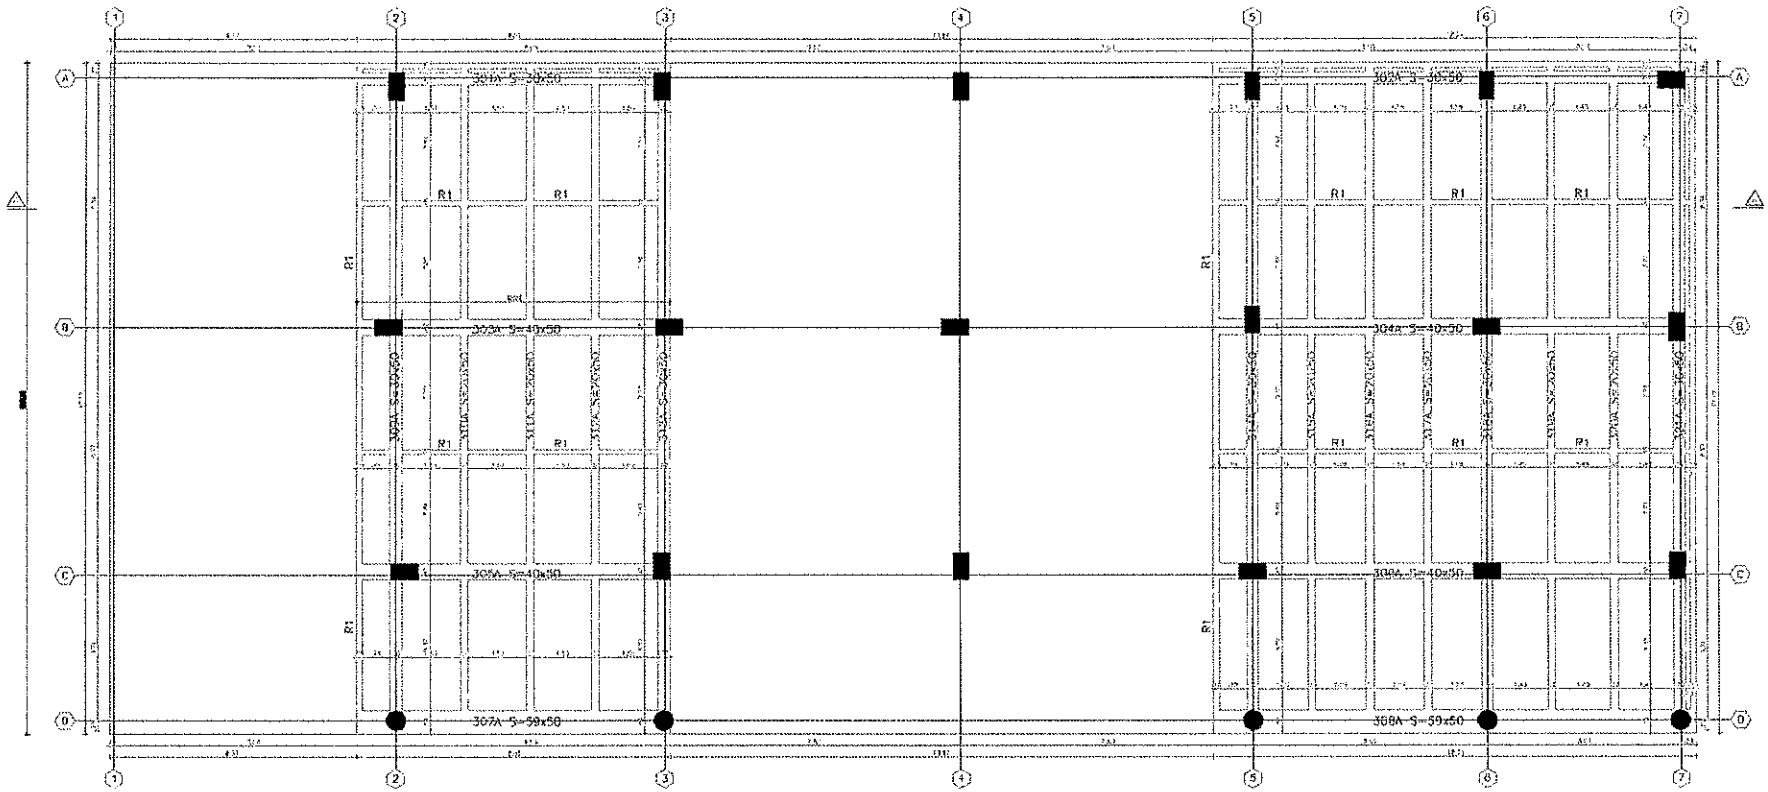



PLANTA CUBIERTA
NF+5.65
BLOQUE A

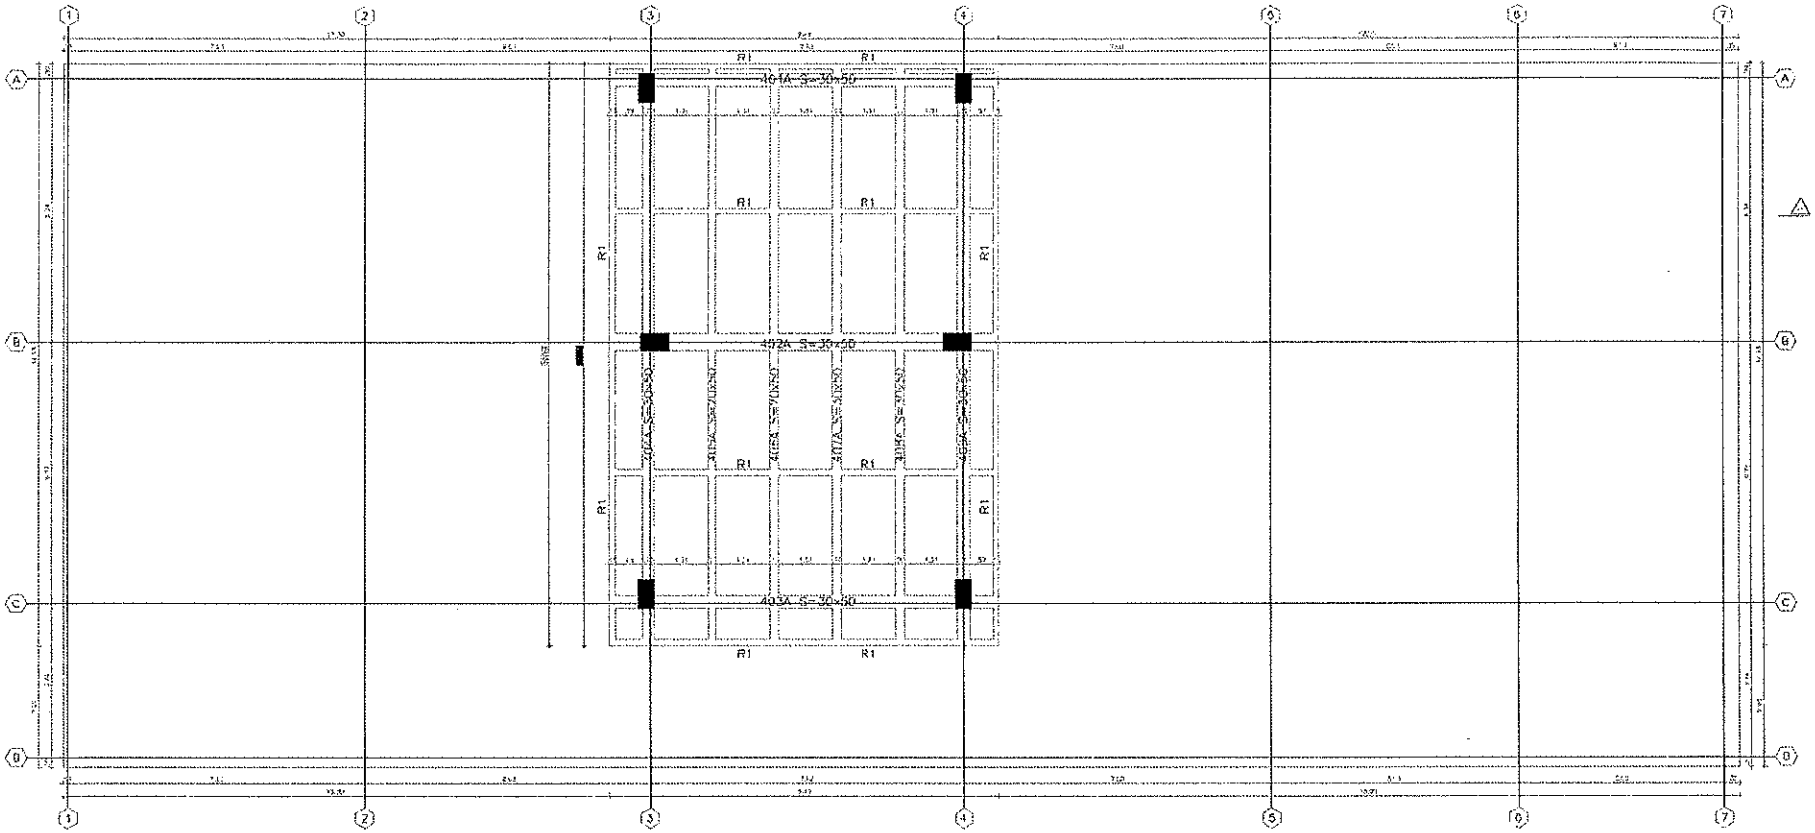



PLANTA CUBIERTA
NE+6.65
BLOQUE A


# BLOQUE B

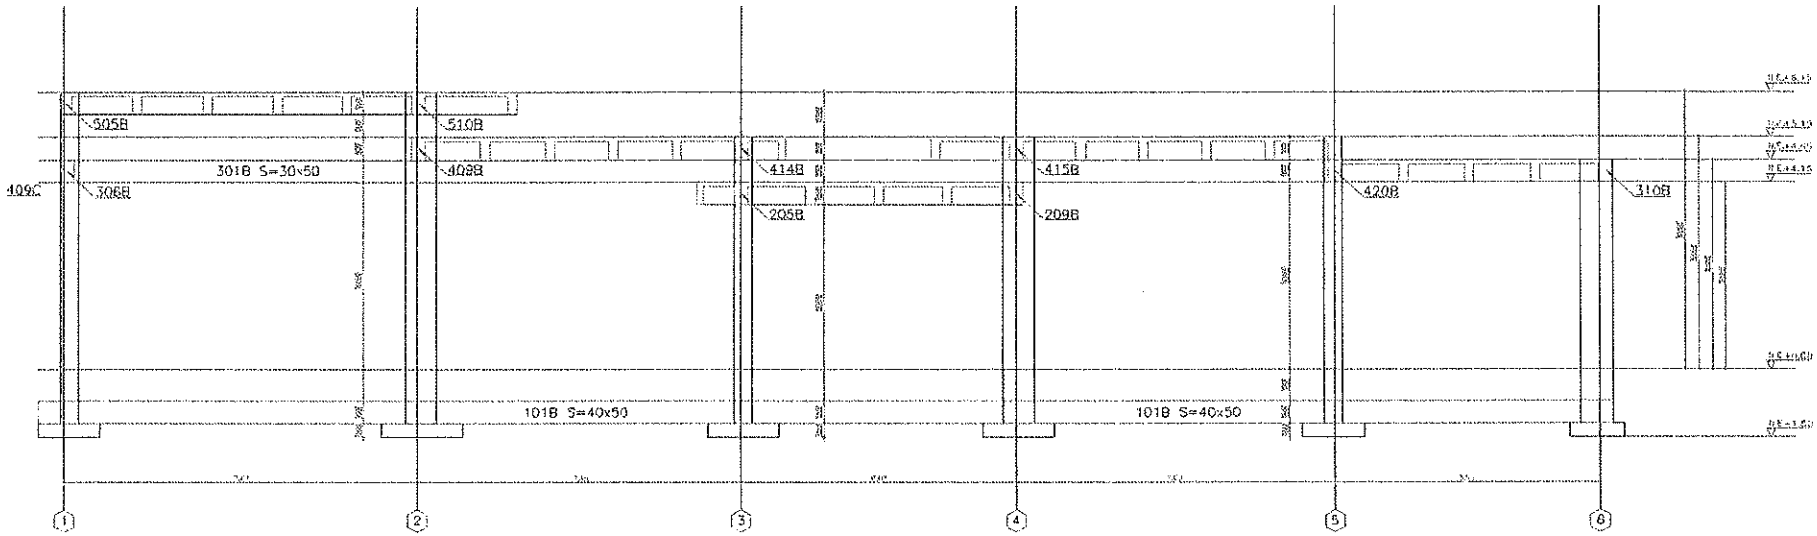



CORTE A--A

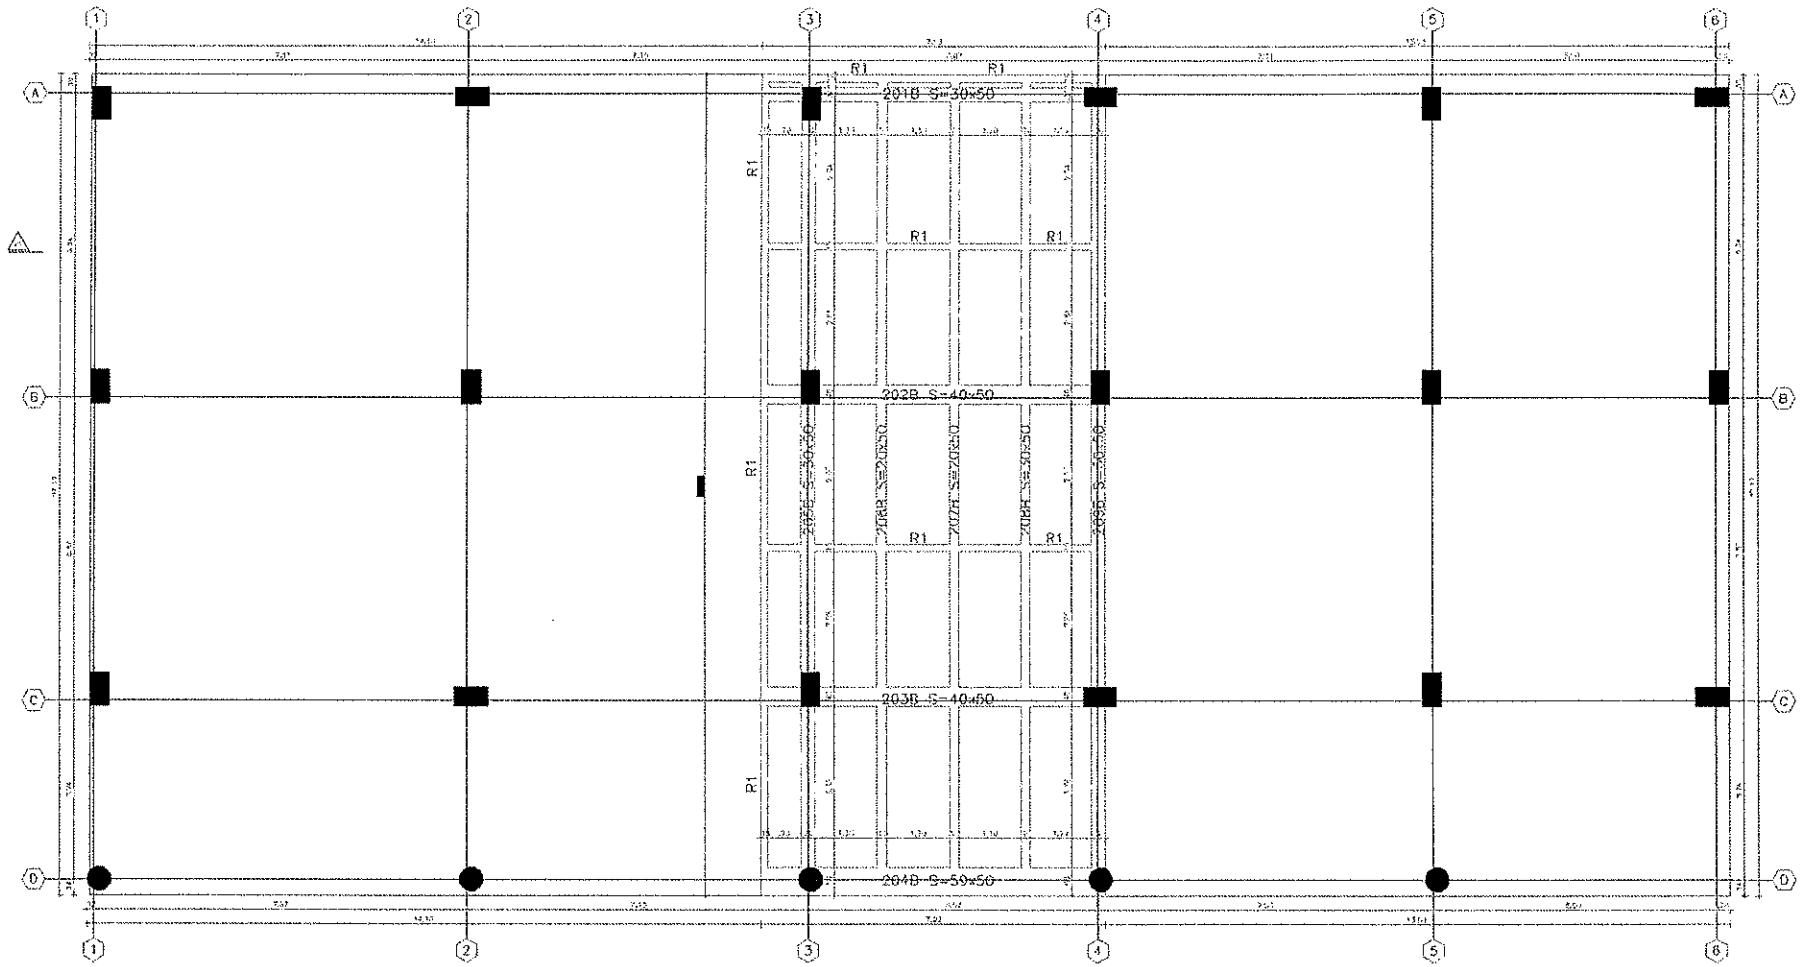


PLANTA CUBIERTA
NE+4.15
BLOQUE B

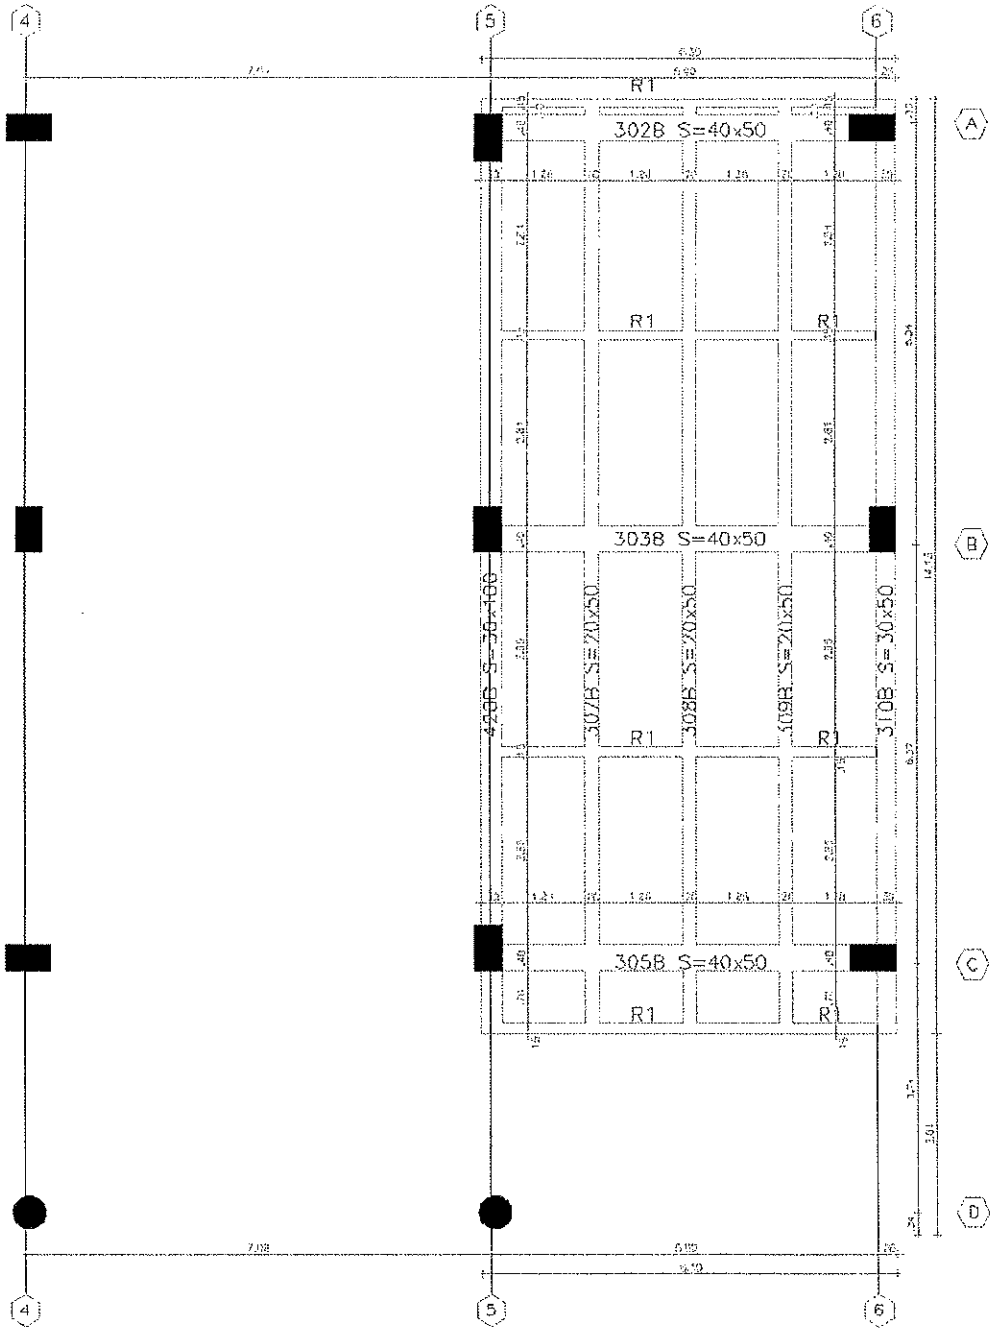

4
5
6
A
B
C
D
R1
302B S=40x50
303B S=40x50
305B S=40x50
420B S=30x100
307B S=20x50
308B S=20x50
309B S=20x50
310B S=30x50

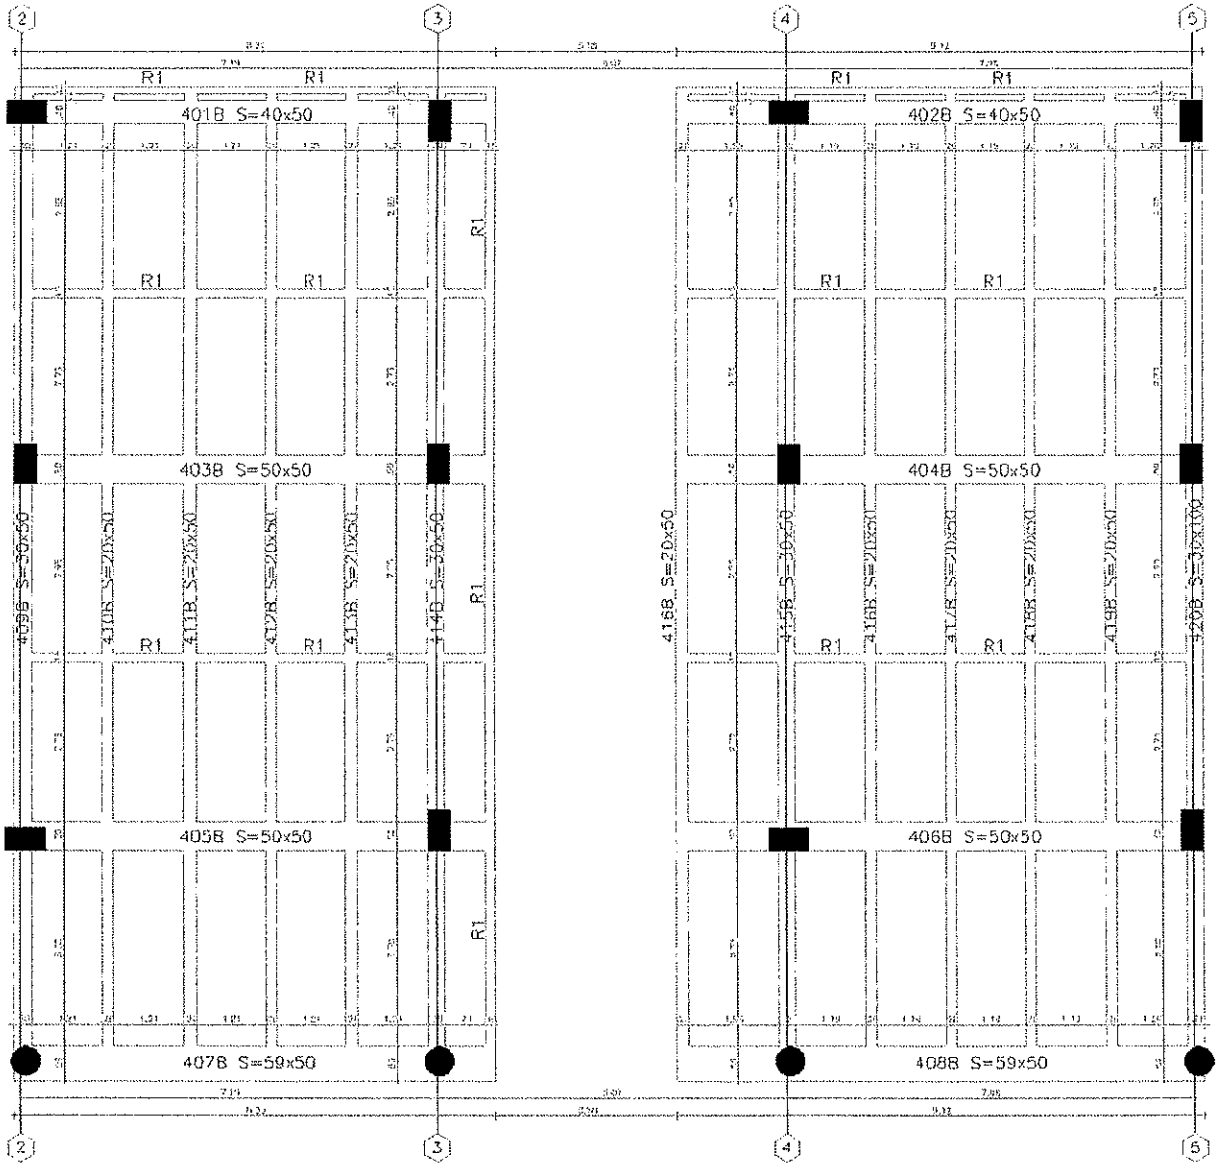


PLANTA CUBIERTA

NE+5.15

BLOQUE B

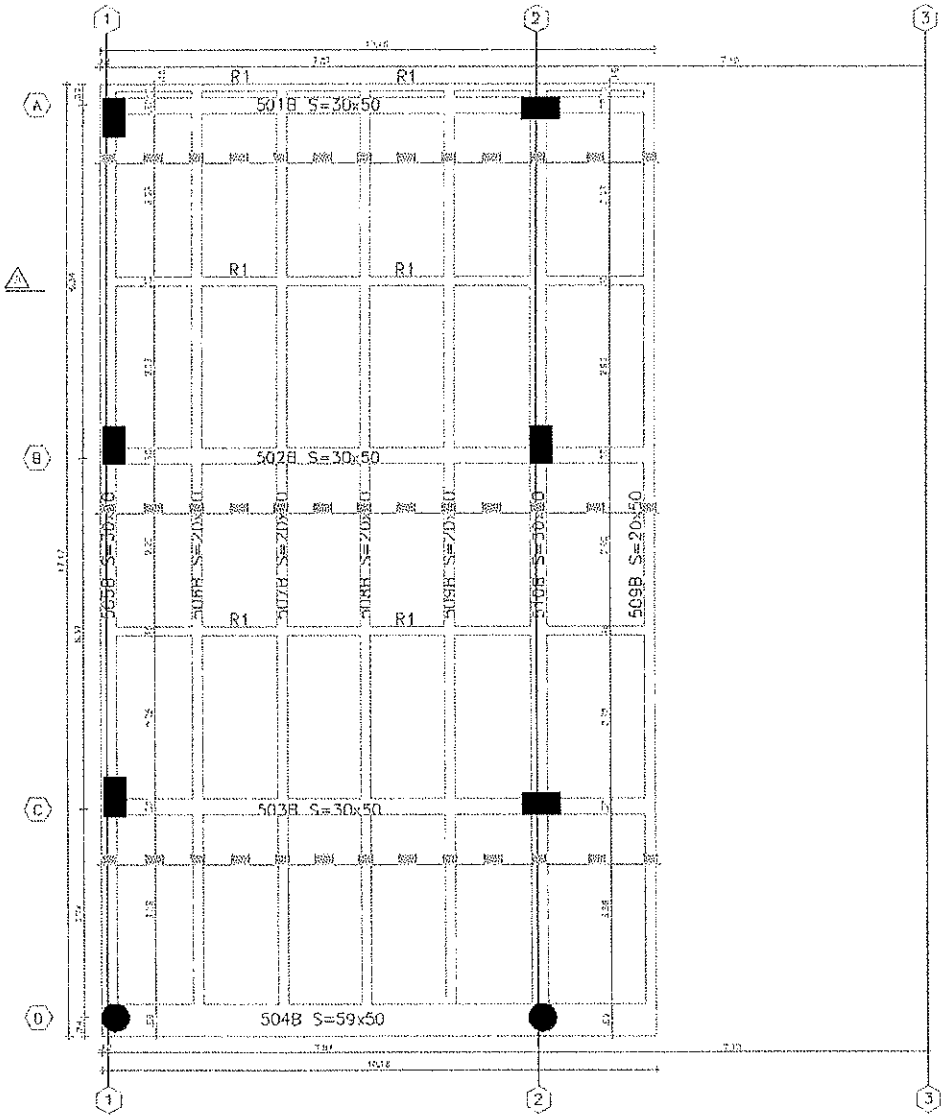


PLANTA CUBIERTA
NE+6.15
BLOQUE B

MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL: | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCION | DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL | ITEM: NP 1 | UNIDAD: M2 |


CAPITULO: NO PREVISTOS — EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE OAC

| BLOQUE | REFERENCIA | LOCALIZACIÓN: | CANTIDAD (und) | DIMENSIONES Largo (m) | Ancho (m) | Área (m2) | Espesor (m) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EDIFICIO OFICINA ATENCION AL CLIENTE | | | | | | |
| OAC | | | | | | | | |
| | DESCAPOTE ZONA DE BLOQYES A,B,C,D,E | | | | | | | |
| | | DESCAPOTE PARA ESTRUCTURA DE BLOQUES A,B,C,D,E DEL K0+000 AL K0+200 | 1,00 | 200,00 | 40,00 | 8000,00 | | |
| | | DESCAPOTE ZONA DE CAMPAMENTO | 1,00 | 40,00 | 10,00 | 400,00 | | |
| | | DESCAPOTE PARA ACCESO A POZO | 1,00 | 7,00 | 220,00 | 1540,00 | | |
| | | DESCAPOTE PARA ACCESO PRINCIPAL | 1,00 | 70,00 | 12,00 | 840,00 | | |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 10780,00 |
| AREA QUE RESTA ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES | | | | | | | | 10640,00 |
| TOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 140,00 |

ESQUEMA / FOTOGRAFÍA

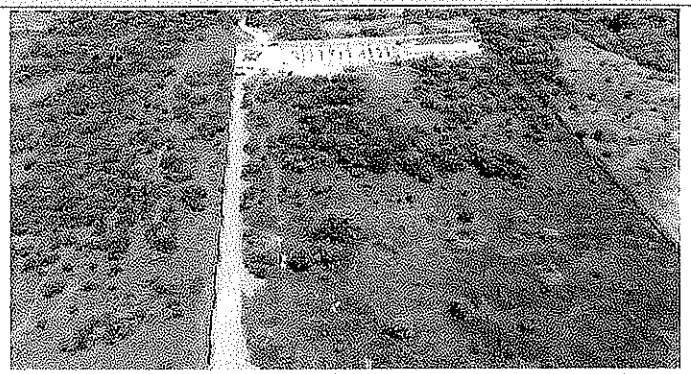



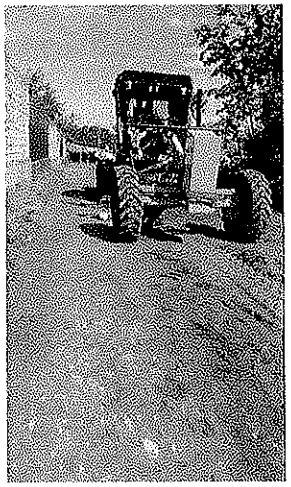

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 10780,00 |
| DIFERENCIA: | 0,00 |
| PORCENTAJE: | 0,00% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

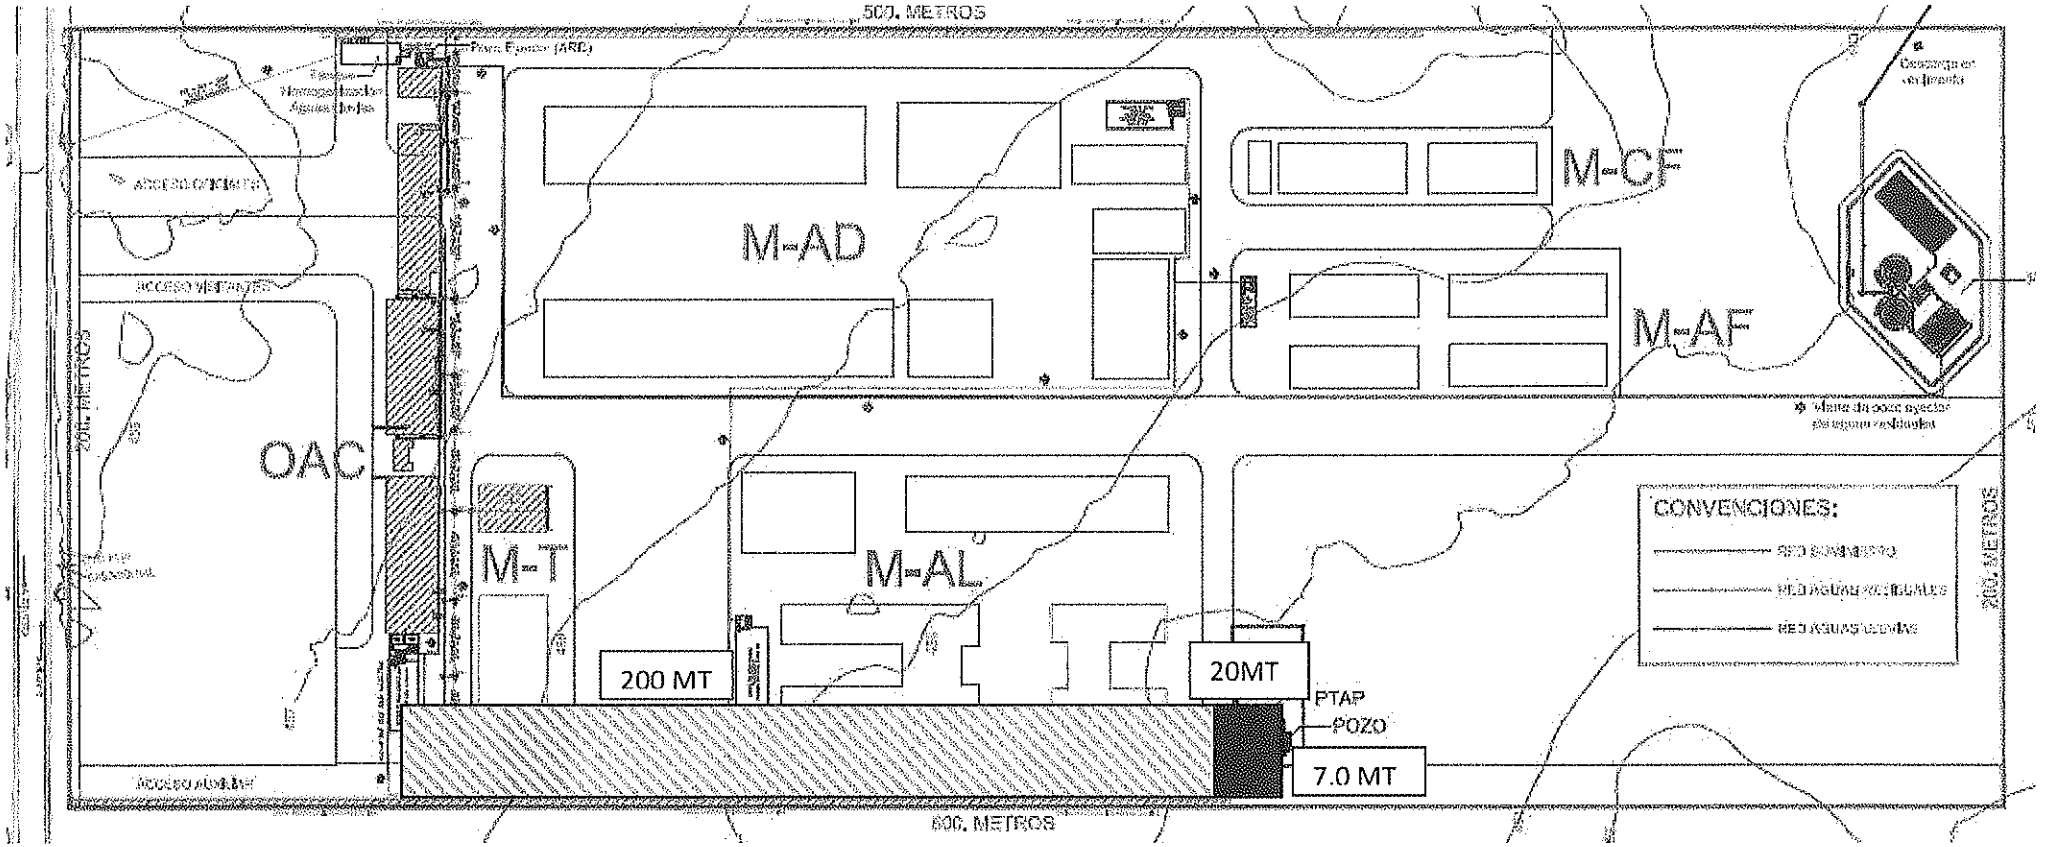
500. METROS
M-AD
M-CF
M-AF
OAC
M-T
M-AL
200 MT
20MT
PTAP
POZO
7.0 MT
CONVENCIONES:
600. METROS
200. METROS

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


**MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PRESTOS**

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | CONCRETO SOLADOS 2500 PSI | ITEM: NP 2 | UNIDAD M3 |
| CAPITULO: NO PREVISTOS | | FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022 | FECHA FINAL: 06/10/20232 |

| LOCALIZACION | EJES | # ELEMENTOS | DIMENSIONES L | A | H | VOLUMEN | VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS | # COLUMNAS DECUENTO | VOLUMEN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE C | | | | | | | | | |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE A 1-2 | 1 | 6,00 | 0,40 | 0,05 | 0,12 | 0,008 | 2,00 | 0,10 |
| BLOQUE C OAC S20X50 | EJE A-B ENTRE 5-6 | 1 | 4,55 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 |
| BLOQUE C OAC S30X50 | EJE A-B ENTRE 6-7 | 1 | 6,93 | 0,30 | 0,05 | 0,10 | 0,008 | 2,00 | 0,09 |
| BLOQUE C OAC S40X60 | EJE A2-B3 | 1 | 9,39 | 0,40 | 0,05 | 0,19 | | | 0,19 |
| BLOQUE C OAC S40X60 | EJE B3-B8 | 1 | 27,27 | 0,40 | 0,05 | 0,55 | 0,008 | 6,00 | 0,50 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE C 1-2 | 1 | 5,20 | 0,40 | 0,05 | 0,10 | | | 0,10 |
| BLOQUE C OAC S40X60 | EJE D ENTRE 1-8 | 1 | 42,48 | 0,40 | 0,05 | 0,85 | 0,008 | 8,00 | 0,79 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE 1 Y 2 ENTRE A-D | 2 | 9,05 | 0,40 | 0,05 | 0,18 | 0,008 | 3,00 | 0,34 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJES 3, 4 Y 8 ENTRE B-D | 2 | 7,15 | 0,40 | 0,05 | 0,14 | 0,008 | 2,00 | 0,27 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE 5 B-D | 1 | 8,00 | 0,40 | 0,05 | 0,16 | 0,008 | 2,00 | 0,14 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJES 6 Y 7 ENTRE B-D | 2 | 8,55 | 0,40 | 0,05 | 0,17 | 0,008 | 3,00 | 0,32 |
| TOTAL PRESENTE ACTA | | | | | | | | 2,88 | |
| ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES | | | | | | | | 18,67 | |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | | | | 21,55 | |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

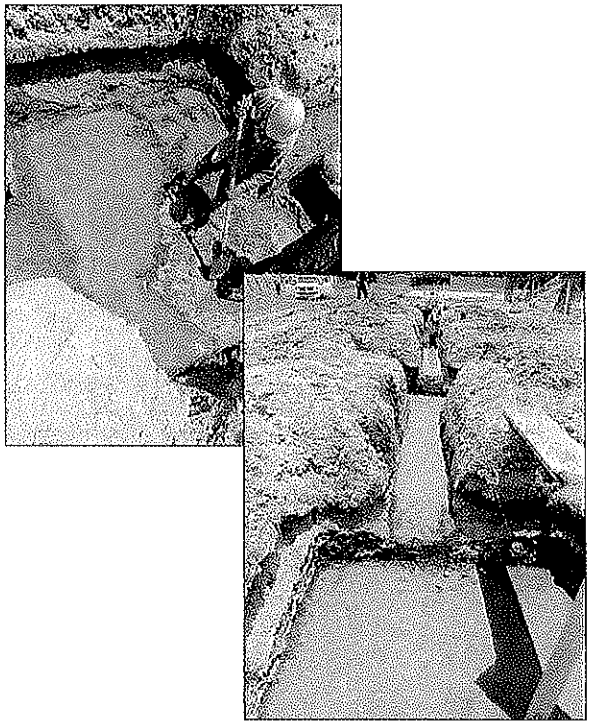

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 23,63 |
| DIFERENCIA: | 2,08 |
| PORCENTAJE: | 8,79% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:
DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:
DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


**MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS**

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 5000 PSI | ITEM: NP 6 | UNIDAD: M3 |
| CAPITULO: | 21 - NO PREVISTOS | FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022 | FECHA FINAL: 06/10/20232 |

| LOCALIZACION | EJES | # ELEMENTOS | DIMENSIONES L | A | H | VOLUMEN | VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS | # COLUMNAS DECUENTO | VOLUMEN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGAS DE CIMENTACION BLOQUE C | | | | | | | | | |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE A 1-2 | 1 | 6,00 | 0,40 | 0,50 | 1,20 | 0,08 | 2,00 | 1,04 |
| BLOQUE C OAC S20X50 | EJE A-B ENTRE 5-6 | 1 | 4,55 | 0,20 | 0,50 | 0,46 | | | 0,46 |
| BLOQUE C OAC S30X50 | EJE A-B ENTRE 6-7 | 1 | 6,93 | 0,30 | 0,50 | 1,04 | 0,08 | 2,00 | 0,88 |
| BLOQUE C OAC S40X60 | EJE A2-B3 | 1 | 9,39 | 0,40 | 0,60 | 2,25 | | | 2,25 |
| BLOQUE C OAC S40X80 | EJE B3-B8 | 1 | 27,27 | 0,40 | 0,60 | 6,54 | 0,08 | 6,00 | 6,06 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE C 1-2 | 1 | 5,20 | 0,40 | 0,50 | 1,04 | | | 1,04 |
| BLOQUE C OAC S40X60 | EJE D ENTRE 1-8 | 1 | 42,48 | 0,40 | 0,60 | 10,20 | 0,08 | 8,00 | 0,00 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE 1 Y 2 ENTRE A-D | 2 | 9,05 | 0,40 | 0,50 | 1,81 | 0,08 | 3,00 | 0,00 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJES 3, 4 Y 8 ENTRE B-D | 2 | 7,15 | 0,40 | 0,50 | 1,43 | 0,08 | 2,00 | 2,54 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJE 5 B-D | 1 | 8,00 | 0,40 | 0,50 | 1,60 | 0,08 | 2,00 | 1,44 |
| BLOQUE C OAC S40X50 | EJES 6 Y 7 ENTRE B-D | 2 | 8,55 | 0,40 | 0,50 | 1,71 | 0,08 | 3,00 | 2,94 |
| ZAPATAS BLOQUE D | | | | | | | | | |
| BLOQUE D OAC ZAPATAS T6 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 | 6 | 1,50 | 1,50 | 0,45 | 1,01 | | | 6,08 |
| ZAPATAS BLOQUE E | | | | | | | | | |
| BLOQUE D OAC ZAPATAS T6 | A2, A4, B1, B3, B5, C1, C3, C5 | 8 | 1,50 | 1,50 | 0,45 | 1,01 | | | 8,10 |
| TOTALES PRESENTE ACTA: | | | | | | | | | 32,83 |
| ACUMULADO ACTAS PARCIALES ANTERIORES | | | | | | | | | 231,63 |
| ACUMULADO TOTAL: | | | | | | | | | 264,46 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

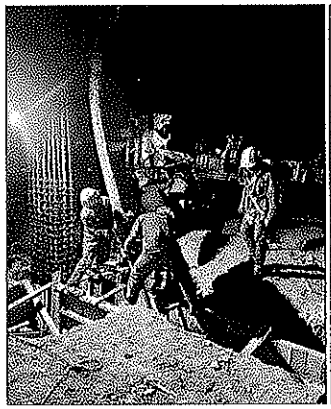



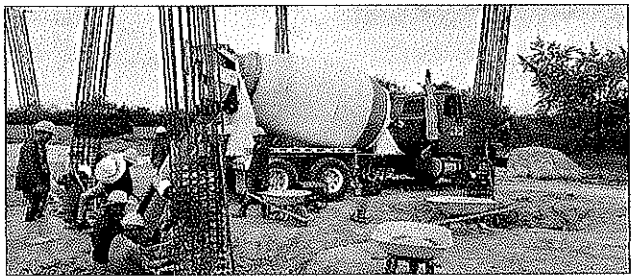

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 281,88 |
| DIFERENCIA: | 17,42 |
| PORCENTAJE: | 6,18% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:


DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:


DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

PLANTA CIMENTACION

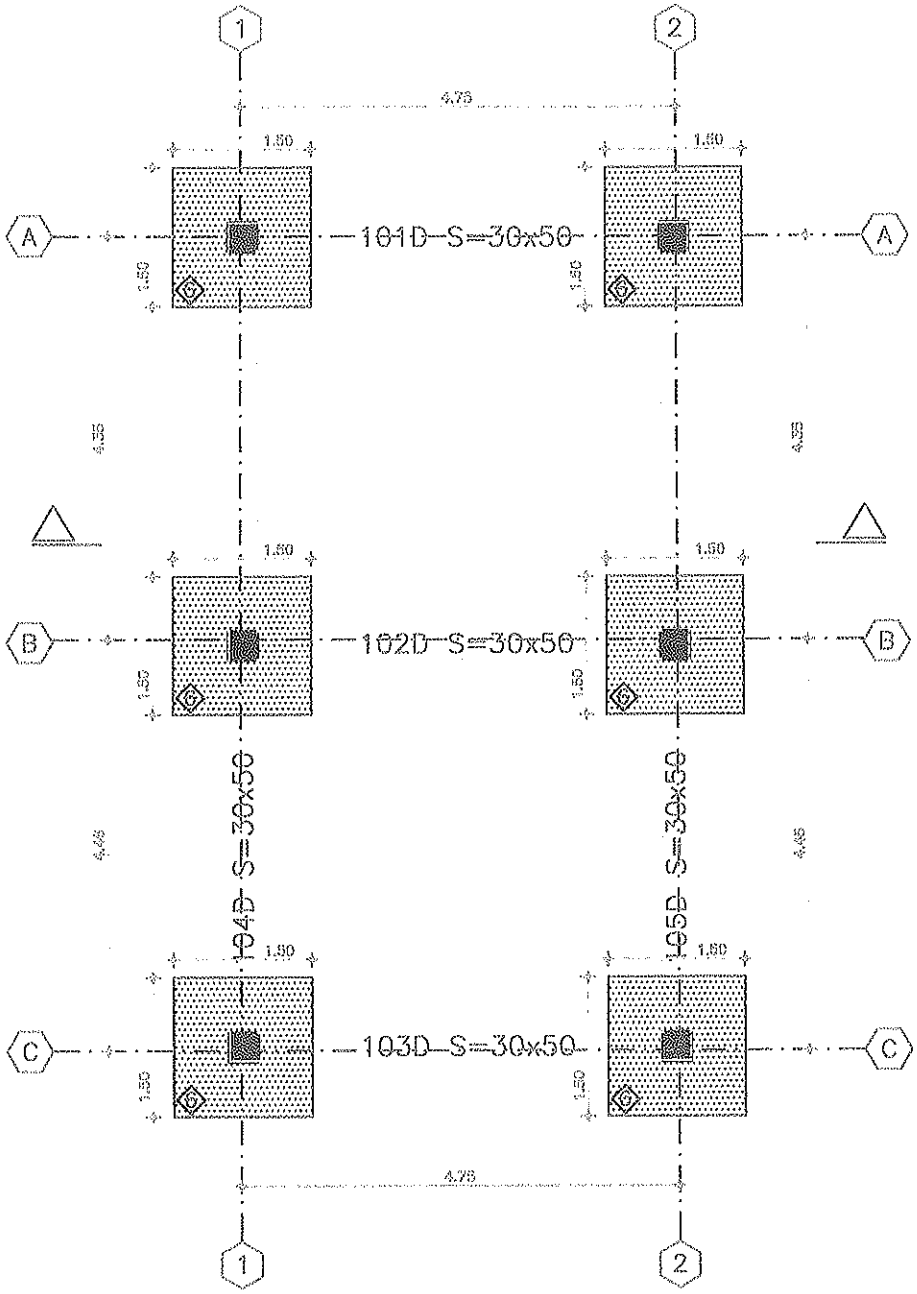


PLANTA CIMENTCIÓN
BLOQUE D

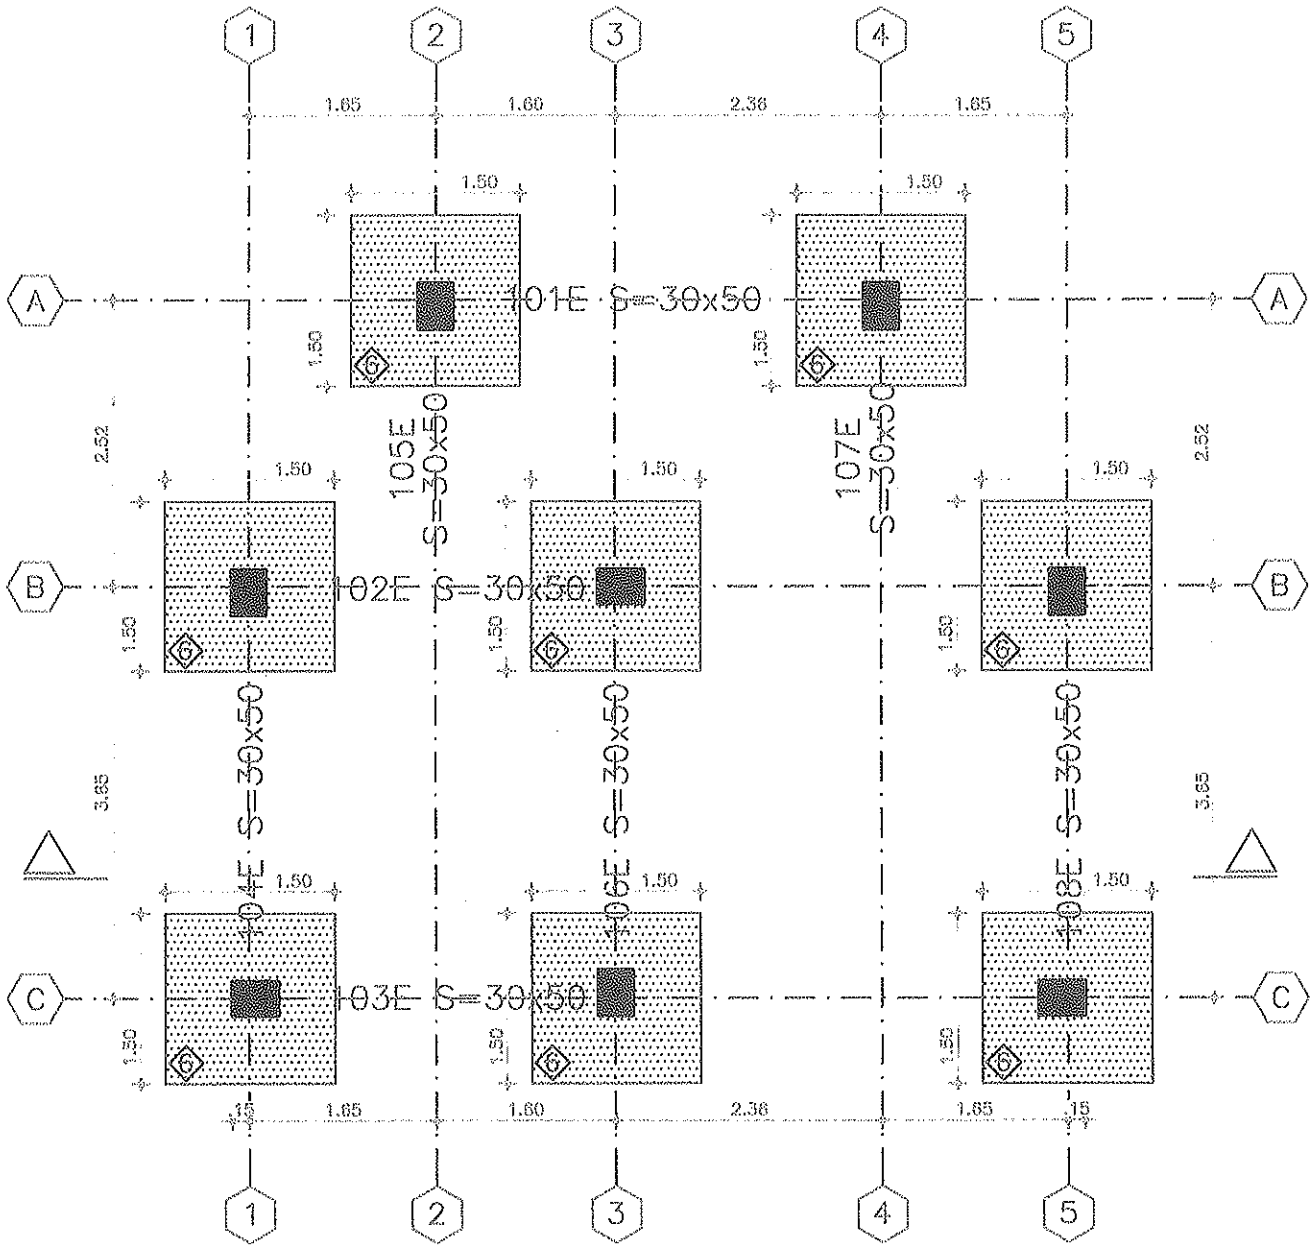


PLANTA CIMENTACIN

BLOQUE E

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura


**MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS**



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-8-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMQACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA | ITEM: NP 7 | UNIDAD M3 |
| CAPITULO: | 21 - NO PREVISTOS | FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022 | FECHA FINAL: 06/10/20232 |

| LOCALIZACION | EJES | #ELEMENTOS | DIMENSIONES L | A | H | VOLUMEN | VOLUMEN DESCUENTOS | # COLUMNAS DECUENTO | VOLUMEN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMNAS BLOQUE A | | | | | | | | | |
| BLOQUE A | EJE 1 ENTRE EJES A-C | 3 | 0,70 | 0,40 | 5,85 | 1,64 | | | 4,91 |
| BLOQUE A | EJE 2,5,6 Y 7 ENTRE EJES A-C | 12 | 0,70 | 0,40 | 6,85 | 1,92 | | | 23,02 |
| BLOQUE A | EJES 3 Y 4 ENTRE EJES A-C | 6 | 0,70 | 0,40 | 7,85 | 2,20 | | | 13,19 |
| COLUMNAS BLOQUE B | | | | | | | | | |
| BLOQUE B | EJE 1 Y 2 ENTRE EJES A-C | 6 | 0,70 | 0,40 | 7,35 | 2,06 | | | 12,35 |
| BLOQUE B | EJE 3, 4 Y 5 ENTRE EJES A-C | 9 | 0,70 | 0,40 | 6,35 | 1,78 | | | 16,00 |
| BLOQUE B | EJE 6 ENTRE EJES A-C | 3 | 0,70 | 0,40 | 5,85 | 1,64 | | | 4,91 |
| TOTALES: | | | | | | | | | 74,38 |
| ACUMULADO: | | | | | | | | | 74,38 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

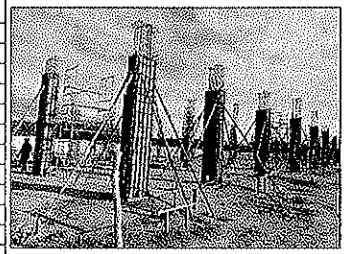

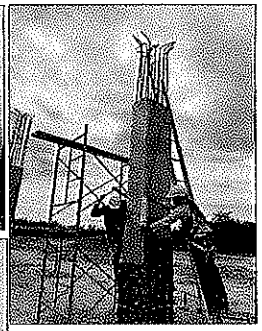
| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 0,00 |
| DIFERENCIA: | 74,38 |
| PORCENTAJE: | 0,00% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma:

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA


Firma:

DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

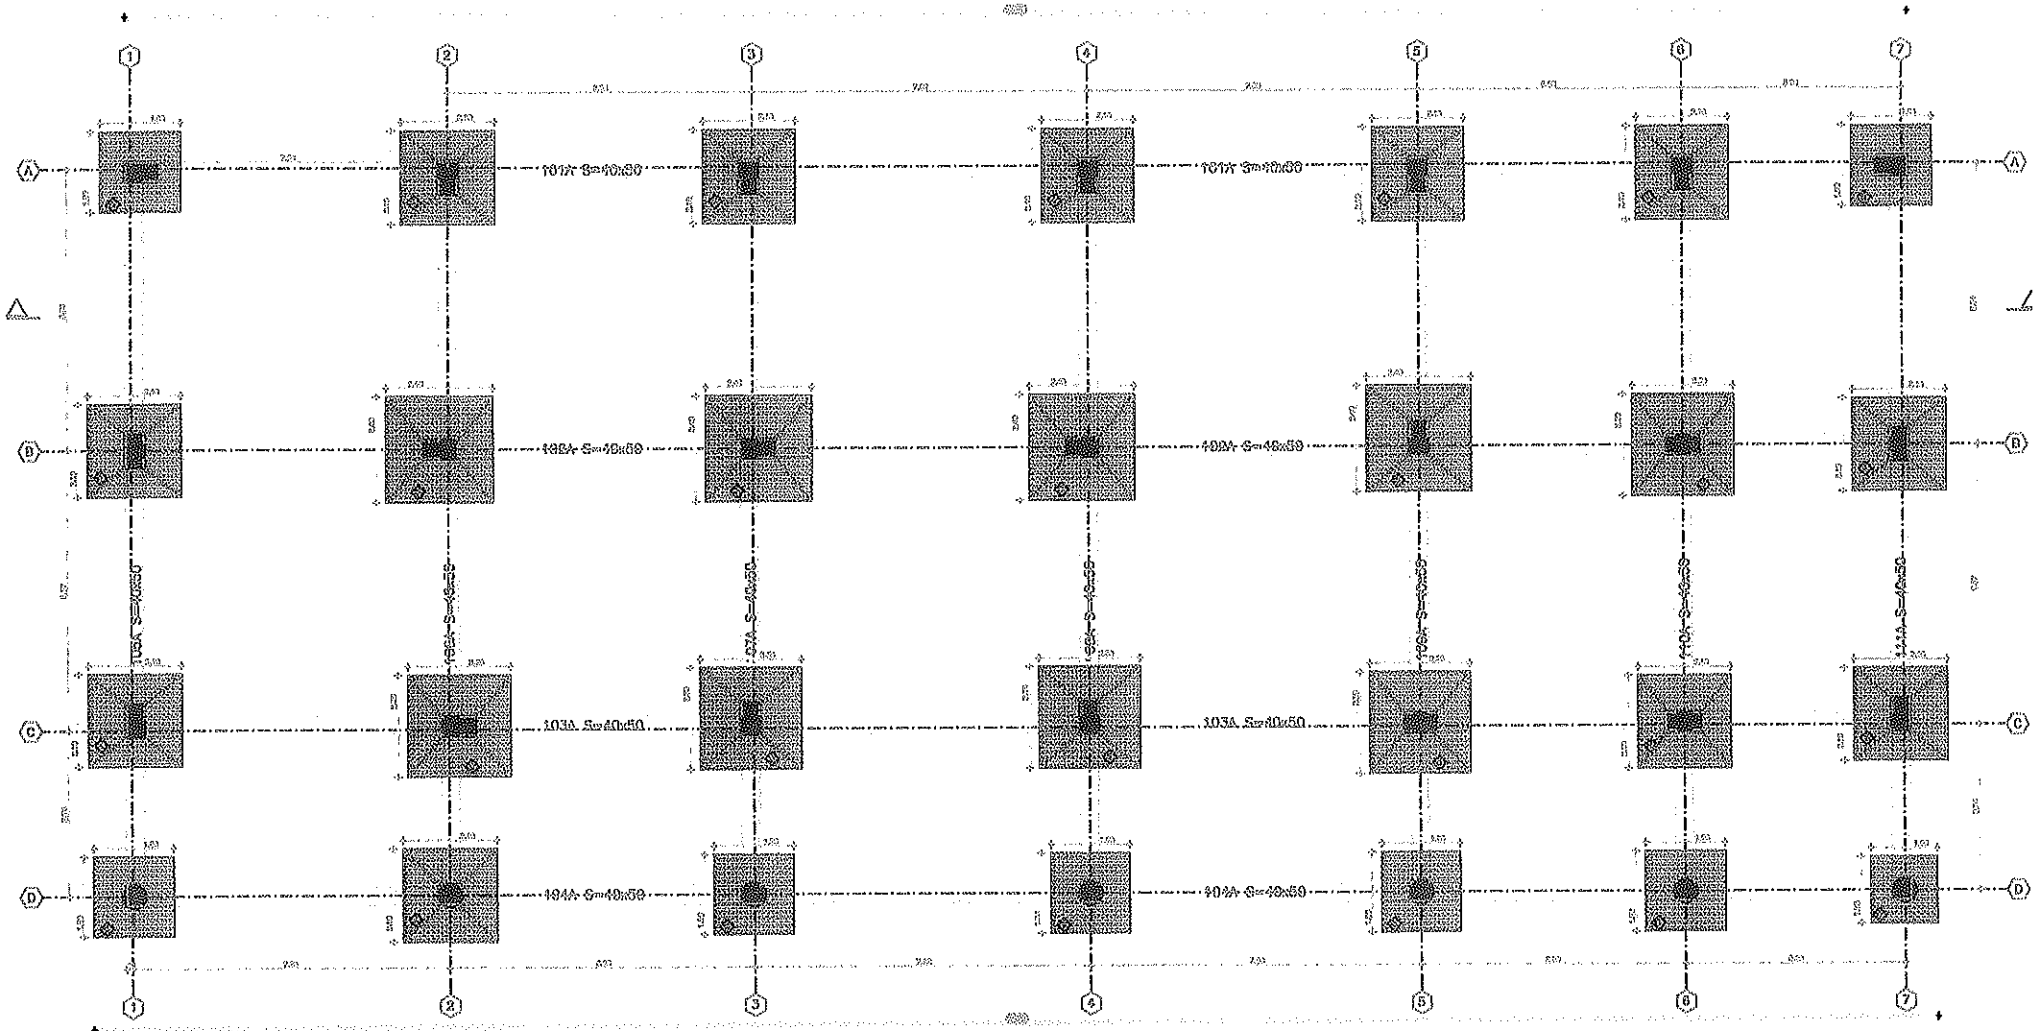


PLANTA CIMENTACIÓN
BLOQUE A

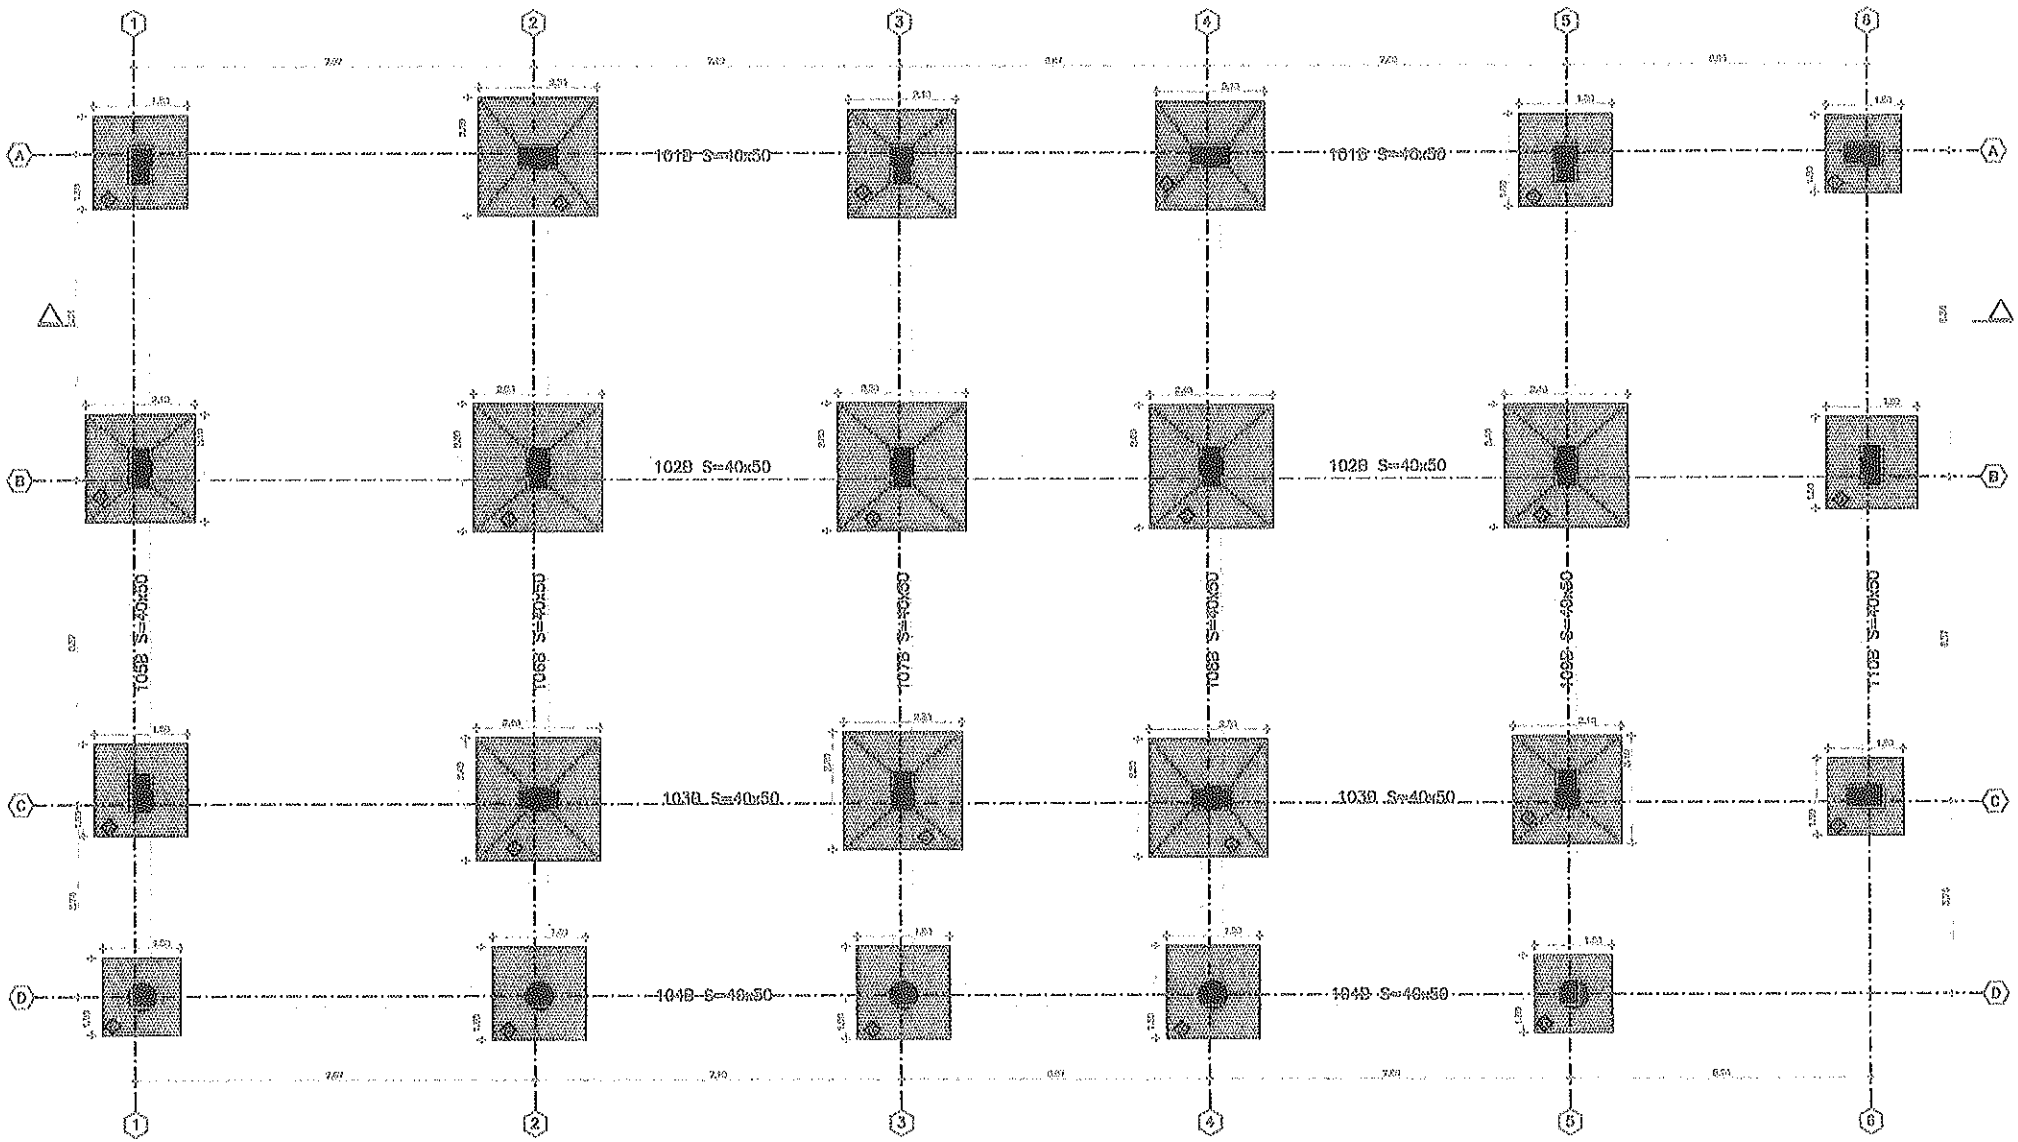


PLANTA CIMENTACIÓN
BLOQUE B

CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA


**MEMORIA Y CONTROL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS**


POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE | CONTRATO No. | PN DIRAF N° 06-6-10178-22 |
| CONTRATANTE | POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUPERVISOR | MAYOR GUSTAVO QUIROZ |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL L Y M | REPRESENTANTE LEGAL | ING. DIEGO MEDINA GUERRERO |
| INTERVENTOR | CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERÍA & ARQUITECTURA | REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS VERGARA NEGRETE |
| DESCRIPCIÓN | CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA | ITEM: NP 9 | UNIDAD: M3 |
| CAPITULO: 21 - NO PREVISTOS | | FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DEL 2022 | FECHA FINAL: 6/10/2023 |

| LOCALIZACION | EJES | # ELEMENTOS | DIMENSIONES L | A | H | VOLUMEN | VOLUMEN DESCUENTOS COLUMNAS | # COLUMNAS DECUENTO | VOLUMEN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE A NE+4.65 PLACA CUBIERTA EJE 1-2 ENTRE A-D | | 1 | 17,17 | 7,52 | 0,10 | 12,91 | 0,060 | 8 | 12,43 |
| BLOQUE A NE+4.65 PLACA CUBIERTA EJE 4-5 ENTRE A-D | | 1 | 17,17 | 7,8 | 0,10 | 13,39 | 0,060 | 8 | 12,91 |
| ANTES EJE A 1-2 R1 | | 1 | 7,52 | 0,15 | 0,40 | 0,45 | 0,048 | 0 | 0,45 |
| ANTES EJE A 4-5 R1 | | 1 | 7,8 | 0,15 | 0,40 | 0,47 | 0,048 | 0 | 0,47 |
| EJE A 1-7 | | 1 | 40,54 | 0,3 | 0,40 | 4,86 | 0,048 | 7 | 4,53 |
| ENTRE EJES A-B Y 1-2 R1 | | 1 | 6,92 | 0,15 | 0,40 | 0,42 | 0,048 | 0 | 0,42 |
| EJE B ENTRE 1-2 | | 1 | 6,47 | 0,4 | 0,40 | 1,04 | 0,048 | 0 | 1,04 |
| EJE B ENTRE 4-5 | | 1 | 7,1 | 0,4 | 0,40 | 1,14 | 0,048 | 0 | 1,14 |
| ENTRE EJES B-C Y 1-2 R1 | | 1 | 6,92 | 0,15 | 0,40 | 0,42 | 0,048 | 0 | 0,42 |
| EJE C ENTRE 1-7 | | 1 | 40,54 | 0,3 | 0,40 | 4,86 | 0,048 | 7 | 4,53 |
| EJE D ENTRE 1-2 | | 1 | 7,52 | 0,59 | 0,40 | 1,77 | 0,048 | 0 | 1,77 |
| EJE D ENTRE 4-5 | | 1 | 7,8 | 0,59 | 0,40 | 1,84 | 0,048 | 0 | 1,84 |
| VIGUETAS ENTRE EJES A-B Y 1-2 | | 4 | 14,83 | 0,2 | 0,40 | 1,19 | 0,048 | 0 | 4,75 |
| EJES 1 Y 2 ENTRE EJES A-D | | 2 | 16,92 | 0,3 | 0,40 | 2,03 | 0,048 | 8 | 3,68 |
| EJE 3 Y 7 ENTRE A-C | | 2 | 11,56 | 0,3 | 0,40 | 1,39 | 0,048 | 2 | 2,68 |
| EJES 4 Y 5 ENTRE EJES A-D | | 2 | 16,92 | 0,3 | 0,40 | 2,03 | 0,048 | 8 | 3,68 |
| VIGUETAS ENTRE EJES A-B Y 4-5 | | 4 | 14,83 | 0,2 | 0,40 | 1,19 | 0,048 | 0 | 4,75 |
| ENTRE EJES A-B Y 4-5 R1 | | 1 | 7,2 | 0,15 | 0,40 | 0,43 | 0,048 | 0 | 0,43 |
| ENTRE EJES B-C Y 4-5 R1 | | 1 | 7,2 | 0,15 | 0,40 | 0,43 | 0,048 | 0 | 0,43 |
| BLOQUE A NE+5.65 PLACA CUBIERTA EJE 2-3 ENTRE A-D | | 1 | 17,17 | 8,05 | 0,10 | 13,82 | 0,060 | 8 | 13,34 |
| BLOQUE A NE+5.65 PLACA CUBIERTA EJE 5-7 ENTRE A-D | | 1 | 17,17 | 12,4 | 0,10 | 21,29 | 0,060 | 12 | 20,57 |
| ANTES EJE A 2-3 R1 | | 1 | 8,05 | 0,15 | 0,40 | 0,48 | 0,048 | 0 | 0,48 |
| ANTES EJE A 5-7 R1 | | 1 | 12,4 | 0,15 | 0,40 | 0,74 | 0,048 | 0 | 0,74 |
| EJE A ENTRE 2-3 | | 1 | 8,05 | 0,3 | 0,40 | 0,97 | 0,048 | 2 | 0,87 |
| EJE A ENTRE 5-7 | | 1 | 12,4 | 0,3 | 0,40 | 1,49 | 0,048 | 3 | 1,34 |
| ENTRE EJES A-B Y 2-3 R1 | | 1 | 7,6 | 0,15 | 0,40 | 0,46 | 0,048 | 0 | 0,46 |
| ENTRE EJES A-B 5-7 R1 | | 1 | 12,1 | 0,15 | 0,40 | 0,73 | 0,048 | 0 | 0,73 |
| TOTALES: | | | | | | | | | 100,86 |
| ACUMULADO: | | | | | | | | | 100,86 |

ESQUEMA / FOTOGRAFIA

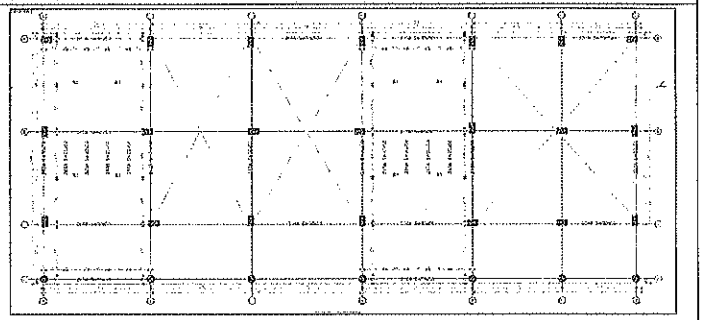

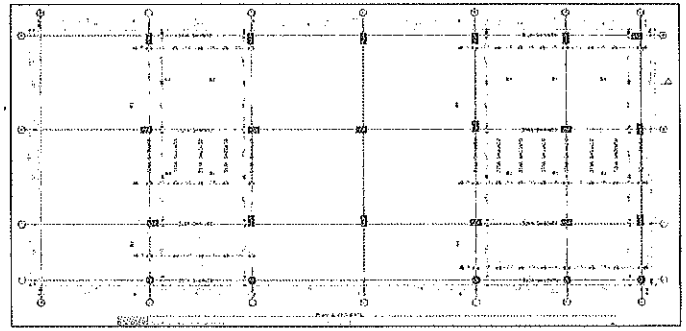

| RESUMEN GENERAL | |
|---|---|
| CANT. PRESUP.: | 471,82 |
| DIFERENCIA: | 370,96 |
| PORCENTAJE: | 78,62% |

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:


DIRECTOR INTERVENTORIA
ARGELIO ARTEAGA ARTEAGA

Firma:


DIRECTOR OBRA
ALEJANDRO BAQUERO SALAZAR

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:


# BLOQUE A

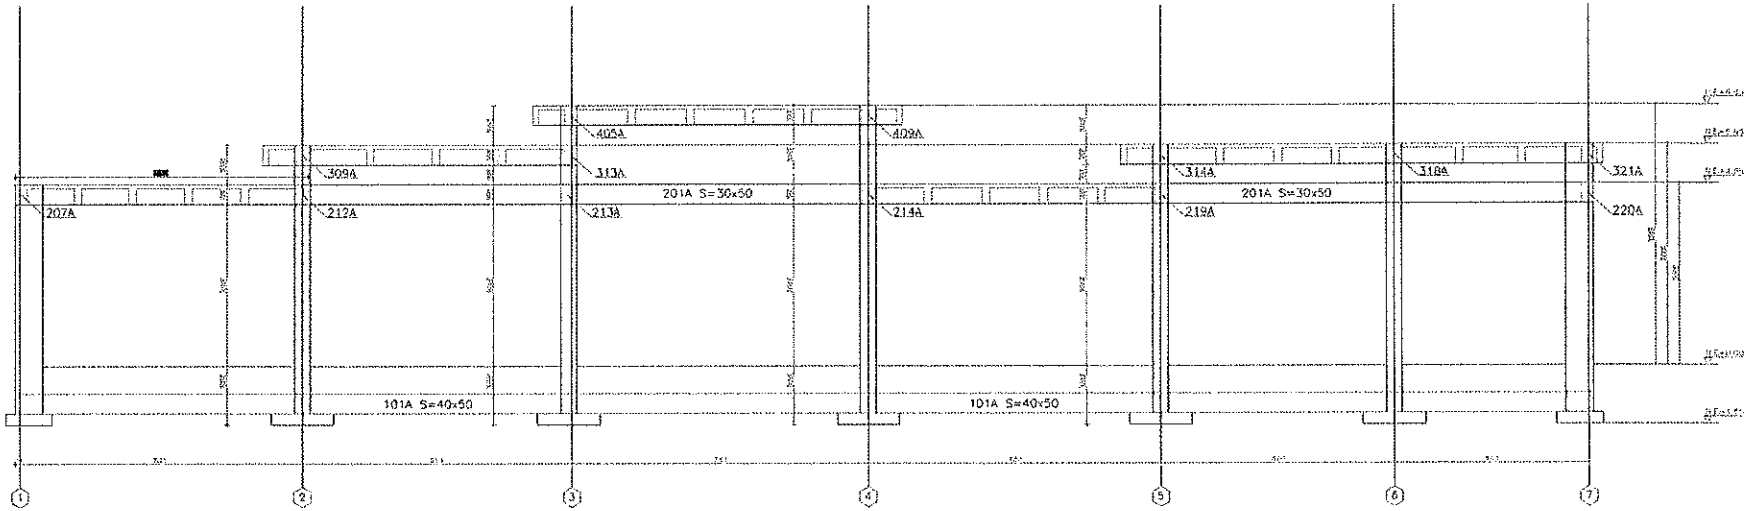



CORTE A-A

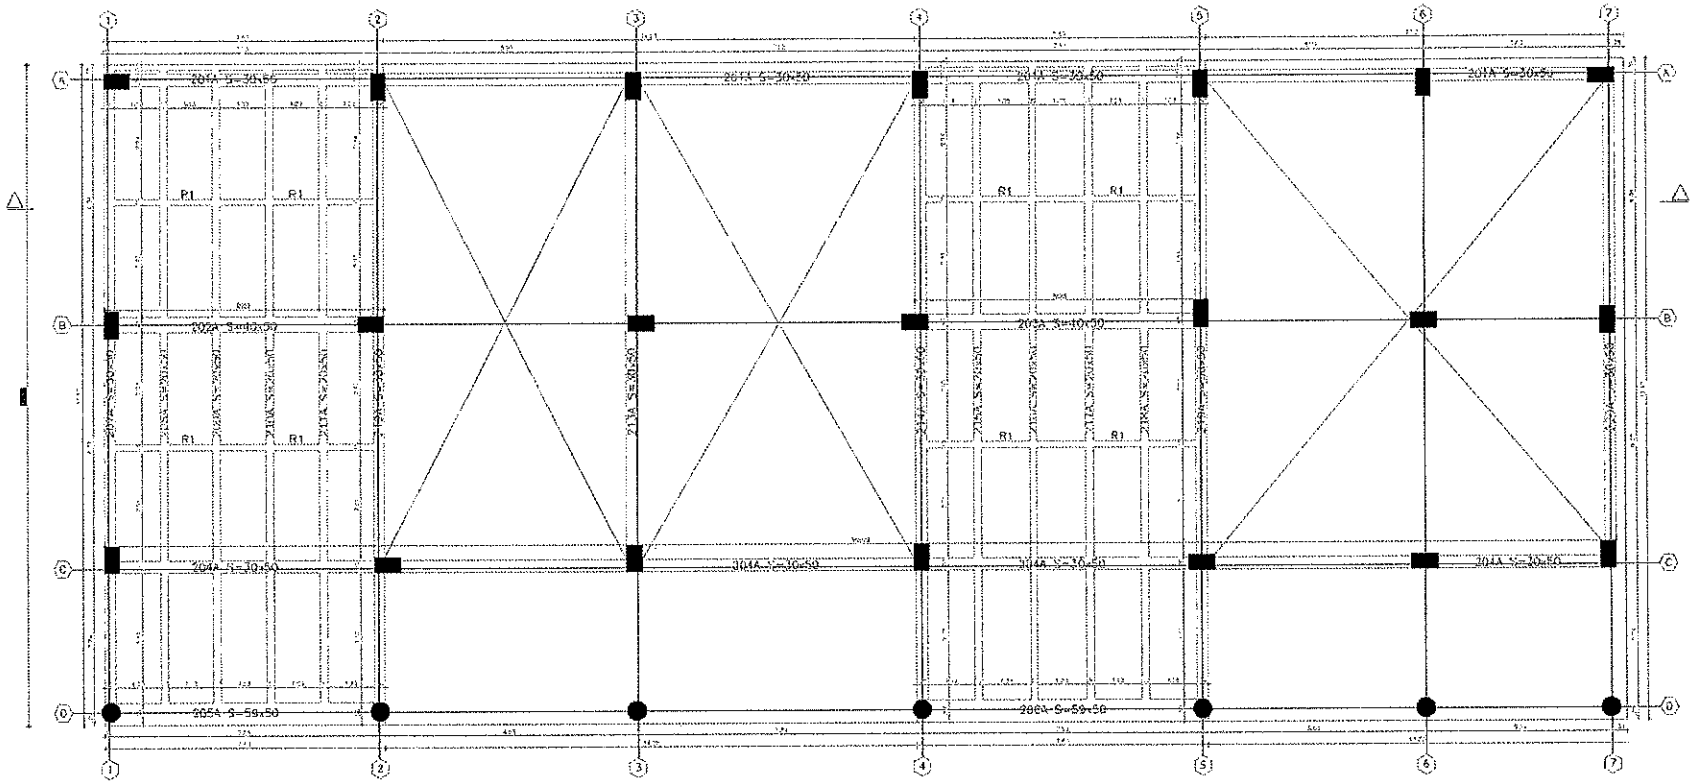

PLANTA CUBIERTA
NF+3.65
BLOQUE A

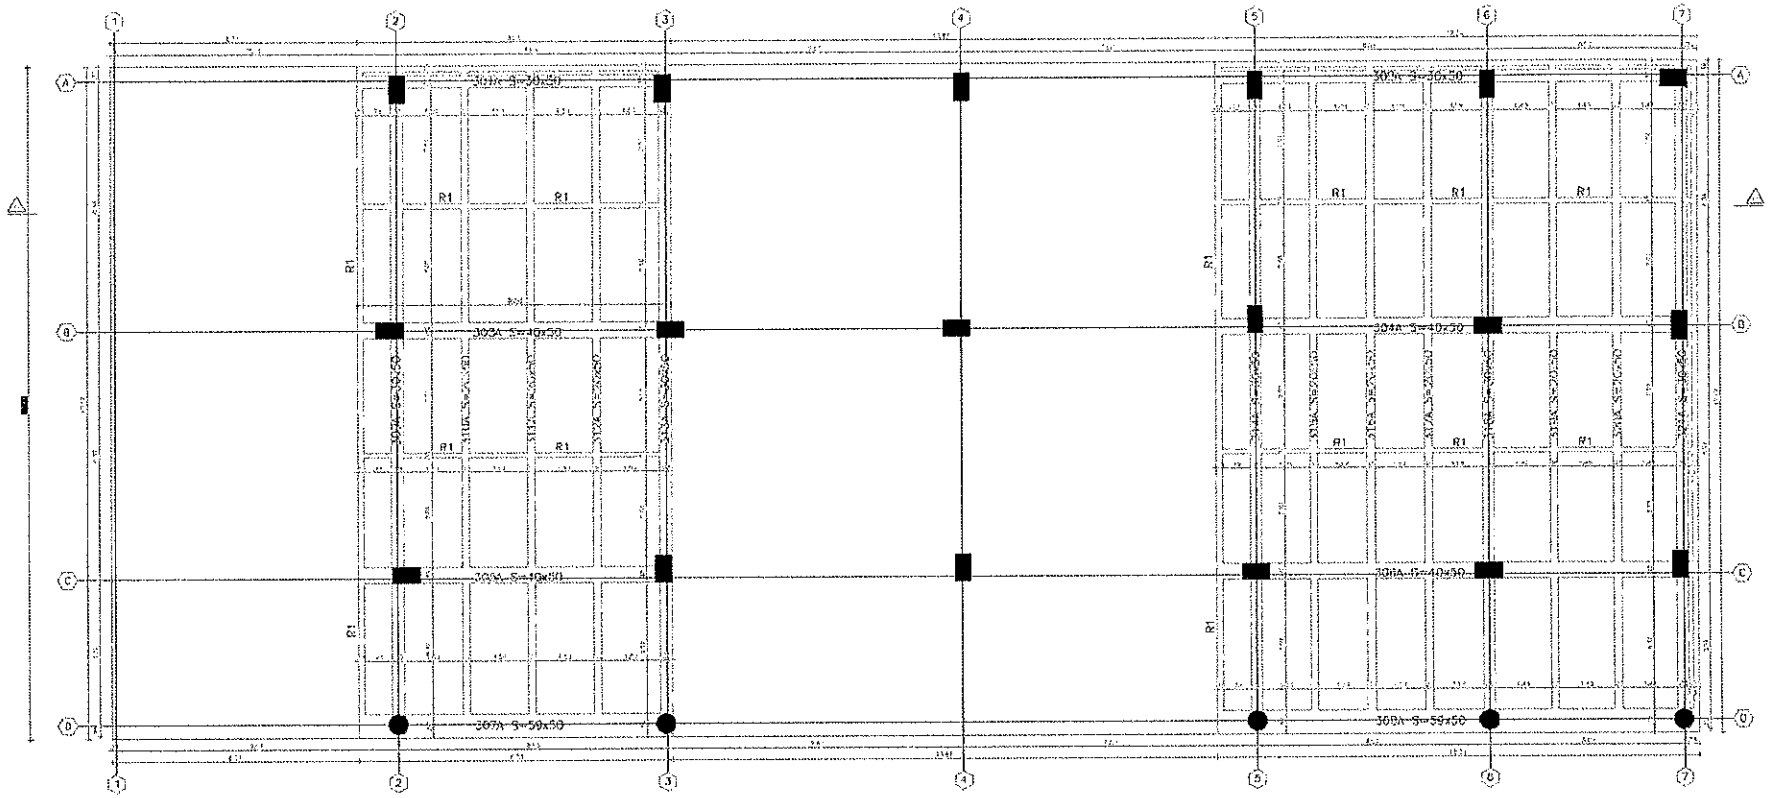

PLANTA CUBIERTA
NF+5.65
BLOQUE A

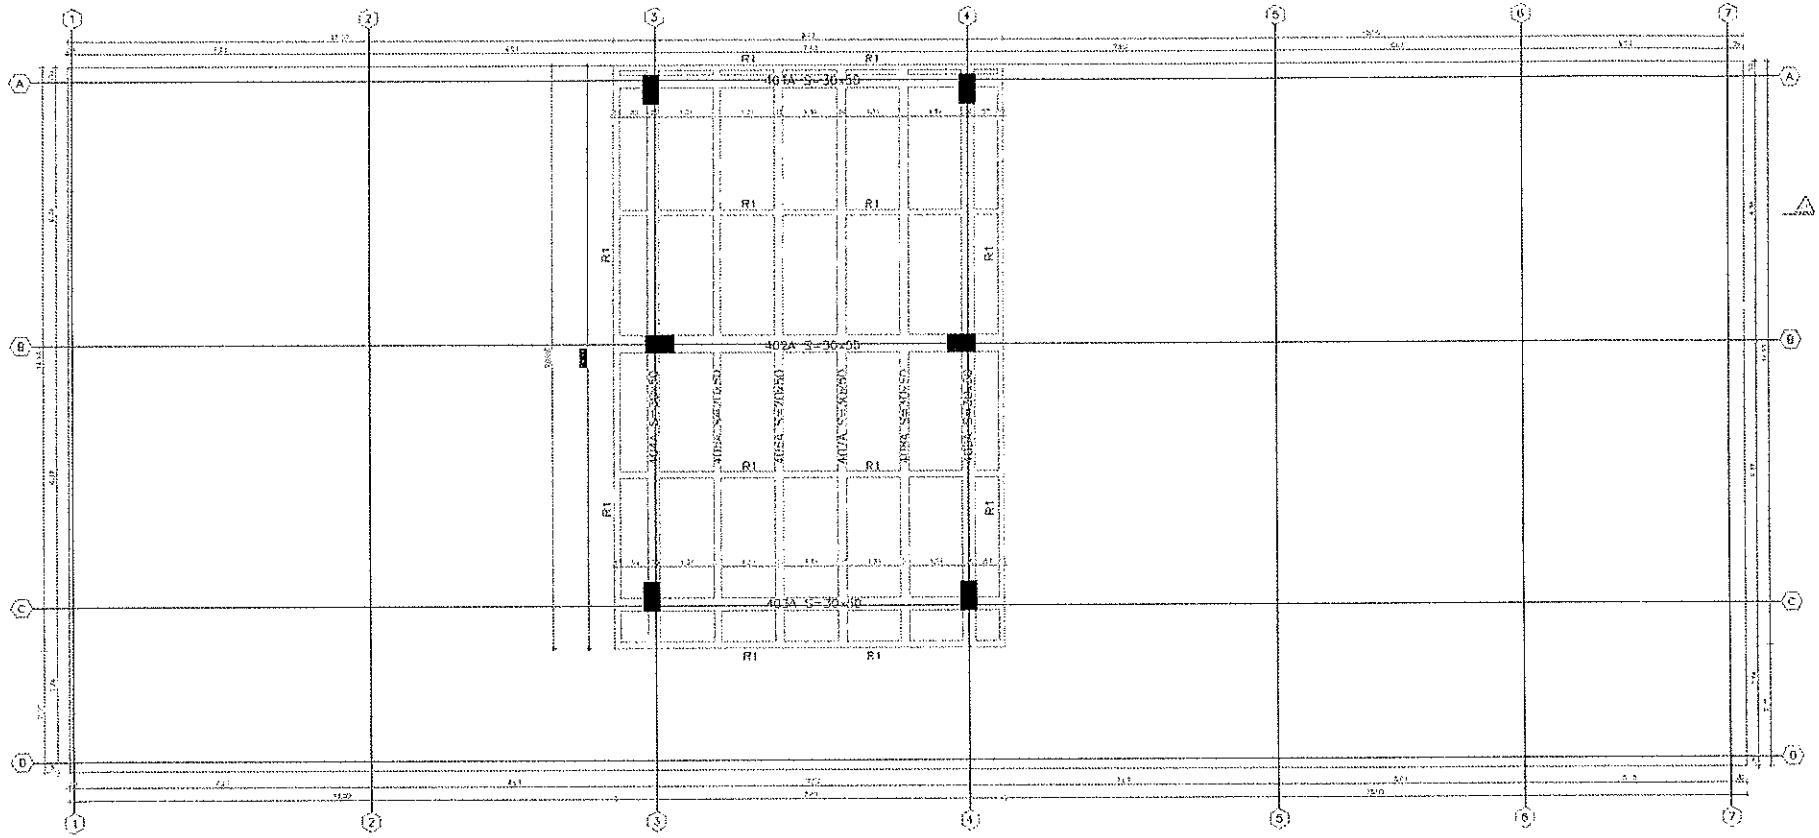


PLANTA CUBIERTA
NF+6.65
BLOQUE A

# INFORME EJECUTIVO DE OBRA- PARCIAL 5

POLICIA NACIONAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



# CONSORCIO PONAL LYM

## INFORME MENSUAL No 5

**Del 24/04/2023 al 28/05/2023**

## CONTRATO DE OBRA No 06-6-10178-22

"Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste"

Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301
ponallym@gmail.com
3102409478
Neiva - Huila

# TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO ..... 3
1.1. Localización General Del Proyecto ..... 3
1.2. Justificación y Metas Del Proyecto ..... 4
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ..... 5
2.1. Información Básica Contrato De Obra ..... 5
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES ..... 6
3.1. Pólizas Contrato De Obra ..... 6
3.1.1. Pólizas Suscripción - Contrato De Obra ..... 6
3.1.2. Pólizas Prórroga 1 - Contrato De Obra ..... 7
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO ..... 9
4.1. Equipamientos A Intervenir ..... 10
5. INFORME DE AVANCE DE OBRA ..... 11
5.1. Actividades de obra. ..... 11
5.1.1. (Ítem 3.1.1) Excavación mecánica. ..... 12
5.1.2. (Ítem 3.1.2) Relleno en Recebo común Compactado. ..... 12
5.1.3. (Ítem 3.2.1) Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI. ..... ¡Error! Marcador no definido.
5.1.4. (Ítem 3.2.3) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS ..... 13
5.1.5. (Ítem NP1) DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL. ..... 13
5.1.6. (Ítem NP2) CONCRETO SOLADOS 2500 PSI. ..... 14
5.1.7. (Ítem NP5) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO MATERIAL DE SUB BASE TAM MAX 3" ..... ¡Error! Marcador no definido.
5.1.8. (Ítem NP6) CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 5000 PSI ..... 14
6. ORGANIGRAMA JERÁRQUICO CONTRATISTA DE OBRA ..... 11
6.1. Organigrama Del Personal De Obra ..... 11
7. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA ..... 12
8. INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 12
9. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ..... 12
10. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA ..... 13



Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301
ponallym@gmail.com
3102409478
Neiva - Huila

10.1. Cuadro De Información Financiera ..... 13
10.2. Cuadro De Ejecución Y Avance Financiero ..... 13
**11. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA ..... 14**
**12. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL ..... 16**
**13. PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS ..... 16**
**14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 17**



Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301
ponallym@gmail.com
3102409478
Neiva - Huila

# 1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

## 1.1. Localización General Del Proyecto

El departamento del Huila es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, conforman la República de Colombia. Su capital y ciudad más poblada es Neiva. Está ubicado al suroeste del país, en la región andina, limitando al norte con Tolima y Cundinamarca, al este con Meta, al sur con Caquetá y al oeste con Cauca.



Neiva es la capital del departamento de Huila. Se encuentra ubicada entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el río Las Ceibas y el río del Oro. Su extensión territorial de 1533 km², su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 27.7 °C.5.

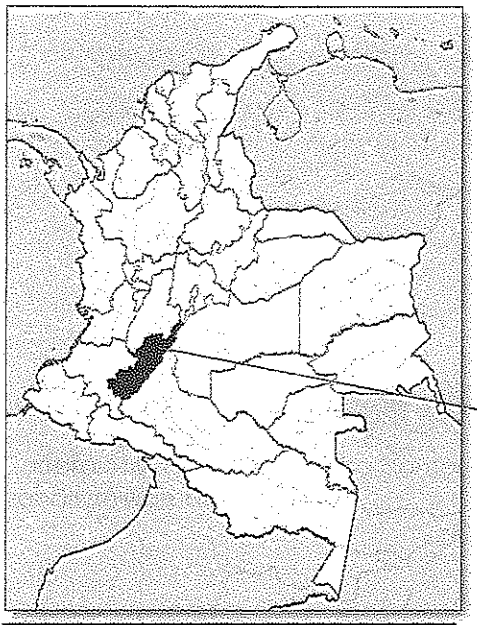


*Ilustración 1-3:Localización Del Departamento*

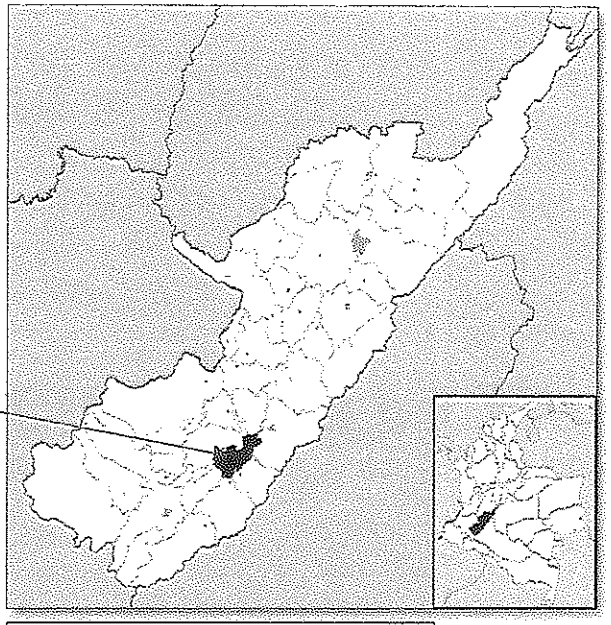


*Ilustración 1-2:Localización del Municipio.*

El predio donde se construirá el Comando de Policía Metropolitana de Neiva y Departamento de Policía de Huila es un lote de aproximadamente 10 has, denominado Trapichito 3, el cual está ubicado al sur de la ciudad de Neiva a una distancia aproximada de 2.0 km del perímetro urbano y sobre la vía nacional -VN45- que comunica a Neiva con el sur del país.

Es un predio predominantemente plano con pendientes del 1% - 5%, con un área de 100.000 m2 y dimensiones de 500m x 200m.

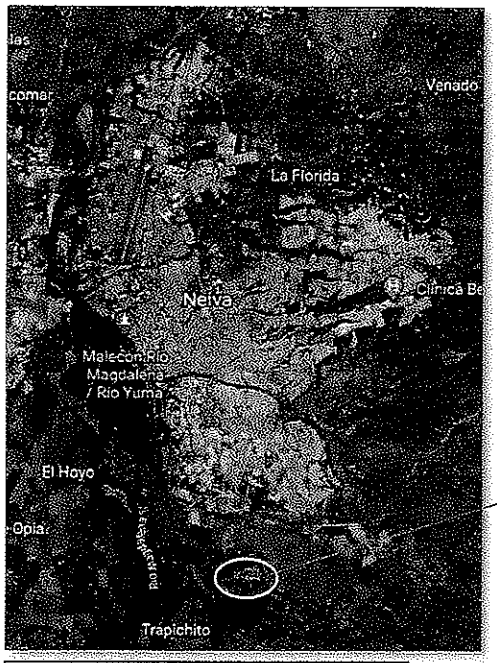



*Ilustración 1-3: Localización Del Predio.*

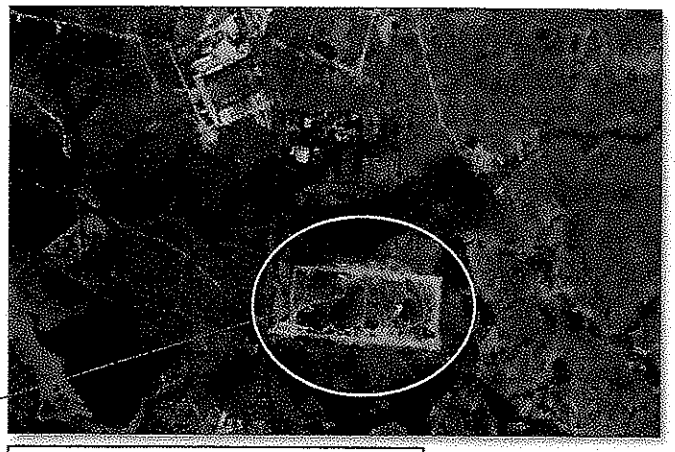


*Ilustración 1-4: Localización Del Proyecto.*



## 1.2. Justificación y Metas Del Proyecto

Con base en las estrategias definidas por el Mando Institucional, acordes y en cumplimiento de la política Integral de Seguridad y Defensa, definida por el gobierno nacional para el año en curso, se hace necesario llevar a cabo la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", ubicado en el Municipio de Neiva en el Departamento de Huila, donde se pretende mejorar la imagen institucional.

Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policía Nacional, tiene el interés de contrarrestar la situación de orden público que vienen generando los grupos al margen de la ley, a través de obras que mejoren la seguridad y el bienestar del personal policial, encargado de garantizar una convivencia en paz y en armonía de todos los habitantes del Municipio de Neiva y el Departamento de Huila, la institución debe realizar las actividades correspondientes a incrementar el pie de fuerza, mejorar aspectos de movilidad, armamento, medios de comunicación y en especial la optimización de la infraestructura de las instalaciones.

La Policía Nacional para cumplir con su misión y en especial con la política Integral de seguridad y defensa, y las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, requiere iniciar con la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE

POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" Edificación que se requiere para brindar la seguridad, bienestar y confort para los policiales adscritos a esta unidad policial.

# 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA



## 2.1. Información Básica Contrato De Obra

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRAF – NIT: 800.141.397 – 5 |
| No DE CONTRATO: | 06-6-10178-22 |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN, EDIFICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PONAL LYM |
| REPRESENTANTE LEGAL | DIEGO MEDINA GUERRERO |
| VALO DEL PROYECTO: | $ 6.974.591.904,74 |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 6.974.591.904,74 |
| PLAZO: | HASTA EL 20/12/2022 |
| PRORROGA 1 | DEL 19/12/2022 |
| PLAZO DE PRÓRROGA: | CINCO (05) MESES |
| PRORROGA 2 | DEL 20/04/2023 |
| PLAZO DE PRÓRROGA: | CIENTO CUARENTA (140) DIAS |
| CORREO ELECTRONICO: | ponallym@gmail.com |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA | 06 DE OCTUBRE DE 2023 |

# 3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

## 3.1. Pólizas Contrato De Obra

### 3.1.1. Pólizas Suscripción - Contrato De Obra



Garantía De Cumplimiento

| Aseguradora | Aseguradora Solidaria De Colombia |
|---|---|
| No Póliza | 435-47 - 994000050931 |
| Certificado O No Anexo | 1 |
| Fecha Expedición | 10/10/2022 |
| Fecha De Aprobación | 18/10/2022 |

| Amparo | Vigencia | | Valor |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento | 27/09/2022 | 20/06/2023 | $ 1.394.918.318,00 |
| Salarios Y Prestaciones Sociales | 27/09/2022 | 210/04/2026 | $ 348.729.595,00 |
| Estabilidad Y Calidad De La Obra | (5) Años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra | | $ 2.092.377.571,50 |
| Calidad Del Servicio | 20/12/2022 | 20/04/2024 | $ 3.487.295.952,50 |

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual

| Aseguradora | Seguros Del Estado |
|---|---|
| No Póliza | 435-74 - 994000012439 |
| Certificado O No Anexo | 1 |
| Fecha De Expedición | 10/10/2022 |
| Fecha De Aprobación | 18/10/2022 |

| Amparo | Vigencia | | Valor |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 20/12/2022 | 20/04/2023 | $500.000.000,00 |

### 3.1.2. Pólizas Prórroga 1 - Contrato De Obra

Garantía De Cumplimiento

| Aseguradora | Aseguradora Solidaria De Colombia |
|---|---|
| No Póliza | 435-47 - 994000050931 |
| Certificado O No Anexo | 3 |
| Fecha Expedición | 26/12/2022 |
| Fecha De Aprobación | 28/12/2022 |

| Amparo | Vigencia | | Valor |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento | 18/10/2022 | 19/11/2023 | $ 1.394.918.318,00 |
| Salarios Y Prestaciones Sociales | 18/10/2022 | 19/09/2026 | $ 348.729.595,00 |
| Estabilidad Y Calidad De La Obra | (5) Años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra | | $ 2.092.377.571,50 |
| Calidad Del Servicio | 20/06/2023 | 19/09/2024 | $ 3.487.295.952,50 |

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual

| Aseguradora | Seguros Del Estado |
|---|---|
| No Póliza | 435-74 - 994000012439 |
| Certificado O No Anexo | 2 |
| Fecha De Expedición | 23/12/2022 |
| Fecha De Aprobación | 28/12/2022 |

| Amparo | Vigencia | | Valor |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 20/04/2023 | 19/10/2023 | $500.000.000,00 |

### 3.1.3. Pólizas Prórroga 2 - Contrato De Obra

Garantía De Cumplimiento

| Aseguradora | Aseguradora Solidaria De Colombia |
|---|---|
| No Póliza | 435-47 - 994000050931 |
| Certificado O No Anexo | 4 |
| Fecha Expedición | 23/05/2023 |
| Fecha De Aprobación | 26/05/2023 |



| Amparo | Vigencia | | Valor |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento | 18/10/2022 | 06/04/2024 | $ 1.394.918.318,00 |
| Salarios Y Prestaciones Sociales | 18/10/2022 | 06/02/2027 | $ 348.729.595,00 |
| Estabilidad Y Calidad De La Obra | (5) Años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra | | $ 2.092.377.571,50 |
| Calidad Del Servicio | 06/10/2023 | 06/02/2025 | $ 3.487.295.952,50 |

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual

| Aseguradora | Seguros Del Estado |
|---|---|
| No Póliza | 435-74 - 994000012439 |
| Certificado O No Anexo | 2 |
| Fecha De Expedición | 23/12/2022 |
| Fecha De Aprobación | 28/12/2022 |

| Amparo | Vigencia | | Valor |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 20/04/2023 | 19/10/2023 | $500.000.000,00 |

# 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto comprende la construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1- b del Comando de Policía Metropolitana de Neiva y Departamento de Policía de Huila. Cuenta con los siguientes espacios:



**Basuras:**

Cuarto de basuras 1 – Desechos orgánicos, Lavado de canecas

Cuarto de basuras 2 – Desechos reciclables

Cuarto de basuras 3 – Desechos reciclables

Garita Guardia

Circulación:

**Acceso:**

Guardia, Acceso, Recepción, Circulación, CC TV, Armerillo, Radicación, WC.

**Atención al ciudadano:**

Sala de espera y recepción

Obras sociales

Admin. SIPQRS

Incorporación

Batería de baños 1

Batería de baños 2

Cocineta

**Cuartos técnicos:**

Condensadores, Eléctrico, Voz y datos.

**Terraza al aire libre:**

**Oficinas:**

S. Conciliación

PNAD

Sección Tránsito y transporte

Zona común

Prevención,

educación y participación ciudadana,

Guape,

Gutur

Polco,

Ambiental

Turismo

Auxiliares Bachilleres

Salas de Juntas.

**Cuartos técnicos – Subestación**



### 4.1. Equipamientos A Intervenir

De acuerdo con los equipamientos priorizados por la Entidad para el contrato de obra DIRAF No. PN DIRAF 06-6-10178-22, las áreas a intervenir en la primera fase 1- b del Comando de Policía Metropolitana de Neiva y Departamento de Policía de Huila son las siguientes:

| ESPACIO | AREA |
|---|---|
| Cuarto de basuras - Residuos orgánicos | 37.77 m2 |
| Cuarto de basuras - Residuos reciclables | 46.54 m2 |
| Garita guardia | 9.70 m2 |
| Garita acceso y recepción | 77.47 m2 |
| Circuito cerrado de TV | 8.0 m2 |
| Circulación | 9.11 |
| Baño hombres | 1.59 m2 |
| Armerillo | 5.60 m2 |
| Radicación | 8.46 m2 |
| Baño mujeres | 1.65 m2 |
| Obras sociales | 45.2 m2 |
| Atención al ciudadano | 37.78 m2 |
| Sala de espera e incorporación | 250.26 m2 |
| Baño mixto | 1.91 m2 |
| Compresores | 1.77 m2 |
| Batería sanitaria hombres | 24.63 m2 |
| Batería sanitaria mujeres | 24.63 m2 |
| Cocineta | 1.18 m2 |


| | |
|---|---|
| Cuarto de aseo | 1.23 m2 |
| Baño movilidad reducida | 6.4 m2 |
| Cuarto técnico eléctrico | 11.01 m2 |
| Cuarto técnico voz y datos | 11.01 m2 |
| Sala de conciliación | 85.37 m2 |
| Pnad | 82.41 m2 |
| Servicios especiales | 324.41 |
| Guardia exterior | 11.74 m2 |
| Cuartos técnicos | 213,52 m2 |
| Sub Total Áreas + Circulación | 1.346,99 m2 |
| Sub Total Áreas + Mampostería | 1.346,99 m2 |
| Total, Edificio | 1.346,99 m2 |




# 5. INFORME DE AVANCE DE OBRA

## 5.1. Actividades de obra.

### 5.1.1. (Ítem 1.1) Replanteo Y Localización.


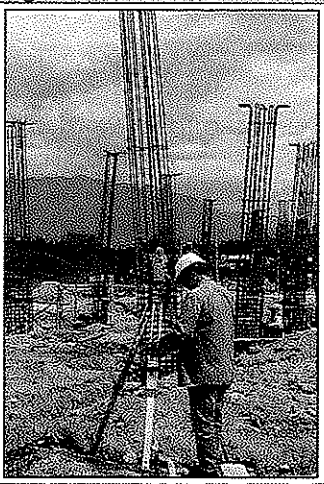
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 1-Localización y replanteo. | Foto 2-Localización y replanteo. |

### 5.1.2. (Ítem 3.1.1) Excavación mecánica.

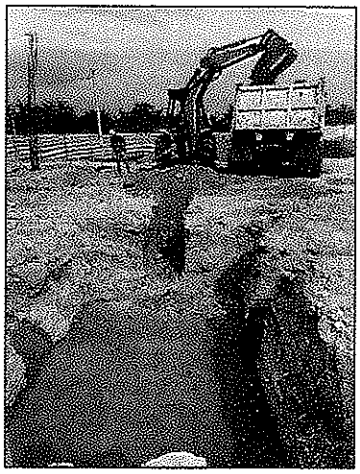
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 3- Excavación mecánica. | Foto 4- Excavación mecánica cimentación. |



### 5.1.3. (Ítem 3.1.2) Relleno en Recebo común Compactado.

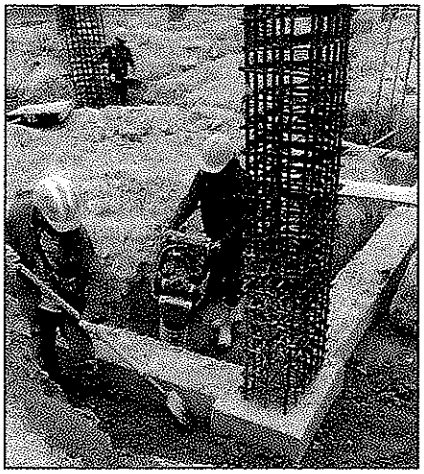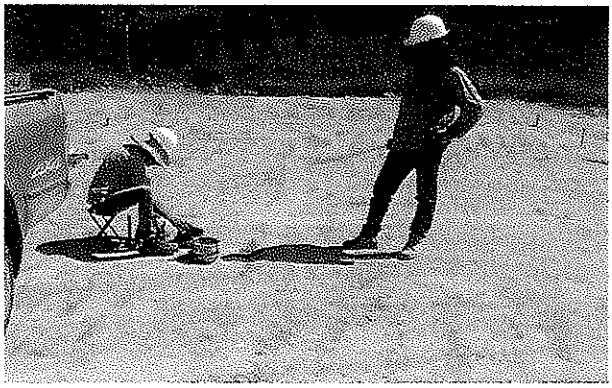
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 5- Suministro e instalación de material de relleno. | Foto 6- Suministro e instalación de material de relleno |

## 5.1.4. (Ítem 3.2.3) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS

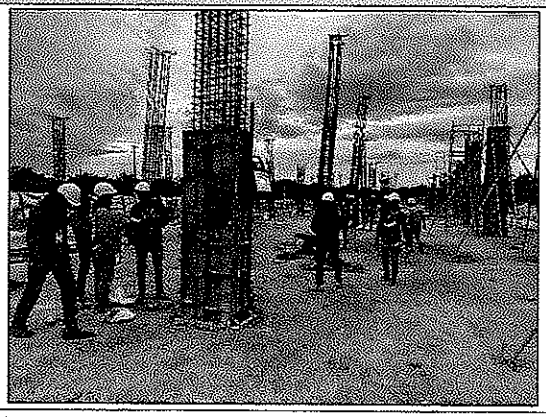
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 7- Suministro e instalación de acero de refuerzo | Foto 8- Suministro e instalación de acero de refuerzo |



## 5.1.5. (Ítem NP1) DESCAPOTE MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIAL.


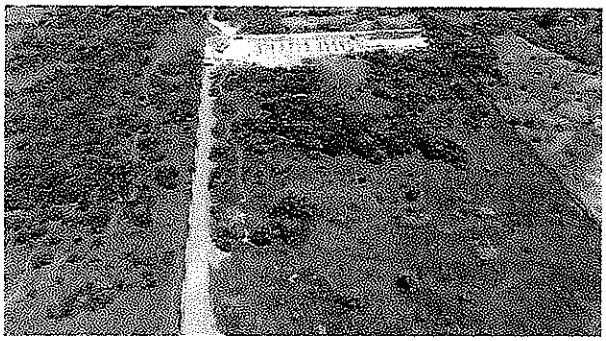
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 9- Descapote mecánico y retiro de material. | Foto 10- Descapote mecánico y retiro de material. |

## 5.1.6. (Ítem NP2) CONCRETO SOLADOS 2500 PSI.

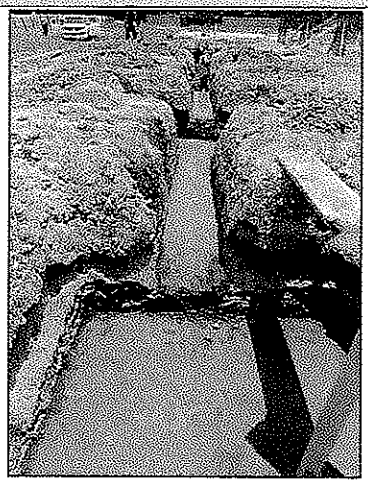
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 11- Concreto solado 2500 psi. | Foto 12- Concreto solado 2500 psi. |



## 5.1.7. (Ítem NP6) CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2" ALTAMENTE FLUIDO PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 5000 PSI
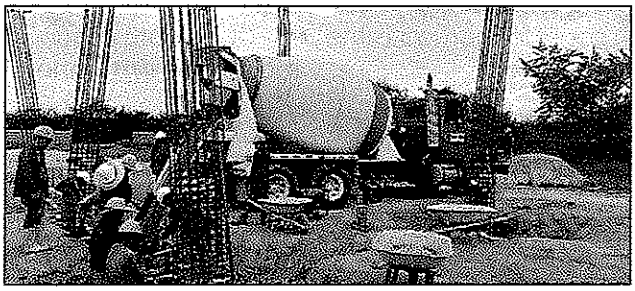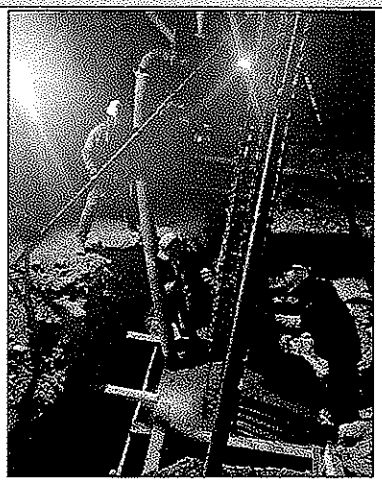
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 13- Concreto premezclado para zapatas. | Foto 14- Concreto premezclado para zapatas. |

## 5.1.8. (Ítem NP7) ONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA COLUMNAS DE 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA
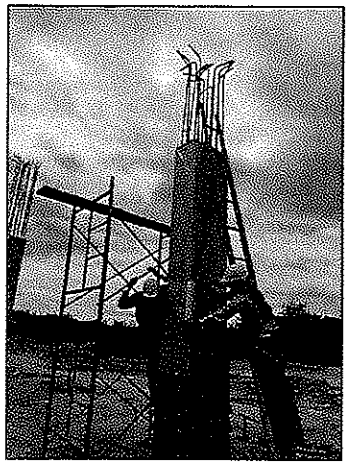
| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 15- Concreto columnas 5000 psi. | Foto 16- Concreto columnas 5000 psi. |




## 5.1.9. (Ítem NP6) CONCRETO PLASTICO PREMEZCLADO, 1/2¨ ALTAMENTE FLUIDO Y AUTOCOMOACTANTE PARA VIGAS AEREAS, VIGUETAS Y LOSA DE CUBIERTA 5000 PSI, INCLUYE ESTACIONARIA DE CONCRETO O AUTOBOMBA

| Registro fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 17- Concreto premezclado para zapatas. | Foto 18- Concreto premezclado para zapatas. |

# 6. ORGANIGRAMA JERÁRQUICO CONTRATISTA DE OBRA



## 6.1. Organigrama Del Personal De Obra

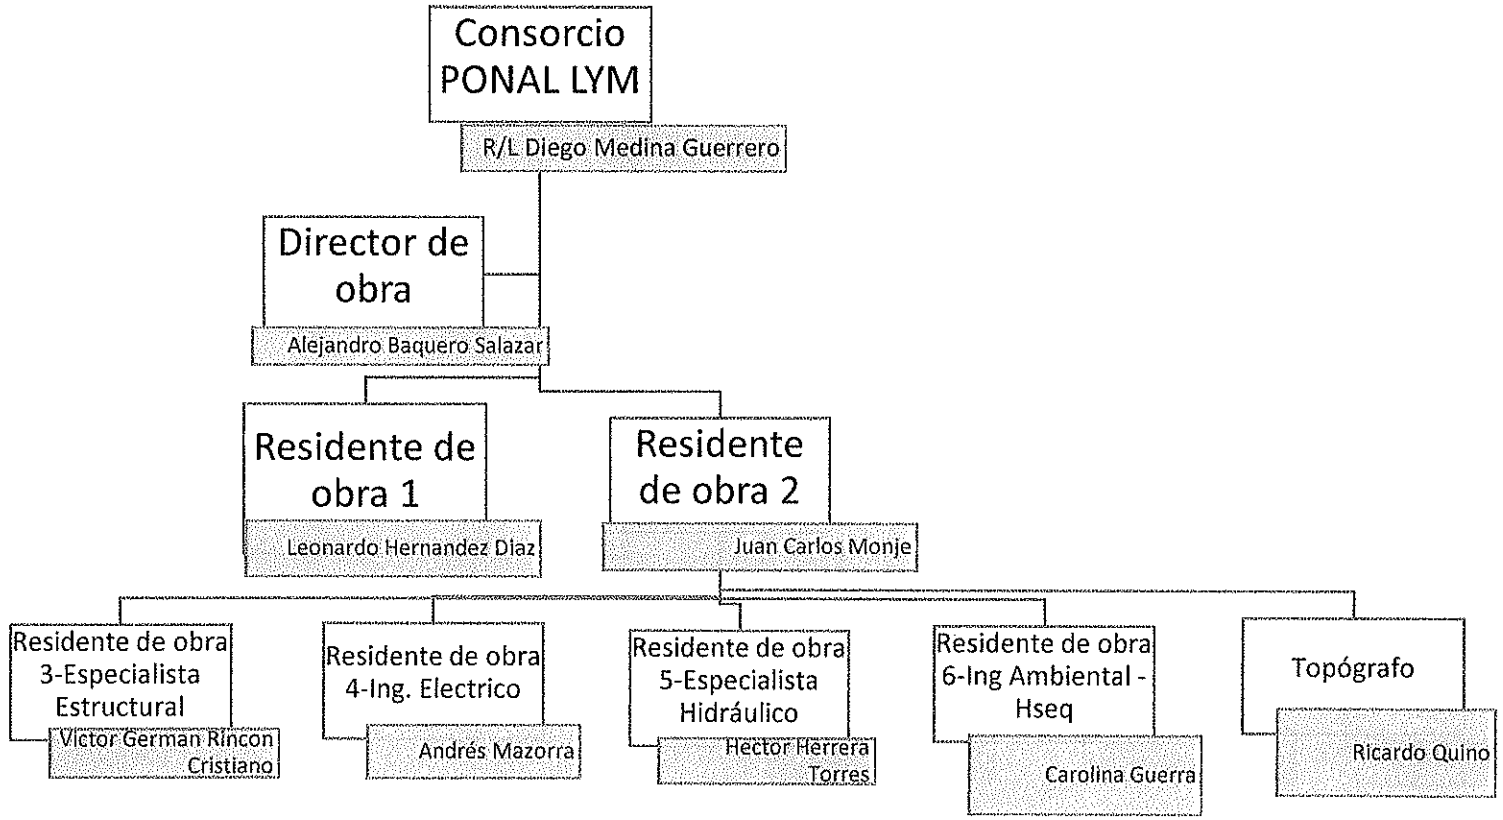

# 7. CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

| EQUIPO CONSORCIO EL EDEN | | |
|---|---|---|
| EQUIPO | CAPACIDAD | ESTADO |
| RETROEXCAVADORA ORUGADA | 20 TON | BUENO |
| VIBROCOMPACTADOR | 10 TON | BUENO |
| RETROCARGADOR DE LLANTAS | N/A | BUENO |
| TRACTOBOMBAS DE CAUDAL 6" | N/A | BUENO |
| PLANTAS ELECTRICAS | N/A | BUENO |
| MOTONIVELADORA | ARTICULADA | BUENO |



# 8. INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo transcurrido de ejecución en el presente mes de mayo de 2023, se realizan ensayos de laboratorio para el control de resistencias de los concretos fundidos, en específico para los elementos de zapatas, columnas, vigas.

Se adjuntan al presente documento los resultados pertinentes emitidos por el laboratorio.

# 9. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Durante el presente periodo, nuestro consorcio PONAL LYM, cumple con los pagos a los aportes parafiscales y de seguridad social, acorde a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, el artículo 41 de la ley 80 de 1993, y las demás normas reglamentarias.

# 10. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA

A la fecha de elaboración del presente informe, se presenta la siguiente relación financiera del contrato de obra No 06-6-10178-22.

Se certifica el estado de pagos del Contrato de obra 06-6-10178-22:



## 10.1. Cuadro De Información Financiera

| BALANCE GENERAL | |
|---|---|
| CONCEPTO | VALOR |
| Valor inicial (1) | $ 6.974.591.904,74 |
| Vr. Adiciones (2) | |
| Valor Total (1) + (2) | $ 6.974.591.904,74 |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | $1.872.893.800,94 |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | $ 0 |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | $1.872.893.800,94 |
| Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | 5.101.698.103,80 |

| PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE CORTE | MES DE COBRO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| Parcial 1 | Diciembre | $230.088.061,97 | 3.30% |
| Parcial 2 | Enero | $137.154.238,39 | 1.97% |
| Parcial 3 | Abril | $1.104.402.516,04 | 15.83% |
| Parcial 4 | Diciembre | $230.088.061,97 | 5.75% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vr. Pagado a la fecha (3) | | | $1.872.893.800,94 |

## 10.2. Cuadro De Ejecución Y Avance Financiero

| Estado De Ejecución | Porcentaje |
|---|---|
| Física | 35.49% |
| Financiera | 26.85% |

# 11. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA



| Fecha | Asunto | Quien Envía | Quien Recibe |
|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Solicitud Prorroga Entrega De Garantías Y Acta De Inicio. | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 03/10/2022 | Solicitud Prorroga Entrega De Garantías Y Acta De Inicio. | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 18/10/2022 | Listado De Detalles Y Requerimiento Iniciales Contrato De La Referencia | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 20/11/2022 | Entrega Parte 1 Memorias Cantidades Actividades Inmediatas Y Hojas De Vida Personal | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 02/11/2022 | Hojas De Vida Equipo De Trabajo. | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 02/11/2022 | Sin Asunto | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 08/11/2022 | Sin Asunto | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 12/11/2022 | Entrega Pma-Pc-Pmt | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 16/11/2022 | Entrega Programación | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 17/11/2022 | Sin Asunto | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 21/11/2022 | Solicitud Documentación Ct, Entrega Sst | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 22/11/2022 | Documentos Minicargador | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 07/12/2022 | Solicitud de prórroga 1 | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Solicitud de tramite pago parcial 1 | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 20/12/2022 | Certificado FIC | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 21/01/2023 | Entrega de acta parcial No 2 del contrato de obra | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 17/01/2023 | observaciones componente hidráulico y sanitario – ingeniería de detalle. | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 17/01/2023 | Comité técnico con el equipo consultor – Diseños eléctricos, hidráulicos y sanitarios | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 19/01/2023 | Solicitud de Documentos de la Policía Nacional – DIRAF | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 20/01/2023 | Solicitud de Documentos de la Policía Nacional – DIRAF | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 25/01/2023 | Respuesta oficio de interventoría CVN-06-3-10086-2022-047 | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 06/02/2023 | Cumplimiento de requerimientos de interventoría oficios CVN-06-3-10086-2022-049 - CVN-06-3-10086-2022-51 | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 06/02/2023 | 06/02/2023 Cumplimiento de requerimientos de interventoría oficios CVN-06-3-10086-2022-049 - CVN-06-3-10086-2022-51 Consorcio Ponal Interventoría-Carlos Vergara Negrete | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 06/02/2023 | Comité técnico con el equipo consultor – Diseños hidráulicos y sanitarios. | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 14/03/2023 | Respuesta oficio de interventoría CVN-06-3-10086-2022- 059 | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 14/03/2023 | Citación De Comité. | | |
| 30/03/2023 | Respuesta De Derecho De Petición. | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |



Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301 3102409478
ponallym@gmail.com Neiva - Huila

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Reporte De Dificultades En Obra | Consorcio Ponal | Interventoría-Carlos Vergara Negrete |
| 26/04/2023 | Solicitud de información cam | Consorcio Ponal | CAM |



# 12. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

En el desarrollo del programa de gestión social y ambiental, se generó un espacio de acercamiento y diálogo con las comunidades presentes en el área de influencia directa del proyecto para mantener relaciones armónicas que garanticen el intercambio permanente de información, resolución de inquietudes y respuesta a propuestas de los ciudadanos involucrados con las obras de mitigación.

Se estableció un punto de atención a la ciudadanía, ubicado en el área de influencia directa de las obras, en este caso se estableció el campamento como punto de atención a la comunidad.

El punto de atención a la ciudadanía está a cargo del especialista ambiental y el director de obra del proyecto, quien realiza la recepción de las consultas ciudadanas, que son gestionadas por las diferentes áreas del proyecto; estas mismas serán quienes manejen la comunicación entre el constructor, comunidad y autoridades.

Para este periodo no se presentaron solicitudes, quejas o reclamos por parte de las comunidades ni de las autoridades competentes.

# 13. PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS

Durante las últimos días, se han presentado fuertes lluvias en la ciudad de Neiva, y específicamente en las zonas sur del municipio, donde se encuentra localizado nuestro proyecto.

Las lluvias presentadas han generado retrasos en el cronograma de ejecución, específicamente en las actividades de:

Fundida de concretos de zapatas, fundida de concretos de vigas de cimentación y fundida de concretos de columnas.

Adicionalmente, las lluvias generan inundaciones en las excavaciones abiertas en las áreas de zapatas, las cuales se encuentran en procesos de amarre de aceros para inicios de columnas. Dichas inundaciones nos obligan a realizar diariamente

maniobras de manejo de agua, con extracciones manuales y con equipos de bombeo.

Otro flagelo que se presenta actualmente producto de las lluvias es el deterioro de las áreas de circulación que impide el trabajo de los vehículos tipo mixer que nos suministran el concreto premezclado, por tal motivo se han tenido que suspender jornadas de vaciado de concretos, hasta tanto las condiciones climáticas no mejoren.



Esta situación climática, afecta dramáticamente el desarrollo normal de actividades, consolidándose como una situación fuera de las voluntades de nuestro consorcio, la cual puede ser corroborada por el personal de interventoría en obra y los registros diarios de bitácora.

# 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades en obra que comprenden: Localización, replanteo, campamento de obra en unidades de contenedores, rellenos en material de recebo, excavaciones mecánicas, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro e instalación de concreto premezclado para zapatas de cimentación, vigas de cimentación, columnas en concreto, vigas áreas, suministro de material de sub base, instalación de cerca en alambre de púa..
- A la fecha de corte del presente informe, el avance ejecutado acumulado es de 35.49 %.
- Se realiza el cobro parcial de obra No 5 en virtud de lo estipulado en la cláusula cuarta (Forma de pago).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 29 días del mes mayo de 2023.

**Ing. Diego Medina Guerrero**
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

# CONSORCIO PONAL LYM

*NIT. NIT: 901.635.603-5*

## CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

# CONSORCIO PONAL LYM

*NIT. 901.635.603-5*

## CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DEL CONSORCIO PONAL LYM NIT 901.635.603-5**

**CERTIFICAMOS:**

Que durante el periodo comprendido del 24 de abril al 28 de Mayo de 2023, el consorcio Ponal LyM, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior se expide la presente certificación en la ciudad de Neiva, a los (29) días del mes de mayo del 2023.

**Ing. Diego Medina Guerrero**
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

**ANA MILENA OSORIO RAMÍREZ**
CC. 1.032.438.052 de Bogotá
**CONTADOR PUBLICO**
**T.P 282674-T**

# CERTIFICADO DE PAGO FIC

## Servicio Nacional de Aprendizaje

## SENA

**MINISTERIO DE TRABAJO**

# CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO PONAL LYM identificado con el NIT 901635603, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

| N° Licencia/Contrato | Nombre Obra | Ciudad Ejecución | Valor Pago | Periodo | Fecha | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-6-10178-22 | CONSORCIO PONAL LYM | 901635603 | 435,000 | 2023-01 | 20-FEB-2023 | 85181763 |
| 06-6-10178-22 | CONSORCIO PONAL LYM | 901635603 | 175,000 | 2022-12 | 13-ENE-2023 | 82973314 |
| 06-6-1017822 | CONSORCIO PONAL LYM | 901635603 | 580,000 | 2023-04 | 10-ABR-2023 | 87776952 |
| 06-6-10178-22 | CONSORCIO PONAL LYM | 901635603 | 580,000 | 2023-02 | 27-FEB-2023 | 85511348 |
| 06-6-10178-22 | CONSORCIO PONAL LYM | 901635603 | 580,000 | 2023-05 | 08-MAY-2023 | 89421228 |
| 06-6-1017822 | CONSORCIO PONAL LYM | 901635603 | 870,000 | 2023-03 | 10-ABR-2023 | 87775699 |
| | | Total | 3,220,000 | | | |

Expedido por el SENA, a los ocho (08) dias del mes de Mayo de 2023

**"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**

## SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-05-08

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 4051075102 - 201656

**SENA, MÁS TRABAJO**



Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Pagos en Línea

# Respuesta de pagos electrónicos

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 8/5/2023 |
| **Identificación:** | 901403404 |
| **Establecimiento:** | 899999034 SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |
| **Cuenta:** | ********0601 |
| **Número de Factura:** | 89421228 |
| **Referencias:** | 181.235.140.58 - NIT - 9003272353 |
| **Referencias pago:** | Pago Ordinario - FIC |
| **Valor a pagar:** | $580.000 |
| **IVA:** | 0 |
| **Estado Transacción** | Transacción Exitosa |
| **Número Aprobación** | 54731675 |
| **Mensaje Respuesta Transacción:** | La transacción ha sido realizada exitosamente. |

Terminar Imprimir

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039561910

(415)7707212489984(8020) 001876403956191 0

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 3 5 6 0 3 | 5 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO PONAL LYM

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Popayán — Cód. 1 7

24. Dirección
CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA

| País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Cauca | Popayán |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-11-15 / 11:23:56 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PATIÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1061754434 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO PONAL LYM

997. Fecha formalización 2022-11-15/11:23:56

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764039561910

(415)7707212489984(8020) 001876403956191 0

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 3 5 6 0 3 | 5 | | | | |

11. Razón social: CONSORCIO PONAL LYM

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO PONAL LYM CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | LYM | 1 | 50 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Solicitud sobre Numeración de Facturación

**1302**

1. Año: 2022 | 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028067757587

(415)7707212489964(8020) 001302806775758 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 3 5 6 0 3 | 5 | | | | |

11. Razón social: CONSORCIO PONAL LYM

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 24. Establecimiento | 25. Modalidad | Cód. | 26. Prefijo | 27. Desde el número | 28. Hasta el número | 29. Tipo de solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO PONAL LYM CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | LYM | 1 | 50 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |

DEFINITIVO

Firma de quien suscribe el documento

DIAN
2022-11-15 / 11:21:36 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres: PATIÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA
1002. Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1061754434 1004. DV: 1
1005. Cód. Represent.: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO PONAL LYM

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE
993. Establecimiento:
992. Área:
990. Lugar Admitivo.:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción: 2022-11-15/11:21:36

# CONSORCIO PONAL LYM

*NIT. NIT: 901.635.603-5*

## FACTURA ELECTRÓNICA

**CONSORCIO PONAL LYM**
NIT 901.635.603-5
CL 5 9-37
Tel: (602) 3113407052
Popayán - Colombia
contador@estrategiaydefensa.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. LYM 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | POLICIA NACIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **NIT** | 800.141.397-5 | **Teléfono** | (601) 5159000 |
| **Dirección** | CR 59 26 21 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2023-05-25 | 2023-05-25 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cobro de acta parcial No 5, del contrato de obra No PN-DIRAF No. 06-6-10178-22 construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del Comando de Policía Metropolitana de Neiva y Departamento de Policía Huila | 1.00 | 475,189,355.91 |

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**
Seiscientos dos millones doscientos ochenta y tres mil noventa y un pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-25 por $ 602,283,091.51

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 470,717,539.29 |
| Administración 21.00% | 98,850,683.25 |
| Imprevistos 1.00% | 4,707,175.39 |
| Utilidad 5.00% | 23,535,876.97 |
| IVA 19% | 4,471,816.62 |
| Descuento - DESCUENTO | 0.01 |
| **Total a Pagar** | 602,283,091.51 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039561910 aprobado en 20221115 prefijo LYM desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# RUT DEL CONSORCIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 3 5 6 0 3 | 5 | Impuestos y Aduanas de Popayán | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO PONAL LYM

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 5 N 9 37 BRR LOMA LINDA

42. Correo electrónico ponallym@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 3 4 0 7 0 5 2 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 2 | 2 0 2 2 0 8 3 1 | 4 3 3 0 | 2 0 2 2 0 8 3 1 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 14 / 11 : 04: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PATIÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 3 5 6 0 3 | 5 | Impuestos y Aduanas de Popayán | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 0 8 3 1 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 9 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 2 0 8 3 1 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Defensa Nacional — 2 0

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 3 5 6 0 3 | 5 | Impuestos y Aduanas de Popayán | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 0 8 3 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 6 1 7 5 4 4 3 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PATIÑO | RAMIREZ | LUISA | FERNANDA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 8 3 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 5 3 8 2 9 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ | LEDEZMA | MANUEL | ANTONIO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14876304803

(415)7707212489984(8020) 000001487630480 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 3 5 6 0 3 | 5 | Impuestos y Aduanas de Popayán | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 6 1 7 5 4 4 3 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PATIÑO | RAMIREZ | LUISA | FERNANDA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 5 2 0 2 2 0 8 3 1 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 5 3 8 2 9 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ | LEDEZMA | MANUEL | ANTONIO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 9 5 | 2 0 2 2 0 8 3 1 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# CERTIFICACIÓN BANCARIA

NIT 890.300.279-4

# CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS - ESTRATEGIA Y DEFENSA SA** identificada con el número de documento **9003272353** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 17 de febrero de 2020 con la Cuenta Corriente 512-856295 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 05 de enero de 2023.

**Gerardo Jose Silva Castro**
Vicepresidencia de Empresas

ESTRATEGIA & DEFENSA

**CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22**

**CONTRATANTE:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA - DIRAF
**CEDENTE:** CONSORCIO PONAL LYM – **NIT.** 901635603-5
**CESIONARIO:** ESTRATEGIA & DEFENSA SAS **NIT.** 900327235-3

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

**VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($6.974.591.904,74)**

**VALOR A CEDER:** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS **($6.974.591.904,74)**

**LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.061.754.434 de Popayán, actuando en nombre y representación legal del **CONSORCIO PONAL LYM**, con Nit. 901635603-5, quién en adelante se denominará **EL CEDENTE y DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía No.80.058.776 de Bogotá, representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS** con Nit 900327235-3 quien en delante se denomina el **CESIONARIO**, en usos de sus facultades legales y estatutarias, se han convenido celebrar la presente cesión de los derechos económicos del contrato de la referencia, previa las siguientes consideraciones:

Que el día 27 de septiembre de 2022, se suscribió el contrato de obra **PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, celebrado entre el **LA POLICÍA NACIONAL Y EL CONSORCIO PONAL LYM**, cuyo objeto lo constituye la **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

a. Que dentro de la forma de pago LA POLICÍA NACIONAL realizará pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cálculo y que la interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día 25 de cada mes.

   Cuando elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las catas parciales y a su ejecución, deberá ser aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesarios) proyectado y avalo por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

   Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y disponibilidad del plan anual de caja (PAC), así:

   - Acta de recibo parcial. (Suscrita entre los contratistas de obra e interventoría)
   - Factura de venta.
   - Balance de cantidades ejecutadas.
   - Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
   - Certificación pagos FIC.
   - Memoria de cantidades ejecutadas.

Juan Carlos Vargas Jaramillo Notaría 42

ESTRATEGIA & DEFENSA

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC)

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** Consorcio Ponal LYM
**NIT:** 901635603-5
**ENTIDAD FINANCIERA:** BBVA
**TIPO DECUENTA:** CORRIENTE
**NÚMERO DE CUENTA:** 0570011064

b. Que por solicitud expresa de **CONSORCIO PONAL LYM**, quien en el presente contrato tiene la calidad de contratista, se requiere la cesión total de los derechos económicos a favor de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS.**

c. Que el presente acto modificatorio, se efectúa en el artículo 887 del código de comercio, el cual establece: " en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse constituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato..." y en especial en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 que reza"...los contratos estatales son intuito persona y en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse so previa autorización escrita de la entidad contratante.

d. Que de conformidad con el artículo 32 de la ley 80 de 1993, las entidades públicas pueden celebrasen todos los contratos previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

e. Que en el artículo 13 de la misma ley, consagra que los contratos que celebren las entidades estatales se rigen por la disposiciones civiles y comerciales, salvo en las materias expresamente reguladas por la ley 80 de 1993.

En virtud de lo expuesto las partes acuerdan:

**CLAUSULA PRIMERA CESIÓN.** Ceder el 100% de los derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, suscrito entre **LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** y **CONSORCIO PONAL LYM** a favor de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, y en virtud del contrato señalado, reciba la suma de dinero que se deba pagar como consecuencia de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22.**

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
**NIT:** 9003272353
**ENTIDAD FINANCIERA:** OCCIDENTE
**TIPO DECUENTA:** CORRIENTE
**NÚMERO DE CUENTA:** 512856295

Dirección Oficina Principal: Calle 152 A No. 17 A - 80 Bogotá – Colombia
Teléfonos: (601) 8053770 – 3107841467
Email: contacto@estrategiaydefensa.com

ESTRATEGIA & DEFENSA

**CLAUSULA SEGUNDA – AUTORIZACION. LA POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, autoriza la cesión de derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, a **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS** en los términos del mismo y del presente documento.

**CLAUSULA TERCERA- ACEPTACIÓN. EL CESIONARIO** acepta la cesión de los derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22** y con suscripción de este documento. Adquiere todos los derechos y obligaciones que dé él se derivan.

**CLAUSULA CUARTA.** Las demás clausulas establecidas en el **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22** continúan vigentes y sin modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente contrato, siendo veinticuatro (24) de noviembre del año 2022, en tres (3) originales.

**LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ**
**C.C 1.061.754.434 DE POPAYÁN**
**CONSORCIO PONAL LYM**
**CEDENTE**

**DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**
**C.C. 80058776 DE BOGOTA**
**ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**
**CESIONARIO**

Juan Carlos Vargas Jaramillo Notaría 42

Dirección Oficina Principal: Calle 162 A No. 17 A - 60 Bogotá – Colombia
Teléfonos: (601) 8053779 – 3107841467
Email: contacto@estrategiaydefensa.com

## DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO
### Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

14386627

En la ciudad de Popayán, Departamento de Cauca, República de Colombia, el primero (1) de diciembre de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Segunda (2) del Círculo de Popayán, compareció: LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1061754434 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----

v3m30vqwkvmr
01/12/2022 - 14:21:32



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

*FABIO ANDRES CASTRO BRAVO*

Notario Segundo (2) del Círculo de Popayán, Departamento de Cauca - Encargado

*Consulte este documento en www.notariasegura.com.co*
*Número Único de Transacción:* v3m30vqwkvmr

Juan Carlos Vergara Jaramillo
Notario
42
Acta 1

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON HUELLA

NOTARÍA CUARENTA Y DOS (42)
CÍRCULO DE BOGOTÁ - COLOMBIA

JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO,
NOTARIO TITULAR

CERTIFICA:

Que MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO

Se identificó con: C.C. 80058775

manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma que en él aparece es la suya. En constancia, firma nuevamente y estampa la huella de su dedo índice derecho.

(La certificación de huella causa derechos notariales según tarifa)

Bogotá D.C. 05/12/2022

teen55vfdcecc

www.notariaenlinea.com
Q2FD0WQG8SWS82YC

YEMR

Identificación Biométrica
Dto. 19 Decreto Ley 019 de 2012
Notaría No. 42 14450 350

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y EL CONSORCIO PONAL LYM, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".**

Entre los suscritos, de una parte la **POLICÍA NACIONAL**, quien actúa a través de su representante legal o su delegado para el caso que nos ocupa señor coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79'637.727** expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre de la **NACIÓN - POLICÍA NACIONAL**, en su calidad de **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL (E)**, nombrado mediante Orden Administrativa de Personal No. 23-009 del 09/01/2023, debidamente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022, emanada de la Dirección General de la Policía Nacional, en adelante se denominará la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**, con **NIT. 800.141.397-5**, y por la otra el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.058.776 expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal del **CONSORCIO PONAL LYM**, con **NIT** 901.635.603-5, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente modificatorio No. 1, previos los siguientes considerandos: **a).** La Policía Nacional celebró con el consorcio PONAL LYM., el contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, el 27 de septiembre de 2022, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", por valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($6.974.591.904,74) incluido AIU e IVA., con plazo de ejecución hasta el 20/12/2022, previa aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la Interventoría). **b).** Que el 29 de septiembre de 2022, la Jefe Grupo de Presupuesto General de la Dirección Administrativa y Financiera, expidió el Registro Presupuestal del Compromiso No. 406222, por un valor de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($6.974.591.904,74), recurso 11. **c).** Que el 18 de octubre de 2022, la Dirección Administrativa y Financiera, aprobó la garantía única del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, póliza No. 435-47-994000050931, anexo No. 1, expedida el 10 de octubre de 2022 y póliza No. 435-74-994000012439, anexo No. 1, expedida el 10 de octubre de 2022, por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. **d).** Que mediante oficio No. GS-2022-042127/DIRAF-ARCON-17.5 del 19 de diciembre de 2022, se suscribió la aceptación cesión de derechos económicos del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22. **e).** Que el 19 de diciembre de 2022, se suscribió la prórroga No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en la cual se prorrogó el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, por ciento cincuenta (150) días calendario, es decir, hasta el día 19 de mayo de 2023. **f).** Que el 28 de diciembre de 2022, la Dirección Administrativa

y Financiera, aprobó la garantía única del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, póliza No. 435-47-994000050931, anexo No. 3, expedida el 26 de diciembre de 2022 y póliza No. 435-74-994000012439, anexo No. 2, expedida el 23 de diciembre de 2022, por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. g). Que mediante oficio sin número del 13 de enero de 2023, radicado en la ventanilla única de correspondencia y radicación de la Dirección General de la Policía Nacional, bajo el Nro. 001426 el 13 de enero de 2023, el señor DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO, Representante Legal del CONSORCIO PONAL LYM., presentó a la Dirección Administrativa y Financiera, solicitud de modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, mediante acta de cambio y nombramiento representante legal y representante legal suplente del consorcio PONAL LYM, en los siguientes términos: *"(...)*

Adjunto encontrará:

- Acta de cambio y nombramiento representante legal y representante legal suplente consorcio PONAL LYM debidamente autenticada.
- Copia cédula de ciudadanía Diego Fernando Medina Guerrero.
- Copia cédula de ciudadanía Ana Milena Osorio Ramirez.

Nuestros datos de notificación son:

**Dirección:** Carrera 5 No 10 – 49
Oficina 301
Neiva – Huila

**Celular:** 3107841467

## ACTA DE CAMBIO Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

## CONSORCIO PONAL LYM

## NIT. 901635603-5

## ACTA No. (01)

En la ciudad de Popayán, siendo las 10:40 am, del día 26 de noviembre de 2022 se reúnen los integrantes del consorcio PONAL LYM, con el objeto de realizar el cambio y nuevos nombramientos de los representante legal y representante legal suplente del consorcio.

Estuvieron presentes los integrantes del consorcio, actuando como actual representante legal la señorita Luisa Fernanda Patiño Ramirez, identificada con cédula de ciudadanía 1.061.754.434 de Popayán y el Manuel Antonio Muñoz Ledezma, identificado con cédula de ciudadanía 10.538.292 de Popayán como representante legal suplente. Con participación consorcial así:

| NOMBRE DEL INTEGRANTE | PARTICIPACIÓN CONSORCIO |
|---|---|
| LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ | 5% |
| MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA | 95% |
| TOTAL | 100% |

El 100% de los integrantes del consorcio aprueban el nombramiento de **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía número **80.058.776** de Bogotá, como Representante legal, en reemplazo de **LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No **1.061.754.434** de Popayán y a **ANA MILENA OSORIO RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.032.438.052** de Bogotá, como representante legal suplente, en reemplazo de **MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA**, identificado con cédula de ciudadanía No **10.538.292** de Popayán.

Los anteriores nombramientos son realizados de manera inamovible por los integrantes del consorcio, esto quiere decir que durante la ejecución y/o cesión del contrato, a no ser que alguno de los nuevos nombrados manifieste lo contrario, no se podrán efectuar cambios en la representación legal aquí y desde ahora establecida; salvo que con su actuar, los nuevos representantes legales principal y suplente, perjudiquen directamente y de manera lesiva a los consorciados.

Tanto la señorita **LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ** como el señor **MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA** declaran que no tienen ninguna limitación para realizar el cambio, y a su vez otorgan total libertad, sin limitación, a los nuevos representantes legales, **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO Y ANA MILENA OSORIO RAMIREZ** para realizar todos los trámites pertinentes, esto incluye cesiones totales o parciales y actuar de manera amplia y suficiente en nombre del consorcio **PONAL LYM – NIT. 901635603-5** para el **CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10178-22**, cuyo objeto es "construcción y dotación edificio atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1 - b del comando de policía metropolitana de Neiva y departamento de policía huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste" respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

**Aceptación de la Nueva Representación Legal Designada.**

Una vez comunicada la designación para el cargo de representante legal al señor **Diego Fernando Medina Guerrero** y representante legal suplente a la señora **Ana Milena Osorio Ramirez** en el consorcio **PONAL LYM**, se manifiesta por ambas partes la aceptación del cargo y el compromiso a ejercer fielmente las funciones.

Como prueba de la aceptación de los nombramientos proceden a firmar al final de la presente acta.

**Lectura y Aprobación del Acta.**

Los integrantes del consorcio y la nueva representación legal del consorcio hacen lectura del acta y esta es aprobada.

**LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ.**
1.061.754.434 de Popayán

**MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA**
10.538.292 de Popayán.

**DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**
80.058.776 de Bogotá

**ANA MILENA OSORIO RAMIREZ.**
1.032.438.052 de Bogotá

*Imagen pegada del PDF (...)".* h). Que mediante oficio Nro. GS-2023-001231/DIRAF del 17 de enero de 2023, el supervisor del contrato de consultoría PN DIRAF No. 06-3-10086-22, señor Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO, presentó al señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ, Director Administrativo y Financiero (E), concepto de viabilidad para el modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en los siguientes términos: *"(...)*

> En atención al desarrollo del contrato PN DIRAF No. 06-6-10178-22 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", y considerando el acta No.1 del consorcio PONAL LYM del 26/11/2022 donde la señorita Luisa Fernanda Patiño Ramirez representante legal del consorcio establece soporte escrito y legal (documento autenticado por Notaría). para que la entidad contratante efectúe los tramites administrativos para lograr el cambio de representante legal y representante legal suplente, respetuosamente informo a mi Coronel que luego de verificar los documentos anexos en el oficio GE-2022-001426-DIPON del 13/01/2023 y la necesidad establecida por el consocio, esta supervisión considera viable y necesario el trámite administrativo requerido por el contratista y así, avanzar en el desarrollo de las obras contratadas.

*Imagen pegada del PDF (...)".* i). Que es procedente la celebración del modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, conforme lo solicitado por el contratista y el supervisor, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** modificar parcialmente el ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO" del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, en el cual quedará como representante legal del CONSORCIO PONAL LYM, el señor DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.058.776 expedida en Bogotá D.C. y como representante legal suplente la señora ANA MILENA OSORIO RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.438.052 de Bogotá D.C. **PARÁGRAFO:** El presente modificatorio No. 1 no genera costos adicionales para la Policía Nacional. **CLÁUSULA SEGUNDA – PERFECCIONAMIENTO:** Para el perfeccionamiento del presente modificatorio No. 1 al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, se requiere de las firmas de las partes. **PARÁGRAFO:** la Policía Nacional se obliga a dar aviso de la suscripción del presente modificatorio No. 1 a la Compañía Aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que expidió el mecanismo de cobertura del riesgo, que respalda las obligaciones contractuales del contrato de obra PN-DIRAF No. 06-6-10178-22. **CLÁUSULA TERCERA:** las demás cláusulas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10178-22, continúan vigentes. Para constancia se firma en Bogotá D.C.,

**LA POLICÍA NACIONAL**

Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**
Director Administrativo y Financiero de la Policía Nacional (E)

**CONTRATISTA**

**DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**
Representante Legal del CONSORCIO PONAL LYM.

| Elaboró | Revisó | Revisó | Revisó | Revisó |
|---|---|---|---|---|
| SI. German Eduardo Daza Chacón<br>Analista Contractual y Seguimiento | MY. José Ricardo Rodríguez Andrade<br>Jefe Grupo Contractual y Seguimiento | MY. Elena Yuriet García<br>Jefe Oficina Asuntos Jurídicos DIRAF | Mayor [illegible]<br>Jefe Área [illegible] | TC. Andrés Ricardo Vaca Camacho<br>Subdirector Administrativo y Financiero (E) |

# LABORATORIOS

# CONSORCIO PONAL LYM

# INFORME LABORATORIO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

# "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA."

MAYO DE 2023



Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

## REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13

| | |
|---|---|
| ORDEN DE TRABAJO | 29-2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA. " |
| UBICACIÓN | LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS |
| FECHA EMISION INFORME: | miércoles, 9 de marzo de 2022 |

| FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO | FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO | COD. | COD. INTERNO LABORATORIO | DIMENSIONES CILINDRO | | Lectura | LECTURA | Edad (Dias) | Fecha de Rotura | Resistencia Obtenida (PSI) | % de Fraguado | Tipo de falla | Especificación Resistencia (PSI) | Observaciones y/o Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Diametro | Longitud | KN | Lbs | | | | | | | |
| 24/02/2023 | 10/02/2023 | 1 | LAB 1 | 15,00 | 30,00 | 729,1 | 163908 | 14 | 24/02/2023 | 5984 | 120% | 5 | 5000 | concreto cimentacion bloque A |
| | 10/02/2023 | 2 | | 15,00 | 30,00 | 705,4 | 158580 | 14 | 24/02/2023 | 5790 | 116% | 6 | 5000 | |
| | 10/02/2023 | 3 | | | | | | 28 | 10/03/2023 | | | | 5000 | |
| | 10/02/2023 | 4 | | | | | | 28 | 10/03/2023 | | | | 5000 | |
| 24/02/2023 | 18/02/2023 | 5 | LAB 2 | 15,00 | 30,00 | 565,9 | 127219 | 7 | 25/02/2023 | 4645 | 93% | 4 | 5000 | concreto cimentacion bloque A |
| | 18/02/2023 | 6 | | 15,00 | 30,00 | 549,0 | 123420 | 7 | 25/02/2023 | 4506 | 90% | 2 | 5000 | |
| | 18/02/2023 | 7 | | 15,00 | 30,00 | 605,5 | 136122 | 14 | 4/03/2023 | 4970 | 99% | 6 | 5000 | |
| | 18/02/2023 | 8 | | 15,00 | 30,00 | 549,8 | 123600 | 14 | 4/03/2023 | 4512 | 90% | 6 | 5000 | |
| 24/02/2023 | 20/02/2023 | 9 | LAB 3 | 15,00 | 30,00 | 500,1 | 112427 | 7 | 27/02/2023 | 4105 | 82% | 4 | 5000 | concreto bloque A |
| | 20/02/2023 | 10 | | 15,00 | 30,00 | 527,9 | 118677 | 7 | 27/02/2023 | 4333 | 87% | 4 | 5000 | |
| | 20/02/2023 | 11 | | 15,00 | 30,00 | 528,4 | 118789 | 14 | 6/03/2023 | 4337 | 87% | 2 | 5000 | |
| | 20/02/2023 | 12 | | 15,00 | 30,00 | 522,9 | 117553 | 14 | 6/03/2023 | 4292 | 86% | 4 | 5000 | |
| 24/02/2023 | 22/02/2023 | 13 | LAB 4 | 15,00 | 30,00 | 614,0 | 138033 | 7 | 1/03/2023 | 5039 | 101% | 1 | 5000 | concreto bloque A |
| | 22/02/2023 | 14 | | 15,00 | 30,00 | 618,7 | 139089 | 7 | 1/03/2023 | 5078 | 102% | 5 | 5000 | |
| | 22/02/2023 | 15 | | 15,00 | 30,00 | 709,3 | 159457 | 14 | 8/03/2023 | 5822 | 116% | 5 | 5000 | |
| | 22/02/2023 | 16 | | 15,00 | 30,00 | 711,8 | 160019 | 14 | 8/03/2023 | 5842 | 117% | 4 | 5000 | |



Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

## REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13

| | |
|---|---|
| ORDEN DE TRABAJO | 29-2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA " |
| UBICACIÓN | LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS |
| FECHA EMISION INFORME: | jueves, 20 de abril de 2023 |

| FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO | FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO | COD. | COD. INTERNO LABORATORIO | DIMENSIONES CILINDRO | | Lectura | LECTURA | Edad (Dias) | Fecha de Rotura | Resistencia Obtenida (PSI) | % de Fraguado | Tipo de falla | Especificación Resistencia (PSI) | Observaciones y/o Ubicacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Diametro | Longitud | KN | Lbs | | | | | | | |
| 24/02/2023 | 27/02/2023 | 17 | LAB 5 | 15,00 | 30,00 | 443,6 | 99725 | 7 | 6/03/2023 | 3641 | 73% | 2 | 5000 | concreto cimentacion bloque A |
| | 27/02/2023 | 18 | | 15,00 | 30,00 | 467,9 | 105188 | 7 | 6/03/2023 | 3840 | 77% | 3 | 5000 | |
| | 27/02/2023 | 19 | | 15,00 | 30,00 | 466,9 | 105413 | 14 | 13/03/2023 | 3848 | 77% | 3 | 5000 | |
| | 27/02/2023 | 20 | | 15,00 | 30,00 | 451,2 | 101434 | 14 | 13/03/2023 | 3703 | 74% | 4 | 5000 | |
| 24/02/2023 | 4/03/2023 | 21 | LAB 6 | 15,00 | 30,00 | 498,8 | 112135 | 7 | 11/03/2023 | 4094 | 82% | 5 | 5000 | Zapatas B2, B3, Viga de Cimentacion Eje B entre ejes 4 a 7 Bloque A |
| | 4/03/2023 | 22 | | 15,00 | 30,00 | 491,2 | 110426 | 7 | 11/03/2023 | 4032 | 81% | 6 | 5000 | |
| | 4/03/2023 | 23 | | 15,00 | 30,00 | 590,1 | 132660 | 14 | 18/03/2023 | 4843 | 97% | 5 | 5000 | |
| | 4/03/2023 | 24 | | 15,00 | 30,00 | 641,2 | 144152 | 28 | 1/04/2023 | 5263 | 105% | 4 | 5000 | |
| 24/02/2023 | 13/03/2023 | 25 | LAB 7 | 15,00 | 30,00 | 429,8 | 96623 | 7 | 20/03/2023 | 3526 | 71% | 4 | 5000 | Pedestales a columnasA2, A3, A4, A5, A6 B7, ytramos de vigas próximas a B6,B5 y B4;y tramos de vigas entre B1, B2, B3 y B4 con sus tercios en dirección eje A y C, del bloque A |
| | 13/03/2023 | 26 | | 15,00 | 30,00 | 431,6 | 97023 | 7 | 20/03/2023 | 3542 | 71% | 5 | 5000 | |
| | 13/03/2023 | 27 | | 15,00 | 30,00 | 554,2 | 124589 | 14 | 27/03/2023 | 4549 | 91% | 3 | 5000 | |
| | 13/03/2023 | 28 | | 15,00 | 30,00 | 614,2 | 138078 | 28 | 10/04/2023 | 5041 | 101% | | 5000 | |
| 21/03/2023 | 18/03/2023 | 29 | LAB 8 | 15,00 | 30,00 | 605,8 | 136189 | 14 | 1/04/2023 | 4972 | 99% | 5 | 5000 | cimentacion y vifgas Bloque A premezclado |
| | 18/03/2023 | 30 | | 15,00 | 30,00 | 603,5 | 135672 | 14 | 1/04/2023 | 4953 | 99% | 5 | 5000 | |
| | 18/03/2023 | 31 | | 15,00 | 30,00 | 641,2 | 144148 | 28 | 15/04/2023 | 5263 | 105% | 4 | 5000 | |
| | 18/03/2023 | 32 | | 15,00 | 30,00 | 645,5 | 145114 | 28 | 15/04/2023 | 5298 | 106% | 4 | 5000 | |



Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

## REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

| | |
|---|---|
| ORDEN DE TRABAJO | 29-2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA " |
| UBICACIÓN | LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS |
| FECHA EMISION INFORME: | martes, 2 de mayo de 2023 |

| FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO | FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO | COD. | COD. INTERNO LABORATORIO | DIMENSIONES CILINDRO | | Lectura | LECTURA | Edad (Dias) | Fecha de Rotura | Resistencia Obtenida (PSI) | % de Fraguado | Tipo de falla | Especificación Resistencia (PSI) | Observaciones y/o Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Diametro | Longitud | KN | Lbs | | | | | | | |
| 25/03/2023 | 22/03/2023 | 33 | LAB 9 | 15,00 | 30,00 | 518,5 | 116563 | 7 | 29/03/2023 | 4256 | 85% | 2 | 5000 | concreto bloque A |
| | 22/03/2023 | 34 | | 15,00 | 30,00 | 526,5 | 118362 | 7 | 29/03/2023 | 4321 | 86% | 3 | 5000 | |
| | 22/03/2023 | 35 | | 15,00 | 30,00 | 624,8 | 140461 | 14 | 5/04/2023 | 5128 | 103% | 4 | 5000 | |
| | 22/03/2023 | 36 | | 15,00 | 30,00 | 618,5 | 139044 | 14 | 5/04/2023 | 5076 | 102% | 3 | 5000 | |
| 27/03/2023 | 24/03/2023 | 37 | LAB 10 | 15,00 | 30,00 | 579,8 | 130344 | 7 | 31/03/2023 | 4759 | 95% | 2 | 5000 | Zapatas C3, C4 y C5 del Bloque A |
| | 24/03/2023 | 38 | | 15,00 | 30,00 | 581,2 | 130659 | 7 | 31/03/2023 | 4770 | 95% | 2 | 5000 | |
| | 24/03/2023 | 39 | | 15,00 | 30,00 | 614,2 | 138078 | 14 | 7/04/2023 | 5041 | 101% | 4 | 5000 | |
| | 24/03/2023 | 40 | | 15,00 | 30,00 | 618,2 | 138977 | 14 | 7/04/2023 | 5074 | 101% | 5 | 5000 | |
| 28/03/2023 | 25/03/2023 | 41 | LAB 11 | 15,00 | 30,00 | 486,6 | 109392 | 7 | 1/04/2023 | 3994 | 80% | 3 | 5000 | Zapata C2 del Bloque A,. Zapata A6 del Bloque B |
| | 25/03/2023 | 42 | | 15,00 | 30,00 | 490,2 | 110201 | 7 | 1/04/2023 | 4023 | 80% | 2 | 5000 | |
| | 25/03/2023 | 43 | | 15,00 | 30,00 | 510,3 | 114720 | 14 | 8/04/2023 | 4188 | 84% | 5 | 5000 | |
| | 25/03/2023 | 44 | | 15,00 | 30,00 | 505,1 | 113551 | 14 | 8/04/2023 | 4146 | 83% | 4 | 5000 | |
| 1/04/2023 | 29/03/2023 | 45 | LAB 12 | 15,00 | 30,00 | 526,3 | 118317 | 14 | 12/04/2023 | 4320 | 86% | 3 | 5000 | Zapatas A4 y A5 del Bloque B y parcial de viga Eje C entre ejes 2 y 3 con sus tercios próximos. |
| | 29/03/2023 | 46 | | 15,00 | 30,00 | 542,4 | 121936 | 14 | 12/04/2023 | 4452 | 89% | 4 | 5000 | |
| | 29/03/2023 | 47 | | 15,00 | 30,00 | 687,2 | 154489 | 28 | 26/04/2023 | 5640 | 113% | 3 | 5000 | |
| | 29/03/2023 | 48 | | 15,00 | 30,00 | 702,2 | 157861 | 28 | 26/04/2023 | 5763 | 115% | 4 | 5000 | |



Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

## REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
## INV-E-410-13

| | |
|---|---|
| ORDEN DE TRABAJO | 29-2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA." |
| UBICACIÓN | LOTE TRAPICHITO 3 —1.6 KM DEL CRUCE SURABASTOS |
| FECHA EMISION INFORME: | viernes, 19 de mayo de 2023 |

| FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO | FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO | COD. | COD. INTERNO LABORATORIO | DIMENSIONES CILINDRO | | Lectura | LECTURA | Edad (Dias) | Fecha de Rotura | Resistencia Obtenida (PSI) | % de Fraguado | Tipo de falla | Especificación Resistencia (PSI) | Observaciones y/o Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Diametro | Longitud | KN | Lbs | | | | | | | |
| 2/04/2023 | 30/03/2023 | 49 | LAB 13 | 15,00 | 30,00 | 526,1 | 118272 | 14 | 13/04/2023 | 4318 | 86% | 4 | 5000 | Zapatas B6, B5, B4 Y B1 del Bloque B |
| | 30/03/2023 | 50 | | 15,00 | 30,00 | 557,9 | 125421 | 14 | 13/04/2023 | 4579 | 92% | 3 | 5000 | |
| | 30/03/2023 | 51 | | 15,00 | 30,00 | 583,7 | 131221 | 28 | 27/04/2023 | 4791 | 96% | 5 | 5000 | |
| | 30/03/2023 | 52 | | 15,00 | 30,00 | 579,3 | 130232 | 28 | 27/04/2023 | 4755 | 95% | 3 | 5000 | |
| 4/04/2023 | 1/04/2023 | 53 | LAB 14 | 15,00 | 30,00 | 670,8 | 150802 | 14 | 15/04/2023 | 5506 | 110% | 3 | 5000 | Zapatas B2, B3 del bloque A y Zapata C6 del Bloque B. POLINAL |
| | 1/04/2023 | 54 | | 15,00 | 30,00 | 628,2 | 141225 | 14 | 15/04/2023 | 5156 | 103% | 3 | 5000 | |
| | 1/04/2023 | 55 | | 15,00 | 30,00 | 692,8 | 155748 | 28 | 29/04/2023 | 5686 | 114% | 4 | 5000 | |
| | 1/04/2023 | 56 | | 15,00 | 30,00 | 708,0 | 159165 | 28 | 29/04/2023 | 5811 | 116% | 5 | 5000 | |
| 8/04/2023 | 5/04/2023 | 57 | LAB 15 | 15,00 | 30,00 | 690,7 | 155276 | 14 | 19/04/2023 | 5669 | 113% | 5 | 5000 | Vigas de cimentacion Eje 1 entre B/C/D y eje C entre ejes 1 y 2. Del Bloque A |
| | 5/04/2023 | 58 | | 15,00 | 30,00 | 623,1 | 140078 | 14 | 19/04/2023 | 5114 | 102% | 4 | 5000 | |
| | 5/04/2023 | 59 | | 15,00 | 30,00 | 655,4 | 147340 | 28 | 3/05/2023 | 5379 | 108% | 4 | 5000 | |
| | 5/04/2023 | 60 | | 15,00 | 30,00 | 653,5 | 146913 | 28 | 3/05/2023 | 5364 | 107% | 4 | 5000 | |
| 16/04/2023 | 13/04/2023 | 61 | LAB 16 | 15,00 | 30,00 | 663,4 | 149138 | 14 | 27/04/2023 | 5445 | 109% | 4 | 5000 | 13 ABRIL VIGA EJE C ENTRE EJES 4-5-6 DEL BLOQUE A |
| | 13/04/2023 | 62 | | 15,00 | 30,00 | 665,1 | 149520 | 14 | 27/04/2023 | 5459 | 109% | 3 | 5000 | |
| | 13/04/2023 | 63 | | 15,00 | 30,00 | 687,2 | 154489 | 28 | 11/05/2023 | 5640 | 113% | 4 | 5000 | |
| | 13/04/2023 | 64 | | 15,00 | 30,00 | 690,2 | 155163 | 28 | 11/05/2023 | 5665 | 113% | 4 | 5000 | |



Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

## REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV-E-410-13

| | |
|---|---|
| ORDEN DE TRABAJO | 29-2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA." |
| UBICACIÓN | LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS |
| FECHA EMISION INFORME: | viernes, 19 de mayo de 2023 |

| FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO | FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO | COD. | COD. INTERNO LABORATORIO | DIMENSIONES CILINDRO | | Lectura | LECTURA | Edad (Días) | Fecha de Rotura | Resistencia Obtenida (PSI) | % de Fraguado | Tipo de falla | Especificación Resistencia (PSI) | Observaciones y/o Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Diametro | Longitud | KN | Lbs | | | | | | | |
| 18/04/2023 | 15/04/2023 | 65 | LAB 17 | 15,00 | 30,00 | 550,3 | 123712 | 14 | 29/04/2023 | 4517 | 90% | 3 | 5000 | 15 ABRIL PEDESTALES BLOQUE A D1,C1,C2,C3,C4,C5 Y ZAPATAS D6,D5,D4,D3,D2,D1, VIGA CIMENTACION EJE C 6-7 |
| | 15/04/2023 | 66 | | 15,00 | 30,00 | 560,9 | 126095 | 14 | 29/04/2023 | 4604 | 92% | 5 | 5000 | |
| | 15/04/2023 | 67 | | 15,00 | 30,00 | 602,2 | 135380 | 28 | 13/05/2023 | 4943 | 99% | 1 | 5000 | |
| | 15/04/2023 | 68 | | 15,00 | 30,00 | 597,8 | 134391 | 28 | 13/05/2023 | 4906 | 98% | 2 | 5000 | |
| 1/05/2023 | 28/04/2023 | 69 | LAB 18 | 15,00 | 30,00 | 534,1 | 120070 | 14 | 12/05/2023 | 4384 | 88% | 1 | 5000 | Concreto Plástico 5000 PSI Viga Eje A entre 3/4/5/6 y los tercios de las vías de los ejes 6, 5, 4 entre ejes A y B del Bloque B |
| | 28/04/2023 | 70 | | 15,00 | 30,00 | 565,9 | 127219 | 14 | 12/05/2023 | 4645 | 93% | 1 | 5000 | |
| | 28/04/2023 | 71 | | 15,00 | 30,00 | | 0 | 28 | 26/05/2023 | 0 | 0% | | 5000 | |
| | 28/04/2023 | 72 | | 15,00 | 30,00 | | 0 | 28 | 26/05/2023 | 0 | 0% | | 5000 | |
| 5/05/2023 | 2/05/2023 | 73 | LAB 19 | 15,00 | 30,00 | 576,1 | 129512 | 14 | 16/05/2023 | 4728 | 95% | 3 | 5000 | Concreto Plástico, Bloque B: vigas de cimentación: EjeA entre 1/2/3, tercios de viejas ejes 1, 2 entre ejes A y B, eje 6 entre A/B/C, tercio de viga Ele C entre ejes 5 y 6 |
| | 2/05/2023 | 74 | | 15,00 | 30,00 | 590,2 | 132682 | 14 | 16/05/2023 | 4844 | 97% | 1 | 5000 | |
| | 2/05/2023 | 75 | | 15,00 | 30,00 | | 0 | 28 | 30/05/2023 | 0 | 0% | | 5000 | |
| | 2/05/2023 | 76 | | 15,00 | 30,00 | | 0 | 28 | 30/05/2023 | 0 | 0% | | 5000 | |




Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

# REPORTE DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
## INV-E-410-13

| | |
|---|---|
| ORDEN DE TRABAJO | 29-2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PONAL LYM |
| PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRIMERA FASE 1B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIAN HUILA " |
| UBICACIÓN | LOTE TRAPICHITO 3 —1,6 KM DEL CRUCE SURABASTOS |
| FECHA EMISION INFORME: | viernes, 19 de mayo de 2023 |

| FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO | FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO | COD. | COD. INTERNO LABORATORIO | DIMENSIONES CILINDRO | | Lectura | LECTURA | Edad (Dias) | Fecha de Rotura | Resistencia Obtenida (PSI) | % de Fraguado | Tipo de falla | Especificación Resistencia (PSI) | Observaciones y/o Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Diametro | Longitud | KN | Lbs | | | | | | | |
| 7/05/2023 | 4/05/2023 | 77 | LAB 20 | 15,00 | 30,00 | 551,1 | 123892 | 14 | 18/05/2023 | 4523 | 90% | 5 | 5000 | Viga de Cimentación Eje B entre ejes 1/2/3 y tercios aledaños |
| | 4/05/2023 | 78 | | 15,00 | 30,00 | 511,3 | 114945 | 14 | 18/05/2023 | 4196 | 84% | 4 | 5000 | |
| | 4/05/2023 | 79 | | 15,00 | 30,00 | | 0 | 28 | 1/06/2023 | 0 | 0% | | 5000 | |
| | 4/05/2023 | 80 | | 15,00 | 30,00 | | 0 | 28 | 1/06/2023 | 0 | 0% | | 5000 | |

TIPO DE FALLA





OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%


REALIZO
FENER GONZALEZ
LABORATORISTA

CALCULO
ANDERSON URREA COLLAZOS
JEFE DE LABORATORIO



Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

# Registro fotografico

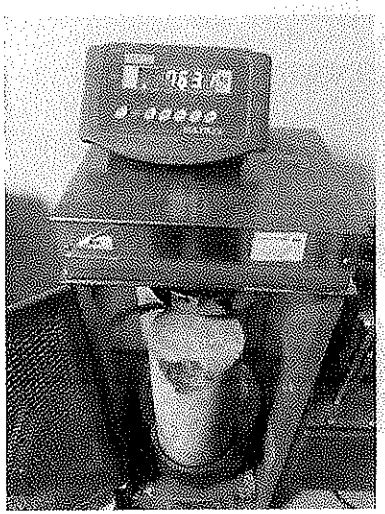

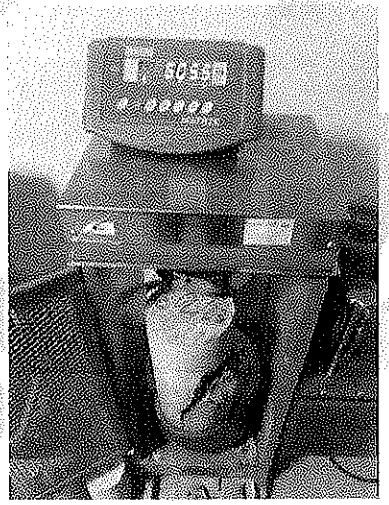



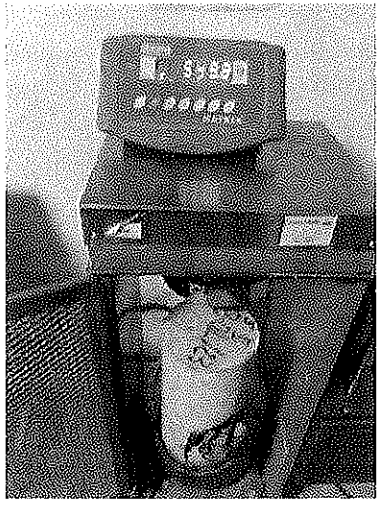



Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699

E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS
