Contrato 229 de 2022

Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Contrato 229 de 2022

1. Oficio de Radicación

Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá Febrero 28 de 2023

Señores

Inversiones AYPE Ltda

Asunto: Contrato 229 de 2022.

Referencia: Oficio de radicación Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023.

Para el tema del asunto, nos permitimos relacionar a continuación la información que estamos radicando para el tema del asunto:

1.Oficio de radicación

2.Lista de chequeo

3.Balance Financiero del Contrato de Obra firmado por el Contratista.

6.Acta de Corte de obra No 02

7.Memorias de cantidades correspondientes al Corte de obra No 02

9.Informe Ejecutivo mensual febrero 2023

10.Factura de Venta

11.Rut

11.Autorización de facturación

11.Certificación bancaria

12.Certificado de aportes emitido por Revisoría Fiscal

12. Vigencia tarjeta profesional, copia tarjeta profesional y copia de cédula del Revisor Fiscal

13.Planilla de pago aportes de seguridad social

14.Certificado del personal en condición de discapacidad

17. Informe de avance mensual de obra

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

18.Informe de PGAS y SG-SST

19.Manifiesto RCD

20.Formato de registro y actualización PIN

22. Bitácora de obra

23.Balance Financiero

Nota: se omiten los numerales que no aplican para este contrato.

Quedamos atentos para resolver cualquier inquietud,

Cordialmente



Martha Lucía Rey Navarro

Directora de obra

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Contrato 229 de 2022

2.Lista de chequeo

Corte de obra No 02, periodo Febrero 1 al 28 del 2023

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Contrato No.	229-2022
Contratista	INGENIERÍA RH SAS
Nit.	830.061.440-1
Corte No.	**2**

	LISTA DE CHEQUEO **RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS DE CONTRATOS**			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**N/A**	**Pg o Archivo**
1*	**Oficio de radicación** Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	**CUMPLE**		.3-4
2*	**Formato Lista de checheo.** Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	**CUMPLE**		.6-7
3*	**Balance Financiero del Contrato de Obra** Debidamente verificado y firmado por el Contratista.	**CUMPLE**		9
4*	**Certificado de cumplimiento del servicio prestado** Expedido por la Interventoría del contrato del cumplimiento a las obligaciones.	**CUMPLE**		10
5*	**Estado y manejo del Anticipo**		**N/A**	
a	**Certificado de consignación Rendimientos Financieros** Soporte o certificación de consignación de Rendimientos Financieros a la Dirección del Tesoro Público		**N/A**	
b	**Certificado de consignación Excedentes del Anticipo** Soporte o certificación de consignación de Excedentes de Recursos a la Dirección del Tesoro Público		**N/A**	
c	**Certificado de Inversión del Anticipo** Extracto o certificación de inversión del anticipo.		**N/A**	
d	**Certificado de Liquidación Fiducia** Certificado de liquidación de la fiducia, expedido por la fiduciaria.		**N/A**	
6*	**Acta recibo parcial / final del Contrato** Acta de corte debidamente firmada por Contratista e Interventoría	**CUMPLE**		.12-16
7*	**Memorias de cantidades** Formatos firmados por Contratista e Interventoría	**CUMPLE**		.17-44
8*	**Acta de entrega y recibo final de obra** Copia del Acta de entrega y recibo final de obra, en el cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas, debidamente suscrita por contratista, interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		**N/A**	
9*	**Informe Ejecutivo mensual** Corresponde al Formato en excel "Informe ejecutivo Mensual"	**CUMPLE**		.46-47
10*	**Factura de Venta** Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)	**CUMPLE**		48
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista			
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de ldocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
11*	**Anexos a la factura** Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.	**CUMPLE**		.50-53
12*	**Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales** Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE**		55
a	**Para Empresa:** Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.	**CUMPLE**		.56-58

Contrato No.	229-2022
Contratista	INGENIERÍA RH SAS
Nit.	830.061.440-1
Corte No.	**2**

	LISTA DE CHEQUEO **RECEPCIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS DE CONTRATOS**			
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**	**N/A**	**Pg o Archivo**
b	**Para personas naturales:** liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.		**N/A**	
13*	**Planillas de pago** Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	**CUMPLE**		.60-76
14*	**Personal en condición de discapacidad** Certificado del personal en condición de discapacidad	**CUMPLE**		78
15*	**Entradas a almacén - Certificación** Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en el periodo correspondiente.		**N/A**	
16*	**Entradas a almacén - Relación** Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo.		**N/A**	
17	**Informe de Avance mensual / final de Obra** Del periodo correspondiente, debidamente firmado por el Contratista. Incluye registro fotográfico, gráficos, porcentajes de avance, desarrollo y estado de ejecución, condiciones particulares, Formatos de informe semanal y mensual y demás soportes del periodo correspondiente.	**CUMPLE**		.80-107
18a	**Cumplido PGAS y SST** Certificación de la Interventoríá de cumplimiento de las obligaciones ambientales y Seguridad y Salud en el trabajo en el periodo correspondiente.	**CUMPLE**		467
18	**Informe de PGAS y SG-SST** Según corresponda y se especifique en el contrato. Debe incluir Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	**CUMPLE**		.109-294 .295-420
19	**Manifiesto RCD** Manifiesto o constancia de entrega de los Residuos de Construcción y Demolición.			388
20	**Formato de registro y actualización PIN** Información para registro mensual de manejo de RCD, en la plataforma de la SDA			.443-466
21	**Planos récord** Planos récord finales firmados, de obras ejecutadas.		**N/A**	
22	**Bitácora de obra**	**CUMPLE**		.470-502
23	Los demás que se especifiquen en el contrato inicial y/o sus modificaciones. (FICHAS TECNICAS)	**CUMPLE**		.312-386

NOTAS	
1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación.
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterísco (*)
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".

Contrato 229 de 2022

3.Balance financiero

Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE OBRA No. : 229 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO : REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA : RAZÓN SOCIAL
INGENIERIA RHA SAS (100%)

CONSULTOR INTERVENTORIA : Inversiones AYPE Ltda

VALOR INICIAL : $951.337.878
ADICIONAL EN VALOR No. 1 : $98.894.568
VALOR TOTAL : $1.050.232.446
FECHA DE INICIO : DICIEMBRE 14 DE 2022
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : Hasta febrero 24 de 2023
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 : Hasta marzo 13 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 13-mar.-23
PERIODO DEL CORTE : febrero 1 al 28 de 2023

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO**	**ANTICIPO AMORTIZADO 0%**	**VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR FACTURAS A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)	N.A.				$0,00	$0	$1.050.232.446
ACTA DE CORTE Nº 01 (Fact. No.FVE 81)	dieiembre 2022-enero 2023	OBRA	$50.422.223,00	$0,00	$0,00	$50.422.223	$999.810.223
ACTA DE CORTE Nº 02 (Fact. No. ___)	feb-23	OBRA	$223.804.644,00	$0,00	$0,00	$223.804.644	$776.005.579
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0	$776.005.579
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0	$776.005.579
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0	$776.005.579
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0	$776.005.579
ACTA DE CORTE Nº __ (Fact. No. ___)			$0,00	$0,00	$0,00	$0	$776.005.579
TOTALES			**$274.226.867**		**$0,00**	**$274.226.867**	**$776.005.579**

SALDO POR EJECUTAR	**$776.005.579**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**		**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR PAGAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)		N.A.	$0,00		$0	$1.050.232.446
ACTA DE CORTE Nº 01 (Fact. No.FVE 81)			$0,00		$50.422.223	$1.050.232.446
ACTA DE CORTE Nº 02 (Fact. No. ___)			$0,00		$223.804.644	$1.050.232.446
TOTALES			**$0,00**		**$274.226.867**	**$1.050.232.446**

SALDO POR PAGAR	**$1.050.232.446**

VALOR A LIBERAR	**$0,00**

Martha Lucía Rey Navarro
NOMBRES Y APELLIDOS
Director de Obra
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

JORGE ROJAS TORRES
Director de Interventoría
INVERSIONES AYPE LTDA.
Consultor Interventoría

CUMPLIDO TECNICO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, FINANCIERO Y CONTABLE

El suscrito Arquitecto **JORGE ROJAS TORRES**, en calidad de director de Interventoría y YENNY **ALEXANDRA PEREZ PEREZ** en representación de **INVERSIONES AYPE LTDA.** identificada con Nit Nº 900.087.183-8, en desarrollo del **Contrato de Interventoría Nº 239 de 2022** cuyo objeto es **"Realizar la Interventoría Técnica, Ambiental, Administrativa, Jurídica, Financiera y Contable al contrato cuyo objeto es "Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C"** nos permitimos **CERTIFICAR** que:

INGENIERIA RH SAS identificada con Nit N° 830.061.440-1, quién ejecuta el **Contrato de Obra N° 229 de 2022** cuyo objeto es ***"*Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C.."** ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales, seguridad industrial, normas ambientales y requisitos técnicos exigidos en el contrato, por lo cual se **APRUEBA** el valor de las cantidades de obra y valores ejecutados consignados en el **Corte de Obra No. 2** de fecha 28 de febrero de 2023, por valor de (**$223.804.644,00.)**, y se **AUTORIZA** el pago, el cual se detalla a continuación:

Corte No.	TIPO	FACTURA No.	VALOR CORTE	VALOR A AMORTIZAR (0%)	VALOR A PAGAR
02	Obra	FVE 85	$223.804.644,00	N/A	$223.804.644,00
TOTAL A PAGAR					**$223.804.644,00**

Así mismo, certificamos que las especificaciones técnicas, cantidades y valores ejecutados del presente corte fueron medidos y verificados en su totalidad por la Interventoría y se encuentran conforme con lo contratado.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. el 30 de mayo de 2023.

YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ
Representante legal
INVERSIONES AYPE LTDA.

JORGE ROJAS TORRES
Director de Interventoría
INVERSIONES AYPE LTDA.

Contrato 229 de 2022

6.Corte de corte

7.Memorias de cantidades de obra

Corte de obra No 02, periodo Febrero 1 al 28 de 2023

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. 229 / 22 de noviembre de 2022

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2 **PERIODO MES / AÑO** FEBRERO 2023 **FECHA:** 28/02/2023

CONTRATISTA	:	**INGENIERIA RH SAS**
NIT	:	830.061.440-1
DIRECCIÓN	:	CARRERA 56B # 128-16
TELÉFONO	:	(601) 744 7729 - (601) 624 5215
INTERVENTOR	:	**INVERSIONES AYPE LTDA**
NIT	:	900.087.183.8
DIRECCIÓN	:	TRANSVERSAL 74 11 A 35 T 10 204
TELÉFONO	:	(601) 4120525

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 951.337.878,00**
VR. ADICIONAL No. 1 (DICIEMBRE 2022)	:	**$ 98.894.568,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL A LA FECHA	:	**$ 1.050.232.446,00**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN		En las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C. Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia" calle 12 No 7 - 65 ,Calle 72 No 7-96, Sede anexa Carrera 8 con calle 11 y sede almacen Cra 1 con calle 14
FECHA INICIO	:	14/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	25/02/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	13/03/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	13/04/2023
PLAZO TOTAL	:	13/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	13/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 62.431.162**
1.1	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	ML	70,0	$ 11.374,00	$ 796.180
1.2	Desmonte de rejas metálicas y/o aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	M2	54,0	$ 60.113,00	$ 3.246.102
1.3	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	14,0	$ 9.833,00	$ 137.662
1.4	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	80,0	$ 12.563,00	$ 1.005.040
1.5	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	10,0	$ 6.733,00	$ 67.330
1.6	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	160,0	$ 8.798,00	$ 1.407.680
1.7	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	178,0	$ 3.134,00	$ 557.852
1.8	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	862,0	$ 6.913,00	$ 5.959.006
1.9	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	150,0	$ 10.159,00	$ 1.523.850
1.10	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	897,0	$ 5.037,00	$ 4.518.189
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	1,0	$ 7.555,00	$ 7.555
1.12	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	76,0	$ 6.851,00	$ 520.676
1.13	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	53,0	$ 13.622,00	$ 721.966
1.14	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye desconexión y desmonte aparato, cableado, trasiego y disposición final)	UN	4,0	$ 12.976,00	$ 51.904
1.15	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	11,0	$ 15.483,00	$ 170.313
1.16	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	12,0	$ 15.222,00	$ 182.664
1.17	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	847,0	$ 32.677,00	$ 27.677.419
1.18	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	102,0	$ 1.600,00	$ 163.200
1.19	Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	21,0	$ 66.062,00	$ 1.387.302
1.20	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	26,0	$ 5.927,00	$ 154.102
1.21	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	10,0	$ 19.017,00	$ 190.170
1.22	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	UN	200,0	$ 59.925,00	$ 11.985.000
2.	**CONCRETOS**				**$ 16.966.480**
2.1	Concreto de limpieza de 10,5 MPa (1500 psi) e=5cm.	M2	10,0	$ 13.791,00	$ 137.910
2.2	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	30,0	$ 103.759,00	$ 3.112.770
2.3	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	M2	30,0	$ 255.158,00	$ 7.654.740
2.4	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	M3	2,0	$ 562.273,00	$ 1.124.546
2.5	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)	KG	632,4	$ 7.806,00	$ 4.936.514
3.	**MAMPOSTERÍA**				**$ 4.114.600**
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	95,0	$ 41.081,00	$ 3.902.695
3.2	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	ML	5,0	$ 42.381,00	$ 211.905

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		$ 8.179.796
-	-15,30	$ 174.022
-	-4,99	$ 300.123
+	33,00	$ 324.489
-	-28,29	$ 355.407
+	173,30	$ 1.166.805
-	-132,84	$ 1.168.744
+	213,68	$ 669.670
-	-701,40	$ 4.848.764
	150,00	$ 1.523.850
-	-812,92	$ 4.094.678
	1,00	$ 7.555
	76,00	$ 520.676
+	60,59	$ 825.289
+	77,00	$ 999.152
	11,00	$ 170.313
+	19,30	$ 293.845
-	-530,53	$ 17.336.276
-	-75,00	$ 120.000
	21,00	$ 1.387.302
	26,00	$ 154.102
	10,00	$ 190.170
	200,00	$ 11.985.000
		$ 18.247.840
	10,00	$ 137.910
+	105,17	$ 10.912.334
+	30,00	$ 7.654.740
+	-0,01	$ 8.322
+	-57,50	$ 448.822
		$ 1.099.277
-	-31,92	$ 1.311.182
-	5,00	$ 211.905

OBRA EJECUTADA

CORTE Nº 2 CANT	CORTE Nº 2 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 5.411.152		**$ 16.962.277**		**$ 22.373.430**
0,00	$ 0	54,70	$ 622.158	54,70	$ 622.158
0,00	$ 0	49,01	$ 2.945.979	49,01	$ 2.945.979
0,00	$ 0	47,00	$ 462.151	47,00	$ 462.151
0,00	$ 0	51,71	$ 649.633	51,71	$ 649.633
76,11	$ 512.432	107,19	$ 721.703	183,30	$ 1.234.135
0,00	$ 0	27,16	$ 238.936	27,16	$ 238.936
391,68	$ 1.227.522	0,00	$ 0	391,68	$ 1.227.522
0,00	$ 0	160,60	$ 1.110.242	160,60	$ 1.110.242
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	84,08	$ 423.511	84,08	$ 423.511
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
108,05	$ 1.471.857	5,54	$ 75.398	113,59	$ 1.547.255
0,00	$ 0	81,00	$ 1.051.056	81,00	$ 1.051.056
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	31,30	$ 476.509	31,30	$ 476.509
67,31	$ 2.199.342	249,16	$ 8.141.801	316,47	$ 10.341.143
0,00	$ 0	27,00	$ 43.200	27,00	$ 43.200
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 16.972.158		**$ 2.656.862**		**$ 19.629.021**
	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
135,17	$ 14.025.104	0,00	$ 0	135,17	$ 14.025.104
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 0	1,99	$ 1.116.224	1,99	$ 1.116.224
377,54	$ 2.947.054	197,37	$ 1.540.638	574,90	$ 4.487.692
	$ 1.519.792		**$ 1.071.721**		**$ 2.591.513**
37,00	$ 1.519.792	26,09	$ 1.071.721	63,08	$ 2.591.513
	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. 229 / 22 de noviembre de 2022

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2 **PERIODO MES / AÑO** FEBRERO 2023 **FECHA:** 28/02/2023

CONTRATISTA	:	**INGENIERIA RH SAS**
NIT	:	830.061.440-1
DIRECCIÓN	:	CARRERA 56B # 128-16
TELÉFONO	:	(601) 744 7729 - (601) 624 5215
INTERVENTOR	:	**INVERSIONES AYPE LTDA**
NIT	:	900.087.183.8
DIRECCIÓN	:	TRANSVERSAL 74 11 A 35 T 10 204
TELÉFONO	:	(601) 4120525

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 951.337.878,00**
VR. ADICIONAL No. 1 (DICIEMBRE 2022)	:	**$ 98.894.568,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL A LA FECHA	:	**$ 1.050.232.446,00**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN		En las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C. Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia" calle 12 No 7 - 65 ,Calle 72 No 7-96, Sede anexa Carrera 8 con calle 11 y sede almacen Cra 1 con calle 14
FECHA INICIO	:	14/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	25/02/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	13/03/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	13/04/2023
PLAZO TOTAL	:	13/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	13/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CORTE Nº 2 CANT	CORTE Nº 2 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
4.	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				**$ 13.518.397**			**$ 2.628.384**		**$ 0**		**$ 970.337**		**$ 970.337**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos)	M2	24,4	$ 79.334,00	$ 1.935.750	-	-14,05	$ 1.114.960		$ 0	10,35	$ 820.790	10,35	$ 820.790
4.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	32,0	$ 51.563,00	$ 1.650.016		32,00	$ 1.650.016		$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
4.3	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	93,0	$ 71.213,00	$ 6.622.809	-	-90,90	$ 6.473.262		$ 0	2,10	$ 149.547	2,10	$ 149.547
4.4	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	ML	54,0	$ 61.293,00	$ 3.309.822		54,00	$ 3.309.822	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.	**ALISTADO DE PISOS, PAÑETES**				**$ 61.977.381**			**$ 35.889.645**		**$ 12.259.466**		**$ 13.828.270**		**$ 26.087.736**
5.1	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	323,0	$ 23.428,00	$ 7.567.244	-	-255,69	$ 5.990.411	67,31	$ 1.576.833	0,00	$ 0	67,31	$ 1.576.833
5.2	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	717,0	$ 30.081,00	$ 21.568.077	-	-632,04	$ 19.012.323		$ 0	84,96	$ 2.555.754	84,96	$ 2.555.754
5.3	Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	160,0	$ 59.801,00	$ 9.568.160	-	-24,83	$ 1.484.859	135,17	$ 8.083.301	0,00	$ 0	135,17	$ 8.083.301
5.4	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	214,0	$ 46.855,00	$ 10.026.970	-	-104,62	$ 4.901.970	11,30	$ 529.462	98,08	$ 4.595.538	109,38	$ 5.125.000
5.5	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	KG	1858,0	$ 3.437,00	$ 6.385.946	-	-1.659,81	$ 5.704.767	198,19	$ 681.179	0,00	$ 0	198,19	$ 681.179
5.6	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	100,0	$ 25.525,00	$ 2.552.500	+	161,59	$ 4.124.478		$ 0	261,59	$ 6.676.978	261,59	$ 6.676.978
5.7	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M2	298,0	$ 14.458,00	$ 4.308.484	-	-201,95	$ 2.919.793	96,05	$ 1.388.691	0,00	$ 0	96,05	$ 1.388.691
6.	**CIELO RASOS**				**$ 33.791.627**			**$ 31.977.980**		**$ 3.948.153**		**$ 0**		**$ 3.948.153**
6.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel)	M2	60,0	$ 48.015,00	$ 2.880.900	+	22,23	$ 1.067.253	82,23	$ 3.948.153	0,00	$ 0	82,23	$ 3.948.153
6.2	Cielo raso en Drywall RH 1/2" (Resistente a la humedad) junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	20,0	$ 62.376,00	$ 1.247.520		20,00	$ 1.247.520	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6.3	Cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, remates y accesorios)	M2	203,0	$ 55.498,00	$ 11.266.094		203,00	$ 11.266.094	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6.4	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	263,0	$ 69.951,00	$ 18.397.113		263,00	$ 18.397.113	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7.	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 79.236.780**			**$ 63.516.941**		**$ 2.899.989**		**$ 0**		**$ 2.899.989**
7.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	250,0	$ 5.833,00	$ 1.458.250		250,00	$ 1.458.250	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)	M2	3332,0	$ 13.661,00	$ 45.518.452	-	-3.246,05	$ 44.344.292	85,95	$ 1.174.160	0,00	$ 0	85,95	$ 1.174.160
7.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)	M2	1695,0	$ 9.945,00	$ 16.856.775	-	-1.618,89	$ 16.099.886	76,11	$ 756.889	0,00	$ 0	76,11	$ 756.889
7.4	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	396,0	$ 26.393,00	$ 10.451.628	-	-359,29	$ 9.482.688	36,71	$ 968.940	0,00	$ 0	36,71	$ 968.940
7.5	Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	305,0	$ 16.235,00	$ 4.951.675		305,00	$ 4.951.675	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				**$ 272.775.482**			**$ 169.873.647**		**$ 11.789.193**		**$ 0**		**$ 11.789.193**
8.1	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)	M2	647,0	$ 64.782,00	$ 41.913.954	-	-635,50	$ 41.169.052	11,50	$ 744.902	0,00	$ 0	11,50	$ 744.902
8.2	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	233,0	$ 21.326,00	$ 4.968.958	-	-224,92	$ 4.796.644	8,08	$ 172.314	0,00	$ 0	8,08	$ 172.314

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. 229 / 22 de noviembre de 2022

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2 **PERIODO MES / AÑO** FEBRERO 2023 **FECHA:** 28/02/2023

CONTRATISTA	:	**INGENIERIA RH SAS**
NIT	:	830.061.440-1
DIRECCIÓN	:	CARRERA 56B # 128-16
TELÉFONO	:	(601) 744 7729 - (601) 624 5215
INTERVENTOR	:	**INVERSIONES AYPE LTDA**
NIT	:	900.087.183.8
DIRECCIÓN	:	TRANSVERSAL 74 11 A 35 T 10 204
TELÉFONO	:	(601) 4120525

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 951.337.878,00**
VR. ADICIONAL No. 1 (DICIEMBRE 2022)	:	**$ 98.894.568,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL A LA FECHA	:	**$ 1.050.232.446,00**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	En las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C. Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia" calle 12 No 7 - 65 ,Calle 72 No 7-96, Sede anexa Carrera 8 con calle 11 y sede almacen Cra 1 con calle 14
FECHA INICIO	:	14/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	25/02/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	13/03/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	13/04/2023
PLAZO TOTAL	:	13/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	13/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
8.3	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	188,0	$ 68.521,00	$ 12.881.948
8.4	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)	M2	87,0	$ 87.266,00	$ 7.592.142
8.5	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	90,0	$ 31.894,00	$ 2.870.460
8.6	Piso listón de madera sapán o granadillo 16cm. (Incluye suministro, instalación, lijado, sellado, pulido y lacado)	M2	50,0	$ 137.057,00	$ 6.852.850
8.7	Piso en Tablón Gres Latino liso 20x20. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	30,0	$ 51.421,00	$ 1.542.630
8.8	Guardaescoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	28,0	$ 18.796,00	$ 526.288
8.9	Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). (Suministro e instalación. Incluye jumbolón, perfiles, accesorios.)	M2	1515,0	$ 100.031,00	$ 151.546.965
8.10	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)	ML	102,0	$ 16.278,00	$ 1.660.356
8.11	Piso Deck WPC Clip estructurado (Encapsulado) textura acanalada (ancho 16cm, largo 3m, e=2cm) . Color Café, tráfico comercial. (Incluye suministro e instalación, clips, tornillería y accesorios de instalación)	M2	30,0	$ 259.622,00	$ 7.788.660
8.12	Suministro e instalación de estructura en tubería metalica cuadrada de 1-1/2 x 1-1/2 en Cal 16 Base para piso en Deck, incluye anticorrosivo cromato de zinc de alta resistencia	M2	30,0	$ 82.232,00	$ 2.466.960
8.13	Sardinel en concreto 15cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)	ML	20,0	$ 32.924,00	$ 658.480
8.14	Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)	ML	20,0	$ 16.421,00	$ 328.420
8.15	Loseta lisa en concreto 40x40 (Suministro e instalación)	M2	190,0	$ 99.575,00	$ 18.919.250
8.16	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la existente (Suministro e instalación, incluye sello y accesorios)	ML	96,0	$ 64.922,00	$ 6.232.512
8.17	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	55,0	$ 43.199,00	$ 2.375.945
8.18	Cambio vidrio crudo bronce e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye desmonte del existente, sellos y accesorios)	M2	31,0	$ 53.184,00	$ 1.648.704
9.	**CARPINTERIA MADERA**				**$ 21.121.146**
9.1	Mueble cocina. - Aplica para mueble alto y mueble bajo con mesón en acero inoxidable. Módulos de puertas batientes. (Incluye lavaplatos incorporado y grifería tipo ganso sencilla)	ML	36,0	$ 483.305,00	$ 17.398.980
9.2	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	4,0	$ 508.038,00	$ 2.032.152
9.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	3,0	$ 563.338,00	$ 1.690.014
10.	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 66.182.876**
10.1	Pasamanos acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación, incluye herrajes y accesorios)	ML	57,0	$ 159.598,00	$ 9.097.086
10.3	Cerramiento en malla eslabonada en alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" con parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, incluye perfilería, puerta, pasador, manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)	M2	235,0	$ 126.626,00	$ 29.757.110
10.4	PANEL MEDIA ALTURA h= 1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por una cara, según ficha técnica.	M2	36,0	$ 759.130,00	$ 27.328.680
11.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 4.111.012**
11.1	Salida interruptor sencillo, Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 53.315,00	$ 53.315

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	188,00	$ 12.881.948
+	14,73	$ 1.285.184
+	-27,46	$ 875.809
	50,00	$ 6.852.850
	30,00	$ 1.542.630
	28,00	$ 526.288
	1.515,00	$ 151.546.965
	102,00	$ 1.660.356
	30,00	$ 7.788.660
	30,00	$ 2.466.960
	20,00	$ 658.480
	20,00	$ 328.420
	190,00	$ 18.919.250
	96,00	$ 6.232.512
	55,00	$ 2.375.945
	31,00	$ 1.648.704
		$ 21.121.146
	36,00	$ 17.398.980
	4,00	$ 2.032.152
	3,00	$ 1.690.014
		$ 5.311.666
-	-55,80	$ 8.905.568
-	-187,44	$ 23.734.777
	36,00	$ 27.328.680
		$ 6.704.750
	1,00	$ 53.315

OBRA EJECUTADA

CORTE Nº 2 CANT	CORTE Nº 2 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
101,73	$ 8.877.326	0,00	$ 0	101,73	$ 8.877.326
62,54	$ 1.994.651	0,00	$ 0	62,54	$ 1.994.651
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 0		**$ 0**		**$ 0**
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 6.213.850		**$ 0**		**$ 6.213.850**
1,20	$ 191.518	0,00	$ 0	1,20	$ 191.518
47,56	$ 6.022.333	0,00	$ 0	47,56	$ 6.022.333
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 5.050.356		**$ 0**		**$ 5.050.356**
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. 229 / 22 de noviembre de 2022

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2 **PERIODO MES / AÑO** FEBRERO 2023 **FECHA:** 28/02/2023

CONTRATISTA	:	**INGENIERIA RH SAS**
NIT	:	830.061.440-1
DIRECCIÓN	:	CARRERA 56B # 128-16
TELÉFONO	:	(601) 744 7729 - (601) 624 5215
INTERVENTOR	:	**INVERSIONES AYPE LTDA**
NIT	:	900.087.183.8
DIRECCIÓN	:	TRANSVERSAL 74 11 A 35 T 10 204
TELÉFONO	:	(601) 4120525

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 951.337.878,00**
VR. ADICIONAL No. 1 (DICIEMBRE 2022)	:	**$ 98.894.568,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL A LA FECHA	:	**$ 1.050.232.446,00**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	En las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C. Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia" calle 12 No 7 - 65 ,Calle 72 No 7-96, Sede anexa Carrera 8 con calle 11 y sede almacen Cra 1 con calle 14
FECHA INICIO	:	14/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	25/02/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	13/03/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	13/04/2023
PLAZO TOTAL	:	13/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	13/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
11.2	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	1,0	$ 53.551,00	$ 53.551
11.3	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)	UN	1,0	$ 72.954,00	$ 72.954
11.4	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	100,0	$ 18.957,00	$ 1.895.700
11.5	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	50,0	$ 18.444,00	$ 922.200
11.6	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	30,0	$ 12.294,00	$ 368.820
11.7	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN	5,0	$ 71.120,00	$ 355.600
11.8	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	3,0	$ 129.624,00	$ 388.872
12	**LUMINARIAS**				**$ 22.075.056**
12,1	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	82,0	$ 269.208,00	$ 22.075.056
13.	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				**$ 1.623.046**
13.1	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	5,0	$ 89.916,00	$ 449.580
13.2	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	2,0	$ 6.356,00	$ 12.712
13.3	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 39.021,00	$ 39.021
13.4	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	1,0	$ 61.499,00	$ 61.499
13.5	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	120,0	$ 6.951,00	$ 834.120
13.6	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 50.512,00	$ 50.512
13.7	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)	UN	1,0	$ 62.762,00	$ 62.762
13.8	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	2,0	$ 56.420,00	$ 112.840
14.	**IMPERMEABILIZACIÓN**				**$ 92.718.389**
14.1	Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm,, color gris (Suministro y aplicación)	M2	180,0	$ 272.508,00	$ 49.051.440
14.2	Impermeabilización de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)	M2	193,0	$ 26.393,00	$ 5.093.849
14.3	Flanche en lámina galvanizada cal.22. (Suministro e instalación)	ML	180,0	$ 44.978,00	$ 8.096.040
14.4	Cubierta en policarbonato alveolar e= 8 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	135,0	$ 225.756,00	$ 30.477.060
15.	**ASEO Y VARIOS**				**$ 2.686.362**
15.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1002,0	$ 2.681,00	$ 2.686.362
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 755.329.796**
ADMINISTRACIÓN	**(17%)**				$ 128.406.065
IMPREVISTOS	**(3%)**				$ 22.659.894

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
+	29,00	$ 1.552.979
+	16,00	$ 1.167.264
	100,00	$ 1.895.700
+	50,00	$ 922.200
+	30,00	$ 368.820
-	5,00	$ 355.600
+	3,00	$ 388.872
		$ 17.498.520
-	-65,00	$ 17.498.520
		$ 1.623.046
	5,00	$ 449.580
	2,00	$ 12.712
	1,00	$ 39.021
	1,00	$ 61.499
	120,00	$ 834.120
	1,00	$ 50.512
	1,00	$ 62.762
	2,00	$ 112.840
		$ 87.074.747
	180,00	$ 49.051.440
-	-20,83	$ 549.793
-	180,00	$ 8.096.040
-	135,00	$ 30.477.060
		$ 2.686.362
	1.002,00	$ 2.686.362
		$ 205.185.290
		$ 34.881.499
		$ 6.155.559

OBRA EJECUTADA

CORTE Nº 2 CANT	CORTE Nº 2 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
30,00	$ 1.606.530	0,00	$ 0	30,00	$ 1.606.530
17,00	$ 1.240.218	0,00	$ 0	17,00	$ 1.240.218
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
17,00	$ 2.203.608	0,00	$ 0	17,00	$ 2.203.608
	$ 4.576.536		**$ 0**		**$ 4.576.536**
17,00	$ 4.576.536	0,00	$ 0	17,00	$ 4.576.536
	$ 0		**$ 0**		**$ 0**
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 0		**$ 4.544.056**		**$ 4.544.056**
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	172,17	$ 4.544.056	172,17	$ 4.544.056
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 0		**$ 0**		**$ 0**
0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	$ 70.640.646		**$ 40.033.524**		**$ 110.674.170**
	$ 12.008.910		$ 6.805.699		$ 18.814.609
	$ 2.119.219		$ 1.201.006		$ 3.320.225

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial
Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. 229 / 22 de noviembre de 2022

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 2 **PERIODO MES / AÑO** FEBRERO 2023 **FECHA:** 28/02/2023

CONTRATISTA	:	**INGENIERIA RH SAS**
NIT	:	830.061.440-1
DIRECCIÓN	:	CARRERA 56B # 128-16
TELÉFONO	:	(601) 744 7729 - (601) 624 5215
INTERVENTOR	:	**INVERSIONES AYPE LTDA**
NIT	:	900.087.183.8
DIRECCIÓN	:	TRANSVERSAL 74 11 A 35 T 10 204
TELÉFONO	:	(601) 4120525

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 951.337.878,00**
VR. ADICIONAL No. 1 (DICIEMBRE 2022)	:	**$ 98.894.568,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL A LA FECHA	:	**$ 1.050.232.446,00**
ANTICIPO 0%	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	En las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C. Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia" calle 12 No 7 - 65 ,Calle 72 No 7-96, Sede anexa Carrera 8 con calle 11 y sede almacen Cra 1 con calle 14
FECHA INICIO	:	14/12/2022
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	25/02/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	13/03/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	13/04/2023
PLAZO TOTAL	:	13/04/2023
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	13/04/2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
UTILIDAD	(5%)				$ 37.766.490
IVA	(19%)				$ 7.175.633
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 951.337.878**
NP	**OBRA NO PREVISTA**				
NP 1	Impermeabilización mediante sistema de membrana líquida de poliuretano con tecnología de curado latente de alto desempeño, de aplicación en frío; imprimación, primera, segunda y tercera capa con producto tipo Sikalastic 612 o Vulkem 171 primer o Vulkem 191 o equivalente de igual calidad o superior; refuerzo entre primera y segunda capa con malla de fibra de vidrio tipo Sikafelt FV-225 de SIKA o Vulkem 350 NF SL o equivalente; textura antideslizante mediante riego de arena de alta pureza entre segunda y tercera capa con granulometría 0.3 y 1.18mm tipo Sikadur 501 de SIKA o Vulkem 351, o equivalente. Incluye limpieza de la superficie, suministros y ejecución. USO TRANSITABLE PEATONAL PESADO. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación. La aplicacion del material deberá realizarce con personal certificado.	M2	303,3	$ 258.882,00	$ 78.518.911
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL NO PREVISTA					**$ 78.518.911**
ADMINISTRACIÓN	(17%)				$ 13.348.215
IMPREVISTOS	(3%)				$ 2.355.567
UTILIDAD	(5%)				$ 3.925.946
IVA	(19%)				$ 745.930
A. TOTAL OBRA CIVIL NO PREVISTA					**$ 98.894.568**
VALOR TOTAL					**$ 1.050.232.446**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA					**$ 223.804.644**
VALOR A AMORTIZAR DE LA PRESENTE ACTA				0%	**$ 0**
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA				21%	**$ 223.804.644**

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		$ 10.259.264
		$ 1.949.260
		$ 258.430.873
		$ 28.533.689
+	110,22	$ 28.533.689
		$ 28.533.689
		$ 4.850.727
		$ 856.011
		$ 1.426.684
		$ 271.070
		$ 35.938.181
		$ 294.369.054

OBRA EJECUTADA

CORTE Nº 2 CANT	CORTE Nº 2 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 3.532.032		$ 2.001.676		$ 5.533.708
	$ 671.086		$ 380.318		$ 1.051.405
	$ 88.971.894		**$ 50.422.223**		**$ 139.394.117**
	$ 107.052.600		**$ 0**		**$ 107.052.600**
413,52	$ 107.052.600	0,00	$ 0	413,52	$ 107.052.600
	$ 107.052.600		**$ 0**		**$ 107.052.600**
	$ 18.198.942		$ 0		$ 18.198.942
	$ 3.211.578		$ 0		$ 3.211.578
	$ 5.352.630		$ 0		$ 5.352.630
	$ 1.017.000		$ 0		$ 1.017.000
	$ 134.832.750		**$ 0**		**$ 134.832.750**
	$ 223.804.644		**$ 50.422.223**		**$ 274.226.867**
	$ 223.804.644				

SON: **DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

Rodrigo Ernesto Hidalgo
Representante Legal
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA

Yenny Alexandra Pérez P.


YENNY ALEXANDRA PÉREZ PÉREZ
Representante Legal
INVERSIONES AYPE LTDA
CONSULTOR INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

		HOJA	1

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	1	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:							
ITEM No.	1.5	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

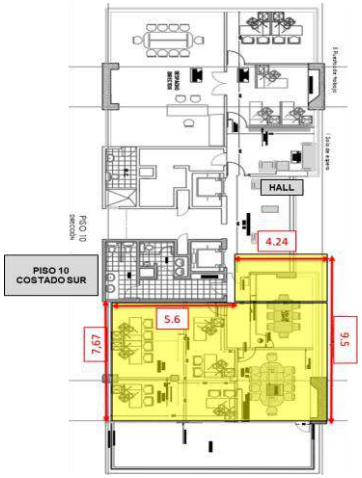





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud		MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CALLE 72						
PISO 10	4,24	9,50	-	40,28	1	40,28
PISO 10	5,60	7,67	-	42,95	1	42,95
LAMPARAS	0,60	0,60	-	0,36	17	-6,12
MURO TV	0,15	2,43	-	0,36	1	-0,36
COLUMNA	0,40	0,40	-	0,16	4	-0,64
TOTAL ITEM						76,11
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						76,11

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA**	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA RE**	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS**	Nombre: ARQ JORGE RO AS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

			HOJA	1	

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	1.7	DESCRIPCION ITEM:	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

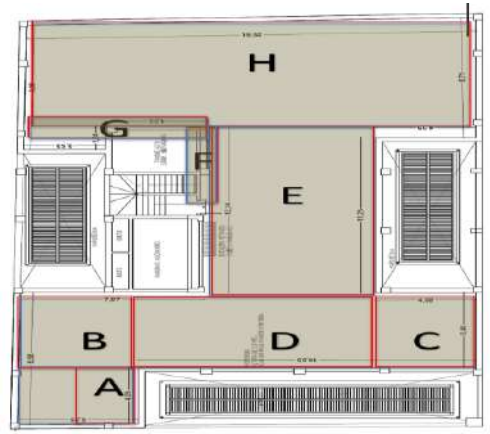



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud			
SEDE ANEXA						
A	-	2,19	3,91	8,56	1	8,56
B	-	5,25	5,80	30,45	1	30,45
C	-	4,28	5,80	24,82	1	24,82
D	-	10,37	5,80	60,15	1	60,15
E	-	7,01	11,19	78,44	1	78,44
F	-	1,05	4,82	5,06	1	5,06
G	-	1,05	7,85	8,24	1	8,24
H	-	8,98	19,97	179,33	1	179,33
Menos la cara Superior de los cubos	-	0,65	0,65	0,42	8	-3,38
TOTAL ITEM						**391,68**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**391,68**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

				HOJA	1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**1.13**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud	Altura			
MURO CALLE 1A						
MURO CALLE 1A (MAMPOSTERIA DOBLE PARED)	-	11,30	4,25	48,03	2	96,05
MURO EN L 1	-	2,00	3,00	6,00	1	6,00
MURO EN L 2	-	2,00	3,00	6,00	1	6,00
TOTAL ITEM						**108,05**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**108,05**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	**HOJA**	**1**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**1.17**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

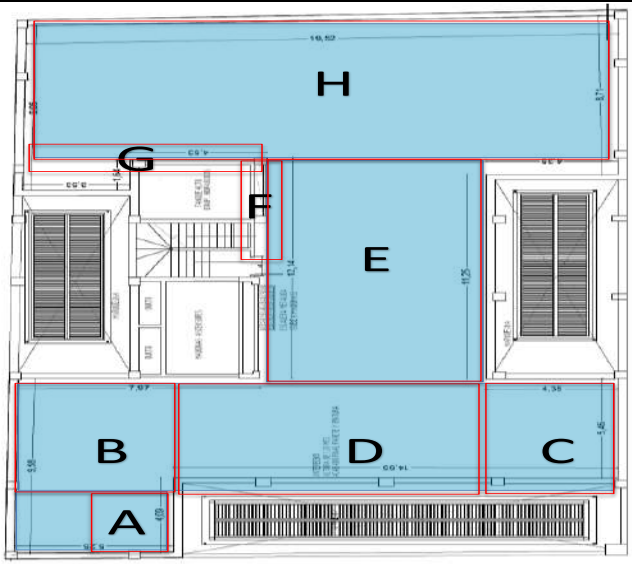



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ANEXA						
D	5,93	11,35	-	67		67,31
TOTAL ITEM						**67,31**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**67,31**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	1						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	2.2	DESCRIPCION ITEM:	Placa contrapiso en concreto h=12 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

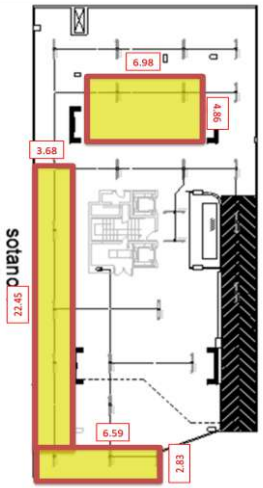







DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud		MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CALLE 72						
SOTANO 01	4,86	6,98	-	33,92	-	33,92
TRAMO DE VIA	3,68	22,45	-	82,62	-	82,62
TRAMO DE VIA	2,83	6,59	-	18,63	-	18,63
TOTAL ITEM						135,17
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						135,17

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA 1	Ubicación

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	2.5	DESCRIPCION ITEM:	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)			UNIDAD:	KG







DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LONGITUD VARILLA	CANT VARILLA/ FLEJES	DIAMETRO (PESO NOMINAL)			
MURO CALLE 1A						
ACERO ZAPATAS - PARRILLA 60X60	0,90	8,00	0,996	7,17	5	35,86
ACERO VIGA CIM - VARILLA	11,50	4,00	0,996	45,82	1	45,82
ACERO FLEJES VIGA	0,9	75	0,566	38,37	1	38,37
ACERO VIGA INTERMEDIA - VARILLA	11,50	4,00	0,996	45,82	1	45,82
ACERO FLEJES VIGA INTER	0,9	75	0,566	38,37	1	38,37
ACERO VIGUETA CORONA	11,50	2,00	0,996	22,91	1	22,91
ACERO FLEJES VIGUETA	0,15	75	0,566	6,40	1	6,40
ACERO COLUMNAS - VARILLA	4,25	4,00	0,996	16,93	5	84,66
ACERO FLEJES COLUMNAS	0,74	28	0,566	11,87	5	59,34
				TOTAL ITEM		377,54
				CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES		0,00
				CANTIDAD CORTE ACTUAL		377,54

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA**	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY**	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS**	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

		HOJA	1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**	**CORTE No.**	**2**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**	**FECHA:**	**28/02/2023**
ITEM No.	**3.1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)**
UNIDAD:	**M2**		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
MURO CALLE 1A						
MAMPOSTERIA	-	**11,30**	**4,25**	48,03	1	48,03
MENOS VIGAS	-	**11,30**	**0,20**	2,26	3	-6,78
MENOS COLUMNAS	0,20	**-**	**4,25**	0,85	5	-4,25
				TOTAL ITEM		**37,00**
				CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES		**0,00**
				CANTIDAD CORTE ACTUAL		**37,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

			HOJA	1			

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**5,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

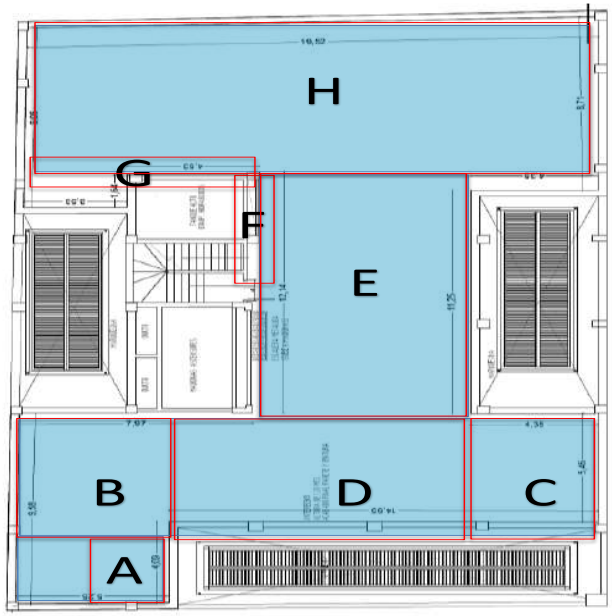

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ANEXA						
D	5,93	11,35	-	67,31		67,31
TOTAL ITEM						**67,31**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**67,31**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Ubicación

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**5.3**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

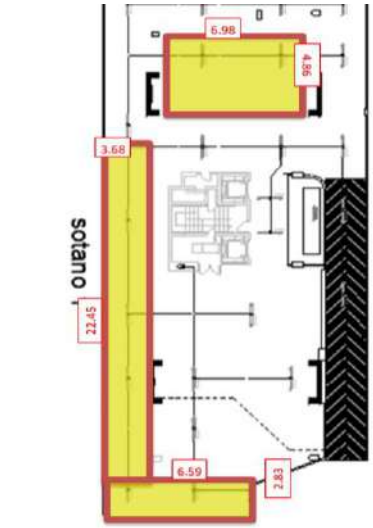



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud		MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CALLE 72						
SOTANO 01	4,86	6,98	-	33,92	-	33,92
TRAMO DE VIA	3,68	22,45	-	82,62	-	82,62
TRAMO DE VIA	2,83	6,59	-	18,63	-	18,63
TOTAL ITEM						**135,17**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**135,17**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE HOJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**5.4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)**			**UNIDAD:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES** Ancho	Longitud		MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
MURO CALLE 1A						
MEDIA CAÑA	1,00	11,30	-	11,30	-	11,30
TOTAL ITEM						**11,30**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**11,30**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

		HOJA	1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	5.5	DESCRIPCION ITEM:	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)			UNIDAD:	KG

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

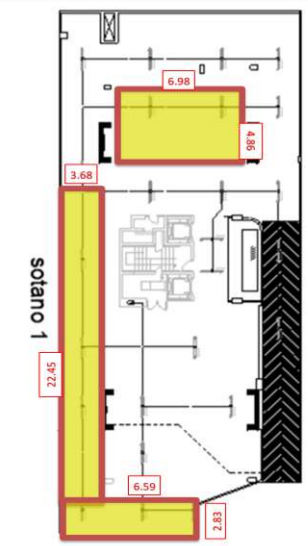





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Peso Nominal			
CALLE 72						
SOTANO 01	4,86	6,98	1,34	45,42	1,0	45,42
TRAMO DE VIA 01	3,68	22,45	1,34	110,63	1,0	110,63
TRAMO DE VIA 02	2,83	6,59	1,34	24,95	1,0	24,95
TRASLAPOS SOTANO 1	0,30	4,65	1,34	1,87	3,0	5,60
TRASLAPOS TRAMO VIA 01	0,30	22,81	1,34	9,16	1,0	9,16
TRASLAPOS TRAMO VIA 02	0,30	6,04	1,34	2,43	1,0	2,43
TOTAL ITEM						198,19
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						198,19

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA**	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY**	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS**	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

		HOJA	1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	5.7	DESCRIPCION ITEM:	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO		DIMENSIONES Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE CARAS	MEDIDA TOTAL
MURO CALLE 1A						
PAÑETE	-	11,30	4,25	48,03	2	96,05

INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	**1**						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**6.1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud		MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CALLE 72						
PISO 10	4,24	9,50		40,28		40,28
PISO 10	5,60	7,67		42,95		42,95
MURO TV	0,15	2,43		0,36	-1	-0,36
COLUMNA	0,40	0,40		0,16	-4	-0,64
TOTAL ITEM						**82,23**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**82,23**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	HOJA 1		

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	7.2	DESCRIPCION ITEM:	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)			UNIDAD:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

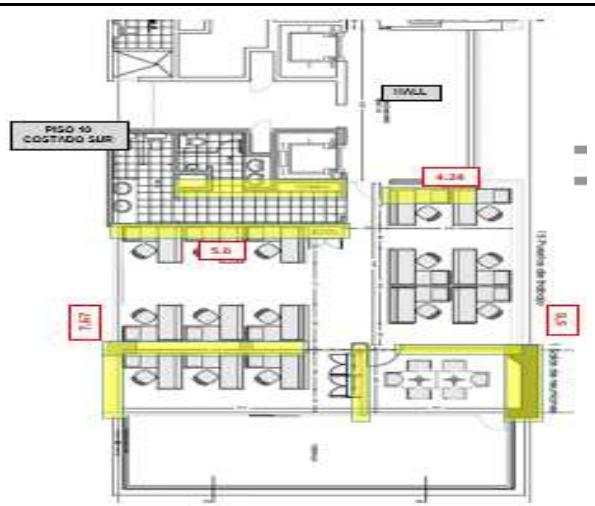



DESCRIPCIÓN /ESPACIO		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	No DE CARAS	MEDIDA TOTAL
		Longitud	Altura			
CALLE 72						
MURO DIV COCINA	-	5,60	2,28	12,77	1	12,77
DIVISION OFIC TERRAZA	-	4,77	1,25	5,96	2	11,93
	-	0,50	1,25	0,63	1	0,63
	-	0,50	1,41	0,71	2	1,41
	-	0,34	1,41	0,48	2	0,96
BORDE VENTANA	-	0,28	1,37	0,38	1	0,38
	-	0,38	1,37	0,52	1	0,52
	-	2,16	1,37	2,96	1	2,96
MURO DIV JUNTAS	-	2,92	2,73	7,97	2	16,74
	-	0,36	2,73	0,98	1	0,98
	-	0,21	2,73	0,57	1	0,57
BORDE VENTANA	-	3,25	1,37	4,45	1	4,45
DIVISION JUNTAS	-	2,71	1,25	3,39	2	6,78
INGRESO	-	2,30	2,28	5,24	1	5,24
COCINA	-	4,21	2,40	10,10	1	10,10
	-	3,41	2,40	8,18	1	8,18
	-	0,28	2,40	0,67	2	1,34
TOTAL ITEM						85,95
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						85,95

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE I OJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	**1**						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**7.3**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES** Ancho	Longitud		MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
CALLE 72						
PISO 10	4,24	9,50	-	40,28	1	40,28
PISO 10	5,60	7,67	-	42,95	1	42,95
LAMPARAS	0,60	0,60	-	0,36	17	-6,12
MURO TV	0,15	2,43	-	0,36	1	-0,36
COLUMNA	0,40	0,40	-	0,16	4	-0,64
TOTAL ITEM						**76,11**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**76,11**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA**	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY**	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS**	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	HOJA 1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**7.4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones) (PISO)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud	Altura			
PALACIO DE JUSTICIA						
CUARTO RESIDUOS PELIGROSOS MURO 1	-	8,40	2,00	16,80	1	16,80
CUARTO RESIDUOS PELIGROSOS MURO 2 (DOS CARAS)	-	2,35	2,00	4,70	2	9,40
CUARTO RESIDUOS PELIGROSOS MURO 3	-	6,85	2,00	13,70	1	13,70
MENOS REJILLA	-	1,15	0,36	0,41	2	-0,83
MENOS PUERTA	-	0,88	2,00	1,76	1	-1,76
MENOS VIGA/COL	-	0,30	2,00	0,60	1	-0,60
TOTAL ITEM						**36,71**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**36,71**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	HOJA 1		


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**8.1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

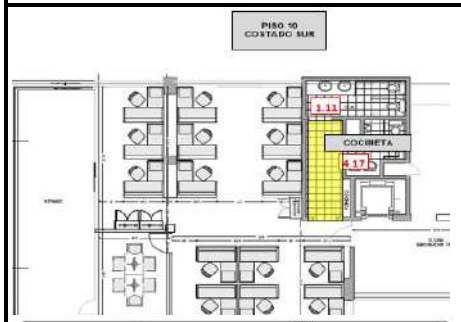

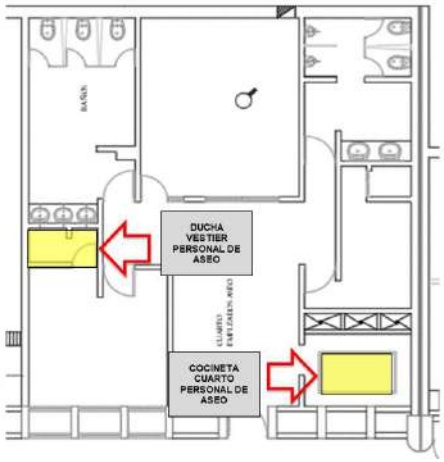

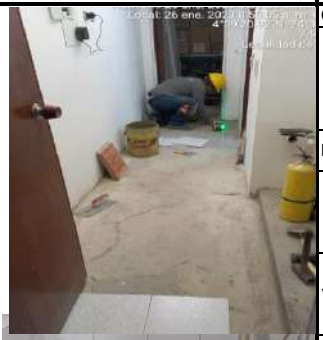





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES** Ancho	Longitud		MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
CALLE 72						
ENCHAPE PISO CORREDOR COCINA/BAÑO	1,11	4,17	-	4,63		4,63
PALACIO DE JUSTICIA SALON PERSONAL DE ASEO						
ENCHAPE PISO COCINA PERSONAL DE ASEO	1,80	2,70	-	4,86		4,86
ENCHAPE PISO VESTIER PERSONAL DE ASEO	1,21	1,66	-	2,01		2,01
			TOTAL ITEM			11,50
			CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES			0,00
			CANTIDAD CORTE ACTUAL			11,50

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	Ubicación

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**8.2**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)**			**UNIDAD:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

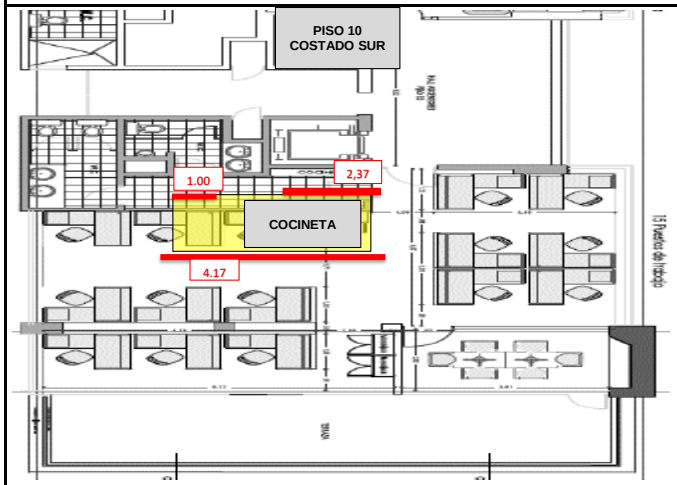



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud				
CALLE 72						
G/ESCOBA PISO CORREDOR COCINA/BAÑO	-	2,37	-	2,37		2,37
G/ESCOBA PISO CORREDOR COCINA/BAÑO	-	4,17	-	4,17		4,17
G/ESCOBA PISO CORREDOR COCINA/BAÑO	-	1,00	-	1,00		1,00
G/ESCOBA PISO PUERTAS	-	0,54	-	0,54		0,54
TOTAL ITEM						**8,08**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**8,08**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

				HOJA	1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**8.4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud				
CALLE 72						
PISO 10	4,24	9,50	-	40,28	1	40,28
PISO 10	5,60	7,67	-	42,95	1	42,95
HALL	3,30	6,00	-	19,80	1	19,80
MURO TV	0,36	2,93	-	1,05	1	-1,05
COLUMNA	0,50	0,50	-	0,25	1	-0,25
TOTAL ITEM						**101,73**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**101,73**

Elaboró: Firma Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Revisó: Firma Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Aprobó: Firma Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Firma Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	HOJA 1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**8.5**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)**			**UNIDAD:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





DESCRIPCIÓN /ESPACIO		DIMENSIONES Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CALLE 72						
1	-	**5,60**	-	5,60		5,60
2	-	**4,75**	-	4,75		4,75
3	-	**4,77**	-	4,77		4,77
4	-	**0,50**	-	0,50		0,50
5	-	**4,77**	-	4,77		4,77
6	-	**2,42**	-	2,42		2,42
7	-	**5,97**	-	5,97		5,97
8	-	**2,92**	-	2,92		2,92
9	-	**0,36**	-	0,36		0,36
10	-	**0,50**	-	0,50		0,50
11	-	**0,21**	-	0,21		0,21
12	-	**2,42**	-	2,42		2,42
13	-	**3,76**	-	3,76		3,76
14	-	**0,15**	-	0,15		0,15
15	-	**0,34**	-	0,34		0,34
16	-	**2,76**	-	2,76		2,76
17	-	**2,71**	-	2,71		2,71
18	-	**0,15**	-	0,15		0,15
19	-	**2,71**	-	2,71		2,71
20	-	**6,58**	-	6,58		6,58
21	-	**3,16**	-	3,16		3,16
22	-	**1,03**	-	1,03		1,03
23	-	**2,00**	-	2,00		2,00
24	-	**2,00**	-	2,00		2,00
TOTAL ITEM						**62,54**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**62,54**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA**	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY**	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS**	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	**1**						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**10.1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pasamanos acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación, incluye herrajes y accesorios)**			**UNIDAD:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

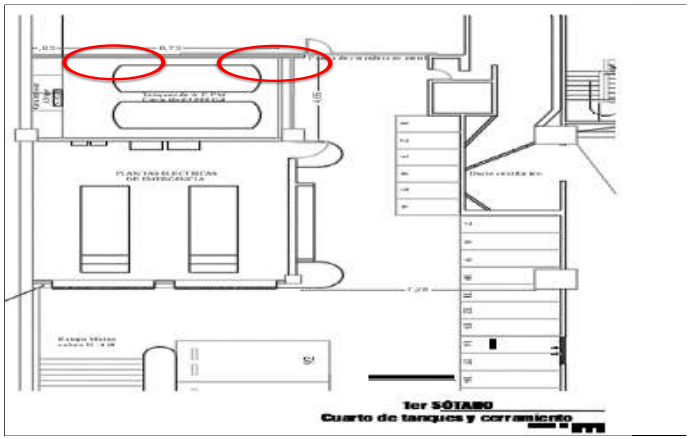





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		Longitud	Altura			
PALACIO DE JUSTICIA						
Pasamanos de agarre para ingreso a tanques de combistible	-	0,60	-	0,60	2	1,20
TOTAL ITEM						**1,20**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,20**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

				HOJA	1		


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**10.3**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Cerramiento en malla eslabonada en alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" con parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, incluye perfilería, puerta, pasador, manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)**			**UNIDAD:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

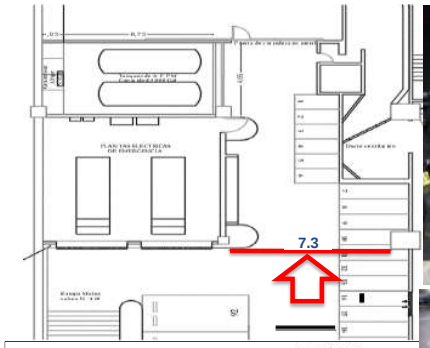



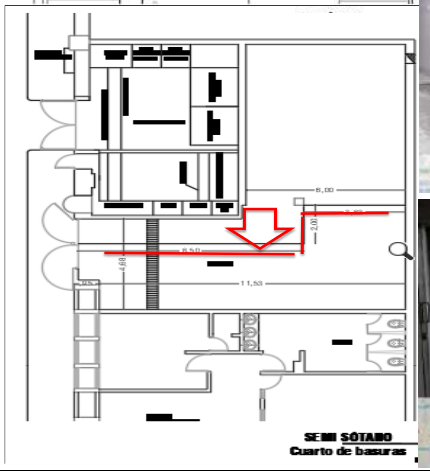





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Longitud	Altura			
TANQUES ACPM SOTANO						
PALACIO JUSTICIA - SOTANO ACCESO A TANQUES ACPM	-	7,35	2,00	14,70		14,70
SHUT DE BASURAS						
PALACIO JUSTICIA - SOTANO SHUT DE BASURAS	-	14,19	2,00	28,38		28,38
CUARTO DESECHOS QUIMICOS						
PALACIO JUSTICIA - SOTANO - CUARTO DESECHOS QUIMICOS	-	2,39	1,88	4,48		4,48
TOTAL ITEM						**47,56**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**47,56**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	2						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	**OBJETO:**	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			**CORTE No.**	1	**FECHA:**	23/03/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	10.3	**DESCRIPCION ITEM:**	Cerramiento en malla eslabonada en alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" con parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, incluye perfilería, puerta, pasador, manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)			**UNIDAD:**	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			

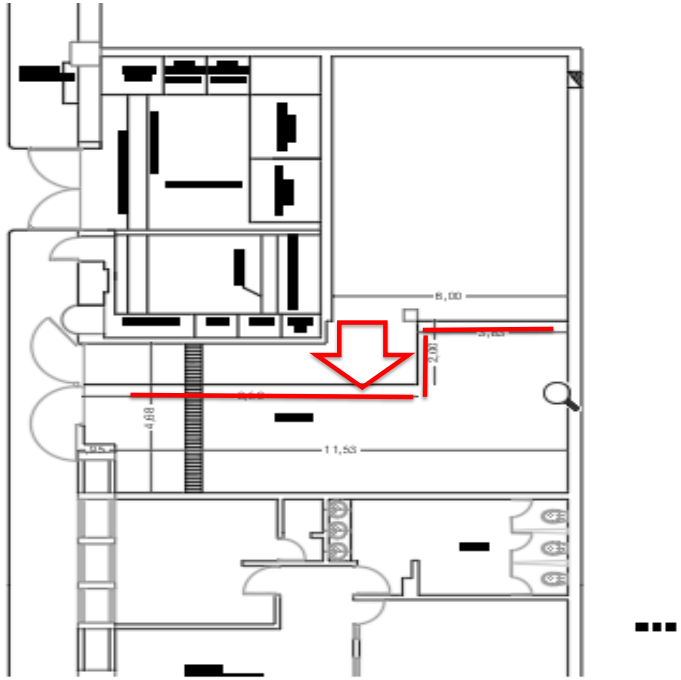

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

				HOJA	1		


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	11.2	DESCRIPCION ITEM:	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)			UNIDAD:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

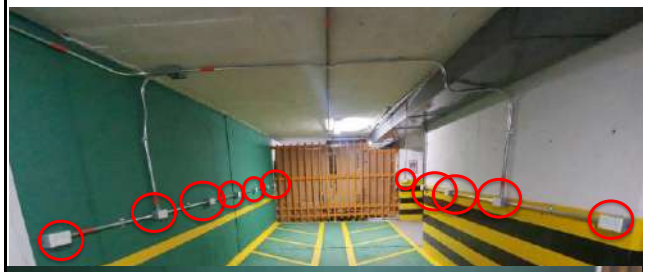



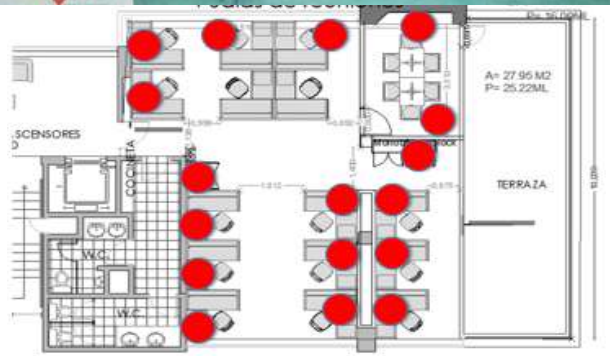

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CALLE 72						
ZONA PATINETAS	-	-	-	-	13	13,00
OFICINAS PISO 10	-	-	-	-	17	17,00
TOTAL ITEM						30,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						30,00


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA**	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY**	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS**	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	**1**						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:	**INVERSIONES AYPE LTDA**						
ITEM No.	**11.3**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Salida Tomacorriente red regulada L5-20R. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, marcación, terminales, accesorios necesarios)**			**UNIDAD:**	**UN**

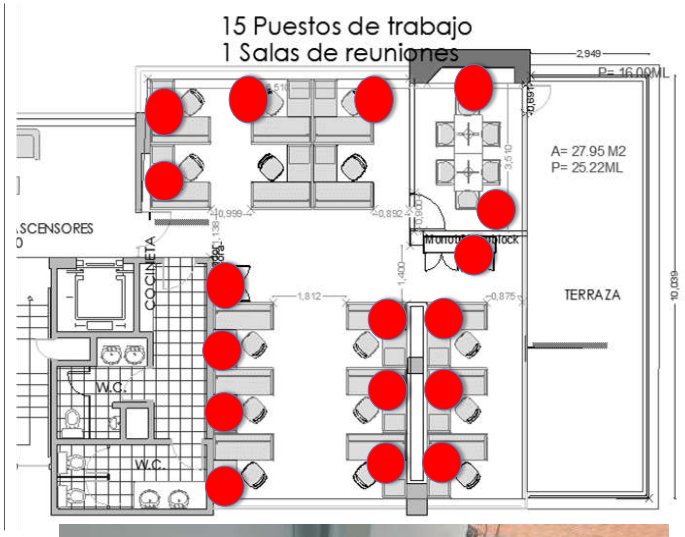PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**DESCRIPCIÓN /ESPACIO**	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		Ancho	Longitud	Altura			
	**CALLE 72**						
	PISO 10	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**17,00**
							
					TOTAL ITEM		**17,00**
					CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES		**0,00**
					CANTIDAD CORTE ACTUAL		**17,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA**	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY**	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS**	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	1						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	11.8	DESCRIPCION ITEM:	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)			UNIDAD:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

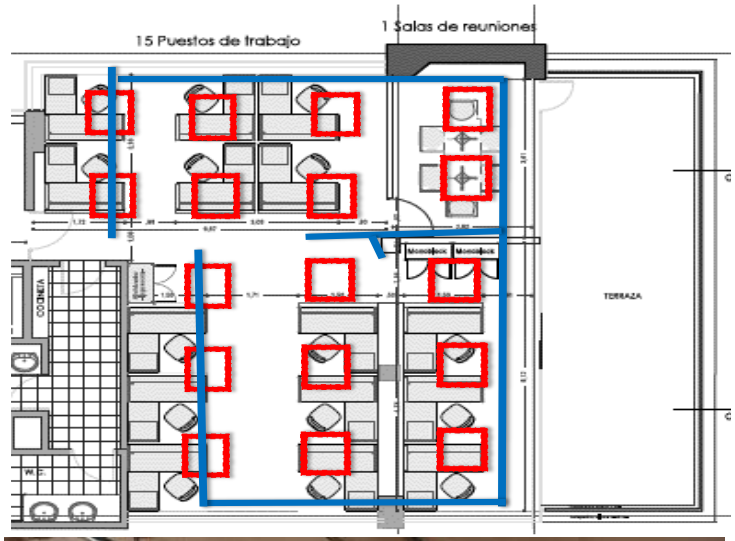



DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CALLE 72						
PISO 10	-	-	-	-	17	17,00
TOTAL ITEM						17,00
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						17,00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **MEMORIAS DE CANTIDADES**	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

HOJA	**1**						

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**229**	**OBJETO:**	**REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**				
CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**			**CORTE No.**	**2**	**FECHA:**	**28/02/2023**
INTERVENTORIA:							
ITEM No.	**12,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)**			**UNIDAD:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

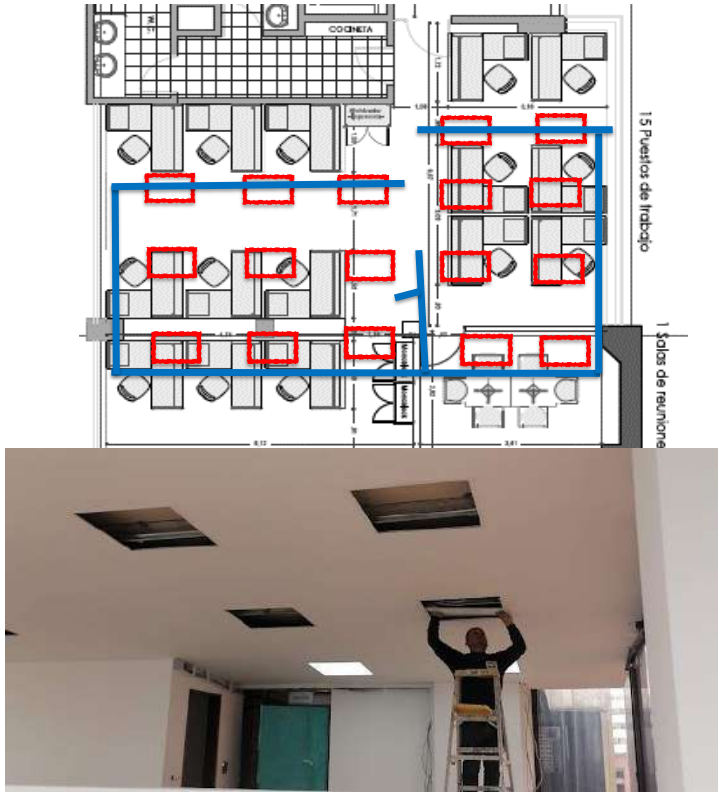

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
CALLE 72						
PISO 10	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**17,00**
TOTAL ITEM						**17,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**17,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INGENIERIA RH SAS	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	Ubicación	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	HOJA 1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	229	OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.				
CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS			CORTE No.	2	FECHA:	28/02/2023
INTERVENTORIA:	INVERSIONES AYPE LTDA						
ITEM No.	NP 1	DESCRIPCION ITEM:	Impermeabilización mediante sistema de membrana líquida de poliuretano con tecnología de curado latente de alto desempeño, de aplicación en frío; imprimación, primera, segunda y tercera capa con producto tipo Sikalastic 612 o Vulkem 171 primer o Vulkem 191 o equivalente de igual calidad o superior; refuerzo entre primera y segunda capa con malla de fibra de vidrio tipo Sikafelt FV-225 de SIKA o Vulkem 350 NF SL o equivalente; textura antideslizante mediante riego de arena de alta pureza entre segunda y tercera capa con granulometría 0.3 y 1.18mm tipo Sikadur 501 de SIKA o Vulkem 351, o equivalente. Incluye limpieza de la superficie, suministros y ejecución. USO TRANSITABLE PEATONAL PESADO. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación. La aplicacion del material deberá realizarce con personal certificado.	UNIDAD:	M2		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

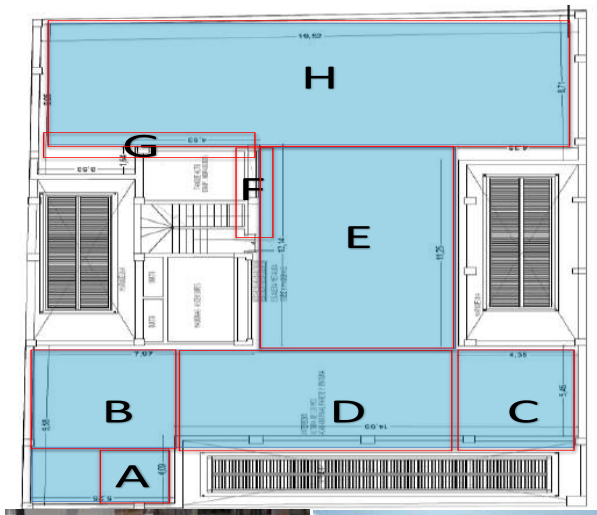





DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SEDE ANEXA						
A	3,91	2,19	-	8,56	1	8,56
B	5,8	5,25	-	30,45	1	30,45
C	5,8	4,28	-	24,82	1	24,82
D	5,8	10,37	-	60,15	1	60,15
E	11,19	7,01	-	78,44	1	78,44
F	4,82	1,05	-	5,06	1	5,06
G	7,85	1,05	-	8,24	1	8,24
H	19,97	8,98	-	179,33	1	179,33
Cara Superior de los cubos	0,65	0,65	-	0,42	8	3,38
CUBOS A	2,4	-	0,65	1,56	2	3,12
CUBOS B	3,2	-	0,65	2,08	4	8,32
CUBOS C	2,8	-	0,65	1,82	2	3,64
TOTAL ITEM						413,52
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						0,00
CANTIDAD CORTE ACTUAL						413,52

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **CARLOS HORMECHEA** RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ARQ. MARTHA LUCIA REY** DIRECTOR DE OBRA	Nombre: **ING. LUIS FLECHAS** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: ARQ JORGE ROJAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Contrato 229 de 2022

9.Informe ejecutivo mensual

Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. **2** PERIODO: **DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	xxxx
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	xxxx
	FECHA DE EXPEDICION	xxxx
	No. DE RADICACION	xxxx
	VIGENCIA	xxxx

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	**INVERSIONES AYPE LTDA.**			CONTRATISTA:	**INGENIERIA RH SAS**		
CONTRATO No.:	**239-2022**			CONTRATO No.:	**229-2022**		
VALOR INICIAL:	**$**	**40.888.400,00**		VALOR INICIAL:	**$**	**951.337.878,00**	
VALOR ADICIÓN 1:	**$**	**-**		VALOR ADICIÓN 1:	**$**	**98.894.568,00**	
VALOR ADICIÓN 2:	**$**	**-**		VALOR ADICIÓN 2:	**$**	**-**	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**40.888.400,00**		VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**1.050.232.446,00**	
PLAZO INICIAL:	**31/12/2022**			PLAZO INICIAL:	**31/12/2022**		
PLAZO ACTUALIZADO:	**13/03/2023**			PLAZO ACTUALIZADO:	**13/03/2023**		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**			FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**			FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**14/12/2022**			FECHA DE INICIACIÓN:	**14/12/2022**		
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/03/2023**			FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/03/2023**		
VALOR EJECUTADO:	**$**	**11.786.241,00**	**4,30%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**274.226.867,00**	**39,85%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**29.102.159,00**	**71,17%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**776.005.579,00**	**60,15%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
-	-	-
-	-	-

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	26,79%	14,30%	-12,49%
Durante el periodo	33,18%	25,54%	-7,63%
Acumulado Actual	59,97%	39,85%	-20,12%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

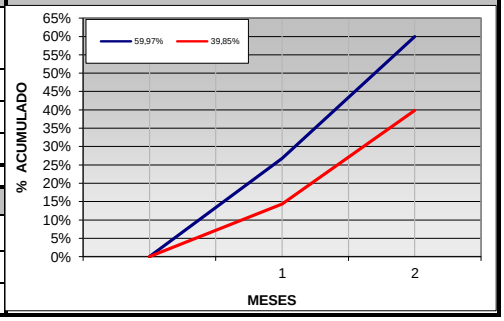

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
90	77	13	-18

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PALACIO DE JUSTICIA
PINTURA EPOXICA A BASE DE AGUA (CUARTO DESECHOS PELIGROSOS)
PISO EN CERAMICA 30X30 (ZONA PERSONAL DE ASEO)
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (ZONA TANQUES ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE)
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (ZONA TANQUES COMBUSTIBLE, SHUT DE BASURAS, CUARTO DESECHOS PELIGROSOS)

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. **2** PERIODO: **DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	xxxx
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	xxxx
	FECHA DE EXPEDICION	xxxx
	No. DE RADICACION	xxxx
	VIGENCIA	xxxx


SEDE CALLE 72
DESMONTE DE CIELO RASO (OFICINAS PISO DECIMO)
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO (PARQUEADEROS SOTANO 1)
ALISTADO PISOS EN CEMENTO ESMALTADO (PARQUEADEROS SOTANO 1)
MALLA ELECTROSOLADADA (PARQUEADEROS SOTANO 1)
INSTALACION CIELO RASO (OFICINAS PISO DECIMO)
PINTURA VINILO TIPO 1 EN MUROS (OFICINAS PISO DECIMO)
PINTURA VINILO TIPO 2 EN TECHOS (OFICINAS PISO DECIMO)
PISO EN CERAMICA 30X30 (COCINA OFICINAS PISO DECIMO)
GUARDAESCOBAS EN CERAMICA (COCINA OFICINAS PISO DECIMO)
PISO EN PORCELANATO SELLADO (OFICINAS PISO DECIMO)
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO (OFICINAS PISO DECIMO)
SALIDAS TOMAS MONOFASICAS (OFICINAS PISO DECIMO)
SALIDAS TOMACORRIENTES REGULADO (OFICINAS PISO DECIMO)
SALIDAS ILUMINACION (OFICINAS PISO DECIMO)
LAMPARAS PANEL LED (OFICINAS PISO DECIMO)
SEDE ANEXA
RETIRO IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO (CUBIERTA)
DEMOLICION Y RETIRO MORTERO PLACAS (CUBIERTA)
AFINADO DE PISO EN MORTERO (CUBIERTA)
IMPERMEABILIZACION EN MEMBRANA LIQUIDA (CUBIERTA)
ALMACEN (CALLE 1ra)
DEMOLICION MUROS EN MAMPORTERIA E=15CM
ACERO DE REFUERZO PARA MURO EN MAMPORTERIA
MURO EN MAMPOSTERIA (BLOQUE No. 4)
MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO
PAÑETE LISO MURO EN MAMPOSTERIA

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1- DICIEMBRE 2022	$ 259.537.769	$ 21.342.318	2,03%
2- ENERO 2023	$ 579.721.439	$ 29.079.905	2,77%
3- FEBRERO 2023	$ 112.078.670	$ 223.804.644	21,31%
4- MARZO 2023	$ 98.894.568	$ -	-
VALOR TOTAL	**$ 1.050.232.446**	**$ 274.226.867**	**26,11%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

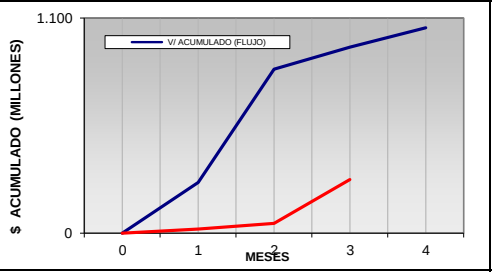

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES		X	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

A LA FECHA SOLO SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 39,8% DEBIDO A LA FALTA DE DILIGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA HORA DE DEFINIR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA EL PISO QUINTO Y EN LA ENTREGA DE LOS RESPECTIVOS SOPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA ENTIDAD. ADICIONALMENTE SE PRESENTAN RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DEL SOTANO 1 DEBIDO A LA SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES EN LA ZONA DEL PERSONAL DE ASEO Y SHUT DE BASURAS A CAUSA DE LAS LABORES QUE ADELANTA LA ENTIDAD PARA EL ARREGLO DE LAS FILTRACIONES EXISTENTES.

- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA CELERIDAD EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA APROBACIÓN Y DESARROLLO DE LOS DIFERENTES ÍTEMS NO PREVISTOS, PARA DE ESTA MANERA GARANTIZAR QUE NO SE SIGAN PRESENTANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- ADICIONALMENTE, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA UN MAYOR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE OBRA Y EVITAR EL RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR LA AUSENCIA DEL PERSONAL.

INGENIERIA RH S.A.S.

N.I.T. 830061440 - 1
DIRECCION CLL 131 No 57 A 52
TELEFONOS 6245215

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Nro. FVE 85

Fecha : 30 - 5 - 2023
Vencimiento : 30 - 05 - 2023

Datos del Cliente

Nombre RAMA JUDICIAL
Nit 800093816 - 3
Dirección CL 72 7 96
Ciudad BOGOTÁ **Teléfonos** 6012127389

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Realizar reparaciones locativas en sedes de nivel central en la ciudad de Bogotá			
COSTOS DIRECTOS	1.00	177,693,246.53	177,693,246.53
ADMINISTRACION 17%	1.00	30,207,851.91	30,207,851.91
IMPREVISTOS 3%	1.00	5,330,797.39	5,330,797.39
UTILIDAD 5%	1.00	8,884,662.33	8,884,662.33

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Notas: #$27-01-02-000;contrato229-2022;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#$

SUBTOTAL	222,116,558.16
I.V.A.	1,688,085.84
TOTAL VENTA	223,804,644.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art.5 Ley 1231 de 2008) Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA.

Resolución Facturación Dian No 18764048463592 de fecha 03-05-2023. Habilita numeración del FVE 83 al FVE 500 . Vigencia (18) meses). Factura hecha por computador en programa Helisa de propiedad de Proasistemas SA Nit 800.042.928-1

CUFE 42f726db75c2e7613f82b394409afaffc618a7cec395ffe824f6e41bc5bbf7454 9dc786b750a8c40e69bd1aea5d29ca3

Contrato 229 de 2022

11.Anexos a la factura

Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14774138483

(415)7707212489984(8020) 000001477413848 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 6 1 4 4 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA R H S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA R H S A S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 131 57 A 52

42. Correo electrónico info@ingenieriarh.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 3 1 8 4 3 3	3 1 4 3 1 8 3 2 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 9 9 0 5 2 6	4 1 1 1	1 9 9 9 0 5 2 6	4 3 3 0 2 5 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 07 - 28 / 16 : 52: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HIDALGO MARTINEZ RODRIGO ERNESTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764020545815

(415)7707212489984(8020) 001876402054581 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 6 1 4 4 0	1				

11. Razón social
INGENIERIA R H S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 131 57 A 52

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-11-03 / 10:35:41 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HIDALGO MARTINEZ RODRIGO ERNESTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 11379159 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INGENIERIA R H S A S

997. Fecha formalización 2021-11-03/10:35:41

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764020545815

(415)7707212489984(8020) **001876402054581 5**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 6 1 4 4 0	1				

11. Razón social

INGENIERIA R H S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INGENIERIA R H S A S CL 131 57 A 52	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	54	500	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 14/12/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA R H S A S** con NIT **830.061.440-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 000028038412

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Contrato 229 de 2022

12.Certificación expedida por Revisor Fiscal: pago de seguridad social y parafiscales

Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023


www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONAS JURÍDICAS.

Yo, JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ, identificado con 79.112.791 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 12907-TP de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA RH S.A.S identificado con Nit 830.061.440-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del corte de obra No 02 del contrato 229 de 2022 correspondiente al periodo febrero de 2023, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, al 01 día del mes de marzo de 2023.



JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ
C.C.79.112.791 DE BOGOTA
T.P. 12907-T
REVISOR FISCAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.112.791
BOJACA DIAZ

APELLIDOS
JORGE ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA





NDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-NOV-1955
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S._RH
M SEXO

28-FEB-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00200853-M-0079112791-20091130 0018518358A 1 1130107344

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12907-T



JORGE ALEJANDRO
BOJACA DIAZ
C.C. 79112791
RESOLUCION INSCRIPCION 1068 FECHA 11/07/1985
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 20323

65804

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FF283FF4053CB7E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ALEJANDRO BOJACA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79112791 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12907-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Contrato 229 de 2022

13.Planillas de pago de seguridad social Febrero 2023

Corte de obra No 02, periodo febrero 1 al 28 de 2023

www.ingenieriarh.com
Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-02-09, 04:33:46 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1051702992

Periodo Cotización 202301 **Periodo Servicio** 202302

PAGADA 2023-02-09 15:58:33.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA RH SAS				
Documento	NI 830061440	**Dirección**	CL 131 #57 A - 52		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6245215		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	19
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HIDALGO MARTINEZ RODRIGO ERNESTO	**Identificación**	CC 11379159		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1077866138		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					POLANIA ARCINIEGAS NICOLAS ALEJANDRO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.800.000	230301		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.800.000	$ 125.300	CCF21	4 %	$ 1.800.000	$ 72.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 125.300	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!
