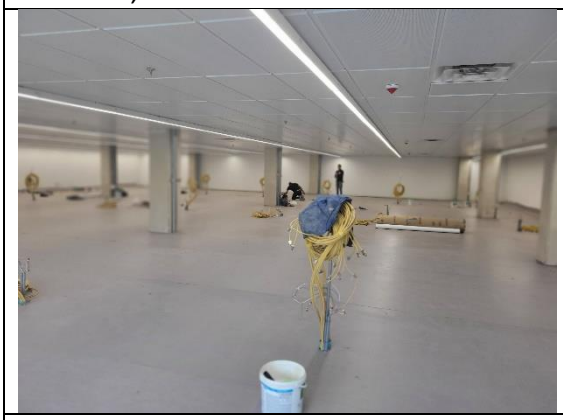
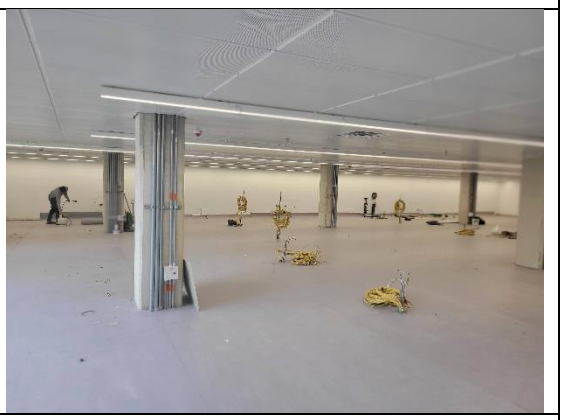
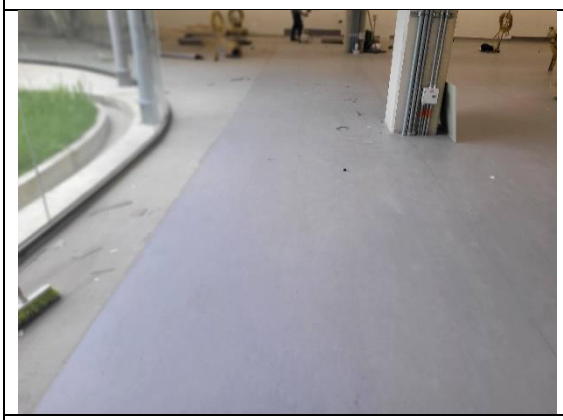
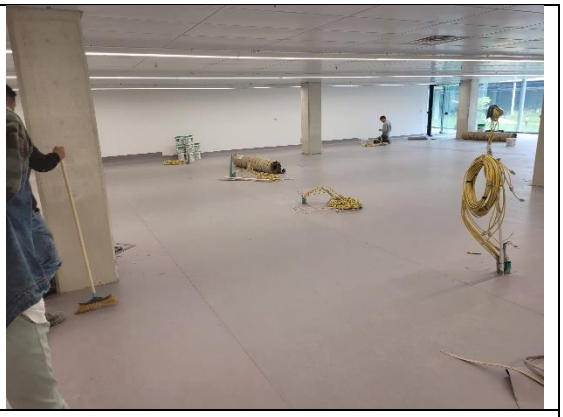
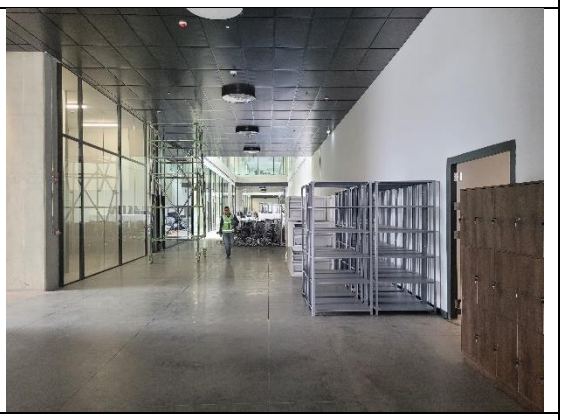
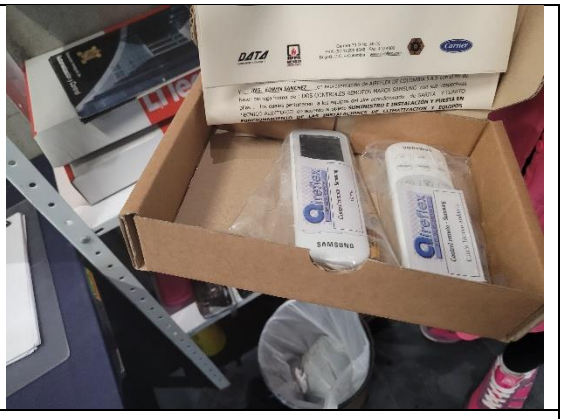
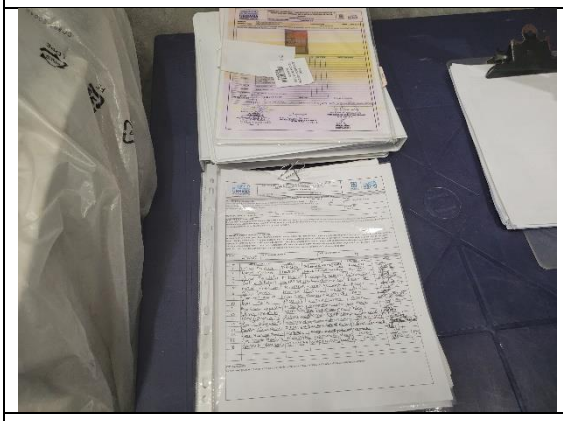
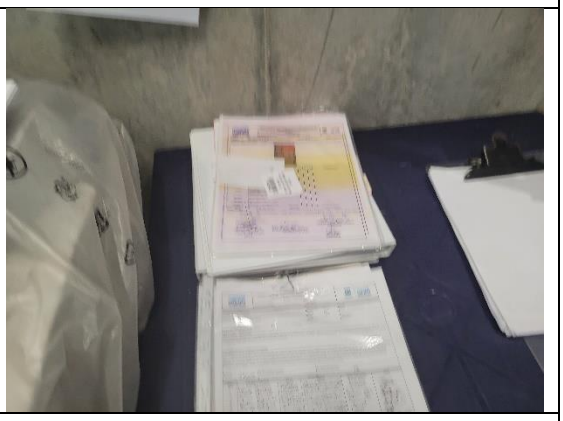
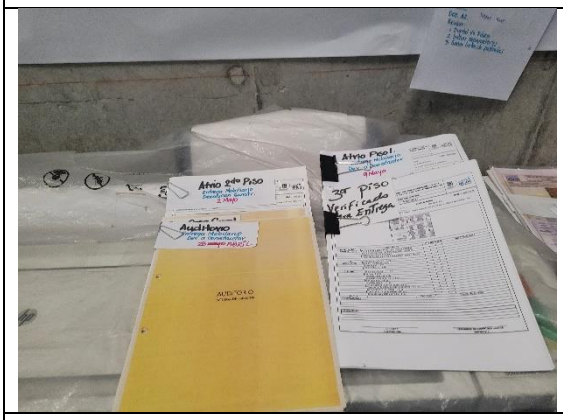
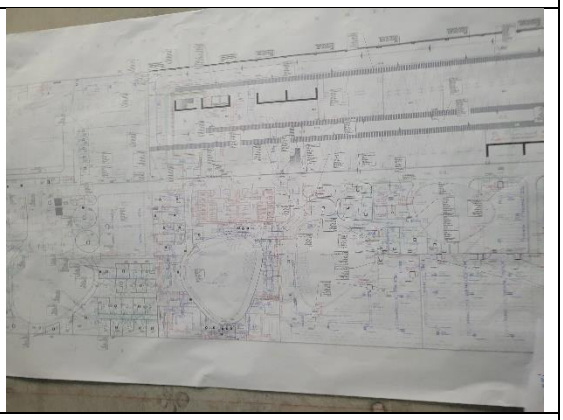
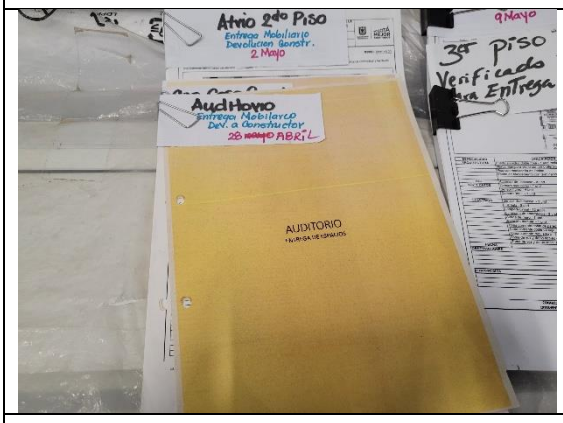
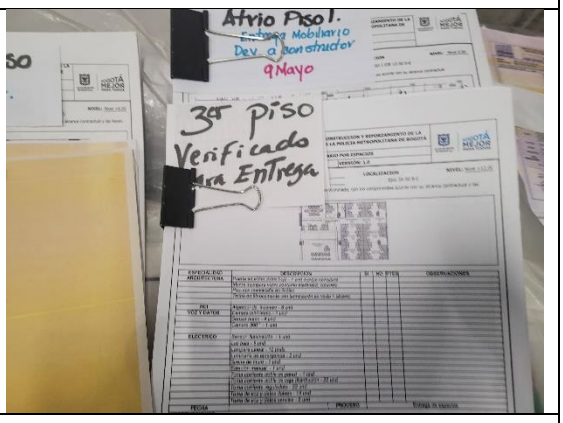
NUEVO COMANDO MEBOG
ABRIL
ULTIMA SEMANA



	
ACCESO CARRERA 60 OBRAS DE URBANISMO ALCANTARILLADO	SE HACEN TRABAJOS EN ZONA DE ACCESO, DISEÑOS FINALES CONCILIADOS ENTIDADES DEL DISTRITO
	
TRABAJOS DE COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	OTRA VISTA DE LOS TRABAJOS DE UREBANISMO
	
VISTA DE LA CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAS OBRAS EXTERIORES	EXPLICACON DE LA FORMA DE APOYO DEL ARCHIUVADOR EN ZONA DE SOTANO, SIN PASAR LA BARRERA DE VAPOR



	
PRIMERAS COLOCACIONES DE MOBILIARIO ZONAS HABILITADAS DE SOTANO, SIJIN	OTRA PANORAMICA DE COLOCACION, EN LAS ZONAS PERMITIDAS A LA FECHA DONDE EL PISO NO ES LINOLEO
	
COLOCACION DE LA BARRERA DE VAPOR, ZONA ORIENTAL ACCESO	SECUENCIA DE COLOCACION, LO CUAL PERMITIRA LA COLOCACION DEL LINOLEO, PARA PERMITIR COLOCACION DE MOBILIARIO
	
PISO LINOLEO YA COLOCADO, DONDE SE HA SURTICO EL PROTOCOLO TECNICO DE COLOCACION DE BARRERA DE VAPOR	SECUECIA, DE COLOCACION, SIN SUFICIENTES CUADRILLAS DE COLOCACION DE PISO, AFECTA CRONOGRAMA




	
OTRA PANORMICA, DE COLOCACION DE PISO	SE RECOMENDO INCREMENTAR PERSONAL, PARA NO AFECTAR PROGRAMACION DE MOBILIARIO
	
MOBILIARIO ACOPIADO, PARA DISPONERLO EN LAS ZONAS PREVISTAS,	MOBILIARIO ACOPIADO, PARA DISPONERLO EN LAS ZONAS PREVISTAS
	
MOBILIARIO ACOPIADO, PARA DISPONERLO EN LAS ZONAS PREVISTAS	HALL CENTRAL, PRIMER NIVEL, PARA DISPONER EN ALMACEN




	
CARPETAS, CON EL CONTENIDO DE INVENTARIOS, MANUALES DE OPERACIÓN, PROTOCOLO DOCUMENTAL PARA RECIBO DE LA EDIFICACION	CONTROLOS, DE EQUIPOS, PARA ENTREGAR DENTRO DEL PROTOCOLO DE ENTREGA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
	
DOCUMENTOS, COMO ACTAS INVENTARIOS, DE CADA UNA DE LOS COMPARTIMIENT0S DE LA EDIFICACION	DOCUMENTOS, COMO ACTAS INVENTARIOS, DE CADA UNA DE LOS COMPARTIMIENT0S DE LA EDIFICACION
	
DOCUMENTOS, COMO ACTAS INVENTARIOS, DE CADA UNA DE LOS COMPARTIMIENT0S DE LA EDIFICACION	PLANOS EXPLICATIVOS, USADOS EN CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES, POR LAS ESPECIALIDADES, COORDINADO CON DIRAF



	
ACCESORIOS DE RED CONTRA INCENDIO, REPUESTOS, PARA SER RECIBIDOS COMO INVENTARIOS	ACCESORIOS DE RED CONTRA INCENDIO, REPUESTOS, PARA SER RECIBIDOS COMO INVENTARIOS
	
DOCUMENTOS, COMO ACTAS INVENTARIOS, DE CADA UNA DE LOS COMPARTIMIENT0S DE LA EDIFICACION	DOCUMENTOS, COMO ACTAS INVENTARIOS, DE CADA UNA DE LOS COMPARTIMIENT0S DE LA EDIFICACION
	
LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN OBRA, COMO PLANOS RECORD, CARPETAS, INVENTARIOS, MANUALES DE OPERACIÓN, PARA ENTREGA INVENTARIO Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO	TRABAJOS ZONA DE ACCESO EN LA CARRERA 56 TIPOS DE ACABADOS DE LAS BALDOSA, DE CONFORMIDAD A CONCILIACION DISEÑOS UNIVERSIDAD NACIONAL, IDU, ETC

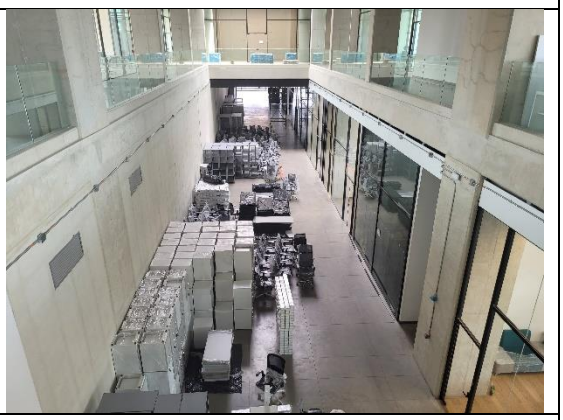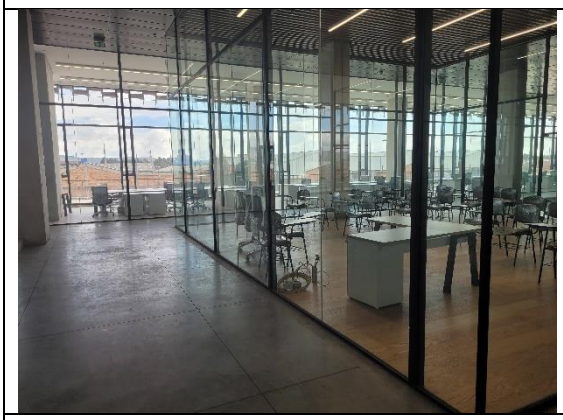	
TRABAJOS ZONA DE ACCESO EN LA CARRERA 56 TIPOS DE ACABADOS DE LAS BALDOSA, DE CONFORMIDAD A CONCILIACION DISEÑOS UNIVERSIDAD NACIONAL, IDU, ETC	SE SOLICITO LAVADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PREVIA LA ENTREGA, DADO QUE SE VERIFICAN MANCHAS.
	
VISTA DE MANCHAS, PATOLOGIAS EN EL ACABADO DEL CONCRETO	ACOPIO DE MOBILIARIO, PARA SER DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS SITIOS DE ACUERDO A DISEÑO
	
LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO	VISTA DE MOBILIARIO DISPUESTO

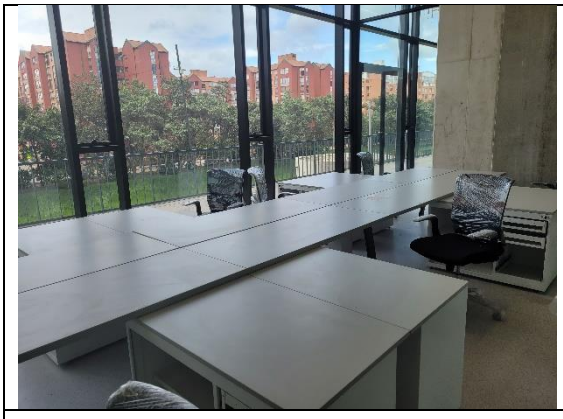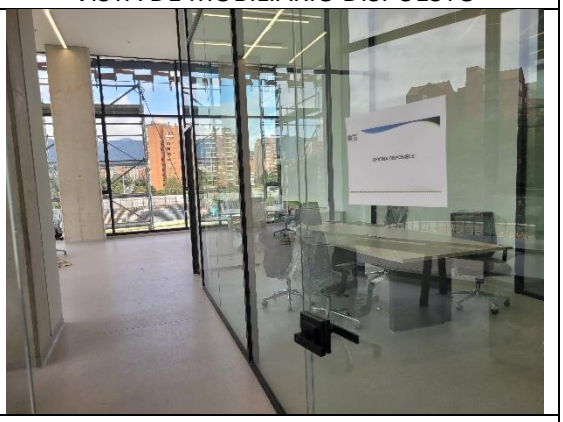	
VISTA DE MOBILIARIO DISPUESTO	VISTA DE MOBILIARIO DISPUESTO
	
VISTA DE MOBILIARIO DISPUESTO	VISTA DE MOBILIARIO DISPUESTO
	
SALA DE CRISIS	SALA DE CRISIS

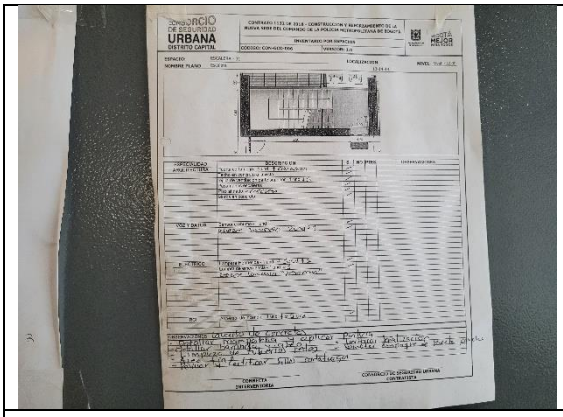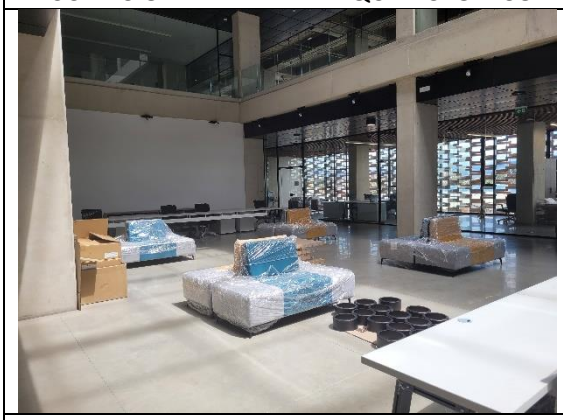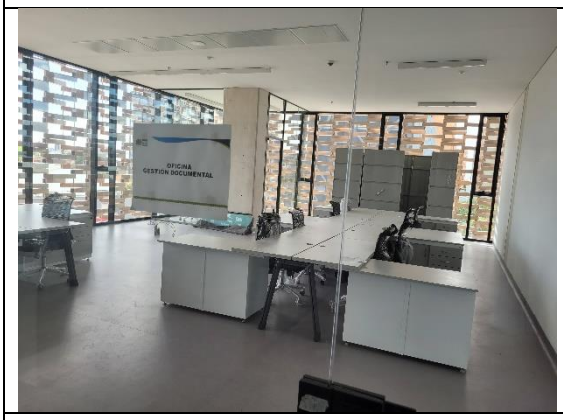	
MODELO DE ACTA DE RECIBO, CON LA DESCRIPCION Y DETALLE ARQUITECTONICO	FISURA ACACABADO DE PISO CORREDOR CENTRAL, PARA DEJAR EN ACTA DE RECIBO
	
LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO	LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO
	
LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO	LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO

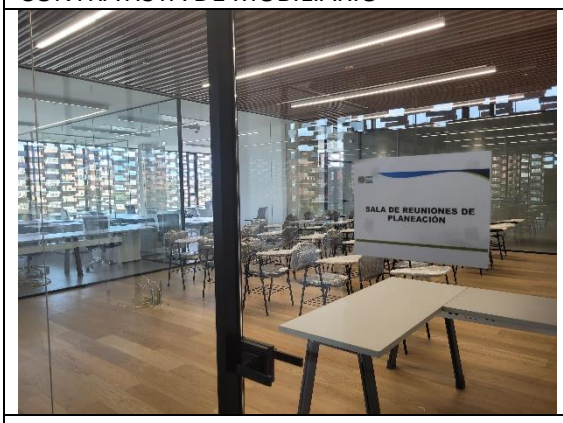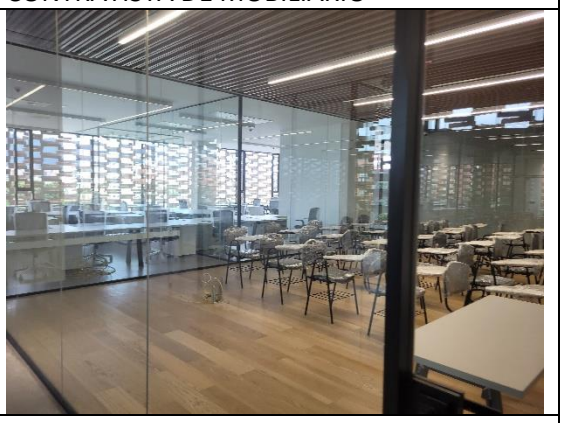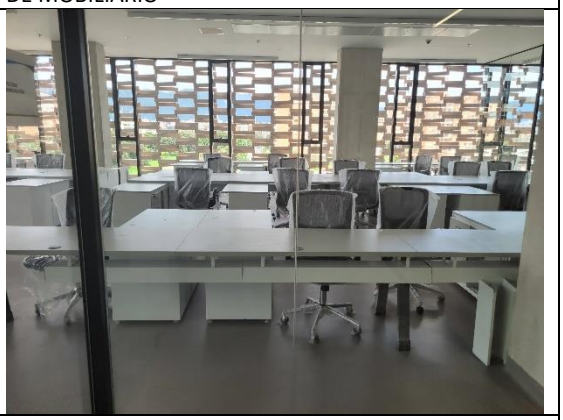	
LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO	LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO
	
LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO	LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO
	
LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO	LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO

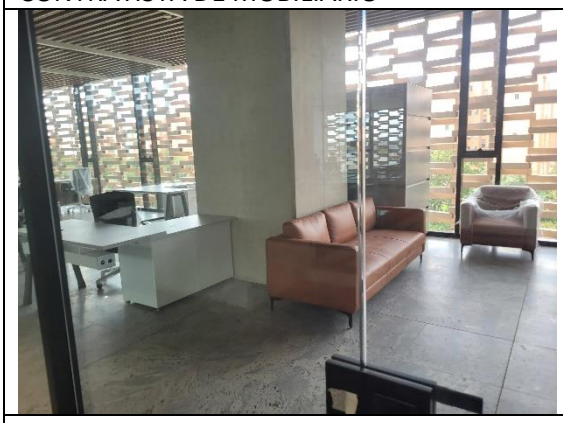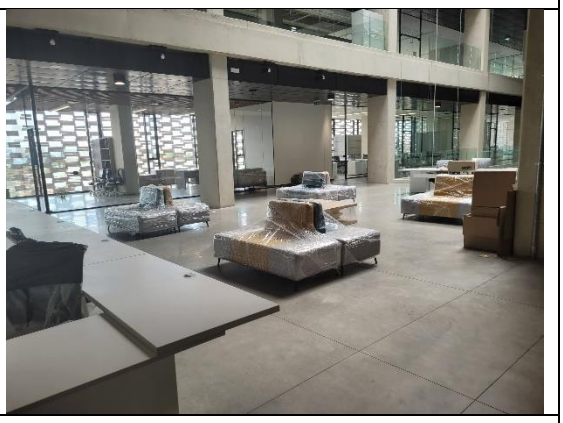
	
LA INSTALACION DEL SEGUNDO AL SEXTO PISO, EN PROCESO Y PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECIBO, ENTRE OBRA INTERVENTORIA, SECRETARIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO	PANORAMICA DE OFICINA DE COMANDO, LA CUAL HA TENIDO OBSERVACIONES
	
PANORAMICA DE OFICINA DE COMANDO, LA CUAL HA TENIDO OBSERVACIONES	SALA DE RECEPCION
	
SALA DE RECEPCION	SALA DE RECEPCION

ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y RECOMENDACIONES

- El porcentaje programado con la reprogramación presentada es 99,21% ejecutado 99,20%

- En la primera semana de seguimiento al nuevo programa se observa se identifica la necesidad de aumentar el rendimiento en la ejecución del plan establecido para ejecutar las actividades de la ruta crítica de acabados en sótanos. En la semana pasada se trabajó en instalación de piso en linóleo del sótano desde el día miércoles y se constató un rendimiento promedio de 45 M2 por día. En respuesta enviada por el consorcio se indica que se estará terminado la instalación el 20 de mayo del 2023, teniendo en cuenta que el 50% de los insumos importados para la barrera de vapor llega el 10 de mayo. El promedio de ejecución para poder llegar a esta meta es de 245 M2 día.

- Se presentan desviaciones en la ejecución de actividades relacionadas con la construcción de redes de alcantarillado pluvial, la construcción de sumideros, acometidas de alumbrado, fibra óptica del acceso por la carrera 56 y la instalación de la torre de comunicaciones.
- A la fecha no se presenta ninguna desviación en el consolidado general y se conserva la fecha de terminación en junio 17 de 2023, debido a que la desviación de las redes de alcantarillado y la instalación de la torre de comunicaciones es mitigable. El plazo para evitar desviaciones es de dos semanas.

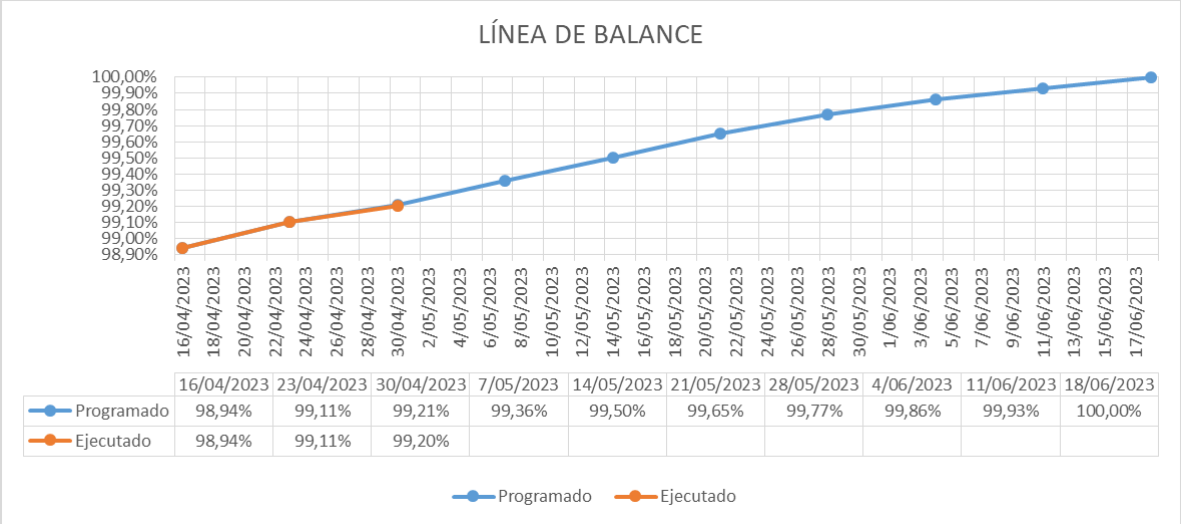

	16/04/2023	23/04/2023	30/04/2023	7/05/2023	14/05/2023	21/05/2023	28/05/2023	4/06/2023	11/06/2023	18/06/2023
Programado	98,94%	99,11%	99,21%	99,36%	99,50%	99,65%	99,77%	99,86%	99,93%	100,00%
Ejecutado	98,94%	99,11%	99,20%							

Se solicito incrementar cuadrillas de trabajadores de piso, horarios adicionales, para no afectar la programación de mobiliario, en zona de SIJIM-

RECOMENDACIONES

Se recomienda generar mesas de trabajo, con el personal que ha estado en la fase de capacitación de cada una de las especialidades, con el fin de que se hagan saber, inquietudes, observaciones, para generar solicitudes a la Secretaria de Seguridad, a fin de que si es posible sean subsanadas, aclaradas debidamente.

Dentro de esta verificación, el sistema de control de acceso, seguridad en cada uno de los pisos, es importante, tener el conocimiento dado que el edificio funciona con sistemas integrados, de circuitos, los software disponibles, con el numero de cámaras y accesorios, esto con el fin de poder advertir observaciones de capacidad operativa bajo las condiciones de funcionamiento real, condiciones actuales.

Se solicito un ensayo real de carga de archivadores, para verificar condiciones reales de funcionamiento, manejo, con las condiciones de soporte y anclaje propuesto por el consultor.

Dado que se evidencian patologías, fisuras por contracción en los pisos de concreto, hacer saber esto a la Secretaria, toda vez que una vez este en operación el edificio, con la población flotante, tanto de servicio, como visitantes, se pueden presentar deterioros prematuros, especialmente en zonas de circulación.

Se solicito procesos de limpieza y desinfección del taque de reserva.

Ir analizando, la distribución de los parqueaderos, exteriores y de sótano.

El acceso dada su limitación en sección transversal, ir socializando a las bodegas localizadas en este sector, los horarios de desembarque o embarque de mercancía.

MEBOG

Id		Id	Nombre de tarea	Tareas críticas	Comienzo	Fin	% completad
0		**0**	**reprogramacion 3 v19_corte abr_30_linea**	**Sí**	**31/12/18**	**17/06/23**	**99%**
1		**1**	**reprogramacion 5 AMPLIACION 17 JUNIO 2023 v6**	**Sí**	**23/03/23**	**17/06/23**	**37%**
20		**20**	**SOTANO BARRERA DE VAPOR Y VARIOS**	**Sí**	**27/03/23**	**17/06/23**	**26%**
23		23	Instalación de pisos de sótano (linóleo, vinilo y madera)	Sí	24/04/23	3/06/23	17%
24		24	Instalación mobiliario 904 (a cargo de la PONAL)	Sí	8/05/23	3/06/23	0%
25		25	Conexión puestos de trabajo	Sí	15/05/23	17/06/23	0%
26		26	Pruebas y entregas (conexiones v/d sótano)	Sí	5/06/23	17/06/23	0%
27		27	Ajustes de automatización	Sí	5/06/23	17/06/23	0%
28		28	Remates obra blanca	Sí	15/05/23	17/06/23	0%
29		29	Muro de limpieza norte en pvc	Sí	3/05/23	25/05/23	0%
30		30	Remate demarcación parqueaderos	Sí	26/05/23	6/06/23	0%
40		**40**	**REMATES VARIOS INTERNOS**	**Sí**	**23/03/23**	**3/06/23**	**45%**
41		41	Remates de pintura	Sí	24/04/23	3/06/23	17%
45		**45**	**MOBILIARIO Y CONEXION DE PUESTOS**	**Sí**	**14/05/23**	**3/06/23**	**0%**
46		**46**	**Atrio**	**Sí**	**14/05/23**	**3/06/23**	**0%**
49		49	Piso 5 (164 puestos)	Sí	14/05/23	14/05/23	0%
50		50	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 5	Sí	15/05/23	3/06/23	0%
51		51	Piso 4 (171 puestos)	Sí	14/05/23	14/05/23	0%
52		52	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 4	Sí	15/05/23	3/06/23	0%
53		53	Piso 3 (149 puestos)	Sí	14/05/23	14/05/23	0%
54		54	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 3	Sí	15/05/23	3/06/23	0%
55		55	Piso 2 (101 puestos)	Sí	14/05/23	14/05/23	0%
56		56	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 2	Sí	15/05/23	27/05/23	0%
57		57	Piso 1 (148 puestos)	Sí	14/05/23	14/05/23	0%
58		58	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 1	Sí	15/05/23	3/06/23	0%
59		**59**	**Auditorio**	**Sí**	**14/05/23**	**27/05/23**	**0%**
60		60	Auditorio (3 puestos)	Sí	14/05/23	14/05/23	0%
61		61	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Auditorio	Sí	15/05/23	27/05/23	0%
62		**62**	**AUTOMATIZACION GENERAL PRUEBAS Y CAPACITACION**	**Sí**	**23/03/23**	**16/06/23**	**50%**
63		63	Automatizacion general seguridad y control, voz y datos	Sí	23/03/23	31/05/23	55%
64		64	Automatización iluminación general	Sí	23/03/23	31/05/23	55%
65		65	Pruebas de todo el sistema	Sí	29/03/23	6/06/23	47%
66		66	Fin Capacitación y entrega	Sí	7/06/23	16/06/23	0%

MEBOG

Id		Id	Nombre de tarea	Tareas críticas	Comienzo	Fin	% completac
80		**80**	**PENDIENTES POR DEFINICIÓN DE DISEÑO Y AJUSTES FINALES**	**Sí**	**23/03/23**	**17/06/23**	**31%**
81		**81**	**PENDIENTES POR DEFINICIÓN RETILAP INTERIOR**	**Sí**	**31/03/23**	**17/06/23**	**34%**
83		83	Adquisición de lámparas importadas	Sí	1/04/23	23/05/23	56%
85		85	Instalación lamparas nuevas	Sí	4/05/23	7/06/23	0%
86		86	Pruebas de verificación retilap	Sí	22/05/23	13/06/23	0%
87		87	Ajustes de automatización de iluminación	Sí	8/06/23	17/06/23	0%
88		**88**	**PENDIENTES OBRA PARQUE**	**Sí**	**23/03/23**	**17/06/23**	**58%**
90		90	Redes ALL	Sí	27/04/23	31/05/23	10%
91		91	Redes eléctricas	Sí	27/04/23	31/05/23	10%
92		92	Postes, luminarias y medidor	Sí	24/04/23	13/05/23	33%
97		97	Mobiliario y Señalización (Pendientes definición de vallas)	Sí	1/06/23	17/06/23	0%
98		**98**	**TORRE DE COMUNICACIONES (Pendiente permiso DAPD)**	**Sí**	**1/05/23**	**17/06/23**	**0%**
99		99	Montaje torre de comunicaciones	Sí	1/05/23	17/06/23	0%
100		**100**	**REMATES VARIOS EXTERIORES**	**Sí**	**24/04/23**	**3/06/23**	**17%**
101		101	Amoblamiento exterior (canecas, talanquera, otros)	Sí	24/04/23	3/06/23	17%
102		**102**	**PENDIENTES POR APROBAR APUS (Modificatorios 18 ó 19)**	**Sí**	**27/04/23**	**17/06/23**	**7%**
103		103	Elementos varios en madera (guardaescoba, pirlanes, boceles,	Sí	27/04/23	31/05/23	10%
104		104	Ventanas adicionales y puertas patios	Sí	1/06/23	17/06/23	0%
105		105	Piso antiestático	Sí	1/06/23	17/06/23	0%
106		106	Refuerzo cinta de carbono box coulvert	Sí	9/06/23	16/06/23	0%
107		107	Salidas a.n. especiales cocina y protección tubería de gas	Sí	27/04/23	31/05/23	10%
108		108	Conexión de aparatos de cocina	Sí	1/06/23	12/06/23	0%
110		110	Aire acondicionado armerillo	Sí	15/05/23	6/06/23	0%
113		113	Estación de trabajo control de iluminación	Sí	8/06/23	17/06/23	0%
116		116	Fin	Sí	17/06/23	17/06/23	0%
117		**117**	**PROGRAMA OBRAS IDU - V2**	**Sí**	**17/04/23**	**17/06/23**	**16%**
122		**122**	**IDU**	**Sí**	**17/04/23**	**17/06/23**	**14%**
123		**123**	**Acceso vial por Carrera 56**	**Sí**	**17/04/23**	**9/06/23**	**13%**
127		127	Redes aguas lluvias (Sumidero S1 y conexión a pozo)	Sí	1/05/23	4/05/23	0%
128		128	Redes eléctricas exteriores	Sí	1/05/23	4/05/23	0%
129		129	Canalización y caja fibra óptica	Sí	1/05/23	4/05/23	0%
130		130	Relleno en sub base granular	Sí	29/04/23	2/05/23	33%
131		131	Visita IDU revisión sub base (2 may)	Sí	2/05/23	2/05/23	0%

MEBOG

Id		Id	Nombre de tarea	Tareas críticas	Comienzo	Fin	% completad
132		132	Relleno en base granular	Sí	3/05/23	16/05/23	0%
134		134	Andenes y sardineles	Sí	6/05/23	29/05/23	0%
136		136	Visita IDU revisión final (17 jun)	Sí	9/06/23	9/06/23	0%
137		137	Jardines y zonas verdes	Sí	18/05/23	9/06/23	0%
138		138	Iluminación	Sí	30/05/23	9/06/23	0%
139		139	Señalización	Sí	17/05/23	31/05/23	0%
140		**140**	**Plazoleta por Carrera 60**	**Sí**	**17/04/23**	**17/06/23**	**14%**
141		141	Consecución de material y caracterización	Sí	17/04/23	3/05/23	80%
142		142	Aceptación de materiales	Sí	3/05/23	3/05/23	0%
144		144	Mejoramiento subrasante (rajón y sello)	Sí	29/04/23	19/05/23	6%
145		145	Visita IDU revisión subrasante	Sí	19/05/23	19/05/23	0%
146		146	Redes aguas lluvias (Sumidero S2)	Sí	5/05/23	23/05/23	0%
147		147	Redes eléctricas exteriores	Sí	5/05/23	23/05/23	0%
148		148	Relleno en sub base granular	Sí	20/05/23	8/06/23	0%
149		149	Visita IDU revisión sub base	Sí	8/06/23	8/06/23	0%
150		150	Excavaciones y confinamientos para jardineras y zonas verdes	Sí	9/06/23	17/06/23	0%
151		151	Zonas duras en tabletas y concreto	Sí	9/06/23	17/06/23	0%
152		152	Iluminación	Sí	9/06/23	17/06/23	0%
153		153	Arborización y zonas verdes	Sí	9/06/23	17/06/23	0%
154		**154**	**REMATES VARIOS EXTERIORES**	**Sí**	**9/06/23**	**17/06/23**	**0%**
155		155	Amoblamiento exterior (canecas, talanquera, otros)	Sí	9/06/23	17/06/23	0%
156		156	Fin	Sí	17/06/23	17/06/23	0%

Id	Nombre de tarea	% programado	% completado	Variación de fin	Notas
0	**reprogramación 3 v19**	**99,21%**	**99,20%**	**0 días**	
1	**reprogramación 5 AMPLIACIÓN 17 JUNIO 2023 v6**	**37,00%**	**37,00%**	**0 días**	
6	**REDES AGUAS LLUVIAS POC N-E**	**61,00%**	**61,00%**	**0 días**	
9	Rellenos	50,00%	50,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
10	Pruebas	60,00%	60,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
11	Pradización	14,00%	14,00%	0 días	Abr 30: REDES AGUAS LLUVIAS POC N-E: Tierra y Grama: extendida de tierra negra y Empradización
17	**INTERNAS EAAB**	**33,00%**	**33,00%**	**0 días**	
18	Instalación charnelas	50,00%	50,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
19	Entrega a EAAB	0,00%	0,00%	0 días	
20	**SÓTANO BARRERA DE VAPOR Y VARIOS**	**26,00%**	**26,00%**	**0 días**	
22	Instalación barrera de vapor	77,00%	77,00%	0 días	Abr 30: Acabado de pisos: Auditorio: Sótano: aplicación sello barrera de vapor para instalación de acabado de piso en linóleo

Id	Nombre de tarea	% programado	% completado	Variación de fin	Notas
23	Instalación de pisos de sótano (linóleo, vinilo y madera)	17,00%	17,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
24	Instalación mobiliario 904 (a cargo de la PONAL)	0,00%	0,00%	0 días	
25	Conexión puestos de trabajo	0,00%	0,00%	0 días	
26	Pruebas y entregas (conexiones v/d sótano)	0,00%	0,00%	0 días	
27	Ajustes de automatización	0,00%	0,00%	0 días	
28	Remates obra blanca	0,00%	0,00%	0 días	
29	Muro de limpieza norte en pvc	0,00%	0,00%	0 días	
30	Remate demarcación parqueaderos	0,00%	0,00%	0 días	
31	**ACCESO PEATONAL Y BÓVEDA**	**57,00%**	**64,00%**	**0 días**	
32	Ventanería fachada Bóveda	50,00%	50,00%	0 días	Abr 30: Piso 1: Ventanería fachada Bóveda: alistado de perfilería curva y soldadura, perfilería de fachada vidrio bóveda, Spider para soporte de vidrios en perfilería metálica, vidrios de fachada
33	Puertas de fachada Bóveda	0,00%	0,00%	0 días	
34	Fachada acceso eje 1	0,00%	0,00%	0 días	
35	Remates de pisos y obra blanca acceso	0,00%	0,00%	0 días	
36	Bicicleteros	11,00%	60,00%	0 días	Abril 30: Se instalaron los Bicileteros, presenta adelanto
40	**REMATES VARIOS INTERNOS**	**45,00%**	**45,00%**	**0 días**	
41	Remates de pintura	17,00%	17,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
42	Remates aire acondicionado	33,00%	33,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
45	**MOBILIARIO Y CONEXIÓN DE PUESTOS**	**0,00%**	**0,00%**	**0 días**	
46	**Atrio**	**0,00%**	**0,00%**	**0 días**	
47	Piso 6 (No hay puestos de trabajo - habitaciones)	0,00%	0,00%	0 días	
48	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 6	0,00%	0,00%	0 días	
49	Piso 5 (164 puestos)	0,00%	0,00%	0 días	
50	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 5	0,00%	0,00%	0 días	
51	Piso 4 (171 puestos)	0,00%	0,00%	0 días	
52	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 4	0,00%	0,00%	0 días	
53	Piso 3 (149 puestos)	0,00%	0,00%	0 días	
54	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 3	0,00%	0,00%	0 días	

Id	Nombre de tarea	% programado	% completado	Variación de fin	Notas
55	Piso 2 (101 puestos)	0,00%	0,00%	0 días	
56	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 2	0,00%	0,00%	0 días	
57	Piso 1 (148 puestos)	0,00%	0,00%	0 días	
58	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Piso 1	0,00%	0,00%	0 días	
59	**Auditorio**	**0,00%**	**0,00%**	**0 días**	
60	Auditorio (3 puestos)	0,00%	0,00%	0 días	
61	Conexiones Ponchado y certificado de puntos Auditorio	0,00%	0,00%	0 días	
62	**AUTOMATIZACIÓN GENERAL PRUEBAS Y CAPACITACIÓN**	**50,00%**	**50,00%**	**0 días**	
63	Automatización general seguridad y control, voz y datos	55,00%	55,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
64	Automatización iluminación general	55,00%	55,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
65	Pruebas de todo el sistema	47,00%	47,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
66	Fin Capacitación y entrega	0,00%	0,00%	0 días	
67	**PENDIENTES POR TERMINAR MODIFICATORIOS 1-17**	**30,00%**	**30,00%**	**0 días**	
68	**Atrio Piso 5**	**27,00%**	**27,00%**	**0 días**	
69	Aseo fino y entrega	27,00%	27,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
70	**Atrio Piso 4**	**27,00%**	**27,00%**	**0 días**	
71	Aseo fino y entrega	27,00%	27,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
72	**Atrio Piso 1**	**33,00%**	**33,00%**	**0 días**	
73	Sellos cortafuego	50,00%	50,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
74	Banca en madera	42,00%	42,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
75	Aseo fino y entrega	0,00%	0,00%	0 días	
76	**Sótano**	**31,00%**	**31,00%**	**0 días**	
77	Luminarias	33,00%	33,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
78	Sellos cortafuego	33,00%	33,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
79	Aseo fino y entrega	0,00%	0,00%	0 días	
80	**PENDIENTES POR DEFINICIÓN DE DISEÑO Y AJUSTES FINALES**	**32,00%**	**31,00%**	**0 días**	

Id	Nombre de tarea	% programado	% completado	Variación de fin	Notas
81	**PENDIENTES POR DEFINICIÓN RETILAP INTERIOR**	**34,00%**	**34,00%**	**0 días**	
83	Adquisición de lámparas importadas	56,00%	56,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
84	Salidas eléctricas adicionales para lámparas	67,00%	67,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
85	Instalación lámparas nuevas	0,00%	0,00%	0 días	
86	Pruebas de verificación retilap	0,00%	0,00%	0 días	
87	Ajustes de automatización de iluminación	0,00%	0,00%	0 días	
88	**PENDIENTES OBRA PARQUE**	**58,00%**	**58,00%**	**0 días**	
90	Redes ALL	10,00%	10,00%	0 días	Abr 30: PENDIENTES POR DEFINICIÓN OBRA PARQUE: Redes ALL y Eléctricas (Pendientes): cañuela tipo IDU en parque, tubería PVC eléctrica de 3" para alumbrado publico
91	Redes eléctricas	10,00%	10,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
92	Postes, luminarias y medidor	33,00%	33,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
95	Placas Concreto estampado	68,00%	68,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
96	Zonas verdes y arborización	75,00%	75,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
97	Mobiliario y Señalización (Pendientes definición de vallas)	0,00%	0,00%	0 días	
98	**TORRE DE COMUNICACIONES (Pendiente permiso DAPD)**	**13,00%**	**0,00%**	**0 días**	
99	Montaje torre de comunicaciones	13,00%	0,00%	0 días	Abr 30: No presenta avance
100	**REMATES VARIOS EXTERIORES**	**17,00%**	**17,00%**	**0 días**	
101	Amoblamiento exterior (canecas, talanquera, otros)	17,00%	17,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
102	**PENDIENTES POR APROBAR APUS (Modificatorios 18 ó 19)**	**7,00%**	**7,00%**	**0 días**	
103	Elementos varios en madera (guardaescoba, pirlanes, boceles, remates F!&)	10,00%	10,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
104	Ventanas adicionales y puertas patios	0,00%	0,00%	0 días	
105	Piso antiestático	0,00%	0,00%	0 días	
106	Refuerzo cinta de carbono box coulvert	0,00%	0,00%	0 días	
107	Salidas a.n. especiales cocina y protección tubería de gas	10,00%	10,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
108	Conexión de aparatos de cocina	0,00%	0,00%	0 días	

Id	Nombre de tarea	% programado	% completado	Variación de fin	Notas
109	Perfiles cableado mamparas	15,00%	15,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
110	Aire acondicionado armerillo	0,00%	0,00%	0 días	
111	Señalización parqueo minusválidos	30,00%	30,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
112	Charnela adicional en costado oriental	30,00%	30,00%	0 días	
113	Estación de trabajo control de iluminación	0,00%	0,00%	0 días	
114	Cierre de basculantes primer piso	0,00%	0,00%	0 días	
115	Puntos hidrosanitarios peluquería	0,00%	0,00%	0 días	
116	Fin	0,00%	0,00%	0 días	
117	**PROGRAMA OBRAS IDU - V2**	**21,00%**	**16,00%**	**0 días**	
119	**PREVIOS**	**100,00%**	**99,00%**	**0 días**	
121	Aceptación de materiales	100,00%	0,00%	0 días	
122	**IDU**	**19,00%**	**14,00%**	**0 días**	
123	**Acceso vial por Carrera 56**	**25,00%**	**13,00%**	**0 días**	
125	Mejoramiento subrasante (rajón y sello)	100,00%	75,00%	0 días	Abr 30: Debería estar terminado se requiere terminar la instalación de redes enterradas
127	Redes aguas lluvias (Sumidero S1 y conexión a pozo)	100,00%	0,00%	0 días	Abril 30:No reporta avance, se requiere para terminar estructura de pavimentos debido a que es una red subterránea
128	Redes eléctricas exteriores	100,00%	0,00%	0 días	Abril 30:No reporta avance, se requiere para terminar estructura de pavimentos debido a que es una red subterránea
129	Canalización y caja fibra óptica	100,00%	0,00%	0 días	Abril 30:No reporta avance, se requiere para terminar estructura de pavimentos debido a que es una red subterránea
130	Relleno en sub base granular	33,00%	33,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
131	Visita IDU revisión sub base (2 may)	0,00%	0,00%	0 días	
132	Relleno en base granular	0,00%	0,00%	0 días	
133	revisión base	0,00%	0,00%	0 días	
134	Andenes y sardineles	0,00%	0,00%	0 días	
135	Asfaltos	0,00%	0,00%	0 días	
136	Visita IDU revisión final (17 jun)	0,00%	0,00%	0 días	
137	Jardines y zonas verdes	0,00%	0,00%	0 días	
138	Iluminación	0,00%	0,00%	0 días	
139	Señalización	0,00%	0,00%	0 días	

Id	Nombre de tarea	% programado	% completado	Variación de fin	Notas
140	**Plazoleta por Carrera 60**	**14,00%**	**14,00%**	**0 días**	
141	Consecución de material y caracterización	80,00%	80,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
142	Aceptación de materiales	0,00%	0,00%	0 días	
143	Excavaciones	30,00%	30,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
144	Mejoramiento subrasante (rajón y sello)	6,00%	6,00%	0 días	Abr 30: avance equivalente al programado
145	Visita IDU revisión subrasante	0,00%	0,00%	0 días	
146	Redes aguas lluvias (Sumidero S2)	0,00%	0,00%	0 días	
147	Redes eléctricas exteriores	0,00%	0,00%	0 días	
148	Relleno en sub base granular	0,00%	0,00%	0 días	
149	Visita IDU revisión sub base	0,00%	0,00%	0 días	
150	Excavaciones y confinamientos para jardineras y zonas verdes	0,00%	0,00%	0 días	
151	Zonas duras en tabletas y concreto	0,00%	0,00%	0 días	
152	Iluminación	0,00%	0,00%	0 días	
153	Arborización y zonas verdes	0,00%	0,00%	0 días	
154	**REMATES VARIOS EXTERIORES**	**0,00%**	**0,00%**	**0 días**	
155	Amoblamiento exterior (canecas, talanquera, otros)	0,00%	0,00%	0 días	
156	Fin	0,00%	0,00%	0 días	

Id	Actividad	% programado	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
	Auditorio F1 - Consolidado	**99,77%**	**99,77%**	**(+) 0 días**	**Actividad Capítulo**

Id	Actividad	% programado	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
	Atrio F2 - Consolidado	**98,57%**	**98,54%**	**(+) 0 días**	**Actividad Capítulo**
	Atrio F3 - Consolidado	**99,39%**	**99,39%**	**(+) 0 días**	**Actividad Capítulo**

Id	Actividad	% programado	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
	Plazoleta F4 - Consolidado	**98,50%**	**98,50%**	**(+) 0 días**	**Actividad Capítulo**

Id	Actividad	% programado	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
	Exteriores F5 - Consolidado	**96,80%**	**96,76%**	**(+) 0 días**	**Actividad Capítulo**
