CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		


CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	Safrid Ingeniería SAS	**Interventor**	Consorcio Inter colegios 2022
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022
Fecha de suscripción del contrato	jueves, 6 de octubre de 2022	**Fecha de suscripción del contrato**	jueves, 24 de noviembre de 2022
Valor Inicial	$13.954.280.882,00	**Valor Inicial**	$ 951.138.738,00
Plazo Inicial	12 meses	**Plazo Inicial**	13 meses
Plazo Actualizado	12 meses	**Plazo Actualizado**	13 meses
Fecha de Iniciación	miércoles, 11 de enero de 2023	**Fecha de Iniciación**	jueves, 22 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación*	miércoles, 10 de enero de 2024	**Fecha de Terminación**	domingo, 21 de enero de 2024
Prórroga No.1	Tres (03) meses, quince (15) días.	**Prórroga No.1**	Tres (03) meses, veinte (20) días
Adición No.1	$5.370.000.000,00	**Adición No.1**	$ 310.122.937,00
Fecha Actualizada de Terminación	25 de abril de 2024	**Fecha Actualizada de Terminación**	sábado, 11 de mayo de 2024
Valor Contrato Actualizado	$19.324.280.882,00	**Valor Contrato Actualizado**	$ 1.261.261.675,00
No póliza contrato de obra	14-44-101164899	**No póliza contrato de interventoría**	NB-100235369
Fecha aprobación	miércoles, 12 de abril de 2023	**Fecha aprobación**	martes, 27 de diciembre de 2022

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
Cumplimiento del contrato	11/01/2023 - 27/10/2024	$ 3.864.856.176,40	Cumplimiento	22/12/2022 - 22/07/2024	$ 190.227.747,60
Estabilidad y Calidad de la obra	11/01/2024 - 11/01/2026	$ 3.864.856.176,40	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	22/12/2022 - 21/01/2027	$ 47.556.936,90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/01/2023 - 26/04/2027	$ 1.395.428.088,20	Calidad del servicio	21/01/2024 - 21/01/2029	$ 190.227.747,60
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	11/01/2023 - 26/04/2024	$ 966.214.044,10			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad
	Colegio Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	31/10/2023	$ 2.024.236.834,00	30,65%	$ 433.268.406,72	21,40%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)** 9,25%
1	Preliminares	25/01/2023	28/07/2023	$ 290.916.537,98	14,37%	$ 79.225.682,21	3,91%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, acabado y alistado de pisos, muros en mampostería, pañete de muros, enchape de muros, desmonte de ventanas, puertas, aparatos sanitarios, tubería, lámparas, cielo raso, cubierta, red eléctrica, picado de muros, corte en concreto y picado de muros en mampostería, limpieza de canales y bajantes.
2	Estructura	17/06/2023	12/10/2023	$ -	0,00%	$ 102.101.739,87	5,04%	Excavación manual en material común, suministro e instalación de subbase granular B-400, placa de contrapiso de 10cm, suministro e instalación de acero de refuerzo, malla electro soldada y estructura metálica., columnetas y viguetas en concreto.
3	Mampostería	13/10/2023	18/10/2023	$ -	0,00%	$ 4.682.874,48	0,23%	Muro divisorio en bloque No. 4, anclajes de varilas 3/8", anclaje para sujeción de elementos 1/2"
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	2/08/2023	24/08/2023	$ -	0,00%	$ 6.438.964,93	0,32%	Suministro e instalación de tubería PVCS 1-1/2", PVCP RDE 9 de 1/2", suministro e instalación de punto de agua fría sanitario y lavamanos y suministro e instalación de geotextil tejido T1700.
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	20/06/2023	22/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
7	Pisos	20/06/2023	28/08/2023	$ -	0,00%	$ 81.456.681,18	4,02%	Alistado de pisos en mortero, alistado de paso para escalera en mortero, suministro e instalación de porcelanato y guardaescoba en porcelanato.
8	Mampostería	25/07/2023	4/08/2023	$ -	0,00%	$ 7.309.107,97	0,36%	Suministro e instalación de enchape cerámico brillante.
9	Carpintería metálica	5/08/2023	2/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
11	Aparatos sanitarios y accesorios	29/08/2023	6/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
12	Aparatos y equipos especiales	7/09/2023	23/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
13	Pañete y pintura	5/04/2023	6/11/2023	$ 150.933.335,63	7,46%	$ 53.046.019,82	2,62%	Pañete muro incluye filos, pañete liso sobre muro, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, pintura vinilo sobre muros interiores.
16	Obras exteriores	5/07/2023	19/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/03/2023	19/06/2023	$ 178.622.530,99	8,82%	$ 94.926.268,48	4,69%	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica UPVC 2mm.
20	Aseo y disposición final	29/08/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ 4.081.067,77	0,20%	Embalaje de teja de asbesto cemento

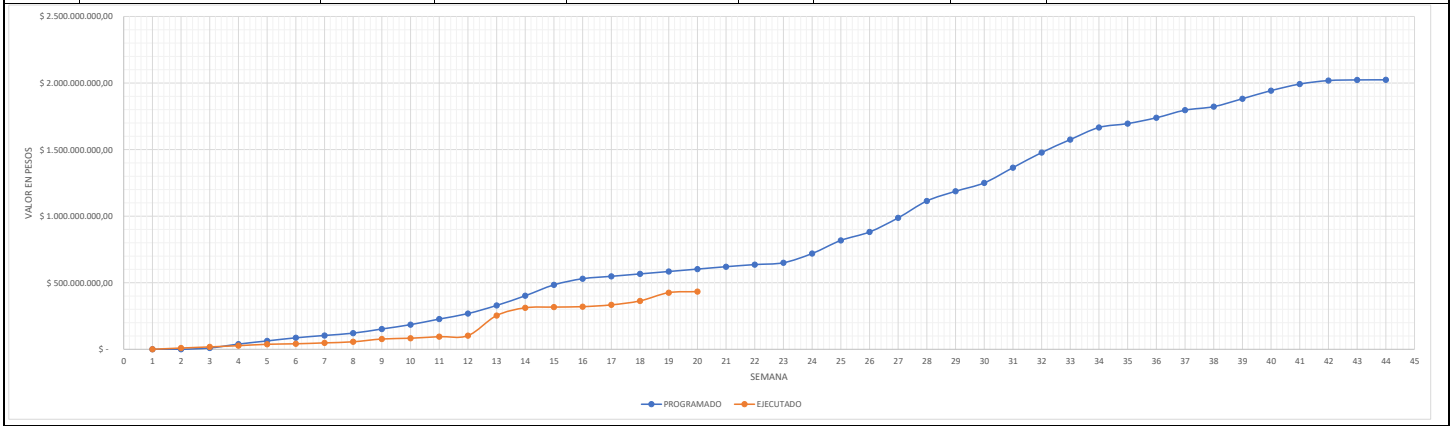


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Francisco José de Caldas, Sede A		25/01/2023	31/10/2023	$ 1.962.546.144,54	48,98%	$ 780.090.468,08	39,75%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	9,23%
1	Preliminares	25/01/2023	30/08/2023	$ 199.038.148,25	10,14%	$ 102.726.615,61	5,23%	Cerramiento en lona, demolición de acabado de pisos, muros, pañete, enchape de muros, encorozado de cubierta, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso, cubierta, desmonte de aparatos sanitarios, tubería hidrosanitaria existente, lámparas, salidas eléctricas y tubería eléctrica, limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	4/03/2023	23/09/2023	$ 36.228.788,50	1,85%	$ 249.223.291,54	12,70%	Excavación manual en material común y recebo compactado, suministro e instalación de subbase B-400, suministro de estructura metálica, acero de refuerzo, malla electro soldada, placa de contrapiso de 10 cm, viga cinta de confinamiento.	
3	Mampostería	23/03/2023	29/07/2023	$ 44.602.974,00	2,27%	$ 4.125.359,63	0,21%	Muro divisorio bloque estriado No. 4, resane de fisuras en muros, anclajes varilla 3/8".	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	20/09/2023	$ 2.066.803,00	0,11%	$ 10.563.286,63	0,54%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", caja de inspección 1.00x1.00, suministro e instalación de geotextil tejido 1700 y sondeo y revisión de desagües.	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/05/2023	28/10/2023	$ 1.353.977,56	0,07%	$ 745.504,12	0,04%	Suministro e instalacion de muro en dry wall.	
7	Pisos	27/02/2023	28/10/2023	$ 95.252.936,27	4,85%	$ 167.858.480,89	8,55%	Alistado de pisos en mortero, suministro de enchape en porcelanato	
9	Carpintería metálica	14/03/2023	17/08/2023	$ 191.061.475,00	9,74%	$ 26.269.676,18	1,34%	Suministro de ventana en aluminio con rejilla superior.	
13	Pañete y pintura	22/03/2023	20/09/2023	$ 122.153.405,00	6,22%	$ 71.616.563,31	3,65%	Pañete muro 1:4 incluye filos, estuco sobre pañete, estuco filos sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos.	
16	Obras exteriores	1/09/2023	31/10/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	13/03/2023	26/09/2023	$ 265.721.021,50	13,54%	$ 128.944.416,69	6,57%	Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica UPVC 2mm, suministro e instalación de caballete para teja, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio.	
20	Aseo y disposición final	20/04/2023	31/10/2023	$ 3.721.329,15	0,19%	$ 18.017.273,49	0,92%	Embalaje de teja en asbesto cemento	

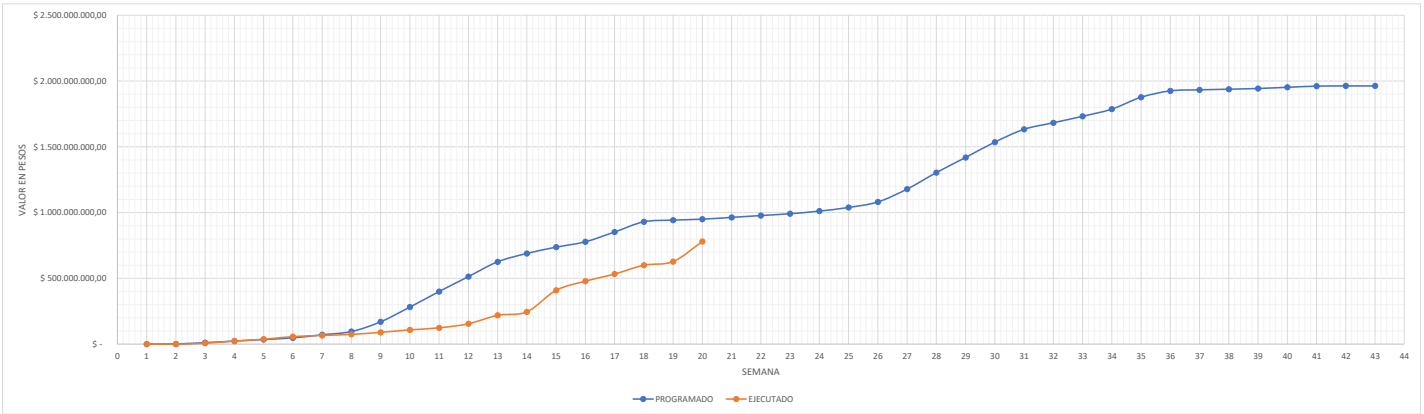


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
Colegio Garcés Navas		1/02/2023	31/07/2023	$ 787.083.405,50	78,25%	$ 333.594.136,39	42,38%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	35,87%
1	Preliminares	1/02/2023	3/05/2023	$ 184.553.201,40	23,45%	$ 89.546.085,44	11,38%	Cerramiento en teja de zinc, desmonte de cielo raso, cubierta, desmonte de lámparas y red eléctrica, retiro de manto de aluminio, mantenimiento de ventanería y puertas y limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	8/04/2023	19/04/2023	$ 9.608.600,00	1,22%	$ 134.924.786,38	17,14%	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento, viga de amarre en concreto de 3000PSI, suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI, suministro e instalación de estructura metálica,.	
3	Mampostería	4/03/2023	15/03/2023	$ 8.208.415,00	1,04%	$ 2.127.832,55	0,27%	Muro en ladrillo prensado macizo	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	13/03/2023	24/05/2023	$ 39.390.310,00	5,00%	$ -	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	25/05/2023	27/05/2023	$ 661.334,00	0,08%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	20/04/2023	13/06/2023	$ 39.804.153,45	5,06%	$ -	0,00%		
16	Obras exteriores	4/05/2023	20/05/2023	$ 11.483.940,00	1,46%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	3/02/2023	29/07/2023	$ 297.985.150,01	37,86%	$ 70.968.392,24	9,02%	Suministro e instalación de cubierta en teja termoacustica UPVC 2mm, suministroo e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio	
20	Aseo y disposición final	10/02/2023	5/06/2023	$ 24.224.877,78	3,08%	$ 36.027.039,79	4,58%	Embalaje de teja de asbesto cemento	


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

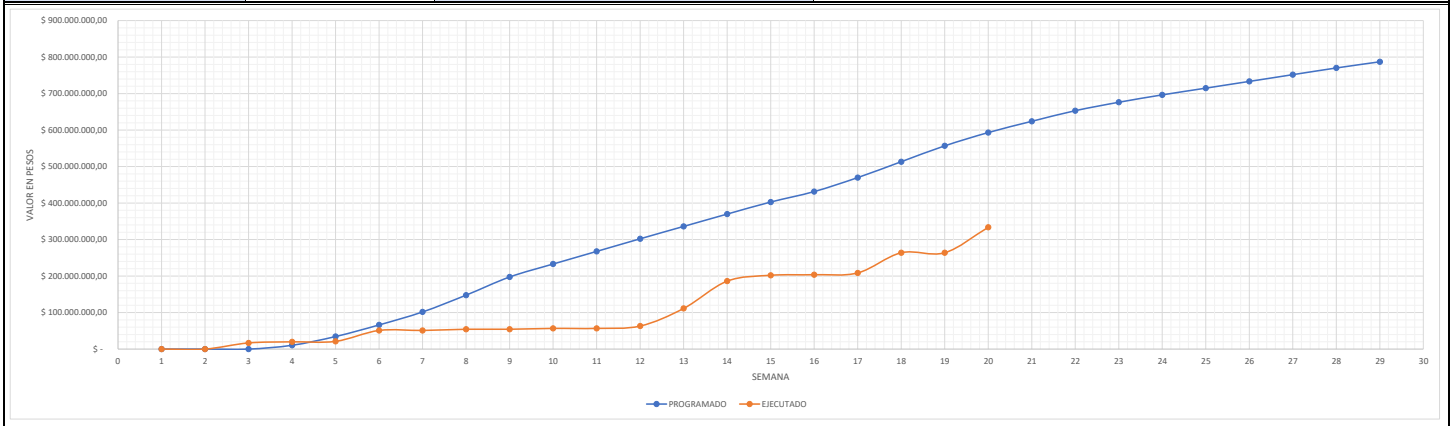

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Floridablanca	6/02/2023	31/10/2023	$ 699.153.025,00	33,15%	$ 180.142.951,72	25,77%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	7,38%
1	Preliminares	6/02/2023	17/07/2023	$ 77.055.764,11	11,02%	$ 42.393.337,21	6,06%	Localización y replanteo, cerramiento en lona, demolición pavimento asfáltico, desmonte canecas de basura, limpieza y mantenimiento cárcamos, picado de placa.	
2	Estructura	6/03/2023	13/05/2023	$ 126.308.688,00	18,07%	$ 96.083.590,43	13,74%	Excavación manual en material común y recebo compactado, concreto corriente en grava común, suministro e instalación de acero de refuerzo, suministro de malla electro soldada	
3	Mampostería	8/05/2023	31/10/2023	$ 8.226.638,05	1,18%	$ -	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	15/04/2023	8/05/2023	$ 195.726,00	0,03%	$ 624.337,48	0,09%	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 6"	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	8/05/2023	8/09/2023	$ 6.968.254,88	1,00%	$ -	0,00%		
7	Pisos	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 33.941.805,90	4,85%	Concreto de limpieza, piso en concreto a la vista endurecido y afinado con helicóptero, junta de dilatación inducida piso en concreto allanado.	
9	Carpintería metálica	6/09/2023	30/10/2023	$ -	0,00%	$ 7.099.880,70	1,02%	Cerramiento contra impacto H=5,00m	
13	Pañete y pintura	19/05/2023	14/08/2023	$ 4.938.707,41	0,71%	$ -	0,00%		
16	Obras exteriores	6/03/2023	29/06/2023	$ 7.307.830,08	1,05%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	18/07/2023	22/09/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final	13/05/2023	31/10/2023	$ 750.858,07	0,11%	$ -	0,00%		

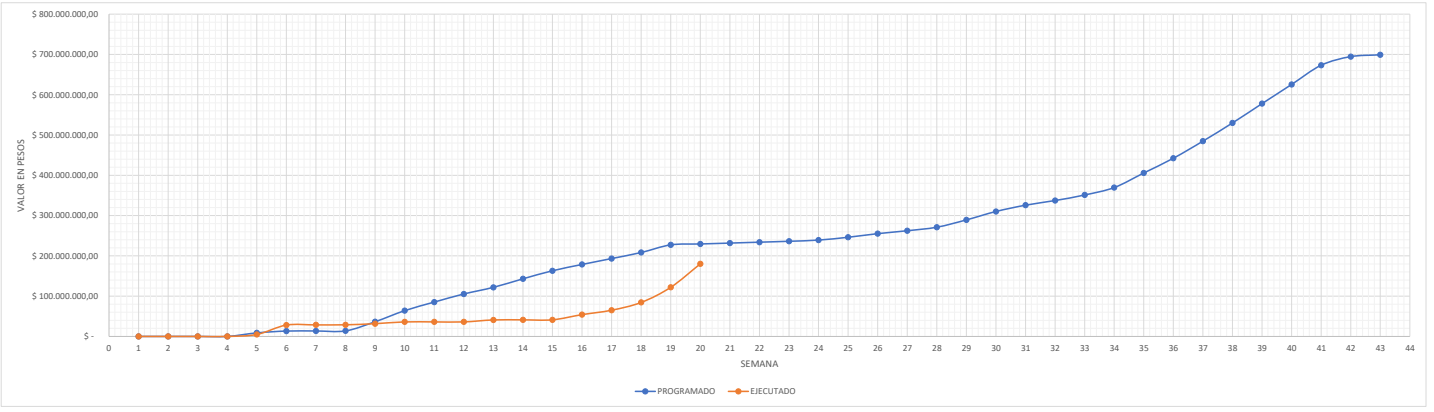


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Miguel Antonio Caro	7/02/2023	15/07/2023	$ 102.360.534,08	100,00%	$ 102.360.534,08	100,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
1	Preliminares	7/02/2023	2/05/2023	$ 32.297.839,19	31,55%	$ 32.297.839,19	31,55%	Cerramiento en lona, demolición placa maciza, demolición de alistado de piso, desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cubierta, desmonte de canaleta metálica, diagnostico y mantenimiento de cubierta existente, limpieza de	
2	Estructura	11/04/2023	15/07/2023	$ 22.957.821,67	22,43%	$ 22.957.821,67	22,43%	Excavación manual, relleno en recebo, concreto corriente, placa de contrapiso de 10 cm, instalación malla electro soldada, cuneta trapezoidal 3000 PSI	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	16/05/2023	19/06/2023	$ 9.089.058,90	8,88%	$ 9.089.058,90	8,88%	Instalación de tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro y aplicación de pintura para tubería, sondeo y revisión de desagües	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	24/04/2023	8/06/2023	$ 4.616.550,32	4,51%	$ 4.616.550,32	4,51%	Suministro e instalación de bala led de 18W, suministro e instalación de tubería EMT conduit 2", suministro e instalación de cableado 1#6 + 1#8 + 1*10T.	
7	Pisos	27/04/2023	12/05/2023	$ 4.568.148,99	4,46%	$ 4.568.148,99	4,46%	Concreto de limpieza para caja de inspección, instalación de bordillo prefabricado, media caña en mortero, afinado de piso en mortero impermeabillizado.	
16	Obras exteriores	11/04/2023	9/05/2023	$ 1.382.430,89	1,35%	$ 1.382.430,89	1,35%	Reparación y adecuación de cunetas existentes	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

17	Cubiertas e impermeabilizaciones	20/03/2023	12/06/2023	$	19.578.768,35	19,13%	$ 19.578.768,35	19,13%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de teja termo acústica UPVC 2mm, teja en fibrocemento, canal galvanizada.
20	Aseo y disposición final	7/03/2023	12/07/2023	$	7.869.915,77	7,69%	$ 7.869.915,77	7,69%	Aseo general final y limpieza, embalaje de teja de asbesto cemento

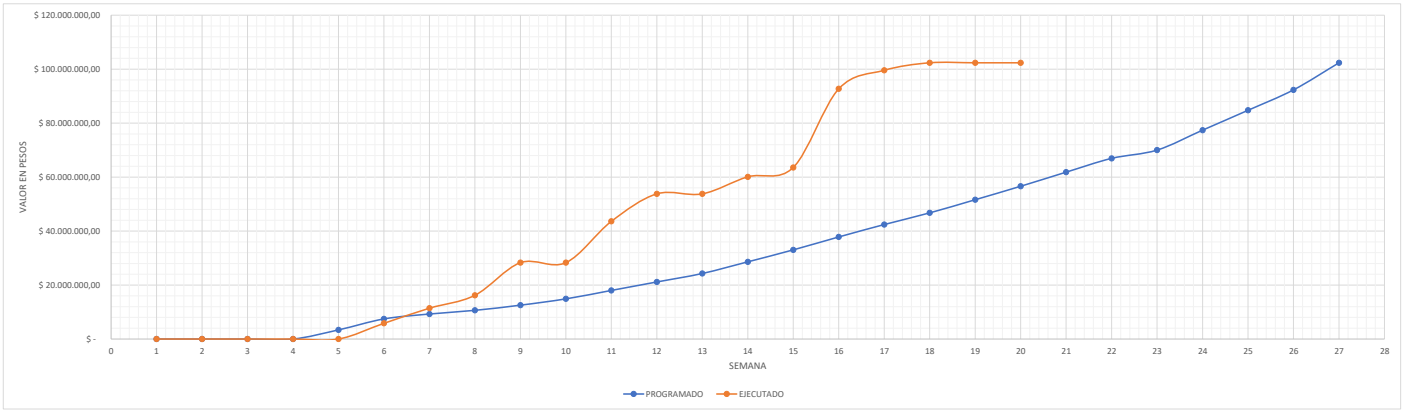

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Justo Víctor Charry	13/02/2023	15/07/2023	$ 369.424.312,00	73,36%	$ 47.534.896,96	12,87%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	60,50%
1	Preliminares	13/02/2023	8/04/2023	$ 54.617.956,72	14,78%	$ 12.751.956,70	3,45%	Replanteo, cerramiento en lona, demolición de acabado, muros, enchape y placa, desmonte de aparatos sanitarios, puertas, baranda metálica y tubería existente y perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso	
3	Mampostería	31/03/2023	8/04/2023	$ 21.960.041,00	5,94%	$ -	0,00%		
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	27/06/2023	10/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
7	Pisos	27/04/2023	1/05/2023	$ 5.437.009,00	1,47%	$ 736.042,85	0,20%	Mediacaña en granito, instalación de wing de aluminio	
8	Mampostería seca	4/04/2023	26/04/2023	$ 27.180.454,00	7,36%	$ 9.583.722,95	2,59%	Suministro e instalación de enchape cerámico	
9	Carpintería metálica	27/04/2023	14/06/2023	$ 59.072.854,52	15,99%	$ -	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	27/04/2023	25/05/2023	$ 65.354.718,00	17,69%	$ 9.497.761,66	2,57%	Suministro de lavamanos de incrustar, sanitario línea infantil y orinal línea adulto	
12	Aparatos y equipos especiales	20/05/2023	23/06/2023	$ 14.954.811,20	4,05%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	17/05/2023	26/06/2023	$ 21.669.096,74	5,87%	$ 14.965.412,81	4,05%	Pañete muro incluye filos, estuco sobre pañete, pintura epóxica a 3 manos	
15	Cerraduras, vidrios y espejos	27/06/2023	1/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final	10/04/2023	15/07/2023	$ 778.316,57	0,21%	$ -	0,00%		

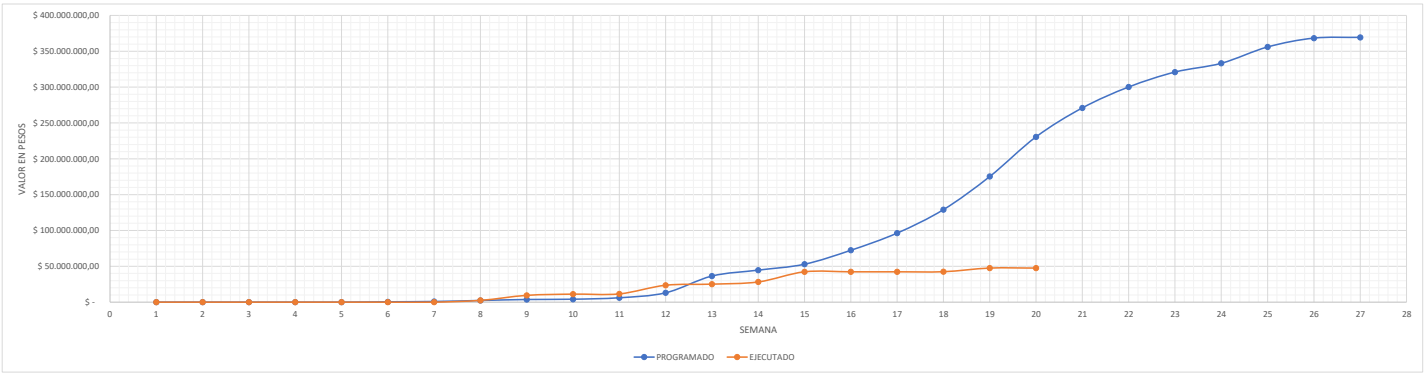


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	22/08/2023	$ 677.034.595,00	58,18%	$ 162.264.141,73	23,97%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	34,21%
1	Preliminares	7/02/2023	17/05/2023	$ 94.505.893,26	13,96%	$ 44.017.269,52	6,50%	Cerramiento en teja de zinc, demolición acabado de piso y placa maciza, desmonte de puertas, ventanas, cielo raso y cubierta y limpieza de canales y bajantes.	
2	Estructura	23/02/2023	5/05/2023	$ 13.713.785,00	2,03%	$ 7.975.513,47	1,18%	Excavación manual en material común y recebo compactado, relleno en material seleccionado, suministro e instalación de subbase B-400, placa de contrapiso de 10 cm, instalación de malla electro soldada.	
3	Mampostería	1/05/2023	17/05/2023	$ 4.596.240,00	0,68%	$ -	0,00%		
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	9/03/2023	11/03/2023	$ 196.992,00	0,03%	$ 1.180.639,84	0,17%	Suministro e instalación de tubería PVCS 2", suministro e instalación de sifón piso 2" y tubería PVCP RDE 9 de 1/2"	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	10/07/2023	29/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
7	Pisos	18/05/2023	26/07/2023	$ 27.131.177,00	4,01%	$ 4.567.040,87	0,67%	Alistado de piso en mortero	
8	Mampostería seca	12/07/2023	20/07/2023	$ -	0,00%	$ 6.983.157,64	1,03%	Muro en superboard de 8 mm, incluye estructura metálica	
9	Carpintería metálica	6/05/2023	21/06/2023	$ 49.788.486,55	7,35%	$ -	0,00%		
11	Aparatos sanitarios y accesorios	4/07/2023	8/07/2023	$ -	0,00%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	1/04/2023	25/07/2023	$ 38.122.970,88	5,63%	$ 14.450.591,10	2,13%	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta	

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

16	Obras exteriores	4/03/2023	8/03/2023	$ 450.384,00	0,07%	$ -	0,00%	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	27/03/2023	8/07/2023	$ 155.295.688,33	22,94%	$ 83.089.929,30	12,27%	Instalación de lámina de policarbonato
20	Aseo y disposición final	5/04/2023	29/07/2023	$ 10.079.811,89	1,49%	$ -	0,00%	

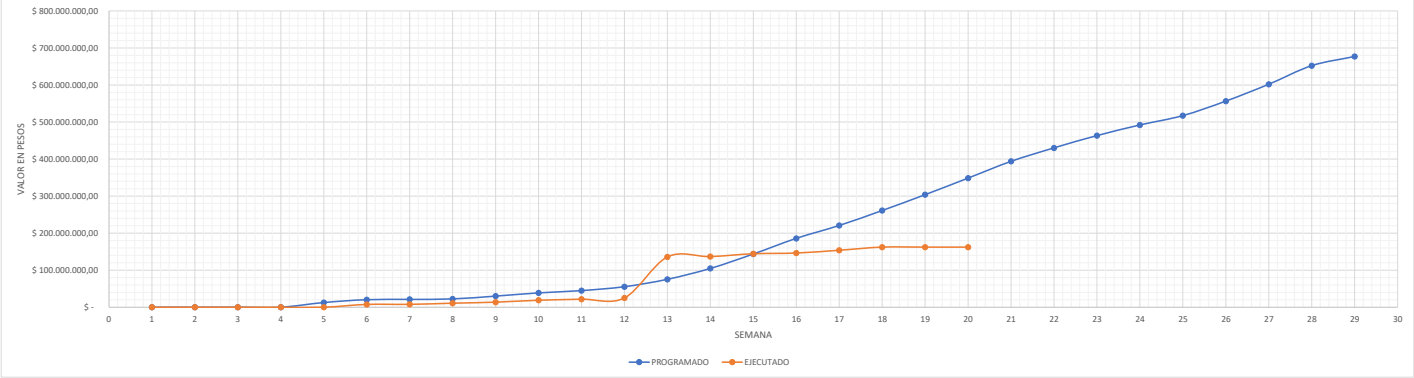

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Instituto técnico Juan del Corral	15/02/2023	12/09/2023	$ 524.030.444,00	9,41%	$ 77.795.896,82	14,85%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	-5,44%
1	Preliminares	15/02/2023	23/02/2023	$ 6.409.678,37	1,22%	$ 21.623.068,56	4,13%	Cerramiento en lona, demolición de alistado y acabado de piso, retiro de tuberías, desmonte de cielo raso, lámparas y picado de membrana y placa, demolición de acabado y alistado de piso.	
3	Mampostería	3/07/2023	31/07/2023	$ -	0,00%	$ 19.477.699,10	3,72%	Muro divisorio en bloque No. 4, tratamiento de fachadas en ladrillo a la vista, anclajes varillas 3/8".	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio	14/04/2023	4/05/2023	$ 2.886.660,00	0,55%	$ 3.422.898,22	0,65%	Suministro e instalación de tubería PVCS 4", suministro, transporte e instalación de soporte tipo pera 4".	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones	17/05/2023	13/06/2023	$ 10.948.166,17	2,09%	$ -	0,00%		
7	Pisos	19/06/2023	17/07/2023	$ -	0,00%	$ 19.680.140,13	3,76%	Alistado de pisos en mortero, mediacaña en mortero	
8	Mampostería seca	17/05/2023	2/06/2023	$ 2.324.366,00	0,44%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura	14/07/2023	14/08/2023	$ -	0,00%	$ 7.450.693,00	1,42%	Pañete muro 1:4, incluye filos, vinilo tipo 1 a tres manos.	
17	Cubiertas e impermeabilizaciones	24/04/2023	17/08/2023	$ 23.482.964,88	4,48%	$ 6.141.397,82	1,17%	Flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio	
20	Aseo y disposición final	27/02/2023	8/08/2023	$ 3.251.610,64	0,62%	$ -	0,00%		

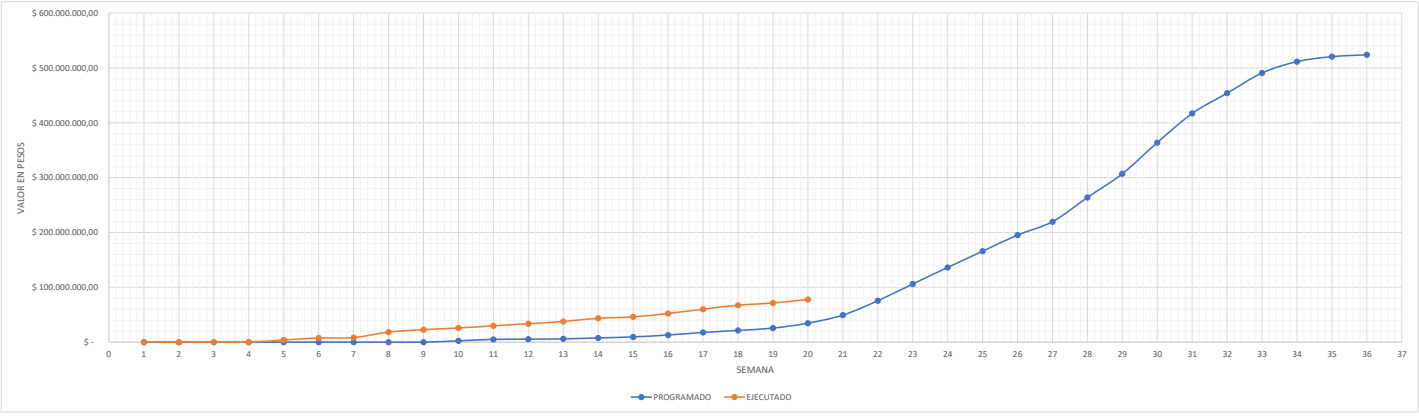


No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	% Avance programado	Valor ejecutado	% Avance ejecutado	Descripción de la Actividad	
	Colegio San José Norte	5/04/2023	29/04/2024	$ 2.929.420.309,00	14,29%	$ 61.727.821,20	2,11%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	12,18%
1	Preliminares			$ 418.488.615,57	14,29%	$ 39.330.095,29	1,34%	Cerramiento en lona, demolición de estructuras en concreto, placa contra piso, acabado y alistado, muro en mampostería, enchape de muros y pega, desmonte de puertas y ventanas, desconexión de aparatos sanitarios, retiro de tuberías hidrosanitarias, desmonte de cielo raso, salidas eléctrica y red eléctrica.	
3	Mampostería				0,00%	$ 21.457.529,98	0,73%	Excavación manual en material común, excavación manual en recebo compactado, suministro e instalación de subbase granular B-400.	
4	Instalaciones domiciliarias hidráulicas, sanitarias, de gas y de control de incendio				0,00%	$ 940.195,94	0,03%	Suministro e instalación geotextil tejido T1700	
5	Instalaciones eléctricas y de comunicaciones				0,00%	$ -	0,00%		
7	Pisos				0,00%	$ -	0,00%		
8	Mampostería seca				0,00%	$ -	0,00%		
13	Pañete y pintura				0,00%	$ -	0,00%		
17	Cubiertas e impermeabilizaciones				0,00%	$ -	0,00%		
20	Aseo y disposición final				0,00%	$ -	0,00%		

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

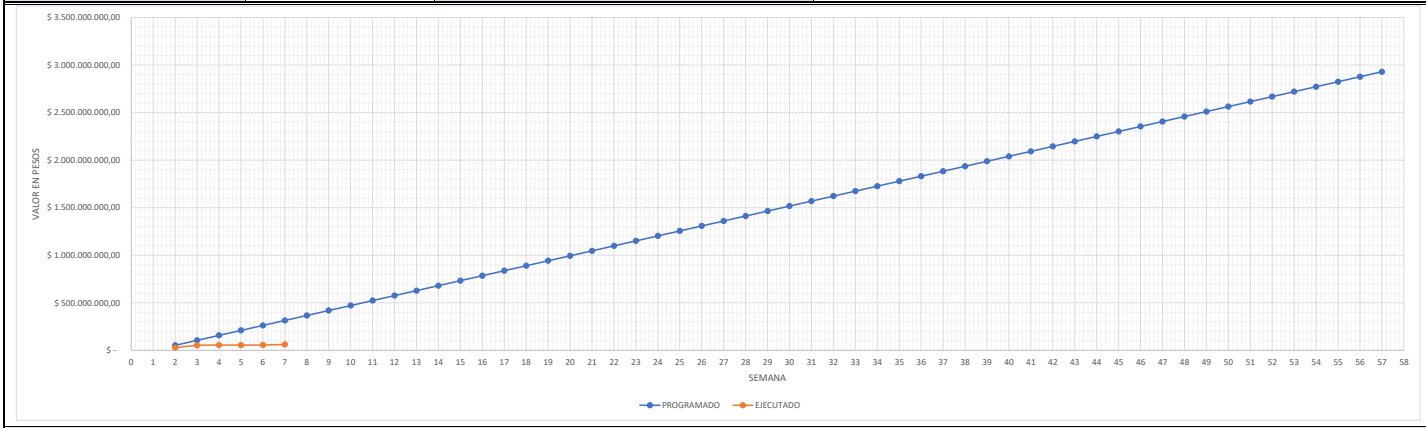

Atención de IED

Institución	Fecha inicio	Fecha terminación	Valor programado	Avance programado	Valor ejecutado	Avance ejecutado	Observaciones	Diferencia
Colegio Francisco Primero	25/01/2023	22/08/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio José Asunción Silva	15/02/2023	12/09/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Colombia	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Simón Bolívar	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Nidia Quintero de Turbay	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Guatemala	24/03/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio República de Panamá	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Tomás Carrasquilla	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%
Colegio Robert F Kennedy	10/05/2023	31/10/2023	-		-	0,00%	**Atraso (Rojo) - Avance (Verde)**	0,00%

Atención de emergencias

Colegio Morisco	13/01/2023	21/01/2023					
Colegio Tomas Cipriano de Mosquera	1/02/2023						
Colegio Nidia Quintero de Turbay	14/02/2023	6/03/2023					
Colegio Thomas Carrasquilla, sede A	1/02/2023						
Colegio Rafael Bernal Jiménez, sede B	28/01/2023	23/02/2023					
Colegio República de Panamá	22/02/2023	27/03/2023					
Colegio Domingo Faustino	8/03/2023	27/03/2023					
Dirección Local de Engativá	8/02/2023						


PROGRAMADO					EJECUTADO				
No.	**VALOR PROGRAMADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**	**No.**	**VALOR EJECUTADO SEMANAL**	**%**	**ACUMULADO**	**%**
1	$ -	0,00%	$ -	0,00%	1	$ -	0,00%	$ -	0,00%
2	$ 1.270.756,93	0,01%	$ 1.270.756,93	0,01%	2	$ 9.458.499,71	0,07%	$ 9.458.499,71	0,07%
3	$ 19.951.637,75	0,14%	$ 21.222.394,68	0,15%	3	$ 31.826.160,08	0,23%	$ 41.284.659,79	0,30%
4	$ 50.914.718,24	0,36%	$ 72.137.112,92	0,52%	4	$ 33.373.547,10	0,24%	$ 74.658.206,89	0,54%
5	$ 84.783.311,22	0,61%	$ 156.920.424,14	1,12%	5	$ 33.581.581,31	0,24%	$ 108.239.788,20	0,78%
6	$ 84.520.694,84	0,61%	$ 241.441.118,98	1,73%	6	$ 94.518.500,86	0,68%	$ 202.758.289,06	1,45%
7	$ 79.994.302,15	0,57%	$ 321.435.421,13	2,30%	7	$ 22.218.182,48	0,16%	$ 224.976.471,55	1,61%
8	$ 92.371.183,17	0,66%	$ 413.806.604,30	2,97%	8	$ 40.324.809,10	0,29%	$ 265.301.280,65	1,90%
9	$ 188.479.295,83	1,35%	$ 602.285.900,13	4,32%	9	$ 65.485.536,40	0,47%	$ 330.786.817,05	2,37%
10	$ 221.475.791,25	1,59%	$ 823.761.691,38	5,90%	10	$ 41.427.564,22	0,30%	$ 372.214.381,27	2,67%
11	$ 229.916.129,85	1,65%	$ 1.053.677.821,23	7,55%	11	$ 49.569.565,98	0,36%	$ 421.783.947,25	3,02%
12	$ 230.178.690,91	1,65%	$ 1.283.856.512,14	9,20%	12	$ 74.571.439,34	0,53%	$ 496.355.386,59	3,56%
13	$ 271.119.796,10	1,94%	$ 1.554.976.308,24	11,14%	13	$ 384.555.815,94	2,76%	$ 880.911.202,53	6,31%
14	$ 418.493.027,93	3,00%	$ 1.973.469.336,17	14,14%	14	$ 175.842.367,10	1,26%	$ 1.056.753.569,63	7,57%
15	$ 419.346.600,61	3,01%	$ 2.392.815.936,78	17,15%	15	$ 240.754.691,04	1,73%	$ 1.297.508.260,66	9,30%
16	$ 385.041.091,99	2,76%	$ 2.777.857.028,77	19,91%	16	$ 148.581.092,20	1,06%	$ 1.446.089.352,86	10,36%
17	$ 396.837.578,62	2,84%	$ 3.174.694.607,39	22,75%	17	$ 109.142.302,12	0,78%	$ 1.555.231.654,98	11,15%
18	$ 418.989.557,94	3,00%	$ 3.593.684.165,33	25,75%	18	$ 189.934.769,81	1,36%	$ 1.745.166.424,79	12,51%
19	$ 478.583.967,26	3,43%	$ 4.072.268.132,59	29,18%	19	$ 137.179.908,07	0,98%	$ 1.882.346.332,85	13,49%
20	$ 465.184.794,77	3,33%	$ 4.537.452.927,36	32,52%	20	$ 300.346.880,40	2,15%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
21	$ 457.480.610,95	3,28%	$ 4.994.933.538,32	35,79%	21	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
22	$ 445.302.299,14	3,19%	$ 5.440.235.837,46	38,99%	22	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
23	$ 428.293.319,64	3,07%	$ 5.868.529.157,10	42,06%	23	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
24	$ 471.933.403,33	3,38%	$ 6.340.462.560,44	45,44%	24	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
25	$ 517.957.332,48	3,71%	$ 6.858.419.892,92	49,15%	25	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
26	$ 502.398.796,86	3,60%	$ 7.360.818.689,78	52,75%	26	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

27	$ 592.079.250,63	4,24%	$ 7.952.897.940,41	56,99%	27	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
28	$ 660.478.306,35	4,73%	$ 8.613.376.246,77	61,73%	28	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
29	$ 578.512.115,36	4,15%	$ 9.191.888.362,13	65,87%	29	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
30	$ 544.790.952,11	3,90%	$ 9.736.679.314,24	69,78%	30	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
31	$ 568.215.173,58	4,07%	$ 10.304.894.487,83	73,85%	31	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
32	$ 498.727.100,05	3,57%	$ 10.803.621.587,88	77,42%	32	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
33	$ 484.671.350,33	3,47%	$ 11.288.292.938,21	80,89%	33	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
34	$ 471.917.208,88	3,38%	$ 11.760.210.147,09	84,28%	34	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
35	$ 451.787.732,30	3,24%	$ 12.211.997.879,40	87,51%	35	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
36	$ 419.593.109,31	3,01%	$ 12.631.590.988,71	90,52%	36	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
37	$ 394.915.239,85	2,83%	$ 13.026.506.228,56	93,35%	37	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
38	$ 363.722.866,10	2,61%	$ 13.390.229.094,67	95,96%	38	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
39	$ 400.217.895,43	2,87%	$ 13.790.446.990,10	98,83%	39	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
40	$ 404.941.999,94	2,90%	$ 14.195.388.990,04	101,73%	40	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
41	$ 393.096.931,71	2,82%	$ 14.588.485.921,76	104,54%	41	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
42	$ 336.508.997,74	2,41%	$ 14.924.994.919,50	106,96%	42	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
43	$ 192.836.797,45	1,38%	$ 15.117.831.716,95	108,34%	43	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
44	$ 53.015.551,95	0,38%	$ 15.170.847.268,90	108,72%	44	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%
45	$ 4.153.433.613,10	29,76%	$ 19.324.280.882,00	138,48%	45	$ -	0,00%	$ 2.182.693.213,25	15,64%

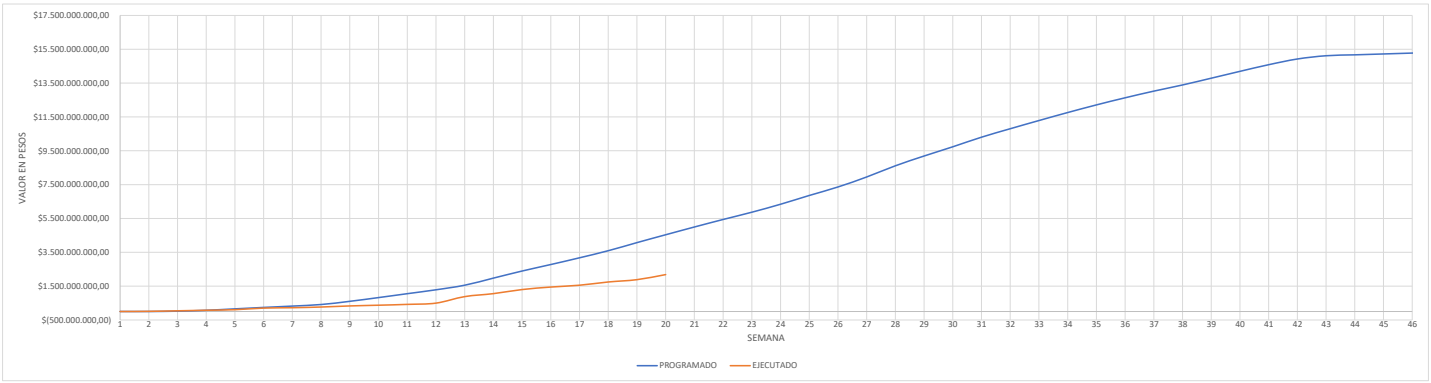

Seguimiento Ruta Critica

No.	Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1	Jorge Eliecer Gaitán	25/01/2023	19/01/2023	31/10/2023	6	285	-279	
2	Francisco José de Caldas, Sede A	25/01/2023	23/01/2023	31/10/2023	2	281	-279	
3	Garcés Navas	25/01/2023	23/01/2023	31/07/2023	2	189	-187	
4	Florida Blanca	6/02/2023	2/02/2023	31/10/2023	4	271	-267	
5	Miguel Antonio Caro	7/02/2023	7/02/2023	15/07/2023	0	158	-158	
6	Justo Víctor Charry	13/02/2023	13/02/2023	15/07/2023	0	152	-152	
7	Rafael Bernal Jiménez	25/01/2023	8/02/2023	22/08/2023	-14	195	-209	
8	Juan del Corral	15/02/2023	8/02/2023	12/09/2023	7	216	-209	
9	Francisco Primero	24/03/2023	24/03/2023	22/08/2023	0	151	-151	
10	José Asunción Silva	24/03/2023	24/03/2023	12/09/2023	0	172	-172	
11	Manuela Ayala de Gaitán	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
12	República de Colombia	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
13	Simón Bolívar	24/03/2023	24/03/2023	31/10/2023	0	221	-221	
14	Nidia Quintero de Turbay	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
15	República de Guatemala	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
16	República de Panamá	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
17	Tomás Carrasquilla	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
18	Francisco José de Caldas, Sede B	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	
19	Robert F Kennedy	10/05/2023	10/05/2023	31/10/2023	0	174	-174	

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), se firma acta de inicio entre Jorge Gómez Falla, en calidad de Representante de Consorcio Intercolegios 2022, como Interventor, y Miguel Alexander Cerón Molina, en calidad de representante legal de Safrid Ingeniería S.A.S como Contratista.

El día 05 de abril de 2023 se realizó aprobación de Modificatorio No.1 Adición y Prórroga de Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4077642 – 2022.

Aspecto Financiero

A la fecha del presente informe se han tramitado actas de pago No. 1, No. 2 y No.3 de contrato de obra e interventoría acorde a los avances realizados.

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Aspecto Técnico

En el periodo comprendido del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades:

Colegio Jorge Eliecer Gaitán

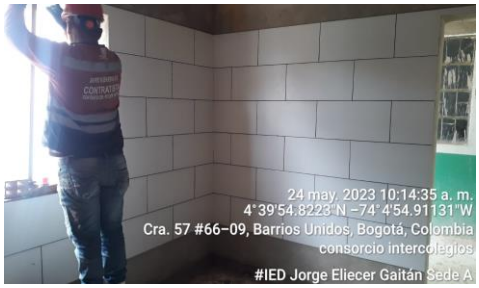

Enchape en cuarto de cooperativa



Aplicación de pintura e instalación de perfiles



Picado de muro en mampostería

Colegio Francisco José de Caldas, Sede A



Aplicación de estuco y pintura en aulas



Alistado en aulas y pasillo de segundo piso



Instalación de enchape de piso en aulas

Colegio Garcés Navas



Aplicación de pintura en perfiles



Desmonte de cubierta bloque B



Aplicación de pintura en perfiles

Colegio Floridablanca



Fundición cancha No. 1



Afinado y corte en cancha No. 1



Limpieza y mantenimiento de cajas de aguas lluvias y eléctricas

Colegio Juan del Corral


CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		



Aplicación de pañete en viga

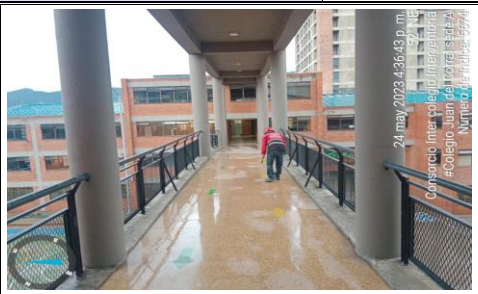

Pintura en placa cubierta y columnas



Aplicación de pintura en salón de música

Colegio Rafael Bernal Jiménez



Estructura shut de basuras



Frente de obra sin ejecución de actividades



Estructura de cubierta

Colegio Justo Victor Charry



Instalación de enchape en piso baño de niños bachiller



Instalación de enchape en piso baño de niños bachiller



Instalación de enchape en piso baño de niños bachiller

CONSORCIO INTER COLEGIOS 2022	**INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4146207 – 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA.				
SEMANA No.	20	**DEL**	domingo, 21 de mayo de 2023	**AL**	sábado, 27 de mayo de 2023
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	136	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Arq. Edwin Alexander Santana Rodríguez		

Colegio San José Norte



Exacavación manual en recebo compactado



Trasiego de material - aula múltiple



Compactación de material en aula múltiple

En cumplimiento de sus funciones esta interventoría realiza:

•Control y seguimiento a los procesos constructivos realizados en los frentes de obra, así mismo, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas del caso.
•Requerimiento a contratista de obra de documentos, conceptos, fichas de calidad, manual de garantías y demás material que permita verificar los trabajos ejecutados en aras de cumplir con objeto contractual.
•Visitas técnicas en atención a emergencias presentadas en la localidad de Engativá y Barrios Unidos informadas por la Secretaría de Educación Distrital.
•Verificación de cumplimiento de todas la obligaciones contenidas dentro del contrato de obra.

Aspecto SST-Ambiental

•Se realiza control y seguimiento sobres los aspectos e impactos ambientales a fin de establecer las acciones pertinentes para reducir, mitigar y corregir dichos impactos.
•Se verifica en obra las actividades, aspectos y controles en materia de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir riesgos existentes.

Aspecto Social

Se realiza comité semanal de obra el día 23 de mayo de 2023 en instalaciones de IED San José Norte.

Aspecto PMT


N/A

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
22/05/2023	7:00 am 5:00 pm	3
23/05/2023	7:00 am 5:00 pm	2
24/05/2023	7:00 am 5:00 pm	2
25/05/2023	7:00 am 5:00 pm	3
26/05/2023	7:00 am 5:00 pm	4
27/05/2023	7:00 am 12:00 pm	1



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán: Suministro e instalación de cubierta en teja termoacustica.
• Colegio Francisco José de Caldas: Suministro e instalación de piso laminado 8 mm, aseo y disposición final.
• Colegio Garcés Navas: Esmalte sobre cerchas y estructura metálica, flanche en lámina galvanizada, bajante en PVC blanco, suministro e instalación de teja termoacustica, estructura metálica y caballetes para cubierta y orden y aseo general.
• Colegio Floridablanca: Estuco impermeabilizado sobre pañete, cancha múltiple, aseo general final y limpieza.
• Colegio Juan del Corral: Desmonte de cubierta, retiro de manto de aluminio, reinstalación de lámparas existentes, suministro e instalación de cableado eléctrico, muro en drywall doble cara, flanche en lámina galvanizada, suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica y estructura metálica, suministro e instalación de remates laterales para cubierta, orden y aseo general.
• Colegio Rafael Bernal Jiménez: Alistado de pisos en mortero, suministro e instalación de baranda en tubería de agua negra, suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, suministro e instalación de cubierta termoacustica, lamina policarbonato, aseo general final y limpieza.
• Colegio Miguel Antonio Caro: Relleno en recebo común compactado, cuneta trapezoidal 3000 PSI, suministro e instalación tubería PVC alcantarillado 4", caja de inspección 80x80, suministro e instalación de luminaria tipo LED hermética, bajante en PVC, orden y aseo.
• Colegio Justo Víctor Charry: Suministro e instalación de divisiones de baño en acrilico recuperado de 10mm, suministro e instalación de división puertas y paneles en acero, estuco impermeabilizado sobre pañete, vinilo tipo 1 a tres manos, aseo general final y limpieza.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

• De acuerdo con el presente informe, a la fecha se presenta un avance general ejecutado de 15,64%, con base en la programación presentada un avance general programado de 32,52%, teniendo una diferencia de 16,87% en el contrato.
• Con base en la relación establecida entre programación y ejecución en los frentes de obra activos a la fecha, se evidencia atraso en 7 de 9 colegios por lo que se insta realizar las acciones pertinentes a fin de evitar incurrir en incumplimientos al contrato.
• Con base en el atraso evidenciado, se implementa por parte de contratista de obra plan de contingencia en los frentes de obra, esto en aras de mitigar y evitar incurrir en atrasos y posibles incumplimientos
• En atención a emergencias se realiza intervención con instalación de estructura y membrana en tanque subterráneo de agua potable de IED Juan Francisco Berbeo.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
• De acuerdo con el avance evidenciado en las Instituciones Educativas activas, a la fecha se establece un avance físico de 47,7% para IED Jorge Eliecer Gaitán; 42,00% para IED Francisco José de Caldas; 55,00% para Garcés Navas IED; 48,00% para IED Floridablanca; 21,00% para Justo Víctor Charry; 25,00% para Rafael Bernal Jiménez, 36,00% para Juan del Corral y 30,00% para San José Norte. • Teniendo en cuenta las directrices estipuladas y manifestadas por la Secretaria de Educación del Distrito, se insta a contratista de obra efectuar las actividades acorde a lo requerido por la entidad, así mismo, considerar el balance presupuestal actualizado para evitar afectaciones al contrato. • Se verifica en obra que el personal cumpla con los requisitos mínimos establecidos, del mismo modo, se inspecciona acerca del adecuado uso del equipo de protección personal pertinente en todo el personal, esto en aras de evitar accidentes laborales. •Se notifica a contratista de obra que la entrega de la información es indispensable para la validación y aprobación de los conceptos por parte de la interventoría, por tal razón, los tiempos de demora en la entrega de la documentación solicitada, son imputables al contratista de obra. •Se solicita a contratista de obra, ejecutar las acciones pertinentes para cumplir con el alcance del contrato para las Instituciones Educativas. •Consorcio Intercolegios 2022 se encuentra pendiente de los trámites de adición y prórroga de contrato de interventoría, de manera, que requiere de las buenas gestiones de la entidad para dar celeridad a los mismos.	**FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR**

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
