SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL N° 04

PERIODO COMPRENDIDO
01 DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°218

CONTRATO DE OBRA N° 217

INFORME DE INTERVENTORIA

[ ] FINAL [x] PARCIAL No __4_

PERIODO DEL INFORME: 01 de abril al 30 de abril de 2023.

Contrato de Interventoría No.	**Contrato No.218 de 2023**
Objeto	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Valor Inicial	$ 423.394.860’.00
Plazo	Doce (12) Meses
Anticipo 46%	$194.761.635,60
Contratista	SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS
Representante Legal	MABEL YESENIA SIERRA AGUILLON
Supervisor	Yesid rojas peña
Contratante	Aguas del Huila S.A E.S.P
Fecha de Inicio	28 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación	28 de diciembre de 2023
Aseguradora	Seguros Mundial

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	**Contrato No. 217 de 2022**
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
Valor Inicial	$ 5.106.990.466,00
Plazo	Doce (12) meses a partir de Acta de Inicio
Anticipo	$ 2.042.796.186,40
Contratista	UNION TEMPORAL PMA SUAZA
Representante Legal	Ing. Javier Leonardo Valderrama
Supervisor	Aguas del Huila
Fecha de Inicio	28 de diciembre de 2022
Aseguradora	Seguros del Estado S.A
Estado del Contrato	En ejecución

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

Para el mes de abril se continua con la instalación de la línea de conducción como lo expresa el contratista en su informe describiendo el estado y el avance físico y financiero.

De igual formase describe para este mes el estado y avance físico del contrato de obra y consecuente mente su información financiera, desarrolladas según cronograma de actividades.

Al finalizar el mes de abril se ha recibido de parte de Aguas del Huila en total 606 tubos PVC diámetro 8" PR160 Biaxial, fue verificada en obra según tabla que anexa el contratista, a la vez se verifico el acopio acopiado en fincas de los vecinos que han facilitado esta labor.

A fecha del 24 de abril se efectuó el ultimo recibo de 93 tubos de 8 pulgadas. La instalación de la tubería para este mes llega a 1629 metros. Al realizar las excavaciones se han presentado daños a redes domiciliarias y del gas las que vienen subsanando en forma inmediata por el personal de la UT PMA SUAZA.

Fueron instaladas los semi codos y uniones pertinentes con sus respectivos atraques.
Debido a la conducción de la tubería esta requiere ser pasada por una quebrada en una longitud aproximada de 23 metros lineales, la cual requiere ser encofrada manejando para

esta actividad el hierro de media pulgada y concreto elaborado en sitio utilizando formaleta de madera para su fundición.

La topografía viene haciendo sus trazados para la construcción del plano récor y evitar así que se pierda la huella de la tubería ya instalada.

Como lo expresa el contratista, se llevó a cabo un comité técnico con todas las partes en recinto de aguas del Huila, donde se trataron temas de dimensiones de cajas de purga y ventosa, instalación de un bay pass en el desarenador, empalme de la tubería de 8 pulgadas con el desarenador existente, definición de iniciar trabajos en el tanque de almacenamiento entre otros.

A 30 de abril se cuenta con un 8,47 % de avance físico de obra ejecutadas.

1.1.1 Estado de las pólizas Interventoría – Aseguradora: Seguros Mundial

N Anexo 0 Relación de Pólizas de Interventoría

Amparo	No. Póliza	Desde	Hasta	V/r. Asegurado
Cumplimiento	NV-100015138	22/12/2022	22/04/2024	$127.018.458
Buen manejo del Anticipo	NV-100015138	22/12/2022	22/04/2024	$169.357.944
Prestaciones Sociales	NV-100015138	22/12/2022	22/12/2026	$84.678.972
Calidad del Servicio	NV-100015138	22/12/2023	22/12/2028	$127.018.458
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual	NV-100015138	22/12/2022	22/12/2023	$200.000.000

N° Anexo 3 Acta aclaratoria y modificatoria Relación de Pólizas de Interventoría

Amparo	No. Póliza	Desde	Hasta	V/r. Asegurado
Cumplimiento	NV-100080313	06/01/2023	28/04/2024	$127.018.458
Buen manejo del Anticipo	NV-100080313	06/01/2023	28/04/2024	$194.761635.60
Prestaciones Sociales	NV-100080313	06/01/2023	28/12/2026	$84.678.972
Calidad del Servicio	NV-100080313	28/12/2023	28/12/2028	$127.018.458
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual	NV-100015138	22/12/2022	22/12/2023	$200.000.000

1.1.2 Estado de las pólizas Contratista de obra – Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de expedición: 28 de diciembre /2022 Fecha de Aprobación: 28 de diciembre 2022

No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
11-44-101195530	Cumplimiento	$1.532.097.140,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	Anticipo	$2.042.796.187,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	Salarios y prestaciones	$1.021.398.094,0	21/12/2022	21/12/2026
11-44-101195530	Estabilidad de la obra	$ 1.532.097.140,0	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días
11-40-101050935	Responsabilidad Civil	-	-	-

11-40-101050935	Predios labores y operaciones	$ 500.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Contratistas y subcontratistas	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Vehículos propios y no propios	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Responsabilidad Civil Patronal	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Daño Emergente y Lucro Cesante	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023

Póliza actualizada x Acta de inicio

Fecha de expedición: 20 / enero / 2023Fecha de Aprobación: 20 / enero / 2023

No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
11-44-101195530	Cumplimiento	$ 1.532.097.140,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	Anticipo	$ 2.042.796.187,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	Salarios y prestaciones	$ 1.021.398.094,0	21/12/2022	21/12/2026
11-44-101195530	Estabilidad de la obra	$ 1.532.097.140,0	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días
11-40-101050935	Responsabilidad Civil			
11-40-101050935	Predios labores y operaciones	$ 500.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Contratistas y subcontratistas	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Vehículos propios y no propios	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023

11-40-101050935	Responsabilidad Civil Patronal	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Daño Emergente y Lucro Cesante	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

Historial Cronológico del contrato de **OBRA**

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	28/12/22	123	0	28/12/23

Historial Cronológico del contrato de **INTERVENTORIA**

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	28/12/2023	123	0	28/12/2023

ACTAS DE OBRA (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.**)**

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	28 de diciembre de 2022

ACTAS DE INTERVENTORIA (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.**)**

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	28 de diciembre de 2022

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto OBRA

La interventoría procede a realizar entrega de la información del contrato No 217de 2022 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA el cual se encuentra actualmente con un porcentaje de avance en obras del 4,66% y el avance físico ejecutado a la fecha es del 8,47%.

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

Para el mes de abril se instalaron 1926 ml, correspondiente al 28,83% del total de la tubería a instalar más los 2502 ml instalados en el mes anterior que correspondía al 37.45% correspondiente a la tubería total a instalar, a la fecha se tiene un total de 4.428 ml instalados correspondientes al 66.29% de la tubería total a instalar en la línea de conducción.

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

A la fecha van adelantados en un porcentaje de 3,81% de acuerdo con el cronograma presentado.

AVANCE EN TIEMPO
Tiempo Total Transcurrido ……...123 días
Avance Porcentual según plazo inicial……4.66%

AVANCE FINANCIERO
Inversión contratada…… $ 5.106.990.466,00
Inversión Ejecutada en el Periodo……$ 241.791.699,00

Porcentaje Ejecutado en el Periodo…… 40 %

1.3.1 Estado y Avance Presupuestal del Proyecto ***INTERVENTORIA***

Valor inicial del contrato…… $ 423.394.860.00
Valor adicional del contrato……... $ 00.00
Valor total del contrato……..…$ 423.394.860.00
Valor del anticipo……..…$ 194.761.635,60
Porcentaje de anticipo…… 46%

AVANCE FISICO REAL

Avance Físico Mensual……3,74%
Avance Físico Acumulado…… 8,47%

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

De acuerdo con la programación inicialmente presentada, el avance físico supera lo programado.

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA
Avance 3,74%

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total de Obra…….. 365 días
Tiempo Total Transcurrido ……123 días
Tiempo Total que les queda……242 días
Avance Porcentual según plazo inicial……...33,7%
Porcentaje restante en tiempo ……66,30%

AVANCE FINANCIERO
Inversión contratada…… …… $ 423.394.860.00
Inversión Ejecutada en el Periodo……...$ 194.761.635,60
Porcentaje Ejecutado en el Periodo……..& 46 %
Inversión Total Ejecutada……..$ 194.761.635,60

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

- El contratista sigue cumpliendo con las indicaciones solicitadas por esta interventoría. Se espera que en el transcurso de este mes se haga entrega de detalles de planos pendientes.

- El despacho de la tubería por parte del ente contratante ha sido muy aceptable, no se han presentado perdidas de tiempo ni de materiales a la vez el contratista también ha desarrollado aceptable la compra de los accesorios en forma puntual sin generar retraso en obra.

1.5. Estado de cronograma de obra

El cronograma de actividades de obra y flujo de inversión refleja el avance en el desarrollo de las actividades donde se aprecia claramente un ligero pero significativo porcentaje de ejecución a favor del 8,47 acumulado.

Esta interventoría considera que el cronograma presentado es lo suficientemente claro y que de no presentarse alguna eventualidad cumpliría con el desarrollo de la obra en el tiempo allí estipulado.

El porcentaje (%) de avance de obra programado es del 3.74%

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)	-	-	-	$ 2.042.796.186,40
Acta parcial N°1	15/abril/2023	$ 241.791.699	$ 96.716.680	$ 145.075.019
TOTALES		$ 241.791.699	$ 96.716.680	$ 145.075.019

Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 5.106.990.466,00	-	$ 5.106.990.466,0	241.791.699,00	4.865.198.767
2.1.1. Estado Financiero del Contrato DE INTERVENTORIA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha**	**Valor Acta**	**Amortización**	**Valor pagado**
Anticipo (46%)	**-**	-	-	$194.761.635,6
$194.761.635,60				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 423.394.860'.00	-	$ 423.394.860	194.761.635,60	228.633.224-

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Representante legal: Javier Leonardo Valderrama Gutiérrez
Ingeniero Director de obra: Néstor Yair Ávila Herrera
Ingeniero Residente de Obra: Anderson Leander Villota Martínez
Profesional sisoma: Lida Vanessa Suarez Ortiz

Personal mano de obra

Maestro: Vitelio galindo flores
Oficial de obra: Serafín duarte esterlín
Oficial de obra: Álvaro Bermeo Chávez
Operador: Wllintong bustos muños
Ayudante: Gerardo Pérez Barreiro
Ayudante: Carlos Bermeo Chávez
Ayudante: Benjamín Rodríguez
Ayudante: Cristian Fernando Alarcón bolaños

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Interventor

Representante legal: Mabel Yesenia Sierra Aguillón
Ingeniero Director: Adrián Rodrigo Cabezas Peña
Ingeniero residente: Francy Andrea Galindo Soto
Ingeniero Hidráulico: Oscar Orlando Méndez Buitrago
Ingeniero Estructural: Andrés Felipe de Jesús Muños Cuellar
Sisoma: Norma Constanza Díaz Sánchez

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

No se han presentado más modificaciones a la fecha solo el cambio de la tubería descrito en el mes anterior donde se avaló el cambio de tubería de RDE21 a presión de trabajo de 200 psi, teniendo en cuenta que ambas referencias manejan la misma presión de trabajo 200 psi; al igual que la tubería de RDE26, correspondientes a 160 psi respectivamente como se puede ver en acta de justificación técnica cambio de descripción de tubería.

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Durante el mes de abril se continua con la instalación de la tubería de 8 pulgadas donde se contemplan las actividades de excavación, cama de arena, instalación de tubería, tape de brecha con material de la misma excavación y retiro de sobrantes

Se continua en espera de que entreguen planos de implementación y localización de todas las estructuras del sistema de acueducto,

3.3. Cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones

La interventoría SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS viene realizando revisiones a los diseños presentados por la entidad contratante en cumplimiento de las obligaciones contractuales cuyo objeto del contrato es EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, evidenciando que se cumplan las especificaciones técnicas y de diseño estipuladas en el contrato.

Es obligación de la interventoría velar por el buen cumplimiento de las normas específicas para la construcción de la obra, para ello se basa en la reglamentación, planos y diseños aprobados y se rige en el cumplimiento de los mismos.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

N/A en este periodo

En el periodo de este informe no se han realizado laboratorios, teniendo en cuenta que las actividades que se han realizado en el frente de obra de la línea de conducción no lo a requerido.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

N/A en este periodo

4.3. Comentarios y Conclusiones

Se continua con la instalación de la tubería de 8”, las lluvias permanentes en la región han ocasionado cese parcial de actividades, pero no han sido impedimento para la ejecución de la misma.

4.4. Comité de Obra		
Fecha de Realización	**Lugar**	**Resultado del Comité**
17/04/2023	Aguas del Huila- Neiva	Se presenta propuesta para modificación de dimensiones y accesorios a instalar para cajas de purgas y ventosas en la línea de aducción. Definir si la nueva PTAP se construirá enterrada, semienterrada o superficial por análisis del diseñador hidráulico. Revisar niveles para construcción del nuevo tanque de almacenamiento. Se presentará propuesta por parte de UT PMA SUAZA. Se presentará propuesta para ver la viabilidad de realizar un tratamiento completo de manera independiente a la Ptap existentes Se definió que se puede iniciar la construcción del tanque de almacenamiento, manteniendo el nivel de acceso de agua, igual al tanque existente.

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

El día 10 de abril, el contratista de obra radica respuesta mediante oficio, UT_**AT_217_014_2023,** el cual se encuentra dando cumplimiento con la implementación e instalación de los elementos de seguridad, emergencias y punto ecológico requeridos para el proyecto para su correcta ejecución.

Se anexa evidencia en Oficio de respuesta.

_____

El día 28 de abril de presente año se le solicita al contratista de obra mediante oficio **C.E 2023-020,** entrega de:

- Fuentes de suministro de materiales pétreos y agregados, previa verificación de licencias ambientales y/o permisos de las autoridades competentes.
- La licencia ambiental o título minero.
- Registro único de comercializadores de minerales.

El día 28 de abril del presente año se radica solicitud al contratista de obra, mediante oficio **C.E 2023-021** Solicitando certificación o constancia de disposición final del retiro de material sobrante de excavación.

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

Durante la instalación de la tubería fueron averiadas algunas tuberías del acueducto veredal, las cuales fueron reparadas en forma inmediata, como también sobre la vía se vio afectada la tubería de gas siendo atendida por los empleados de la entidad sur gas.

5.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

Las actividades que se realizaron son las siguientes:

- Localización y replanteo de la línea de conducción.
- Excavaciones manuales
- Instalación de la cama de arena
- Instalación de tubería de 8” biaxial
- Tape de brecha con material de la excavación
- Tape de brecha con recebo.

PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Cumplimiento de las normas de seguridad Industrial

Manejo de trafico



Paleteros en la Vía de instalación línea de conducción de 8”

Elementos de Seguridad y Emergencia



Camilla de Emergencia, botiquín de Emergencias y Extintor de seguridad

Cumplimiento y buen uso de los elementos de protección personal



Cumplimiento de Epp



Supervisión de Interventoría

Señalización Preventiva implementada en obra



Inicio de Obra



Maquinaria en la vía



Señalización Tubular



Obreros en la vía



Banderero



Señalización Tubular

Disposición final de residuos. Se esta reutilizando cualquier tipo de residuo ya sean escombros o desperdicio de material en un sistema adecuado de recolección o lugares certificados para la disposición final.

En el informe de gestión HSEQ, se evidencia toda la gestión echa por el contratista que comprende, charlas ocupaciones, inducciones, entrega de elementos de protección personal, pausas activas, preoperacionales, inspecciones.

Todo el personal de mano de obra no calificado se encuentra debidamente afiliados a seguridad social.

El contratista presenta el PMA (Plan de manejo Ambiental), que fue aprobado por esta interventoría.

El contratista presenta el plan de contingencia ambiental, el cual fue aprobado y avaluado por esta Interventoría.

El contratista presenta el plan de seguridad y salud en el trabajo, el cual fue revisado y avalado por esta interventoría.

El contratista presenta el plan de gestión de calidad el cual fue revisado y avaluado por la interventoría.

Se realizan jornadas de limpiezas de obra de los sitios donde se vienen desarrollando actividades de obra.

Se anexan en el presente informe la seguridad social tanto de interventoría como de contratista de obra.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA MES DE ABRIL

 Instalación de tubería de 8”	 Instalación de tubería de 8”
 Instalación de arena para protección de tubería	 Instalación de arena para protección de tubería
 Relleno sobre zanja de la línea de conducción	 Compactación sobre zanja de la línea de conducción

 Instalación de uniones pasantes en línea de conducción de 8”	 Reparaciones de tubería de gas y agua
 Descargue de Material de Playa arena	 Señalización en la Vía

 Supervisión de Interventoría	 Supervisión de Interventoría

 Tubería para realizar encofrado en concreto	 Tubería para realizar encofrado en concreto
 Paisajeo y retiro de sobrantes mecánico de 0 a 5 km	 Paisajeo y retiro de sobrantes mecánico de 0 a 5 km

 Valla informativa del contrato	 Valla informativa del contrato

 Tubería recibida de parte de aguas del huila 13 abril- 90 tubos	 Tubería recibida de parte de aguas del huila 13 abril- 90 tubos
 Acopio de tubería 24 abril- 93 tubos	 Verificación por parte de la interventoría de la tubería recibida

FIRMA INTERVENTORIA
R.L. MABEL YESENIA SIERRA AGUILLON
SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S

ANEXO 1 (PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA)

ANEXO 2 (CORRESPONDENCIA ENVIADA)

ANEXO 3 (ACTA DE COMITÉ)

ANEXO 4 (INFORME CONTRATISTA DE OBRA)

ANEXO 1 (PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA)

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900993178	7	SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 16 N 31 10		8645656			SOLSERVING@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26511265	E	2023-05-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.065.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	26511265	2023-05-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1082804363	BOHORQUEZ AVILES ADRIANA	1.260.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.260.000	201.600	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.260.000	50.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.260.000	50.400	1.260.000	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	309.000	S	5439004
2	CC 79781886	CABEZAS PEÑA ADRIAN RODRIGO	3.412.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.412.500	546.000	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	3.412.500	136.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.412.500	136.500	3.412.500	237.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.056.600	S	5429001
3	CC 1075311823	CALDERON MUÑOZ PABLO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.374.479	220.000	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.374.479	55.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.374.479	55.000	1.374.479	95.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	425.700	S	5439004
4	CC 83237502	CAMACHO OSSA JOSE WILLIAM	1.800.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.040.000	326.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.040.000	81.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.040.000	81.600	2.040.000	142.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	631.600	S	5439004
5	CC 1075260118	CARRILLO LOZANO GIORDANO	1.450.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.450.000	232.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.000	58.000	1.450.000	7.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	355.600	S	1711001
6	CC 1075283803	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.460.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.460.000	233.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.460.000	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.460.000	58.400	1.460.000	7.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5439001
7	CC 83248244	CRUZ ROJAS AMADEO	1.300.000	F	X								X							0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	855.834	137.000	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	855.834	34.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	855.834	34.300	855.834	59.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	265.200	S	5439000
8	CC 55179280	DIAZ SANCHEZ NORMA CONSTANZA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5429001
9	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5439004
10	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.100.000	84.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.100.000	84.000	2.100.000	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.200	S	5429001
11	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA YIVI MAGALI	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S.S.A. MOV-EPS041	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	392.400	S	5439004
12	CC 1130744004	MENDEZ BUITRAGO OSCAR ORLANDO	2.535.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.535.000	405.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.535.000	101.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.535.000	101.400	2.535.000	176.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	784.900	S	5429001
13	CC 1075254094	MUÑOZ CUELLAR ANDRES FELIPE DE JESUS	2.535.000	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.535.000	405.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.535.000	101.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.535.000	101.400	2.535.000	176.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	784.900	S	5429001
14	CC 1075284419	PERDOMO BOLIVAR NANCY VIVIANA	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	343.400	S	5439004
15	CC 1007499097	RODRIGUEZ VASQUEZ YESSICA LORENA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	5439004
16	CC 12119056	ROMERO SEGURA LUIS ALBERTO	1.500.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.630.469	260.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.630.469	65.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.630.469	65.300	1.630.469	113.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	505.000	S	5439004
17	CC 1014223303	SIERRA AGUILLON MABEL YESENIA	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1711001
18	CC 1007301201	SOLANO GUEVARA ANDRES FELIPE	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.694.063	271.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.694.063	67.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.694.063	67.800	1.694.063	118.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.700	S	5439004

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
19	CC 7731925	TRUJILLO CASTAÑO JHON DEVINSON	2.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.318.750	371.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.318.750	92.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.318.750	92.800	2.318.750	161.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	718.000	S	5439004
20	CC 80216745	URREA ROZO OMAR RODRIGO	3.150.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.150.000	504.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.150.000	126.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.150.000	126.000	3.150.000	16.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	772.500	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900993178	7	SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 16 N 31 10		6645656			SOLSERVING@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26511265	E	2023-05-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.065.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	26511265		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
38.816.095	38.816.095	38.816.095	38.816.095	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				20	6.210.800	0	0	0	6.210.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.944.500	0	0	0	1.944.500
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.713.600	0	0	0	1.713.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	645.600	0	0	0	645.600
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.907.100	0	0	0	1.907.100
EPS(Administradoras: 4)				20	1.552.900	0	0	0	1.552.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	65.300	0	0	0	65.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	934.600	0	0	0	934.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	64.000	0	0	0	64.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	489.000	0	0	0	489.000
ARP(Administradoras: 1)				20	1.748.400	0	0	0	1.748.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	20	1.748.400	0	0	0	1.748.400
CCF(Administradoras: 1)				20	1.552.900	0	0	0	1.552.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	20	1.552.900	0	0	0	1.552.900
Gran Total					11.065.000	0	0	0	11.065.000

ANEXO 2 (CORRESPONDENCIA ENVIADA)

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Construcción de obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, transporte de carga.
Nit: 900.993.178-7

C.E 2023-020

Neiva, 28 de abril de 2023.

Señores:
UNION TEMPORAL PMA SUAZA
ING. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA.
R.L. CONTRATISTA

Ref.: **"CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Asunto: **Solicitud Documentación Materiales de cantera.**

Cordial Saludo,

En acuerdo con las actividades de seguimiento y control desarrolladas por esta interventoría, que se enmarcan dentro del alcance técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social y jurídico de la misma, nos permitimos por medio del presente solicitar los siguientes documentos:

- ✓ Fuentes de suministro de materiales pétreos y agregados, previa verificación de licencias ambientales y/o permisos de las autoridades competentes.
- ✓ La licencia ambiental o Título Minero.
- ✓ Registro Único de Comercializadores de Minerales.

Agradecemos la atención prestada.

Recibido: Lina Martinez
Fecha: 28 de abril 2023
Hora: 12:30 pm

Atentamente,

ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA.
DIRECTOR INTERVENTORIA 218 de 2022.

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Construcción de obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, transporte de carga.
Nit: 900.993.178-7

C.E 2023-021

Neiva, 28 de abril de 2023.

Señores:
UNION TEMPORAL PMA SUAZA
ING. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA.
R.L. CONTRATISTA

Ref.: "**CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**"

Asunto: **Certificado de disposición final de residuos sobrantes de excavación.**

Cordial Saludo,

En acuerdo con las actividades de seguimiento y control desarrolladas por esta interventoría, que se enmarcan dentro del alcance técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social y jurídico de la misma, nos permitimos por medio del presente solicitar certificación o constancia de la disposición final del retiro de material sobrante de excavación del contrato en mención.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

Recibido: Lina Patiñez
Fecha: 28 de abril. 2023
Hora: 11:30 am

ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA.
DIRECTOR INTERVENTORIA 218 de 2022.

Dirección: Calle 35 Sur 3 19 - Zona Industrial El Cortijo
Teléfono: 3202658952 solserving@gmail.com
Neiva - Huila

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

UT_AH_217_014_2023

10 de abril de 2023

Señores:
SOLVERING CONSTRUCCIONES S.A.S.
ING ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Interventor

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Respuesta de oficio C.E 2023-016

Respetados señores,

Atendiendo al oficio C.E 2023-016 me permito informar que el contrato de obra **No. 217 DE 2022** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"** se encuentra dando cumplimiento con la implementación e instalación de los elementos de emergencias y punto ecológico requeridos para el proyecto tal como se muestra continuación:

Adecuación de primeros auxilios	Punto ecológico
	

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

14-04-23

Proyecto: _____
Anderson Villota Martínez
Residente de Obra
C.C. Esperanza Ortiz Martínez - Subgerente Técnico y Operativo – Aguas del Huila, info@aguasdelhuila.gov.coYesid Rojas Peña – Supervisor de proyecto – Aguas del Huila, yesid.ingetecnica@aguasdelhuila.gov.co

ANEXO 3 (ACTA DE COMITÉ)

aguas del huila

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE COMITE TECNICO
VESION 5,0

ACTA DE COMITE

Fecha:	Dia	Mes	Año
	17	4	2023

Lugar: AUDITORIO DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

1. GENERALIDADES

Objeto del Comite: "COMITÉ TECNICO SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Motivo de la Reunion

				Presentada Por:	
Queja		Soliciud	Escrita	x	Comunidad	
Hallazgo			Verbal		Alcaldia	
Acuerdo					Derecho de Peticion	
					Empresas de Servicios Publicos	

3. OBJETIVO DE LA REUNION

Estado de ejecución y seguimiento del contrato de obra No. 217 DE 2022.

Avance de Obra en Tiempo:

Presentación por parte del ingeniero Residente Andersan Villota del avance de obra. Actividades ejecutadas Localización y replanteo de redes para la linea de conducción desde el desarenador hasta la ptap existente.

- Excavación manual a todo costo.
- Retiro de Material sobrante
- Relleno con material seleccionado de la misma excavación.
- Relleno con recebo para mejoramiento de la zanja sobre la via.
- Instalación de 2.502m de tubería PVC D=8

Temas tratados por Andersan Villota:

- Empalme y/o conexión a desarenador existente, definir como se hara conexión de by pass para poner funcionamiento la nueva linea de conducción de 8".
- Modificación en las dimensiones de las cajas de concreto para purga y ventosa. Construcción de caja para purga.

4. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA EL CONTRATISTA Y LA COMUNIDAD

- Revision por parte del diseñador hidraulico para contemplar propuesta del contratista UT PMA SUAZA. Realizar Analisis Hidraulico.
- Detalle de la nueva ptap a construir enterrada, semi enterrada o superficial. por analizar del diseñador hidraulico.
- En el recibimiento puede aumentar el caudal a tratar.
- Revisar Niveles para construcción del nuevo tanque de almacenamiento.

- Realizar Balance para determinar posibles propuestas por UT PMA SUAZA.
- Se puede iniciar con la construcción del nuevo tanque de almacenamiento

7. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

(1) Se presentara propuesta para modificación de dimensiones y accesorios a instalar para cajas de purgas y ventosas en la linea de aduccion.

(2) Se presentara propuesta de los pases y empalme de la aduccion al desarenador existente.

(3) Todos los pases sobre causes se realizaran mediante encofrado de la tubería (Subfluvial)

(4) Se autoriza modificar caja de valvulas de entrada y salida del tanque, asi como los accesorios a suministrar. Se presentara propuesta por parte de la UT. De igual manera los cajas de lavado y rebose.

(5) Se presentara propuesta para ver viabilidad de realizar un tratamiento completo, de manera independiente a la ptap existente.

(6) Se define que se puede iniciar la construccion del tanque, manteniendo el nivel de acceso de agua, igual al del tanque existente.

7) Se tiene pendiente el suministro por parte del contratante del diseño de la red de distribucion a construir.

Firmado en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2023,

se anexa lsitado de asistencia

aguas del huila
...llevamos más que agua.


AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2


PLANILLA DE ASISTENCIA
VERSIÓN: 5.0


FECHA: 17 DE ABRIL DE 2023
HORA: 03:00 P.M.
LUGAR: AUDITORIO AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.
TEMA: COMITÉ TECNICO SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022 "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C	CARGO	MUNICIPIO	NUMERO TELEFONICO	EMAIL	FIRMA
1	Leonardo Valderrama	79.957.561	R.L. UT Suaza		3138925432	l.valderrama@envical.co	
2	Anderson Ovalles	1218848	RL. Soplenka		3132078555	anderson.ovalles@yahoo.es	
3	Juan Camilo Montiquis S.	1.075.261.418	Ing. Ambiental		320 4221731	juanco_21 92@hotmail	
4	ADRIAN R. CABEZAS	77.178.886	Ing. Civil		3118093146	adrian.cabezas.p@gmail	
5	Andres Vileta	1813543	Ing Civil		3124981774	Utpmasuaza@gmail.com	
6	Esperanza Ortiz M	26558.633	Sub tecnico		3158611364		
7	Yeison Rojas P	12.288.1			3124802716		
8							
9							

REGISTRO FOTOGRAFICO

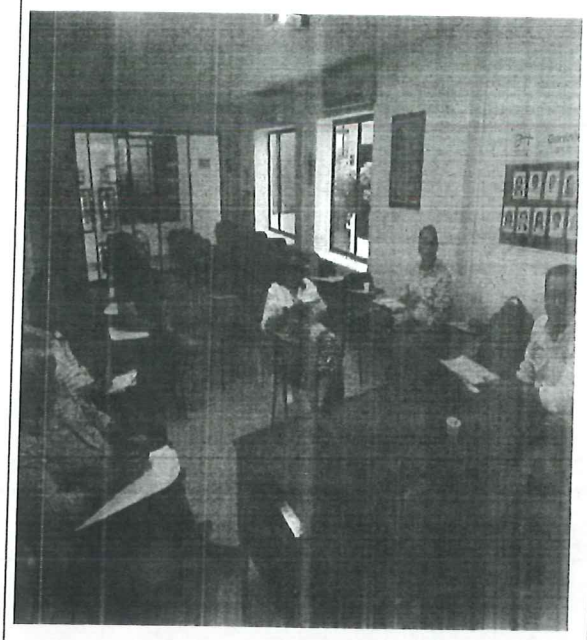

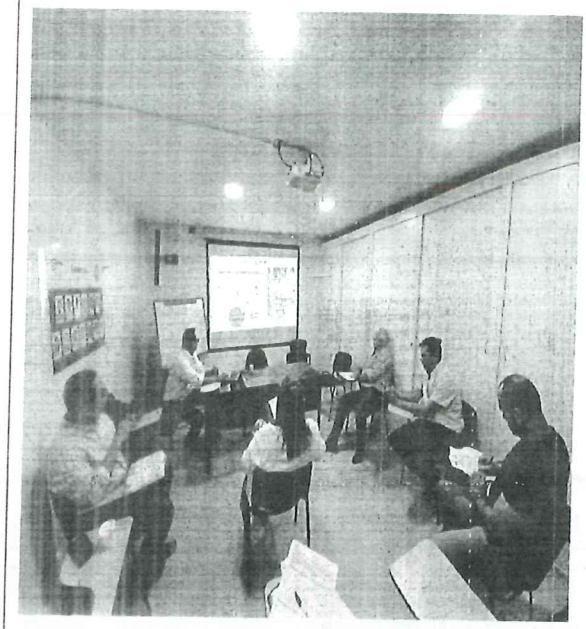

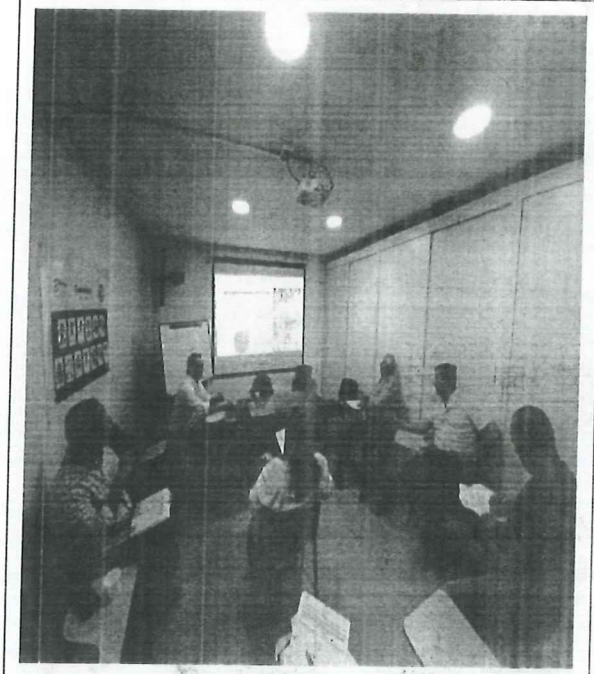



ANEXO 4 (INFORME CONTRATISTA DE OBRA)
