1. FECHA ELABORACIÓN:	4	6	2023	2. No. INFORME	13	3. SEMANA No.	13
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	29/05/2023 AL 04/06/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	81,00%	2,92%	32,00%	1,16%	-49,00%	-1,77%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	3,00%	0,98%	9,13%	2,98%	6,13%	2,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	14,15%	6,27%	10,86%	6,50%	-3,30%	0,23%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	9,27%	14,00%	-4,73%
Durante el periodo	1,59%	0,15%	1,44%
Acumulado Actual	10,86%	14,15%	-3,29%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,65%	6,27%
Valor de la Obra Programada	$ 17.099.770,11	$ 164.796.962,54

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,39%	6,50%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 89.116.578,71	$ 170.849.366,69

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

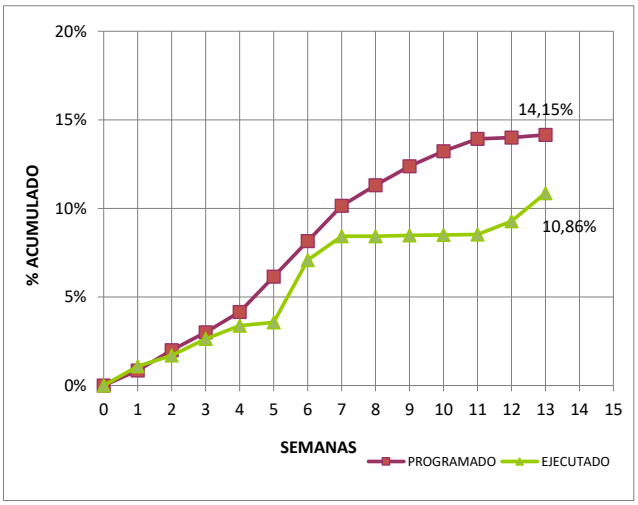

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	8	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	F
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR	1	JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se ha dificultado el inicio de actividades por las fuertes lluvias que se han presentado en las noches, ya que el terreno queda totalmente colmatado.
2. Se continúa la actividad de excavación manual de las zapatas y los contrapesos.
3. Se realiza instalación de concreto de limpieza (solado) en zapatas terminadas.
4. Se realiza bombeo y evacuación de agua empozada en el área de trabajo.
5. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades ejecutadas se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
6. Ingresa material petreo, cemento y acero figurado a la obra.
7. Se realiza verificación de niveles por parte del maestro de obra y la interventoría.

Observación: Hasta el día 31/05/2023 La obra no presentó el avance esperado según PDT, dado a que se encontraba a la espera del permiso por parte de la CAS para intervenir la Ceiba. Esto afectó directamente el inicio de las actividades de cimentación en el área de influencia del árbol.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Se realiza comité semanal de obra, donde se levanta acta y se plasman los temas tratados y compromisos surgidos.
2. Se realiza el estudio de las hojas de vida del personal postulado en la plataforma CAFABA.
3. Ingresan un (1) oficial de obra.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Se realiza cambio y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Por parte de interventoría se realiza inspección del estado de los EPP's y herramientas de los trabajadores.
4. Se realza jornada de orden y aseo en todas las áreas de trabajo.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo no se realizaron actividades del componente ambiental
2. Se firma la resolución por parte de la CAS para el aprovechamiento forestal de la CEIBA.
3. El 31/05/2023 inicia la tala de la Ceiba por parte del equipo de poda de la secretaría de infraestructura.
4. Se realiza cargue y retiro de material sobrante hacia disposición final.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	4 / 6 / 2023	No. INFORME	13	SEMANA No.	13
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 29 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual de zapatas.



FECHA FOTO: 30 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante.



FECHA FOTO: 31 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Pausa activa por parte del profesional HSE.



FECHA FOTO: 31 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación de zapatas y retiro de material.



FECHA FOTO: 01 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Llegada y descargue de acero figurado.



FECHA FOTO: 02 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Tala de la Ceiba por el equipo de poda de la secretaría de infraestructura.
