INFORME DE AVANCE DE OBRA DEL 2 MES

FECHA. 23 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATANTE: *ALCALDÍA DE MOCOA*

Alma Corazón y Vida

Alcaldía de Mocoa

OBJETO: *MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.*

CONTRATISTA: *CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S.*
(R/L LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ)
Contratista de obra.

INTERVENTORÍA: *JAIME HERNANDO JAJOY CHINDOY.*
Contratista de INTERVENTORÍA.

SUPERVISOR: *Ing. JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS*
Secretario de Obras e Infraestructura y gestión del riesgo de desastres Municipal


ABRIL-2023

1.0 INFORMACIÓN GENERAL.

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.

2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Localización del proyecto:

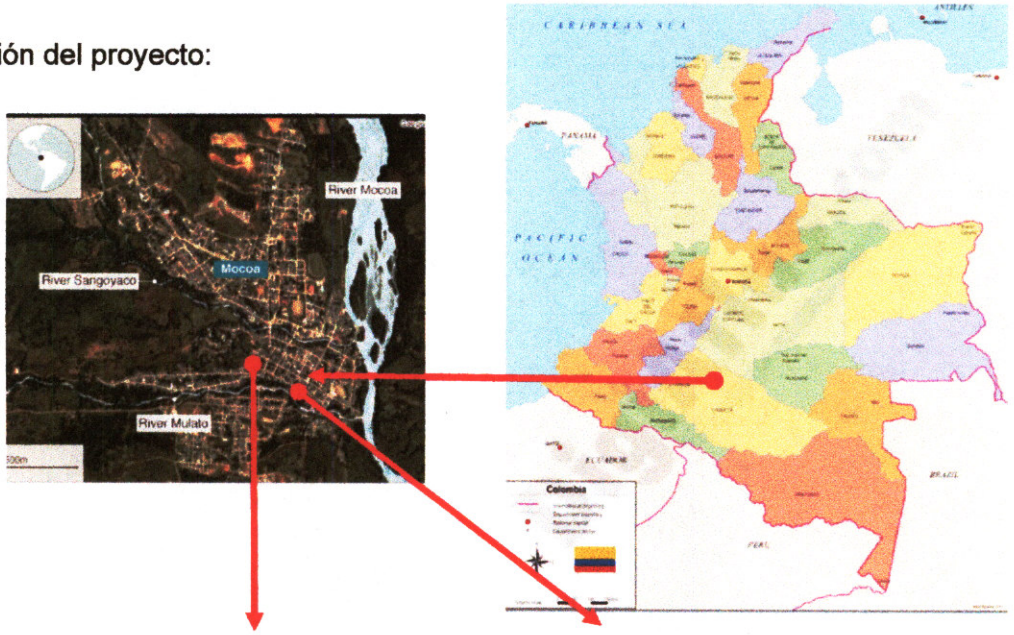



Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

El proyecto busca el "***MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.***", ya que, por factores climáticos, y tráfico vehicular la vía se encuentra en mal estado. Para la cual se hace necesario su pavimentación la cual contempla las siguientes actividades.

1.0 PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
2.0 EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS
2.1 EXCAVACIÓN A MAQUINA
2.2 DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO
2.3 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES
3.0 ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR
3.2 PEDRAPLÉN
3.3 SUBBASE GRANULAR
3.4 PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2
3.5 ACERO DE REFUERZO
3.6 JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO
3.7 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI
3.8 RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN
4.0 ALCANTARILLADO PLUVIAL
4.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
4.2 SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO
4.3 CÁMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M
4.4 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO
4.5 ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN
4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"
4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 20"
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)
PLAN DE ATENCIÓN COVID 19

3.0 INFORMACIÓN CONTRATOS OBRA

CONTRATO DE OBRA	No 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
NIT/CC.	R/L LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ
CONTRATANTE	900.764.492-3
OBJETO	MUNICIPIO DE MOCOA
Valor	MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.
PLAZO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($847.698.464) MDA. CTE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION:	21 DE FEBRERO DE 2023

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

4.0 RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA.

GENERALIDADES

La alcaldía del municipio de Mocoa putumayo contrato con la empresa jurídica CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S cuyo representante legal es el ING. LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ el contrato de obra No 367 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO. dentro del cual existen los ítems contratados que se relacionan a continuación.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT.
1,00	**PRELIMINARES**		
1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	M2	1.581,74
2,00	**EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**		
2,10	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	840,76
2,20	DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO	M2	1.581,74
2,30	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1.295,45
3,00	**ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**		
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	2.304,72
3,20	PEDRAPLÉN	M3	454,76
3,30	SUBBASE GRANULAR	M3	316,73
3,40	PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2	M3	284,72
3,50	ACERO DE REFUERZO	KG	4.663,12
3,60	JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	292,30
3,70	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	338,64
3,80	RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN	UN	4,00
4,00	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**		
4,10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	34,09
4,20	SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO	UN	5,00
4,30	CÁMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M	UN	3,00
4,40	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	107,72
4,50	ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN	M3	19,41
4,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"	ML	30,00
4,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 20"	ML	90,32

AVANCE FÍSICO EN EL MES

El avance físico por actividades ejecutado en este mes corresponde según lo registrado en este mes al tramo No 02 localizado en CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 8 FRENTE A GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO:

ACTIVIDAD		UN	CANT CONTRATADA	MES 1	MES 2	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
				CANT EJEC	CANT EJEC	
1,0	**PRELIMINARES**					
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1365,28	916,80	0,00	57,96%

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

	ACTIVIDAD	UN	CANT CONTRATADA	MES 1	MES 2	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
				CANT EJEC	CANT EJEC	
2,0	**EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**					
2,1	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	840,76	412,57	0,00	49,07%
2,2	DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO	M2	1.581,74	916,80	0,00	57.96%
2,3	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1.295,45	730,25	0,00	56,37%
3,0	**ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**				0,00	
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	2.304,72	916,82	0,00	39,78%
3,20	PEDRAPLÉN	M3	454,76	229,23	0,00	50,41%
3,30	SUBBASE GRANULAR	M3	316,73	183,35	0,00	57,89%
3,40	PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2	M3	284,72	0,00	165,03	57,96%
3,50	ACERO DE REFUERZO	KG	4.663,12	0,00	4.249,69	91,13%
3,60	JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	292,30	0,00	237,33	81,19%
3,70	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	338,64	0,00	75,26	22,22%
3,80	RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN	UN	4,00	0,00	1,00	25,00%
4,0	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**					
4,10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	34,09	0,00	6,23	18,28%
4,20	SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO	UN	5,00	0,00	1,00	20,00%
4,30	CÁMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M	UN	3,00	0,00	0,00	0,00%
4,40	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	107,72	0,00	2,09	1,94%
4,50	ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN	M3	19,41	0,00	0,91	4,69%
4,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"	ML	30,00	0,00	9,10	30,33%
4,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 20"	ML	90,32	0,00	0,00	0,00%

AVANCE PROGRAMADO EN EL MES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	SEGUNDO MES EJECUCIÓN OBRA	
1,0	**PRELIMINARES**					CAN EJECU	VALOR EJECUTADO
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1.581,74	$ 3.137,000	$4.961.918,00	0,00	$ 0,00

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	SEGUNDO MES EJECUCIÓN OBRA	
1,0	PRELIMINARES					CAN EJECU	VALOR EJECUTADO
2,0	EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS						
2,10	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	840,76	$ 24.190,000	$ 20.337.984,00	0,00	$ 0,00
2,20	DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO	M2	1.581,74	$ 48.428,000	$ 76.600.505,00	0,00	$ 0,00
2,30	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1.295,45	$ 34.682,000	$ 44.928.797,00	0,00	$ 0,00
3,0	ESTRUCTURA PAVIMENTO						
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	2.304,72	$ 14.366,000	$ 33.109.608,00	0,00	$ 0,00
3,2	PEDRAPLEN	M3	454,76	$ 110.517,370	$ 50.258.879,00	0,00	$ 0,00
3,3	SUBBASE GRANULAR	M3	316,73	$ 170.788,400	$ 54.093.810,00	0,00	$ 0,00
3,4	PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2	M3	284,72	$ 1.252.438,080	$ 356.594.170,00	165,03	$ 206.689.856,00
3,5	ACERO DE REFUERZO	KG	4.663,12	$ 11.122,000	$ 51.863.221,00	4.249,69	$ 47.265.052,00
3,6	JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	292,30	$ 18.939,150	$ 5.535.914,00	237,33	$ 4.494.828,00
3,7	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	338,64	$ 68.817,600	$ 23.304.392,00	75,26	$ 5.179.213,00
3,8	RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN	UN	4,00	$ 523.446,000	$ 2.093.784,00	1,00	$ 523.446,00
4,0	ALCANTARILLADO PLUVIAL						
4,10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	34,09	$ 34.808,000	$ 1.186.605,00	6,23	$ 216.854,00
4,20	SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO	UN	5,00	$ 2.223.513,000	$ 11.117.565,00	1,00	$ 2.223.513,00
4,30	CÁMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M	UN	3,00	$ 5.304.015,000	$ 15.912.045,00	0,00	$ 0,00
4,40	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	107,72	$ 142.790,950	$ 15.381.441,00	2,09	$ 298.433,00
4,50	ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN	M3	19,41	$ 68.963,000	$ 1.338.572,00	0,91	$ 62.756,00
4,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"	ML	30,00	$ 109.428,000	$ 3.282.840,00	9,10	$ 995.795,00
4,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 20"	ML	90,32	$ 429.544,000	$ 38.796.414,00	0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL OBRA	$ 810.698.464,00	- $ 267.949.746,00
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 16.000.000,00	$ 4.000.000,00
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 16.000.000,00	$ 4.000.000,00
					PLAN DE ATENCIÓN COVID 19	$ 5.000.000,00	$ 1.250.000,00
					VALOR TOTAL CONTRATO	$ 810.698.464,00	$ 277.199.746,00
							-
					TOTAL OBRA EJECUTADA EN EL PRIMER MES		$ 277.199.746,00
					PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MES		32.70%

CONSOLIDADO DE AVANCE DESDE FEBRERO-ABRIL

	INVERSIÓN RECURSOS	% AVANCE
AVANCE FINANCIERO PRIMER MES	$ 161.650.377,00	19,07%
AVANCE FINANCIERO SEGUNDO MES	$ 277.199.746,00	32.70%
PORCENTAJE DE AVANCE	$ 438.850.123,00	51,77%

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

CONTROL DE TIEMPO Y AVANCE DE OBRA

AVANCE DE OBRA	
PORCENTAJE EJECUTADA EN EL PERIODO FEBRERO-ABRIL	51,77%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUCIÓN	48,23%
TIEMPO TRANSCURRIDO (MESES) % EN TIEMPO	2,00 50,00%
PLAZO INICIAL MESES	4,00
TIEMPO RESTANTE % EN TIEMPO	2,00 50,00%

5.0 INFORME CONTRATO DE OBRA.

6.1 Descripción

MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.

6.2 Componentes básicos del proyecto

El proyecto consta de los siguientes capítulos iniciales los cuales a su vez se subdividen en ítems como se reporta en las generalidades del contrato de obra no 367 del 28 de octubre de 2022, con el propósito de determinar un balance económico de inversión las actividades contratadas se resumen el siguiente.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,00	**PRELIMINARES**				
1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	M2	1.581,74	$ 3.137,000	$ 4.961.918,00
2,00	**EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RETIROS**				
2,10	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	840,76	$ 24.190,000	$ 20.337.984,00
2,20	DEMOLICIONES DE PLACAS DE CONCRETO	M2	1.581,74	$ 48.428,000	$ 76.600.505,00
2,30	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1.295,45	$ 34.682,000	$ 44.928.797,00
3,00	**ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO**				
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO T2400 O SIMILAR	M2	2.304,72	$ 14.366,000	$ 33.109.608,00
3,20	PEDRAPLÉN	M3	454,76	$ 110.517,370	$ 50.258.879,00
3,30	SUBBASE GRANULAR	M3	316,73	$ 170.788,400	$ 54.093.810,00
3,40	PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2	M3	284,72	$ 1.252.438,080	$ 356.594.170,00
3,50	ACERO DE REFUERZO	KG	4.663,12	$ 11.122,000	$ 51.863.221,00
3,60	JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO	ML	292,30	$ 18.939,150	$ 5.535.914,00
3,70	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	338,64	$ 68.817,600	$ 23.304.392,00
3,80	RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN	UN	4,00	$ 523.446,000	$ 2.093.784,00
4,00	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**				

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
4,10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	34,09	$ 34.808,000	$ 1.186.605,00
4,20	SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO	UN	5,00	$ 2.223.513,000	$ 11.117.565,00
4,30	CÁMARAS DE 2X2 DESDE H=1,00M HASTA H= 1,75M	UN	3,00	$ 5.304.015,000	$ 15.912.045,00
4,40	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	107,72	$ 142.790,950	$ 15.381.441,00
4,50	ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN	M3	19,41	$ 68.963,000	$ 1.338.572,00
4,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"	ML	30,00	$ 109.428,000	$ 3.282.840,00
4,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 20"	ML	90,32	$ 429.544,000	$ 38.796.414,00
				TOTAL COSTOS OBRA	**$ 810.698.464,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 16.000.000,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 16.000.000,00
	PLAN DE ATENCION COVID 19				$ 5.000.000,00
	TOTAL PLANES				**$ 37.000.000,00**
	COSTO TOTAL OBRA				**$847.698.464,00**

6.3 Aspectos técnicos

3.0 ESTRUCTURA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

3.1 PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2

Esta actividad se ejecutó en un 57,96% y contemplo la preparación e instalación de concreto con Mr: 42 Kg/cm2 en un espesor a lo largo de la vía de 18 cm, se realizó el respectivo control en la mezcla para las fundiciones realizadas, el resultado de las resistencias obtenidas se presenta en el ANEXO-REGISTRO FOTOGRÁFICO TOMA DE MUESTRAS

3.2 ACERO DE REFUERZO:

Esta actividad fue realizando partiendo de la estructura de soporte en varilla de 6,40mm para los pasadores de 1 pulgadas, acero transversal de 5/8 pulgada y refuerzo en varilla de 1/2 pulgada para las placas irregulares, ver ANEXO- REGISTRO FOTOGRÁFICO.

3.3 JUNTAS DE EXPANSIÓN Y SU RESPECTIVO SELLADO

Actividad ejecutada en un 81.19% y contemplo la instalación del cordón de respaldo y el respectivo sellante previo corte de las placas según la modulación de placas, en la instalación de estos materiales se realizó la limpieza previa del corte a fin de mantener un adecuado proceso de instalación de los materiales.

3.4 SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI

La construcción del sardinel correspondió al encofrado y fundición de concreto de 3000 Psi, su avance correspondió a la margen izquierda subiendo por cuanto el de la

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

derecha se encontraba delimitado por el anden del parque del municipio lo cual permitió confinar las placas construidas, el avance de ejecución fue del 22.22%.

3.5 RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN

El recalce de los pozos corresponde a un avance del 25% y fue realizado a una cámara existente la cual hace parte de la red de alcantarillado del municipio.

4.0 ALCANTARILLADO PLUVIAL

4.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

Las diferentes excavaciones a mano fueron realizadas para: sumideros, tubería para sumideros. El avance en su ejecución es del 18.28%.

4.2 SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO CON REJA DE ACERO

La ejecución de este ítem corresponde a la construcción de sumidero de acuerdo con los diseños con el fin de evacuar aguas provenientes de las altas precipitaciones del sitio contempla igualmente la instalación de la rejilla. De acuerdo con lo anterior se ha cuantificado un avance en un 20%.

4.3 RELLENO MATERIAL SELECCIONADO Y ARENA DE BASE PARA NIVELACIÓN

Estas actividades contemplaron el suministro e instalación de un encamado de arena a fin de nivelar y alistar la base de cimentación de la tubería del sumidero, posterior a su alistado se llena con material seleccionado y se compacta, el avance en la ejecución de esta actividad correspondió al 1.94%. para el material seleccionado y el 4.69% para el encamado de arena.

4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"

Estas actividades se ejecutaron en un 30,33% y corresponde al desagüe de las aguas lluvias provenientes de la escorrentía que se genera de la construcción del pavimento.

6.5 Aspectos ambientales, impacto urbano

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes en relación a los aspectos ambientales, impacto urbano.

6.51 Aspectos ambientales

La obra y los ítems contratados no presentan afectaciones ambientales en el medio donde se ejecutan las obras.

6.52 Impacto urbano

En general los impactos urbanos ocasionados son mínimos y están ligados con la atenuación del mismo y se relacionan a continuación:

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

6.6 Mitigación del impacto Urbano.

En el desarrollo del contrato de obra se ejecutarán las siguientes actividades las cuales permiten mitigar el impacto urbano ocasionado hacia los pobladores:

- Manejo interno de los escombros ocasionados para el posterior retiro.
- Cerramiento con lona verde del sitio de la obra.
- Adecuaciones de pasos peatonales.
- Señalización vial.
- Implementación adecuada del plan de manejo del tránsito.
- Información y atención adecuada a los residentes de la zona

6.7 Manejo y disposición de escombros

Los escombros se dispusieron en una escombrera legalmente autorizada para recibir este tipo de material.

6.8 Seguimiento del Plan de Gestión Integrado de Salud Ocupacional, seguridad industrial.

6.81Seguridad industrial

En el desarrollo del contrato de obra el contratista dotara a los trabajadores de los implementos de seguridad (guantes, gafas, casco, y chaleco refractivo). Elementos de seguridad necesarios para la seguridad del personal.

Dotación con Implemento de seguridad en Obra



Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

6.9 Aspectos logísticos

6.9.1 Personal del contratista - organigrama



6.9.2 Equipo del contratista

Maquinaria:

- Herramienta menor.
- Mezcladora de concreto.
- Carmix
- Vibrador de concreto.
- 6 Volquetas.
- Motobomba.
- Planta eléctrica.
- Cortadora de concreto y de acero.
- Regla.
- Compactador

6.9.3 Estado del tiempo

Ver anexo la tabla de registro y control del tiempo.

6.9.4 Control de calidad

- Se consultaron de manera reiterativa y permanente los planos y documentos técnicos del proyecto.
- Se verificaron que las conexiones en las instalaciones de las redes de acueducto y alcantarillado cumplan técnicamente, para lo cual se hace necesario realizar las respectivas reparaciones y reconexiones.

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

- Se verifico en conjunto con la interventoría las distancias para la instalación de los pasadores de acuerdo con la modulación de las placas propuestas según las condiciones geométricas.
- Se realizó un seguimiento en conjunto con la interventoría de las dosificaciones y calidad de los materiales para la mezcla de concreto, se realizó un control de la cantidad de agua realizando ensayos en campo mediante el CONO SLUMP.

6.9.5 Aspectos Sociales

Las actividades desarrolladas por el contratista en relación así:

6.9.5.1 Actividades desarrolladas al inicio del contrato

Las actividades desarrolladas con el inicio de las obras se encuentran reportadas en el informe del primer mes.

6.9.5.2 Actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato

- Las actividades desarrolladas en el mes se describen en el ítem 6.3 Aspectos Técnicos.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

- La obra en el tramo No 02 presentó ajustes en el ancho a intervenir de conformidad con las condiciones técnicas encontradas en campo, ello implico una modulación de placas diferente a la contenida según las condiciones originales del proyecto, dando como resultado placas que se ajustan según normatividad.

- El avance de las actividades reportado en este informe está de acuerdo según lo programado con el inicio de las obras.

7.2 RECOMENDACIONES.

- De acuerdo con las condiciones encontradas en campo en las diferentes actividades adelantas se hace necesario proyectar ajustes de carácter técnico al proyecto por cuanto existen mayores y menores cantidades de obra, ello no implica adiciones presupuestales si no una redistribución de recursos y cantidades.

Firma:

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR
(R/L ING. LUIS CARLOS SALAS RODRIGUEZ)

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

ANEXO- REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLACA EN CONCRETO MR: 42 KG/CM2 - RECALCE POZOS DE INSPECCIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACERO DE REFUERZO



Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI



REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 10"



Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

REGISTRO FOTOGRÁFICO

TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

ANEXO- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764492	3	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	avenida san francisco	MOCOA-PUTUMAYO	4200035	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2040536030	9449632501	E	2023/04/25	2023/04/24	BANCOLOMBIA	0	$1,078,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1193597262	CUESVAS EDWIN		X																25-14	22	$850,667	$136,200	EPSIC3	22	$850,667	$34,100	CCF63	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0	SI	$263,700
2	CC	1120068599	LOPEZ ANGIE	X	X																230301	8	$309,334	$49,500	EPSIC3	8	$309,334	$12,400	CCF63	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	SI	$95,900
3	CC	1120216042	LOPEZ EULER																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	1121506227	SALAS LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	Afiliados(4)																						$3,480,001	$556,900			$3,480,001	$139,300			$3,480,001	$139,300			$3,480,001	$242,500		$0	$0		$1,078,000

2023/05/12 04:37 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764492	3	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCION	avenida san francisco	MOCOA-PUTUMAYO	4200035	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2040536030	9449632501	E	2023/04/25	2023/04/24	BANCOLOMBIA	0	$1,078,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$556,900	$0	$0	$556,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$136,200	$0	$0	$136,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$235,100	$0	$0	$235,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$242,500	$0	$0	$242,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$242,500	$0	$0	$242,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$139,300	$0	$0	$139,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$139,300	$0	$0	$139,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$139,300	$0	$0	$139,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	8	2	$46,500	$0	$0	$46,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				4	$1,078,000	$0	$0	$1,078,000

2023/05/12 04:37 PM

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		[illegible]
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			ALCIRA FERNANDA MA[illegible]Z MEJ[illegible]OZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBUNDOY DEPARTAMENTO:		PU[illegible]MAYO
DIRECCIÓN:	PROGRESO TELÉFONO:		42[illegible]03
TIPO APORTANTE:	07-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE		INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Otras actividades de servicios de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4490989261	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD.	AÑO	2023
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN		[illegible]

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8[illegible]2268	23030[illegible]	230201-PORVENIR			$ [illegible]
SUBTOTAL					$ [illegible]
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9[illegible]254	EPS03*	EPS[illegible]NUEVA EPS			$ 189.000
SUBTOTAL					$ 189.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
[illegible]1153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			$ [illegible]
SUBTOTAL:					$ 13.422

TOTAL PAGADO: $.378.200

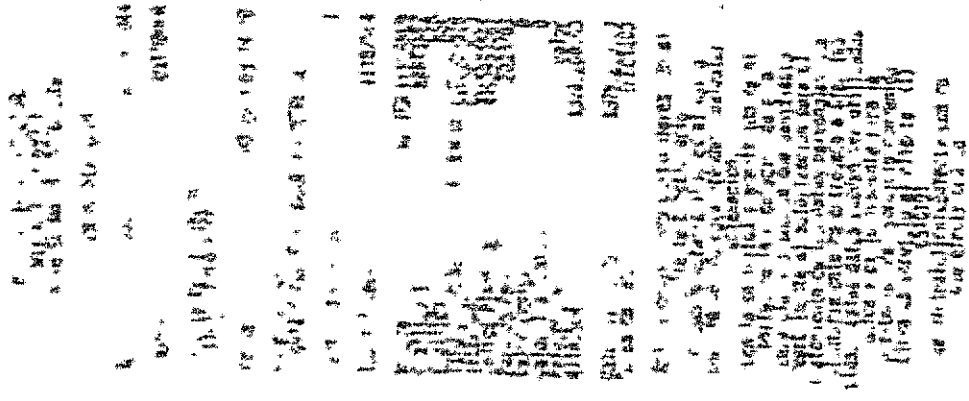

[illegible] [illegible] [illegible] [

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		41182584
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALCIRA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBUNDOY DEPARTAMENTO:		PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	PROGRESO TELÉFONO:		4280705
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE.		I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4494737753	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993984733	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
Planilla Pago			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA:				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	[redacted]		1	$ 274.500
		TOTAL:	1	$ 274.500
SALUD				
ADMINISTRADORA:				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	[redacted]		1	$ 214.400
		TOTAL:	1	$ 214.400

SOI

TOTAL PAGADO:	**$ 488.900**

Planilla Pago

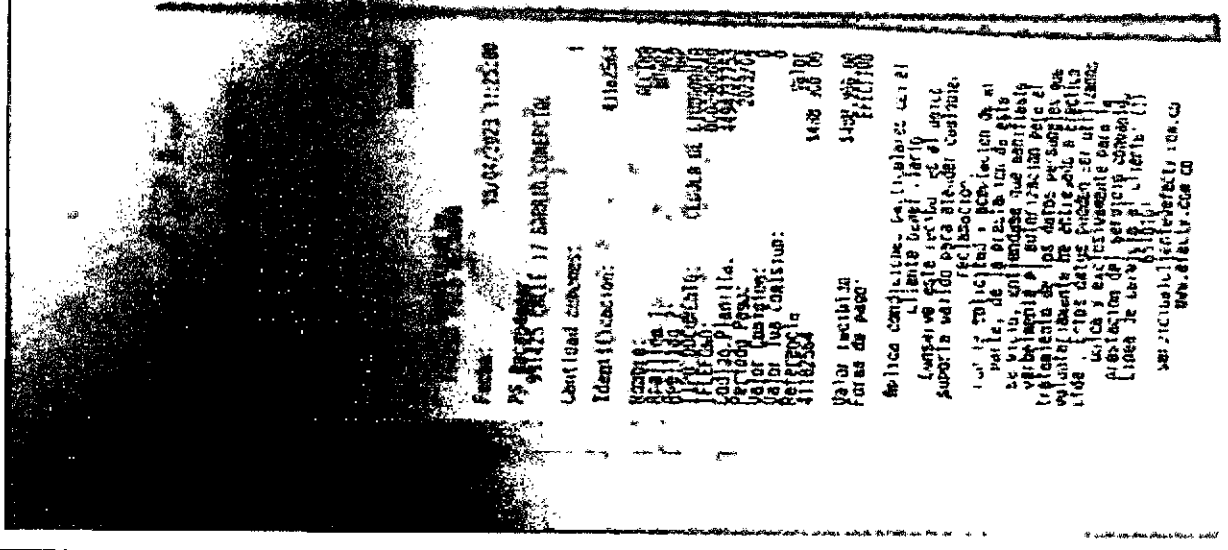

ANEXO- PÓLIZAS

Notificaciones: Email: consulyconstrujesahr@hotmail.com
Calle 14. 8 No. 10-15 B/Obrero Mocoa (P) / Cel: 3114830228

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101265469	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2023	31	01	2023	00:00	31	05	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.764.492-3
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 5 NRO 25 -39 BARRIO NUEVE DE MAYO	VILLAGARZON, PUTUMAYO	3204540712

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.891-6
MUNICIPIO DE MOCOA	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 7 N 8-42 B CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO NO 364 DE 2022, OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2023	30/11/2023	$84,769,846.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/01/2023	31/05/2026	$169,539,692.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$254,309,539.20

ACLARACIONES

ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,881,272.00	$ *****20,000.00	$ *****547,441.00	$ *********3,428,714.00	$ *******508,619,078.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CALDERON Y PADILLA CIA LTDA	4602	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101265469

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNICA 01

KAMIREZ Impresores S.A.S PBX: 311 0255 Nit. 800.350.626-1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101265469	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	31	01	2023	00:00	31	08	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	NIT: 900.764.492-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 5 NRO. 25 - 39 BARRIO NUEVE DE MAYO	VILLAGARZON, PUTUMAYO	3204540712

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA	NIT: 800.102.891-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BRR CENTRO	MOCOA, PUTUMAYO	3219686353

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0109, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S. A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO No 361 DE 2022, OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE ANEXO SE ACOGE ACTA DE INICIO DEL 21/02/2023 Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS CONFORME MENCIONADA ACTA Y SE DA EN CONOCIMIENTO QUE HAY UN CAMBIO EN EL NUMERO DEL CONTRATO QUEDANDO EN CONTRATO 367.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN Y PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,861,272.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(547,441.00)	$ *******(3,428,714.00)	$ ****(508,619,078.40)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CALDERON Y PADILLA CIA LTDA	4602	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 TELEFONO: 7226622 - PASTO.

41-44-101265469

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarama B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101265469	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	03	2023	21	02	2023	00:00	21	06	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS. IDENTIFICACIÓN NIT: 900.764.492-3

DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 25 - 39 BARRIO NUEVE DE MAYO CIUDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO TELÉFONO: 3204540712

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MOCOA IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.891-0

DIRECCIÓN: BRR CENTRO CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO 3219686353

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO No 364 DE 2022, OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/02/2023	21/12/2023	$84,769,846.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/02/2023	21/06/2026	$169,539,692.80	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS *		$254,309,539.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

CON EL PRESENTE ANEXO SE ACOGE ACTA DE INICIO DEL 21/02/2023 Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS CONFORME MENCIONADA ACTA Y SE DA EN CONOCIMIENTO QUE HAY UN CAMBIO EN EL NUMERO DEL CONTRATO QUEDANDO EN CONTRATO 367.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN Y PERMANECEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,861,272.00	$ ***20,000.00	$ ****547,441.00	$ *****3,428,714.00	$ *****508,619,078.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CALDERON Y PADILLA CIA LTDA	4602	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 18 NO. 24 - 52 TELEFONO: 7226622 , PASTO

41-44-101265469

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101047697	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2023	31	01	2023	00:00	31	05	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		NIT: 900.764.492-3
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 25 - 39 BARRIO NUEVE DE MAYO	CIUDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO	TELEFONO: 3204540712

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MOCOA		NIT: 800.102.891-6
DIRECCIÓN: CALLE 7 N 6-42 B CENTRO	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELEFONO:3219686353
BENEFICIARIO: 800102891 - MUNICIPIO DE MOCOA		

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/01/2023	31/05/2023	$464,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/01/2023	31/05/2023	$464,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	31/01/2023	31/05/2023	$464,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101047697

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OLF0046028

2

PUNICA 01

KAMIRIZ Impresores S.A.S PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1
