AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PE-F02-1-13	
		FECHA 18/05/2022	VERSIÓN 1
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 1 de 1	


NOMBRE DEL CONTRATISTA	Nelly Gómez Llanez			**IDENTIFICACIÓN**			1093735129
NÚMERO DEL CONTRATO:	**064**	**FECHA DEL CONTRATO:**	**16/01/2023**	**DEPENDENCIA**			**Subdirector de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura**
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE LIDERA LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.**						
SUPERVISOR:	**ING ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO**						
FECHA DE INFORME:	**14/06/2023**	**PERIODO DEL INFORME DESDE**	**16/05/2023**			**HASTA**	**15/06/2023**
VALOR MES COBRADO	**4.000.000,00**	**PAGO NO.**	**05**	**DE**	**9**	**% DE AVANCE**	**55,56%**
No DE PLANILLA APORTES	**7880938462**	**PERIODO PAGADO**	**Mayo/2023**				

RESUMEN DE ACTIVIDADES


1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL


ACTIVIDAD: 1. Realizar visitas técnicas a los predios y sitios dispuesto para el desarrollo de los proyectos que adelanta la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

Realizar visitas técnicas del contrato 09/2021, baterías sanitarias.

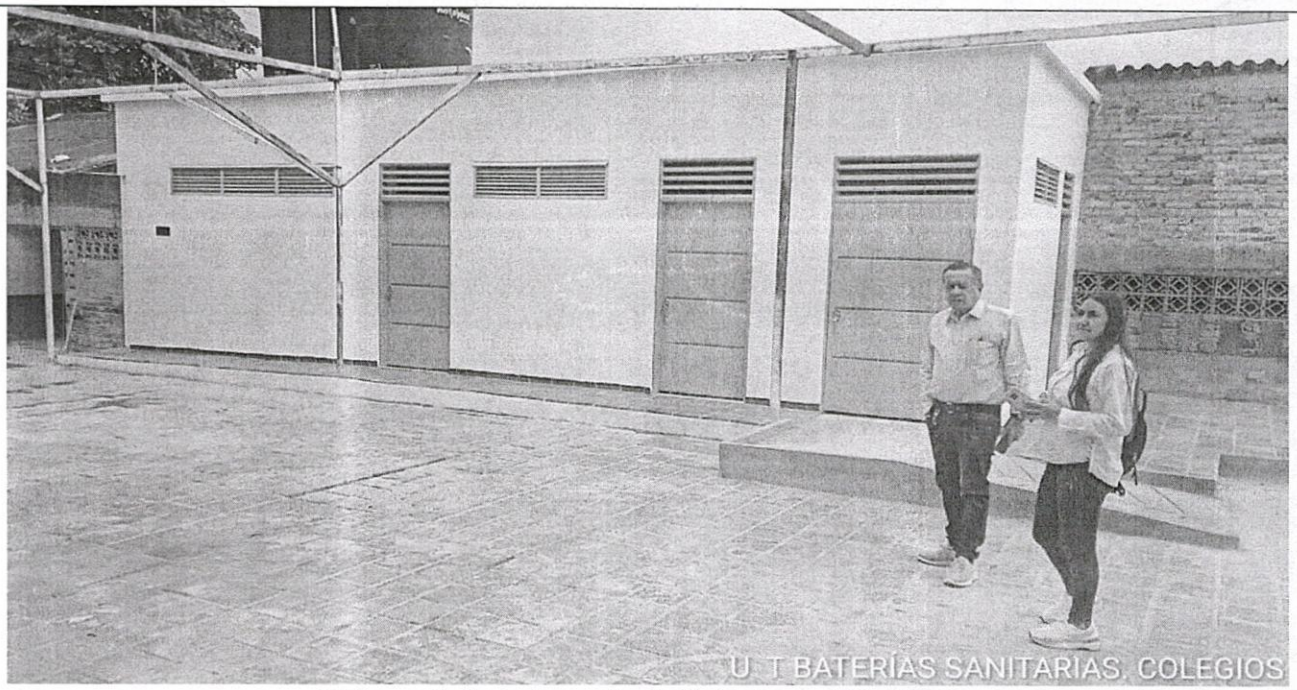

Entrega de bateria sanitaria Colegio espiritu Santo.

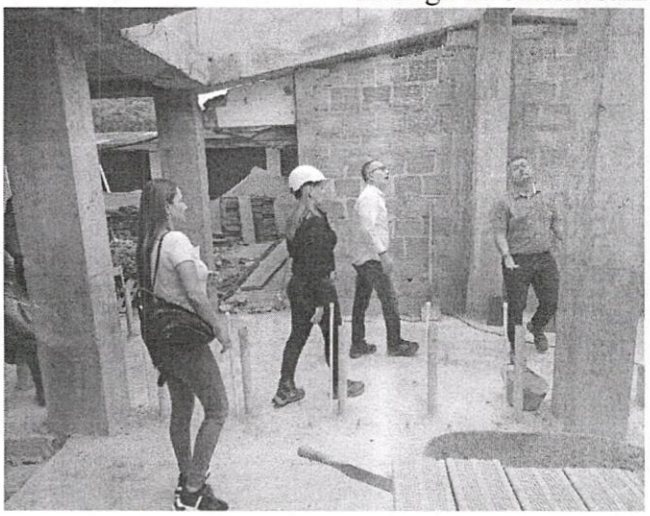





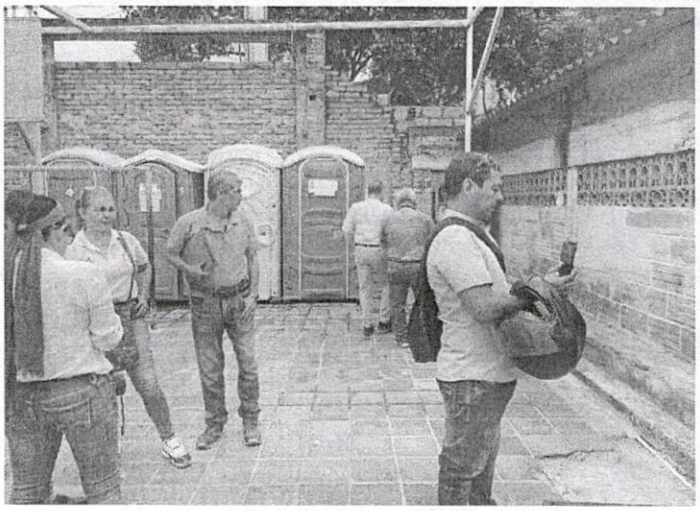







ACTIVIDAD: 2. Realizar acompañamiento a la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura en la supervisión de las obras que adelante esta dependencia.







Se realizan oficios e informes de supervisión para proyectos del contrato 09/2021.

- Informe de la cuenta parcial No 07 de contrato de obra 09/2021 BATERIAS SANITARIAS.

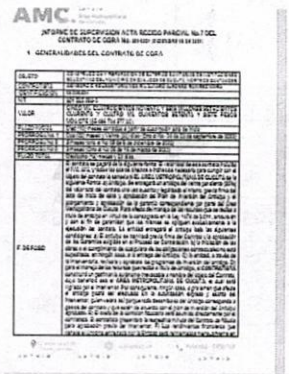

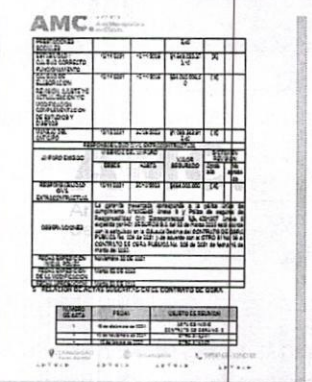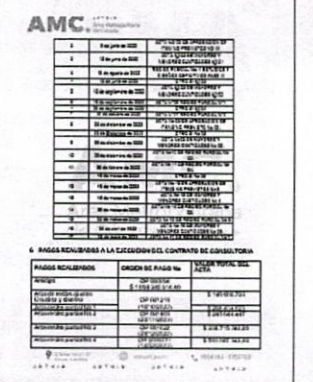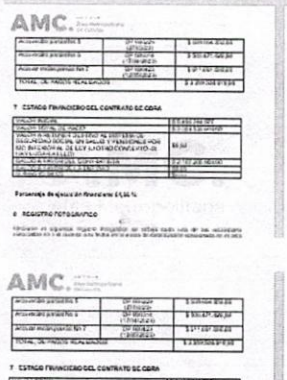- Informe de supervisión del contrato de obra No 09/2021- EDUSANITARIAS N.D.S.

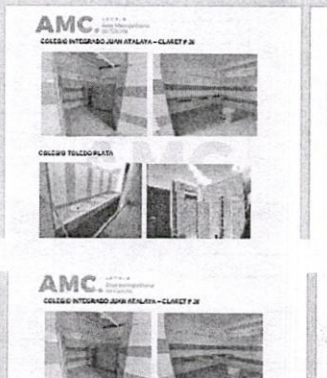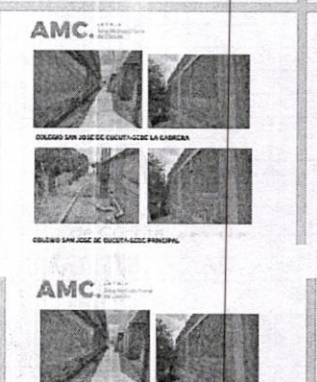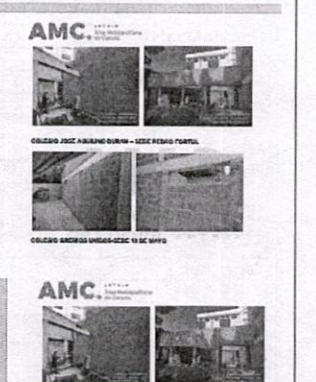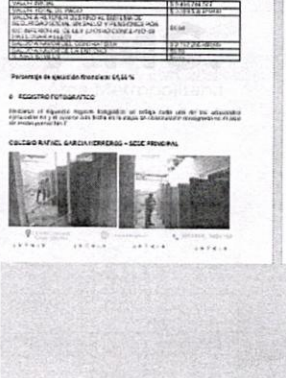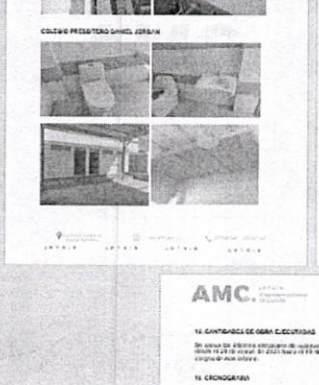AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

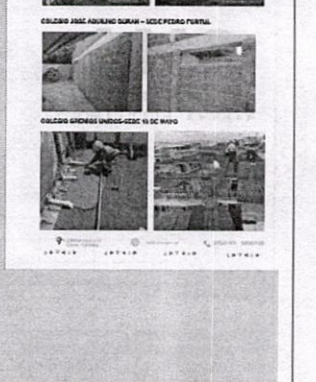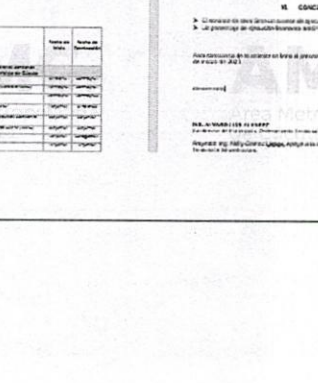CONTRATO DE OBRA N° 009 DE 2021 (8 DE OCTUBRE DE 2021)

INFORME DE SUPERVISION

Fecha del Informe:	desde:	Hasta:	Valor presente acta:	Valor acumulado:	% Ejecución
11/05/2023	29/03/2023	27/04/2023	$ 611.891.680,00	$ 3.389.538.619,00	61,66%

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

Contratista	CONSORCIO EDUSANITARIAS NDS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA

Contrato Obra N°:	09- 2021	Fecha de suscripción:	8 DE OCTUBRE DE 2021	N° CDP:	289	Fecha:	28/06/2021
Valor	5.496.744.577	Fecha de iniciación:	10 DICIEMBRE de 2021	N° RP:	478	Fecha:	3/11/2021
Adicional:	0	Fecha de vencimiento:	28 JUNIO DE 2023				
Valor Final:	5.496.744.577	Fecha de Suspensión:	N/A	Rubro Pres	3510308		
Plazo:	10	Fecha de Reinicio:	N/A				
Adición en Plazo	8 meses, 20 días	Fecha recibo Parcial No 7:	Mayo 08 de 2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1404-2021			
Plazo Final:	18 meses 20 días						

INFORMACIÓN SUPERVISION

Supervisor:	ING. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO	Cargo	Subdirector de planeacion, ordenamiento Territorial e Infraestructura

INFORMACIÓN SUPERVISION

Supervisor:	ING. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO	Cargo	Subdirector de planeacion, ordenamiento Territorial e Infraestructura

INFORMACION OBLIGACIONES: PARAFISCALES, SENA, ETC

PLANILLA:	9449507802	FECHA:	13/04/2023	PLANILLA:		FECHA:		SENA - FIC
SALUD:	$ 2.404.800,00	Periodo:	Abril	SALUD:		Periodo:		
PENSION:	$ 9.520.300,00		Marzo	PENSION:				
ARP:	$ 4.167.800,00			ARP:				
CCF:	$ 2.401.700,00			CCF:				
PLANILLA:		FECHA:		PLANILLA:		FECHA:		
SALUD:		Periodo:		SALUD:		Periodo:		
PENSION:				PENSION:				
ARP:				ARP:				
CCF:				CCF:				

Página 1

INFORMACION DE GARANTIAS

INFORMACION GARANTIAS CONTRATO OBRA

Aseguradora	N°	fecha
HDI SEGUROS S.A	4001007 - 4005348	22/12/2022

Amparos	DESDE	HASTA	VR.ASEGURADO
Cumplimiento	10/12/2021	30/12/2023	549.674.457,70
Pago de salario y prestaciones sociales	10/12/2021	30/06/2026	1.099.348.915,40
Estabilidad de la obra	12/11/2021	12/11/2026	1.649.023.373,10
CALIDAD DE ELABORACION, REVISION AJUSTE ACTUALIZACION MODIFICACION	12/11/2021	12/11/2026	54.000.000,00

CERTIFICADO DE ENTREGA

Con el fin de dar constancia del presente documentos , por parte del Contratista y el recibo satisfacción por parte del Área Metropolitana de Cúcuta.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA

OPS		Pago N°	6	Factura N°	FEV - 08	Persona Natural:	X	común		Simplif.	
CONTRATO	X					Persona Jurídica:				Gran Contribuyente	
RESOLUCIÓN		CDP:	289	Fecha:	11/06/2021	Autoretenedor				Ent. sin animo de lucro	
FACTURA	X					Actividad IICA- Código CIIU:					
CONVENIO		RP:	478	Fecha:	3/11/2021	Tarifa:					

Se ha verificado esta información en el RUT: SI [ ] NO [X]

A Nombre de: CONSORCIO EDUSANITARIAS NDS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA — Identificación: NIT 901525293-6

Dirección: CCBOLIVAR LC I4BRR SAN LUIS — Telefono: 5956578

Anexa certificación: x — Entidad Bancaria: DAVIVIENDA

numero de cuenta: 007700871267 — Ahorros [X] Corriente. [ ]

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

		Vr. Pagado	2.777.646.939,0
Valor Inicial	5.496.744.577	Vr. A pagar:	611.891.680,0
Vr. Adicional	0	Acumulado	3.389.538.619,0
Vr. Total final:	5.496.744.577	vr. Contrato no ejecutada	2.107.205.958,00

C.E.: [ ] Fecha [ ]

ANEXOS Y CHEQUEO


	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL	X		FACTURA	X		PORCENTAJE AVANCE (	X	
BALANCE DE OBRA			PAGOS PARAFISCALES	X		INFORME IMPREVISTO		X
MEMORIA DE CANTIDADES	X		PAGO FIC			PLANOS		X
INFORME CONTRATISTA	X		CERTIFICACION DE LA CUENTA	X				


ACTIVIDADES DESARROLLADAS


A los (08) dias del mes de mayo de 2023 se suscribe el acta de recibo parcial No. 7 segun el informe de cumplimiento de interventoria anexas que hacen parte integral de este informe, donde se a ealizado seguimiento por parte de la supervision del AMC al avance en la ejecución de obra.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

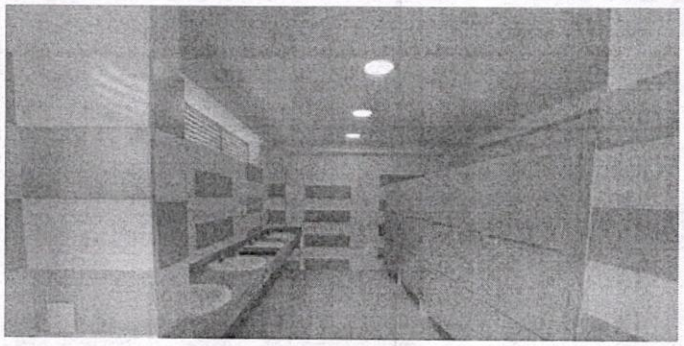

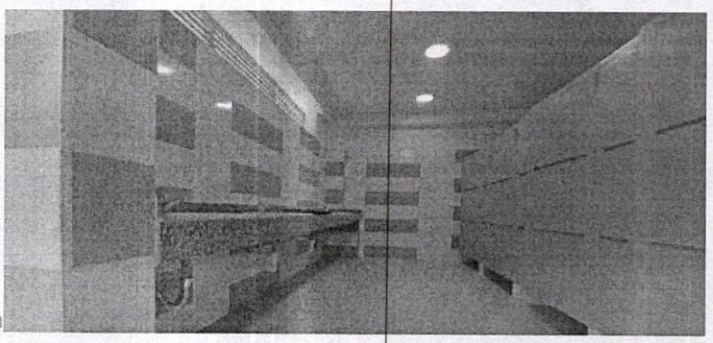


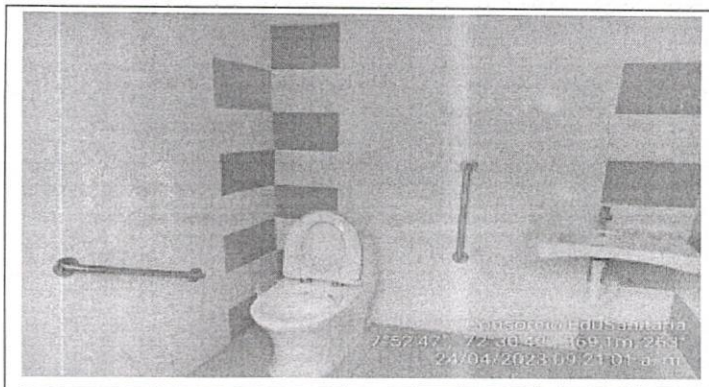

Consorcio EduSanitaria
7°52'47", 72°30'42", 369.1m, 253°
24/04/2023 09:21:01 a. m.

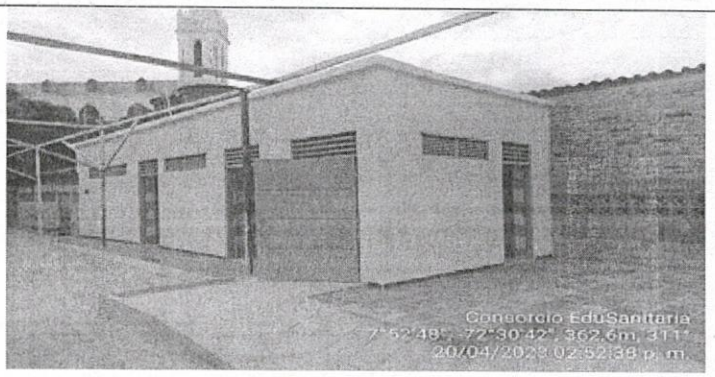

Consorcio EduSanitaria
7°52'48", 72°30'42", 362.6m, 311°
20/04/2023 02:52:38 p. m.



Consorcio EduSanitaria


Consorcio EduSanitaria
7°52'50", 72°30'14", 325.8m, 244°
14/04/2023 08:20:31 a. m.

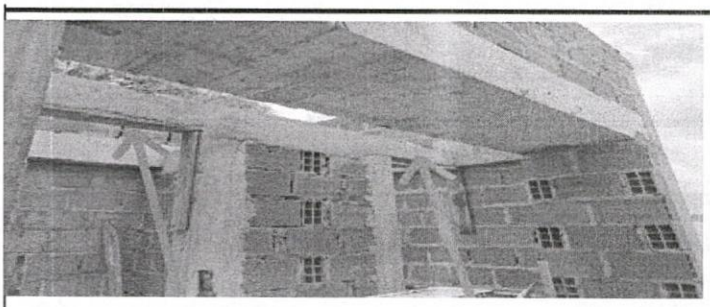

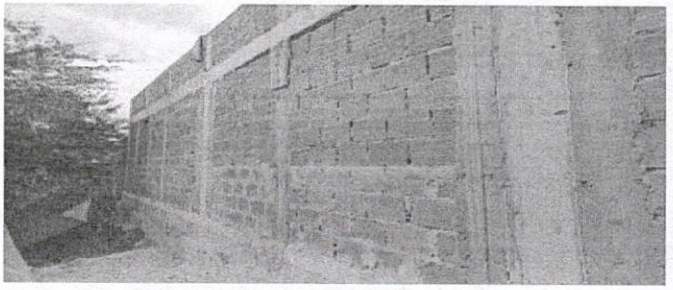

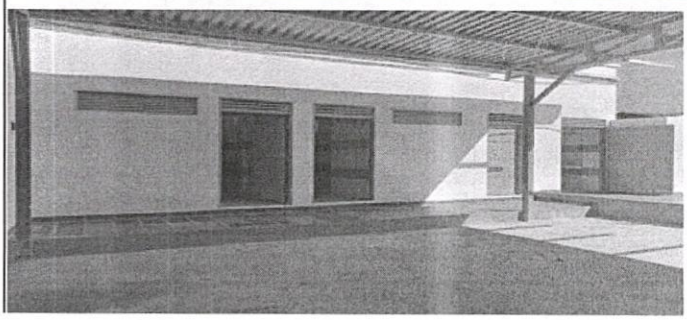

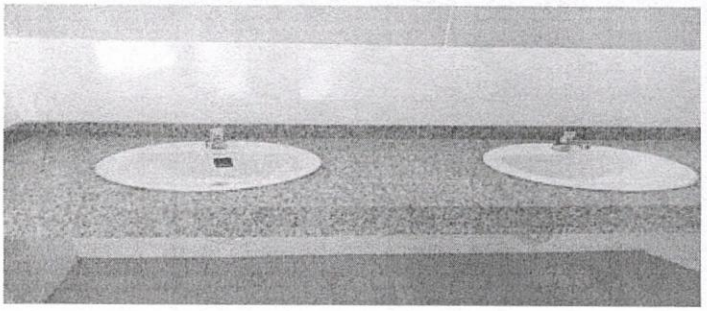

- Informe de supervisión del contrato de interventoría No 11/2021- INTERBATERIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 011 DE 2021 (NOVIEMBRE 30 DE 2021)

INFORME DE SUPERVISION

Fecha del Informe:	desde:	Hasta:	Valor presente acta:	Valor acumulado:	% Ejecución
30/05/2023	10/06/2022	9/07/2022	$ 32.469.150,00	$ 281.054.531,00	74,26%

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA No AMC-LP-007-2021 " CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

Contratista	UNION TEMPORAL INTER BATERIAS R/L LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

Contrato Obra N°:	11- 2021	Fecha de suscripción:	NVIEMBRE 30 DE 2021	N° CDP:	348	Fecha:	5/08/2021
Valor	$ 378.473.648,00	Fecha de iniciación:	DICIEMBRE 10 de 2021	N° RP:	533	Fecha:	2/12/2021
Adicional:	0	Fecha de vencimiento:	28 MARZO DE 2023				
Valor Final:	$ 378.473.648,00	Fecha de Suspensión:	N/A	Rubro Pres	03510308 contrato interadministrativo 1404 Amc Municipio de Cucuta 2021.		
Plazo:	10	Fecha de Reinicio:	N/A		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1404-2021		
Adición en Plazo	8 meses, 20 días	Fecha recibo Parcial No 6:	Junio 10 de 2022				
Plazo Final:	18 meses 20 días						

INFORMACIÓN SUPERVISION

Supervisor:	ING. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO	Cargo	Subdirector de planeacion, ordenamiento Territorial e Infraestructura

INFORMACION OBLIGACIONES: PARAFISCALES, SENA, ETC

PLANILLA:	9439014051	FECHA:	30/09/2022	PLANILLA:		FECHA:		SENA - FIC
SALUD:	$ 262.700,00	Periodo:	julio	SALUD:		Periodo:		

Supervisor:	ING. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO	Cargo	Subdirector de planeacion, ordenamiento Territorial e Infraestructura

INFORMACION OBLIGACIONES: PARAFISCALES, SENA, ETC

PLANILLA:	9439014051	FECHA:	30/09/2022	PLANILLA:		FECHA:		SENA - FIC
SALUD:	$ 362.700,00	Periodo:	julio	SALUD:		Periodo:		
PENSION:	$ 1.450.100,00		junio	PENSION:				
ARP:	$ 630.900,00			ARP:				
CCF:	$ 362.600,00			CCF:				
PLANILLA:	9444091400	FECHA:	12/12/2022	PLANILLA:		FECHA:		
SALUD:	$ 64.300,00	Periodo:	agosto	SALUD:		Periodo:		
PENSION:	$ 256.300,00		julio	PENSION:				
ARP:	$ 111.700,00			ARP:				
CCF:	$ 64.100,00			CCF:				

Página 1

INFORMACIÓN DE GARANTIAS

INFORMACION GARANTIAS CONTRATO INTERVENTORIA

Aseguradora	Poliza unica de cumplimiento No		Fecha
Seguros Mundial	CCT-100001359		12/01/2022
Amparar	DESDE	HASTA	VR.ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	10/12/2021	10/06/2023	37.847.364,80
Pago de salarios y prestaciones sociales	10/12/2021	10/12/2025	75.694.729,60
calidad del servicio	10/12/2021	10/12/2026	113.542.094,40

CERTIFICADO DE ENTREGA

Con el fin de dar constancia del presente documento , por parte del Contratista y el recibo satisfacción por parte del Área Metropolitana de Cúcuta.

ING. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO, SUPERVISOR
SUBDIRECTOR DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA

OPS		Pago N°	7	Factura N°	FEIB-7	Persona Natural:		común	Simplif.
CONTRATO	X					Persona Jurídica:	X		Gran Contribuyente
RESOLUCIÓN		CDP:	348	Fecha:	5/08/2021	Autoretenedor			Ent. sin animo de lucro

OPS		Pago N°	7	Factura N°	FEIB-7	Persona Natural:		común		Simplif.	
CONTRATO	X					Persona Jurídica:	X			Gran Contribuyente	
RESOLUCIÓN		CDP:	348	Fecha :	5/08/2021	Autoretenedor				Ent. sin animo de lucro	
FACTURA	X					Actividad IICA- Código CIIU:					
CONVENIO		RP:	533	Fecha :	2/12/2021	Tarifa:					

Se ha verificado esta información en el RUT:	SI		NO	X	
A Nombre de:	UNION TEMPORAL INTERBATERIAS			Identificación:	NIT 901544496-2
Dirección:	AVEN 17 E-4 N 45 PARQUE CENTRAL, CUCUTA NORTE DE SANTANDER COLOMBIA			Telefono:	5743194
Anexa certificación:	x	Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA		
		numero de cuenta:	83200002212		
		Ahorros	X	Corriente.	

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial	378.473.648	Vr. Pagado	248.585.381,0			
Vr. Adicional	0	Vr. A pagar:	32.469.150,0	C.E.:		Fecha
Vr. Total fina	378.473.648	Acumulado	281.054.531,0			
		vr. Contrato no ejecutada	97.419.117,00			

ANEXOS Y CHEQUEO

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL	X		FACTURA	X		PORCENTAJE AVANCE (10,	X	
BALANCE DE OBRA		X	PAGOS PARAFISCALES	X		INFORME IMPREVISTO		X
MEMORIA DE CANTIDADES		X	PAGO FIC		X	PLANOS		X
INFORME CONTRATISTA	X		CERTIFICACION DE LA CUENTA	X				


ACTIVIDADES DESARROLLADAS


A los (11) dias del mes de julio de 2022 se suscribe el acta de recibo parcial No.7 segun el informe de cumplimiento de interventoria anexas que hacen parte integral de este informe, donde se a


REGISTRO FOTOGRÁFICO

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA




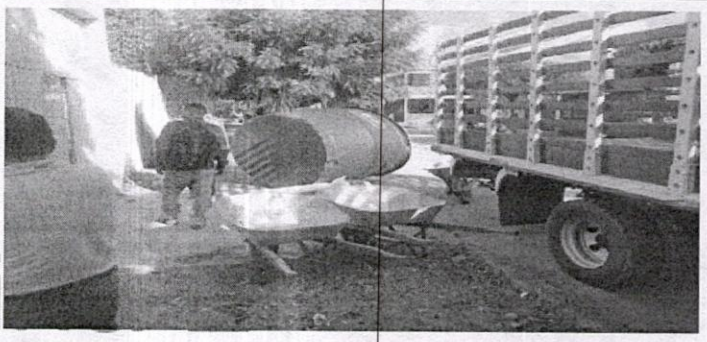

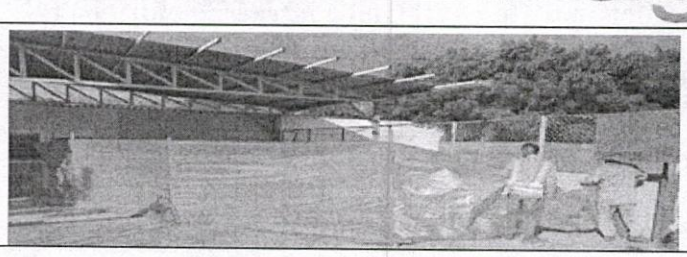





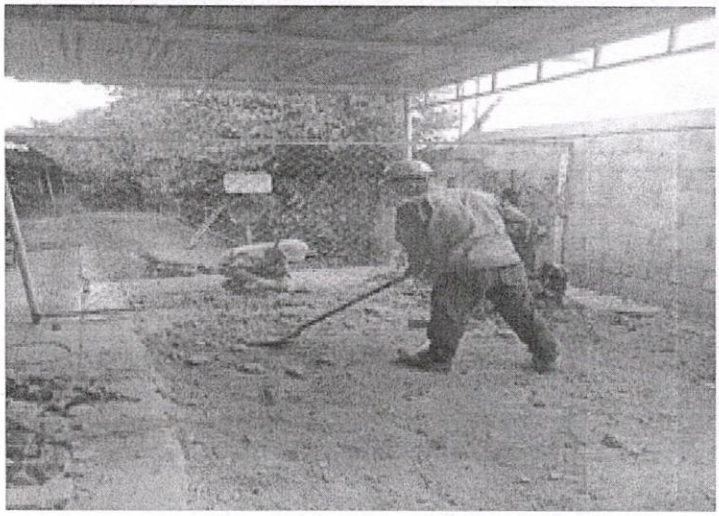





ACTIVIDAD: 3. Apoyar a la subdirección de planeación ordenamiento territorial e infraestructura en la respuesta de correspondencia solicitudes y peticiones radicadas en l subdirección ene l marco del desarrollo de las obras.

- Oficios realizados para el convenio 1404/2021 Contrato 09/2021.

ACTIVIDAD: 4. Asistir a las reuniones y comités que se programen para el buen desarrollo del objeto del contrato.

- se realizan reuniones para el desarrollo y socialización de los convenios que se están llevando a cabo en la entidad.

Actas de comité del contrato 09 de 2021- convenio 1404/2021.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

INFORMACION Y COMUNICACION
ACTA DE COMITE Y REUNION

TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DIA
1. Avance de obra construcción de baterías sanitarias Colegio Juan Fernandez de Novoa Sede los Alpes y Sede Reyes Montilla.
2. Fecha de terminación de Obras Segun Nuevo Cronograma.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS
Siendo las 3:00 pm del 17 de mayo de 2023 en la obra de construcción de batería Sanitaria de la Institución Juan Fernandez de Novoa - Sede los Alpes, se realizo comite de obra con asistencia de contratista, Interventoria, Representante de padres de familia y apoyo de supervision del AMC.
Ja Ing. Nelly Gomez Apoyo de supervision del AMC da un saludo a los presentes manifestando la importancia de la reunión de comite de obra, teniendo en cuenta que en la pasada reunión del 02 de mayo a los 8:00 AM por solicitud de padres de familia y profesores en la asistencia del Director del AMC; Donde alli el Director presento Para revisar las falencias que venian observandose en el avance de obra y acceso Personal.
Ya hoy pasando 15 dias despues de la mencionada reunión, se pudo ver avance significativo, como: Instalaciones de enchape Muros baños y Pisos, Instala cion de [illegible]

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

INFORMACION Y COMUNICACION
ACTA DE COMITE Y REUNION


Tema de la reunión	Contrato 09/2021 conv 1404/2021	Fecha:	17/05/23
Población o grupo objetivo		Responsable	
Objetivo Reunión	Avance de Obras Baterias Colegio Juan Fernando Novoa Alfes Reyes M.		


Nombres y Apellidos	Entidad u organización	Teléfono	Correo electrónico	Firma
ESTELLA HERNANDEZ SANDOVAL	COOPERATIVA COOSANITARIA	3114690113	consorcioalcanitarioc@gmail.com	
Jorge Arteaga	CONSULTOR INTERVENTORIA	3004611842	ceinterventoria@gmail.com	
Carlos Fernando Asencio	Padre de familia	320234 1024		Carlos Asencio
Caro Alfonso Bautista	Ing residente	3052340181	Caroalbautistabautista@gmail.com	
Nelly Gomez	SUPERVISION AMC	3213435854	Ingnellygomez11@gmail.com	


ACTIVIDAD: 5. Elaboración del informe mensual de avance de acuerdo a las tareas asignadas.


INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 064


- **Informe mensual convenió 1404/Mayo.**

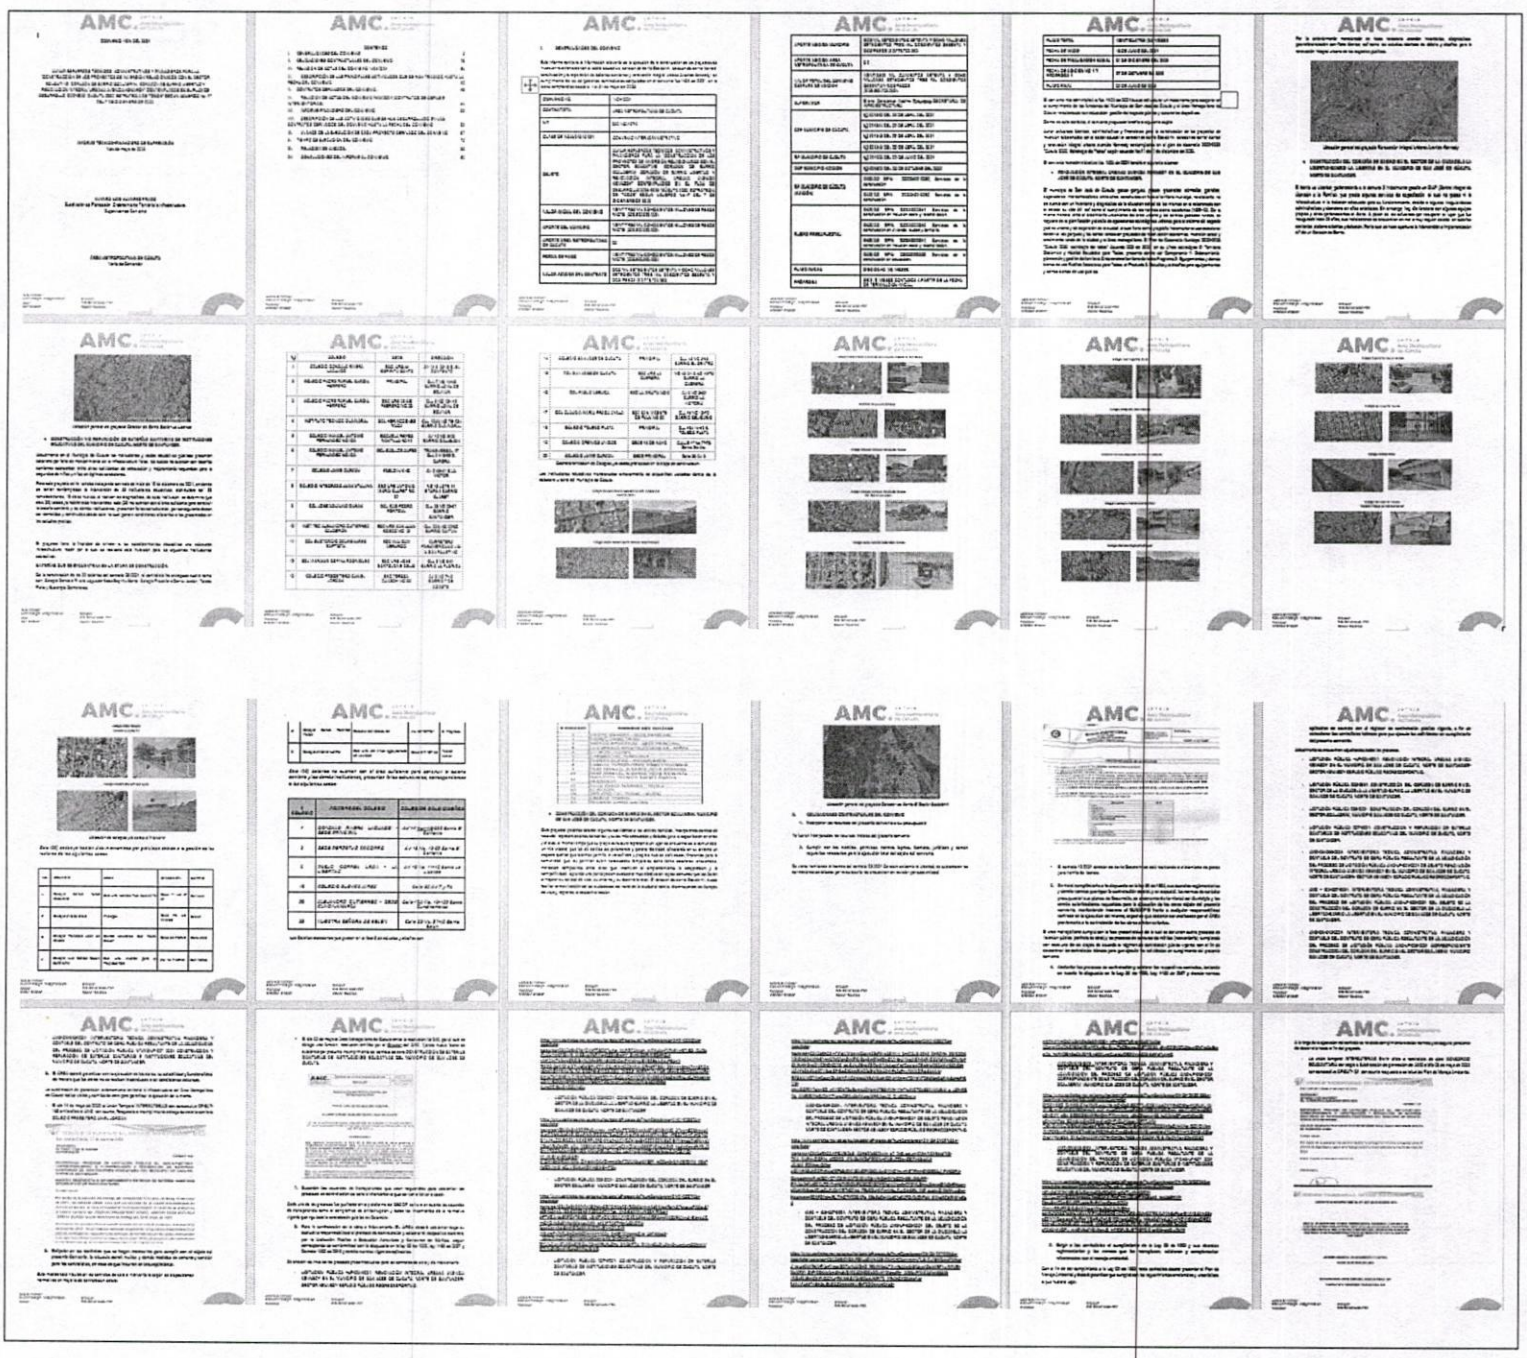


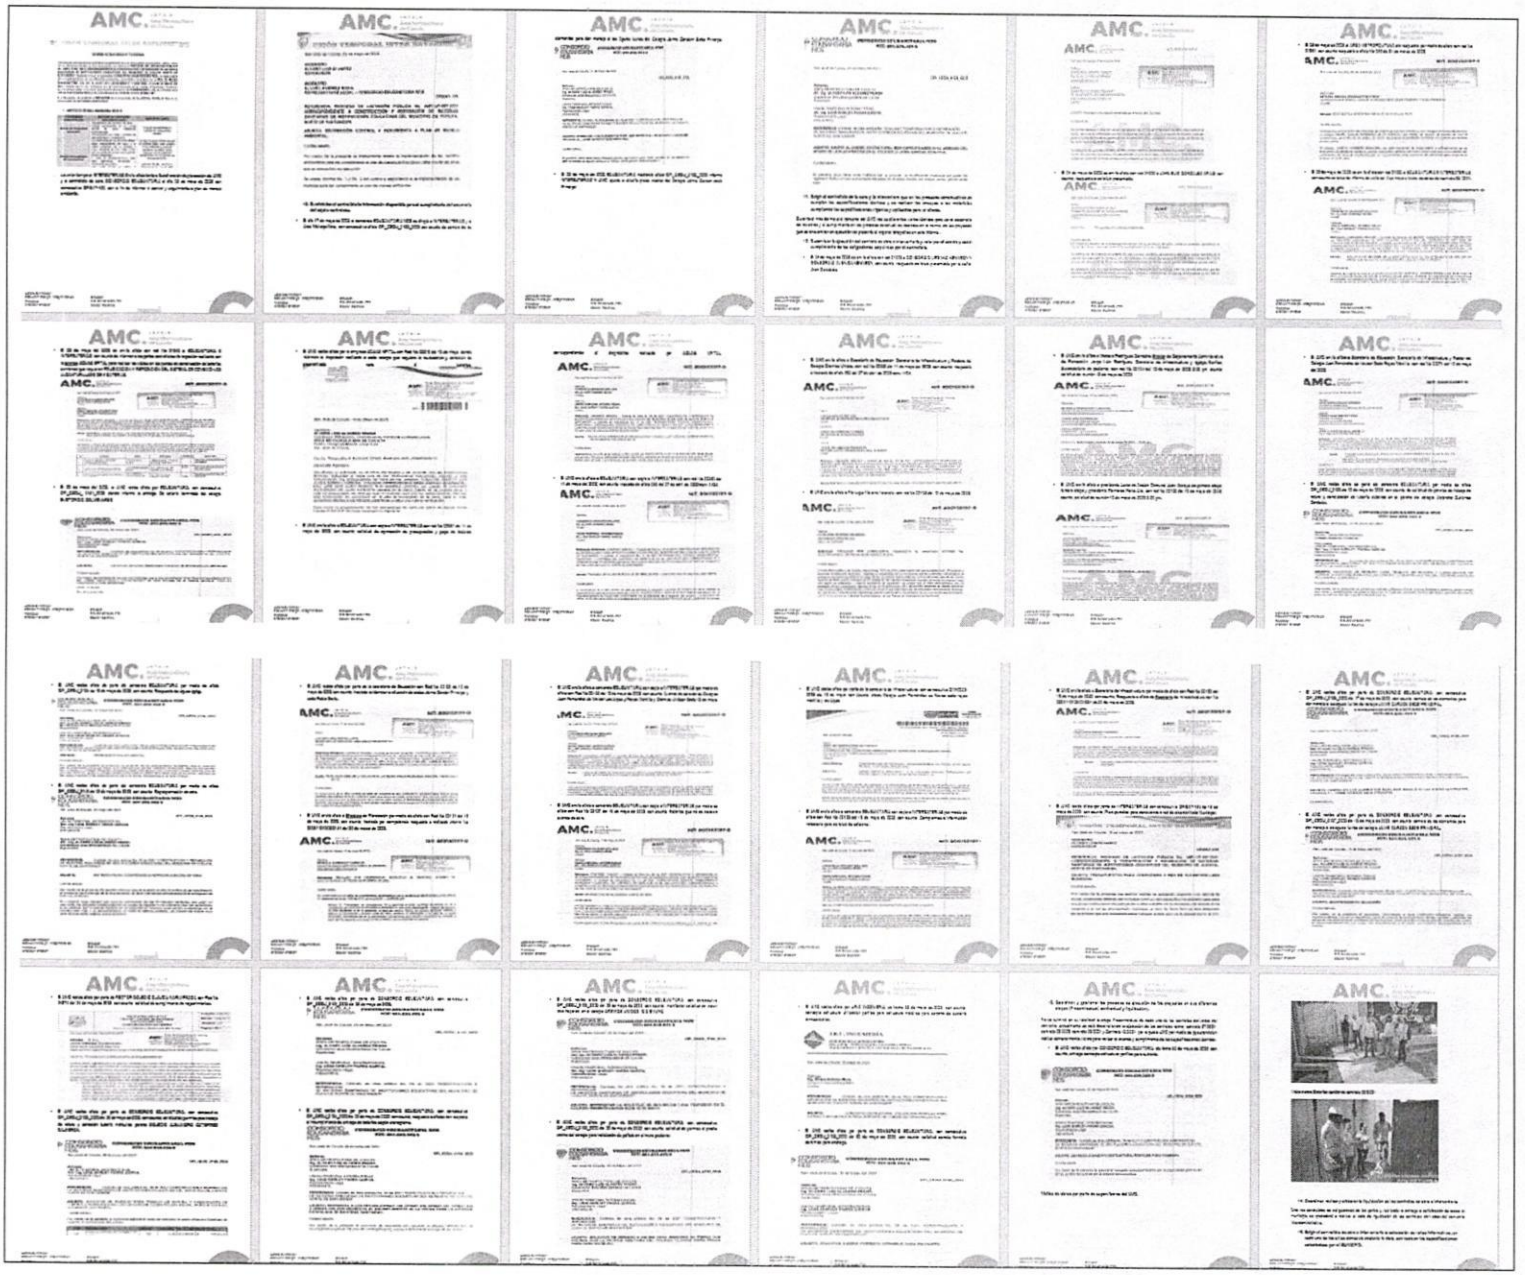

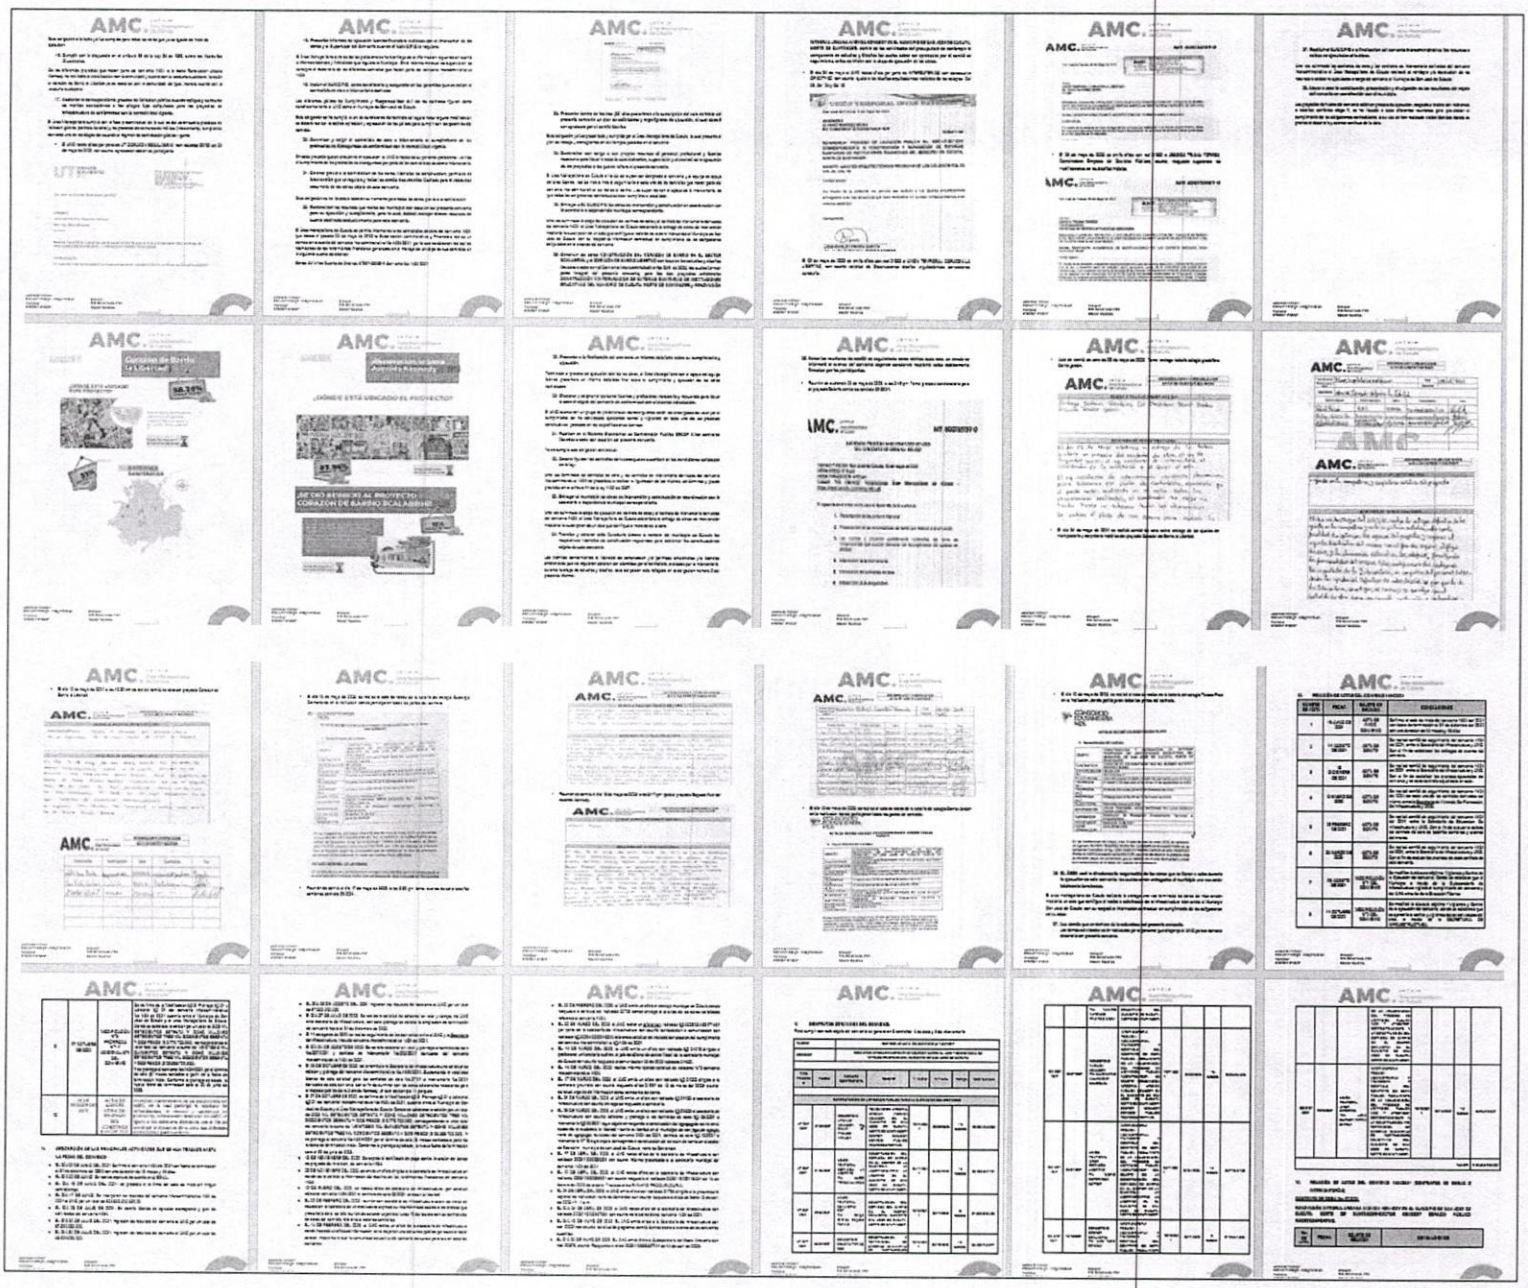


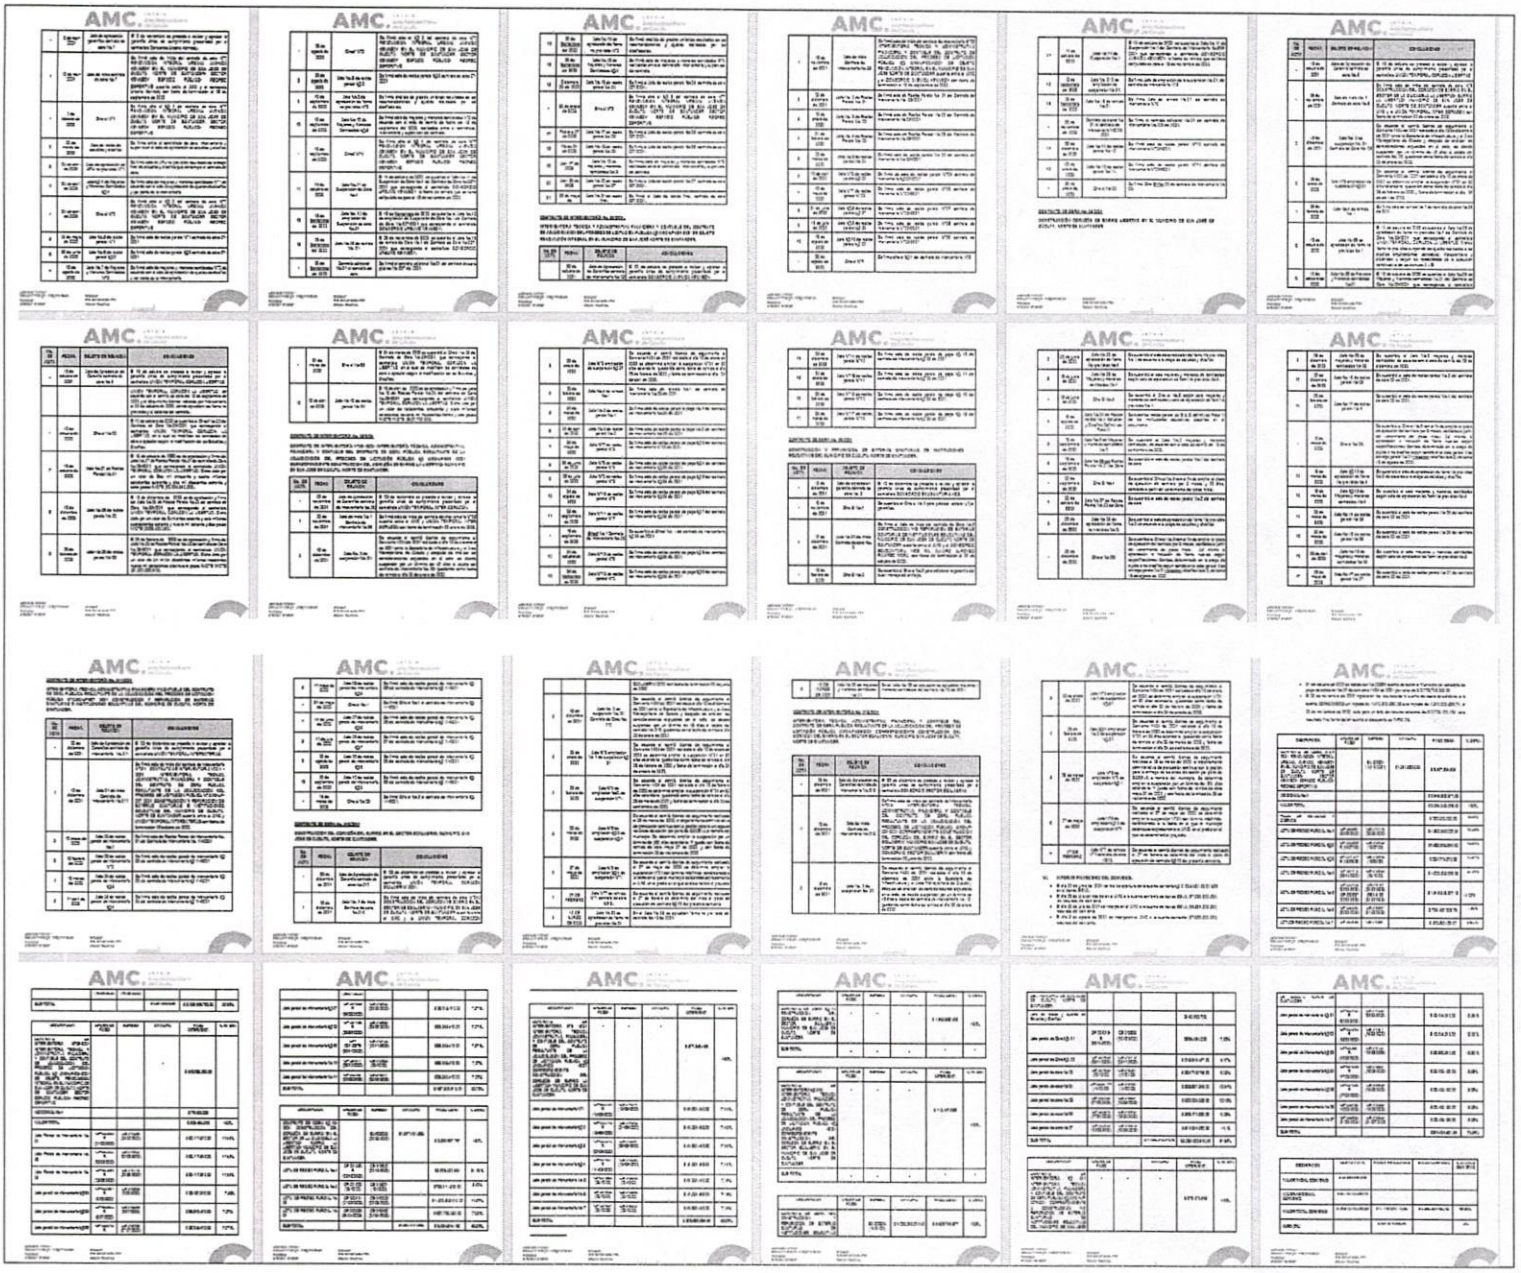


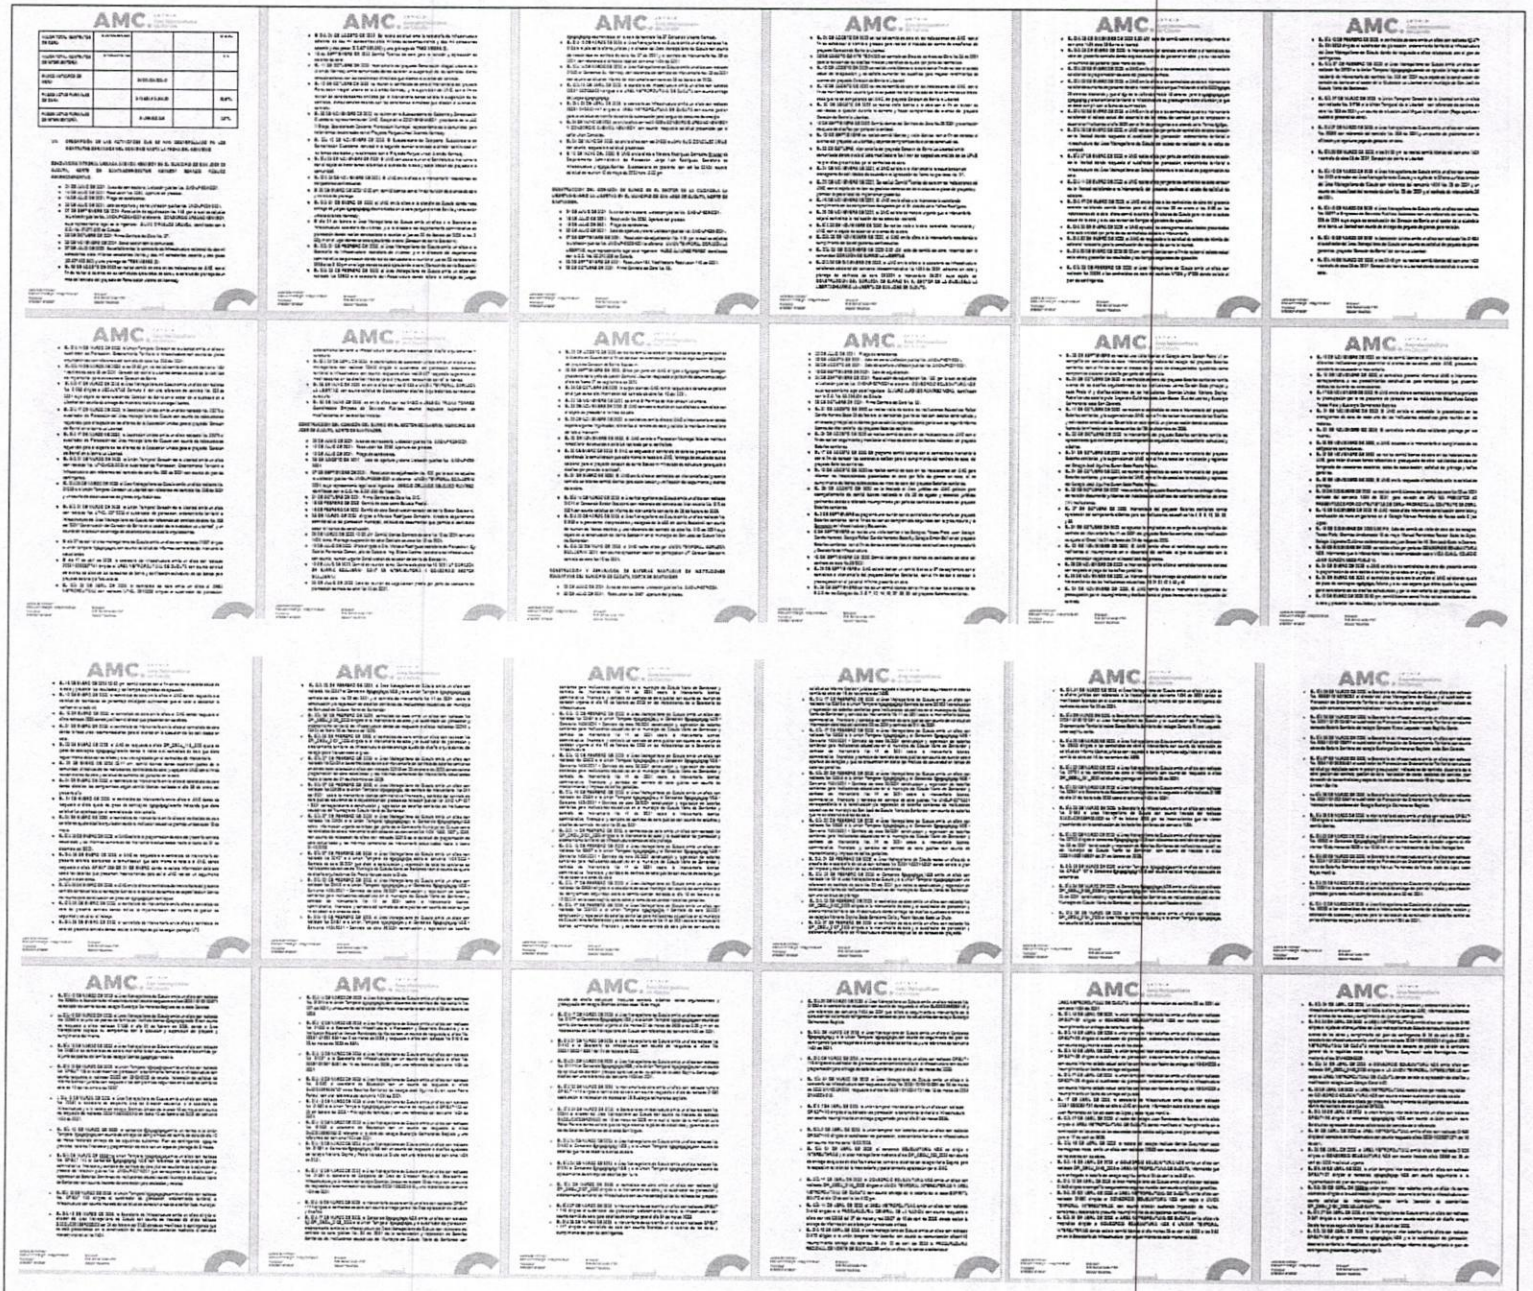


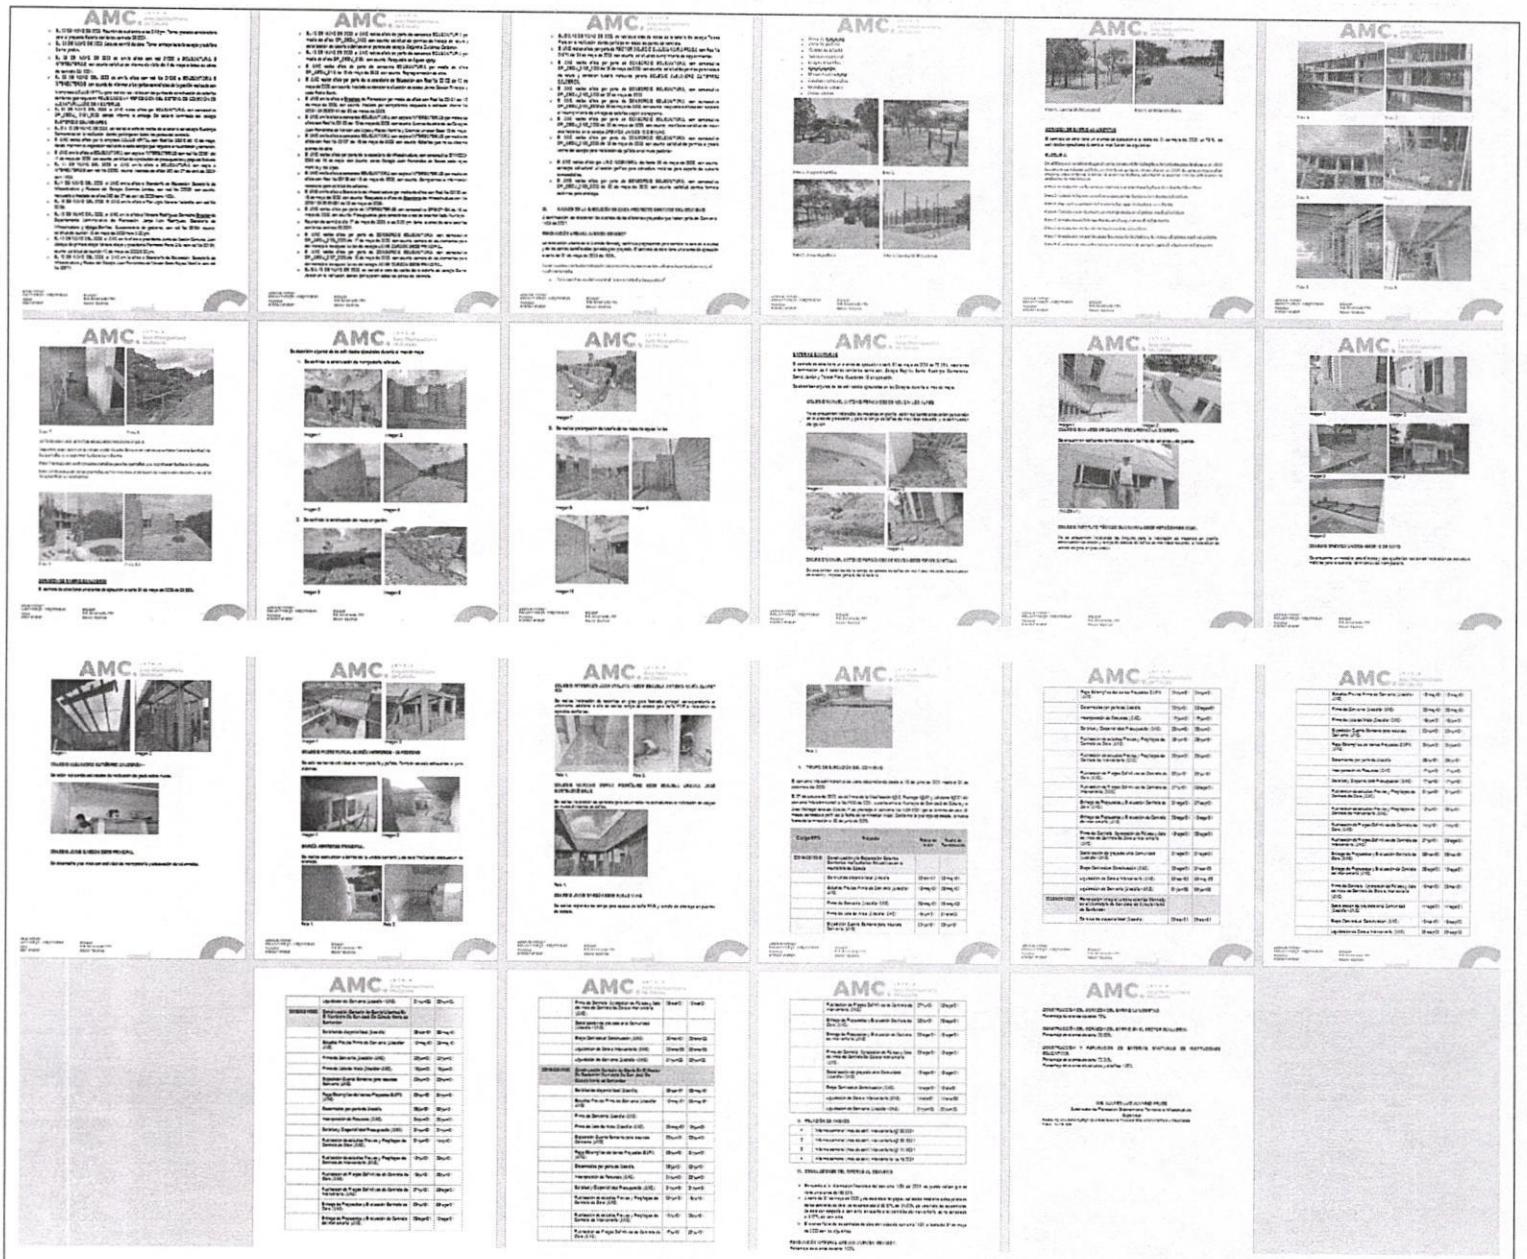

- **Informe de convenio 1563/ Mayo.**

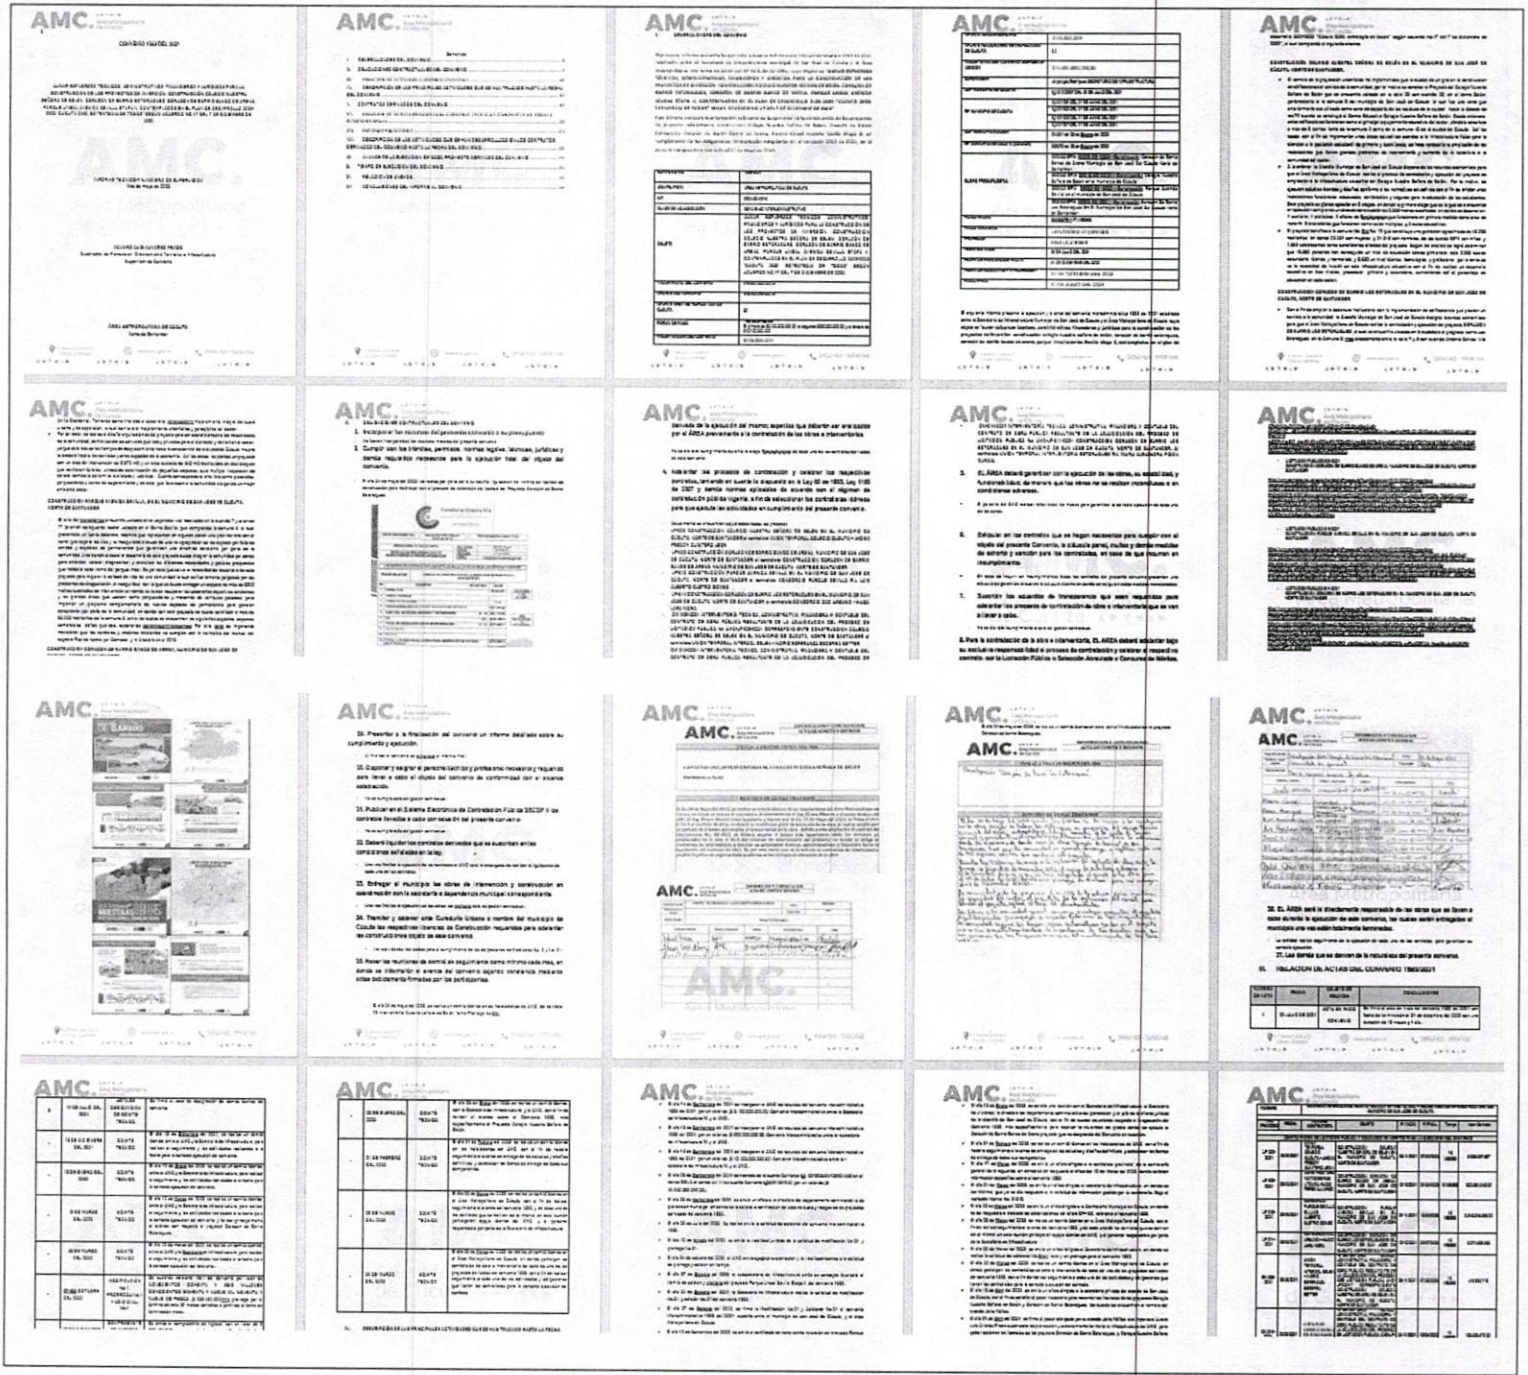

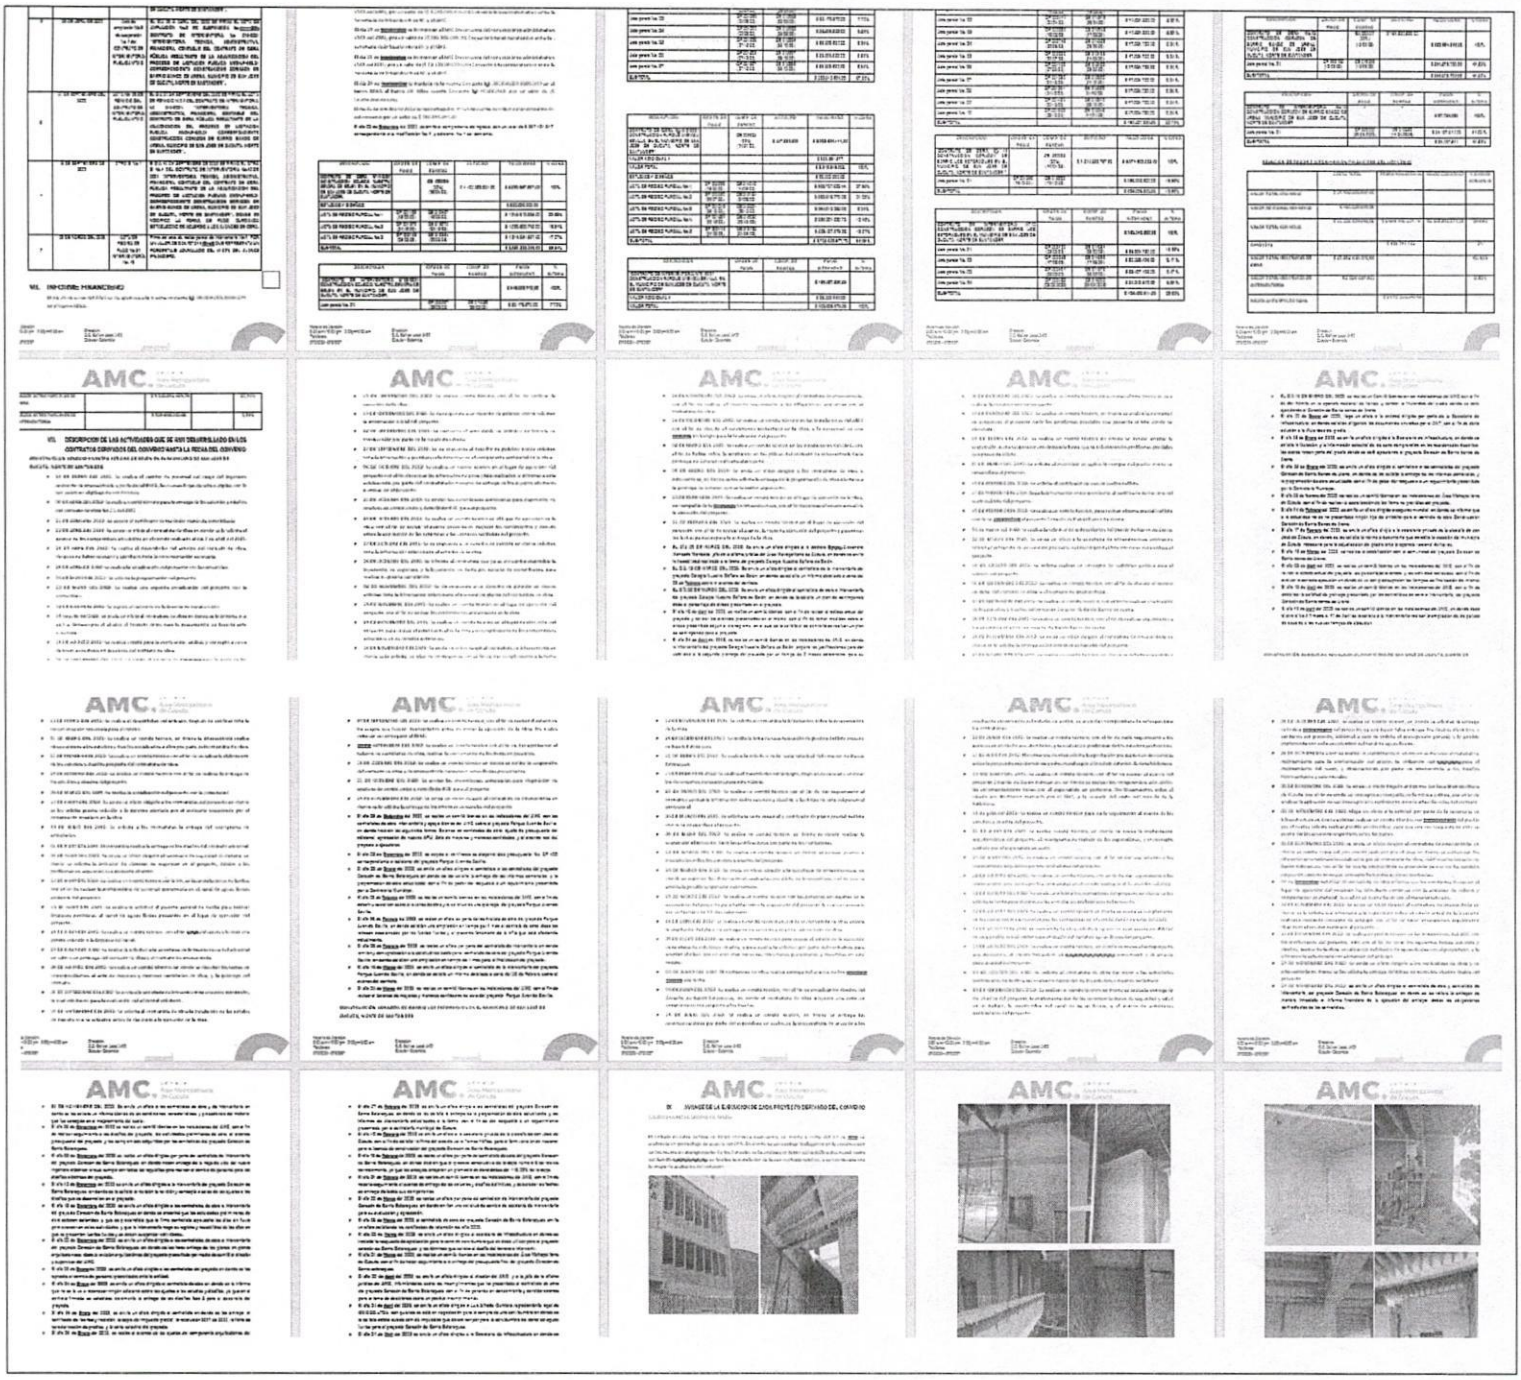

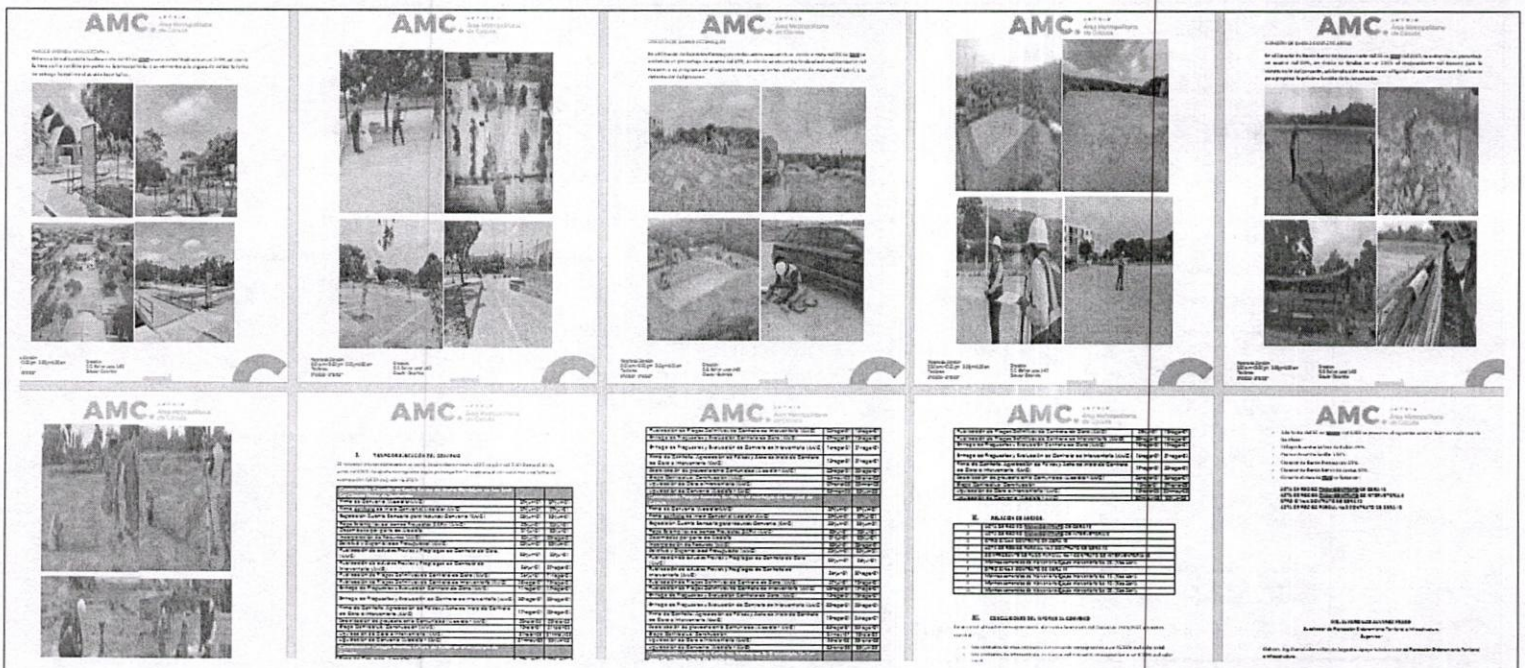

ACTIVIDAD: 6. Otras actividades inherentes al objeto contractual y a su perfil designas por el supervisor.

- Semanalmente informe para la publicación de la revista sobre el contrato 09/2021 BATERIAS SANITARIAS/ CONV 1404/2021, Periodo 16 de mayo a 15 de junio de 2023, se presenta semanalmente.

BATERIAS SANITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 70,25%
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA OBRA: 31 DÍAS
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 67,54%
TOTAL SEMANAS DE EJECUCIÓN: 82
SEMANA EN CURSO: 77

Nota importante: de las 20 construcciones de baterías del contrato 09/2021 ya están terminadas 4 baterías como son; Colegio Espíritu Santo, Eustorgio Colmenares, Daniel Jordán y Toledo Plata. Quedando 16 en ejecución.

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA- LOS ALPES.

Ya se encuentran instalados los mesones en granito, están realizando excavación para andén en el área de preescolar y para la rampa de baños de movilidad reducida; y la continuación del gavión.
(IMAGEN 1, IMAGEN 2, IMAGEN 3, IMAGEN 4).

Para la siguiente semana se tiene programada terminación del gavión, instalación de lavamanos y aparatos sanitarios.

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes.

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA-SEDE REYES MANTILLA.

Se encuentran realizando la rampa de acceso de baños de movilidad reducida, construcción de andén y limpieza general de la batería.
(IMAGEN 5, IMAGEN 6)

Para la siguiente semana se tiene programada la instalación de aparatos sanitarios, limpieza de áreas aledañas a la obra que hayan sido utilizadas por el desarrollo de

BATERIAS SANITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 70,25%
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA OBRA: 25 DÍAS
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 61,66%
TOTAL SEMANAS DE EJECUCIÓN: 82
SEMANA EN CURSO: 78

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA- LOS ALPES.

Se encuentran realizando construcción de andén, rampa de acceso de movilidad reducida y la continuación del gavión.

(IMAGEN 1, IMAGEN 2, IMAGEN 3).

Para la siguiente semana se tiene programada terminación del gavión, instalación de lavamanos, aparatos sanitarios y pintura.

Personal en obra: 1 oficial y 3 ayudantes.

COLEGIO INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE HERMOGENES MAZA.

Se encuentran instalando pasta sobre muros, excavación para la conexión de tubería de presión, ya se encuentran los mesones en granito instalados con apertura para la instalación de los lavamanos.

(IMAGEN 4, IMAGEN 5)

La siguiente semana se tiene programada, la instalación de lavamanos, grifería, pintura, instalación de guardaescoba.

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.

COLEGIO GREMIOS UNIDOS -SEDE 18 DE MAYO

Se encuentra un maestro, dos oficiales y dos ayudantes realizando

BATERIAS SANITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 73,65%
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA OBRA: 19 DÍAS
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 61,66%
TOTAL SEMANAS DE EJECUCIÓN: 82
SEMANA EN CURSO: 79

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA- LOS ALPES.

Se encuentran realizando cuneta de aguas lluvias en lado lateral del salón de preescolar, continúan con retoque de pintura y continuación construcción del gavión.

(IMAGEN 1, IMAGEN 2, IMAGEN 3).

Para la siguiente semana se tiene programada la continuación de construcción del gavión.

Personal en obra: 1 oficial y 3 ayudantes.

COLEGIO INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE HERMOGENES MAZA.

ya se cuenta con la instalación de tableta de gres en el pasillo de la fachada principal, guardaescoba, instalación de bordillo en la rampa e instalación de pintura.
(IMAGEN 4, IMAGEN 5)

La siguiente semana se tiene programada, hacer los builtrones para las bajantes de aguas lluvias y la instalación de lavamanos, aparatos sanitarios y grifería.

Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudante, 1 pintor y 2 plomeros.


COLEGIO GREMIOS UNIDOS -SEDE 18 DE MAYO

Se encuentra un maestro, dos oficiales y dos ayudantes realizando instalación de pañete sobre muro, encofrado para columnetas, regateada de

- Semanalmente revisión de toda la información subida al drive por los apoyos del AMC, la revisión se realiza en conjunto con el Subdirector de planeación e infraestructura territorial AMC. Y así el resultado de la revista pueda llevarse a cabo por el diseñador.





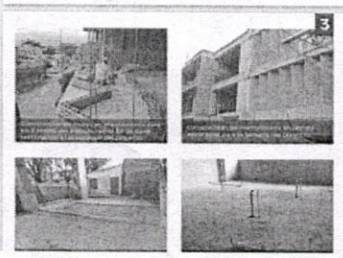












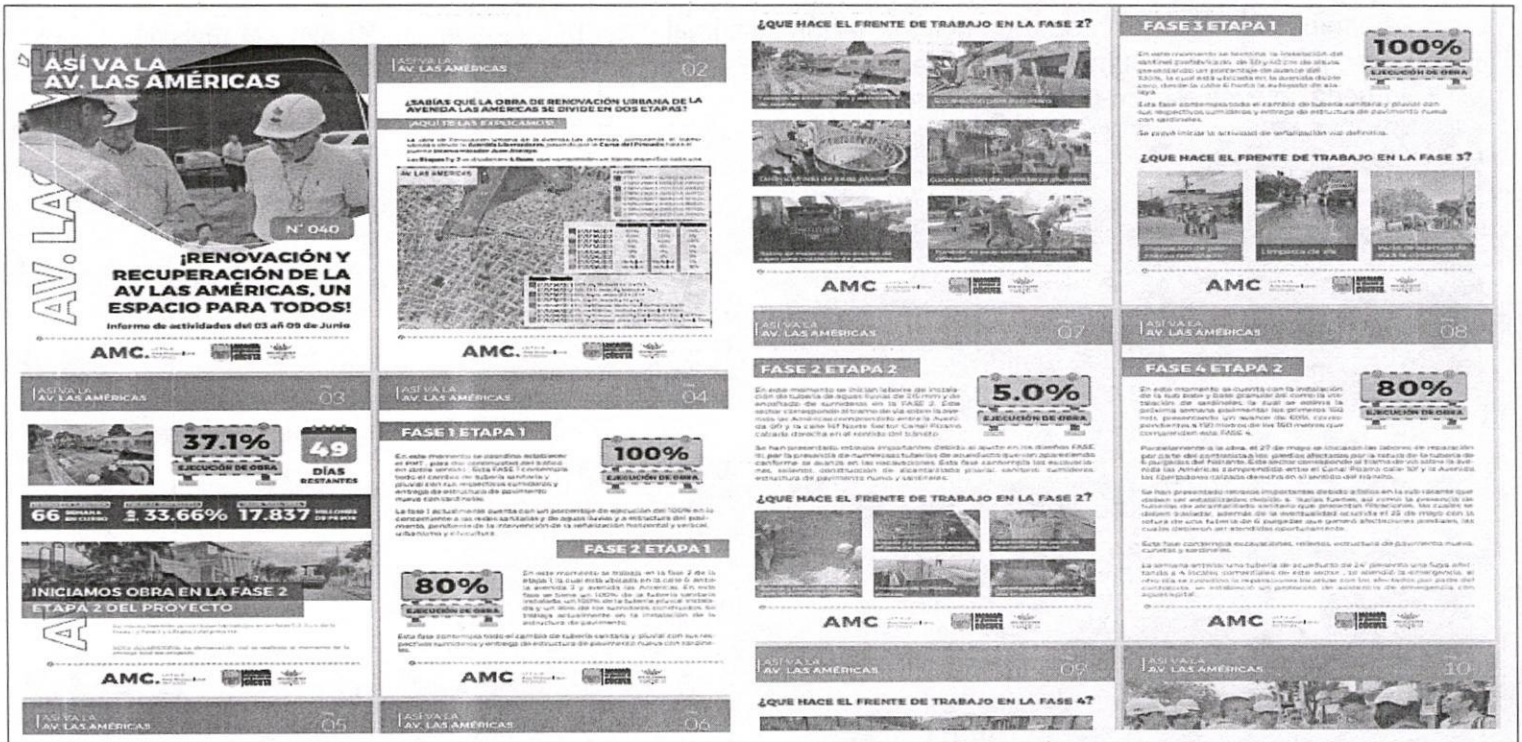

2.COMPROMISOS ADQUIRIDOS/RECOMENDACIONES

3. EVIDENCIAS	Física	Magnética	LUGAR DE CONSULTA

ANEXOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PAGO:

Se anexa al presente informe para hacer efectivo el pago los siguientes documentos:

- ✓ **Formato único de supervisión contratos – convenios y certificación de pagos**
- ✓ **Certificado del supervisor en cumplimiento de las actividades**
- ✓ **Pagos seguridad social**
- ✓ **Pagos pensión**
- ✓ **Pagos riesgos profesionales**
- ✓ **Demás documentos pertinentes**

Firma Contratista
Nombre: Nelly Gómez Llanez
C.C. No. : 1093735129

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta
000405
RADICADO
RECIBIDO: Gabriela S
FECHA: 14 JUN 2023
HORA: 2:36 pm
