1. FECHA ELABORACIÓN:	11	6	2023	2. No. INFORME	14	3. SEMANA No.	14
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	05/06/2023 AL 11/06/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12 Meses
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12 Meses
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ING. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	81,00%	2,92%	34,01%	1,23%	-46,99%	-1,70%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	5,00%	1,63%	9,36%	3,05%	4,36%	1,42%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	14,31%	6,92%	11,03%	6,65%	-3,28%	-0,27%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	10,59%	14,08%	-3,49%
Durante el periodo	0,44%	0,23%	0,21%
Acumulado Actual	11,03%	14,31%	-3,28%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,98%	6,92%
Valor de la Obra Programada	$ 25.832.573,62	$ 181.939.570,60

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,95%	6,65%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 24.928.149,09	$ 174.727.792,66

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

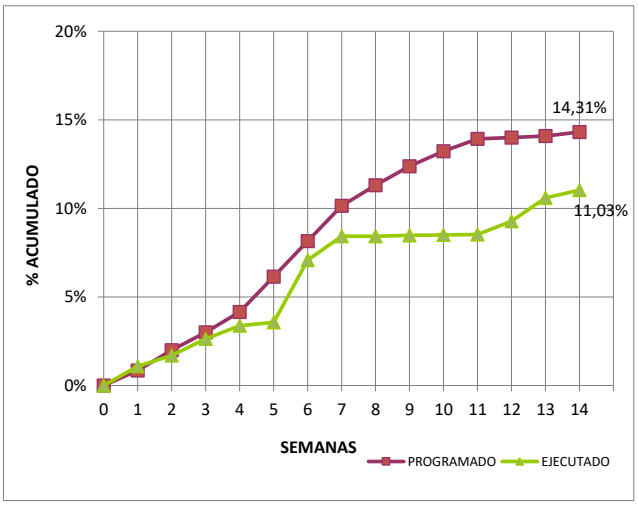

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	13	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	23	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1	RETROCARGADOR	0	JUEVES	S
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	1	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se continúa la actividad de excavación manual de las zapatas y contrapesos.
2. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades ejecutadas se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
3. Se realiza movimiento de material sobrante hacia acopio temporal en obra, para luego ser retirado a disposición final.
4. Se realiza la actividad de aplicación de solado para las excavaciones terminadas.
5. Durante las excavaciones se realiza verificación de niveles por parte del maestro de obra y la interventoría.
6. Se realiza bombeo y manejo de aguas, por motivos de las fuertes lluvias presentadas en horas nocturnas y diurnas.
7. Ingresa acero de refuerzo de los pedestales y columnas.

Observación: La interventoría en conjunto con el contratista verifica el trazado de la red actual de alcantarillado pluvial, la cual no coincide como se ilustra en los planos entregados por diseño. Por lo tanto se define el nuevo trazado en campo, dadas las condiciones mencionadas anteriormente.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas en la obra.
2. Se hace entrega de la dotación y se firma el respectivo contrato a los trabajadores nuevos por parte del contratista.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Se realiza comité semanal de obra con el equipo de trabajo de obra e interventoría, el supervisor y el representante del despacho de la alcaldía, donde se levanta el acta de seguimiento y se plasman los temas tratados y compromisos surgidos.
2. Se realiza el estudio de las hojas de vida del personal postulado en la plataforma CAFABA.
3. Ingresan cinco (5) ayudantes de obra.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por todo el equipo de trabajo.
2. Se realiza cambio y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado, también se realiza recambio de cinta de peligro averiada.
3. Por parte de interventoría se realiza inspección del estado de los EPP's y herramientas de los trabajadores.
4. Se realiza jornada de orden y aseo general en toda la zona de trabajo y campamento de obra.
4. Se realiza inducción al SG-SST al personal nuevo que ingresó a la obra.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo no se realizaron actividades del componente ambiental.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
