
INFORME No. 2

PERIODO: 06 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 05 DE MAYO DE 2023

CONTRATO N° 0757-23 **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RANCER SIFREIL PRADA OTERO	

UT. INTERCOMEDOR ITSI

901.683.399-1

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INFORME No. 2 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 0757-23 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".



ABRIL 2023

Carrera 22 No. 52B - 60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

INTRODUCCIÓN **5**
OBJETIVOS **6**
1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO **7**
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 9
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 10
1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO 11
2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA **12**
2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 12
2.2. ACTAS SUSCRITAS 13
2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 13
2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 14
2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 17
2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18
2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 18
2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 19
2.9. CONTROL DE GARANTÍAS 20
3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA **21**
3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 21
3.2. ACTAS SUSCRITAS 22
3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 22
3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 23
3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 25
3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST) 27
3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES 27
3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 28
3.9. CONTROL DE GARANTIAS 28
3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 29
4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES **30**
5. CAPITULO V. ANEXOS **31**

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 31
5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 32
5.3. BITÁCORA DE OBRA 33
5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA 34
5.5. LIQUIDACIÓN, PAGO, RESOLUCIÓN DEL PMT Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 35
5.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 36
5.7. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 37
5.8. CERTIFICADO DE ESCOMBRERA POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 38
5.9. NFORME TÉCNICO DE OBRA 39
5.10. INFORME HSE DE OBRA 40
5.11. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA 41
5.12. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA 42
5.13. HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DE LABOR 43

INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

OBJETIVOS

GENERAL

- ✓ Presentar el estado técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de obra ejecutado por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS durante el periodo comprendido entre el 6 de marzo del 2023 y el 05 de marzo del 2024.


ESPECÍFICOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.
- ✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo.

1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

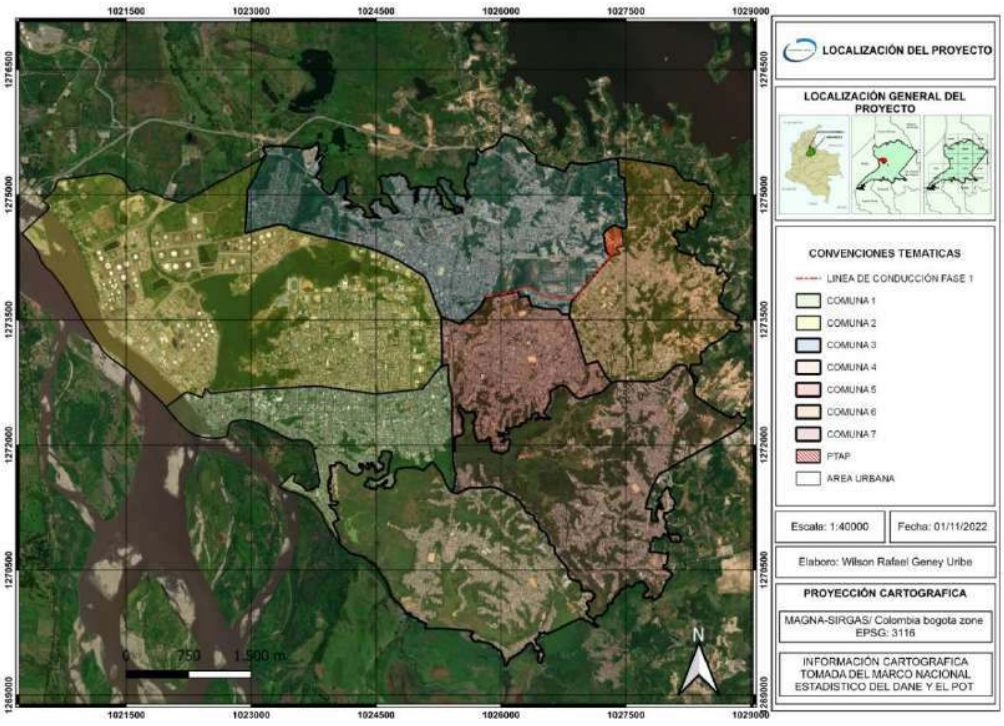


El proyecto de construcción del comedor escolar se encuentra ubicado en la carrera 28 No. 53-08 en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, Santander, Dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI

Figura 1. Localización del proyecto.



Fuente: Interventoría

Figura 2. Planta general cafetería.

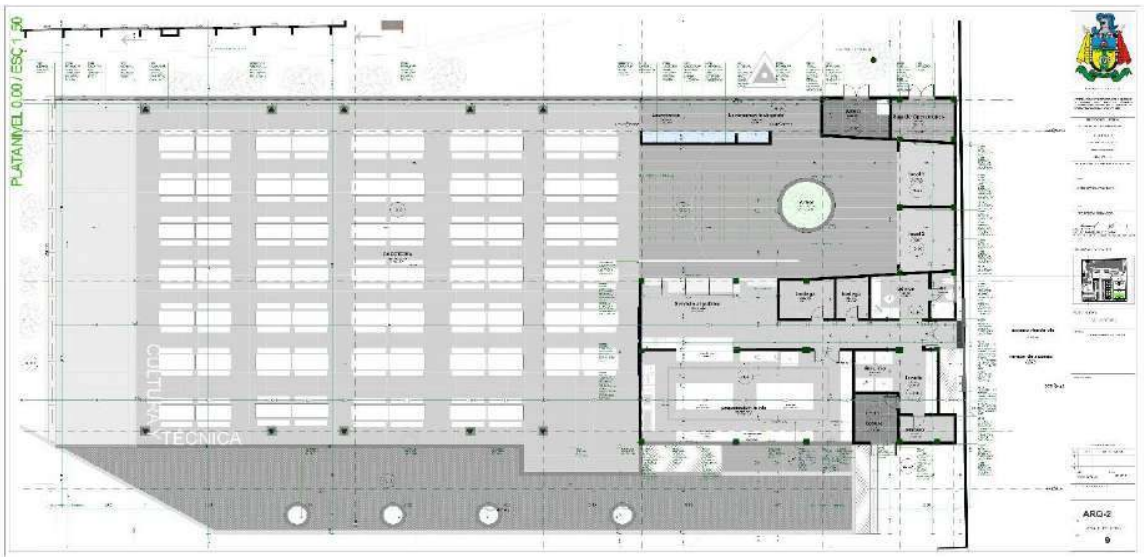

Fuente: secretaria distrital de infraestructura.

1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

En este proyecto se indican de forma general las tareas encaminadas para la construcción del restaurante escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, el cual será el comedor más grande de la ciudad, beneficiando cerca de 5000 estudiantes, que pasaran de tener comida industrializada a comida caliente preparada en sitio.

En general, las actividades a realizar serán:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**, comprenden todas las actividades de localización, cerramiento, desmonte de estructuras, demoliciones y demás actividades necesarias para poder adecuar completamente el área disponible para el proyecto.
- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**, comprenden las actividades de excavaciones, rellenos de acuerdo a la ubicación definida en planos y bajo estricto control topográfico y el cargue y retiro del material sobrante y de escombros generados durante el proyecto.
- **ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO**, corresponde a las actividades de elaboración y vaciados de concretos de sus diferentes resistencias de acuerdo a las especificaciones del elemento, y al suministro de acero estructural para cubiertas y el suministro y figurado de acero.
- **MAMPOSTERÍA Y FRISOS**, corresponde a la construcción de muros de mampostería y pañete de los mismos.
- **ARQUITECTURA Y ACABADOS**, comprenden actividades de instalación de puertas y ventanas, pasamanos, mesón en granito, acabados de pisos y muros para acabado final. También incluye la cubierta, así como el cielo raso, bajantes y canal metálico, los elementos sanitarios y de cocina y los acabados exteriores finales de la obra.
- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de agua fría, cajas de registro, entre otros, para el abastecimiento de agua potable y la construcción del cuarto de bombas para el suministro de agua.

- **INSTALACIONES SANITARIAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de desagües, ventilaciones, cajas de registro, entre otros para la eliminación de residuos a través de desagües.
- **ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO**, comprende actividades de instalación de tuberías para la entrega final de aguas lluvias y aguas negras, cajas de inspección y construcción de pozos.
- **INSTALACIONES DE GAS**, comprende actividades de instalación de tubería de gas y conexión para abastecimiento de la infraestructura.
- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**, comprenden todas las actividades de circuitos eléctricos y/o sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica la infraestructura construida.
- **EQUIPOS DE COCINA**, hace referencia a las actividades de suministro e instalación de los equipos y elementos de primera necesidad para la cocina.

1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en los estudios previos y los diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto, son inmodificables.

El presente contrato de obra pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto tiene una duración de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Planos y diseños.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

2.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DE LA INTERVENTORÍA	
CONTRATO N°:	0757-23
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$ 272.766.458 (DOSIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE MARZO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte de la interventoría. En el periodo de este informe no se suscribió ningún acta.

NOMBRE DEL ACTA	FECHA
Contrato de interventoría 0757-23	22 de febrero de 2023
Acta de Inicio de interventoría	6 de marzo de 2023

2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

En el presente periodo se observa el siguiente avance de obra y presupuestal del proyecto. Y se hace un comparativo con el porcentaje proyectado según PDT. Esta gráfica se toma como referencia del informe semanal.

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,43%	11,31%	-2,88%
Durante el periodo	0,04%	1,07%	-1,03%
Acumulado Actual	8,47%	12,38%	-3,91%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,49%	4,57%
Valor de la Obra Programada	$ 12.882.658,91	$ 120.107.666,94

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,01%	2,73%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 350.952,63	$ 71.834.291,32

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

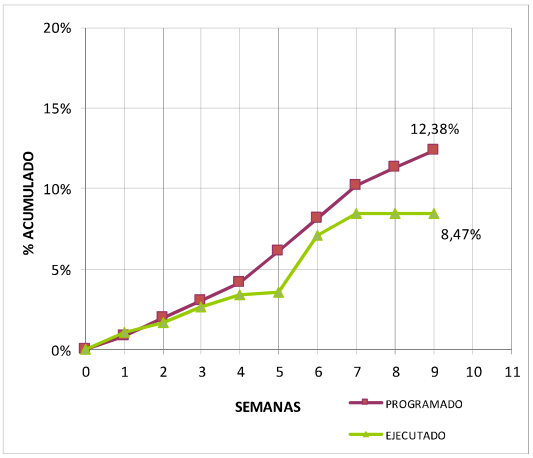

A continuación, se relacionan las actividades de obra ejecutadas en el periodo:

- La interventoría verifica que los equipos y las herramientas usadas para realizar las actividades, se encuentren en buen estado de operación y de seguridad.
- La interventoría realiza recorridos diarios de obra, revisando la correcta ejecución de

las actividades, verificando que sean construidos en orden y eficiencia.

- La interventoría por medio de su equipo de trabajo, verifica las irregularidades que manifiesta el contratista en los diseños estructurales, y en conjunto con la supervisión y el contratista, se evidencia que se debe hacer un ajuste en la cimentación para evitar futuras fallas en la estructura.
- La interventoría con su equipo de topografía, verifica niveles e implantación del proyecto, demarcado por el contratista.

2.3.1 Seguimiento semanal

Con el fin de llevar un control de la programación para evaluar el avance o atraso del proyecto, se diligencia un formato de informe semanal; esto con el fin de determinar los planes de contingencia necesarios en el caso de presentarse atrasos. **Ver anexo 5.2**

2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La interventoría verifica el cumplimiento del personal mínimo propuesto para la ejecución de las actividades.
- La interventoría cumple y exige al contratista el estricto cumplimiento al desarrollo del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas.
- La interventoría realiza la presentación de informes mensuales donde se destaca el avance físico y presupuestal del proyecto, y posteriormente informa del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad del proyecto.
- La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de salud y parafiscales de todo el personal que se encuentra en obra, posteriormente se verifica que los pagos de las planillas se hagan oportunamente y se anexe su comprobante de pago en cada informe.

- La interventoría realiza y lleva el registro fotográfico diario de obra, donde se ilustra el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.

2.4.1 Registro Diario de Obra

Durante el periodo de este informe se diligenció por parte de la interventoría, en equipo con el contratista, la bitácora de obra. En este libro se plasman todas las actividades realizadas día a día con sus respectivas cantidades, visitas técnicas, actividades no previstas, toma de decisiones y cualquier tema relevante para la obra. También se especifica si hay lluvias o climas desfavorables que ameriten suspender labores. **Ver anexo 5.3**

2.4.2 Plan Detallado de Trabajo - PDT

El proyecto cuenta con un Plan de trabajo detallado (PDT) en Project y un control de programación, donde se discrimina el flujo de inversión programado semanalmente en pesos y en porcentaje, esto con el fin de evaluar periódicamente la ejecución del proyecto y determinar avances o atrasos respectivamente.

2.4.3 Personal de interventoría

A continuación, se relaciona el personal de la interventoría que laboró en este periodo Se anexa planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. **Ver anexo 5.4**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Leonardo Mantilla Noguera	Director de Interventoría
Rancer Sifreil Prada Otero	Residente de Interventoría
Fernan Gomez Gonzalez	Topógrafo
Daniela Moreno Rincón	Profesional SST
Andrés Camilo Garzón Martínez	Residente de Apoyo
Wilson Rafael Geney	Apoyo SST y Ambiental

2.4.4 Control de equipos de interventoría

A continuación, se presenta la relación de equipos usados por la interventoría durante el periodo de este informe.

EQUIPOS	CANTIDAD
Computador portátil	2
Camioneta	1
Equipo de topografía	1

2.4.5 Licencias

Dentro del periodo de este informe, se solicitaron las siguientes licencias por parte del contratista. **Ver anexo 5.5**

- PMT (Plan de manejo de tránsito), este documento ya fue aprobado por la ITTB, se anexa la liquidación con su respectivo pago y la resolución emitida por la entidad.
- Se anexa licencia de construcción del proyecto aprobado por curaduría.

2.4.6 Correspondencia

A la fecha de este informe por parte de la interventoría se han enviado los siguientes comunicados al contratista. **Ver anexo 5.6**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
10/04/2023	0003	Respuesta a solicitud de suspensión del contrato oficio 0009-0756 DEL CONTRATO N° 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"	UT INTERCOMEDOR ITSI	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

A continuación, se presenta la forma de pago estipulada por contrato y la disponibilidad presupuestal para la interventoría.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

A). Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada

7

www.barrancabermeja.gov.co
Diagonal 60 Kilómetro 1 vía Corregimiento El Llanito (7) 611 5555 Ext. 1604

Secretaría de Infraestructura
lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

B). Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del Distrito.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. En todo caso las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

CLÁUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato será cancelado con recursos de la vigencia fiscal 2023, según certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 23-00751 del 03 de Febrero de 2023, con rubro 2.3-2202-0700-051-220057-2.3.2.02.02.008, concepto: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación: CREDITO INTERNO, por valor de: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($227.305.400); Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-01133 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-02-2.3.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($45.461.080), y ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.

2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Por parte de interventoría se realiza el control estricto de los equipos usados en obra, verificando que su documentación este al día y que su funcionamiento sea el correcto.
- La interventoría realiza revisión continua del estado de EPP's de los trabajadores, verificando que se encuentren en buen estado para realizar sus labores.
- La interventoría realizó la revisión de los elementos para atención de emergencias, de lo cual se observa que se encuentran completos y en buen estado. Entre ellos están, el botiquín, la camilla y el extintor.
- Por parte de interventoría se realizó verificación de la señalización adecuada de todas las áreas de trabajo y senderos peatonales.
- La interventoría lleva control y verificación de orden y aseo de todas las áreas de trabajo diariamente.

2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

2.7.1 Socializaciones y seguimiento al contrato

- En el periodo correspondiente de este informe, se realiza comité de obra con todo el equipo de trabajo (Interventoría, Contratista, Secretaría de infraestructura, Supervisor), para revisar la tala de la Ceiba que interfiere en la cimentación del proyecto, y aclarar las observaciones que tiene el contratista por las irregularidades

que presenta el diseño en la cimentación del proyecto. Se levanta acta de comité donde se refleja los temas tratados y compromisos surgidos. **Ver anexo 5.7**

- Se realiza comité de seguimiento con el secretario de medio ambiente, el supervisor, la interventoría y el contratista, para revisar en campo la interferencia que tiene la Ceiba con la construcción de la cimentación. **Ver anexo 5.7**

2.7.2 Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

- La interventoría revisa y aprueba el presupuesto del plan de manejo ambiental aportado por el contratista.
- Desde el inicio de la obra se evidencia que el contratista no cuenta con el suministro de las baterías sanitarias con sus respectivos lavamanos para las necesidades fisiológicas de los trabajadores, por parte de la interventoría se hace un llamado verbal solicitando dichos sanitarios.
- La interventoría verifica el suministro y buen estado del punto ecológico para la disposición de residuos generados por el proyecto.
- La interventoría verifica la correcta disposición final de escombros y residuos orgánicos generados en la obra por medio del certificado de la escombrera. **Ver anexo 5.8**

2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

2.8.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

La interventoría verificó que el contratista a la fecha ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En lo concerniente al recurso humano se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal al igual que la dotación suministrada por el contratista. En el periodo transcurrido toda actividad realizada por el contratista ha tenido el aval de la interventoría y se ha realizado de manera segura.

2.9. CONTROL DE GARANTÍAS

La interventoría cuenta actualmente con la póliza N° 400-47-994000090491 Anexo 1 de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios y prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, para la Legalización del contrato de Obra de interventoría N° 0757-23 por acta de inicio.

POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	6/03/2023	06/09/2024	$ 54.553.291,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	06/03/2027	$ 27.276.645,80
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2024	06/03/2025	$ 54.553.291,60

3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información General del Contrato

CUADRO GENERAL DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	0756-23
OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$3.684.062.560,88 (TRES MIL SEISIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE)
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
SUPERVISOR:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
INTERVENTOR CONTRATO:	UT INTERCOMEDOR ITSI
FECHA DE INICIO:	06 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	05 DE MARZO DE 2024
MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte del contratista.

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS SAS
06 de marzo de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS SAS

3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo, y se anexa el informe técnico mensual del contratista para ver a detalle las actividades ejecutadas. **Ver anexo 5.9**

- Se finaliza la actividad de Demolición de muros en mampostería esp. 0,10m.
- Demolición manual de concreto.
- Demolición de concreto de placa de entrepiso de baños esp. 0,10m usando equipo minicargador con taladro.
- Demolición de columnas de concreto del área de los baños usando equipo minicargador con taladro.
- Demolición de vigas de cimentación de concreto del área de los baños usando equipo minicargador con taladro.
- Personal de VANTI ingresa a la obra para realizar el respectivo retiro de la acometida de gas existente.
- Se realiza comité de obra el día 19 de abril de abril del presente año, donde participan la supervisión del contrato, interventoría y contratista, con el fin de revisar el diseño estructural del proyecto e intervención de la ceiba.

- Se realiza el retiro de raíces de los árboles talados en el área de influencia del proyecto.
- Se recibe visita en obra el día 21 de abril del presente año por parte del secretario de medio ambiente para verificar el área de interferencia de la ceiba en la obra.
- Instalación de la acometida eléctrica temporal para la obra y campamento de la misma.
- Cuadrilla de topografía realiza la toma e implantación de niveles del proyecto para cálculo de volúmenes de excavación y relleno.
- Se inicia la actividad de excavación manual de material común, buscando el nivel cero del terreno natural, demarcado por topografía.
- Se realiza cargue y retiro de material sobrante y escombros producto de la demolición del antiguo comedor.

3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.4.1 Personal de obra del contratista

A continuación, se relaciona el personal de obra del contratista que laboró en este periodo. Se anexan hojas de vida del personal de labor, contratos, certificado de afiliaciones a salud y parafiscales y la planilla de pago de este periodo. **Ver anexos 5.12, 5.13 y 5.14**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Fanny Gutierrez Acosta	Profesional SST
Yesenia Alvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Antonio Jose Carvallido Carpio	Ayudante de obra
Hector Julio Escobar Saavedra	Ayudante de obra
Alveiro Carpio Peñaloza	Ayudante de obra
Alexander Jimenez Santamaria	Ayudante de obra
Elvis Carpio Peñaloza	Ayudante de obra

3.4.2 Control de equipos de obra

A continuación, se presenta la relación de herramientas y equipos usados por el contratista durante el periodo de este informe.

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	1
Martillo demoledor mediano	1

3.4.3 Correspondencia

En el periodo correspondiente de este informe el contratista ha enviado los siguientes comunicados a la interventoría. **Ver anexo 5.6**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
14/04/2023	0010-0756	RADICACIÓN REPROGRAMACIÓN DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
18/04/2023	0011-0756	RADICACIÓN OBSERVACIONES DISEÑO Y PLANOS ESTRUCTURALES	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
25/04/2023	0013-0756	OBSERVACIONES TEMAS ESTRUCTURALES Y DEFINICION CEIBA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
3/05/2023	0014-0756	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS AIU y APU´S NP	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

A continuación, se presenta la forma de pago estipulada por contrato y la disponibilidad presupuestal para el contratista.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

A. Actas de Avance parcial: Se generarán actas de pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por la Interventoría y visto bueno de la Supervisión.

B. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobación de la garantía de estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. El pago de las diferentes actas está al sujeto al PAC, a los giros de Nación y su respectivo recaudo, según sea el caso.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no

Código	CCE-EICP-IDI-35	Versión	3



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-35	Página	9 de 17
Versión No.	3		

sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).

PARAGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL DISTRITO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

PARÁGRAFO CUARTO: - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00750 del 03 de Febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-2202-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005, por concepto de CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.306.985.499); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01132 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005 por concepto de CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, fuente de financiación CREDITO INTERNO, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($589.678.168), Y ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.

3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST)

A continuación, se relacionan las actividades principales del área SST, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe HSE para ver a detalle el trabajo realizado por el equipo de trabajo. **Ver anexo 5.10**

- Se realizaron las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo.
- Se realizó constantemente la reposición de EPP's por daños a los trabajadores.
- Se realizaron inspecciones de EPP continuamente.
- Se realizaron inspecciones de herramientas y equipos.
- Se realizaron inspecciones diarias de áreas verificando el orden y aseo.

3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

A continuación, se relacionan algunas de las actividades principales del área ambiental, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe Socio Ambiental para ver a detalle el trabajo realizado. **Ver anexo 5.11**

- Se realizó acta de comité de obra donde se trataron los temas de la tala de la Ceiba y el cambio de diseño de la cimentación del proyecto.
- Se realizó acta de seguimiento de comité, donde se hizo la revisión de la Ceiba en campo con el secretario de medio ambiente.
- Atención a PQRS.
- Se da apertura a vacantes por la plataforma CAFABA, para la búsqueda del personal competente para laborar en el proyecto.
- Aplicación de instrumento de caracterización social.

3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

- A la fecha no se han realizado ensayos de control de calidad a materiales, dado a que el proyecto se encuentra en etapa preliminar y excavaciones.
- Las actividades de obra se han realizado siguiendo y respetando las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante y con aval de la interventoría.

3.9. CONTROL DE GARANTIAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato de obra, actualizadas por acta de inicio.

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	07 de marzo de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*04/07/2024*	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*06/03/2027*	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*05/03/2024*	$464.000.000,00

3.10. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el segundo mes de obra, se presentó en general un buen estado del clima, lo cual permitió la continuidad a los trabajos de obra. No obstante, algunos días presentaron lluvias fuertes, en los que la interventoría tomó la decisión de suspender actividades en esas franjas horarias.

	ABRIL																								MAYO				
HORA DEL	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
DÍA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
7:00-8:00																														
8:00-9:00																														
9:00-10:00																														
10:00-11:00																														
11:00-12:00																														
DESCANSO																														
13:30:-14:00																														
14:00-15:00																														
15:00-16:00																														
16:00-17:00																														

DOMINICALES TIEMPO SECO TIEMPO LLUVIOSO

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES

- En el periodo correspondiente a este informe, el contratista cumplió con las actividades realizadas de manera correcta y segura, siguiendo las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la interventoría.
- Dentro del avance programado del contrato evidenciamos a la fecha que se tiene un porcentaje de obra del 12.38% y se ha ejecutado un 8.47%, presentando una desviación negativa de **3.91%.**
- Durante el periodo que contempla este informe, se presentaron lluvias fuertes durante algunos días, lo cual representa una suspensión de labores de 7 horas en los 30 días.
- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.
- Con respecto a la tala del árbol de mayor tamaño (Ceiba), aún está por definir el permiso de tala y/o aprovechamiento forestal por parte da la CAS para proceder con la continuación de las actividades de excavaciones y cimentación del proyecto.
- El contrato no presenta el avance esperado según PDT, ya que se encuentra a la espera de la resolución para la intervención de la Ceiba por parte de la CAS, y adicional se esta en revisión el diseño estructural ya que presenta algunas irregularidades en la cimentación, lo cual afecta directamente el inicio de las actividades de excavación.
- Durante el periodo de este informe no se presentaron accidentes en la obra, ni sucesos donde los trabajadores sufrieran alguna lesión.

5. CAPITULO V. ANEXOS

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

OBJETO:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERCOMEDOR ITSI
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS SILVA RINCON
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-04-2023 AL 05-05-2023
DIRECCIÓN Y SECTOR:	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

FOTOGRAFÍA No 1 – DEMOLICIÓN D MUROS EN MAMPOSTERÍA ESP. 0,10m.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No. 2 – DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO.





FOTOGRAFÍA No.3 – DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE PLACA DE ENTREPISO DE BAÑOS ESP. 0,10m



RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

lo tiene todo. Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23



FOTOGRAFÍA No.4 – DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO EN CONCRETO CAFETERIA PRINCIPAL Y BAÑOS ESP. 0,10M



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23



FOTOGRAFÍA No.5 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO DEL ÁREA DE BAÑOS.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23



FOTOGRAFÍA No.6 – RETIRO ACOMETIDA DE GAS POR VANTI



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.7 COMITÉ DE OBRA ABRIL 19 / 2023



FOTOGRAFÍA No.8 – RETIRO DE RAICES



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.9 VISITA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE



FOTOGRAFÍA No.10 – INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA TEMPORAL





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.11 – IMPLANTACIÓN DE NIVELES POR TOPOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA No.12 – EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMUN



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

FOTOGRAFÍA No.13 – CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS





5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	9	4	2023	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	03/04/2023 AL 09/04/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	65,00%	1,54%	44,00%	1,04%	-21,00%	-0,50%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	15,00%	0,54%	1,98%	0,07%	-13,02%	-0,47%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	6,15%	2,08%	3,54%	1,11%	-2,62%	-0,97%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	3,38%	4,15%	-0,77%
Durante el periodo	0,18%	2,00%	-1,82%
Acumulado Actual	3,56%	6,15%	-2,59%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,78%	2,08%
Valor de la Obra Programada	$ 20.517.992,36	$ 54.682.823,35

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,04%	1,11%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.140.687,80	$ 29.260.971,77

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

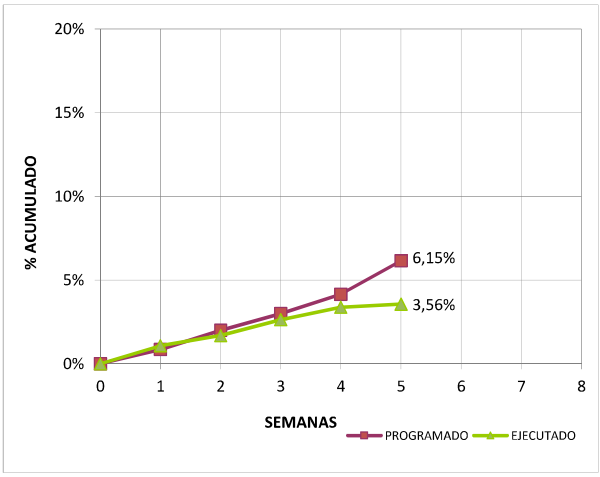

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	1	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	
OFICIAL	0			VIERNES	
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se continúa con la demolición de vigas en concreto en el área del comedor.
2. Se continúa con la demolición de las columnas de concreto en el área del comedor.
3. Se inicia el armado y fundida en concreto de la rampa de acceso del portón auxiliar.
4. Se realiza el desencofrado de las columnas y rampa fundidas del portón auxiliar.
5. Se realiza jornada de orden y aseo en toda el área de trabajo.

E. ADMINISTRATIVO

1. Durante este periodo no se solicitó ni se envió ninguna documentación.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra.

G. SOCIAL

1. Durante este periodo no segeneraron comentarios y/o observaciones del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se verifica por parte de la interventoría la realización de charlas diarias de SST a los trabajadores.
2. Se realiza revisión y aseguramiento de la lona verde de todo el cerramiento.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo no se generaron comentarios y/o observaciones del componente ambiental.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.



Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	9	4	2023	No. INFORME	5	SEMANA No. 5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 3 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de vigas en concreto.



FECHA FOTO: 3 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta y parrila para la construcción de la rampa y las escaleras de acceso del nuevo portón instalado.



FECHA FOTO: 3 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de vigas en concreto.



FECHA FOTO: 3 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de formaleta de las columnas fundidas.



FECHA FOTO: 4 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Fundida de escaleras y rampa de acceso en concreto.



FECHA FOTO: 5 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Desencofrado de columnas y rampa de acceso.

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	4	2023	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	6
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	10/04/2023 AL 16/04/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	78,00%	1,85%	90,00%	2,13%	12,00%	0,28%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	28,00%	1,01%	1,98%	0,07%	-26,02%	-0,94%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	8,15%	2,86%	7,08%	2,20%	-1,08%	-0,66%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	3,56%	6,15%	-2,59%
Durante el periodo	3,52%	2,00%	1,52%
Acumulado Actual	7,08%	8,15%	-1,07%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,78%	2,86%
Valor de la Obra Programada	$ 20.443.350,19	$ 75.107.079,77

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,09%	2,20%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 28.716.525,97	$ 57.888.035,51

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

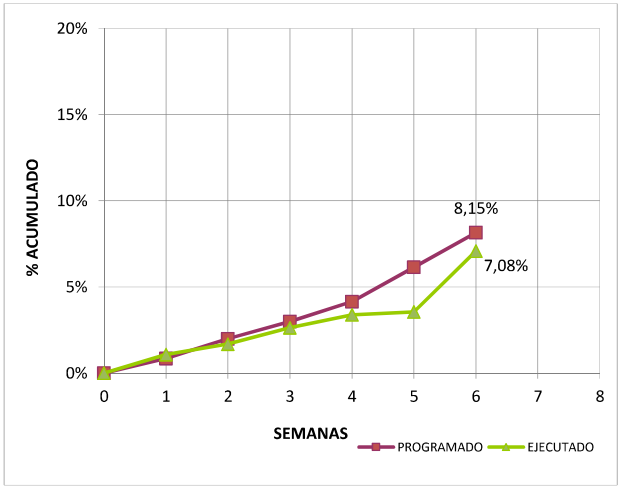

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	0	BOBCAT	1	JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se finaliza la actividad de demolición de mampostería en el área de los baños.
2. Finaliza la construcción del campamento y almacén de obra.
3. Se realiza jornada de orden y aseo en toda el área de trabajo.
4. Se realiza demolición de placa de entrepiso en área de los baños.
5. Se continúa con la demolición de vigas y columnas del área de los baños.
6. Se recibe visita por parte de la secretaria de infraestructura y el equipo de despacho de la alcaldía distrital, donde se hace un seguimiento a la obra.
7. Se realiza la actividad de demolición de la placa de contrapiso en el area del antiguo comedor.
8. Se realizó la demolición manual de concreto de las 2 rampas de inspección de vehiculos al costado de la Ceiba.
9. Se realiza jornada de orden y aseo en toda el área de trabajo y se retiran los escombros para el acopio temporal, antes de su disposición final.

E. ADMINISTRATIVO

1. Por parte de interventoría se emite comunicado, dando respuesta a la solicitud de suspención del contrato que pidió el contratista.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra.

G. SOCIAL

1. Se hace entrega oficial del pontón construido a la institución y se firma la respectiva acta de entrega con el Rector.
2. Se realiza entrega a la institución, de los elementos desmontados de la antigua estructura y se realiza su respectiva acta de entrega.

H. SST

1. Por parte del área HSE se realizan las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo.
2. Se realiza recambio de EPP a los trabajadores que lo necesitan.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza visita por parte de la secretaría de gestión del riesgo, donde se evalúa el estado actual de las 10 especies arboreas, donde ellos evidencian y concluyen que seis (6) de estas 10 especies deben ser taladas, debido a que representan un riesgo inminente para la infraestructura del colegio y los estudiantes.
2. Se realiza la tala de los árboles que se encontraban en condición de riesgo por parte de la secretaría de infraestructura.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.



Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	16	4	2023	No. INFORME	6	SEMANA No. 6
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de mampostería en área de baños.



FECHA FOTO: 10 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de escombros al área de acopio para proximo retiro en volqueta.



FECHA FOTO: 11 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Tala de árboles en el área de trabajo, por la secretaría de infraestructura.



FECHA FOTO: 13 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Charlas diarias de Seguridad y salud en el trabajo por parte del equipo HSE.



FECHA FOTO: 13 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de columnas y placa de entrepiso en el área de los baños.



FECHA FOTO: 13 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante hacia acopio temporal.

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	4	2023	2. No. INFORME	7	3. SEMANA No.	7
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	17/04/2023 AL 23/04/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	91,00%	2,15%	100,00%	2,37%	9,00%	0,21%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	41,00%	1,48%	9,62%	0,35%	-31,38%	-1,13%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	10,15%	3,64%	8,43%	2,72%	-1,72%	-0,92%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	7,08%	8,15%	-1,07%
Durante el periodo	1,35%	2,00%	-0,65%
Acumulado Actual	8,43%	10,15%	-1,72%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,78%	3,64%
Valor de la Obra Programada	$ 20.368.708,01	$ 95.531.336,19

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,52%	2,72%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 13.542.500,44	$ 71.359.906,73

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

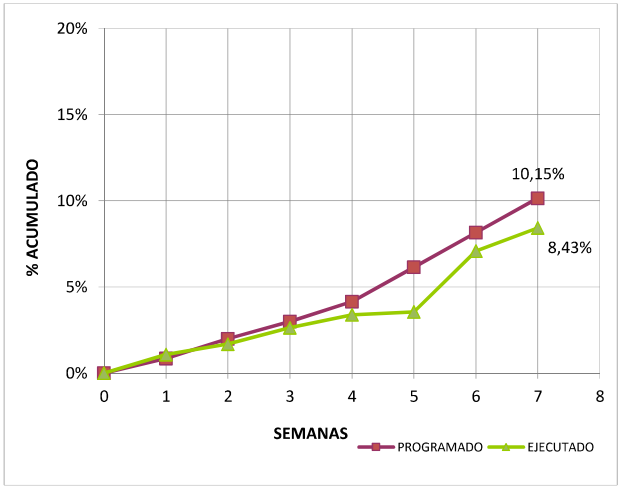

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELÉCTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	0	BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se realiza cargue y retiro de escombro hacia disposición final (Escombrera - Yondó).
2. Se pausan actividades forma momentanea por daño a linea de gas activa en la zona de trabajo. Se comunica de forma inmediata a VANTI, y ellos envían una cuadrilla de manera inmediata para atender esta emergencia.
3. Se realiza comité de obra, donde se revisa el diseño estructural y la intervención de la Ceiba. En este comité están presentes: La interventoría, el contratista y el equipo de supervisión de la secretaría de infraestructura.
4. La comisión topográfica realiza la ubicación y demarcación del punto DELTA en la obra para iniciar el replanteo del proyecto.
5. Se realiza la demolición de vigas de cimiento en el área de los baños.
6. Se realiza retiro de escombros hacia acopio temporal, para despejar zona de trabajo.
7. Se inicia la actividad de extracción de raices de los árboles talados por gestión del riesgo.
8. Topografía realiza el levantamiento topográfico de toda el área de trabajo y realiza la implantación del proyecto.

Observación 1: El día sabado 22 de abril, se presentaron fuertes lluvias en la jornada laboral, lo cual causó que no se realizaran actividades.

Observación 2: La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

E. ADMINISTRATIVO

1. Durante este periodo no se solicitó ni se envió ninguna documentación.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra.

G. SOCIAL

1. Se levanta acta de comité de seguimiento donde queda plasmado lo expuesto en la reunión y los compromisos surgidos.
2. Se levanta acta de reunión con el secretario de medio ambiente donde queda plasmado lo expuesto en la reunión y los compromisos adquiridos.

H. SST

1. Se rectifica la lona verde del cerramiento perimetral y demás zonas con cinta de peligro.
2. Se realizan las respectivas charlas diarias de SST por parte de la profesional HSE.
3. Se realiza jornada de orden y aseo de toda el área de trabajo.
4. Se delimita el paso peatonal con cinta de peligro, dentro del cerramiento de la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se recibe visita en la obra por parte del secretario de medio ambiente, para verificar el área de incidencia que tienen las raices de la Ceiba, con el diseño estructural.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	23	4	2023	No. INFORME	7	SEMANA No. 7
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Retiro de material sobrante (escombro) para disposición final.



FECHA FOTO: 18 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Demolición de vigas de cimiento del área de los baños.



FECHA FOTO: 19 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Demarcación de pasos peatonales con cinta de peligro.



FECHA FOTO: 24 de marzo de 2023
DESCRIPCIÓN: Levantamiento topográfico e implantación del proyecto.



FECHA FOTO: 21 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Comité de obra con el secretario de medio ambiente, para revisar la intervención de la Ceiba.



FECHA FOTO: 18 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Atención de emergencia por parte de la empresa VANTI por daño en línea de gas.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	4	2023	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	8
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	24/04/2023 AL 30/04/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	99,00%	2,34%	100,00%	2,37%	1,00%	0,02%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	48,00%	1,73%	9,62%	0,35%	-38,38%	-1,39%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	11,31%	4,08%	8,43%	2,72%	-2,88%	-1,36%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,43%	10,15%	-1,72%
Durante el periodo	0,00%	1,16%	-1,16%
Acumulado Actual	8,43%	11,31%	-2,88%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,44%	4,08%
Valor de la Obra Programada	$ 11.489.813,42	$ 107.151.340,19

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,00%	2,72%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 0,00	$ 71.359.906,73

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

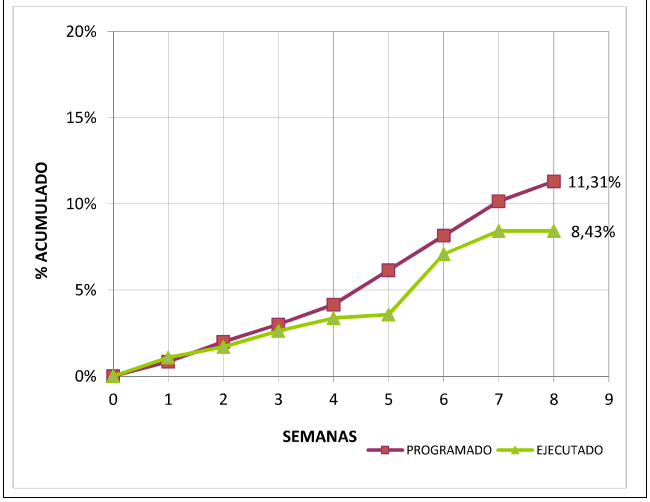

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	L
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	12	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Se continúa con la extracción de las raices de los árboles que fueron talados.
2. Cuadrilla de topografía hace nivelación del terreno para cálculo de volumenes de excavación y rellenos.
3. Se continúa instalación de acometida eléctrica temporal para la obra y campamento.
4. Se realiza jornada de orden y aseo general en toda la zona de trabajo.

Observación: La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional esta en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

E. ADMINISTRATIVO

1. Durante este periodo se recibió un oficio por parte del contratista, en el que se solicitó de manera formal respuesta a las observaciones presentadas del diseño estructural del proyecto, y solicitud de intervención de la Ceiba ante la CAS.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra.

G. SOCIAL

1. Se realizó solicitud ante CAFABA para la apertura de vacantes del personal necesario para la obra.

H. SST

1. Durante este periodo se verifica la realización de charlas diarias de SST.
2. Se realiza demarcación de sendero peatonal dentro de la obra afectado por las lluvias.
3. Se realiza aseguramiento de lona verde que cubre el cerramiento en lámina, el cual se afectó por las fuertes lluvias.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo no se generaron comentarios y/o observaciones en el componente ambiental.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	30	4	2023	No. INFORME	8	SEMANA No. 8

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 24 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Extracción de raices de los árboles talados.



FECHA FOTO: 24 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Extracción de raices de los árboles talados.



FECHA FOTO: 24 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Señalización de senderos peatonales en obra.



FECHA FOTO: 24 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Aseguramiento de lona verde que cubre el cerramiento en lámina.



FECHA FOTO: 26 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Levantamiento topográfico de niveles.



FECHA FOTO: 28 de abril de 2023
DESCRIPCIÓN: Instalación de acometida eléctrica para el campamento y

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Pág 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	5	2023	2. No. INFORME	9	3. SEMANA No.	9
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	01/05/2023 AL 07/05/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	61,00%	2,20%	10,12%	0,37%	-50,88%	-1,84%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	12,38%	4,57%	8,47%	2,73%	-3,91%	-1,84%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,43%	11,31%	-2,88%
Durante el periodo	0,04%	1,07%	-1,03%
Acumulado Actual	8,47%	12,38%	-3,91%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,49%	4,57%
Valor de la Obra Programada	$ 12.882.658,91	$ 120.107.666,94

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,01%	2,73%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 350.952,63	$ 71.834.291,32

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

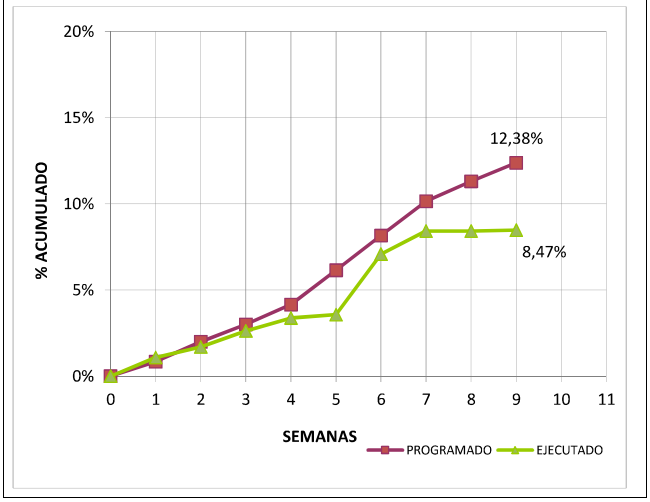

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	5	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	12	MARTES	S
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Finaliza la instalación de la acometida eléctrica del campamento de la obra.
2. Se continúa con la extracción de las raices de los árboles que fueron talados por gestión del riesgo.
3. Se inicia la actividad de excavación manual de material común, buscando el nivel demarcado por topografía.
4. Se realiza movimiento de material sobrante hacia acopio temporal en obra, para luego ser retirado a disposición final.
5. Se realiza jornada de orden y aseo general en toda la zona de trabajo.

Observación: La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional esta en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Se atienden los requerimientos de los padres de familia, personal del colegio y personal foraneo que tiene dudas o preguntas acerca del proyecto.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST.
2. Se realiza cambio y demarcación de sendero peatonal que se encuentra en mal estado.
3. Se verifica por la interventoría que el contratista cambie periodicamente los EPP's que se encuentren en mal estado.
4. Se realiza aseguramiento de lona verde que cubre el cerramiento en lámina, el cual se afectó por el paso del tiempo.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo no se generaron comentarios y/o observaciones en el componente ambiental.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: LEONARDO MANTILLA NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN:	7	5	2023	No. INFORME	9	SEMANA No. 9
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 02 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Extracción de raices de los árboles talados.



FECHA FOTO: 03 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual del terreno y retiro de material a acopio temporal.



FECHA FOTO: 04 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Charla diaria de SST por parte del profesional HSE.



FECHA FOTO: 03 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual del terreno y retiro de material a acopio temporal.



FECHA FOTO: 02 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Conexión final de acometida eléctrica para campamento.



FECHA FOTO: 04 de mayo de 2023
DESCRIPCIÓN: Excavación manual del terreno demarcado por topografía.

5.3. BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 05 de abril de 2023 / Miercoles.

- Se inician labores a las 7:00 am con la respectiva charla de SST.
- Se realiza jornada de orden y aseo con el retiro de escombros del área de trabajo.
- Se realiza revisión y aseguramiento de la lona verde de todo el cerramiento.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 10 de abril de 2023 / Lunes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla HSE.
- Se realiza visita por parte de la secretaría de gestión del riesgo, donde se evalua el estado actual de las 10 especies arboreas, en donde ellos evidencian y concluyen que 6 de estas 10 especies deben ser taladas, debido a que representan un riesgo para la infraestructura del colegio y las personas. Por lo cual, ellas autorizan la tala de estos arboles.
- Se finaliza la actividad de demolición de mampostería, con una cantidad de ($79.52 m^2$).
- La interventoría da respuesta al oficio de suspensión de contrato, que fue enviado por el contratista el dia 01 de abril de 2023.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 11 de abril de 2023 / Martes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am, con la respectiva charla HSE.
- se finaliza la construcción del campamento y almacen de la obra.
- Se realiza jornada de orden y aseo en el área de trabajo.
- Se realizo la tala de los árboles que se encontraban en condición de riesgo, por parte de la secretaría de Infraestructura. Razón por la cual no se pudo continuar con la actividad de demolición.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 12 de abril de 2023 / Miercoles.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am, con la charla dirigido por el profesional HSE.
- Se realiza la tala del árbol de mango que estaba pendiente por parte de la secretaría de Infraestructura, lo cuál impidió continuar con las actividades de demolición. ejecutadas por el contratista.
- Se hace entrega oficial al Rector de la institución, del portón nuevo para el acceso de los estudiante.
- Se funde solado en el área destinada para oficina en el campamento de la obra.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 13 de abril de 2023 / Jueves

- Se inician las actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla HSE.
- Ingresa minicargador con martillo, para continuar con las actividades de demolición.
- Se realiza la actividad de demolición de placa de entrepiso en los baños, con una cantidad de (59,13 m^2).
- Se realiza la actividad de demolición de vigas en el área de los baños, con una cantidad de (43,6 ml).
- Se realiza la actividad de demolición de columnas en concreto, con una cantidad de (22,8 ml).
- Se realiza retiro de elementos desmontados del área del comedor, y son entregados a la institución, realizando su respectiva acta de entrega.
- Se recibe visita por parte de la secretaría de infraestructura y el despacho de la alcaldía distrital, donde se hace seguimiento a la obra.

Residente de interventoría

Residente de obra.

Fecha: 14 de abril de 2023 / Viernes

- Se inician actividades de obra a los 7:00 am con la charla de seguridad y salud en el trabajo.
- Se inicia la actividad de demolición del contrapiso en el área de comedor, con una cantidad de (357,3 m^2).
- Se continúa con la entrega a la institución, de los elementos desmontados de la estructura antigua.
- Se realiza jornada de orden y aseo en todo el área de trabajo.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 15 de abril de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla SST
- Se realizó la demolición manual de concreto de las dos rampas para inspección de vehículos. (16,2 m^2)
- Se continúa con la demolición de la placa de contrapiso del área del comedor. Esta actividad se realiza con minicargador. Se demolió un total de (146,58 m^2).
- Se inicia acopio de escombros con bobcat para proxima disposición Final.

Residente de interventoría

Residente de obra.

Fecha: 17 de abril de 2023 / Lunes

- Se inician las actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla SST.
- Se realiza cargue y retiro de escombros, una cantidad de (80 m^3).
- Orden y aseo general de la obra.
- Se rectifica cerramiento perimetral

Residente de interventoría Residente de obra

Fecha: 18 de abril de 2023 / Martes.

- Se inician las actividades de obra a las 7:00 am con la charla HSE.
- Se realiza cargue y retiro de escombro, una cantidad de (152 m^3).
- Durante la actividad de demolición de las vigas de cimiento en el área de baños, se causo rotura de linea de gas domiciliaria, a lo cual se pausaron actividades y se comunicó de forma inmediata a emergencias VANTI.
- Personal de VANTI ingresa a las 5:00 pm a realizar taponamiento e inspección de acometida existente en la obra.

Residente de interventoría Residente de obra.

Fecha: 19 de abril de 2023 / Miercoles

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla SST.
- Se realiza comite de obra, donde participan, la supervición, interventoría, y contratista, con el Fin de revisar el diseño estructural del proyecto y la intervención de la ceiba. Se levanta acta de reunión donde queda el registro de los temas y compromisos tratados en el comite.
- se Finaliza la actividad de demolición de vigas de Cimiento en el área de los baños, con una cantidad de (39,20 ml).
- Personal de VANTI realiza trabajos de retiro de la acometida de gas de la obra.
- La comisión topográFica realiza instalación y ubicación de punto DELTA en la obra para iniciar el replanteo del proyecto.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 20 de abril de 2023 / Jueves

- Inicio el retiro de raices, de los árboles talados.
- Orden y aseo general y retiro de escombros para acopio temporal.
- la obra no presenta el avance esperado según el PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural dado que presentan algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla HSE.
- Desde el área HSE, se delimita el área de trabajo y senderos peatonales.

Residente de interventoría — Residente de obra.

Fecha: 21 de abril de 2023 / Viernes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla SST.
- Se recibe visita en obra por parte del secretario de medio ambiente para verificar el área de incidencia de la Ceiba en la obra. De esta reunión se levanta un acta en la cual se plasman todos los temas tratados y compromisos pactados.
- Se continúa con la extracción de las raíces de los árboles que fueras talados.
- Cuadrilla de topografía realiza levantamiento topográfico e implantación del proyecto.
- Orden y aseo general de la obra, con retiro de escombros hacia acopio temporal.
- La obra no presenta el avance esperado según el PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural dado que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

Residente de interventoría — Residente de obra.

Fecha: 22 de abril de 2023 / Sábado

- Se presentan fuertes lluvias durante toda la jornada laboral, motivo por lo cuál, no se realiza ninguna actividad.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 24 de abril de 2023 / Lunes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla HSE.
- Se presentan fuertes lluvias de 8:00 am a 10:00 am por lo cuál se suspenden actividades en ese horario.
- Se continúa con la extracción de las raices de los árboles que fueron talados.
- Se realiza aseguramiento de lona verde que cubre el cerramiento, la cual se afectó por las lluvias.
- La obra no presenta el avance esperado según el POT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural dado que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

Residente de interventoría


Residente de obra.

Fecha: 25 de abril de 2023 / Martes

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla HSE.
- Se inicia la instalación de acometida eléctrica temporal para la obra y campamento.
- Se continúa con la extracción de las raices de los árboles que fueron talados.
- La obra no presenta el avance esperado según el PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.
- Se envía oficio por el contratista solicitando pronta respuesta a las inquietudes del diseño estructural y la tala de la Ceiba.



Residente de interventoría



Residente de obra


Fecha: 26 de abril de 2023 / Miercoles.

- Se inician las actividades de obra a las 7:00 am con la charla SST.
- Se continúa con la instalación de acometida electrica temporal para la obra y campamento.
- Se continúa con la extracción de las raices de los árboles que fueron talados.
- Cuadrilla de topografía realiza la toma de niveles del proyecto en obra para cálculo de volumenes de excavación y rellenos.
- La obra no presenta el avance esperado según el PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño

estructural, dado que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.




Residente de Interventoría




Residente de obra

Fecha: 27 de abril de 2023 / Jueves.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla SST.
- Se continúa instalación de acometida eléctrica temporal para la obra y campamento.
- Se continúa con la extracción de las raices de los árboles talados.
- La obra no presenta el avance esperado según el PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.



Residente de Interventoría



Residente de obra

Fecha: 28 de abril de 2023 / Viernes.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla diaria por el profesional HSE.
- Se continúa con la instalación de la acometida eléctrica de la obra y el campamento.

- Se continúa con la extracción de las raíces de los árboles talados por gestión del riesgo.
- La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado q que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 29 de abril de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra con la respectiva charla HSE.
- Se continúa con la extracción de las raíces de los árboles talados por gestión del riesgo.
- Se realiza jornada de orden y aseo en toda el área de trabajo.
- Se realiza rectificación del cerramiento perimetral en su lona verde.
- La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 2 de mayo de 2023 / Martes.

- Se inician actividades de obra con la respectiva charla SST por parte del profesional HSE.
- Se termina la instalación de la acometida eléctrica en el campamento.
- Se continúa con la extracción de raices de los arboles talados por gestión del riesgo.
- La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

Residente de interventoría Residente de obra

Fecha: 3 de mayo de 2023 / Miercoles.

- Se inician las actividades de obra a las 7:00 am con la respectiva charla SST.
- Se inicia excavación manual de material común, buscando el nivel cero (0) de terreno natural, demarcado por topografía. Cantidad ejecutada ($2\ m^3$).
- Se realiza retiro de material excavado para acopio temporal.
- Se realiza demarcación de paso peatonal y excavaciones con cinta de peligro.
- La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta

algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

- El contratista envía desgloce AIU, APU de cerramiento y Portón para revisión.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 4 de mayo de 2023 / Jueves.

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla SST.
- Se continúa con la excavación manual del terreno, buscando el nivel demarcado por topografía. Cantidad ejecutada ($3\ m^3$).
- Se continúa con el retiro de material sobrante para acopio temporal en obra.
- Se realiza jornada de orden y aseo en toda el área de trabajo.
- La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

Residente de interventoría

Residente de Obra

Fecha: 5 de mayo de 2023 / Viernes

- Se inician actividades de obra con la charla SST impartida por el profesional HSE.
- Se continúa con la excavación manual del terreno, buscando el nivel cero (0) demarcado por topografía. Cantidad ejecutada ($2m^3$)
- Se continúa con el retiro del material excavado hacia acopio temporal dentro de la obra, para ser retirado proximamente.
- Se realiza jornada de orden y aseo general.
- La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta algunas irregularidades, que afectan directamente el inicio de las actividades de cimentación.

Residente de interventoría

Residente de obra

Fecha: 6 de mayo de 2023 / Sábado

- Se inician actividades de obra a las 7:00 am con la charla HSE
- Se continúa con la excavación manual del terreno buscando el nivel demarcado por topografía, cantidad ejecutada ($1 m^3$).
- Se realiza jornada de orden y aseo en el campamento de la obra.
- La obra no presenta el avance esperado según PDT, dado a que se encuentra a la espera del permiso para intervenir la Ceiba. Adicional está en revisión el diseño estructural, dado a que presenta

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2028569259	9449548059	E	2023/05/26	2023/05/17	BANCO DE BOGOTA	0	$2,646,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102370870	GARZON ANDRES	X																	230301	30	$2,828,000	$452,500	EPS005	30	$2,828,000	$113,200	CCF40	30	$2,828,000	$113,200	14-4	30	$2,828,000	$196,900	30	$0	$0	Si	$875,800
2	CC	91280656	GOMEZ FERNAN	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	91522770	PRADA RANCER	X																	25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS017	30	$3,400,000	$136,000	CCF40	30	$3,400,000	$136,000	14-4	30	$3,400,000	$236,700	30	$0	$0	Si	$1,052,700
4	CC	91258439	MANTILLA LEONARDO	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(4)**																						$8,548,000	$1,367,700			$8,548,000	$342,000			$8,548,000	$342,000			$8,548,000	$595,200		$0	$0		$2,646,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2028569259	9449548059	E	2023/05/26	2023/05/17	BANCO DE BOGOTA	0	$2,646,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,367,700	$0	$0	$1,367,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$729,600	$0	$0	$729,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$638,100	$0	$0	$638,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$595,200	$0	$0	$595,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$595,200	$0	$0	$595,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$342,000	$0	$0	$342,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$342,000	$0	$0	$342,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$136,000	$0	$0	$136,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,200	$0	$0	$113,200
TOTAL				4	$2,646,900	$0	$0	$2,646,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CRA 22 52B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2123377128	9452025373	E	2023/05/13	2023/05/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,813,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (9 Afiliados)																							$21,401,506	$3,496,200			$22,901,506	$916,500			$22,184,163	$887,700			$22,901,506		$1,513,000		$0	$0		$6,813,400
Centro de Trabajo: UNICA (9 Afiliados)																							$21,401,506	$3,496,200			$22,901,506	$916,500			$22,184,163	$887,700			$22,901,506		$1,513,000		$0	$0		$6,813,400
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)																							$21,401,506	$3,496,200			$22,901,506	$916,500			$22,184,163	$887,700			$22,901,506		$1,513,000		$0	$0		$6,813,400
1	CC	1096800274	AMAYA CAMILA																		23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
2	CC	1005240083	DEVIA SANTIAGO											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
3	CC	1005240083	DEVIA SANTIAGO																		23030 1	28	$1,493,334	$239,000	EPS037	28	$1,493,334	$59,800	CCF40	28	$1,493,334	$59,800	14-4	28	$1,493,334	6.960%	$104,000	28	$0	$0	Si	$462,600
4	CC	1096241286	GENEY URIBE																		23030	30	$1,400,00	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,569,443	$62,800	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$440,300
5	CC	13884628	GOMEZ JORGE																			0	$0	$0	EPS041	14	$840,000	$33,600	CCF40	14	$840,000	$33,600	14-4	14	$840,000	6.960%	$58,500	14	$0	$0	Si	$125,700
6	CC	1095807710	MERCADO HENRY											X							23030 1	2	$323,632	$55,200	EPS037	2	$323,632	$13,000	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$323,632	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$68,200
7	CC	1095807710	MERCADO HENRY																		23030 1	28	$6,796,263	$1,155,500	EPS037	28	$6,796,263	$271,900	CCF40	28	$6,796,263	$271,900	14-4	28	$6,796,263	6.960%	$473,100	28	$0	$0	Si	$2,172,400
8	CC	1098767102	MORENO DANIELA																		23030 1	30	$4,427,653	$708,500	EPS005	30	$4,427,653	$177,200	CCF40	30	$4,427,653	$177,200	14-4	30	$4,427,653	6.960%	$308,200	30	$0	$0	Si	$1,371,100
9	CC	1096200026	PADILLA DAYRO		X															X	23030 1	15	$1,369,422	$219,200	EPS017	15	$1,369,422	$54,800	CCF40	15	$1,654,714	$66,200	14-4	15	$1,369,422	6.960%	$95,400	15	$0	$0	Si	$435,600
10	CC	1099553662	PINEDA DANIEL	X																	23030 1	15	$1,369,422	$219,200	EPS041	15	$1,369,422	$54,800	CCF40	15	$1,369,422	$54,800	14-4	15	$1,369,422	6.960%	$95,400	15	$0	$0	Si	$424,200
11	CC	1096240780	SALOM WILLY		X															X	23020 1	21	$1,400,000	$224,000	EPS005	21	$1,400,000	$56,000	CCF40	21	$1,569,443	$62,800	14-4	21	$1,400,000	6.960%	$97,500	21	$0	$0	Si	$440,300
12	CC	1033774093	VARGAS DURLEY											X							23030 1	2	$111,112	$17,800	EPS037	2	$111,112	$4,500	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$111,112	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$22,300
13	CC	1033774093	VARGAS DURLEY																		23030 1	28	$2,333,334	$373,400	EPS037	28	$2,333,334	$93,400	CCF40	28	$2,333,334	$93,400	14-4	28	$2,333,334	6.960%	$162,500	28	$0	$0	Si	$722,700
Total			**Afiliados(9)**																				$21,401,506	$3,496,200			$22,901,506	$916,500			$22,184,163	$887,700			$22,901,506		$1,513,000		$0	$0		$6,813,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CRA 22 52B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2123377128	9452025373	E	2023/05/13	2023/05/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,813,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,496,200	$0	$0	$3,496,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,000,200	$0	$0	$3,000,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$496,000	$0	$0	$496,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,513,000	$0	$0	$1,513,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$1,513,000	$0	$0	$1,513,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$887,700	$0	$0	$887,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	$887,700	$0	$0	$887,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$916,500	$0	$0	$916,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$54,800	$0	$0	$54,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$513,700	$0	$0	$513,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,800	$0	$0	$114,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$233,200	$0	$0	$233,200
TOTAL				9	$6,813,400	$0	$0	$6,813,400

5.5. LIQUIDACIÓN, PAGO, RESOLUCIÓN DEL PMT Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

Libertad y Orden

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NIT. 890270948

Dirección: Carrera 2 No. 50 - 25 - Barrancabermeja Teléfono(s): 2571922

CONTRATO DE CONCESIÓN 068
CONSORCIO ISTB
NIT. 901139967-3

RECIBO DE PAGO

Nombre	WRUSSY INGENIEROS SAS	**Identificación**	901109885	**Placa**	
No. Motor		**Fecha**	17/05/2023	**Recibo**	877506

TRÁMITES LIQUIDADOS

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO x 2 | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO x 2

Cantidad	Conceptos	Valor
1	Plan Manejo Transito	$2.320.035
1	Formato de Factura Otros Tramites	$27.067
VALOR TOTAL A PAGAR		**$2.347.102**

---USUARIO - Liquidado por EMMA VILARDI---

Nombre	WRUSSY INGENIEROS SAS	**Identificación**	901109885	**Placa**	
No.Motor		**Fecha**	17/05/2023 11:44:39 a.m.	**Recibo**	877506

Cantidad	Conceptos	VALOR
1	Plan Manejo Transito	$2.320.035
1	Formato de Factura Otros Tramites	$27.067
Valor total		$2.347.102
Trámites	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO x 2	

---ITTB DAVIVIENDA 146269993011---

FAVOR PAGARSE EXCLUSIVAMENTE EN EL BANCO DAVIVIENDA. FECHA LIMITE DE PAGO (dd/mm/aaaa) 25/05/2023

ITTB DAVIVIENDA 146269993011 - $ 2.347.102

(415)7709998943155(8020)000877506(3900)00023471 02(96)20230525



BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 18/05/2023 Hora: 15:03:16
Jornada: Normal
Oficina: 4661
Terminal: CJ4661W703
Usuario: HV2

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
TRAMITES INSPECCION DE TRANSITO
Cuenta Convenio: ********3011
Código Convenio: 1206234
No. de Referencia 1:
000877506
Forma de Pago: Tarjeta Débito
Número de Tarjeta: ******1522
Vr. Total: $2,347,102.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 104424

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 19445221

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

RESOLUCIÓN NÚMERO DIR23000495 DE 2023
(Mayo 18 de 2023)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA A WRUSSY INGENIEROS SAS EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

LA DIRECTORA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 769 de 2.002 y,

CONSIDERANDO:

1. Que es función de las autoridades de tránsito autorizar el cierre temporal de vías, norma contemplada en los artículos 99 y 119 de la Ley 769 de 2.002.
2. Que el Artículo 101 de la Ley 769 de 2002, establece que siempre que se efectúen trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de la labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas.
3. Que el Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 0001885 de 2.015, adopta el Manual de Señalización Vial, que en su capítulo 4 establece las medidas de Señalización y seguridad para obras en la Vía pública (Planes de Manejo de Tránsito - PMT). Cuando se ejecutan obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, acopio autorizado de materiales de construcción, o actividades relacionadas con servicios públicos o emergencias en una determinada vía, o en zona adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que pueden afectar la circulación de personas y vehículos; dichas situaciones deben ser atendidas especialmente, aplicando normas y medidas técnicas apropiadas que se incorporan al desarrollo del proyecto, cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios. Así mismo, la instalación de la señalización de calles y carreteras afectadas por obras civiles deberá diseñarse e instalarse de acuerdo con los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debidamente aprobados por la autoridad competente.
4. Que la firma WRUSSY INGENIERO SAS, con NIT 901109885-1, presentó solicitud el día 28 de marzo de 2023 ante la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja para revisión y aprobación del Plan de Manejo de Tránsito en desarrollo del contrato de obra pública No. 0756-23: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", el cual cuenta con Licencia de construcción en modalidades de obra Nueva y demolición total mediante Resolución No. 68081-1-22-RS-0815 de noviembre 10 de 2022 emanada de la Curaduría Urbana No. 1 de Barrancabermeja, con la Interventoría de UT INTERCOMEDOR ITSI con NIT 901683399-1 y entidad contratante la Alcaldía del Distrito de Barrancabermeja, bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Distrital.
5. Que una vez revisado el contenido del PMT, se encuentra ajustado a los requerimientos establecidos en el manual de señalización y corresponde con la magnitud y nivel de afectación de las actividades a desarrollar, perteneciendo a la Categoría II – Obras de interferencias moderadas. contempla cierre parcial y temporal de un carril en las vías aledañas, acompañado de la señalización descrita en el documento del PMT. Se validó en el sistema SIOT el pago de los derechos Causados por la revisión y aprobación del PMT, según recibo oficial No. 877506 de fecha 18/05/2023.

Continuación Resolución No. DIR23000495 de 2023.

R E S U E L V E:


ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar a WRUSSY INGENIERO SAS, con NIT. 901109885-1, el Plan de Manejo de Tránsito en desarrollo del contrato de obra pública No. 0756-23: "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" en el sector de la carrera 28 No. 55-10 en la comuna dos del Distrito de Barrancabermeja, por el término de un año, contados a partir del 18 de Mayo de 2023 hasta el 17 de mayo de 2024, según el avance del siguiente cronograma.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

WRUSSY INGENIEROS S.A.S														
CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA														
ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	2												
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	3												
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	8												
4	MAMPOSTERÍA Y FRISOS	4												
5	CARPINTERÍA EN ACERO Y ALUMINIO	3												
6	CARPINTERIA EN MADERA Y GRANITO	1												
7	PISOS Y MUROS (ACABADOS)	5												
8	CUBIERTA	3												
9	ELEMENTOS SANITARIOS Y DE COCINA	1												
10	URBANISMO	2												
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS	8												
12	INSTALACIONES SANITARIAS	8												
13	ALCANTARILLADO	8												
14	INSTALACIONES DE GAS	2												
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	2												
16	SISTEMA DE COMUNICACIONES	1												
17	EQUIPOS DE COCINA	2												
18	OTROS	2												
19	DOTACIÓN	1												
20	ASEO	1												

Fuente: Documento PMT WRussy Ingenieros Sas.

ARTICULO SEGUNDO: El Documento del Plan de Manejo de Tránsito, contempla un cierre parcial y temporal de un carril sobre la carrera 31 entre calles 55ª y Diagonal 49, para realizar la conexión de la nueva red de alcantarillado al pozo de inspección.

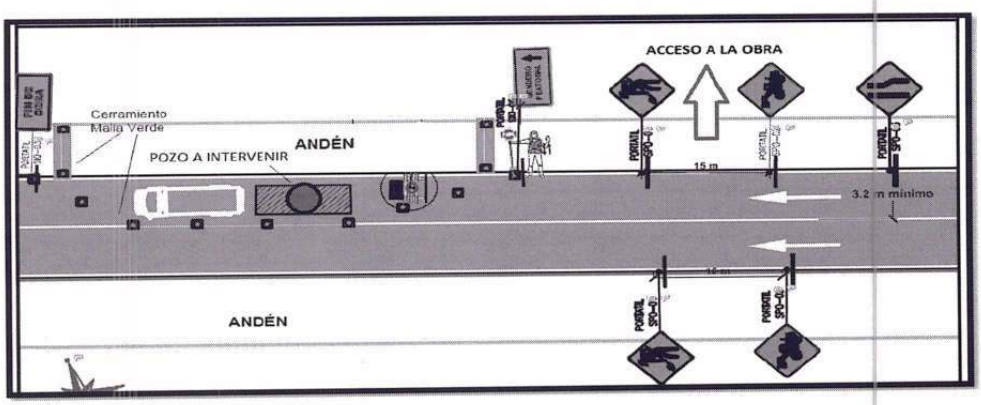

Continuación Resolución No. DIR23000495 de 2023.

El PMT estará sujeto a modificaciones según el avance y desarrollo de las obras, y sus actualizaciones serán radicadas mediante oficio en la ITTB, y formarán parte integral de este acto administrativo.

ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION COMEDOR DEL ITSI.



Fuente: Documento PMT WRussy Ingenieros Sas

ARTICULO TERCERO: Los responsables de las obras, deberán tomar las precauciones y suministrar los elementos de seguridad necesarios para su normal desarrollo en la vía pública, señalizándolos de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 1885 de 2015. Una vez terminada la intervención retirar los dispositivos de control de tránsito, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente.

ARTICULO CUARTO: Las autoridades de Tránsito serán las encargadas de controlar y vigilar el cumplimiento de la presente Resolución, conforme con la Ley 769 de 2.002.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Expedida en Barrancabermeja, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2023.

ELISA FERNANDA PEÑA REYES
Directora ITTB

	Nombre del Funcionario	Firma	Fecha
Proyectó :	Emma Vilardi Cañarete - Prof. Esp. División Técnica		18/05/2023
Revisó:	Fabiola Guarín – Prof. Esp. Divisón Jurídica ITTB		18/05/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Arq. Jose Yair Caicedo Palacios
Curaduria Urbana 1

CURADURIA URBANA N° 1 - Barrancabermeja
ARQ. Jose Yair Caicedo Palacios
CURADOR URBANO

No DE RADICACIÓN	PÁGINA
68081-1-22-0231	1
FECHA DE RADICACIÓN	
06-jul-22	
RADICACIÓN LEGAL Y DEB. FORMA	
07-jul-22	
FECHA EXPEDICION: 28-oct-22	
FECHA EJECUTORIA: 10 NOV 2022	

LICENCIA N° 68081-1-22-RS-0815

EL CURADOR URBANO N° 1 DE BARRANCABERMEJA, JOSE YAIR CAICEDO PALACIOS, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES CONFERIDAS POR EL DECRETO DISTRITAL 2030 DE AGOSTO DE 2022 Y EN EJERCICIO DE LA LEY 388 DE JULIO 18 DE 1997, REFORMADA POR LA LEY 810 DEL 13 DE JUNIO DE 2003; COMPILADAS POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1077 DEL 26 DE MAYO DE 2015, MODIFICADO POR EL DECRETO 2218 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO 1783 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021; EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO 033 DE MARZO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTÓ EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BARRANCABEREJA"; Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y EN CONSIDERACIÓN DEL ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD RADICADA:

RESUELVE

OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA(S) MODALIDAD(ES) DE DEMOLICIÓN TOTAL, OBRA NUEVA PARA UN PROYECTO DOTACIONAL DE TIPO EDUCATIVO (COMEDOR) EN EL PREDIO LOCALIZADO EN LA(S) DIRECCION(ES): KR 28 52 02 08 (ACTUAL) -, CON MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S) # 303-14999 Y CED. CATASTRAL(ES) 01-02-0167-0001-000, URBANIZACIÓN/BARRIO/VEREDA: GALAN , COMUNA/LOC./SECTOR: COMUNA 2, TITULAR(ES): DISTRITO BARRANCABERMEJA (SANTANDER) NIT / CC: 890201900-6 REP. LEGAL: ALFONSO ELJACH MANRRIQUE CC. 79780077, ARQUITECTO PROYECTISTA: AMAURY RAFAEL ARROYO GARAY, MATRÍCULA: A682220008-91526450, CC: 91526450; INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL: ROLANDO FONSECA ARZUZA, MATRÍCULA: 25202-79218, CC: 91436300; INGENIERO CIVIL GEOTECNISTA: NEYER BARREÑO , MATRÍCULA: 68202-180667, CC: 91542253; URBANIZADOR/PARCELADOR: FABIAN AREVALO , MATRÍCULA: A680320000, CC: 91473480; DIRECTOR DE LA CONSTRUCCION: FABIAN AREVALO , MATRÍCULA: A680320000, CC: 91473480; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1. MARCO NORMATIVO

1.1 POT Acuerdo 033	Area de Actividad: Institucional - Dotacional	Tratamiento: Consolidación Urbana TC2	
1.1.2 ZN AD. Circular 027	13-jul-22	a. CZon/Polig. N/A	d. Resolución: N/A
1.2 ZN RIESGO	a. Remoción en Masa: NO APLICA	b. Inundación: NO APLICA	
1.3 MICRO-ZONIFICACIÓN	NA No Aplica		

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO

2.1 USOS		2.2 ESTACION.				2.4 SIS. CONSTRUCTIVO	2.5 Estrato	2.6 Tipo VIS
DESCRIPCIÓN USO	ESCALA	UN	P.Res	V-Pub	Blc.	LOTEO INDIVIDUAL	EST-5	NO APLICA
DOTACIONAL DE EDUCACION	NIVEL 2	1	1	0	0			

3. CUADRO DE AREAS

3.1 NOMBRE DEL EDIFICIO O PROYECTO:	
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COCINA DE USO DOTACIONAL EDUCATIVO	
3.2 AREAS PROYECTO ARQUITECTÓNICO (M²)	
LOTE	21,750.00
SÓTANO	0.00
SEMISÓTANO	0.00
PRIMER PISO	1,092.82
PISOS RESTANTES	0.00
3.3 TOTAL CONSTRUIDO	1,092.82
LIBRE PRIMER PISO	20,657.18

3.4 AREAS CONSTRUIDAS	O. Nueva	Reconoc.	Ampl.	SUBTOT	Adec.	Modif.	Reforzam.	TOT
Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio - Oficinas - Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Institucional - Dotacional	1,092.82	0.00	0.00	1,092.82	0.00	0.00	0.00	1,092.82
Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agricultura , Ganaderia y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERVENIDO	1,092.82	0.00	0.00	1,092.82	0.00	0.00	0.00	1,092.82
GESTION ANTERIOR:				00.00	MT LINEALES DE CERRAMIENTO:			N/A
TOTAL CONSTRUIDO:				1,092.82	N/A.			00.00

4. EDIFICABILIDAD

4.1 VOLUMETRÍA

a. No. PISOS	i. HAB./Ex	1	ii. NoHAB	0	
b. ALTURA EN MTS	9.12	Y	0	Y	0
c. SÓTANOS					0
d. SEMISÓTANO					NO
e. No. EDIFICIOS					0
f. ETAPAS CONSTRUCCION					0
g. 1er PISO EQUIP. Y/O ESTACION.					NO
h. M2 BAJO CUBIERTA INCLINADA/ALTILLO					NO
i. INDICE DE OCUPACIÓN					0.05
j. INDICE DE CONSTRUCCIÓN					0.05

4.2 TIPOLOGÍA Y AISLAMIENTOS

a. TIPOLOGIA	AISLADA			
b. AISLAMIENTOS	MTS	NIVEL		
a. LATERAL	N/A	N/A		
b. LATERAL 2(*)	N/A	N/A		
c. POSTERIOR	N/A	N/A		
d. POSTERIOR 2(*)	N/A	N/A		
e. ENTRE EDIFICACIONES	1	Y	N/A	(*) Apl. predios esquin
f. EMPATES Y PATIOS	N/A	X	N/A	N/A
g. OTROS	N/A			

4.3 ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO

a. ANTEJARDIN
5 Mts POR: KR 28
N/A
b. CERRAMIENTO
NO
Mts N/A ALTURA N/A
c. VOLADIZO
N/A
N/A
d. RETROCESOS
N/A

4.4 EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO

DESTINACIÓN	%	Mts
ZONAS RECREATIVAS	N/A	N/A
SERVICIOS COMUNALES	N/A	N/A
ESTACION. ADICIONALES	N/A	N/A

4.5 ESTRUCTURAS

TIPO CIMENTACIÓN: Zapatas aisladas	GRADO DE DESEMPEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCT.: BAJO.A.9.2.1.c
TIPO ESTRUCTURA: Pórticos de concreto reforzado	MÉTODO DE DISEÑO: Método de la resistencia última
	ANALISIS SISMICO: Método de la fuerza horizontal equivalente

5. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE LICENCIA

Planos Arquitectónicos	5	Planos Estructurales del proyecto	0	Estudio de Suelos	1
Memoria de Cálculos y diseños Estructurales	1				

6. PRECISIONES

1.Que, en virtud del proceso de empalme entre el curador saliente y el entrante, y teniendo que los expedientes fueron recibidos el 5 de septiembre del año en curso, se emitió la Resolución 68081-1-22-0759, por medio de la cual se prorrogaron los términos para resolución final de las licencias, encontrándose este expediente en dicho acto administrativo.

7. INFORMACION DE TRIBUTOS

# Imp./Rec.: 8345	F.: 29-ago-22 Valor: $ 3,065,865.00	Tipo: Delineación Urbana	
# Imp./Rec.: 2502200539745	F.: 14-sept-22 Valor: $ 1,093,000.00	Tipo: Estamp./UIS	

8. VIGENCIA

VIGENCIA: ESTA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE TREINTA Y SEIS (36) MESES PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ POR DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU EJECUTORIA, SEGÚN EL ARTICULO 2.2.6.1.2.4.1 DEL DECRETO UNICO NACIONAL 1077 DE 2015, MODIFICADO POR EL ARTICULO 21 DEL DECRETO NACIONAL 1783 DE 2021.

CONTINUA EN CAPITULO 9. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA

IMPRESO EN: 04-nov-22

CURADURIA URBANA UNO DE BARRANCABERMEJA
APROBADO
Fecha 28 OCT 2022

CURADURIA URBANA UNO DE BARRANCABERMEJA
EJECUTORIADO
Fecha 10 NOV 2022

CURADURIA 1 DE BARRANCABERMEJA

Curador Urbano N° 1	Revisión Arquitectónica	Revisión Estructural	Revisión Jurídica
Jose Yair Caicedo Palacios	CHRIS AMARO ORTIZ M. P. No. 68202017-1152187498	OSCAR MOYANO SARMIENTO M. P. N° 25202-169832 CND	CARO. INA FLOREZ OLIVARES T. P. N° 241101 CSJ

9. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA

Este acto administrativo se expide con base en la información presentada por el solicitante y conforme a su explícita manifestación de voluntad. En consecuencia, cualquier diferencia que pueda existir entre la información presentada y la realidad física o legal del inmueble será exclusiva responsabilidad del solicitante.

En caso de presentarse cambio de alguno de los profesionales responsables se deberá designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra, el cual asumirá la totalidad de las obligaciones correspondientes. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el titular de la licencia asumirá la responsabilidad de las obligaciones del profesional y/o a las que hubiera lugar.

El solicitante está obligado a instalar y mantener una valla durante todo el término de ejecución de las obras, conforme lo establecido en el Articulo 2.2.6.1.4.9 del Decreto Nacional 1077 de 2015. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.

Ejecutar las obras garantizando la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público. El replanteo será de entera responsabilidad del constructor responsable; éste está obligado a respetar el espacio público y los predios vecinos, y en ningún caso podrá construir sobre estos.

Esta licencia no autoriza tala de árboles, ni excavaciones o similares en el espacio público para lo cual se debe consultar a la autoridad competente. En caso de requerir para la ejecución de las obras ocupación y/o intervención del espacio publico, el titular deberá solicitar la respetiva licencia ante la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público o la entidad competente.

Se deben adoptar las medidas de insonorización requeridas para garantizar el mantenimiento de los niveles máximos de ruido permitido para cada uso, según el sector en el cual se localicen, de conformidad con la normativa nacional y distrital vigente.

Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, así mismo dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o el Distrito en ejercicio de sus competencias.

El titular de la licencia que aquí se expide se obliga a cumplir con las disposiciones aplicables y contenidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas que lo desarrollen, modifiquen o sustituyan. Igualmente se obliga a cumplir con las disposiciones de los demás contenidas en el RETILAP, en las nuevas construcciones que involucren la iluminación de zonas y vías públicas.

El titular de la licencia se obliga a cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico para redes Internas de Telecomunicaciones RITEL y las normas que lo desarrollen, modifiquen o sustituyan.

El titular de la licencia se obliga a cumplir con las normas vigentes de carácter nacional o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.

Durante la ejecución de las obras se deberán realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción sismo resistentes. Así mismo las nuevas construcciones deben tener en cuenta el aislamiento por deriva, separación sísmica según lo estipulado en la tabla A.6.5-1 NSR 10 y deben cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente.

Los proyectos con área mayor a dos mil (2.000) metros cuadrados deberán cumplir con lo señalado en el titulo I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10 y deberán someterse a la supervisión técnica independiente correspondiente.

De acuerdo con en el parágrafo 3 del Artículo 18 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 4 de la Ley 1796 de 2016, la supervisión técnica independiente se exigirá sin perjuicio de la obligación que tiene el constructor de realizar todos los ensayos de comprobación técnica de calidad de los materiales y demás controles de calidad que la ley y sus reglamentos exigen para garantizar que la edificación se ejecute de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobados en la respectiva licencia. Para ello, el constructor responsable, durante el desarrollo de la obra, deberá contar con la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotécnista responsables de los planos y estudios aprobados, quienes deberán atender las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o el supervisor técnico independiente. Tales consultas y aclaraciones deberán quedar registradas y documentadas en las actas del proceso de supervisión de la obra.

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 32 del decreto 1783 de 2021 las obras que no requirieren supervisión técnica independiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 400 de 1997 modificado por el artículo 5 de la Ley 1796 de 2016, la responsabilidad frente al cumplimiento de las normas sismo resistente en la ejecución de la obra, recae exclusivamente sobre el titular de la licencia urbanística y el constructor responsable del proyecto.

Cuando sea aplicable, deberán obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

En las licencias de construcción, cuando sea aplicable, solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 13 del Decreto 1203 de 2017.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6. del DECRETO No. 0394 de 28 de noviembre de 2019. que en el acto de reconocimiento se deberán incorporar; cuando las condiciones de seguridad, estabilidad, habitabilidad, salubridad y/o funcionalidad no sean las adecuadas, las obligaciones para el ajuste posterior de la edificación a las normas de sismo-resistencia y a las normas urbanísticas y arquitectónicas señaladas en el POT, para lo cual el acto de reconocimiento otorgará un plazo máximo de veinticuatro (24) meses sin posibilidad de prórroga, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la licencia, para que el interesado ejecute estas obras.

En los proyectos que requieren supervisión técnica independiente, deberán remitir copia a las autoridades competentes de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quién es el responsable de esta obligación.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el(a) titular subsanó dentro de los términos establecidos por la ley las observaciones técnicas, jurídicas, estructurales, urbanística y arquitectónicas del proyecto, dándole con ello viabilidad a la expedición de la licencia..

En cumplimiento del principio legal de publicidad y con el objeto de que los terceros interesados puedan ejercer sus derechos, la solitud de la licencia fue debidamente comunicada a los vecinos a través de citación a vecinos.

Los curadores urbanos en ejercicio del principio de la buena fe dan tramite a las licencias y demás requerimientos de acuerdo con los documentos aportados por los solicitantes, en desarrollo de su competencia; correspondiendo a otras autoridades las funciones de control urbano.

Fin del contenido de este acto administrativo.

NOTIFICACION PERSONAL

Trámite	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD DE OBRA NUEVA
Dirección Predio:	KR 28 58 02/08
Acto Administrativo:	68081-1-22-RS-0815

En Barrancabermeja D.E. a los 10, días del mes de noviembre, de 2022, se notifica al Señor (a) heyner mancera, identificado con cédula de ciudadanía No. 91296589, expedida en Bucaramanga actuando en calidad de Apoderado, a quien se notificó personalmente del acto administrativo **No. 68081-22-RS-0815**, proferido por este despacho 28/10/2022, haciendo con ello entrega integra, autentica y gratuita de la misma

En constancia de lo anterior, firmo como aparece y manifiesto: Renuncio a Termino de ejecutoria

El notificado: H/ HEYNER MANCERA R — Firma y cédula

Nombre y apellidos

La notificadora: CLARA CHAVES — Firma y cédula 1098737441

Nombre y apellido

CURADURIA URBANA UNO
DE BARRANCABERMEJA
ENVIADO

CONSTANCIA No. CE-22- 0382

Expediente No. 68081-1-22-0231

Fecha 10 NOV 2022

Firma

5.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Barrancabermeja, 10 de abril de 2023

Señores:
WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
ATN. ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ref: Contrato de interventoría N° 0757-23 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"

Asunto:	**Respuesta a solicitud de suspensión del contrato oficio 0009-0756 DEL CONTRATO N° 0756-23 "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA"**

Cordial saludo,

Por medio de la presente ponemos en contexto nuestra respuesta a la solicitud de suspensión del contrato.

Una suspensión en este momento carece de fundamentos necesarios, ya que todavía existen varias actividades de obra que se pueden realizar, sin que los árboles interfieran en estas, a lo cual se puede dar un avance al proyecto. Entre las actividades a realizar y sus respectivas cantidades por ejecutar, en el ítem de PRELIMINARES están:


- DEMOLICIÓN DE PLACA ENTREPISO EN ÁREA DE BAÑOS – CANT: 59,13 m^2
- DEMOLICIÓN DE VIGAS EN ÁREA DE BAÑOS – CANT: 43,40 ml
- DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN ÁREA DE BAÑOS – CANT: 22,80 ml
- DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO – CANT: 449,88 m^2
- DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA – CANT: 78 m2
- DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO RAMPA CARROS – CANT: 16,20 m^3

Por otro lado, después de terminar con las anteriores actividades, se procederá a realizar la localización topográfica, marcando todos los puntos, niveles y mediante el uso de hilos para demarcar toda el área de la cimentación. Con estos puntos se puede iniciar la actividad de FIGURADO DE HIERRO DE LAS VIGAS DE AMARRE Y ZAPATAS de toda el área de trabajo.

En la Figura 1 que se presenta a continuación se resalta la zona en color naranja, en la que se pueden iniciar las respectivas EXCAVACIONES MANUALES, y proceder con la construcción de zapatas y vigas, ya que en esa zona no hay interferencia de ningún árbol ni raíces. Adicionalmente, en ese sector se encuentran 2 pozos de inspección de alcantarillado, los cuales deben ser reubicados hacia un costado para que no interfieran con la cimentación.

UT. INTERCOMEDOR ITSI


Figura 1. Plano de cimentación general.

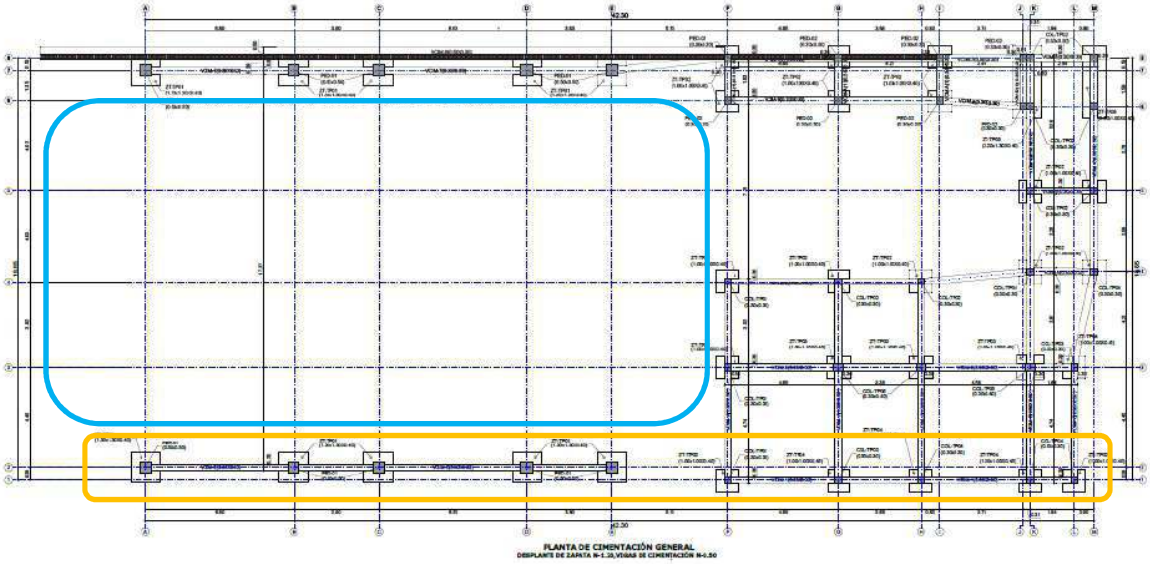

Por otro lado, el contratista puede dar inicio y continuidad a la actividad de RELLENOS con material de recebo, esto con el fin de darle el nivel adecuado a toda el área resaltada en azul.

En la figura 2 se puede evidenciar el atraso que se tiene a día de hoy, el cual genera preocupación, ya que, según el PDT presentado inicialmente, vemos que a medida que avanza el tiempo, este porcentaje negativo va creciendo y hasta la fecha no se han tomado las acciones necesarias para mejorar los tiempos de ejecución de las actividades (ingreso de nuevo personal y la maquinaria necesaria).

Figura 2. Gráfica de avance de obra.

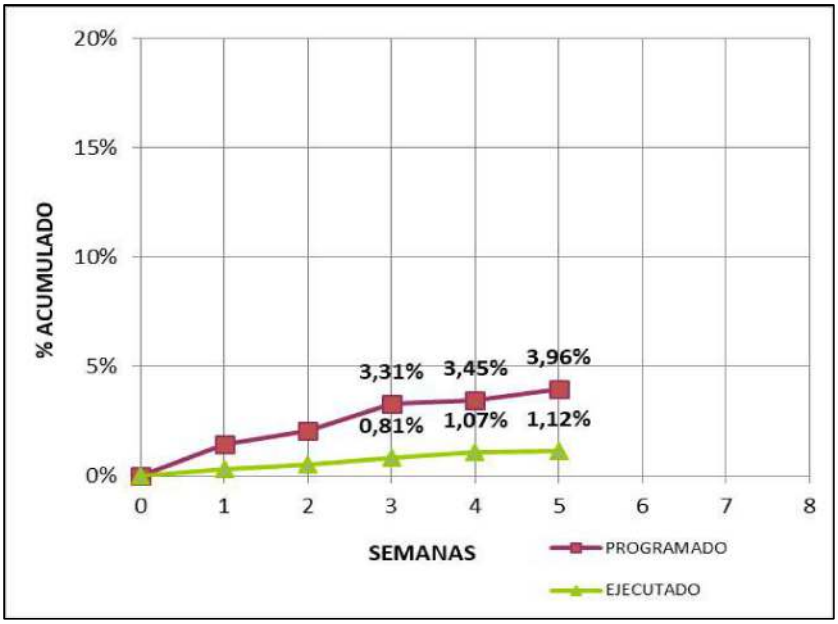


Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT. INTERCOMEDOR ITSI

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, vemos como interventoría, que todavía se puede avanzar en varias actividades, antes de tomar una decisión como la de suspender el contrato. A su vez, también vemos que, si en un corto plazo no se emite el permiso de tala de las 10 especies arbóreas y se realiza esta actividad, no se podrá continuar con la ejecución de esta obra, ya que estas especies arbóreas interfieren directamente en la cimentación de toda el área de la Figura 1 que no está subrayada.

Cordialmente,



LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R/L UT. INTERCOMEDOR ITSI

Carrera 22 No.52B-60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 Barrio Torcoroma
Celular 314 412 1030, E-mail: fmcconstructoresltda@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0258-WR-2023

Bogotá,14 de abril de 2023

0010-0756-BARRANCA

Señores
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION REPROGRAMACION DE OBRA

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de referencia Nos permitimos radicar los siguientes documentos

Anexos

- Programación de obra

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0266-WR-2023

Bogotá,18 de abril de 2023

0011-0756-BARRANCA

Señores
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: RADICACION OBSERVACIONES DISEÑO Y PLANOS ESTRUCTURALES

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de referencia Nos permitimos radicar los siguientes documentos

Anexos

- Documento observaciones diseño y planos estructurales
- COPNIA ING Cristian Pardo
- TP ING Cristian Pardo
- Título de maestría ING Cristian Pardo

Quedamos atentos a la respuesta.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

Cristhian Duvan Pardo Perez
Ingeniero Civil
Msc Ingeniería Civil – Énfasis en estructuras

Bogotá, Abril 16 de 2023

Señores

A quien corresponda

Asunto: Revisión diseño y planos estructurales

- 2107-ITS-M1V1-MC
- 2107-ITS-M1V1-PL

De lo cual anexo revisión estructural de los mismos, comentarios que a consideración del constructor deben ser aclarados, corregidos e incluidos en la siguiente revisión de los planos e informe

Cordialmente



Cristhian Duvan Pardo Perez

Ingeniero Civil

MP 25202-357565 CND

C.C. Archivo

Anexo. Lo anunciado

ZONA DE CAFETERIA					
No	**ITEM**	**Presenta**	**No presenta**	**Presenta con comentarios**	**Observación**
1	Zona de amenaza sísmica		X		
2	Capacidad de disipación de energía	X			DMO
3	Sistema estructural	X			PRM
4	Ubicación	X			Barrancabermeja
5	Zona de amenaza sísmica	X			Intermedia
6	Tipo de suelo	X			D, Debe estar acorde al estudio de suelos
7	Ro básico de diseño	X			5
8	R de diseño	X			3.375
9	Sobre resistencia		X		Especificar el valor de la sobre resistencia
10	Irregularidades			X	No se evidencia la justificación de redundancia, recordar que es un comparativo de rigidez antes y después de la perdida de capacidad a momento de una de las vigas así como verificación de irregularidad torsional luego de la falla, se solicita incluirla para justificar el 0.75 adoptado
11	Capacidad portante del suelo	X			1480 kPa
12	Nivel de desplante	X			1.20m desde la superficie del terreno
13	Sistema de cimentación	X			Cimentación superficial, zapatas aisladas y vigas de amarre
14	Resistencia del concreto	X			21 Mpa para el sistema estructural, 14 MPa para losa de entrepiso
15	Acero de refuerzo	X			Grado 60
16	Acero estructural	X			A500 Gr C
17	Acero platinas	X			A36
18	Pernos	X			SAE Gr8
19	Soldadura	X			E 60xx
20	Definición del material de concreto en el modelo			X	Se indica la correcta asignación del módulo, se requiere indicar la resistencia tomada en el Design Property
21	Presenta secciones estructurales	X			Presenta
22	Presenta asignación de perfiles estructurales			X	Se solicita aclarar la sección 2P-8-14 sección no definida, la sección VB35X15 n se encuentra asignada
23	Grupo de uso	X			1.25
24	Espectro elástico de diseño	X			Presenta
25	Aceleración sísmica de diseño	X			Presenta
26	Base reaction DEAD	X			1055.64 kN
27	Fuerza sísmica en la base	X			742 kN FHE
28	Torsión accidental	X			5% de la longitud del diafragma
29	Fuerzas sísmicas asignadas al modelo	X			
30	Definición del diafragma		X		Se solicita indicar en la memoria la definición y asignación del diafragma
31	Derivas			X	No especifica para que combinaciones, debe ser para la envolvente de cargas de B.2.4 con sismo sin reducir. Se solicita aclarar en el informe
32	Método de análisis sísmico	X			Fuerza horizontal equivalente
33	Asignación de cargas al modelo	X			
34	Diseño de vigas			X	Si bien el módulo de diseño está con el ACI 318, la cuantía colocada en las vigas no debe ser menor a la cuantía mínima, se solicita aclarar en el capitulo 9.1 el acero adoptado para cada tramo. También en la figura 7 se presenta una viga en voladizo fallando. También se solicita indicar todos los requerimientos de detallamiento especificados en C.21 para una viga DMO así como los detalles del refuerzo suministrado
35	Acero de refuerzo de columnas			X	Se solicita incluir una nueva imagen la cual presente la cuantía de diseño para cada columna, se solicita incluir esquemas con el acero de refuerzo longitudinal adoptado para cada sección. Se solicita incluir un diagrama de interacción para cada sección de columna con el acero de refuerzo suministrado. Se solicita incluir los requerimientos de detallamiento de refuerzo para una columna DMO
36	Análisis de viento	X			Presenta análisis de viento - Arquimet
37	Cargas de viento	X			Incluidas en el modelo
38	Release en elementos metálicos		X		No se presentan imágenes d elso release asignados, no se sabe que conexiones son a cortante
39	Módulo de diseño metálico		X		No se presenta el Steel Frame Design, el diseño es un IMF, intermediate moment frame, la filosofía de diseño es por método directo o longitud efectiva? Las conexiones se están diseñando con sobre resistencia? Los perfiles cumplen con los requisitos sísmicos a nivel de ductilidad?. Un índice de sobreesfuerzo no dice nada si no se cuenta con los criterios de diseño para su revisión
40	Diseño de conexión a momento			X	Se presenta conexión a momento, especificar si se diseña con sobre resistencia
41	Diseño de conexión a cortante		X		No presenta diseño de conexión a corte, se solicita
42	Diseño de vigas de amarre			X	Las vigas de amarre deben diseñarse para tomar el momento generado en las mismas por asentamientos diferenciales, se solicita incluir este momento adicional. Se debe especificar que estas vigas no toman los momentos sísmicos, es lo que se evidencia en la memoria
43	Diseño de zapatas			X	No se especifica el momento en la base, no especifica la amplificación del momento en la base por el nivel de desplante, no especifica la amplificación de esfuerzos en la zapata por los momentos bidireccionales. El diseño de la cimentación no puede ser solo por carga vertical, la altura de la zapata debe garantizar la longitud de desarrollo de la barra de la columna
44	Diseño de elementos no estructurales		X		
45	Diseño de losa de contrapiso		X		
46	Sección compuesta lámina colaborante		X		La lámina colaborante trabaja en sección compuesta?
47	Verificación de columna fuerte viga débil		X		Se debe realizar la verificación para el pórtico de 2 niveles
48	Diseño de anclaje químico		X		Se evidencia en planimetría anclajes post instalados pero no hay diseño

No ítems	48
Presenta	28
No presenta	11
Presenta con comentarios	9

DOCUMENTO
2107-ITS-M1V1-MC

OBSERVACIONES

El diseño de la cimentación no presenta el nivel de detalle para un proyecto de construcción
Justificar porque se tienen anclajes post instalados en elementos estructurales nuevos

ZONA COMEDORES						
No	**ITEM**	**Presenta**	**No presenta**	**Presenta con comentarios**	**No aplica**	**Observación**
1	Zona de amenaza sísmica		X			
2	Capacidad de disipación de energía	X				
3	Sistema estructural	X				Se presenta, capitulo 14.1
4	Ubicación	X				Barrancabermeja
5	Zona de amenaza sísmica	X				Intermedia
6	Tipo de suelo	X				D, Debe estar acorde al estudio de suelos
7	Ro básico de diseño			X		Cuando se trate de estructuras de acero donde las uniones del sistema de resistencia sísmica son soldadas en obra, el valor de Ro debe multiplicarse por 0.9
8	R de diseño			X		Cuando se trate de estructuras de acero donde las uniones del sistema de resistencia sísmica son soldadas en obra, el valor de Ro debe multiplicarse por 0.9
9	Sobre resistencia		X			Especificar el valor de la sobre resistencia
10	Irregularidades		X			Se solicita justificar los valores de reducción
11	Capacidad portante del suelo	X				1480 kPa
12	Nivel de desplante	X				1.20m desde la superficie del terreno
13	Sistema de cimentación	X				Cimentación superficial, zapatas aisladas y vigas de amarre
14	Resistencia del concreto	X				21 Mpa para el sistema estructural, 14 MPa para losa de entrepiso
15	Acero de refuerzo	X				Grado 60
16	Acero estructural	X				A500 Gr C
17	Acero platinas	X				A36
18	Pernos	X				SAE Gr8
19	Soldadura	X				E 60xx
20	Definición del material de concreto en el modelo				X	
21	Presenta secciones estructurales			X		Se presentan pero no presentan su definición en el modelo
22	Presenta asignación de perfiles estructurales	X				Presentadas en la figura 11, 12, 13 y 14
23	Grupo de uso	X				1.25
24	Espectro elástico de diseño	X				Presenta
25	Aceleración sísmica de diseño	X				Presenta
26	Base reaction DEAD	X				
27	Fuerza sísmica en la base	X				
28	Torsión accidental				X	No hay diafragma rígido
29	Fuerzas sísmicas asignadas al modelo	X	.			
30	Definición del diafragma				X	
31	Derivas			X		No especifica para que combinaciones, debe ser para la envolvente de cargas de B.2.4 con sismo sin reducir. Se solicita aclarar en el informe
32	Método de análisis sísmico	X				Fuerza horizontal equivalente
33	Asignación de cargas al modelo	X				
34	Diseño de vigas				X	
35	Acero de refuerzo de columnas				X	
36	Análisis de viento		X			Se solicita especificar como se obtuvo la carga de 0.65 kN/m2
37	Cargas de viento	X				Incluidas en el modelo
38	Release en elementos metálicos		X			No se presentan imágenes de los release asignados, no se sabe que conexiones son a cortante
39	Módulo de diseño metálico		X			No se presenta el Steel Frame Design, el diseño es un IMF, intermediate moment frame, la filosofía de diseño es por método directo o longitud efectiva? Las conexiones se están diseñando con sobre resistencia? Los perfiles cumplen con los requisitos sísmicos a nivel de ductilidad?. Un índice de sobreesfuerzo no dice nada si no se cuenta con los criterios de diseño para su revisión
40	Diseño de conexión a momento			X		Se presenta conexión a momento, especificar si se diseña con sobre resistencia
41	Diseño de conexión a cortante		X			
42	Diseño de vigas de amarre		X			
43	Diseño de zapatas		X			
44	Diseño de elementos no estructurales		X			
45	Diseño de correas	X				
46	Estabilidad a volcamiento			X		El análisis debe ser bidireccional, no se especifica si son cargas de servicio, los factores de seguridad mínimos deben ser acorde a la tabla H.6.9-1 de la NSR-10
47	Estabilidad a deslizamiento			X		Especificar cual es el coeficiente de fricción, es un suelo cohesivo?, se contempla el nivel freático en cas de presentarse?
48	Cargas ficticias		X			Si está diseñando por método directo debe incluir las notional loads por imperfecciones
49	Efectos de segundo orden		X			Se deben considerar los efectos P- delta
50	Control de deformaciones		X			Se debe garantizar que las deformaciones en los elementos estructurales cumplan los requerimientos a nivel de servicio, está verificación no se incluye en la memoria de diseño
51	Contravientos		X			No se especifican contravientos en el diseño
52	Cargas de fachada		X			
53	Diseño de pedestales		X			
54	Valores de KL/r		X			Presentar el valor de KL/r para las columnas, se tienen columnas tubulares con un módulo de sección bajo y una altura de más de 7m
55	Diseño de anclaje de cerca a estructura de concreto		X			

No ítems	55
Presenta	25
No presenta	18
Presenta con comentarios	7
No aplica	5

DOCUMENTO
2107-ITS-M1V1-MC

OBSERVACIONES

El diseño de la cimentación no presenta el nivel de detalle para un proyecto de construcción
El diseñador debe garantizar que se desarrolla los niveles de ductilidad para un sistema DMO, esto no está claro en la memoria
En la cubierta se presentan apoyos tipo rodillo en la cubierta, no queda claro por que está definición, no queda claro si se están transmitiendo cargas a otra estructura
Reconsiderar el R de diseño con lo especificado en el punto 7 y 8
Esta estructura debe ser diseñada con los requerimientos para naves industriales
Considero que para está estructura con la altura de columnas que tiene, las derivas están dando muy bajas en el análisis, recomiendo revisar la asignación de las mismas
Para el cálculo de la fuerzas sísmicas, los elementos de fachada adosados a los perfiles se deben acelerar (La fuerza sísmica aumenta)

ITEM	PLANOS 2107-ITS-M1V1-PL
1	No presenta detalle de juntas de dilatación entre el pedestal de columnas y losa de contrapiso
2	No presenta recomendación de juntas para losa de contrapiso para evitar fisuras por retracción y temperatura
3	Se presentan detalles de elementos no estructurales pero no hay memoria
4	No se ven claros los conectores de cortante para el sistema de lámina colaborante, la losa trabaja en sección compuesta?
3	Verificar el sentido de las correas de la cubierta, en algunos cortes se indican paralelas a la luz de 18m
4	No se especifica sistema de manejo de aguas lluvia
5	No se especifica concreto de limpieza bajo las cimentaciones
6	No se especifica el talud de excavación para los cimientos
7	No hay especificaciones del material del préstamo
8	No hay especificaciones para el suelo compactado
9	No se especifica el grado de desempeño de los elementos no estructurales
10	El despiece de las vigas no presenta zona de confinamiento según C.21, estribos muy espaciados en los extremos en vigas de cimentación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1971439

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CRISTHIAN DUVAN PARDO PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1031145009, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-357565 desde el 28 de Abril de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 477.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Abril del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

SOLO PARA TRAMITE DE MANTA

Matrícula Profesional No.
25202-357565 CND
Fecha de Expedición: **28/04/2017**

Nombre:
CRISTHIAN DUVAN
PARDO PEREZ
Identificación:
C C. 1031145009

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BOGOTÁ D.C.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Consejo Superior, y el Rector de la Universidad de los Andes
con las debidas autorizaciones legales y teniendo en cuenta que

Cristhian Duván Pardo Pérez

C. C. 1.031.145.009

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorgan, con los derechos y obligaciones correspondientes, el diploma de

Magíster en Ingeniería Civil

El Presidente del Consejo Superior | La Rectora (E) | La Decana de la Facultad | La Secretaria General

Bogotá D.C., 05 de abril de 2022
REGISTRADO: LIBRO 18 FOLIO 13

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

005978

Escaneado con CamScanner

Universidad de los Andes

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
RECONOCIMIENTO COMO UNIVERSIDAD: DECRETO 1297 DEL 30 DE MAYO DE 1964
RECONOCIMIENTO PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 28 DEL 23 DE FEBRERO DE 1949 MINJUSTICIA
NIT. 860.007.386-1

C E R T I F I C A:

Que el señor CRISTHIAN DUVAN PARDO PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.031.145.009, recibió el título de MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL el 05 de abril del año 2022, de acuerdo al acta 248 libro 18 folio 13 de la misma fecha. El señor Pardo cursó su programa de maestría con el énfasis en ESTRUCTURAS, SÍSMICA Y MATERIALES. ESTA CONSTANCIA SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO.

JUANA MARGARITA LOPERA DONCEL
Jefe
Oficina de Registro

Bogotá, abril 05 de 2022
M.Peña

Dirección de Admisiones y Registro
Calle 18 A No. 0 -33 Este; Bloque E Bogotá, Colombia Tels.: [571] 3394949 – 3394999 Exts.: 2210 - 2216 Fax: [571] 3324469 Apartado aéreo: 4976 http://registro.uniandes.edu.co - admreg@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Escaneado con CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

0280-WR-2023

Bogotá,25 de abril de 2023

0013-0756-BARRANCA

Señores
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: OBSERVACIONES TEMAS ESTRUCTURALES Y DEFINICIO CEIBA

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de referencia nos permitimos solicitar a la interventoría respuesta de los siguientes puntos:

- **Definición de intervención de Ceiba**: tal y como se evidencia en el levantamiento topográfico adjunto se puede ver que el árbol Ceiba interfiere con la estructura que la zapata mas próxima se encuentra a una distancia de 1.30 m, para lo cual una vez se inicien los trabajos de excavación y cimentación esta estructura de zapata estará dentro de las raíces de la Ceiba, para ello se solicita que la CAS “CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER “ y la secretaria de infraestructura defina las acciones a realizar dado lo anteriormente expuesto por el contratista de obra
- **Revisión de observaciones diseño estructural:** el día 18 de abril de 2023 el contratista de obra mediante oficio 0013-0756-BARRANCA, realizo mediante nuestro especialista estructural una serie de observaciones a los diseños y planos estructurales las cuales no han sido resueltas y por ende no se ha podido avanzar en las actividades de excavación y armado y fundida de la cimentación, esto nos representara retrasos tanto en la programación de obra presentada como en la adquisición de insumos y mano de obra para la ejecución de estas actividades anteriormente mencionadas.

Solicitamos a la interventoría respuesta a estas situaciones dado que estas situaciones expuestas generarán retrasos a la programación los cuales no serán imputables al contratista

Anexos

- oficio 0013-0756-BARRANCA
- levantamiento topográfico formato DWG y PDF

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

0298-WR-2023

Bogotá, 3 de mayo de de 2023

0014-0756-BARRANCA

Señores
Dra. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
R.L UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 0756-23 “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

ASUNTO: OBSERVACIONES TEMAS ESTRUCTURALES Y DEFINICIO CEIBA

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de referencia nos permitimos radicar los siguientes documentos:

Anexos

- Cálculo del AIU
- Apus ítems no previstos

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá

5.7. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**ACTA DE ENTREGA**	**CÓDIGO DE-FOR-01**
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 19-04-2023 **HORA: 7:00 AM** **LUGAR: I.T.SI** **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Alcaldía de Barrancabermeja
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión de seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor y cocina del I.T.S.I en el distrito de Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Juan Carlos Silva
APUNTADOR	Yesenia Alvarez Morales
ASISTENTES	Contratista, Contratante, Supervisores e interventoría.

TEMAS DE DISCUSIÓN
Comité de seguimiento de obra, contratista, supervisión del contrato e interventoría.
Reunión convocada para tratar los siguientes temas:
1. Intervención Árbol Ceiba
2. Revisión diseño estructural del proyecto

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Tema 1. Intervención del Árbol Ceiba.
Se analizan las diferentes opciones de intervención (tala, poda, construcción de contenedor de raíces), dado a que el árbol se encuentra en el área de influencia del proyecto. A su al redor estará ubicado el mayor porcentaje de estructuras a construir.
Durante el desarrollo de la reunión se menciona que la alcaldía ya se encuentra adelantando los diferentes permisos ante la CAS.

Tema 2. Revisión del diseño estructural del proyecto.

De acuerdo con el concepto tecnico estructural emitido por el contratista, sobre el diseño de la cimentación a construir; se analizó de manera conjunta con el equipo estructural de la supervisión y la interventoría llegando a la conclusión de que se debe realizar nuevamente la modelación de la estructura proyectada y su comportamiento, para que de esta manera dar respuesta al contratista y continuar con las actividades de excavación y cimentación del proyecto.

CONCLUSIONES

Se debe tener un concepto tecnico del profesional forestal quien dictaminara la decisión sobre la Ceiba.
Realizar la respectiva socialización sobre dicho concepto a la comunidad del área de influencia.

COMPROMISOS

- Por parte de la contratista se debe emitir un concepto tecnico forestal, social y cultural, como soporte y justificación de la tala del árbol por interferencia en el proyecto.
- Se debe realizar la socialización de dicho concepto ante la comunidad del área de influencia del proyecto.
- Por parte de la interventoría se debe emitir un concepto tecnico estructural sobre el diseño existente, el cual será enviado junto con el concepto del contratista a la supervisión, para su revisión por parte del equipo consultor.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Wilson Rafael Cano V.	Interventora	
Fabio A. Moños	Interventorio	
Andrés Garzón M.	Ing. Residente Int.	
Rafael M Senegal A	Ing SST Interventoria	
Paola Andrea Pinzón Pulido	Ingeniera S.E.D.	
Juan Carlos Soto A	Prof. Univ. - Soc. Infra	
Luisa Orozco	Sec. de Infraest	
Wilver F. Duque C.	Residente Legal	
Camila Hoyos	Seguimiento Proyectos Despacho Alcaldía-Apoyo	
Cesar Narvaez	Ing. Residente Contrat.	
Yesenia Alvarez M.	Trabajadora Social	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 21-04-23 HORA: 8:30 AM LUGAR: I.T.S.I. ACTA NO.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Juan Carlos Silva.
TIPO DE REUNIÓN	Intervención de la Ceiba.
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DE LA REUNION	construcción y dotación del comedor y cocina del Instituto Tecnico superior Industrial en el distrito de Bermeja
ORGANIZADOR	Juan Carlos Silva
APUNTADOR	Yesenia Alvarez morales.
ASISTENTES	Contratista, Ing Foresta de Sec. Medio Ambiente, Interventoria

TEMAS DE DISCUSIÓN
Intervención de la Ceiba

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN
El ingeniero Forestal de la secretaria de Medio ambiente revisó el concepto dado por el ingeniero forestal de la contratista, manifestando que no esta de acuerdo con el concepto emitido, argumentando que la Ceiba esta en buenas condiciones y las raices no afectanan.

Powered by CamScanner

Se procede a validar nuevamente la especie arborea y observa que posiblemente el arbol obstruye la Construcción de la cimentación del comedor.

CONCLUSIONES

Realizar el dia lunes un comite de reunion con todo el equipo de trabajo para definir lo anteriormente expuesto.

COMPROMISOS

Por parte del contratista hacer la implantación real de la cimentación en obra para tomar decisiones sobre la intervención de la Ceiba

Powered by CamScanner

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra Santiago	Insp SST.	
[illegible]	Ing Fta Sec. Medio Amb	
Andrés Camilo Garzón	Residente Interventoria.	
Wilson Rafael Quiroz C.	Auxiliar de Interventoria	
Gisell D. Plata P.	Apoyo técnico sec. infraestructura	
Juan Carlos Silva	Prof. Univ. – Supervisor del Contrato	
Cesar Narvaez	Ing. Residente Contratista	
Yesenia Alcalez M.	Trabajo social contratista	

Powered by CamScanner

5.8. CERTIFICADO DE ESCOMBRERA POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA



ESCOMBRERA SANTA LUCIA

Resolución N° SPDT 001 DEL 13 ENERO 2021

Yondó Antioquia, 15/ 04/ 2023

CERTIFICACION

La empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S Identificada con NIT: 901109885-1 realizo disposición en la escombrera SANTA LUCIA, de 68 metros cúbicos correspondientes al material de residuos de construcción y demolición provenientes del proyecto CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER, durante el periodo comprendido entre el 6 de marzo al 5 de abril de 2023

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado.

Atentamente

GUSTAVO SOLANO
Propietario Escombrera santa lucia

Scanned by TapScanner



ESCOMBRERA SANTA LUCIA

Resolución N° SPDT 001 DEL 13 ENERO 2021

Yondó Antioquia, 05/ 05/ 2023

CERTIFICACIÓN

La empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S Identificada con NIT: 901109885-1 realizó disposición en la escombrera SANTA LUCIA, de 224 metros cúbicos correspondientes al material de residuos de construcción y demolición provenientes del proyecto CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER, durante el periodo comprendido entre el 6 de abril al 5 de mayo de 2023

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado.

Atentamente

GUSTAVO SOLANO
Propietario Escombrera santa lucia

Scanned by TapScanner

5.9. NFORME TÉCNICO DE OBRA

INFORME DE OBRA No .2

"CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."



CONTRATO DE OBRA No. 0756-23

INFORME DE OBRA Nro.2

PERIODO DE EJECUCIÓN

06 DE ABRIL DE 2023 – 05 DE MAYO DE 2023

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-1

ORIGINAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO. 4
2.1. Localización del proyecto. 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance. 5
2.3. CONTRATO SUSCRITO 6
2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23 6
2.3.2. Objeto del Contrato 6
2.3.3. Contratista 6
2.4. Plazo del Contrato 6
2.5 Valor de la inversión 6
3. CONTROL DE POLIZAS 7
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS 7
4. CONTROL DE RECUSOS 7
4.1. Personal involucrado en el proyecto 7
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 8
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA 8
5.1. Actividades realizadas en el periodo descrito: 8
6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO 9
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas. 9
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 9
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 9
6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. 10
6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. 10
6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO 10
7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 10

1. INTRODUCCIÓN.

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo la CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Es por eso por lo que se decide abrir el proceso de contratación Licitación pública LPO-015-2022, para la construcción anteriormente mencionada

De esta rigurosa selección de proponentes, se adjudicó el contrato; a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS identificado** con **NIT:901.109.885-1,** para celebrar el contrato el día 23 de febrero de 2023.


Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la interventoría del contrato, presentamos el informe de obra Nro.1 correspondiente con fecha desde el 06 DE MARZO DE 2023 – 5 DE ABRIL 2023, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", cuya oferta comercial es por valor de $3.684.062.560,88 y su culminación está prevista para el 5 de marzo de 2024

2. INFORMACION DEL PROYECTO.

2.1. Localización del proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en Cra. 28 # 55-10, Barrancabermeja, Santander, en el INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (ITSI)

MICROLOCALIZACIÓN

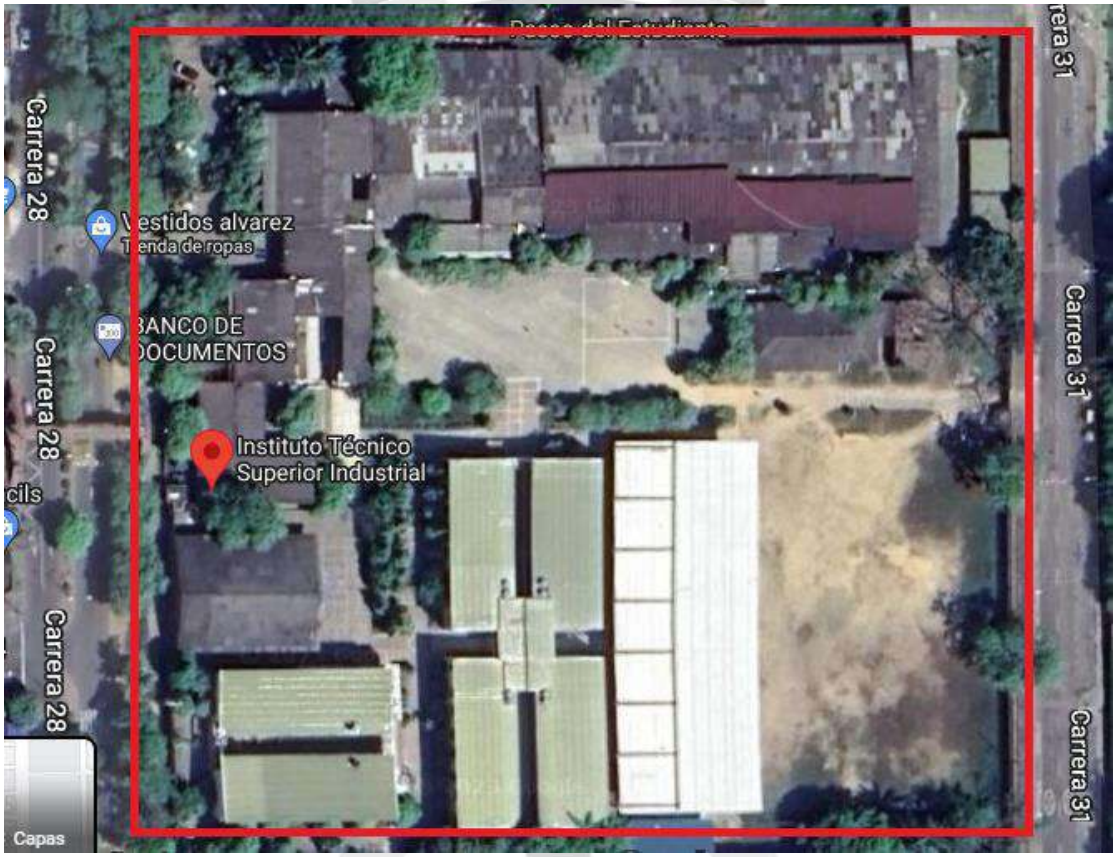

MACROLOCALIZACIÓN.



2.2. Características técnicas del proyecto y alcance.

Para la ejecución del contrato 0756-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"se contempló construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI, para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las

condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo
Construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo

2.3. CONTRATO SUSCRITO

2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23

2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."

2.3.3. Contratista

El contratista es WURSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra es de doce (12) meses, teniendo una fecha de inicio de 6 de marzo de 2023 y una fecha de finalización de 5 de marzo de 2024

2.5 Valor de la inversión

El valor para invertir es de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 3.684.062.560,88)**

3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

CONTRATO 0756-23

TABLA No.1. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	07 de marzo de 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*04/07/2024*	$736.812.513,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*06/03/2027*	$368.406.257,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$736.812.513,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*05/03/2024*	$464.000.000,00

INGENIERIA

4. CONTROL DE RECUSOS

4.1. Personal involucrado en el proyecto

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional y operativo de obra:

TABLA No.2. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL Y OPERATIVO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chaparro	Profesional Eléctrico
Fanny Gutierrez Acosta	Profesional SST
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Yesenia Alvarez Morales	Profesional Social
Albeiro Carpio Peñaloza	Ayudante de Obra
Elvis Carpio Peñaloza	Ayudante de Obra
Hector Julio Escobar Saavedra	Ayudante de Obra
Alexander Jimenez Santamaria	Ayudante de Obra
Antonio Carballido Carpio	Ayudante de Obra

4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA No.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

EQUIPO / HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	1
Pulidora 7"	1
Minicargador con taladro	1

5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

5.1. Actividades realizadas en el periodo descrito:

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo:

.

- Se finaliza la actividad de Demolición de muros en mampostería esp. 0,10m
- Demolición manual de concreto.
- Demolición de concreto de placa de entrepiso de baños esp. 0,10m usando equipo minicargador con taladro.
- Demolición de contrapiso en concreto de la cafetería principal y baños e=

10cm usando equipo minicargador con taladro.

- Demolición de columnas de concreto del área de los baños usando equipo minicargador con taladro.
- Demolición de vigas de cimentación de concreto del área de los baños usando equipo minicargador con taladro.
- Personal de VANTI ingresa a la obra para realizar el respectivo retiro de la acometida de gas existente.
- Se realiza comité de obra el día 19 de abril de abril del presente año, donde participan la supervisión del contrato, interventoría y contratista, con el fin de revisar el diseño estructural del proyecto e intervención de la ceiba.
- Se realiza el retiro de raíces de los árboles talados en el área de influencia del proyecto.
- Se recibe visita en obra el día 21 de abril del presente año por parte del secretario de medio ambiente para verificar el área de interferencia de la ceiba en la obra.
- Instalación de la acometida eléctrica temporal para la obra y campamento de la misma.
- Cuadrilla de topografía realiza la toma e implantación de niveles del proyecto para cálculo de volúmenes de excavación y relleno.
- Se inicia la actividad de excavación manual de material común, buscando el nivel cero del terreno natural, demarcado por topografía.
- Se realiza cargue y retiro de material sobrante y escombros producto de la demolición del antiguo comedor.

6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

6.1. Contrato o modificaciones Suscritas.

CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS SAS
06 de marzo de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS SAS

En este periodo no hubo modificación ni suscripción de actas al contrato.

6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

A la fecha del presente informe no se ha realizado tramite de acta de corte parcial.

6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

A la fecha no se ha realizado acta de modificación de cantidades de obra

6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

No existen otras actividades de orden jurídico.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Con respecto a la tala del árbol de mayor tamaño (Ceiba), aún está por definir el permiso de tala y/o aprovechamiento forestal por parte da la CAS para proceder con la continuación de las actividades de excavaciones y cimentación del proyecto.
- Adicional, se realizó una propuesta con un nuevo diseño estructural a la interventoría y supervisión del contrato ya que el diseño inicial entregado por la consultoría presenta inconsistencias y podría llegar a incurrir en un futuro a un deterioro de la estructura y su cubierta por no presentar continuidad en su cimentación. Ante esta situación se está a una pronta respuesta por parte de la interventoría para de esta manera poder continuar con la ejecución de la obra.

ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
WRUSSY INGENIEROS SAS
NIT:901.109.885-1

5.10. INFORME HSE DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

INFORME SST 2

PERIODO: 06 ABRIL - 05 MAYO 2023

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



FANNY GUTIERREZ ACOSTA
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4
   1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 4
   2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 4
      2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5
      2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
   2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 10
      2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 10
      2.2.2. INSPECCIONES 10
      2.2.3. ACCIDENTALIDAD 11
      2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 11
      2.2.5. INDICADORES 11
3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19 16
4. CONCLUSIONES 16

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Personal 5
Tabla 2. Programación capacitaciones 7
Tabla 3. Asistencia a capacitaciones. 7
Tabla 4. Programación Charlas 8
Tabla 5. Programación Pausas activas 9
Tabla 6. COPASST 9
Tabla 7. CCL 10
Tabla 8. Permisos de trabajo 10
Tabla 9. Programación inspecciones 10
Tabla 10. Brigada de emergencias 11

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capitulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 0756-23** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parametros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de abril al 05 de mayo de 2023**, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. 0756-23

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de abril al 05 de mayo de 2023,** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. 0756-23.

Tabla 1. Personal

DATOS PERSONALES					
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**	**ESTADO**
WILVER RUSSY LADINO	80.212.380	DIRECTOR DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ	1,098,754,093	RESIDENTE DE OBRA	9/03/2023		**ACTIVO**
FANNY GUTIERREZ ACOSTA	28,060,687	RESIDENTE HSEQ	16/03/2023		**ACTIVO**
SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO	37,712,004	INSPECTOR HSE	15/03/2023		**ACTIVO**
YESENIA ALVAREZ MORALES	1,096,226,349	PROFESIONAL SOCIAL	9/03/2023		**ACTIVO**
FRANCINY RUSSI NAVARRETE	19,445,221	LOGISTICO	1/01/2023		**ACTIVO**
ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO	1,096,242,479	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**

HECTOR JULIO ESCOBAR SAAVEDRA	91,425,553	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1,042,211,689	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023		**ACTIVO**
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1,096,212,001	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023		**ACTIVO**
ALEXANDER JIMENEZ SANTAMARIA	13,565,252	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023		**ACTIVO**

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023.

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF
- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - Son obligaciones especiales del trabajador
  - Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.

- ✓ Que es el comité de convivencia laboral
- ✓ Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

ANEXO 1: Entrega individual EPP

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del 06 de abril al 05 de mayo de 2023 y las planillas de seguridad social se encuentran en el **ANEXO 2.**

2.1.2.3. CAPACITACIONES

En el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023 se programó una capacitación, cumpliendo con un porcentaje de ejecución del 100%.

Tabla 2. Programación capacitaciones

PROGRAMACIÓN					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
03/05/2023	03/05/2023	CUMPLE	1	1	100%
			1	1	**100%**

Nota 2: A continuación, se relaciona el personal que asistió a la capacitación dada en el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023.

Tabla 3. Asistencia a capacitaciones.

CAPACITACION	NOMBRE DE TRABAJADOR	CARGO
PRIMEROS AUXILIOS	SANDRA SANTIAGO	INSPECTOR SST
	CESAR NARVAEZ	RESIDENTE
	ELVIS CARPIO	AYUDANTE
	ANTONIO VARVALLIDO	AYUDANTE
	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE
	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE
	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE

ANEXO 3. Capacitaciones

2.1.2.4. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad

y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023 se programaron 22 charlas y se ejecutaron 22, cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 4. Programación Charlas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**TEMA**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
10/04/2023	10/04/2023	CUMPLE	Charla motivacional	1	100%
11/04/2023	11/04/2023	CUMPLE	Dinámica la concentración	1	100%
12/04/2023	12/04/2023	CUMPLE	Golpe de calor	1	100%
13/04/2023	13/04/2023	CUMPLE	Reunión COPASST y CCL	1	100%
14/04/2023	14/04/2023	CUMPLE	Resbalones, tropiezos y caídas	1	100%
15/04/2023	15/04/2023	CUMPLE	Calentamiento global	1	100%
17/04/2023	17/04/2023	CUMPLE	Tareas de alto riesgo	1	100%
18/04/2023	18/04/2023	CUMPLE	Que es una excavación	1	100%
19/04/2023	19/04/2023	CUMPLE	Rutas de evacuación	1	100%
20/04/2023	20/04/2023	CUMPLE	Rutas de evacuación	1	100%
21/04/2023	21/04/2023	CUMPLE	Medir el riesgo	1	100%
22/04/2023	22/04/2023	CUMPLE	Trabajo en equipo	1	100%
24/04/2023	24/04/2023	CUMPLE	Cuidar el medio ambiente	1	100%
25/04/2023	25/04/2023	CUMPLE	Orden y aseo	1	100%
26/04/2023	26/04/2023	CUMPLE	Hábitos saludables	1	100%
27/04/2023	27/04/2023	CUMPLE	Radiación solar	1	100%
28/04/2023	28/04/2023	CUMPLE	Que es un riesgo biomecánico	1	100%
29/04/2023	29/04/2023	CUMPLE	Cuidemos el agua	1	100%
02/05/2023	02/05/2023	CUMPLE	Punto ecológico	1	100%
03/05/2023	03/05/2023	CUMPLE	Traslado en camilla	1	100%
04/05/2023	04/05/2023	CUMPLE	Trabajo en equipo y clima laboral	1	100%
05/05/2023	05/05/2023	CUMPLE	Autocuidado	1	100%
				22	**100 %**

ANEXO 4: Asistencia charlas de seguridad

2.1.2.5. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los días laborales, donde en periodo se ejecutaron 22 pausas activas teniendo un porcentaje de cumplimiento del **100%.**

Tabla 5. Programación Pausas activas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	Fecha Ejecutada	Cumple/No cumple	Programadas	Ejecutadas	% Cumplimiento
10/04/2023	10/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
11/04/2023	11/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
12/04/2023	12/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
13/04/2023	13/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
14/04/2023	14/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
15/04/2023	15/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
17/04/2023	17/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
18/04/2023	18/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
19/04/2023	19/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
20/04/2023	20/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
21/04/2023	21/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
22/04/2023	22/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
24/04/2023	24/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
25/04/2023	25/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
26/04/2023	26/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
27/04/2023	27/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
28/04/2023	28/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
29/04/2023	29/04/2023	CUMPLE	1	1	100%
02/05/2023	02/05/2023	CUMPLE	1	1	100%
03/05/2023	03/05/2023	CUMPLE	1	1	100%
04/05/2023	04/05/2023	CUMPLE	1	1	100%
05/05/2023	05/05/2023	CUMPLE	1	1	100%
			22	22	**100%**

ANEXO 5: Asistencia Pausas Activas

2.1.2.6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 6. COPASST

FECHA	TEMAS TRATADOS
27/04/2023	1. Que es un andamio?

ANEXO 6: Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

2.1.2.7. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 7. CCL

FECHA	TEMAS TRATADOS
02/05/2022	1. El trabajo en equipo

ANEXO 7: Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 8. Permisos de trabajo

DOCUMENTO	CANTIDAD
Analisis de trabajo	2

ANEXO 13 ATS-Permisos de trabajo.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de abril al 05 de mayo de 2023**, teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 9. Programación inspecciones

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD

Inspección EPP	1
Inspección herramientas manuales	3
Inspección orden y aseo	1
Inspección pulidora	2

ANEXO 8: Inspecciones

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023, no se presentaron accidentes laborales.

ANEXO 9: HSE-FOR-65 Accidentalidad.

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto.

Tabla 10. Brigada de emergencias

FECHA	TEMAS TRATADOS
13/04/2023	• Protocolo de incendios

ANEXO 10: Reunión Brigada de Emergencias

2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{10} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes + \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\boldsymbol{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{10}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de marzo al 05 de abr06 de abril al 05 de mayo de 2023il de 2023** no se tuvo accidentes laborales.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\mathbf{\#\ \textit{AT en el año}}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ \textit{días ausencia por incapacidad laboral}}}{\mathbf{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de 06 de abril al 05 de mayo de 2023 no se presentó ausentismo laboral, debido a incapacidades medicas por accidente de trabajo.

- **CAPACITACIONES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ \textit{capacitaciones programadas}}}{\mathbf{No\ \textit{Capacitaciones Ejecutadas}}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

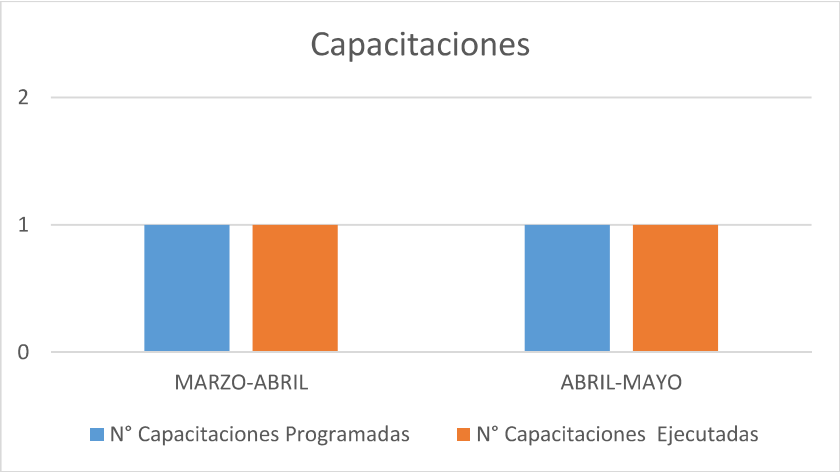


Se cumplió con el 100% de las capacitaciones programadas para el periodo 06 de abril al 05 de mayo de 2023.

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\mathbf{No\ pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{22}}{\mathbf{22}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

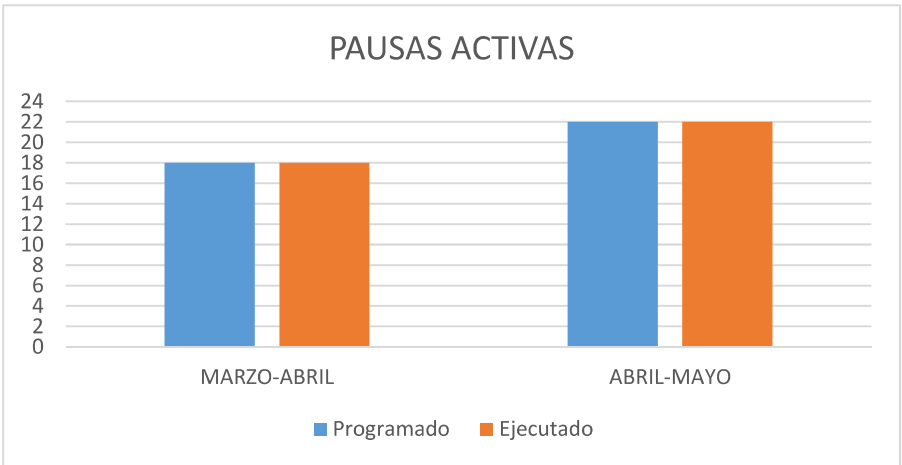


Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023.

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{22}}{\mathbf{22}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

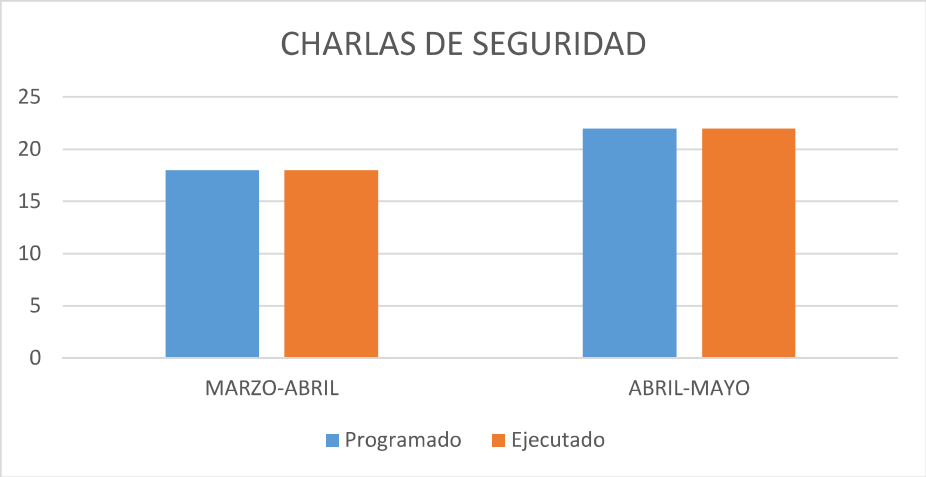


Se cumplió con el 100% de las Charlas de seguridad programadas para el periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2023.

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL}\ = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

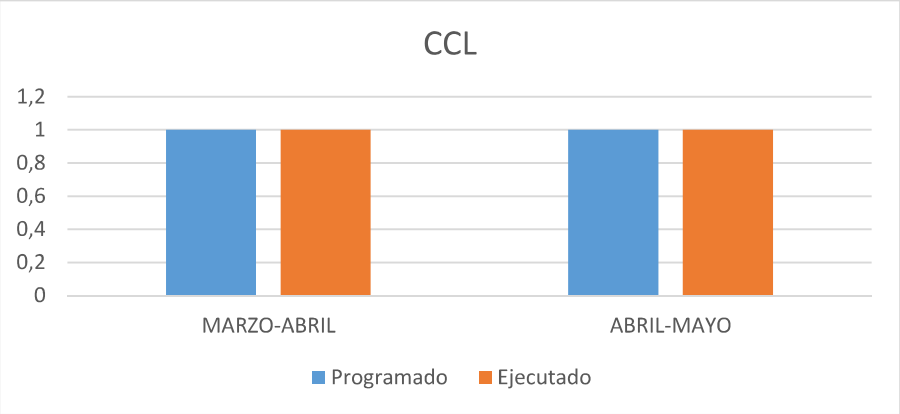

- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

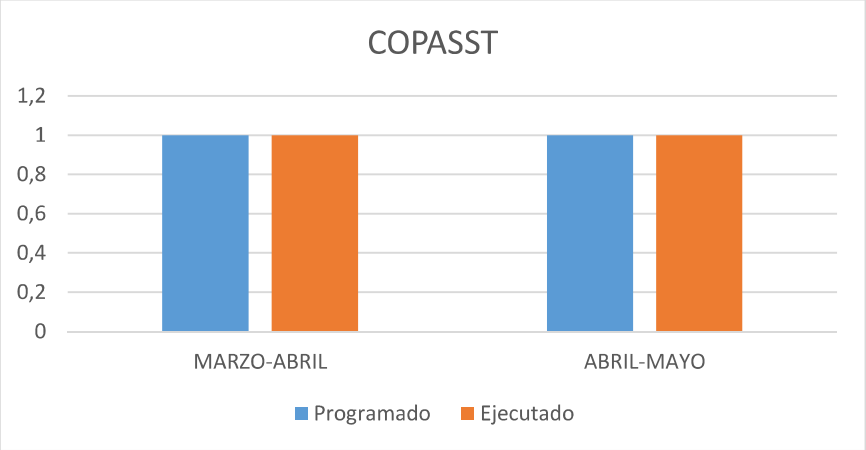

- **REUNIONES COE**

$$\textbf{COE} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

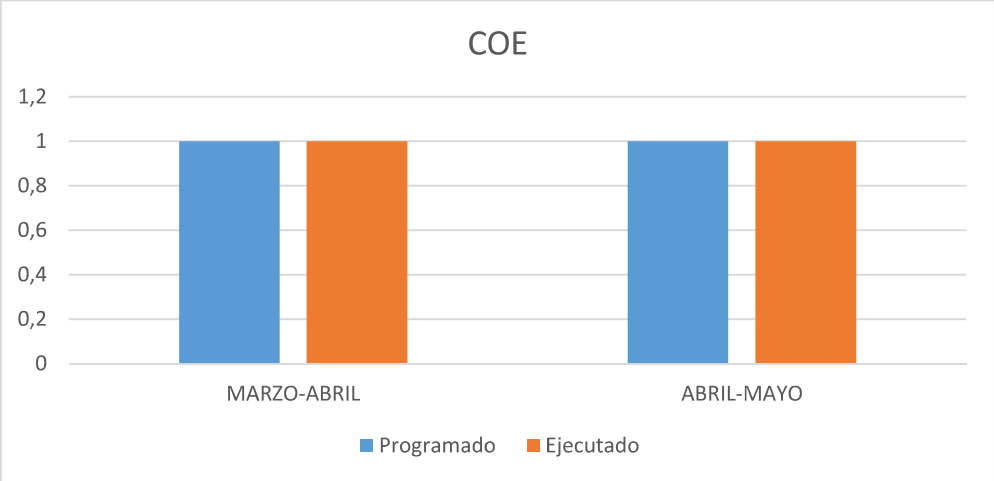

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Debido a la pandemia que se presenta actualmente por el coronavirus COVID-19 y en cumplimiento a la circular conjunta 001 del 11 de mayo de 2020 expedida por Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio De Salud y Protección Social Y Ministerio Del Trabajo; a la circular conjunta 0000003 del 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio De Salud y Protección Social, Ministerio De Trabajo y Ministerio De Transporte, al decreto 593 de 24 mayo de 2020, a la resolucion 666 de 24 de mayo de 2020, al decreto 121 de 2020, a la Resolucion 223 de 2021 y a la resolucion 777 de 2021, entre otros, diariamente se realiza control a los trabajadores de su estado de salud mediante una encuesta para autorizar su ingreso a las instalaciones y se implementa el protocolo de bioseguridad a los trabajadores. En el **ANEXO 13** se encuentra los registros de la implementación del protocolo de bioseguridad PAPSO.

4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **06 de abril al 05 de mayo de 2023** se realizo la reunion de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **06 de abril al 05 de mayo de 2023** no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de abril al 05 de mayo de 2023.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

- Con ayuda del formato que se implemento de ENCUESTA DE AUTOCUIDADO se pudo determinar que ningun trabajador presentó sintomatologia y/o posible contagio de COVID19, con este formato se autorizaba el ingreso de personal

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfeccion de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevncion y mitigacion del contagio de COVID19.

Anexos # 1

Entrega de epp

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

ara dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y t. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	CESAR NARVAEZ	CARGO: Ing. Residente

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	CHALECO	CESAR ON	1	28-04-23	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buei estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declar que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajado definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en e Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA: 1.098.754.093.

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004.
CARGO	Insp. SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/201

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 d art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Elvis Carpio. CC. 1096212001.	CARGO: Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Par de guantes de camara.	Elvis C.	1	28-04-23	
2	Botas de seguridad.	Elvis C.	1	28-04-23.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en b estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Dec que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabaja definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1 Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado e Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado e WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago.	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insp SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	HECTOR JULIO ESCOBAR.	CARGO: AYUDANTE.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	BOTAS DE SEGURIDAD.	Hector J.	1	28-04-23	
2	Guantes de Camaza.	Hector J.	1	28-04-23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712034
CARGO	Insp SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:		CARGO: Insp. SST.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	CHALECO		1	28-04-23.	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA: 37712004

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insp SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	YESENIA ALVAREZ	CARGO: TRABAJO SOCIAL.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	CHALECO		1.	28-04-23	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insp SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Alexander Jimenez.	CARGO: Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Botas de seguridad	Alex J.	1.	28-04-23	
2	Pantalon Jean.	Alex J.	1	28-04-23.	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insp SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	ALVEIRO CARPIO.	CARGO: AYUDANTE.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Botas de seguridad.	Alveiro C	1	28-04-23	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declar que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajado definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979 Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en e Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en l WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: x	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004.
CARGO	Insp. SST	FIRMA	

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	ANTONIO CARVALLIDO	CARGO: AYUDANTE.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	BOTAS DE SEGURIDAD.	Antonio C	1.	28-04-23	
2	Guantes de Carnaza	Antonio C	1	28-04-23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:
X	

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	Insp. SST.	FIRMA	

Powered by CamScanner

2- Documentaciòn y planillas del personal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	21/04/2023	66666460	$1.595.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	124.100	0		0		0	0	0	0	124.100	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	82.200	0		0		0	0	0	0	82.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	161.100	0	0	0	0	0	0		161.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	328.400	0	0	0	0	0	0		328.400	2
231001	Colfondos	800227940-6	167.300	0	0	0	0	0	0		167.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	167.300	0	0	0	0	0	0		167.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	358.600				358.600	0	0	358.600			3.586	358.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	206.300	0	0	206.300	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	206.300	206.300
Pensión	4	824.100	824.100
Riesgos Laborales	1	358.600	358.600
CCF	1	206.300	206.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.595.300	1.595.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	21/04/2023	66666460	$1.595.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042211689	CARPIO PEÑALOZA ALBEIRO	1	0			S	X							X									231001	1.045.209	167.300	0	0	0	0	EPS037	1.045.209	41.900	14-11	1.045.209	5	72.800	CCF38	1.045.209	41.900	0	0	0	0	0
2	CC	1096212001	CARPIO PEÑALOZA ELVIS	1	0			S	X							X									230301	1.006.542	161.100	0	0	0	0	EPS037	1.006.542	40.300	14-11	1.006.542	5	70.100	CCF38	1.006.542	40.300	0	0	0	0	0
3	CC	1096242479	CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE	1	0			S	X							X									230301	1.045.209	167.300	0	0	0	0	EPS037	1.045.209	41.900	14-11	1.045.209	5	72.800	CCF38	1.045.209	41.900	0	0	0	0	0
4	CC	13565252	JIMENEZ SANTAMARIA ALEXANDER	1	0			S	X							X									230201	1.006.542	161.100	0	0	0	0	EPS041	1.006.542	40.300	14-11	1.006.542	5	70.100	CCF38	1.006.542	40.300	0	0	0	0	0
5	CC	91425553	ESCOBAR SAAVEDRA HECTOR JULIO	1	0			S	X							X									25-14	1.045.209	167.300	0	0	0	0	EPS041	1.045.209	41.900	14-11	1.045.209	5	72.800	CCF38	1.045.209	41.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	24/04/2023	66666520	$1.470.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	34.100	0		0		0	0	0	0	34.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	89.300	0		0		0	0	0	0	89.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	43.500	0		0		0	0	0	0	43.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	23.200	0		0		0	0	0	0	23.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	357.000	0	0	0	0	0	0		357.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	310.200	0	0	0	0	0	0		310.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	92.800	0	0	0	0	0	0		92.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	330.700				330.700	0	0	330.700			3.307	330.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	190.100	0	0	190.100	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	190.100	190.100
Pensión	3	760.000	760.000
Riesgos Laborales	1	330.700	330.700
CCF	1	190.100	190.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.470.900	1.470.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	24/04/2023	66666520	$1.470.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S	X																230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS002	850.667	34.100	14-11	850.667	5	59.300	CCF38	850.667	34.100	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONES CESAR ORLANDO	1	0			S	X							X									230201	2.231.250	357.000	0	0	0	0	EPS010	2.231.250	89.300	14-11	2.231.250	5	155.300	CCF38	2.231.250	89.300	0	0	0	0	0
3	CC	28060687	GUTIERREZ ACOSTA FANNY	1	0			S	X																25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF38	580.000	23.200	0	0	0	0	0
4	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S	X							X									230301	1.087.500	174.000	0	0	0	0	EPS017	1.087.500	43.500	14-11	1.087.500	5	75.700	CCF38	1.087.500	43.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

3- CAPACITACIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS		
RE: Sandra Santiago	CARGO: Insp. SST.	FECHA: 00-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.

   C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS

NOMBRE: Cesar Narvaez	CARGO: Ing Residente	FECHA: 03-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.
   C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

CESAR

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS

NOMBRE: Elvis Carpio	CARGO: Ayudante.	FECHA: 03-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.
   C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

Elvis Carpio Penaloza

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS

NOMBRE: Antonio	CARGO: Ayudante.	FECHA: 03-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.

   C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

Antonio. Carvajal

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS

NOMBRE: Alexander Jimenez	CARGO: Ayudante.	FECHA: 03-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.
   C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

Alexander Jimenez

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS

MBRE: Hector Eduar	CARGO: Ayudante.	FECHA: 03-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.
   C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

H Julio E

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS		
BRE: Hector Eduar	CARGO: Ayudante.	FECHA: 03-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.
   C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

H Julio E

FIRMA

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS

NOMBRE: Alvaro Cargo	CARGO: Ayudante.	FECHA: 03-05-23	NOTA:

1. Los primeros auxilios son técnicas básicas y simples que, aplicadas a en los primeros momentos de un accidente o enfermedad
   (a) Pueden minimizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   b) Pueden maximizar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.
   c) Pueden evitar las lesiones e incluso salvar la vida de las personas.

2. El término "primer respondiente" se aplica a:
   (A) La primera persona que socorre al accidentado o enfermo.
   B) La primera persona que pone en conocimiento de los servicios de emergencia la necesidad de que intervengan y comience el socorro.
   C) La persona que necesita servicios de socorro por accidente, lesión o enfermedad.

3. Para evitar el shock (choque):

   A) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 90º y aflojando la ropa.

   B) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y apretando la ropa.
   (C) Se coloca al accidentado en cúbito supino, con las piernas a 30º y aflojando la ropa.

4. ¿Qué es una hemorragia?

   (A) La salida anormal de sangre del sistema circulatorio.
   B) Una rotura de la piel
   C) Un traumatismo que cursa sin rotura de la piel

Alvaro Cargo

FIRMA

Powered by CamScanner

4- CHARLA DE SEGURIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	11-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Dinamica la concentracion
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	HSE OPERATIVA – Pausas activas.

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Calificación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELIS CARMO PEÑALOZA	AYUDANTE		WRUSSY
2	ALVEIRO PEÑALOZA	AYUDANTE		WRUSSY
3	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE		WRUSSY
4	ANTONIO JOSE CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE		WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		WRUSSY
7	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL.		WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	12-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Golpe de calor. - Pausas activas.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVERO CARPIO	AYUDANTE	Alvaro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		Antonio C
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	
6	CESAR NARVAEZ	JNG RESIDENTE	Cesar	
7	JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 3 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	13-04-2023	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	9:00 AM.	Tema:	Conformación COPASST y Convivencia.
Responsable:	Sandra Santiago.	Cargo:	Insp. SST. – Pausas activas.

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otra	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE		WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		WRUSSY
7	HECTOR J. ESCOBAR	AYUDANTE		WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	14-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Resbalon, tropezon, caidas.
Responsable:	Sandra Santana	Cargo:	Insp. SST. - Pausas activas.

Charla Charla	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	W RUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE.	Julio	WRUSSY

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-IISE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	15- 04- 2023	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	7:00 AM	Tema:	Calentamiento global - Pausas activas,
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	JNSP SST

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro Carpio	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C.	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE		
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-1155-76 VERSION 5 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	TAREAS DE ALTO RIESGO - Pausas activas
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	INSP. SST.

Charla Charla [X] Direccionamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio.	WEUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WEUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WEUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	WEUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WEUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR N	WEUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WEUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 3 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Que es una excavación 7 - Pausa activa.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST.

Charla Charla: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	AM
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez H.	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR N	
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE.	Julio	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	19-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Ruta de evacuacion – Rescate actua
Responsable:	Sandro Santiago	Cargo:	Insp SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE		Alveiro
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez (Sarong)	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		
7	HECTOR J ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20-04-2023	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	9:00 AM.	Tema:	Pausas de educación - Pausas activas
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp- SST.

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio-C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	Presencialmente
6	CESAR NARVAEZ	JNG RESIDENTE	(Cesar)	
7	HECTOR ESCOBAR	JULIO		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION: 01/08/2019

Fecha:	21-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Medir el riesgo - Pausas activas
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WEUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	WEUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WEUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WEUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia AH	WEUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR	WEUSSY
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WEUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	22-04-2023	Lugar:	J.T.S.I
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Trabajo en equipo - Para actuar
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio.C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez (ESMERONT)	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		
7	JULIO ESCOBAR	JULIO		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	24-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Cuidar el medio amb. (Para-actue
Responsable:	Sandro Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Induccion [ ] Capacitacion [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPLEADO
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	Wrussy
2	ALVERO CARPIO	AYUDANTE	Alvero	Wrussy
3	ANTONIO CARRILLO	AYUDANTE	Antonio-C	Wrussy
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	Wrussy
5	YESENIA ALVAREZ	PRACTICA SOCIAL	Yesenia Alv	Wrussy
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	(CESAR ON)	Wrussy
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	Wrussy
8				

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	25-04-23	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	7:00 AM	Tema:	Orden y aseo
Responsable:	Sandra Santiago.	Cargo:	Insp. SST

Charla Charla	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio P.	Wrussy
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	Wrussy
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	Wrussy
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	Wrussy
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alv	Wrussy
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	(Cesar Nt)	Wrussy
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	Wrussy

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 5 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26-04-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Habitos saludables (Pausa-activa.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Charla [ ] Entrenamiento [ ] Induccion [ ] Capacitacion [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio-C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia.	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
7	HECTOR ESCOBAR.	Julio		WRUSSY

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-1155-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27-04-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Radiación solar (Pasas - activas)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	ELVIS CARPIO P.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	ALVEIRO C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	YESENIA ALVAREZ M.	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR N.	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	28-04-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Que es un Riesgo biomecanico (Postura Activa)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Induccion ☐ Capacitacion ☐ Otro ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Ca P.	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	(Yesenia AM)	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	(CESAR ON)	
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	29-04-23	Lugar:	E.T.S.I
Hora:	7:00 AM	Tema:	Cuidemos el agua (para-actuar)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Induccion [ ] Capacitacion [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVERO CARPIO	AYUDANTE	Alvero C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez H	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	(ESAR N)	
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	02-05-2023	Lugar:	T.I.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Punto ecologico. (Pausa- activa
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	ALVEIRO C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio-C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE		WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez H.	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESARON	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE		WRUSSY

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	03-05-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Translado en camilla (paso activo).
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Induccion		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR NARVAEZ	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSIÓN 5 FECHA APROBACIÓN 01/06/2019

Fecha:	04-05-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Trabajo en equipo y clima laboral - Parson de
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otra:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR	
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	05-05-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Actividad (Pausa activa).
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carp.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	ALVEIRO C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	ANTONIO C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	———	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JVG RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WRUSSY

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	MOTIVACIONAL. (Pausas activas.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	INSP. SST.

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELIUS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	WRUSSY
3	HECTOR J. ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WRUSSY
4.	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	WRUSSY
5	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
6.	YESENIA ALVAREZ	TRAB. SOCIAL		WRUSSY
7.	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR	WRUSSY.

Powered by CamScanner

5- PAUSAS ACTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-1155-76 VERSION 5 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	TAREAS DE ALTO RIESGO - Pausas activas
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	INSP. SST.

Charla Charla [X] Direccionamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio.	WEUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WEUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WEUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	WEUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WEUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR N	WEUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WEUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 3 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	18-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Que es una excavación 7 - Pausa activa.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST.

Charla Charla: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	AM
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez H.	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR N	
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE.	Julio	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	19-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Ruta de evacuacion – Rescate actua
Responsable:	Sandro Santiago	Cargo:	Insp SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE		Alveiro
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez (Sarong)	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		
7	HECTOR J ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20-04-2023	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	9:00 AM.	Tema:	Pausas de educación - Pausas activas
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp- SST.

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio-C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	Presencialmente
6	CESAR NARVAEZ	JNG RESIDENTE	(Cesar)	
7	HECTOR ESCOBAR	JULIO		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION: 01/08/2019

Fecha:	21-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Medir el riesgo - Pausas activas
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WEUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	WEUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WEUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WEUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia AH	WEUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR	WEUSSY
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WEUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	22-04-2023	Lugar:	J.T.S.I
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Trabajo en equipo - Para actuar
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio.C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez (ESMERONT)	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		
7	JULIO ESCOBAR	JULIO		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	24-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Cuidar el medio amb. (Para-actue
Responsable:	Sandro Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Induccion [ ] Capacitacion [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPLEADO
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	Wrussy
2	ALVERO CARPIO	AYUDANTE	Alvero	Wrussy
3	ANTONIO CARRILLO	AYUDANTE	Antonio-C	Wrussy
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	Wrussy
5	YESENIA ALVAREZ	PRACTICA SOCIAL	Yesenia Alv	Wrussy
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	(CESAR ON)	Wrussy
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	Wrussy
8				

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	25-04-23	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	7:00 AM	Tema:	Orden y aseo
Responsable:	Sandra Santiago.	Cargo:	Insp. SST

Charla Charla	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio P.	Wrussy
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	Wrussy
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	Wrussy
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	Wrussy
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alv	Wrussy
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	(Cesar Nt)	Wrussy
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	Wrussy

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 5 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26-04-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Habitos saludables (Pausa-activa.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Charla [ ] Entrenamiento [ ] Induccion [ ] Capacitacion [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio-C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia.	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
7	HECTOR ESCOBAR.	Julio		WRUSSY

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-1155-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27-04-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Radiación solar (Pasas - activas)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	ELVIS CARPIO P.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	ALVEIRO C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	YESENIA ALVAREZ M.	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR N.	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	28-04-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Que es un Riesgo biomecanico (Postura Activa)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Induccion ☐ Capacitacion ☐ Otro ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Ca P.	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	(Yesenia AM)	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	(CESAR ON)	
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	29-04-23	Lugar:	E.T.S.I
Hora:	7:00 AM	Tema:	Cuidemos el agua (para-actuar)
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Induccion [ ] Capacitacion [ ] Otra [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVERO CARPIO	AYUDANTE	Alvero C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez H	
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE	(ESAR N)	
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	02-05-2023	Lugar:	T.I.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Punto ecologico. (Pausa- activa
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	ALVEIRO C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio-C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE		WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez H.	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESARON	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE		WRUSSY

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	03-05-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM	Tema:	Translado en camilla (paso activo).
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Induccion		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR NARVAEZ	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSIÓN 5 FECHA APROBACIÓN 01/06/2019

Fecha:	04-05-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Trabajo en equipo y clima laboral - Parson de
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST

Charla Diaria: X | Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otra:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR	
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	05-05-23	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Actividad (Pausa activa).
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carp.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	ALVEIRO C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	ANTONIO C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	———	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JVG RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
7	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WRUSSY

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	MOTIVACIONAL. (Pausas activas.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	INSP. SST.

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELIUS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro	WRUSSY
3	HECTOR J. ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	WRUSSY
4.	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C	WRUSSY
5	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
6.	YESENIA ALVAREZ	TRAB. SOCIAL		WRUSSY
7.	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR	WRUSSY.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	11-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Dinamica la concentracion
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	HSE OPERATIVA – Pausas activas.

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Calificación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELIS CARMO PEÑALOZA	AYUDANTE		WRUSSY
2	ALVEIRO PEÑALOZA	AYUDANTE		WRUSSY
3	HECTOR JULIO ESCOBAR	AYUDANTE		WRUSSY
4	ANTONIO JOSE CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE		WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		WRUSSY
7	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL.		WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	12-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Golpe de calor. - Pausas activas.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp. SST.

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVERO CARPIO	AYUDANTE	Alvaro C	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		Antonio C
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	
6	CESAR NARVAEZ	JNG RESIDENTE	Cesar	
7	JULIO ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 3 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	13-04-2023	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	9:00 AM.	Tema:	Conformación COPASST y Convivencia.
Responsable:	Sandra Santiago.	Cargo:	Insp. SST. – Pausas activas.

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otra	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE		WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE		WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE		WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	ING RESIDENTE		WRUSSY
7	HECTOR J. ESCOBAR	AYUDANTE		WRUSSY

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	14-04-2023	Lugar:	I.T.S.I.
Hora:	7:00 AM.	Tema:	Resbalon, tropezon, caidas.
Responsable:	Sandra Santana	Cargo:	Insp. SST. - Pausas activas.

Charla Charla	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	W RUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C	WRUSSY
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	WRUSSY
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE.	Julio	WRUSSY

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-IISE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	15- 04- 2023	Lugar:	I.T.S.I
Hora:	7:00 AM	Tema:	Calentamiento global - Pausas activas,
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	JNSP SST

Charla Charla [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio	
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro Carpio	
3	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C.	
4	ALEX JIMENEZ	AYUDANTE	Alex	
5	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alvarez	
6	CESAR NARVAEZ	JUG RESIDENTE		
7	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	Julio	

Powered by CamScanner

6- COPASST

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 27/04/2023 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 02**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNION N° 2- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Que es un Andamio
2. Partes de un Andamio
3. Como se utiliza un Andamio

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Que es un Andamio

Es una estructura temporal elevada que se usa para soportar a un grupo de trabajo o materiales durante la construcción, mantenimiento o reparación de puentes, edificios y otro tipo de estructuras.

Los andamios son una herramienta para los trabajos de altura, que permite llegar a lugares que de otra forma sería muy difícil.

2. Partes de un Andamio

Los componentes básicos de un andamio son tubos, acopladores y tablas.

- Placa base. Esto es una base de carga para el andamio.
- Tubos, usualmente de aluminio o acero.
- Listones o tablas que se usan para hacer la plataforma de trabajo. Usualmente se encuentran de tres grosores 38 mm, 50mm y 63mm; el estándar de ancho es de 225 mm y de largo 3,9 metros.
- Acoplador, un accesorio utilizado para unir componentes.

Powered by CamScanner

- Soportes, utilizados para extender el ancho de las plataformas de trabajo.
- Escaleras y plataformas. Permiten el movimiento de los trabajadores.
- Amarres reveladores.
- Cuerdas.
- Amarres de anclajes.

3. Como se utiliza un Andamio

Una vez que el andamio esté perfectamente ensamblado y fijo al suelo los operadores deben acceder a este por medio de escaleras o rampas de acceso. Estas deben poseer doble barandilla y estar ubicadas en la parte interna de la estructura o en torres anexas al mismo. Es importante recordar que todo trabajador que labore en alturas debe posee el equipo de protección individual respectivo. Una vez que te encuentres en el nivel en donde realizará la labor, debes anclarte a uno de los tubos de mayor resistencia o soporte. Esto te permitirá prevenir caídas de diferente nivel.

CONCLUSIONES

- Los procedimientos de seguridad para uso de andamios son muy importantes, porque de no seguirse puede resultar en muertes o heridas graves de los trabajadores de altura.

COMPROMISOS

- Verificar en el cronograma de capacitaciones si se incluyen temas sobre los andamios.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cesar Narvaez	Ing Residente.	
Sandra Santiago	Insp. SST	
Alexander Jimenez	Ayudante.	Alex J.
Yesenia Alvarez.	Trabajo Social	
Hector J. Escobar	Ayudante.	H JULIO
Alveiro Carpio	Ayudante.	
Antonio Corvalido	Ayudante.	Alvaro Carpio Antonio e.

Powered by CamScanner

7- CCL

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 02/05/2023 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 02**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNION N° 2- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. EL TRABAJO EN EQUIPO
2. TIPS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. EL TRABAJO EN EQUIPO

Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la realización de un proyecto. Trabajar en equipo implica de la coordinación de 2 a más personas orientadas para el alcance de objetos comunes. Cada miembro debe aportar para la realización de una parte del trabajo. Trabajar en equipo implica compromiso, no es solo la estrategia y el procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros.

2. TIPS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

Cuando estos trabajan en equipo, las actividades fluyen de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, no es fácil que los miembros de un mismo grupo se entiendan entre si con el objeto de llegar a una conclusión.

Establecer Objetivos Comunes:
Es indispensable que todos los colaboradores persigan las mismas metas y que trabajen en forma coordinada para cumplirlas, la idea no es que cada uno aporte

Powered by CamScanner

elementos por su parte, sino que lo hagan sincronizadamente para que se genere confianza, unión y comunicación.

Promover canales de comunicación:
La comunicación es un elemento esencial para brindar a los colaboradores espacios adecuados de retroalimentación. Deben existir canales formales e informales, mediante los cuales pueda eliminarse cualquier barrera comunicacional, para darle paso a una comunicación asertiva y eficaz.

Crear un ambiente armónico:
Entender la premisa de equipo desde un todo es importante para generar un excelente ambiente laboral. Se bebe eliminar la competencia individual y fomentar la sana competencia de equipo, en donde los aciertos y desaciertos permitan la participación en los procesos de mejora y crecimiento grupal.

Tomar decisiones en conjunto:
Tener en cuenta a los colaboradores para que expresen sus ideas y opiniones respecto a temas importantes, estima la creatividad y abre la puerta a ideas innovadoras y soluciones efectivas

CONCLUSIONES

- Se realiza trabajo en equipo para el año 2023.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas de trabajo en equipo.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cesar Narvaez	Ing Residente.	CESAR ON
Sandra Santiago	Insp. SST.	
Alexander Jimenez	Ayudante.	
Elvis Carpio	Ayudante	Elvis Carpio
Yesenia Alvarez	trabajo Social.	Yesenia Alvarez
Alvaro Carpio	Ayudante.	Alvaro Carpio
Hector Julio Escobar	Ayudante.	H Julio.
Antonio Carvallido	Ayudante	Antonio C.

Powered by CamScanner

8-

INSPECCIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del I.T.S.I. del Distrito de Bca-bq.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia Bcabga.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	W Russy	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Alexander Jimenez.

MES Marzo 16- 2023. AL 16 ABRIL 2023. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Alex Jimenez		Alex Jim		Alex Jim		Alex Jimen	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación del comedor y cocina del I.T.S.I. en el distrito de bca-bja.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia bca-bja.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy.	NIT	

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Antonio Carvallido

MES 17-04-2023 / A 05-2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓					
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓					
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓					
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓					
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓					
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓					
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓					
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓					
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓					
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓					
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓					
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Antonio C.							
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio C.							
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción de Comedor y cocina I.T.S.I del distrito de bca-bja		
N° CONTRATO	0756 - 23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia Bcabja.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRussy	NIT	901.109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Alexander Jimener.

MES 17 Abril al 17 Mayo TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓	✓	✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓	✓	✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓	✓		
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓	✓	✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓	✓	✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓	✓	✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓	✓	✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓	✓	✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓	✓	✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓	✓	✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓	✓	✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Alex Jimenez		Alex Jimenez		Alex J.		Alex J.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO	CODIGO HSE-FOR- 32 VERSION 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

LISTA DE VERIFICACION DE ORDEN Y LIMPIEZA EN AREAS DE TRABAJO

RESPONSABLE: La lista de chequeo será aplicada por los jefes inspectores asignados en cada área crítica de orden y aseo de la planta

PERIODICIDAD:

- **Para el área:** Mensualmente será aplicada, con el fin de consolidar las mejoras y calificar el mantenimiento del orden y aseo en las areas.

NOMBRE DEL AREA:	FECHA:
operativa.	27 - Abril 23
INSPECTOR:	**PERSONA RESPONSABLE DEL AREA:**
Sandra Santiago.	Alveiro Carpio.

ORDEN Y LIMPIEZA

No.	ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	¿Tiene en su área de trabajo sólo lo necesario? (Está libre de elementos deteriorados, poco funcionales, obsoletos, rotos, sin potencial de uso).	✓			
2	Los estantes y otras áreas de almacenaje están señalizados, demarcados y codificados según la clase de elementos que se almacenan.			✓	
3	¿El lugar donde guarda las herramientas y elementos de trabajo como: (escaleras, estibadores manuales, carritos y estibas) está señalizado La señalización es visible y estética y se encuentra organizado?	✓			
4	El almacenamiento de canastillas se encuentran bien conformada y apilada, sobre estibas .			✓	
5	¿Los pisos, herramientas de trabajo y equipos se encuentran limpios sin sustancias ó solidos que generen riesgo?	✓			
6	¿El trabajador tiene el uniforme limpio y en buen estado, está libre de cadenas, pulseras, anillos y reloj mientras ejecuta su trabajo.	✓			No cuentan con boton en buen estado.
7	Los residuos, basuras se clasifican de acuerdo con las normas de reciclaje y se disponen en canecas debidamente señalizadas.				No tenemos punto de ecologico.
8	El piso esta en buen estado? (libre de huecos, desniveles ó losas levantadas)	✓			
9	Las escaleras de acceso a las areas tienen cintas, bandas o pintura antideslizante, son seguras?			✓	
10	Las escaleras de acceso a las areas tienen pasamanos? (en ambos costados)			✓	
11	¿El piso o pasillos por donde se transita esta libre de obstáculos (canastillas, cajas, desniveles, mercancía)	✓			
12	¿El personasl usa los elementos de protección personal, conforme a la necesidad del área y los que no se están utilizando se encuentran ubicados en un lugar asignado?	✓			No tienen el uniforme y boton en buen estado
13	¿Los pasillos y áreas de desplazamiento en general están iluminados?			✓	
14	¿Las áreas es encuentran señalizadas y demarcadas?	✓			

Observaciones:

CALIFICACION DE ORDEN Y LIMPIEZA				Si la calificación final obtuvo como resultado de 0 a 7 No, la tarjeta aplicada será de color rojo, si se obtuvo como resultado de 8 a 11 Si la tarjeta será de color amarillo, y si se obtuvo como resultado de 12 a 14 Si, la tarjeta sera de color verde. En el caso que el numeral no aplique se debe colocar un Si.
Numero de Accidentes de Trabajo a la fecha	0			Si el área presenta Accidentes de Trabajo en el periodo, se aplica tarjeta de color rojo.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA**	**CODIGO: HSE-FOR-20** **VERSION: 1** **FECHA DE APROBACION: 08/01/2019**

OBJETO	Construcción de comedor y cocina del I.T.C.I del distrito de BCA-BJA.		
N° CONTRATO	0716-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia bco, bja.	**NIT**	
EMPRESA CONTRATISTA	W Russy	**NIT**	901109885-1

PULIDORA No. **OPERADOR** Antonio. Carvalho

MES Marzo 16-2023. **Al.** 16 Abril 2023 **TAMAÑO:** G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Antonio. C		Antonio C.		Antonio C.		Antonio C	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción de comedor y cocina de I.T.S.I. del distrito de bca-ga.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia bca-ga.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy	NIT	901109885-1

PULIDORA No. OPERADOR Antonio Corvallido.

MES 17 Abril al 4 Mayo TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Antonio C		Antonio C.		Antonio C		Antonio C	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
1.2	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.3	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general	✓					
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura	✓					
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes	✓					
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida	✓					
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones	✓					
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto	✓					
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas	✓					

NA: No aplica **SI :** SI CUMPLE **NO:** NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Fecha:	Firma	
Asesor HSEQ	Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Fecha: 21-05-2020	Firma	Alvaro Cano
Cargo			

Powered by CamScanner

9- ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**ACCIDENTALIDAD**	**CÓDIGO: HSE-FOR-65** **VERIÓN: 1** **FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019**

FECHA 05 de abril al 05 de mayo del 2023

UBICACIÓN: COLEGIO INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes del 06 de abril al 05 de mayo del 2023 no se presentaron accidentes laborales.

	EMPRESA	IDENTIFICACION	Accidentes personales según gravedad				Nº de accidentes personales	Lista de accidentes con daños personales a colaboradores directos	Nº de accidentes con daño material	Lista de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Lista de accidentes con daño ambiental	Accidentes a terceros según gravedad				Nº de accidentes a terceros	Lista de accidentes con daños personales a terceros	Días perdidos totales en el mes	Horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Indices norma colombiana			Indices norma colombiana	
			Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)							Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
1	WRUSSY INGENIEROS SAS	901.109.885-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$0.00	0	0	0	0.0	0.0
2			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ninguno	0	0	$0.00	0	0	0	0.0	0.0
3			0	0	0	0	0									0	0					0	0	0	0.0	0.0

Consolidado Mensual	EMPRESA	Nº de colaboradores	Tipo de accidentes				Total de accidentes personales
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
EMPRESA	WRUSSY INGENIEROS SAS	10	0	0	0	0	0
Total		10	0	0	0	0	0

Total de accidentes con daño material
0
0

Nº de accidentes con daño ambiental	Total de accidentes con daño ambiental	Tipo de accidentes				Total de accidentes a terceros
		Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Total de días perdidos	Total de horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Norma colombiana			Norma colombiana	
			Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
0	0	$0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0.0	0.0


Accidentes con daño personal



Accidentes con daños a terceros



Accidentes con daño material



Accidentes con daño ambiental



Horas hombre trabajadas



Días perdidos



Costo de los accidentes



Índice de frecuencia



Índice de severidad




Índice accidentabilidad



Índice de accid. (frec.) -norma colombiana



Índice de severidad - norma colombiana



Fecha Elaboro:	Reviso y Aprobo:	VoBo:
FANNY GUTIERREZ ACOSTA	Karen Lisseth Salamanca Rojas	Wilver Francisny Russy Ladino
28.061.687	1.007.588.784	80.212.380
Residente HSEQ	Directora HSEQ	Gerente General

10- COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 13/04/2023 **HORA: 9:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 02**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNION N° 2- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Protocolo de Incendios
2. Pasos para seguir en caso de incendio

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Protocolo de Incendios

El desarrollo de un incendio depende en gran medida combustible y del elemento iniciador, siendo su evolución muy diversa en función de las condiciones presentes en cada edificio y el momento de la detección.

2. Pasos para seguir en caso de incendio

- Pasos en caso de incendio
- Mantenga la calma
- Llame al departamento de bomberos
- Si se trata de un incendio pequeño, trate de extinguirlo con el tipo de extinguidor apropiado o por otros medios. No ponga en peligro su seguridad personal.
- No permita que el fuego se interponga entre usted y la salida.
- Desconecte el equipo eléctrico si está en llamas y si no fuese peligroso hacerlo.
- Notifíquelo a su supervisor y al coordinador de evacuación si fuese posible.
- Evacue la instalación si no puede extinguir el fuego. Ayude a las personas discapacitadas.
- No rompa las ventanas.

Powered by CamScanner

- No abra las puertas que estén calientes (antes de abrir una puerta toque el pomo. Si está caliente o hay humo visible, no la abra)

CONCLUSIONES

- En todo lugar, ya sea hogar, trabajo, empresa, institución, etc., es imprescindible que todas las personas conozcan los elementos básicos sobre lo que es el fuego, su prevención y combate. Solo de esta forma estaremos sentando las bases para prevenir algún siniestro de cualquier tipo, por lo tanto, estaremos previniendo daño alguno para las personas e instalaciones.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre el protocolo de incendios.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CESAR MANUEL	ING RESIDENTE.	CESARON
SACOCA SANTIAGO	INSP. SST	
ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE.	ALEX J.
ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carpio.
YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL.	
ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alviro Carpio
HECTOR ESCOBAR	Ayudante.	H Julio
ANTONIO CARVALLIDO	Ayudante.	Antonio C.

Powered by CamScanner

11- COVID 19

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 10 - 04 - 2023 | Hora Apertura: 7:00 / 5:00 PM. | Encargado Apertura: Sandra Santiago

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO	1096212001	7:00.	Elvis Carpio	5:00	Elvis Carpio	
ALVEIRO CARPIO	10422111689	7:00.	Alveiro C	5:00	Alveiro C	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91.425.553	7:00	Julio	5:00	Julio	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	7:00	Antonio. C	5:00	Antonio. C	
ALEX JIMENEZ	13565252	7:00	ALEX	5:00	ALEX	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Yesenia Alvarez	12:00M.	Yesenia Alvarez	
CESAR NARVAEZ	1098754093	7:00	CESAR	5:00	CESAR	
SANDRA SANTIAGO	37712004	7:00		5:00		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIERIA S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 04-10-2023

RESPONSABLE: Sandra Milena Santiago Camacho

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta algunos síntomas *							Tiene alguna de estas condiciones: enfermedad pulmonar crónica, asma moderado o severo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad renal, hepática, o cardiovascular, inmunosupresión, fumador, otra?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has estado en contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros) con una persona diagnosticada con COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor a igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1096212001	31	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X					Elvis Carpio
ALVEIRO CARPIO	1042211689	33	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X					Alveiro C
HECTOR JULIO ESCOBAL	91425553	58	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			X			Julio
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	25	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X					Antonio D.C
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			X			ALEX
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Salud Total	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			X			
CESAR NARVAEZ	1098754093	28	M	Sura	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No			X			
SANDRA SANTIAGO	37712004	40	F	Famisanar	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X					

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 11-04-2023 | Hora Apertura: 7:00 AM | 5:00 PM | Encargado Apertura: Sandra Santiago

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1096212001	7:00	Elvis C P	5:00	Elvis Carpio P.	
ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1042241689	7:00	Alveiro C	5:00	Alveiro C	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	Julio	5:00	Julio	
ALEXANDER JIMENEZ	13565252	7:00	ALEX	5:00	ALEX	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Yesenia Alvarez	12:00 M.	Yesenia Alvarez	
CESAR NARVAEZ	1098754093	7:00	CESAR	5:00	CESAR	
SANDRA SANTIAGO	37712004	7:00	Sandra	5:00	Sandra	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	7:00	Antonio C	5:00	Antonio C	

Powered by CamScanner

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

11-04-2023

Sandra Milena Santiago

ELVIS CARDO	1096212001	31	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X			Elvis
ALVEIRO CARAO	1042211689	33	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X			Alveiro no C
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	58	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No		X		Julio
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	25	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X			Antonio C
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No		X		Alex
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Salud total	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No		X		
CESAR NARVAEZ	1098754093	28	M	Sura	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No		X		Cesar
SANDRA SANTIAGO	37712004	40	F	Famisanar	Sura	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	X			

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-59 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2019

Fecha: 12-04-2023 | Hora Apertura: 7:00 AM. | Encargado Apertura: Sandra Santiago

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO	1096212001	7:00	Elvis Carpio	5:00	Elvis Carpio	
ALVARO CARPIO	10422116 89	7:00	Alvaro C	5:00	Alvaro C	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	Julio	5:00	Julio	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479.	7:00	Antonio. C	5:00	Antonio. C.	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Yesenia Alvarez	12:00	Yesenia Alvarez	
CESAR NARVAEZ	1098754088	7:00	CESAR	5:00	CESAR	
SALDIA SANTIAGO	37712004	7:00		5:00		
Alex Jimenez	13565252	7:00	ALEX	5:00	ALEX	

Powered by CamScanner

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

12-04-2023

Sandra Santiago.

ELVIS CARRIO	1096212001	31	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Elvis Ca
ALVARO CARRIO	1042211689	33	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Alvaro C
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	58	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Julio O
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	25	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Antonio C
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Alex
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Yesenia Alvarez.
CESAR VALDAEZ	1098754093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	CESAR V
SALOMEA SANTIAGO	39712004	40	F	Famisanar	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Salomea

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 7:00 AM.	Hora Apertura: 13-04-2023	Encargado Apertura: Sandra Santiago

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1096212001	7:00	Elvis C.	5:00	Elvis C.	
ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1042211689	7:00	Alveiro	5:00	Alveiro C	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	JULIO	5:00	JULIO	
ALEXANDER JIMENEZ	13 565252	7:00	ALEX	5:00	ALEX	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Yesenia Alvarez	12:00	Yesenia Alvarez	
CESAR NARVAEZ	1098754093	7:00	CESAR ON	5:00	CESAR ON	
SANDRA SANTIAGO	37712034	7:00		5:00		
ANTONIO CARVALHO	1096242479	7:00	Antonio-C	5:00	Antonio-C	

Powered by CamScanner

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

13-04-2023

Sandra Santiago

ELVIS CARPIO	1096212001	31	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				Elvis C
ALVERO CARPIO	1042211689	33	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				Alvaro
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	58	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				Julio
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	25	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				Antonio C
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				Alex
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				Yesenia
CESAR NARVAEZ	1098754093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				CESAR
SANDRA SANTIAGO	37712004	40	F	Famisanar	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				Sandra

Observaciones: (Información adicional que el personal considere relevante)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 14-04-2023 | Hora Apertura: 7:00 AM. | Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1096212001	7:00	Elvis Carpio P.	5:00	Elvis Carpio	
ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1042211689	7:00	Alveiro C	5:00	Alveiro	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	Julio	5:00	Julio	
ALEXANDER JIMENEZ	13565252	7:00	Alex	5:00	Alex	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Yesenia Alvarez	12:00	Yesenia Alvarez	
CESAR NARVAEZ	1098754093	7:00	Cesar	5:00	Cesar	
SANDRA SANTIAGO	37712004	7:00		5:00		
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	7:00	Antonio C	5:00	Antonio C	

Powered by CamScanner

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

14-04-2023

Sandra Santiago

ELVIS CARRIO	1096212001	31	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		ELVIS C
ALVARO CARRIO	1092211689	33	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		ALVARO
HECTOR JULIO ENCISO	91425553	58	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Julio
ANTONIO CARVALLINO	1096242479	25	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		ANTONIO C
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	ALEX
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		YESENIA
CESAR VALDAEZ	1098754093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	CESAR
SANDRA SANTIAGO	39712004	40	F	Famisanar	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		

Observaciones: (Síntomas durante los últimos quince (15) días calendario)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-59 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:03/01/2019

Fecha: 15-04-2023 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Sandra Santiago

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO	1096212001	7:00	Elvis Carpio	12:00	Elvis Carpio	
ALVARO CARPIO	10422116 89	7:00	Alvaro Carpio	12:00	Alvaro Carpio	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	Julio	12:00	Julio	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479.	7:00	Antonio.C	3:00	Antonio.C	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Yesenia Alvarez	12:00	Yesenia Alvarez	
CESAR NARVAEZ	1093754093	7:00	CESAR	3:00	CESAR	
SANDRA SANTIAGO	37712004	7:00		12:00		
ALEXANDER JIMENEZ.	13.565.252	7:00	ALEX	12:00	ALEX	

Powered by CamScanner

WRUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

15-04-2023

Sandra Milena Santiago

ELVIS CARDO	1096212001	31	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		
ALVARO CARDO	1042211689	33	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		
HECTOR JULIO ESTUPIÑAN	91425553	58	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	25	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		
CESAR VALDAEZ	1098754093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	
SALOMA SALINAS	39712004	40	F	Famisanar	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante registrar)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-59 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2019

Fecha: 17-04- 2023 | Hora Apertura: 7:00AM. | Encargado Apertura: Sandra Santiago

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO	1096212001	7:00	Elvis Carpio	5:00	Elvis Carpio	
AUGUSTO CARPIO	1042211689	7:00	Augusto C	5:00	Augusto C	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	JULIO	5:00	JULIO	
ANTONIO CABALLERO	1096242479.	7:00	Antonio C	5:00	Antonio C	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Yesenia Alvarez	12:00	Yesenia Alvarez	
CESAR NARVAEZ	1093754085	7:00	CESAR	5:00	CESAR	
SANDRA SANTIAGO	37712004	7:00	Sandra	5:00	Sandra	
Alexander Jimenez	13565252	7:00	ALEX	5:00	ALEX	

Powered by CamScanner

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

17-04-2023

Sandra Santiago.

ELVIS CARDO	1096212001	31	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		
ALVARO CARDO	1042211689	33	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425.553	58	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	25	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO.	X		
CESAR VALDAEZ	1098754093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	
SANDRA SANTIAGO	39712004	40	F	FAMILIA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		

Observaciones: (Información adicional de interés general relevante para la)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-59 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2019

Fecha: 18-04-23 | Hora Apertura: 7:00 AM / 5:00 PM. | Encargado Apertura: Sandra Santiago.

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO	1096212001	7:00	Elvis Carpio R.	5:00	Elvis Carpio R.	
ALVARO CARPIO	1042211689	7:00	Alvaro C	5:00	Alvaro C	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	Julio	5:00	Julio	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479.	7:00	Antonio. C	5:00	Antonio C.	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	YeseniaAlvarezM	12:00	YeseniaAlvarezM.	
CESAR NARVAEZ	1093754098	7:00	CESARON	5:00	CESARON	
SONIA SANTIAGO	37712004	7:00		5:00		
ALEXANDER JIMENEZ.	13565252.	7:00	ALEX	5:00	ALEX	

Powered by CamScanner

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

18-04-23

Sandra Santiago

ELVIS CARPIO	1096212001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		ELVIS
ALVARO CARPIO	1094211689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		ALVARO
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	JUL. C
ANTONIO CABALLERO	1096242479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		ANTONIO-C
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	ALEX
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		YESENIA
CESAR VALDAEZ	1098754093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	CESAR
SANDRA SANTIAGO	31772004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		

Observaciones: (Síntomas asociados que el persona considere importante mencionar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-59 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2019

Fecha: 19-04-2023 | Hora Apertura: 7:00 AM / 5:00 PM | Encargado Apertura: Sandra Santiago

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO	1096212001	7:00	Elvis Carpio	5:00	Elvis Carp.	
ALVARO CARPIO	1042211689	7:00		5:00	Alvaro C.P.	Alvaro C
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	Julio	5:00	Julio	
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	7:00	Antonio. C	5:00	Antonio. C	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00	Ausencia Laboral	12:00	Presencia	
CESAR MARQUEZ	1093754095	7:00	CESARONO	5:00	CESARONO	
SONIA SANTIAGO	37712004	7:00	[illegible]	5:00	[illegible]	
ALEX JIMENEZ	13565252	7:00	Alex	5:00	Alex	

Powered by CamScanner

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

19-04 2023 Sandra Santiago

ELVIS CARDIO	1096212001	31	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	Elvis Cardio
ALVARO CARDIO	1042211689	33	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	Alvaro V C
HECTOR JULIO ENCISO	91425553	58	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	Julio C
ANTONIO CARVALLIDO	1096242479	25	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	Antonio C
ALEX JIMENEZ	13565252	40	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	Alex
YESENIA ALVAREZ	1096226349	29	F	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	Yesenia Alvarez
CESAR VALDEZ	1098754093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	Cesar V
SANDRA SANTIAGO	39772004	40	F	Famisanar	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante mencionar)

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CÓDIGO: HSE-FOR-59 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:03/01/2019

Fecha: 20 - 04 - 2023 | Hora Apertura: 7:00 AM / 5:00 PM | Encargado Apertura: Sandra Santiago.

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
ELVIS CARPIO	1096212001	7:00	Elvis Carpio	5:00	Elvis Carpio.	
ALVARO CARPIO	1042211689	7:00	Alvaro	5:00	Alvaro C	
HECTOR JULIO ESCOBAR	91425553	7:00	JULIO	5:00	JULIO	
ANTONIO CABALLERO	1096242479.	7:00	Antonio-C	5:00	Antonio-C	
YESENIA ALVAREZ	1096226349	7:00		12:00		
CESAR NARVAEZ	1093754095	7:00		5:00		
SALSA SANTIAGO	37712004	7:00		5:00		
ALEX JIMENEZ	13565252	7:00	ALEX	5:00	ALEX	

Powered by CamScanner
