GNG Ingeniería S.A.S.	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/5/2018	28/7/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	134 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.**				
SEMANA No.	25	**DEL**	**7/11/2022**	**AL**	**13/11/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	174	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**
Contrato No.	**133 DE 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	5/5/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/5/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23/5/2022	**Fecha de Iniciación**	23/5/2022
Fecha de Terminación*	22/10/2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2023
No póliza contrato de obra	Póliza cumplimiento CBC-100035966-0 Póliza RCE CBC_10005343-0	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	19/5/2022	**Fecha aprobación**	12/5/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS


CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 314,031,787.80
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 314,031,787.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 157,015,893.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor total actividad	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
2.1.1	Suministro y colocacion Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	29/9/2022	EN PROCESO	$ 54,262,642.00	$ 5,908,658.21	10.89%	Actividad realizada en bloque N
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	30/9/2022	EN PROCESO	$ 1,430,775,096.00	$ 58,097,347.84	4.06%	Actividad realizada en bloque N
2.1.5	Construccion de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	26/9/2022	EN PROCESO	$ 1,298,625,151.00	$ 26,162,648.40	2.01%	Actividad realizada en bloque N
2.3.1	Suministro e instalación de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa	12/9/2022	EN PROCESO	$ 1,968,908,032.00	$ 47,234,436.48	2.40%	Actividad realizada en bloque L
2.3.2	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	26/9/2022	EN PROCESO	$ 265,423,296.00	$ 15,584,749.92	5.87%	Actividad realizada en bloque N
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	20/9/2022	EN PROCESO	$ 16,226,946.00	$ 2,783,800.00	17.16%	Actividad realizada en bloque N
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	20/9/2022	EN PROCESO	$ 1,164,909.00	$ 795,579.68	68.30%	Actividad realizada en bloque N
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	20/9/2022	EN PROCESO	$ 730,611.00	$ 561,242.00	76.82%	Actividad realizada en bloque N
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	30/9/2022	EN PROCESO	$ 944,434,572.00	$ 42,177,844.18	4.47%	Actividad realizada en columnas bloques A, E y N
4.1.2	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	13/11/2022	EN PROCESO	$ 1,707,849,179.00	$ 69,747,127.30	4.08%	Actividad realizada en bloque A
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo figurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	3/11/2022	EN PROCESO	$ 1,639,528,478.00	$ 41,846,564.90	2.55%	Actividad realizada en bloque A, B y D
4.2.2	Suministro e instalacion de Acero de refuerzo Columnas figurado fy= 420 Mpa	19/9/2022	EN PROCESO	$ 999,772,067.00	$ 13,260,967.44	1.33%	Actividad realizada en bloque N

4.2.3	Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	13/11/2022	EN PROCESO	$ 216,166,901.00	$ 8,824,181.04	4.08%	Actividad realizada en bloque A
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	20/9/2022	EN PROCESO	$ 16,920,337.00	$ 1,065,848.00	6.30%	Actividad realizada en bloque N
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	20/9/2022	EN PROCESO	$ 24,493,611.00	$ 1,457,127.00	5.95%	Actividad realizada en bloque N
6.2.2.12	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas residuales que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	13/11/2022	EN PROCESO	$ 13,833,252.00	$ 4,611,084.00	33.33%	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	13/11/2022	EN PROCESO	$ 9,285,600.00	$ 354,888.00	3.82%	Actividad realizada en bloque A
6.2.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	13/11/2022	EN PROCESO	$ 43,440,600.00	$ 17,497,253.10	40.28%	Actividad realizada en bloque A
6.2.4.13	Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 6" x 4"	13/11/2022	EN PROCESO	$ 5,235,537.00	$ 259,185.00	4.95%	Actividad realizada en bloque A
6.2.4.15	Suministro e instalación de caja de inspección de sección cuadrada 0.80 m x 0.80 m y de altura promedio 1.50 m para aguas lluvias que incluye cuerpo, base, tapa, excavación y retiro de material; paredes de la caja en mampostería simple, tapa y base en concreto reforzado	19/9/2022	EN PROCESO	$ 26,513,733.00	$ 922,216.80	3.48%	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.4.16	Suministro e instalación de pozo de inspección para red de aguas lluvias (Altura promedio 2.20 m y Diametro de cuerpo del pozo1.20 m) incluye cuerpo y cono de reducción hechos en mampostería, placa superior, placa de base hechas en concreto reforzado, excavación y retiro de material.	31/10/2022	EN PROCESO	$ 23,152,194.00	$ 2,572,466.00	11.11%	Actividad realizada en áreas exteriores
7.1.2.1	Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	24/10/2022	EN PROCESO	$ 106,439,805.00	$ 10,667,170.00	10.02%	Actividad realizada en áreas exteriores
7.1.3.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	24/10/2022	EN PROCESO	$ 6,903,904.00	$ 183,926.24	2.66%	Actividad realizada en áreas exteriores
7.1.3.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	24/10/2022	EN PROCESO	$ 8,067,540.00	$ 642,300.30	7.96%	Actividad realizada en áreas exteriores
26.1	Aseo permanente en obra	23/5/2022	EN PROCESO	$ 46,448,640.00	$ 564,480.00	1.22%	Actividad ejecutada permanente en obra
NP 28.2	Tratamiento de fallos	5/9/2022	EN PROCESO	$ 209,903,087.00	$ 11,419,510.00	5.44%	Actividad realizada en bloque J
NP 28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	13/11/2022	EN PROCESO	$ 43,559,141.00	$ 3,218,741.00	7.39%	Actividad realizada en bloque J
NP 28.5	Construcción de placa aligerada de 3000PSI (21Mpa) a la vista con caseton en icopor h=0.49m	13/11/2022	EN PROCESO	$ 823,130,558.00	$ 33,605,814.00	4.08%	Actividad realizada en bloque J

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO	AVANCE	SEMANAL	ACUMULADO
$ 4,958,194,236.36	$ 555,951,472.21	$ 5,514,145,708.57	$ 3,539,045,299.07	$ 422,027,156.83	3,961,072,455.90
14.07%	**1.58%**	**15.65%**	**10.05%**	**1.20%**	**11.24%**

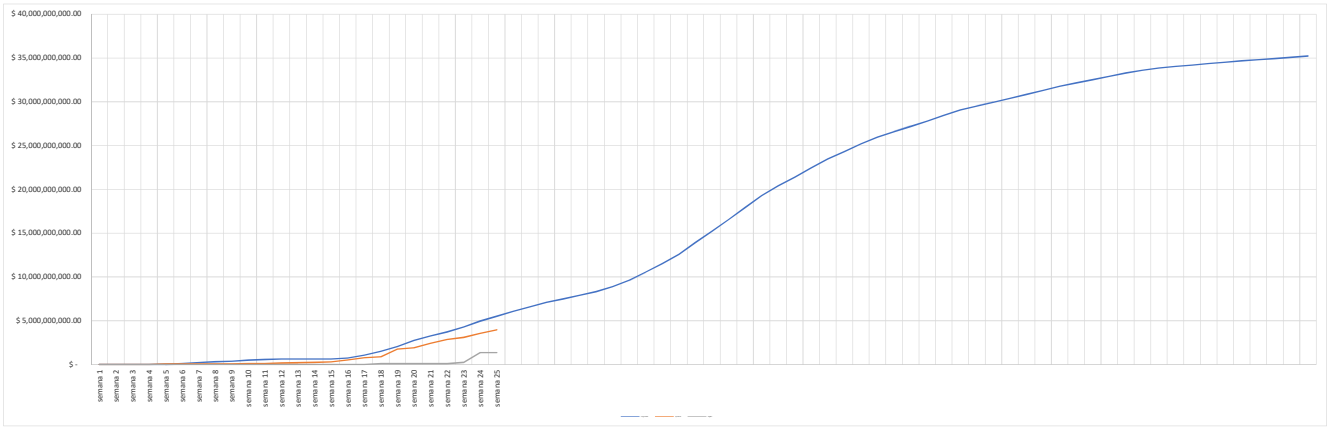

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	7/9/2022	Sin iniciar	0	0	67	Actividad no iniciada, es importante precisar que luego de visita por parte del consultor del proyecto se informó que este material granular se ejecutaría en las zonas exteriores, por tal motivo esta actividad no ha iniciado.
2.1.1 - Suministro y colocación Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	12/9/2022	29/9/2022	0	46	17	Actividad realizada en bloques A,B,C,D, E, N
2.1.3 - Suministro y colocación Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	12/9/2022	30/9/2022	0	45	18	Actividad realizada en bloques A,B,C,D, E, N
2.1.4 - Suministro y colocación Concreto para zapatas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
2.1.5 - Construcción de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	12/9/2022	26/9/2022	0	49	14	Actividad realizada en bloques A,B,C,D, E, N
2.2.1 - Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	13/9/2022	5/11/2022	0	9	48	Actividad realizada en rampa
2.2.2 - Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	13/9/2022	Sin iniciar	0	0	62	Actividad no iniciada
2.2.3 - Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	3/10/2022	5/11/2022	0	9	28	Actividad realizada en rampa
2.2.4 - Suminstro y colocacion de Concreto para columnas de Rampa 4,000 PSI (28 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	42	Actividad no iniciada
2.2.5 - Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	42	Actividad no iniciada
3.1.1 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.1.3 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.1.5 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.1.7 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.2 - CAJAS DE INSPECCION	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividades no iniciadas
4.1.2 - Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	13/11/2022	0	7	35	Actividad realizada en bloque A
4.1.3 - Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	42	Actividad no iniciada
4.1.4 - Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	42	Actividad no iniciada
4.2.1 - Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	3/10/2022	3/11/2022	0	10	28	Actividad realizada en bloque A
4.2.3 - Suministro e instalacion de Malla electrosoldada de refuerzo fy= 550 Mpa	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	42	Actividad no iniciada
4.4.2 - Suministro e instalacion de Junta constructiva manto de poliestireno de alta densidad (unión entre edificaciones)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
4.3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	24/10/2022	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
5.1 - MAMPOSTERIA	24/10/2022	Sin iniciar	0	0	21	Actividad no iniciada
6.1.3 - REDES DE AGUA A PRESION BAJO TIERRA	14/9/2022	Sin iniciar	0	0	61	Actividades no iniciadas
6.1.4 - EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	14/9/2022	Sin iniciar	0	0	61	Actividad no iniciada

6.2.4.5 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	12/9/2022	10/10/2022	0	28	35	Actividad realizada en bloque A, B, E, N
6.2.4.6 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.4.7 - Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 400 mm (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.4.8 - Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	12/9/2022	10/10/2022	0	35	28	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.6.2 - Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/9/2022	10/10/2022	0	35	28	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.6.3 - Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Es importante precisar que teniendo en cuenta las condiciones del material de obra existente, por aclaración de los especialistas en geotecnia de todas las partes, el material existente en el predio no es recomendable para su uso
6.2.6.4 - Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	12/9/2022	10/10/2022	0	35	28	Actividad realizada en áreas exteriores
7.1.2.1 - Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	12/9/2022	24/10/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloques M y N
7.1.2.2 - Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/9/2022	24/10/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloques M y N
7.1.2.3 - Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.2.4 - Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/9/2022	24/10/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloques M y N
7.1.2.5 - Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.3.1 - Excavación manual en material común de brecha para tubería	12/9/2022	24/10/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloques M y N
7.1.3.2 - Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/9/2022	24/10/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloques M y N
7.1.3.3 - Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada. Es importante precisar que teniendo en cuenta el estado del material encontrado inicialmente en obra, dentro de la visita realizada por los especialistas en Geotecnia se indicó que el material no era aceptable para ser usado como material de relleno, por tal razón esta actividad no se ejecutará
7.1.3.4 - Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	12/9/2022	24/10/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloques M y N
13.1 - CUBIERTAS	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	14	Actividad no iniciada
13.2 - CANALES Y FLANCHES	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	14	Actividad no iniciada
27 - SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	14	Actividad no iniciada

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En proceso se encuentra la revisión del balance de obra; el proceso adelantado se encuentra en un 75% quedando pendiente el capitulo electrico, voz y datos. Con este balance se requiere presentar a la entidad contratante la identificación de mayores y menores cantidades de obra, así como las actividades no previstas y que son requeridas para adelantar el proceso de contrucción de la planta fisica. Para el próximo comité de seguimiento debe establecerse el valor y realizar la posterior radicación. En este documento se incluyen APU´S No Previstos para aprobación por parte de la entidad contratante una vez queden ajustados de acuerdo a las observaciones adelantadas por la interventoría.

Aspecto Financiero

Durante el periodo evaluado la entidad contratante no ha realizado pagos. A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

No.	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE OBRA 133 DE 2022	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 134 DE 2022
1	22/8/2022	$108.475.197	1/9/2022	$5.054.851
2	26/10/2022	$134.687.156	12/10/2022	$7.065.711
3	4/11/2022	$1.117.692.007	3/11/2022	$58.080.142

Se realiza el desembolso de anticipo No. 13 para suministro de acero de refuerzo y concreto. A la fecha se han realizado los siguientes desembolsos de anticipo:

No.	FECHA REMISIÓN	DESEMBOLSO DE ANTICIPO
1	31/8/2022	$535.440.897
2	1/9/2022	$801.761.766
3	12/9/2022	$36.735.959
4	22/9/2022	$935.794.251
5	4/10/2022	$1.585.487.141
6	10/10/2022	$183.265.617
7	10/10/2022	$33.114.281
8	20/10/2022	$22.090.963
9	28/10/2022	$172.288.168
10	28/10/2022	$33.765.985
11	31/10/2022	$22.804.992
12	4/11/2022	$250.000.000
13	13/11/2022	$1.250.093.494

Actividades adelantadas durante la semana; armado de placa de entrepiso bloque A verificada y aprobada para fundida, en proceso armado de entrepiso para armado de hierros en bloque B, armado de acero en bloque N el cual no se da aval para fundir el día 12 de noviembre por no cumplir con los requerimientos para aprobación de placa de cimentación. Queda proyectada para el día 15 de noviembre de acuerdo a revisión. Verificadas pruebas de estanqueidad en bloque N, de igual manera la disposición de tubería eléctrica.

Aspecto SST-Ambiental

AMBIENTAL:
Se realiza visita y recorrido de obra, donde se evidencia nuevamente que el cárcamo para lavado de llantas aún no se encuentra funcional, por lo cual se vuelve a reiterar al contratista que se debe dar cumplimiento a los compromisos previamente adquiridos.

SST: Se realiza recorrido de obra en conjunto con el contratista con el fin de identificar aspecto a mejorar en la implementación del SGSST y de las actividades que se encuentran realizando actualmente, por parte de interventoría se reitera mejorar el sendero peatonal dado que sigue evidenciando la zona de paso en mal estado, se reitera al contratista maximizar los controles antes del inicio de actividades en altura, se reitera aumentar el número de baños dado el aumento de trabajadores para el proyecto, no se presentaron accidente ni incidente en el periodo evalaudo.
Se revisó y aprobó el informe de gestión SST, mensual.
En el periodo evaluado no se presentaron accidentes laborales, por parte del contratista, ni de la interventoría ni incidentes de trabajo.

Personal administrativo: 10 trabajadores
Personal Operativo:
Lunes 07 de noviembre de 2022 día festivo no hubo jornada laboral
Martes 08 de noviembre de 2022 80 trabajadores 2 comisión topográfica
Miércoles 09 de noviembre de 2022 87 trabajadores 2 comisión topográfica
Jueves 10 de noviembre de 2022 91 trabajadores 3 comisión topográfica
Viernes 11 de noviembre de 2022 86 trabajadores 2 comisión topográfica
Sábado 12 de noviembre de 2022 85 trabajadores 2 comisión topográfica
Personal interventoría: 7
El personal programado para la semana No. 25 era de 65 trabajadores, de acuerdo a plan de contingencia.

Aspecto Social

El 8 de noviembre de 2022, el contratista envió los volantes No.18 Invitación Personalizada 5to Comité de Participación Ciudadana y No.19 Invitación Masiva 5to Comité de Participación Ciudadana, para revisión y aprobación de la interventoría. Estos volantes fueron remitidos a la supervisión del contrato para aceptación.
El 8 de noviembre de 2022, el contratista remitió el acta del 4to CPC, para revisión y aprobación de la interventoría.
El 9 de noviembre de 2022, la interventoría envió el del 4to CPC para revisión y aceptación de la supervisión.
El 9 de noviembre de 2022, la supervisión remitió la aceptación a los volantes No.18 Invitación Personalizada 5to Comité de Participación Ciudadana y No.19 Invitación Masiva 5to Comité de Participación Ciudadana, este día la interventoría remitió al contratista la aprobación a los volantes.
El 9 de noviembre de 2022, la interventoría mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_231 con radicado No. E2022007387 entregó el informe mensual No.5 para revisión y aceptación de la supervisión.
El 10 de noviembre de 2022, la interventoría solicita se radique el informe mensual No.5 consolidado del contratista, toda vez que el informe del componente social fue visado en medio magnético.
El 10 de noviembre de 2022, la interventoría solicita al contratista se remita el instrumento que será empleado para la implementación del plan de manejo de impactos, por parte del contratista.
El 10 de noviembre de 2022, en el comité de seguimiento social No.24 no se realizó la socialización del cumplimento de la contratación de personal, toda vez que el contratista se encuentra realizando la revisión con el área SST para remitir a la interventoría para validación.
El 10 de noviembre de 2022, a la fecha se continúa a la espera de la aceptación de la supervisión, para proceder al envió de la información a la comunidad.
El 10 de noviembre de 2022, el contratista informó que remitió por correo electrónico al ciudadano la respuesta a la PQRSD el día 9 de noviembre de 2022 con copia a la interventoría, el 11 de noviembre de 2022 el ciudadano confirmó el recibo de la información por correo electrónico.
El 10 de noviembre de 2022, en el comité de seguimiento técnico No.25 se realizó visita del biólogo del contratista y el especialista forestal de la interventoría, quienes surgieron se realice capacitación por parte de los profesionales del área ambiental al personal de obra sobre la fauna de la zona de intervención, adicionalmente, se informe en el próximo CPC sobre este tema a la comunidad participante, para que tengan conocimiento sobre las acciones que ha realizado el contratista en pro del bienestar y conservación de las especies.
El 12 de noviembre de 2022, se reportaron 1 PQRSD cerrada y 0 PQRSD abiertas.

Aspecto PMT

De acuerdo a radicado realizado ante la Secretaría de Movilidad fue aprobado el PMT con la actualización de ingresos para la obra por lo cual informamos que el contratista de obra se encuentra al día con el tramite.


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	20226120170842* 20226120174665*	8/7/2022	6/7/2023			
25316 COI No. 27	20226120170842* 20226120174665*	8/7/2022	6/7/2023			
35147 COI No. 37	20226120257666*	16/9/2022	14/9/2023			
35148 COI No. 37	20226120257666*	16/9/2022	14/9/2023			
35149 COI No. 37	20226120257666*	16/9/2022	14/9/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
7/11/2022	7 a 5	0
8/11/2022	7 a 5	0
9/11/2022	7 a 5	2
10/11/2022	7 a 5	1
11/11/2022	7 a 5	0
12/11/2022	7 a 12	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Armado de acero de entrepiso de bloque B, fundida de entrepiso de bloque A, fundida de placa de cimentación de bloque N y completar fundida de columnas de bloque E y armado de equipo para entrepiso de segundo nivel de bloque C a D.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El porcentaje programado de acuerdo a programación de obra inicial aprobada y vigente se encuentra registrado de la siguiente manera: Programado Acumulado de 59,12%, Ejecutado Acumulado del 11.24% para un atraso de 47.88%. En cuanto al Plan de Contingencia el Programado acumulado es del 15.65%, ejecutado acumulado del 11.24% para un atraso del 4,41%. Seguimos alertando a la entidad contratante sobre el atraso progresivo.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Nos acercamos al 5% del atraso sobre el Plan de Contingencia; es preciso alertar ya que sobre esta acción para frenar el atraso de la programación inicialmente aprobada no debería presentarse atraso. Por otra parte, el contratista de obra manifiesta dificultades con suministros de algunos materiales que relacionamos en comité de seguimiento, sin embargo, damos claridad que hasta no tener argumentos que evidencien tal situación no damos validez a los comentarios realizados en los comités de seguimiento.	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
