GNG Ingeniería S.A.S.	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/5/2018	28/7/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	134 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.**				
SEMANA No.	34	**DEL**	**9/1/2023**	**AL**	**15/1/2023**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	238	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**
Contrato No.	**133 DE 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	5/5/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/5/2022
Valor Inicial	$ 43,322,137,680.00	**Valor Inicial**	$ 1,570,157,939.00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23/5/2022	**Fecha de Iniciación**	23/5/2022
Fecha de Terminación*	22/10/2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2023
No póliza contrato de obra	Póliza cumplimiento CBC-100035966-0 Póliza RCE CBC_10005343-0	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	19/5/2022	**Fecha aprobación**	12/5/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS


CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00	CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 314,031,787.80
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 4,332,213,768.00	CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 314,031,787.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 10,830,534,420.00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 157,015,893.90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8,664,427,536.00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	$ 2,166,106,884.00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor total actividad	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	27/6/2022	EN PROCESO	$ 380,942,381.00	$ 2,521,127.10	0.66%	Actividad ejecutada en bloque G
2.1.2	Suministro y colocacion Concreto limpieza 1,500 PSI (10.5 Mpa)	13/9/2022	EN PROCESO	$ 232,947,620.00	$ 34,151,731.80	14.66%	Actividad ejecutada en bloque G
2.1.3	Suministro y colocacion Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	30/9/2022	EN PROCESO	$ 1,430,775,096.00	$ 3,773,201.04	0.26%	Actividad ejecutada en bloque C y G
2.1.4	Suministro y colocacion Concreto para zapatas de cimentacion 3,000 PSI (21 Mpa)	9/1/2023	EN PROCESO	$ 15,165,012.00	$ 10,919,939.10	72.01%	Actividad ejecutada en bloque G
2.1.6	Suministro e instalacion de Geotextil tejido 2,400	26/9/2022	EN PROCESO	$ 101,026,661.00	$ 390,903.00	0.39%	Actividad ejecutada en bloque G
3.1.2	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Por placa y ductos)	21/11/2022	EN PROCESO	$ 16,226,946.00	$ 1,108,256.00	6.83%	Actividad ejecutada en bloque A
3.1.4	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Por placa y ductos)	21/11/2022	EN PROCESO	$ 5,670,326.00	$ 297,846.00	5.25%	Actividad ejecutada en bloque A
3.1.6	Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Por placa y ductos)	21/11/2022	EN PROCESO	$ 9,291,631.00	$ 207,560.00	2.23%	Actividad ejecutada en bloque A
4.1.1	Suministro y colocacion de Concreto a la vista para columnas de 4,000 PSI (28 Mpa)	30/9/2022	EN PROCESO	$ 944,434,572.00	$ 56,614,944.63	5.99%	Actividad ejecutada en bloques C
4.2.1	Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	3/11/2022	EN PROCESO	$ 1,639,528,478.00	$ 38,970,606.78	2.38%	Actividad ejecutada en bloques C
6.1.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	19/12/2022	EN PROCESO	$ 5,695,536.00	$ 2,847,768.00	50.00%	Actividad ejecutada en bloques A
6.1.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	19/12/2022	EN PROCESO	$ 4,941,450.00	$ 197,328.57	3.99%	Actividad ejecutada en bloques A

6.1.6.2	Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	19/12/2022	EN PROCESO	$ 2,092,356.00	$ 1,031,016.00	49.28%	Actividad ejecutada en bloques A
6.1.6.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	19/12/2022	EN PROCESO	$ 3,113,125.00	$ 124,525.00	4.00%	Actividad ejecutada en bloques A
6.1.6.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	19/12/2022	EN PROCESO	$ 2,157,747.00	$ 62,847.00	2.91%	Actividad ejecutada en bloques A
6.1.6.6	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	19/12/2022	EN PROCESO	$ 3,565,688.00	$ 391,356.00	10.98%	Actividad ejecutada en bloques A
6.1.6.7	Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	9/1/2023	EN PROCESO	$ 1,995,624.00	$ 55,434.00	2.78%	Actividad ejecutada en bloques A
6.1.6.8	Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	9/1/2023	EN PROCESO	$ 2,986,812.00	$ 73,296.00	2.45%	Actividad ejecutada en bloques A
6.1.6.9	Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	19/12/2022	EN PROCESO	$ 14,981,330.00	$ 202,202.00	1.35%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.1.1	Suministro e instalación de punto sanitario 4" para fluxómetros y sanitarios de tanque	20/9/2022	EN PROCESO	$ 16,920,337.00	$ 799,386.00	4.72%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.1.3	Suministro e instalación de punto sanitario 2" para sifones de piso, duchas, lavamanos, lavaplatos, orinales, bebederos, pocetas y puntos de desagüe para equipos de cocina	20/9/2022	EN PROCESO	$ 25,950,738.00	$ 971,418.00	3.74%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.4.10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 250 mm (Bajo tierra)	20/9/2022	EN PROCESO	$ 36,424,243.00	$ 2,907,641.30	7.98%	Actividad ejecutada en áreas exteriores
6.2.5.1	Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	9/1/2023	EN PROCESO	$ 9,288,386.00	$ 409,180.00	4.41%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.5.4	Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	19/12/2022	EN PROCESO	$ 772,055.00	$ 74,715.00	9.68%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.5.5	Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	19/12/2022	EN PROCESO	$ 3,205,197.00	$ 83,796.00	2.61%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.6.1	Excavación manual en material común de brecha para tubería	12/9/2022	EN PROCESO	$ 48,785,278.00	$ 398,773.76	0.82%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.6.2	Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/9/2022	EN PROCESO	$ 227,154,621.00	$ 2,165,824.20	0.95%	Actividad ejecutada en bloques A
6.2.6.4	Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	14/9/2022	EN PROCESO	$ 11,667,950.00	$ 648,404.65	5.56%	Actividad ejecutada en bloques A
7.1.5.2	Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	9/1/2023	EN PROCESO	$ 75,639,390.00	$ 7,439,940.00	9.84%	Actividad ejecutada en bloques A, B, C
7.1.10.2	Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	9/1/2023	EN PROCESO	$ 11,553,966.00	$ 1,109,988.00	9.61%	Actividad ejecutada en bloques A, B, C
26.1	Aseo Permanente en Obra	23/5/2022	EN PROCESO	$ 46,448,640.00	$ 1,128,960.00	2.43%	Actividad ejecutada permanente en obra
26.3	Retiro de Escombros y Sobrantes	9/1/2023	EN PROCESO	$ 78,887,719.00	$ 3,352,560.00	4.25%	Actividad ejecutada en bloques A, B, C
NP 28.3	Reemplazo de material organico por Recebo Común	13/11/2022	EN PROCESO	$ 43,559,141.00	$ 7,770,683.83	17.84%	Actividad ejecutada en áreas exteriores en bloques A al E y zona de Rampa

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**AVANCE**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
$ 9,619,226,546.58	$ 938,607,052.91	$ 10,557,833,599.49	$ 9,628,762,122.19	$ 183,203,158.76	9,811,965,280.95
27.31%	**2.66%**	**29.97%**	**27.33%**	**0.52%**	**27.85%**

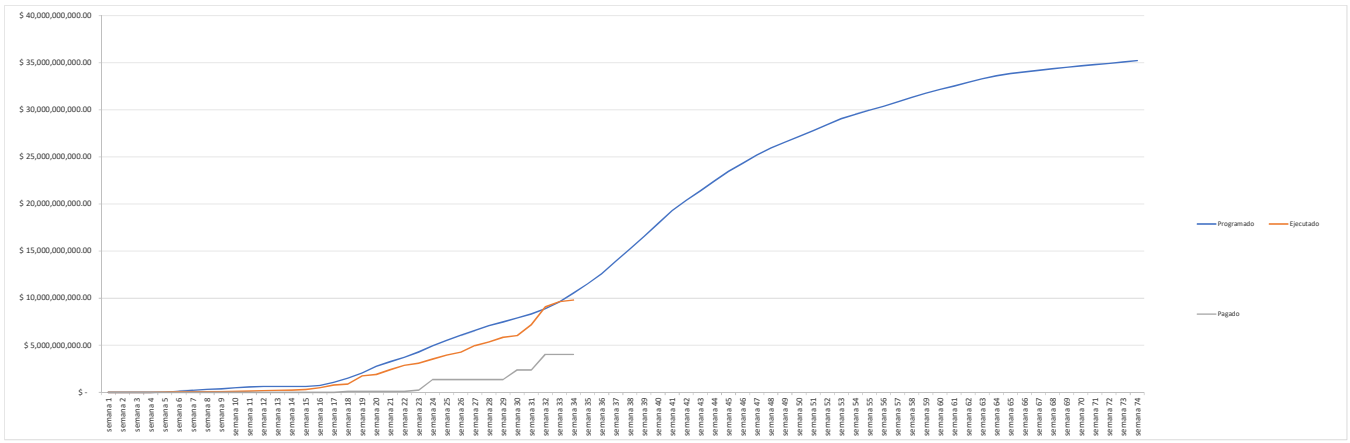

Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1.2.1 - Demolición de estructuras en concreto existentes - muros - adoquines - losetas - estructuras asfalticas (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	40	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.2 - Desmonte aparatos sanitarios, incluye griferias y accesorios (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	40	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.3 - Desmonte Divisiones de baño (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	40	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.4 - Desmonte Puertas y ventanas (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	7/12/2022	0	40	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.5 - Desmonte Tanques elevados (Incluye cargue y retiro)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada, áreas utilizadas por colegio existente
1.2.6 - Desmonte Bomba suministro de agua (Incluye disposición)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada, áreas utilizadas por colegio existente
1.2.7 - Desmonte estructura metalica (Incluye disposición)	14/11/2022	7/12/2022	0	40	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.8 - Desmonte cubierta (Incluye disposición)	14/11/2022	7/12/2022	0	40	23	Actividad iniciada en área de colegio existente
1.2.9 - Demolición de estructura de cimentación existente	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada, áreas utilizadas por colegio existente
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	7/9/2022	Sin iniciar	0	0	130	Actividad no iniciada, es importante precisar que luego de visita por parte del consultor del proyecto se informó que este material granular se ejecutaría en las zonas exteriores, por tal motivo esta actividad no ha iniciado.
2.1.1 - Suministro y colocación Concreto ciclópeo rajón 60% concreto 40% de 2,500 PSI (17.5 Mpa)	12/9/2022	29/9/2022	0	109	17	Actividad realizada en bloques A,B,C,D,E,L,N y M
2.1.3 - Suministro y colocación Concreto para vigas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	12/9/2022	30/9/2022	0	108	18	Actividad realizada en bloques A,B,C,D,E,L,N y M
2.1.4 - Suministro y colocación Concreto para zapatas de cimentación 3,000 PSI (21 Mpa)	12/9/2022	9/1/2023	0	7	112	Actividad iniciada en bloque G
2.1.5 - Construcción de Losa aligerada de fundación en concreto de 3000 PSI - 1 M (loseta superior e inferior de 0.10 M)	12/9/2022	26/9/2022	0	112	14	Actividad realizada en bloques A,B,C,D,E,L,N y M
2.2.1 - Suministro y colocacion de Concreto para vigas cimentacion de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	13/9/2022	5/11/2022	0	65	55	Actividad realizada en rampa
2.2.2 - Construccion de Zapatas de cimentación para rampa en concreto 3000 PSI (21 Mpa)	13/9/2022	Sin iniciar	0	0	125	Actividad no iniciada
2.2.3 - Construcción de Losa maciza en concreto 3,000 PSI (21 Mpa) 0.10 M	3/10/2022	5/11/2022	0	65	35	Actividad realizada en rampa
2.2.4 - Suminstro y colocacion de Concreto para columnas de Rampa 4,000 PSI (28 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada, es importante acotar que esta actividad dentro del diseño estructural se encuentra con cambio de especificación, por tal motivo se realizará mediante un No Previsto.

2.2.5 - Suministro y colocacion de Concreto para vigas aereas de rampa 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
3.1.1 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 6" (Bajo tierra)	12/9/2022	21/11/2022	0	56	77	Actividad realizada en áreas exteriores
3.1.3 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 4" (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	126	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.1.5 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 3" (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	126	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.1.7 - Suministro e instalacion de Tubería PVC sanitaria 2" (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	126	Actividad no iniciada, cabe aclarar que esta actividad no se precisa para los bloques que se encuentran en ejecución.
3.2 - CAJAS DE INSPECCION	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	126	Actividades no iniciadas
4.1.2 - Suministro y colocacion de Concreto a la vista para vigas aéreas de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	13/11/2022	0	70	35	Actividad realizada en bloques A,B,C,D y E
4.1.3 - Suministro y colocacion Concreto a la vista para escaleras de 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	105	Actividad no iniciada
4.1.4 - Construcción de Placa aligerada a la vista en casetón h= 0.30 M concreto 3,000 PSI (21 Mpa)	3/10/2022	Sin iniciar	0	0	91	Actividad no iniciada, es importante precisar que esta actividad se está ejecutando por el ítem, NP-28,5, toda vez que se realizó cambio de especificación
4.2.1 - Suministro e instalacion de Acero de refuerzofigurado fy= 420 Mpa Vigas y Losas Entre-pisos	3/10/2022	3/11/2022	0	73	28	Actividad realizada en bloques A,B,C,D y E
4.3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	24/10/2022	Sin iniciar	0	0	84	Actividad no iniciada
4.4.2 - Suministro e instalacion de Junta constructiva manto de poliestireno de alta densidad (unión entre edificaciones)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	119	Actividad no iniciada
5.1.1 - Construcción de Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a dos caras. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo.	24/10/2022	15/12/2022	0	32	52	Actividad iniciada en bloque A
5.1.2 - Construccion de muro cortafuego en doble Muro en ladrillo tolete prensado liviano coral santafé o similar (0.245x0.12x0.06) M - visto a una cara. Incluye mortero de pega y acero de refuerzo. (resistencia a ignicion de 2 horas)	24/10/2022	19/12/2022	0	28	56	Actividad iniciada en bloque A
5.1.3 - Construccion de Anclaje para reforzamiento en concreto y epóxico para ø 3/8" . de profundidad estándar (perforación - limpieza - epóxico)	24/10/2022	15/12/2022	0	32	52	Actividad iniciada en bloque A
5.1.4 - Muro en bloque de concreto con celdas rellenas de arena, grouting o vermiculita, Dimesiones 20cm , 20cm 40cm pañete a dos caras - auditorio	24/10/2022	Sin iniciar	0	0	84	Actividad no iniciada
6.1.3 - REDES DE AGUA A PRESION BAJO TIERRA	14/9/2022	Sin iniciar	0	0	124	Actividades no iniciadas
6.1.4 - EXCAVACION Y RELLENOS PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	14/9/2022	Sin iniciar	0	0	124	Actividad no iniciada
6.1.5.1 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.5.2 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 3" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.3 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 2.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.4 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A

6.1.5.5 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/2" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.6 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1.1/4" unión soldada RDE 21 (incluye accesorios)	14/11/2022	3/1/2023	0	13	49	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.7 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1" RDE 13.5 unión soldada (incluye accesorios)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.5.8 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 3/4" RDE 11 unión soldada (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.9 - Suministro e instalación de tubería PVC presión 1/2" RDE 9 unión soldada (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.5.10 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 4"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.5.11 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 3"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.5.12 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 2.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.5.13 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.5.14 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 1.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.5.15 - Suministro e instalación de junta de expansión flexible en acero inoxidable 1.1/4"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.6.1 - Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.6.2 - Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.3 - Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.4 - Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.5 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.6 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.7 - Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/1/2023	0	7	56	Actividad iniciada en bloque A
6.1.6.8 - Suministro e instalación de abrazadera 3/4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/1/2023	0	7	56	Actividad iniciada en bloque A

6.1.6.9 - Suministro e instalación de abrazadera 1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.1.7 - VALVULAS DE CIERRE Y CHEQUES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.8.1 - Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1.1/4" para fluxómetro y ducha lavaojos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.1.8.2 - Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría hidráulico 3/4" para orinales	14/11/2022	26/12/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloque A
6.1.8.3 - Suministro e instalación de punto de suministro de agua fría 1/2" (Sanitario de tanque, lavamanos, lavaplatos, ducha, bebedero, pocetas para aseo, salidas de manguera, puntos de suministro para cocina)	14/11/2022	26/12/2022	0	21	42	Actividad iniciada en bloque A
6.2.2.1 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.2.2 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.2.3 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 2" descolgada y a través de ductos (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.2.4 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.2.5 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 3" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.2.14 - Suministro e instalación de trampa de grasas 1.60 m x 0.65 m en concreto reforzado para aguas residuales provenientes de equipos de cocina (incluye tapa con marco y angulo, excavación y retiro de material)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.2.15 - Suministro e instalación de trampa de grasas de grasas 1.20 m x 0.60 m en concreto reforzado para aguas residuales provenientes de laboratorios (incluye tapa con marco y angulo, excavación y retiro de material)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.3.1 - Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 3" (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.3.2 - Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 2" (incluye accesorios)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.3.3 - Suministro e instalación de tubería PVC liviana para reventilación 1.1/2" (incluye accesorios)	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.4.3 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 6" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.4.4 - Suministro e instalación de junta de expansión en PVC sanitaria 4" para bajantes	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.4.5 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	12/9/2022	10/10/2022	0	91	35	Actividad realizada en bloque A, B, E, L y N

6.2.4.6 - Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4" para instalar bajo tierra (incluye accesorios)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	126	Actividad no iniciada
6.2.4.7 - Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 400 mm (Bajo tierra)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	126	Actividad no iniciada
6.2.4.8 - Suministro e instalación de tubería PVC corrugada Novafort 355 mm (Bajo tierra)	12/9/2022	10/10/2022	0	98	28	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.4.12 - Suministro e instalación de tragantes de aguas lluvias 8" x 6"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
6.2.5.1 - Suministro e instalación de abrazadera 6" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/1/2023	0	7	56	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.2 - Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	21	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.3 - Suministro e instalación de abrazadera 3" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	21	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.4 - Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.5.5 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	19/12/2022	0	28	35	Actividad iniciada en bloque A
6.2.6.2 - Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/9/2022	10/10/2022	0	98	28	Actividad realizada en áreas exteriores
6.2.6.3 - Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	126	Es importante precisar que teniendo en cuenta las condiciones del material de obra existente, por aclaración de los especialistas en geotecnia de todas las partes, el material existente en el predio no es recomendable para su uso
6.2.6.4 - Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	12/9/2022	10/10/2022	0	98	28	Actividad realizada en áreas exteriores
7.1.2.1 - Suministro e instalación de tubería bajo tierra PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento en uniones tubo a tubo	12/9/2022	24/10/2022	0	84	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.2.2 - Suministro e instalación de codo 90° para PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/9/2022	24/10/2022	0	77	49	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.2.3 - Suministro e instalación de codo 45° para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	119	Actividad no iniciada
7.1.2.4 - Suministro e instalación de tee para tubería PVC C900 4" para red contra incendios, incluye la incorporación de restrictores de movimiento tubo - accesorio	12/9/2022	24/10/2022	0	84	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.2.5 - Suministro e instalación de transición de PVC C900 - Acero 4" x 4" para paso de tubería enterrada a tubería descolgada	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	119	Actividad no iniciada
7.1.3.1 - Excavación manual en material común de brecha para tubería	12/9/2022	24/10/2022	0	84	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.3.2 - Relleno de brecha con material seleccionado (incluye compactación manual)	12/9/2022	24/10/2022	0	84	49	Actividad iniciada en bloques L, M y N

7.1.3.3 - Relleno de brecha con material de la obra (incluye compactación manual)	12/9/2022	Sin iniciar	0	0	119	Actividad no iniciada. Es importante precisar que teniendo en cuenta el estado del material encontrado inicialmente en obra, dentro de la visita realizada por los especialistas en Geotecnia se indicó que el material no era aceptable para ser usado como material de relleno, por tal razón esta actividad no se ejecutará
7.1.3.4 - Retiro de material sobrante en volqueta de excavación de brecha para tubería	12/9/2022	24/10/2022	0	84	42	Actividad iniciada en bloques L, M y N
7.1.5.1 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 4"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.2 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	9/1/2023	0	7	56	Actividad iniciada en bloque A
7.1.5.3 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.4 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/2" (incluye accesorios)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.5 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1.1/4" (incluye accesorios)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.6 - Suministro e instalación de tubería en acero al carbón 1" (incluye accesorios)	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.7 - Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 4"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.8 - Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.9 - Suministro e instalación de codo 90° en acero al carbón 2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.10 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 4"x2.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.11 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.12 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2.1/2"x 1.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.13 - Suministro e instalación de tee en acero al carbón 2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.14 - Suministro e instalación de reducción en acero al carbón 2.1/2"x 2 "	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.5.15 - Suministro e instalación de junta de expansión en acero al carbón 2.1/2"	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.6 - CENTROS DE CONTROL DE ROCIADORES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.7 - ROCIADORES AUTOMATICOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.8 - SOPORTES SISMICOS PARA RED DE ROCIADORES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.9 - SALIDAS DE MANGUERA CONTRA INCENDIO	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.10.1 - Suministro e instalación de abrazadera 4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.10.2 - Suministro e instalación de abrazadera 2.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	9/1/2023	0	7	56	Actividad iniciada en bloque A

7.1.10.3 - Suministro e instalación de abrazadera 2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.10.4 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/2" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.10.5 - Suministro e instalación de abrazadera 1.1/4" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
7.1.10.6 - Suministro e instalación de abrazadera 1" para tubería descolgada o por ductos	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
8.1.4 - SALIDAS DE ILUMINACION Y LUMINARIAS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
8.1.5 - SALIDAS DE TOMACORRIENTES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
8.1.7 - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA RAYOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada

8.2.1 - INSTALACIONES COMUNICACIONES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
8.3.1 - SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA VIGILANCIA CCTV	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
8.4.1 - SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
9.1 - EQUIPOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
9.2 - CONDUCTOS	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
9.3 - TUBERIA DE REFRIGERACION	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
9.4 - TUBERIA DE PVC	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
9.5 - CABLES DE CONTROL	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
9.6 - TUBERIA CABLEADA	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
10.1 - TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
10.2 - DIFUSORES	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
10.3 - REJILLAS DE SUMINISTRO	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
10.4 - REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
10.5 - REJILLAS TIPO LOUVER	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
10.6 - FILTROS DE AIRE	14/11/2022	Sin iniciar	0	0	63	Actividad no iniciada
11.1 - PAÑETES	26/11/2022	Sin iniciar	0	0	49	Actividad no iniciada
12.1.1 - Suministro e instalacion Piso en baldosa de granito 30 x 30 cm, incluye adhesivo en polvo de altas prestaciones tipo pegacor o similar y boquilla, , incluye destronque pulida y brillado	19/12/2022	Sin iniciar	0	0	28	Actividad no iniciada
12.1.2 - Construccion de Piso en concreto estampado espesor hasta 0.10 M concreto de 3000 PSI color y diseño de acuerdo a plano de detalle de pisos. Incluye manto impermeabilizante (sufridor).	19/12/2022	Sin iniciar	0	0	28	Actividad no iniciada
12.1.6 - Construccion de Piso en concreto pulido 0.05-0.07 M de 3000 PSI allanado y afinado mecanicamente, con endurecedor de cuarzo color de acuerdo a plano de detalle de piso.	19/12/2022	Sin iniciar	0	0	28	Actividad no iniciada
12.2 - ENCHAPES	19/12/2022	Sin iniciar	0	0	28	Actividad no iniciada
13.1 - CUBIERTAS	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	77	Actividad no iniciada
13.2 - CANALES Y FLANCHES	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	77	Actividad no iniciada
15 - CIELO RASOS Y ESTRUCTURA LIVIANA	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	35	Actividad no iniciada

16.1 - ESTUCO Y PINTURA	12/12/2022	Sin iniciar	0	0	35	Actividad no iniciada
21.1.1 - Excavación mecánica (incluye retiro de sobrantes)	27/6/2022	Sin iniciar	0	0	203	Actividad no iniciada
21.1.2 - Rellenos en material seleccionado proveniente de la excavación (no incluye material)	27/6/2022	Sin iniciar	0	0	203	Actividad no iniciada
27 - SISTEMA GENERACION ELECTRICA SOLAR	31/10/2022	Sin iniciar	0	0	77	Actividad no iniciada

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

El día 10 de enero de 2023 el contratista remite el acta parcial de obra No. 6 e informe mensual No. 7 mediante comunicado No. CCERU-22-404, mediante comunicado No. CCERU-22-406 del 11 de enero de 2023 el contratista remite concepto sobre suelo de fundación para escalera modulo G, esta información se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoria. El día 12 de enero de 2023 la interventoría solicita al contratista por segunda vez respuesta a la objeción de la hoja de vida del profesional SST. Mediante comunicado No. GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_276 la interventoría traslada a la ERU solicitud del contratista de aclaración a especificación técnica sanitaria. Mediante comunicado No. GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_277 del 13 de enero de 2023 la interventoría traslada a la ERU solicitud de aclaración de elementos no estructurales de mamposteria.

Aspecto Financiero

A la fecha se han realizado los siguientes pagos de actas de cobro parcial de obra y de interventoría:

No.	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE OBRA 133 DE 2022	FECHA REMISIÓN	ACTAS PARCIALES DE COBRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 134 DE 2022
1	22/8/2022	$108.475.197	1/9/2022	$5.054.851
2	26/10/2022	$134.687.156	12/10/2022	$4.945.998
3	4/11/2022	$1.117.692.007	3/11/2022	$58.080.142
4	6/12/2022	$1.037.817.947	5/12/2022	$53.982.030
5	29/12/2022	$1.644.270.260	15/12/2022	$85.353.786

A la fecha se han realizado los siguientes desembolsos de anticipo:

No.	FECHA REMISIÓN	DESEMBOLSO DE ANTICIPO
1	31/8/2022	$535.440.897
2	1/9/2022	$801.761.766
3	12/9/2022	$36.735.959
4	22/9/2022	$935.794.251
5	4/10/2022	$1.585.487.141
6	10/10/2022	$183.265.617
7	10/10/2022	$33.114.281
8	20/10/2022	$22.090.963
9	28/10/2022	$172.288.168
10	28/10/2022	$33.765.985
11	31/10/2022	$22.804.992
12	4/11/2022	$250.000.000
13	13/11/2022	$1.250.093.494
14	23/11/2022	$62.466.089
15	1/12/2022	$315.708.740
16	16/12/2022	$65.956.068
17	12/12/2022	$69.381.916
18	12/12/2022	$250.306.308
19	13/12/2022	$317.446.512
20	23/12/2022	$19.446.482
21	26/12/2022	$426.006.012
22	3/1/2023	$68.414.976

Aspecto Técnico

Realizando recorrido por el bloque D se observan parales "torcidos" lo cual genera una alerta dado que no se explica el motivo por el cual se encuentran dispuestos de esa manera. Solicitamos al director de Obra adelantar el reforzamiento de los parales en mención y hacer seguimiento con cuadrilla de topografía. Dicho informe se da para seguimiento durante una semana continua con el fin de evidenciar cambios de nivel en los elementos de concreto. De igual manera adelantamos reunión con los especialistas estructurales de las partes para indagar sobre el asunto y determinar parámetros que otorguen seguridad en la entrega de los elementos de concreto. Los resultados de algunos de los elementos en concreto no están llegando al 100% a los 28 días de manera que alertamos sobre el asunto para que el contratista tome los correctivos correspondientes. Las actividades en ejecución corresponden al armado de aceros del bloque G para placa de cimentación y actividades de armado de hierro en bloque D; este último no está autorizado para realizar fundida hasta no tener respuesta y consenso satisfactorio por las partes. En mampostería las actividades están concentradas en bloque A primer nivel, solicitamos las reparaciones pertinentes en viguetas que presentan irregularidades en su acabado. En proceso la instalación de la red hidráulica y RCI.

Aspecto SST-Ambiental

AMBIENTAL:
En el periodo evaluado se solicto al contratista mejorar los acopios del hierros dado que se eviencian sin la respectiva proteccion y señalizacion, por otra parte se requiere se realice el retiro la chatarra una vez se cumplan con el volumen necesario para la disposicion final.

SST:
En reunion realizada en conjunto contratista e interventoria, se reitero el compromiso, donde todo subcontratista que realice actividades de obra en el proyecto debera tener la disponibilidad de un inspector SST, 100% esto con el fin de cumplir con la legislacion vigente, de igual forma se solicita se cumpla con la gestion diaria SST, que consiste en mantener en buen estado la señalizacion de obra, sendero peatonales y uso de epp dependiendo la actividad, no se han presentado incidentes ni accidentes de trabajo en el periodo.

Personal administrativo: 10 trabajadores
Personal Operativo:
Lunes 09 de enero de 2023 día festivo, no se labora
Martes 10 de enero de 2023 60 trabajadores 2 comisión topográfica
Miércoles 11 de enero de 2023 72 trabajadores 2 comisión topográfica
Jueves 12 de enero de 2023 70 trabajadores 2 comisión topográfica
Viernes 13 de enero de 2023 76 trabajadores 2 comisión topográfica
Sábado 14 de enero de 2023 73 trabajadores 2 comisión topográfica
Personal interventoría: 7
El personal programado para la semana No. 34 era de 93 trabajadores, de acuerdo a plan de contingencia.

Aspecto Social

El 10 de enero de 2023, la interventoría envió al contratista el número del radicado de la Secretaría de Educación a la Secretaría de Ambiente con la solicitud de la valla de la obra, información que fue remitida por el contratista al señor Juan Cuesta de acuerdo a la solicitud realizada por él en el 5to CPC, dando cumplimiento al compromiso del 5to CPC.
El 10 de enero de 2023, el contratista mediante el comunicado CCERU_22_404 hizo entrega del informe mensual No.7 consolidado a la interventoría para revisión y aprobación.
El 10 de enero de 2023, frente a la solicitud del permiso de trabajo nocturno el contratista remitió el oficio de aprobación de la Alcaldía Local de Kennedy radicado 20225833641691 del 22 de diciembre de 2022
El 12 de enero de 2023, una vez se recibió la aceptación a los volantes por parte de la supervisión, la interventoría envió la aprobación al contratista de los volantes No.20 para la Invitación Personalizada al 6to Comité de Participación Ciudadana y el No.21 para la Invitación Masiva al 6to Comité de Participación Ciudadana. Con lo cual el contratista puede proceder a realizar la convocatoria.
El 12 de enero de 2023, se realizó el comité de seguimiento social No.33 entre pares sociales contratista e interventoría.
El 12 de enero de 2023, el contratista remitió a la interventoría la presentación para el 6to CPC, para revisión y aprobación.
El 12 de enero de 2023, la interventoría revisó el informe mensual No.7 en físico del componente social y emitió la aprobación para radicación y aceptación de la entidad.
El 13 de enero de 2023, la supervisión radicó el comunicado S2023000116 en el que solicita se informe el avance de cumplimiento del contratista frente a la contratación de MONC de la localidad de Kennedy
El 13 de enero de 2023, la interventoría remitió la presentación para el 6to CPC revisada y aprobada a la supervisión para revisión y aceptación.
El 13 de enero de 2023, el contratista mediante el comunicado CCERU_SOC_049 solicitó a la interventoría una Certificación de las PQRSD presentadas por la comunidad para la continuidad del permiso de trabajo nocturno aprobado por la Alcaldía Local de Kennedy radicado No.20225833641691 del 22 de diciembre de 2022.
El 14 de enero de 2023, la interventoría mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_278, certificó que durante el mes de diciembre de 2022 no se presentaron o atendieron PQRSD generadas por ruidos ni afectaciones a los habitantes de la zona de influencia del proyecto, con lo cual se puede continuar con la aprobación del permiso de trabajo aprobado por la ALK en el mes de diciembre de 2022.
El 14 de enero de 2023, la interventoría informa que hay 1 PQRSD cerrada y 0 PQRSD abiertas. No se ha recibido PQRSD.
El 14 de enero de 2023, el PAC cumple con la instalación y equipamiento. El aviso del PAC se encuentra instalado en un lugar visible. La profesional social ha cumplido el horario de atención a la comunidad.
El 14 de enero de 2023, la interventoría validó que se ha dado cumplimiento del 95% a la contratación de MONC del proyecto para las semanas 25 al 31 de diciembre de 2022 y 1 al 7 de enero de 2023.

Aspecto PMT

De acuerdo a radicado realizado ante la Secretaría de Movilidad fue aprobado el PMT con la actualización de ingresos para la obra por lo cual informamos que el contratista de obra se encuentra al día con el tramite.


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	20226120170842* 20226120174665*	8/7/2022	6/7/2023			
25316 COI No. 27	20226120170842* 20226120174665*	8/7/2022	6/7/2023			
35147 COI No. 37	20226120257666*	16/9/2022	14/9/2023			
35148 COI No. 37	20226120257666*	16/9/2022	14/9/2023			
35149 COI No. 37	20226120257666*	16/9/2022	14/9/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
9/1/2023	7 a 5	0
10/1/2023	7 a 5	5
11/1/2023	7 a 5	4
12/1/2023	7 a 5	2
13/1/2023	7 a 5	2
14/1/2023	7 a 12	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta la fundida de la placa de cimentación del bloque G y armado de aceros del bloque D del tercer nivel; continuar en mampostería con los bloques B y D una vez se liberen los espacios.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El porcentaje programado de acuerdo a programación de obra inicial aprobada y vigente se encuentra registrado de la siguiente manera: Programado Acumulado de 67,70%, Ejecutado Acumulado del 27,85% para un atraso de 39,85%. En cuanto al Plan de Contingencia el Programado acumulado es del 29,97%, ejecutado acumulado del 27,85% diferencia 2,12%. Presenta atraso, es importante informar que tiene una baja de personal lo cual no lo exonera de responsabilidad.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Al presentar un nuevo atraso de la curva del Plan de Contingencia continuamos como interventoría alertando sobre el asunto; en los comités de seguimiento se solicitó implementar las respectivas contingencias para evitar el atraso progresivo tal como se venía registrando en los últimos meses del año 2022.	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.
