CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003 CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
R.L. ING. SANDRA LILINAN GALINDO SANCHEZ

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDIA DE FUSGASUGA

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES 2022
R.L. ING. OSCAR EDUARDO PINILLA PINILLA


FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 002 CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Ing. Luis Gabriel Farfán	Ingeniero residente	
APROBÓ	Ing. Iván Alonso Pardo Ávila	Director de Obra	
Vo. Bo.	Doc. Nestor Guerrero	Director de Interventoría	
Vo. Bo.	Arq. Javier Rojas	Residente de Interventoría	

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 5
2. ALCANCE DEL PROYECTO. 6
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 6
3.1 LOCALIZACIÓN. 8
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 9
3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 9
3.4 OBRAS EJECUTADAS EN EL MES. 19
3.5 OBRAS EJECUTADAS ACUMULADAS A PARTIR DE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO. 19
3.6 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 19
4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEACEURDO A PLIEGO DE CONDICIONES. .. 19
5. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 20
5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA. 20
5.1.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 20
5.2 CONTROL DE POLIZAS. 20
5.2.1 POLIZAS CONTRATO DE OBRA 20
6. ACTAS DE COMITÉ 20
7. ESTADO DEL TIEMPO 21
8. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO. 22
9. CONCLUSIONES. 22

RELACION DE TABLAS

Tabla 1. Contrato de obra. 9
Tabla 2 Caracteristicas tecnicas del contrato. 18
Tabla 3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES 19
Tabla 4 POLIZAS OBRA SEGUN SUSCRIPCION DEL CONTRATO 20
Tabla 5 ACTAS DE COMITE DE OBRA 20
Tabla 6 ESTADO DEL TIEMPO 21
Tabla 7 AVANCE FINANCIERO 22

RELACION DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto. 8
Ilustración 2.Ubicación del proyecto. 8

RELACION DE ANEXOS

ANEXO 1. CORRESPONDENCIAS
ANEXO 2. BITACORA DE OBRA
ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 4. CERTIFICADOS DE CALIDAD ACERO
ANEXO 5. OBRAS NO PREVISTAS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES
ANEXO 6. ACTA DE INICIO
ANEXO 7. POLIZAS
ANEXO 8. MODIFICATORIO AL CONTRATO INICIAL.
ANEXO 9. INFORME SST
ANEXO 10. INFORME AMBIENTAL
ANEXO 11. INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL No.3

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA"

1. INTRODUCCIÓN.

Mediante contrato No. 2022-0586 la Alcaldía de Fusagasugá suscribió con el Consorcio Construedificaciones conformado por: ESTUDIOS E INGENIERIA SAS NIT 900.351.236-1 CUMBRE INGENIERIA SAS NIT 900.321.674-6. el contrato que tiene por objeto "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**. Las actividades se realizarán directamente en el predio que establece el municipio para el desarrollo del proyecto, es decir, en los predios identificados con matrículas inmobiliarias 157-31540, 157-989, 157-57990, ubicados en la calle 3#7-29 Barrio Centro, este conjunto de predios que son colindantes y cuentan con un área total aproximada de 6,111m2. Por lo tanto, se busca por medio del presente contrato generar un espacio de sana convivencia, esparcimiento y recreación pasiva para la Comuna Norte del municipio en donde se busca beneficiar a adultos mayores, jóvenes y niños con un centro de integración social que dote servicios a la comunidad tales como aula de música, aula de danzas, aula de artes escénicas, aulas multipropósito, aula de Innovación y tecnología, aula de Investigación informática, aula múltiple tercera edad, aula interactiva de cocina para niños, jóvenes y adulto mayor, sala de exhibición que evoca el patrimonio, así como espacios exteriores con áreas como cine bajo las estrellas (proyección de películas al aire libre y escenario cultural), picnic literario al aire libre, recorridos exteriores por los diferentes vestigios históricos y patrimoniales que se conservarán de la edificación existente, senderos enmarcados en vegetación y demás espacios los cuales se detallarán en el informe de diseño arquitectónico, pues esta Comuna no posee espacios como el que se pretende desarrollar, aunando que posee índices de pobreza, desigualdad y problemas sociales muy altos dentro del municipio. Los diseños se desarrollarán dando total cumplimiento a la normatividad urbanística de la zona, así como los reglamentos y normas generales para construcción de edificaciones, con el fin de obtener un diseño estético, funcional y que cumpla a cabalidad las expectativas del municipio y de la comunidad

2. ALCANCE DEL PROYECTO.

De acuerdo con el CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022, Ubicados en el municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, relacionando la información general de la Resolución Administrativa No. 0055 del 29 de abril de 2022, abrió la Licitación Pública No. 2022-0579, para contratar la "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ".

El proyecto consta de tres bloques con un área total de 2830 m2 y una altura de 7.30 metros, con 2 niveles de altura únicamente en el Bloque A el cual será construido. El sistema estructural propuesto son pórticos en concreto reforzadas resistentes a momento, con columnas rectangulares y circulares, encargadas de resistir y transmitir al nivel del suelo de fundación las cargas sísmicas, cargas de viento, cargas gravitacionales y las demás cargas establecidas en el Titulo B de la NR – 10. Además de las columnas, se plantean muros estructurales que contribuyen al soporte de los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de las tierras y también a la transmisión de cargas al suelo de fundación. Aparte de lo anterior, las estructuras se componen de vigas de diferentes secciones, escaleras, rampas y demás elementos estructurales. En la estructura se emplean diferentes usos en las distintas habitaciones, las cuales se encuentran todas reflejadas en el ítem de asignación de cargas de cada bloque. Cabe recalcar que el modelo analizado y diseño por separado por lo cual se presenta todo lo relacionado con los mismos de forma independiente. Además de lo anterior, se presentan los cálculos de la estructura en el módulo A que soporta la fachada, esta se compone de perfiles estructurales cuadrados GRADO 50 y unas vigas IPE 220 que soportan la estructura en la parte inferior En cuanto a la cimentación, se plantea zapatas aisladas con vigas de amarre en ambos sentidos, estas zapatas presentan dimensiones variables en base a las cargas que vienen desde las columnas, pero con una altura fija de 50 centímetros. Para las vigas de amarre presentan una sección de 60 x 70 centímetros. Como estructuras anexas en esta memoria de cálculo se encuentran los muros de contención con su respectiva zarpa, y las escaleras de acceso a los diferentes bloques. Cabe resaltar que todas las estructuras diseñadas cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR – 10.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Como antecedente la comuna centro, presenta un deterioro en el tejido social, debido a que en este sector se caracteriza por un alto número de incidentes vandálicos, el consumo de agentes alucinógenos, el desarrollo de actividades económicas como "casas de lenocinio", y demás factores que dificultan la convivencia y el desarrollo del buen vivir. Debido a que en ella se desarrollan las actividades comerciales de bienes y servicios, lo que ocasiona que la población flotante se presente en horarios específicos, y la población residencial sea mínima o nula. Por otro lado, el déficit en espacios públicos para las prácticas artísticas, culturales, recreativas y de participación. La administración municipal en aras de desarrollar los programas y proyectos sociales, los cuales se reflejarán en la construcción

de las UNIDS (Unidades Integrales de Desarrollo Social), dónde tendrán cabida las actividades, programas y proyectos sociales que redunden en el bienestar social de la comunidad Fusagasugueña. Las Unidades Integrales de Desarrollo Social (UNIDS) contarán con espacios polivalentes con servicios de salud, Aulas Múltiples para encuentros culturales, Bibliotecas, Centro para capacitación de educación no formal, Centro día para la atención de la tercera edad, Centro de rehabilitación para discapacitados, Centro de paso para el menor infractor, Centros cívicos, Juntas Administradoras Locales J.A.L, Zonas para la recreación pasiva y activas. Estos programas se deberán desarrollar en cada una de las Comunas donde se cubrirán los sectores que no tengan alguno de estos servicios. El equipamiento de las UNIDS será de acuerdo con las necesidades, aportando una ordenación jerárquica de las funciones urbanas, arquitectónicas, paisajísticas y mejorando la composición morfológica del municipio. La comuna centro tendrá como cobertura los siguientes barrios y urbanizaciones: Santander, Emilio Sierra, Centro, Potosí, Luxemburgo, Olaya, sin embargo, el alcance del proyecto busca contribuir e integrar a las comunas y corregimiento del municipio de Fusagasugá. Por lo anterior el municipio de Fusagasugá cuenta con el predio denominado:" los crepúsculos" ubicado en la dirección Carrera 7 # 3 -27, posee una extensión territorial de 6.111 m2, el cual se encuentra identificado con números de matrícula inmobiliaria 157-31540, 157-57989, 157-57990, y donde se han desarrollado gran parte del colectivo y memoria histórica del municipio de Fusagasugá, es por ello que dentro del plan de ordenamiento territorial acuerdo No. DE 29 DE 2001, se define como UNIDS. Este predio sirvió como hospital, ancianato municipal entre otros usos. Por su ubicación estratégica, se proyecta como epicentro de desarrollo social integral, para la creación y transformación de espacios públicos destinados a la resignificación de la educación, el arte y la cultura como motor de la transformación social para la población Fusagasugueña, a través de aulas interactivas, administración mixta que incluya la participación pública, privada y de grupos sociales, de la programación de contenidos patrimoniales e históricos, impulsar procesos y adelantar planes y programas para favorecer el desarrollo, bienestar y seguridad de diferentes grupos poblacionales vulnerables entre los cuales se encuentran las niñas y niños, las mujeres, la población adulta mayor, las personas con discapacidad, entre otros. Finalmente es de considerar que este predio cuenta con una ubicación estratégica dentro del municipio de Fusagasugá para la implementación de este tipo de proyectos, por lo que el desarrollo de este, beneficiaria directamente a las comunas oriental, central y comuna norte del municipio, además de desarrollar significativamente la zona, dando una nueva organización físico espacial, lo cual permitiría mejorar las condiciones actuales, incluso en materia de seguridad del sector.


Que, de esta manera, hemos convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes consideraciones. El Municipio de Fusagasugá mediante la Resolución Administrativa No. 0055 del 29 de abril de 2022, abrió la Licitación Pública No. 2022-0579, para contratar la "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ". Que mediante resolución administrativa No. 0087 del 08 de junio de 2022, la entidad adjudico el contrato al proponente CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022, con Nit No. 901604402-9, representado

legalmente por SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 52.381.164 de Bogotá D.C

3.1 LOCALIZACIÓN.

El Municipio de Fusagasugá mediante la Resolución Administrativa No. 0055 del 29 de abril de 2022, abrió la Licitación Pública No. 2022-0579, para contratar la "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ". Que mediante resolución administrativa No. 0087 del 08 de junio de 2022, la entidad adjudico el contrato al proponente CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022, con Nit No. 901604402-9 y Mediante contrato No. 2022-0586 la Alcaldía de Fusagasugá suscribió para ser ejecutada la obra con el Consorcio Construedificaciones.

Ilustración 1. Localización del proyecto.

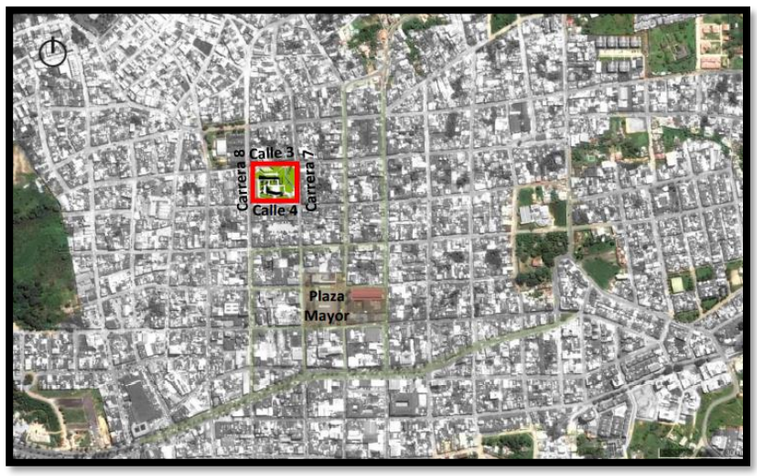

lustración 1 Localización del polígono de intervención, imagen satelital base google earth con modificaciones realizadas por la consultoría

Ilustración 2.Ubicación del proyecto.



Lustración 2 Localización del polígono de intervención, imagen fotográfica tomada por dron.

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Mediante contrato No. 2022-0586 la Alcaldía de Fusagasugá suscribió para ser ejecutada la obra con el Consorcio Construedificaciones; **OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	0586-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	01 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 9,124,368,887.93

Tabla 1. Contrato de obra.

3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"** Sus Actividades y Cantidades a Ejecutar son:

CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ
Actividades y Costos
OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"
FECHA : Septiembre DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 7 MESES
FORMATO No. 1

Contrato No. 2022-0586					
1. PRELIMINARES Y OBRA CIVIL					
APU	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**V.TOTAL**
	PRELIMINARES				
ICUU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	756.33	$ 11,231.00	$ 8,494,342.23
ICUU 16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,119.13	$ 19,041.00	$ 21,309,354.33
ICUU 16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	35.88	$ 21,487.00	$ 770,953.56
	ZAPATAS MÓDULO A - NIVEL -1,00				
1.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA NIVELES BAJOS	m3	42.26	$ 595,507.00	$ 25,166,125.82
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (ZAPATAS)	kg	1,581.16	$ 8,086.00	$ 12,785,259.76
1.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA NIVELES BAJOS	m3	86.50	$ 595,507.00	$ 51,511,355.50
1.5	MEJORAMIENTO EN RECEBO CEMENTO PROPORCIÓN 8:1 (RECEBO TIPO B-400) COMPACTADO AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO H=0,30m - (ÁREA 720,87m2)	m³	216.26	$ 208,535.00	$ 45,097,779.10
1.9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)- NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	m2	720.87	$ 62,155.00	$ 44,805,674.85
	VIGAS DE CIMENTACIÓN				
1.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA NIVELES BAJOS	m3	127.85	$ 595,507.00	$ 76,135,569.95
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (VIGAS NIVEL +3.50)	kg	16,109.99	$ 8,086.00	$ 130,265,379.14
	COLUMNAS NIVEL -1,0 A +7,40				

1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	47.84	$ 625,547.00	$ 29,926,168.48
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA COLUMNAS)	kg	17,104.44	$ 8,086.00	$ 138,306,501.84
	PANTALLAS				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	39.95	$ 625,547.00	$ 24,990,602.65
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PANTALLAS)	kg	12,369.04	$ 8,086.00	$ 100,016,057.44
	ASCENSOR				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	5.82	$ 625,547.00	$ 3,640,683.54
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA ASCENSORES FOSO Y PLACA)	kg	416.62	$ 8,086.00	$ 3,368,789.32
1.6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	m2	5.76	$ 133,551.00	$ 769,253.76
1.9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)- NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	m2	11.52	$ 62,155.00	$ 716,025.60
	MUROS 4, 4A, 4B, 5, 5A,5				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	133.59	$ 625,547.00	$ 83,566,823.73
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA MUROS)	kg	10,045.44	$ 8,086.00	$ 81,227,427.84
	PLACA NIVEL +3,50 -MODULO A				
	VIGAS NIVEL +3,50				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	119.06	$ 625,547.00	$ 74,477,625.82
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA VIGAS NIVEL +3.50)	kg	16,904.63	$ 8,086.00	$ 136,690,838.18
	RIOSTRAS				$ 0.00
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	6.63	$ 625,547.00	$ 4,147,376.61
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA RIOSTRAS NIVEL +3.50)	kg	379.02	$ 8,086.00	$ 3,064,755.72
	TORTAS NIVEL +3,50				
1.3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	m3	8.53	$ 590,732.00	$ 5,038,943.96
1.9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)- NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	m2	1,441.74	$ 62,155.00	$ 89,611,349.70
1.6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	m2	720.87	$ 133,551.00	$ 96,272,909.37
	ALIGERAMIENTO NIVEL +3,50				$ 0.00
1.7	CASETÓN EN ICOPOR DE ALTA DENSIDAD - SECCION VARIABLE - ALTURA 0,39m	m2	53.32	$ 49,908.00	$ 2,661,094.56
	BORDE DE PLACA NIVEL +3,50				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	11.08	$ 625,547.00	$ 6,931,060.76
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA BORDE DE PLACA NIVEL +3.50)	kg	906.35	$ 8,086.00	$ 7,328,746.10
	PLACA NIVEL +7,40 -MODULO A				
	VIGAS NIVEL +7,40				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	127.39	$ 625,547.00	$ 79,688,432.33
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA VIGAS NIVEL +7.40)	kg	16,520.38	$ 8,086.00	$ 133,583,792.68
	VIGA CIRCULAR DE CUBIERTA				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	3.93	$ 625,547.00	$ 2,458,399.71
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	563.76	$ 8,086.00	$ 4,558,563.36
	RIOSTRAS - NIVEL +7,40				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	6.63	$ 625,547.00	$ 4,147,376.61
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	379.03	$ 8,086.00	$ 3,064,836.58
	PLACA ALIGERADA				
1.3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	m3	4.37	$ 590,732.00	$ 2,581,498.84
1.9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)- NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	m2	55.66	$ 62,155.00	$ 3,459,547.30
1.7	CASETON EN ICOPOR DE ALTA DENSIDAD - SECCION VARIABLE - ALTURA 0,39m	m2	27.33	$ 49,908.00	$ 1,363,985.64
	PLACA CON METALDECK				
1.3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	m3	45.39	$ 590,732.00	$ 26,813,325.48
1.9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)- NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	m2	398.20	$ 62,155.00	$ 24,750,121.00
1.6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	m2	398.20	$ 133,551.00	$ 53,180,008.20
	ALIGERAMIENTO NIVEL + 7,40				
1.7	CASETÓN EN ICOPOR DE ALTA DENSIDAD - SECCION VARIABLE - ALTURA 0,39m	m2	459.03	$ 49,908.00	$ 22,909,269.24
	MURO DESCOLGADO NIVEL + 7,40				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	0.83	$ 625,547.00	$ 519,204.01
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	132.09	$ 8,086.00	$ 1,068,079.74
	LUCARNAS (5)				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	18.74	$ 625,547.00	$ 11,722,750.78
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	4,055.52	$ 8,086.00	$ 32,792,934.72
	PISO FLOTADO				
1.10	PREFABRICADO EN CONCRETO 4000PSI 0,90 X 0,20 X 0,08, (INCLUYE MURETES EN CONCRETO SIMPLE DE 0,05X0,05X0,07)	m2	401.31	$ 86,359.00	$ 34,656,730.29
	IMPERMEABILIZACION				
1.11	IMPERMEABILIZACION CON LIMPIEZA Y AJUSTE DE BOMBEOS PENDIENTADO, FIBERGLASS PX900, MANTO DE 3MM, PINTURA BITUMNOSA Y POLIETILENO CALIBRE 6 (GARANTIA DE 10 AÑOS)	m2	401.31	$ 108,646.00	$ 43,600,726.26
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO				$ 0.00
1.4	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	m3	46.40	$ 646,295.00	$ 29,988,088.00
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	4,918.37	$ 8,086.00	$ 39,769,939.82

1.8	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1	ml	28.30	$ 51,230.00	$ 1,449,809.00
ICCU 4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	m3	2.30	$ 346,256.00	$ 796,388.80
ICCU 16,12	SUBSASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	13.85	$ 186,532.00	$ 2,583,468.20
	CAFÉ TERRAZA				
	COLUMNETAS				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	0.32	$ 625,547.00	$ 200,175.04
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	79.36	$ 8,086.00	$ 641,704.96
	VIGAS				
1.2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	m3	0.61	$ 625,547.00	$ 381,583.67
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	87.16	$ 8,086.00	$ 704,775.76
	PLACA				
1.3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	m3	1.12	$ 590,732.00	$ 661,619.84
1.6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	m2	9.92	$ 133,551.00	$ 1,324,825.92
1.9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)- NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	m2	19.84	$ 62,155.00	$ 1,233,155.20
SUBTOTAL OBRA CIVIL MODULO A					**$ 1,875,749,946.20**

2. ARQUITECTURA Y ACABADOS					
2.1 ARQUITECTURA Y ACABADOS MODULO A					
	MUROS				
ICCU 5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	m²	5.60	$ 102,345.00	$ 573,132.00
ICCU 5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	m²	1,228.63	$ 45,907.00	$ 56,402,717.41
ICCU 5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ml	171.29	$ 34,905.00	$ 5,978,877.45
ICCU 5,5	DINTELES CONCRETO 2500 PSI 15X20	ml	359.18	$ 54,215.00	$ 19,472,943.70
	MORTEROS Y PAÑETES		-		
ICCU 8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	m³	20.12	$ 516,272.00	$ 10,387,392.64
ICCU 6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	m²	2,457.26	$ 20,327.00	$ 49,948,724.02
ICCU 6,3	FILOS Y/O DILATACIONES S/MUROS	ml	195.50	$ 8,092.00	$ 1,581,986.00
	APARATOS SANITARIOS		-		
ICCU 17,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INLCUYE GRIFERIA)	und	5.00	$ 334,483.00	$ 1,672,415.00
ICCU 17,2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA)	und	15.00	$ 978,974.00	$ 14,684,610.00
ICCU 17,8	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXÓMETRO INCLUYE GRIFERIA	und	4.00	$ 1,125,210.00	$ 4,500,840.00
ICCU 17,5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	und	4.00	$ 218,209.00	$ 872,836.00
ICCU 17,6	SUMINISTRO E INSTLACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)	und	19.00	$ 202,924.00	$ 3,855,556.00
2.1	POCETA DE ASEO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 1.34X 0.45 H=0.50 INCLUYE LLAVE TIPO POCETA	und	4.00	$ 440,692.00	$ 1,762,768.00
ICCU 17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	und	2.00	$ 276,914.00	$ 553,828.00
ICCU 17,11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA	und	2.00	$ 93,576.00	$ 187,152.00
	CIELOS RASOS		-		
ICCU 15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	m²	335.27	$ 57,212.00	$ 19,181,467.24
	ACABADOS		-		
ICCU 14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RUSTICO 33 X 33	m²	263.27	$ 62,183.00	$ 16,370,918.41
ICCU 14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RUSTICO 33 X 33	m²	335.27	$ 62,183.00	$ 20,848,094.41
2.2	ACABADO ESMALTADO DE CONCRETO A LA VISTA	m²	72.00	$ 213,912.00	$ 15,401,664.00
2.3	ENCHAPE SOBRE MURO CON PINTURA BIOCIDA SOBRE REVOQUE	m²	251.47	$ 42,054.00	$ 10,575,319.38
ICCU 14,17	GUARDAESCOBA EN GRES Y CERAMICA	ml	1,583.58	$ 10,732.00	$ 16,994,980.56
ICCU 18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m²	2,468.46	$ 17,750.00	$ 43,815,165.00
ICCU 18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ml	913.86	$ 11,060.00	$ 10,107,291.60
	CARPINTERÍA METÁLICA		-		
2.4	Ventana fija en perfileria de aluminio tipo pesado anodizado color negro de 14 micras + vidrio Energy Advantge de 6mm de Pilkignton o equivalente, con valor U 3,63w/m2°C, LT 0,82 y SHGC 0,70.	m²	248.33	$ 240,000.00	$ 59,599,200.00
2.5	Ventana batiente en perfileria de aluminio tipo pesado anodizado color negro de 14 micras + vidrio Energy Advantge de 6mm de Pilkignton o equivalente, con valor U 3,63w/m2°C, LT 0,82 y SHGC 0,70	m²	23.96	$ 555,000.00	$ 13,297,800.00
2.6	Ventana con proyectante en perfileria de aluminio anodizado negro de 14 micras + vidrio Energy Advantge de 6mm de Pilkignton o equivalente, con valor U 3,63w/m2°C, LT 0,82 y SHGC 0,70	m²	8.99	$ 595,000.00	$ 5,349,050.00
2.7	Persiana fija en perfileria de aluminio anodizado color negro de 14 micras, ALN 315, con perfileria en lamina de acero Cal. 18 CR	m²	119.76	$ 398,000.00	$ 47,664,480.00
2.8	Puerta corrediza en vidrio templado de 10mm + perfiles de aluminio + cerradura, manijas, rieles, carriles, rodachines, marcos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamento	und	1.00	$ 1,724,249.00	$ 1,724,249.00
2.9	Puerta persiana metálica en lamina de acero cal 18 CR, acabado pintura epoxipoliamina color negro + marco	und	1.00	$ 623,500.00	$ 623,500.00
2.10	Puerta batiente en vidrio templado de 10mm + marco +perfiles de aluminio ancho 1.00 m + herrajes y sistema de pivotes en acero inoxidable	und	26.00	$ 723,500.00	$ 18,811,000.00
2.11	Puerta batiente en vidrio templado de 10mm + marco+ perfiles de aluminio ancho 0.55 m + herrajes y sistema de pivotes en acero inoxidable	und	5.00	$ 450,249.00	$ 2,251,245.00
2.12	Puerta enrrollable en persiana en lamina de acero cal 16 CR, (3.00 x 2.90) acabado pintura epoxipoliamina color negro Incluye motor, malacate, cover, tapas y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento	und	1.00	$ 1,968,500.00	$ 1,968,500.00
2.13	Puerta enrrollable en persiana en lamina de acero cal 16 CR, (2.79 x 2.90) acabado pintura	und	1.00	$ 1,868,500.00	$ 1,868,500.00

	epoxipoliamina color negro Incluye marco, motor, malacate, cover, tapas y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento				
2.14	Puerta plegable en persiana metálica en lamina de acero cal 18 CR, (7,50x2,90) acabado pintura epoxipoliamina negro incluye marco, manijas, rieles, rodachines, carriles, sistema mecánico, marcos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamento	und	1.00	$ 3,333,249.00	$ 3,333,249.00
2.15	DIVISIONES PARA SANITARIOS Y ORINALES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA AISI 304 CALIBRE 20, CON UNA ALTURA DE 1.80 METROS, INCLUYE: PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, MANIJAS DE APERTURA Y CIERRE, CON ACABADO EN LÁMINA DE ACERO POR AMBAS CARAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.ELABORADO EN TALLER Y MONTADO EN OBRA	m2	44.10	$ 586,790.00	$ 25,877,439.00
2.16	JUEGO DE BARRAS PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. 1 BARRA ABATIBLE O PLEGABLE, 1 BARRA DE APOYO DE 24" Y 1 BARRA DE APOYO DE 12"	und	3.00	$ 649,215.00	$ 1,947,645.00
2.17	Cerradura de manija en aleación de zinc satinado, para puertas de vidrio templado altura respecto al acabado de piso cerradura=0.8m manija=0.9m	und	21.00	$ 100,000.00	$ 2,100,000.00
2.18	Cerradura tipo cilindro con llave, para puertas de madera manija en aluminio satinado, altura respecto al acabado de piso cerradura=0.8m manija=0.9m	und	3.00	$ 39,900.00	$ 119,700.00
2.19	Cerradura de piso, tubular T*1102 y manijas en acero inoxidable 1"	und	2.00	$ 268,672.00	$ 537,344.00
2.20	Cerradura antipático o de leva en platina de acero galvanizado de 2mm con refuerzo	und	4.00	$ 349,000.00	$ 1,396,000.00
ICCU 5,5	DINTELES CONCRETO 2500 PSI 15X20	ml	60.48	$ 54,215.00	$ 3,278,923.20
	CARPINTERÍA EN MADERA				
2.21	Puerta entamborada, bastidor en madera pino, alma en honeycomb, caras y cantos en triplex okume 4 mm acabado tinta y laca wengue con manija de palanca, con rejilla inferior en aluminio anodizado color negro 5 de 14 micras ALN 315, con perfileria y marcos en lamina de acero Cal. 18 CR	und	3.00	$ 508,633.00	$ 1,525,899.00
	OTROS				
2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO PUSH CORONA O SIMILAR	und	2.00	$ 287,233.00	$ 574,466.00
2.24	DISPENSADOR DE PAPEL DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE TIPO INSTITUCIONAL O SIMILAR CON LLAVE	und	4.00	$ 117,726.00	$ 470,904.00
2.25	Secador de manos con coraza exterior en acero inox. Tipo turbo con sistema sensor para manos libres Ref: SKU 210806 socoda o equivalente	und	2.00	$ 777,172.00	$ 1,554,344.00
2.26	Espejo flotado, biselado en vidrio de 5mm, calidad cristal (sin distorsión) flotado sobre estructura de soporte metálica interna	m2	36.27	$ 75,975.00	$ 2,755,613.25
2.27	Meson vaciado en concreto reforzado, acabado enchape en granito negro san gil fondo negro grano 0, incluye cantos y mediacaña de 5cms, dilatador de aluminio cada dos metros y Placas de soporte de meson en concreto reforzado, acabado en granito negro san gil fondo negro grano 0	m2	6.72	$ 640,826.00	$ 4,306,350.72
2.28	Media caña coextruida en PVC h: 9cm	m	84.62	$ 17,601.00	$ 1,489,396.62
2.29	Papelera de acero inox. con sistema de fijación y capacidad de 12 lts. Ref: 706630001 Corona o equivalente.	und	12.00	$ 403,191.00	$ 4,838,292.00
2.30	Cortasoles verticales en perfil de acero laminado en frio cal 18 ASTM A1008, dimension 20x8cms, anclaje a piso y techo según detalle especifico acabado esmalte uretano color blanco	m	29.70	$ 91,025.00	$ 2,703,442.50
2.31	Cortasol prefabricado en concreto 3.000psi, dimesión 60x8 cm según diseño, formaleta metalica, acabado a la vista fijacion con platinas de acero según diseño estructural	m3	2.53	$ 780,766.00	$ 1,975,337.98
2.32	Pasarela 1 - Sum + Instalación Perfileria PINTADA ASTM A 532 GRADO 50 (IPE 220, PERFIL CUADRADO 150 X 100 X 4, PERFIL PHR 150 X 50 X 3, LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, REJILLA T 10 x 30 (2" x 3/16" GALVANIZADA) INCLUYE SOLDADURAS	kg	8,628.79	$ 12,500.00	$ 107,859,875.00
2.33	Pasarela 2 - Sum + Instalación Perfileria PINTADA ASTM A 532 GRADO 50 (PERFIL CUADRADO 90 X 90 X 3, PERFIL PHR 150 X 50 X 3, LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, REJILLA T 10 x 30 (2" x 3/16" GALVANIZADA)	kg	520.83	$ 12,500.00	$ 6,510,375.00
2.34	Suministro e instalación de Fachada flotante Perfileria cuadrada ASTM A 500 GRADO C NEGRA	kg	2,894.52	$ 12,500.00	$ 36,181,500.00
SUBTOTAL ARQUITECTURA Y ACABADOS MODULO A					**$ 690,224,299.09**

3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
3.1	TUBERÍA Ø 3" PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	m	3.00	$ 58,867.00	$ 176,601.00
ICCU 11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ml	1.00	$ 56,375.00	$ 56,375.00
ICCU 11,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ml	30.00	$ 36,192.00	$ 1,085,760.00
ICCU 11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ml	2.00	$ 25,485.00	$ 50,970.00
3.2	TUBERÍA Ø 1-1/4" PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	m	28.00	$ 20,242.00	$ 566,776.00
ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ml	65.00	$ 15,841.00	$ 1,029,665.00
ICCU 11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ml	25.00	$ 19,495.00	$ 487,375.00
ICCU 11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ml	120.00	$ 13,960.00	$ 1,675,200.00
3.3	TOTALIZADOR DE Ø 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA	und	5.00	$ 202,284.00	$ 1,011,420.00
3.4	VÁLVULA DE ENTRADA CON NIVEL DE REBOSE Ø1 1/4"	und	1.00	$ 51,987.00	$ 51,987.00
3.5	VÁLVULA DE Ø 3" TIPO RW	und	1.00	$ 192,737.00	$ 192,737.00
3.6	VÁLVULA DE Ø 2-1/2" TIPO RW	und	1.00	$ 165,112.00	$ 165,112.00
3.7	VÁLVULA DE Ø 2" TIPO RW	und	2.00	$ 137,487.00	$ 274,974.00
3.8	VÁLVULA DE Ø 1-1/2" TIPO RW	und	1.00	$ 123,887.00	$ 123,887.00
3.9	VÁLVULA DE Ø 1-1/4" TIPO RW	und	2.00	$ 120,737.00	$ 241,474.00
ICCU 11,35	REGISTRO 1"	und	9.00	$ 119,296.00	$ 1,073,664.00
ICCU 11,37	REGISTRO 3/4"	und	8.00	$ 84,520.00	$ 676,160.00
ICCU 11,36	REGISTRO 1/2"	und	15.00	$ 66,636.00	$ 999,540.00
3.10	VÁLVULA DE GLOBO Ø 3"	und	9.00	$ 178,137.00	$ 1,603,233.00
3.11	VÁLVULA DE GLOBO Ø 2"	und	5.00	$ 152,637.00	$ 763,185.00
3.12	VÁLVULA DE GLOBO Ø 1-1/4"	und	1.00	$ 148,387.00	$ 148,387.00

3.13	VÁLVULA DE GLOBO Ø 1"	und	1.00	$ 122,887.00	$ 122,887.00
3.14	VÁLVULA CHEQUE (ANTIRRETORNO) Ø 2"	und	7.00	$ 115,887.00	$ 811,209.00
3.15	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 3"	und	1.00	$ 71,187.00	$ 71,187.00
3.16	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 2"	und	2.00	$ 57,587.00	$ 115,174.00
3.17	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 1"	und	1.00	$ 41,387.00	$ 41,387.00
3.18	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 3/4"	und	1.00	$ 35,887.00	$ 35,887.00
3.19	PUNTO AGUA FRÍA Ø 1" PVCP	pto	13.00	$ 79,575.00	$ 1,034,475.00
ICCU 11,17	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 3/4"	und	4.00	$ 74,755.00	$ 299,020.00
ICCU 11,16	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	und	38.00	$ 70,507.00	$ 2,679,266.00
ICCU 11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	und	40.00	$ 75,431.00	$ 3,017,240.00
ICCU 11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	und	28.00	$ 93,564.00	$ 2,619,792.00
ICCU 11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	und	15.00	$ 99,849.00	$ 1,497,735.00
3.20	TRAGANTES Ø 4"	pto	60.00	$ 59,274.00	$ 3,556,440.00
3.21	TUBO Ø 8" PVC ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN)	m	60.00	$ 131,300.00	$ 7,878,000.00
ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ml	120.00	$ 97,601.00	$ 11,712,120.00
ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	40.00	$ 52,666.00	$ 2,106,640.00
ICCU 11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	7.00	$ 38,871.00	$ 272,097.00
ICCU 11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ml	30.00	$ 28,105.00	$ 843,150.00
ICCU 11,42	REVENTILACION 3"	ml	40.00	$ 24,807.00	$ 992,280.00
ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	ml	11,041.53	$ 19,683.00	$ 217,330,434.99
ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ml	380.00	$ 37,391.00	$ 14,208,580.00
ICCU 11,6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ml	120.00	$ 47,721.00	$ 5,726,520.00
3.22	CAJA DE INSPECCIÓN 0,70x0,70m	und	10.00	$ 132,439.00	$ 1,324,390.00
3.23	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80X0,80m	und	5.00	$ 189,227.00	$ 946,135.00
3.24	CAJA DE INSPECCIÓN 0,90X0,90m	und	10.00	$ 358,834.00	$ 3,588,340.00
3.25	CAJA DE INSPECCIÓN 1,00X1,00m	und	6.00	$ 464,596.00	$ 2,787,576.00
3.26	PUNTO REVENTILACIÓN Ø 2" PVCV	pto	15.00	$ 55,066.00	$ 825,990.00
ICCU 11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	und	2.00	$ 716,753.00	$ 1,433,506.00
3.27	SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 2HP	und	2.00	$ 1,470,000.00	$ 2,940,000.00
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**$ 303,271,939.99**

4. INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIOS					
4.1	TUBO Ø4" SCH 10 HD (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	m	1.00	$ 154,224.00	$ 154,224.00
4.2	TUBO Ø3" SCH 10 HD (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	m	20.00	$ 122,602.00	$ 2,452,040.00
4.3	TUBO Ø2" SCH 10 HD (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	m	2.50	$ 86,798.00	$ 216,995.00
ICCU 11,59	GABINETE TIPO III	und	6.00	$ 1,112,569.00	$ 6,675,414.00
ICCU 11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	und	1.00	$ 2,379,371.00	$ 2,379,371.00
ICCU6,11 URBANISMO	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	und	1.00	$ 3,665,760.00	$ 3,665,760.00
4.4	SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CONTRA INCENDIO	und	1.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00
SUBTOTAL INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO					**$ 45,543,804.00**
5. ACUSTICA Y SONIDO					
5.1	Piso en madera oak uso comercial	m²	120.00	$ 202,741.00	$ 24,328,920.00
5.2	Cielo raso panel acustico AQ espuma cubierta con listones de madera tipo formica de absorción acústica	m²	120.00	$ 519,141.00	$ 62,296,920.00
5.3	Muros de panel acustico AQ espuma cubierta con listones de madera tipo formica	m²	70.00	$ 510,711.00	$ 35,749,770.00
5.4	Suministro e instalación Vidrio DVH (Hermético)	m²	42.00	$ 850,000.00	$ 35,700,000.00
SUBTOTAL ACUSTICA Y SONIDO					**$ 158,075,610.00**

6. INSTALACIONES ELECTRICAS NORMALES Y REGULADAS E LUMINACION					
	REDES ELECTRICAS E ILUMINACION				
6.1	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 3x250 MCM F+1x250 MCM N+1x 2/0 T AWG THHN	ML	21.00	$ 328,005.00	$ 6,888,105.00
6.2	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 3x6F+1X6N+1X8T AWG THHN HFFR	ML	10.00	$ 41,062.00	$ 410,620.00
6.3	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 3x8F+1X8N+1X10T HFFR	ML	150.00	$ 26,840.00	$ 4,026,000.00
6.4	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 1x10F+1X10N+1X12T HFFR	ML	90.00	$ 11,110.00	$ 999,900.00
6.5	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 1X8F +1X8 N+1X10T AWG (CASETAS EXTERIORES)	ML	220.00	$ 16,792.00	$ 3,694,240.00
6.6	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 2X6F+1X6T AWG THHN (ILUMINACION EXTERIOR)	ML	220.00	$ 27,957.00	$ 6,150,540.00
6.7	Suministro e instalación salida toma 110VAC - CON CABLE HFFR	UN	90.00	$ 166,730.00	$ 15,005,700.00
6.8	Suministro e instalación salida toma 110VAC GFCI - CON CABLE HFFR	UN	19.00	$ 178,050.00	$ 3,382,950.00
6.9	Suministro e instalación salida de iluminación 110VAC - CON CABLE HFFR	UN	220.00	$ 126,717.00	$ 27,877,740.00
6.10	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared sencillo - CON CABLE HFFR	UN	11.00	$ 106,565.00	$ 1,172,215.00
6.11	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared doble - CON CABLE HFFR	UN	1.00	$ 108,144.00	$ 108,144.00
6.12	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared sencillo conmutable - CON CABLE HFFR	UN	1.00	$ 106,683.00	$ 106,683.00
6.13	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared triple conmutable - CON CABLE HFFR	UN	2.00	$ 111,074.00	$ 222,148.00
6.14	Suministro e Instalación luminaria 60X60 de 40 W LED	UN	70.00	$ 196,148.00	$ 13,730,360.00
6.15	Suministro e Instalación luminaria redonda tipo Bala de 24W LED	UN	25.00	$ 69,648.00	$ 1,741,200.00
6.16	Suministro e Instalación luminaria aplique 1X24W LED	UN	6.00	$ 57,548.00	$ 345,288.00
6.17	Suministro e Instalación luminaria SYLPROOF ENCAPSULADA de 94 W LED	UN	2.00	$ 181,408.00	$ 362,816.00

6.18	Suministro e Instalación luminarias de emergencia autonomía 1 hora. 110-130 V, <=4 W	UN	4.00	$ 135,758.00	$ 543,032.00
6.19	Suministro e Instalación luminaria TIPO REFLECTOR 15 W LED	UN	4.00	$ 390,176.00	$ 1,560,704.00
6.20	Suministro e instalación salida toma regulada 110VAC - CON CABLE HFFR	UN	25.00	$ 136,057.00	$ 3,401,425.00
6.21	Suministro e instalación salida toma bifásica 220VAC - CON CABLE HFFR	UN	1.00	$ 107,923.00	$ 107,923.00
6.22	Suministro e Instalación luminaria solar de 60 W	UN	8.00	$ 2,405,347.00	$ 19,242,776.00
6.23	Suministro e Instalación sensor para luminaria	UN	2.00	$ 108,247.00	$ 216,494.00
6.24	Suministro e Instalación tuberia 1" PVC SCH 40	ML	60.00	$ 10,460.00	$ 627,600.00
6.25	Suministro e Instalación tuberia 3/4" PVC SCH40 - DATOS	ML	22.00	$ 8,412.00	$ 185,064.00
6.26	Suministro e Instalación tuberia 1" IMC (REFLECTORES)	ML	80.00	$ 30,181.00	$ 2,414,480.00
6.27	Suministro e Instalación tuberia 6" PVC CORRUGADO - ACOMETIDA	ML	15.00	$ 51,274.00	$ 769,110.00
6.28	Suministro e Instalación Canaleta 12X5 CM metálica	ML	20.00	$ 27,551.00	$ 551,020.00
6.29	Suministro e Instalación Bandeja Portacable tipo cerrada con división 30X8 CM (incluye curvas y accesorios)	ML	60.00	$ 195,461.00	$ 11,727,660.00
6.3	Suministro e Instalación Bandeja Portacable tipo cerrada con división 20X8 CM (incluye curvas y accesorios)	ML	3.00	$ 151,827.00	$ 455,481.00
6.31	Suministro e Instalación Caja CS276	UN	2.00	$ 1,152,799.00	$ 2,305,598.00
6.32	Suministro e Instalación Caja 30x30 para Tierra incluye varilla y accesorios	UN	7.00	$ 407,257.00	$ 2,850,799.00
6.33	Suministro e Instalación cable cobre 2/0 AWG	ML	22.00	$ 50,087.00	$ 1,101,914.00
6.34	Suministro e Instalación UPS trifásica de 20 KVA	UN	1.00	$ 20,148,155.00	$ 20,148,155.00
6.36	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1PB, TL2PB)	UN	1.00	$ 152,300.00	$ 152,300.00
6.37	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1PA)	UN	1.00	$ 164,207.00	$ 164,207.00
6.38	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1P1, TL2P1)	UN	1.00	$ 152,300.00	$ 152,300.00
6.39	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con totalizador (TD1)	UN	1.00	$ 820,088.00	$ 820,088.00
6.40	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TBOMBAS)	UN	1.00	$ 649,131.00	$ 649,131.00
6.41	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TR1)	UN	1.00	$ 747,862.00	$ 747,862.00
6.45	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con totalizador (TD3)	UN	1.00	$ 788,931.00	$ 788,931.00
6.46	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TR3)	UN	1.00	$ 704,022.00	$ 704,022.00
6.48	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TSON)	UN	1.00	$ 672,458.00	$ 672,458.00
6.49	Suministro e Instalación de tablero de medidor Norma AE 319	UN	1.00	$ 5,836,731.00	$ 5,836,731.00
6.51	Suministro e Instalación de Aire acondicionado 12000 BTU cuarto RACK	UN	1.00	$ 1,829,775.00	$ 1,829,775.00
6.52	Suministro e Instalación de Planta eléctrica de 100 KVA	UN	1.00	$ 52,512,922.00	$ 52,512,922.00
6.53	Suministro e Instalación de Transferencia automática de 300 A	UN	1.00	$ 7,763,375.00	$ 7,763,375.00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS NORMALES Y REGULADAS E LUMINACION					**$ 227,227,986.00**
7. COMUNICACIONES, CABLEADO ESTRUCTURADO Y CCTV					
7.1	Suministro e Instalación Patchpanel de 48 puertos Categoría 6A	UN	1.00	$ 753,215.00	$ 753,215.00
7.2	Suministro e Instalación Patchpanel de 24 puertos Categoría 6A	UN	1.00	$ 488,616.00	$ 488,616.00
7.3	Suministro e Instalación jack Categoría 6A	UN	70.00	$ 46,055.00	$ 3,223,850.00
7.4	Suministro e Instalación patchcord 2m Categoría 6A	UN	140.00	$ 20,562.00	$ 2,878,680.00
7.5	Suministro e Instalación bandeja portacables	UN	4.00	$ 164,402.00	$ 657,608.00
7.6	Suministro e Instalación Cable UTP Categoría 6A	ML	2,944.18	$ 7,893.00	$ 23,238,412.74
7.7	Suministro e instalación salida de datos completa (incluye faceplate y marcación)	UN	70.00	$ 220,212.00	$ 15,414,840.00
7.8	Suministro e Instalación RACK 7' X 24"	UN	1.00	$ 492,922.00	$ 492,922.00
7.9	Suministro certificación punto de datos	UN	70.00	$ 12,000.00	$ 840,000.00
7.10	Suministro e Instalación Access point	UN	3.00	$ 1,346,091.00	$ 4,038,273.00
7.11	Suministro e Instalación FIREWALL	UN	1.00	$ 18,457,306.00	$ 18,457,306.00
7.12	Suministro e Instalación Switch CORE	UN	1.00	$ 10,505,131.00	$ 10,505,131.00
7.13	Suministro e Instalación Switch borde	UN	2.00	$ 10,835,356.00	$ 21,670,712.00
7.14	Suministro e Instalación DVR	UN	1.00	$ 3,408,656.00	$ 3,408,656.00
7.15	Suministro e Instalación camara CCTV	UN	4.00	$ 350,049.00	$ 1,400,196.00
SUBTOTAL COMUNICACIONES, CABLEADO ESTRUCTURADO Y CCTV					**$ 107,468,417.74**

PRESUPUESTO DE OBRA FASE I

ITEM	URBANISMO (PARQUE)	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	
1	**PRELIMINARES**				
ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m²	3,190.00	$ 11,231.00	$ 35,826,890.00
ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE h=2,10m	ml	192.18	$ 23,760.00	$ 4,566,196.80
1.10	RETIRO O TRASLADO DE ESPECIAS ARBÓREAS PREEXISTENTES EN SITI	und	20.00	$ 259,568.00	$ 5,191,360.00
ICCU16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE A 5km)	m³	957.00	$ 49,774.00	$ 47,633,718.00
ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m³	478.50	$ 91,079.00	$ 43,581,301.50
2	**ANDÉN**				
ICCU 4,44 VIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	m²	649.51	$ 10,109.00	$ 6,565,896.59
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	97.43	$ 186,532.00	$ 18,173,812.76
2.2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO e=3cm PARA ANDÉN	m³	19.49	$ 90,907.00	$ 1,771,777.43
ICCU 5,1 URB	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6cm	m²	649.51	$ 82,001.00	$ 53,260,469.51
ICCU 5,11 URB	LOSETA PREFABRICADA A-40	m²	163.71	$ 68,372.00	$ 11,193,180.12
ICCU 5,12 URB	LOSETA PREFABRICADA A-60	m²	12.00	$ 98,526.00	$ 1,182,312.00

2.1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	m²	19.70	$ 65,861.00	$ 1,297,461.70
3	**GENERAL URBANISMO**				
ICCU 6,8 URB	BORDILLO PREFABRICADO A80	ml	799.18	$ 75,310.00	$ 60,186,245.80
ICCU 5,15 URB	SARDINEL PREFABRICADO A10	ml	69.65	$ 115,727.00	$ 8,060,385.55
3.1	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A85 TIPO IDU	ml	28.50	$ 36,716.00	$ 1,046,406.00
3.2	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A100 TIPO IDU	und	6.00	$ 37,985.00	$ 227,910.00
3.3	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A105 TIPO IDU	und	6.00	$ 68,487.00	$ 410,922.00
4	**ZONAS PEATONALES**				
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	151.59	$ 186,532.00	$ 28,276,385.88
2.2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO DE 1/2 e=3cm PARA ZONAS PEATONALES	m³	30.30	$ 90,907.00	$ 2,754,482.10
ICCU 5,16 URB	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20cm)	m²	1,010.60	$ 66,110.00	$ 66,810,766.00
4.1	ADOQUÍN ECOLÓGICO EN CONCRETO e=7cm	m²	60.48	$ 66,536.00	$ 4,024,097.28
5	**ESCALERAS**				
5.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	m³	47.25	$ 698,051.00	$ 32,982,909.75
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	3,544.00	$ 8,086.00	$ 28,656,784.00
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	19.70	$ 186,532.00	$ 3,674,680.40
6	**PAISAJISMO**				
ICCU 5,10 URB	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	und	3.00	$ 615,125.00	$ 1,845,375.00
ICCU 6,7 VIAS	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m²	1,476.29	$ 16,996.00	$ 25,091,024.84
6.1	ÁRBOL de mediano porte Yarumo	und	5.00	$ 2,040,178.00	$ 10,200,890.00
6.2	ÁRBOL de mediano porte Guayacan Amarillo	und	1.00	$ 2,014,042.00	$ 2,014,042.00
6.4	ÁRBOL de mediano porte Cresta de gallo	und	1.00	$ 1,979,056.00	$ 1,979,056.00
6.5	Especies menores de sombra Palmiche Curculigo (7 unidades por m2)	m²	10.20	$ 32,027.00	$ 326,675.40
6.6	Especies menores de sombra Helecho Cola de Pescado (4 unidades por m2)	m²	13.80	$ 34,842.00	$ 480,819.60
6.7	Especies menores de sombra Carey (6 unidades por m2)	m²	9.84	$ 31,272.00	$ 307,716.48
6.8	Especies menores de especies de luz Cebollino	m²	99.31	$ 12,402.00	$ 1,231,642.62
6.9	Especies menores de especies de luz Helecho Blechunum (4 unidades por m2)	m²	96.08	$ 35,617.00	$ 3,422,081.36
6.10	Especies menores de especies de luz Filodendro Ala de Angel (3 unidades por m2)	m²	101.02	$ 34,332.00	$ 3,468,218.64
7	**MOBILIARIO**				
7.1	MÓDULO COMERCIAL EN COLD ROLLED CON ESTRUCTURA METÁLICA PTES Y PLACA SOPORTE	und	2.00	$ 7,101,479.00	$ 14,202,958.00
7.2	MOBILIARIO CANECA DE RESIDUOS TRIPLE EN ACERO INOXIDABLE	und	3.00	$ 1,968,986.00	$ 5,906,958.00
7.3	MOBILIARIO URBANO (BANCAS EN CONCRETO 2500 PSI)	m	53.70	$ 442,329.00	$ 23,753,067.30
7.4	MOBILIARIO BOLARDOS	und	8.00	$ 199,232.00	$ 1,593,856.00
7.5	MOBILIARIO BICICLETEROS	und	1.00	$ 862,584.00	$ 862,584.00
8	**MURO DE CONTENCIÓN**				
ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m³	26.55	$ 216,583.00	$ 5,750,278.65
5.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	m³	35.40	$ 698,051.00	$ 24,711,005.40
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2,300.00	$ 8,086.00	$ 18,597,800.00
5.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	m³	177.02	$ 698,051.00	$ 123,568,988.02
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	9,390.00	$ 8,086.00	$ 75,927,540.00
9	**DRENAJES Y SUBDRENAJE AGUA LLUVIA**				
ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ml	120.00	$ 37,391.00	$ 4,486,920.00
ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	ml	3,095.33	$ 19,683.00	$ 60,925,380.39
ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ml	58.23	$ 97,601.00	$ 5,683,306.23
ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	45.34	$ 52,666.00	$ 2,387,876.44
ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ml	124.56	$ 37,391.00	$ 4,657,403.96
ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	ml	1,326.57	$ 19,683.00	$ 26,110,877.31
9.1	CÁRCAMO HASTA 1,50m DE LONGITUD	und	5.00	$ 314,333.00	$ 1,571,665.00
9.2	CÁRCAMO DESDE 2,50m HASTA 3,50m DE LONGITUD	und	2.00	$ 656,963.00	$ 1,313,926.00
9.3	SUMIDERO DE VÍAS	und	2.00	$ 374,938.00	$ 749,876.00
9.4	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,70X0,70m PARA RED SANITARIA DRENAJE	und	3.00	$ 179,302.00	$ 537,906.00
9.5	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80m	und	3.00	$ 206,809.00	$ 620,427.00
9.6	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,90X0,90m	und	3.00	$ 268,893.00	$ 806,679.00
9.7	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1,00X1,00m	und	7.00	$ 341,834.00	$ 2,392,838.00
10	**ELÉCTRICO**				
10.1	Suministro e Instalación luminaria TIPO EXTERIOR 44 W LED incluye fotocelda	UN	31.00	$ 550,072.00	$ 17,052,232.00
10.2	Suministro e Instalación tuberia 1" PVC (CASETAS EXTERIORES)	ML	19.00	$ 13,269.00	$ 252,111.00
10.3	Suministro e Instalación tuberia 2" PVC DB - REDES EXTERIORES	ML	236.00	$ 15,850.00	$ 3,740,600.00
10.4	Suministro e Instalación Caja de paso tipo AP280 (40X40)	UN	37.00	$ 285,487.00	$ 10,563,019.00
10.5	Suministro e Instalación Poste metálico de 4 m	UN	47.00	$ 539,775.00	$ 25,369,425.00
10.6	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1PE, TL2PE, TL3PE, TL4PE)	UN	4.00	$ 152,300.00	$ 609,200.00
10.7	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TEXT)	UN	1.00	$ 727,427.00	$ 727,427.00
10.8	Suministro e Instalación tuberia 4" IMC - Bajante Transformador	ML	6.00	$ 211,194.00	$ 1,267,164.00
10.9	Suministro e Instalación Transformador 112,5 KVA	UN	1.00	$ 9,921,705.00	$ 9,921,705.00
10.10	Suministro e Instalación estructura CTU500	UN	1.00	$ 6,946,779.00	$ 6,946,779.00
10.11	Suministro e Instalación 3X Cable 70 mm2 AL XLPE	ML	10.00	$ 48,336.00	$ 483,360.00
10.12	Suministro certificación RETILAP y RETIE uso final, transformación y Red M.T.	GL	1.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
10.13	Suministro pruebas VLF cable red M.T.	GL	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
11	**RESTAURACIONES**				
11.1	RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE GRUTA VIRGEN	GL	1.00	$ 1,429,546.00	$ 1,429,546.00
12	**CARPINTERIA METALICA**				
12.1	BARANDA TIPO 1 TUBERIA SCHEDULE 40 ESPESOR DE PARED 5,16 mm SAND BLASTIADA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO , MINIMO 5 + 5 MILS DE ESPESOR DE PROTECCIÓN, ANCLADA APISO EN ESPACIO PUBLICO ALTURA LIBRE 0,8	m	37.80	$ 364,320.00	$ 13,771,296.00
PRESUPUESTO DE OBRA FASE II					
ITEM	**URBANISMO (PARQUE) FASE II**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vlr. Unitario**	

1	**PRELIMINARES**				
ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m²	2,230.47	$ 11,231.00	$ 25,050,408.57
ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE h=2,10m	ml	128.12	$ 23,760.00	$ 3,044,131.20
1.10	RETIRO O TRASLADO DE ESPECIAS ARBÓREAS PREEXISTENTES EN SITI	und	44.00	$ 259,568.00	$ 11,420,992.00
ICCU16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE A 5km)	m³	669.14	$ 49,774.00	$ 33,305,774.36
ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m³	334.57	$ 91,079.00	$ 30,472,301.03
2	**ANDÉN**				
ICCU 4,44 VIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	m²	433.01	$ 10,109.00	$ 4,377,298.09
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	64.95	$ 186,532.00	$ 12,115,253.40
2.2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO e=3cm PARA ANDÉN	m³	12.99	$ 90,907.00	$ 1,180,881.93
ICCU 5,1 URB	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6cm	m²	433.01	$ 82,001.00	$ 35,507,253.01
ICCU 5,11 URB	LOSETA PREFABRICADA A-40	m²	109.14	$ 68,372.00	$ 7,462,120.08
ICCU 5,12 URB	LOSETA PREFABRICADA A-60	m²	12.00	$ 98,526.00	$ 1,182,312.00
2.1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	m²	17.60	$ 65,861.00	$ 1,159,153.60
3	**GENERAL URBANISMO**				
ICCU 6,8 URB	BORDILLO PREFABRICADO A80	ml	471.47	$ 75,310.00	$ 35,506,405.70
ICCU 5,15 URB	SARDINEL PREFABRICADO A10	ml	177.41	$ 115,727.00	$ 20,531,127.07
3.1	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A85 TIPO IDU	ml	33.43	$ 36,716.00	$ 1,227,415.88
3.2	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A100 TIPO IDU	und	12.00	$ 37,985.00	$ 455,820.00
3.3	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A105 TIPO IDU	und	12.00	$ 68,487.00	$ 821,844.00
4	**ZONAS PEATONALES**				
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	209.34	$ 186,532.00	$ 39,048,608.88
2.2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO e=3cm (PARA ZONAS PEATONALES)	m³	41.86	$ 90,907.00	$ 3,805,367.02
ICCU 5,16 URB	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20cm)	m²	1,395.60	$ 66,110.00	$ 92,263,116.00
5	**ESCALERAS**				
5.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	m³	126.02	$ 698,051.00	$ 87,968,387.02
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	9,451.51	$ 8,086.00	$ 76,424,909.86
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	7.68	$ 186,532.00	$ 1,432,565.76
ICCU 5,1 URB	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6cm	m²	38.40	$ 82,001.00	$ 3,148,838.40
6	**PAISAJISMO**				
ICCU 5,10 URB	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	un	9.00	$ 615,125.00	$ 5,536,125.00
ICCU 6,7 VIAS	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m²	726.48	$ 16,996.00	$ 12,347,254.08
6.14	ÁRBOL de gran porte Guayacán Rosado	und	2.00	$ 1,950,802.00	$ 3,901,604.00
6.1	ÁRBOL de mediano porte Yarumo	und	2.00	$ 2,040,178.00	$ 4,080,356.00
6.2	ÁRBOL de mediano porte Guayacan Amarillo	und	4.00	$ 2,014,042.00	$ 8,056,168.00
6.15	ÁRBOL de mediano porte Ojo de Paloma	und	3.00	$ 1,993,642.00	$ 5,980,926.00
6.3	ÁRBOL de mediano porte Laurel	und	3.00	$ 1,988,542.00	$ 5,965,626.00
6.16	ÁRBOL de mediano porte Ariza	und	4.00	$ 1,973,242.00	$ 7,892,968.00
6.4	ÁRBOL de mediano porte Cresta de gallo	und	7.00	$ 1,979,056.00	$ 13,853,392.00
6.5	Especies menores de sombra Palmiche Curculigo (7 unidades por m2)	m²	9.58	$ 32,027.00	$ 306,818.66
6.6	Especies menores de sombra Helecho Cola de Pescado (4 unidades por m2)	m²	12.96	$ 34,842.00	$ 451,552.32
6.7	Especies menores de sombra Carey (6 unidades por m2)	m²	20.78	$ 31,272.00	$ 649,832.16
6.8	Especies menores de especies de luz Cebollino	m²	184.45	$ 12,402.00	$ 2,287,548.90
6.9	Especies menores de especies de luz Helecho Blechunum (4 unidades por m2)	m²	178.41	$ 35,617.00	$ 6,354,428.97
6.10	Especies menores de especies de luz Filodendro Ala de Angel (3 unidades por m2)	m²	151.54	$ 34,332.00	$ 5,202,671.28
6.11	Especies menores de especies para cubierta Iris Holándes	m²	41.11	$ 46,877.00	$ 1,927,113.47
6.12	Especies menores de especies para cubierta Hierba Pampa	m²	75.60	$ 41,267.00	$ 3,119,785.20
6.13	Especies menores de especies para cubierta Achira	m²	77.85	$ 22,092.00	$ 1,719,862.20
7	**MOBILIARIO**				
7.1	MÓDULO COMERCIAL EN COLD ROLLED CON ESTRUCTURA METÁLICA PTES Y PLACA SOPORTE	und	2.00	$ 7,101,479.00	$ 14,202,958.00
7.2	MOBILIARIO CANECA DE RESIDUOS TRIPLE EN ACERO INOXIDABLE	und	6.00	$ 1,968,986.00	$ 11,813,916.00
7.3	MOBILIARIO URBANO (BANCAS EN CONCRETO 2500 PSI)	m	35.80	$ 442,329.00	$ 15,835,378.20
7.5	MOBILIARIO BICICLETEROS	und	5.00	$ 862,584.00	$ 4,312,920.00
7.6	JUEGOS PÉNDULO	und	1.00	$ 3,866,538.00	$ 3,866,538.00
7.7	JUEGOS ESCALADOR	und	1.00	$ 5,418,013.00	$ 5,418,013.00
7.8	JUEGOS RUEDA DE HOMBROS	und	1.00	$ 3,491,416.00	$ 3,491,416.00
7.9	JUEGOS REMO	und	1.00	$ 4,580,568.00	$ 4,580,568.00
7.10	JUEGOS BANCA INCLINADA ABDOMINALES	und	1.00	$ 2,486,440.00	$ 2,486,440.00
7.11	JUEGOS SKY	und	1.00	$ 4,496,700.00	$ 4,496,700.00
7.13	JUEGOS TORRE PUENTE CON DESLIZADERO	und	1.00	$ 28,859,403.00	$ 28,859,403.00
7.14	JUEGOS BALANCÍN DE MUELLE SENCILLO ANIMALES	und	1.00	$ 6,674,577.00	$ 6,674,577.00
7.15	JUEGOS BALANCÍN DE MUELLE SENCILLO ESTRELLA	und	1.00	$ 5,224,577.00	$ 5,224,577.00
7.16	JUEGOS CARRUSEL ORBITAL INCLINADO	und	1.00	$ 26,024,577.00	$ 26,024,577.00
7.17	JUEGOS COLUMPIO CANASTA EN RED	und	1.00	$ 16,508,445.00	$ 16,508,445.00
7.18	JUEGOS MURO INTERACTIVO INCLUYENTE	und	1.00	$ 22,640,909.00	$ 22,640,909.00
7.19	JUEGOS TORRE MULTIFUNCIONAL F7 MULTIFUERZA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	und	1.00	$ 16,440,909.00	$ 16,440,909.00
7.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DECK MADERA SOBRE BANCAS DE CONCRETO DE LA TERRAZA (LISTONES)	m2	62.10	$ 185,000.00	$ 11,488,500.00
8	**MURO DE CONTENCIÓN**				
ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m³	59.01	$ 216,583.00	$ 12,780,562.83
5.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	m³	78.67	$ 698,051.00	$ 54,915,672.17
ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	5,901.00	$ 8,086.00	$ 47,715,486.00
5.1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	m³	393.38	$ 698,051.00	$ 274,599,302.38

ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	29,380.16	$ 8,086.00	$ 237,567,973.76
9	**DRENAJES Y SUBDRENAJE AGUA LLUVIA**				
ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ml	400.00	$ 37,391.00	$ 14,956,400.00
ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	ml	10,317.78	$ 19,683.00	$ 203,084,863.74
ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ml	194.11	$ 97,601.00	$ 18,945,330.11
ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	151.13	$ 52,666.00	$ 7,959,412.58
ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	ml	415.19	$ 37,391.00	$ 15,524,369.29
ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	ml	4,421.90	$ 19,683.00	$ 87,036,257.70
9.1	CÁRCAMO HASTA 1,50m DE LONGITUD	und	7.00	$ 314,333.00	$ 2,200,331.00
9.8	CÁRCAMO DESDE 1,50m HASTA 2,50m DE LONGITUD	und	13.00	$ 420,000.00	$ 5,460,000.00
9.2	CÁRCAMO DESDE 2,50m HASTA 3,50m DE LONGITUD	und	2.00	$ 656,963.00	$ 1,313,926.00
9.4	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,70X0,70m PARA RED SANITARIA DRENAJE	und	7.00	$ 179,302.00	$ 1,255,114.00
11	**RESTAURACION**				
11.2	RESTAURACION Y CONSERVACIÓN DE MURO REFERENTE	Gbl	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
11.3	CONSERVACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO Y COMPLEMENTACIÓN DE PIEZAS ESTRUCTURALES INCLUYE COLOCACIÓN ESCUDO PINTADO DE ALCALDÍA	Gbl	1.00	$ 37,639,000.00	$ 37,639,000.00
12	**CARPINTERIA METALICA**				
12.1	BARANDA TIPO 1 TUBERIA SCHEDULE 40 ESPESOR DE PARED 5,16 mm SAND BLASTIADA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO , MINIMO 5 + 5 MILS DE ESPESOR DE PROTECCIÓN, ANCLADA APISO EN ESPACIO PUBLICO ALTURA LIBRE 0,8	m	7.80	$ 364,320.00	$ 2,841,696.00
13	**CICLORRUTA**				
ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m³	59.01	$ 216,583.00	$ 12,780,562.83
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	78.67	$ 186,532.00	$ 14,674,472.44
2.1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	m²	393.38	$ 65,861.00	$ 25,908,400.18
14	**PARQUEADEROS**				
ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m³	30.09	$ 216,583.00	$ 6,516,982.47
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	40.12	$ 186,532.00	$ 7,483,663.84
4.1	ADOQUÍN ECOLÓGICO EN CONCRETO e=7cm	m²	200.64	$ 66,536.00	$ 13,349,783.04
2.1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	m²	19.00	$ 65,861.00	$ 1,251,359.00
15	**PLAZA DE LA MEMORIA**				
ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m³	59.01	$ 216,583.00	$ 12,780,562.83
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	78.67	$ 186,532.00	$ 14,674,472.44
15.1	ARENA DE GUAMO (FINA) e=20cm	m³	393.38	$ 90,563.00	$ 35,625,672.94
16	**PISO ZONA DE JUEGOS INFANTILES**				
ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	m³	59.01	$ 216,583.00	$ 12,780,562.83
ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	m³	78.68	$ 186,532.00	$ 14,676,337.76
16.1	PISO SINTÉTICO EN CAUCHO RECICLADO EPDM e=1cm debe cumplir con norma de seguridad en 1177, dureza shore a de 55, mezclado en colores según diseño	m²	393.38	$ 396,450.00	$ 155,955,501.00
17	**SEÑALIZACION**				
ICCU 7,1 URB	LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ml	503.81	$ 4,375.00	$ 2,204,168.75
17.1	Suministro e Instalacion Señal SC-001 "Arroje la basura en las canecas" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	12.00	$ 265,527.00	$ 3,186,324.00
17.2	Suministro e Instalacion Señal SC-002 "Prohibido el ingreso de mascotas" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	2.00	$ 265,527.00	$ 531,054.00
17.3	Suministro e Instalacion Señal SC-003 "Deja limpio el lugar que usa tu mascota" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	12.00	$ 265,527.00	$ 3,186,324.00
17.4	Suministro e Instalacion Señal SC-004 "Cuida las plantas. No las arranques" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	15.00	$ 265,527.00	$ 3,982,905.00
17.5	Suministro e Instalacion Señal SG-001 Plano ubicacion parque dos caras (1.00 x2.00 Lámina. Poste a 0.60 h. del NPT). Dos dados de concreto de 3000 PSI (.30x.30x.60) paral empotrado 0.35. Idioma español/inglés. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	2.00	$ 1,799,999.00	$ 3,599,998.00
17.6	Suministro e Instalación Señal SG-002 Identificación de Juegos Infantiles dos caras (0.80 x 1.20) Lámina. Poste a 1.00 h. del NPT). Dos dados de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Idioma español/inglés. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	1.00	$ 1,199,999.00	$ 1,199,999.00
17.7	Suministro e Instalacion Señal SG-003 Identificación de Gimnasio Biosaludable dos caras (0.80 x 1.20) Lámina. Poste a 1.00 h. del NPT). Dos dados de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Idioma español/inglés. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	und	1.00	$ 908,118.00	$ 908,118.00
17.8	Suministro e Instalacion Señal SG-004 Señal de Orientación Multidireccional (Tubular 3.00 m+ 4 veletas direccionales)+Dado de concreto de 3000PSI Ø=30cm H=0.80m tubular empotrado 0.50 m	und	6.00	$ 468,836.00	$ 2,813,016.00
ICCU 7,3 URB	Señal doble de cicloruta	und	6.00	$ 341,704.00	$ 2,050,224.00
17.9	Suministro e Instalacion Señalización Vertical de Ciclorruta una cara SRC-01 Conserve su derecha Lámina Ø =45cm tubular libre 2.20 +Dado de concreto de 3000PSI Ø=30cm H=0.80m tubular empotrado 0.50 m. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Debe cumplir las especificaciones de materiales, forma, color y dimensiones descritos en el Cap. 6 y 8 del Manual de Señalización Vial 2015 del Min. de Transporte	und	8.00	$ 265,132.00	$ 2,121,056.00
17.10	Suministro e Instalacion Señalización Vertical de Ciclorruta una cara SRC-02 Descenso obligatorio Lámina Ø =45cm tubular libre 2.20 +Dado de concreto de 3000PSI Ø=30cm H=0.80m tubular empotrado 0.50 m. Incluye suminsitro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Debe cumplir las especificaciones de materiales, forma, color y dimensiones descritos en el Cap. 6 y 8 del Manual de Señalización Vial 2015 del Min. de Transporte	und	3.00	$ 265,132.00	$ 795,396.00
17.11	Señalización Horizontal Flecha de Ciclorruta Unidireccional en pintura alquidílica con microesferas	und	6.00	$ 26,999.00	$ 161,994.00

17.12	Señalización Horizontal Bicicleta de Ciclorruta Unireccional 1.20 x 0.80 en pintura alquidíca con microesferas	und	6.00	$ 44,966.00	$ 269,796.00
17.13	Señalización Horizontal Distancia de Recorrido en metros en pintura alquidílica con microesferas cada 50 metros (letras)	und	5.00	$ 44,966.00	$ 224,830.00
ICCU 7,3 URB	Marca vial con pintura en frio	m2	120.00	$ 47,334.00	$ 5,680,080.00
17.14	Señalización Horizontal pintura alquídilica con microesferas logo discapacitados para zona de estacionamiento	und	1.00	$ 68,961.00	$ 68,961.00
17.15	Tope de estacionamiento de caucho virgen de alto impacto con laminado de alta densidad / capa reflejante 0.53 largo x 0.10 alto	und	18.00	$ 45,000.00	$ 810,000.00

$ 3,239,939,228.00

DEMOLICION TOTAL INCLUIDO AIU					
ICCU 1,23	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,25M	m²	3,586.34	$ 78,285.00	$ 280,756,626.90
ICCU 1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m³	1,435.21	$ 9,749.00	$ 13,991,862.29
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 6,942,249,702.23**
AIU 30%					**$ 2,081,980,685.70**
TOTAL OBRA					**$ 9,024,230,387.93**

DOTACION MODULO 1					
	EQUIPOS ESPECIALES				
2.22	Embarque :Simple frontal (3) paradas, Tracción: Maquina Ecológica sin reductor, variación de frecuencia Velocidad 1,0 m /seg Acometida Principal (TN.S (3L + PE+ N) Voltaje requerido en acometida principal :208v 60 Hz Cuarto Maquina :MRL (sin sala máquina) Control: Marco última parada Acometida de Iluminación: 120 V (+- 10%) Dimensión pozo Interno Existente : (2200) mm Frente x (12150) mm fondo Dimensiones de Cabina: Oferta básica 825 kg 1375 mm ancho x 1400 mm fondo Puertas de Cabina tipo centrales de 900 mm ancho x 2100 mm alto Sobre-reccorrido Mínimo 4040 mm Foso Negativo 1250mm Incluye lona de protección por cada equipo 1y ½ espejo Incluye 6 meses mantenimiento sin costo Incluye Certificación Puertas Anti fuego ABNT 120 Min Incluye Piso en Granito Incluye 2 pasamanos en Acero Inox. Incluye 1ª. Certificación ONAC	und	1.00	$ 100,138,500.00	$ 100,138,500.00
TOTAL					**$ 100,138,500.00**
Nota: se coloca el ascensor en dotación para no cargarle AIU a un elemento que no le aplica					
TOTAL					**$ 9,124,368,887.93**
AJUSTE AL PRESUPUESTO					
GRAN TOTAL					**$ 9,124,368,887.93**

Tabla 2 Caracteristicas tecnicas del contrato.

A la fecha de corte del presente informe se han evidenciado obras cuyos ítems no se relacionan en la Tabla 2., estas han generado la inclusión de actividades no previstas las cuales previamente se han evaluado en conjunto con la interventoría adicionalmente de cada una de ellas se han enviado los análisis de precios unitarios para su respectiva revisión y aprobación, a continuación, se relacionan dichas actividades:

Mediante oficio CP-0018-0586-2022, el 23 de noviembre del presente año se realizó el envío por medio magnético y físico los APU´s de las actividades que se relacionan en el anexo # 5, las cuales fueron aprobadas por la interventoría el día 29 de noviembre de 2022 mediante comité de obra # 12.

Tabla 3 OBRAS NO PREVISTAS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

3.4 OBRAS EJECUTADAS EN EL MES.

Se ejecutaron las siguientes obras durante el mes de noviembre (las fotografías se evidencian en el anexo 3)

- Fundición de zapatas ejes C-2, E-2, F-2, I-1, I-2, H-2, G-2, G-8, H-8, I-8
- Fundición de vigas ejes A, A-1, A-2, A-3, B, C, D, E
- Fundición de zarpas de muros 4, 4A Y 4B
- Conexión al alcantarillado publico
- Armado de cajas de inspección alcantarillado
- Pase de tubería sanitaria entre cajas
- Excavación faltante modulo A
- Armado y amarre de zarpas y muros de contención

3.5 OBRAS EJECUTADAS RECORD MESES ANTERIORES.

Se tienen ejecutadas las siguientes actividades

- Demolición módulos A-B-C-D-E
- Poda de vegetación existente
- Excavación Mecánicas
- Demolición de Muro perimetral cerramiento calle 4
- Elaboración de cerramiento en polisombra por vía calle 4
- Excavación Y retiro de material sobrante de cimentación modulo A
- Explotación y ruptura de piedra de excavación encontrada en modulo-A
- Armado y amarre de acero de zapatas y vigas de cimentación.
- Fundido de zapatas

3.6 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

- Demora en la entrega de la parroquia, a la fecha 30 de noviembre del 2022 no se ha entregado predio para realizar demolición.
- Por fuertes lluvias se presentan retrasos en transporte (especificaciones en el numeral 7: estado del tiempo

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEACEURDO A PLIEGO DE CONDICIONES.

CARGO	NOMBRE	CANTIDAD	DEDICACION
Director De Obra	Ing. Iván Pardo	1	30%
Residente De Obra	Luis Gabriel Farfán	1	100%
Profesional Sisoma	Sandra Liliana Galindo Sánchez	1	100%
Residente Social	Adriana Chacon Olarte	1	100%
Especialista Estructural	Ana Milena Olarte	1	100%

Tabla 3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES

5. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

5.1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA.

5.1.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

- Se anexa en informe ambiental certificados de RCD
- Se adjuntan en el anexo 4 los certificados de calidad de aceros que pertenecen a elementos de cimentación de modulo-A (zarpas y muros de contención, cimentación ascensor columnas), certificados de calidad tubería de red sanitaria y certificados de pruebas de concreto mes anterior (octubre)

5.2 CONTROL DE POLIZAS.

5.2.1 POLIZAS CONTRATO DE OBRA

El Contrato de obra se encuentra amparado bajo la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL con la póliza de cumplimiento, y póliza de responsabilidad civil.

5.2.1.1SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO

GARANTÍAS CBO-100011713	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POLIZA N°400042873	09/08/2022	09/09/2023	$1´824.873.777,59
RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA N°400042873	09/08/2022	09/03/2023	$500'000.000,00

Tabla 4 POLIZAS OBRA SEGUN SUSCRIPCION DEL CONTRATO

6. ACTAS DE COMITÉ

Con respecto a las Actas de Comité de Seguimiento del periodo correspondiente a octubre, comprendido entre las fechas del 01 al 31 de octubre de 2022, se realizaron 4 comités de obra, adjuntados en el informe de interventoría

ACTA DE COMITÉ No.	FECHA	OBSERVACIONES
01	2/11/2022	Seguimiento de obra
02	9/11/2022	Seguimiento de obra
03	16/11/2022	Seguimiento de obra
04	23/11/2022	Seguimiento de obra
05	29/11/2022	Seguimiento de obra

Tabla 5 ACTAS DE COMITE DE OBRA

7. ESTADO DEL TIEMPO

Con respecto al estado de precipitación en el municipio de Fusagasugá en el periodo del 01 al 31 de octubre, se notifican días de lluvias.

FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS	OBSERVACIONES
MIERCOLES 2	03:00	05:00	2	SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS POR CIERRE DE ESCOMBRERA
MARTES 8	07:00	09:00	2	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS
JUEVES 10	08:00	05:00	8	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS
MARTES 15	07:00	11:00	4	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS
MIERCCOLES 16	01:00	05:00	4	SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS POR CIERRE DE ESCOMBRERA DEBIDO A LLUVIAS
LUNES 21	04:00	05:00	1	SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS POR CIERRE DE ESCOMBRERA DEBIDO A LLUVIAS
MARTES 22	01:00	02:00	1	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS
MIEROLES 23	02:30	05:00	2/30	SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS POR CIERRE DE ESCOMBRERA DEBIDO A LLUVIAS
JUEVES 24	07:00	02:00	6	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS
VIERNES 25	07:00	01:00	5	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS
LUNES 28	07:00	05:00	9	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS
MARTES 29	03:30	05:00	1/30	SE SUSPENDE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS POR FUERTES LLUVIAS SE REINICIAN ACTIVIDADES EL DIA SIGUIENTE A LAS 6 AM
MIERCOLES 30	07:00	01:00	5	POR LLUVIAS DESDE EL DIA ANTERIOR NO SE DA APERTURA DE LA ESCOMBRERA SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE CARGUE Y TRASLADO DE ESCOMBROS


Tabla 6 ESTADO DEL TIEMPO

8. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

- En la tabla 7 se encuentra relacionado el avance financiero del contrato 0586-2022 en el cual se presenta el % del avance suscrito por parte del contratista CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022.
- En el mes en curso se cerró con un avance financiero de $735.778.041,00 equivalente a un 8.1% ejecutado
- El contrato de obra tiene un avance Ejecutado del 12.3% sobre el valor total del contrato que equivale a un $1.127.179.128,00 contra un valor programado acumulado de $ 729.949.511.03 que corresponde a un 8% se evidencia un avance en obra de 4.3%

	VALOR	%Ejecución	OBSERVACIONES
CONTRATO	$ 9,124,368,887,93	100 %	Presupuestado
Corte 2 Informe 3	$ 735,778,041.00	8.1%	Ejecutado noviembre
Total, acumulado	$ 1.127.179.128	12.3%	Ejecutado acumulado

Tabla 7 AVANCE FINANCIERO

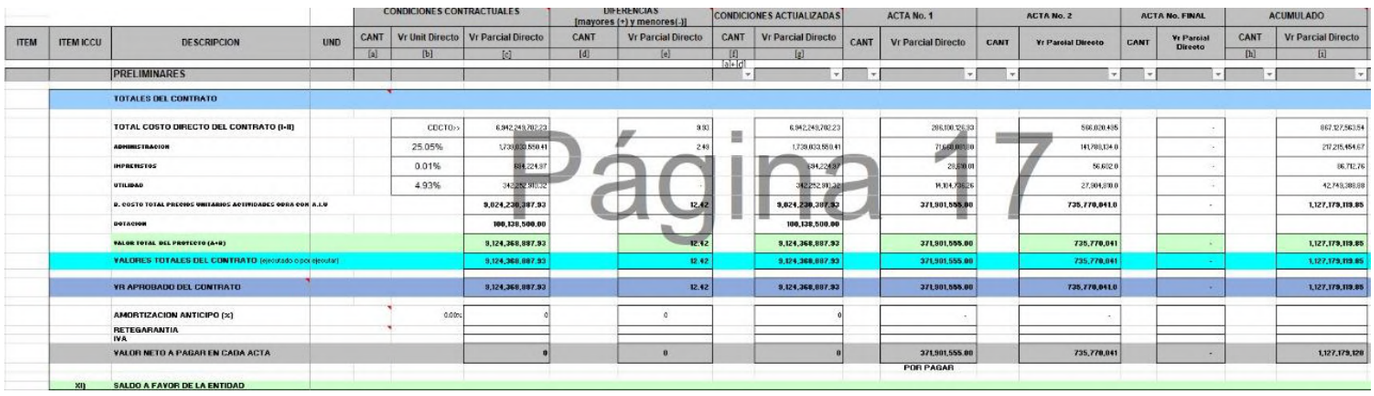

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. FINAL		ACUMULADO	
				CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f] [a]+[d]	Vr Parcial Directo [g]	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
		PRELIMINARES																
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)			COSTO>>	6,942,249,780.23		9.93		6,942,249,780.23		288,100,325.93		566,600.435		-		867,327,563.54
		ADMINISTRACION			25.05%	1,739,003,859.41		2.49		1,739,003,859.41		71,588,809.0		141,780,104.0		-		217,215,454.67
		IMPREVISTOS			0.01%	694,224.97		-		694,224.97		288.0		56,692.0		-		86,792.76
		UTILIDAD			4.93%	342,252,910.32		-		342,252,910.32		14,104,709.26		27,904,890.0		-		42,749,388.88
		D. COSTO TOTAL PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES OBRA CON A.I.U				9,024,230,387.93		12.42		9,024,230,387.93		371,901,555.00		735,778,041.0		-		1,127,179,119.85
		DOTACION				100,138,500.00				100,138,500.00								
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)				9,124,368,887.93		12.42		9,124,368,887.93		371,901,555.00		735,778,041		-		1,127,179,119.85
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				9,124,368,887.93		12.42		9,124,368,887.93		371,901,555.00		735,778,041		-		1,127,179,119.85
		VR APROBADO DEL CONTRATO				9,124,368,887.93		12.42		9,124,368,887.93		371,901,555.00		735,778,041.0		-		1,127,179,119.85
		AMORTIZACION ANTICIPO (x)			0.00%	0		0		0		-		-				
		RETEGARANTIA																
		IVA																
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				0		0		0		371,901,555.00		735,778,041		-		1,127,179,129
												POR PAGAR						
	XII	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																

Página 17

9. CONCLUSIONES.

- CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 ha cumplido con todos los requerimientos exigido por los entes de control, para la implementación de los planes de calidad, ambiental, PMT y SST
- A la fecha se cuenta con el personal idóneo capacitado para la realización de los diferentes Planes exigidos y procesos constructivos, del mismo modo se cuenta con los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades.
- Los efectos del clima con precipitaciones ocasionales durante el mes de noviembre afectaron las siguientes actividades; excavaciones manuales, excavaciones mecánicas, retiro de material sobrante de excavaciones de cimentación de modulo A y urbanismo de obra; conformación de estructura de cimientos (vigas de cimentación-columnas-muros y pantallas) del módulo a

- A la fecha se evidencia actividades de Demolición y retiro de material a un 80% de su ejecución total, se tiene atrasó por falta de entrega del módulo F donde se encuentra actualmente la capilla y no se ha entregado por parte de la Alcaldía de Fusagasugá.
- Pese al mal clima presentado durante el último mes, se culmina con el armado y amarre de la estructura modulo A, en ejecución se encuentra el armado y amarre de los muros de contención y cimentación del ascensor
- A pesar de las adversidades climáticas, se funden los días 1, 2, 9, 17 y 19 de noviembre, los elementos estructurales como zapatas, zarpas y vigas de cimentación.
- Debido a los tiempos por norma de las pruebas de concreto, los certificados del mes de noviembre son adjuntados en el informe del siguiente mes. (se adjunta fotografías, como evidencia de la toma de las pruebas)

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 1 CORRESPONDENCIA

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibi: 04-11-22

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Recibí: 04-11-22

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ | Con la FUERZA de la gente FUSAGASUGÁ

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí: 30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com


CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 2 BITACORA DE OBRA

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

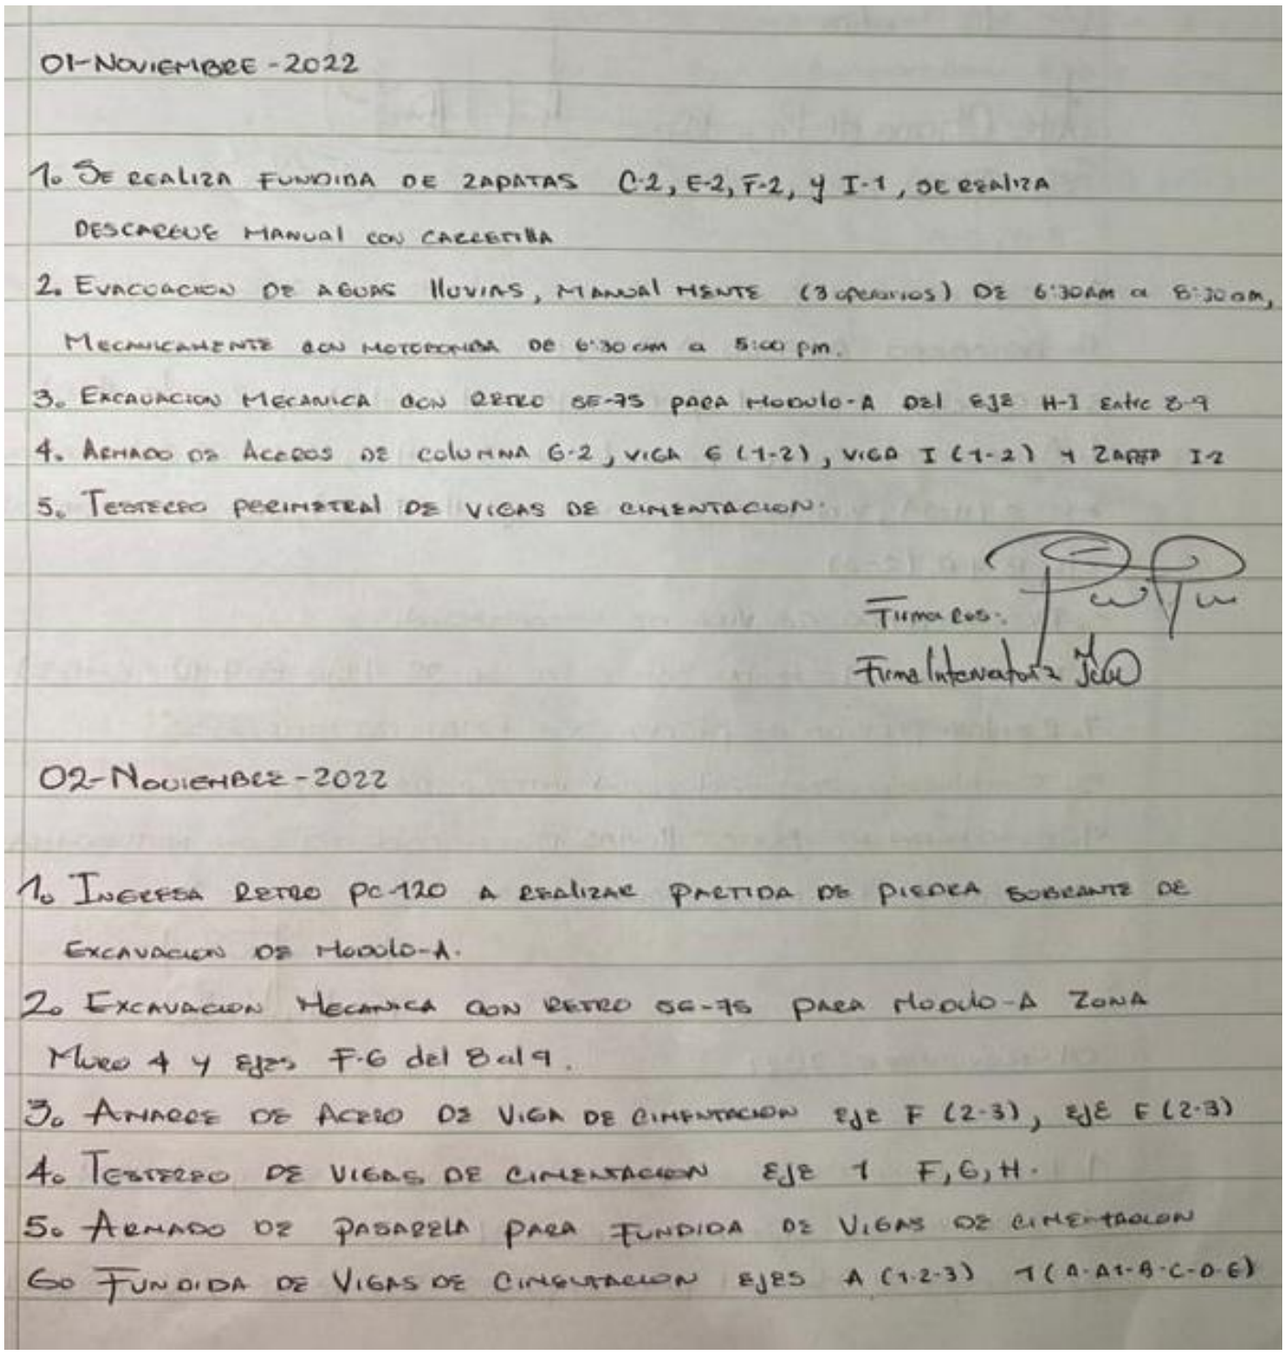

01-NOVIEMBRE-2022


1. SE REALIZA FUNDIDA DE ZAPATAS C-2, E-2, F-2, Y I-1, SE REALIZA DESCARGUE MANUAL CON CARRETILLA
2. EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, MANUALMENTE (3 OPERARIOS) DE 6:30AM A 5:30PM, MECANICAMENTE CON MOTOBOMBA DE 6:30 AM A 5:00 PM.
3. EXCAVACION MECANICA CON RETRO SE-75 PARA MODULO-A DEL EJE H-1 ENTRE 8-9
4. ARMADO DE ACEROS DE COLUMNA G-2, VIGA G (1-2), VIGA I (1-2) Y ZAPATA I-2
5. TESTEREO PERIMETRAL DE VIGAS DE CIMENTACION.

FIRMA RES.

FIRMA INTERVENTORIA

02-NOVIEMBRE-2022

1. INGRESA RETRO PC-120 A REALIZAR PARTIDA DE PIEDRA SOBRANTE DE EXCAVACION DE MODULO-A.
2. EXCAVACION MECANICA CON RETRO SE-75 PARA MODULO-A ZONA MURO 4 Y EJES F-G del 8 al 9.
3. ANCLAJE DE ACERO DE VIGA DE CIMENTACION EJE F (2-3), EJE E (2-3)
4. TESTEREO DE VIGAS DE CIMENTACION EJE 1 F, G, H.
5. ARMADO DE PASARELA PARA FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION
6. FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION EJES A (1-2-3) 1 (A-A1-B-C-D-E)

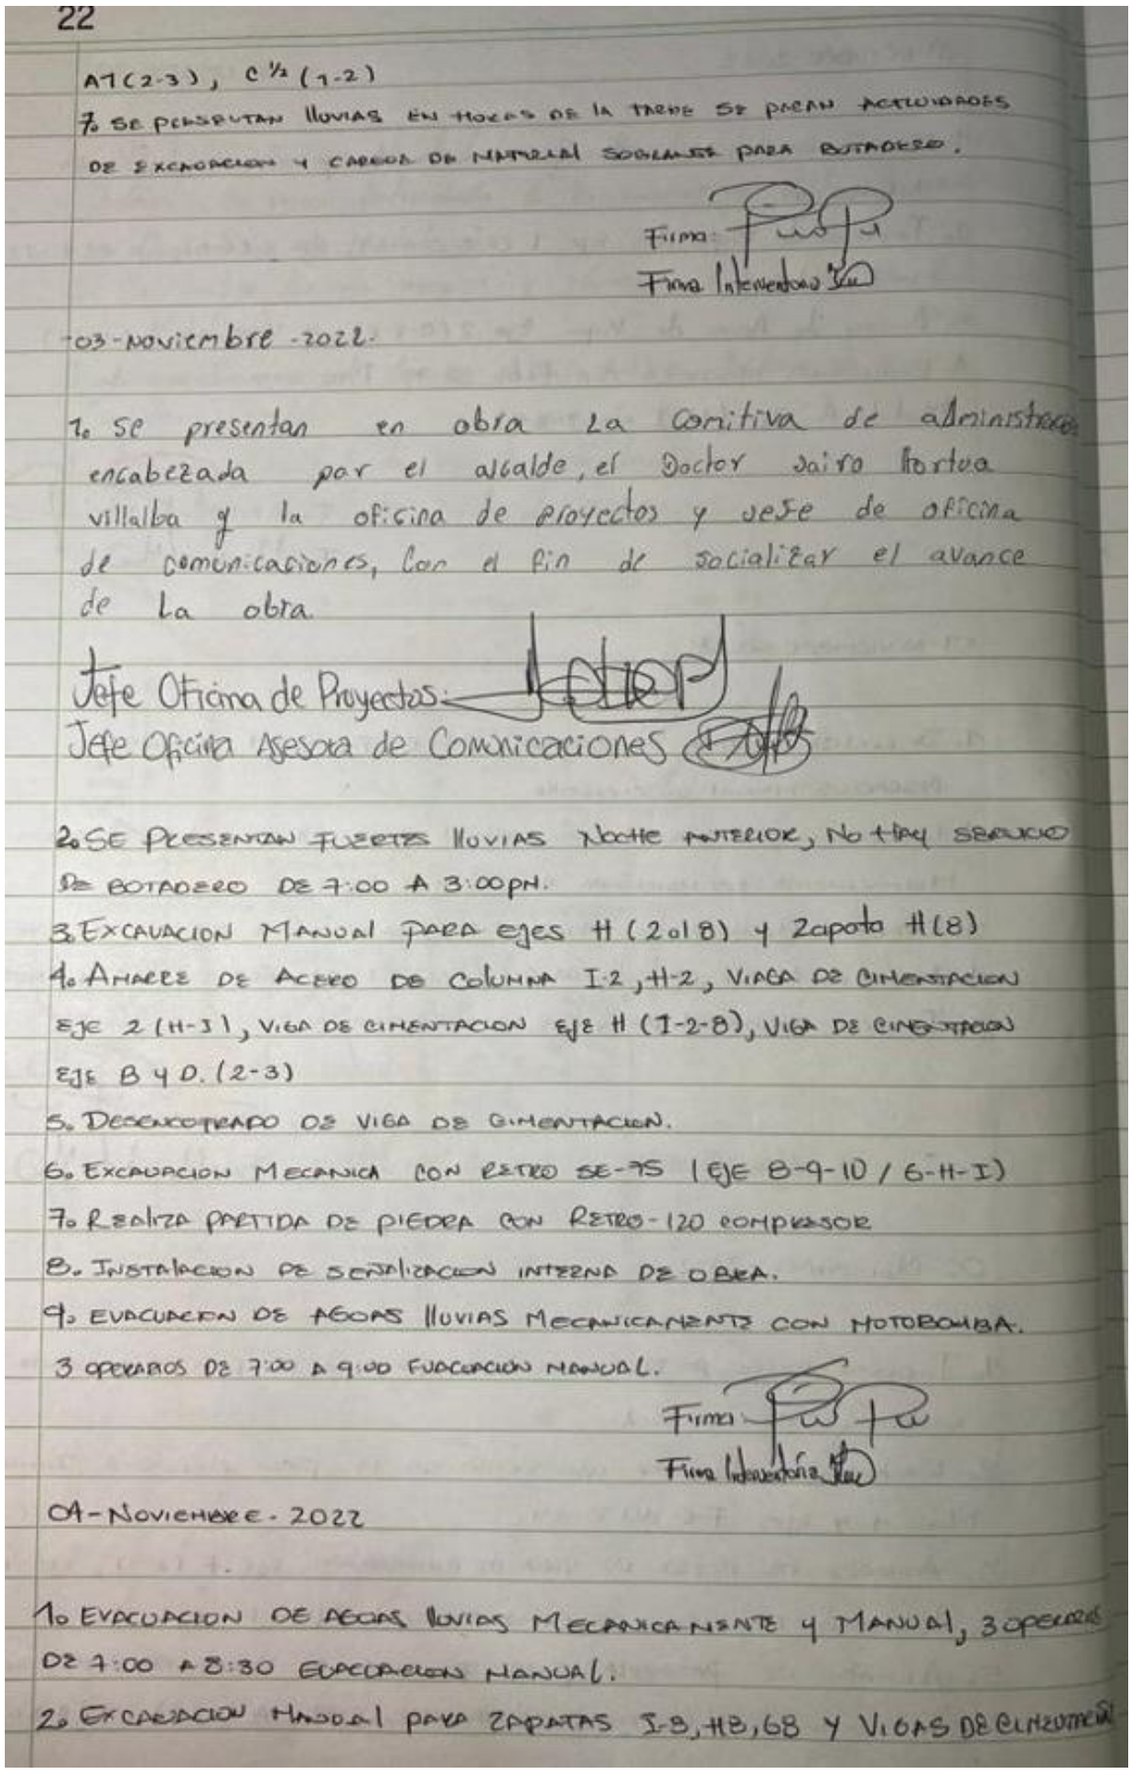

22

A7(2-3), C½(1-2)

7o SE PRESENTAN lluvias EN HORAS DE LA TARDE SE PACAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE PARA BOTADERO.

Firma:
Firma Interventoria

03-Noviembre-2022.

1o Se presentan en obra La Comitiva de administrac encabezada por el alcalde, el Doctor Jairo Hortua villalba y la oficina de proyectos y jefe de oficina de comunicaciones, Con el fin de socializar el avance de la obra

Jefe Oficina de Proyectos:
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

2o SE PRESENTAN FUERTES lluvias Noche anterior, No hay servicio de BOTADERO DE 7:00 A 3:00pm.
3o EXCAVACION MANUAL PARA ejes H(2o18) y Zapata H(8)
4o ARMADO DE ACERO DE COLUMNA I-2, H-2, VIGA DE CIMENTACION EJE 2(H-I), VIGA DE CIMENTACION EJE H(1-2-8), VIGA DE CIMENTACION EJE B y D.(2-3)
5o DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION.
6o EXCAVACION MECANICA CON RETRO SE-75 (EJE 8-9-10 / G-H-I)
7o REALIZA PARTIDA DE PIEDRA CON RETRO-120 COMPRESOR
8o INSTALACION DE SEÑALIZACION INTERNA DE OBRA.
9o EVACUACION DE AGUAS lluvias MECANICAMENTE CON MOTOBOMBA.
3 OPERARIOS DE 7:00 A 9:00 EVACUACION MANUAL.

Firma
Firma Interventoria

04-Noviembre-2022


1o EVACUACION DE AGUAS lluvias MECANICAMENTE y MANUAL, 3 OPERARIOS DE 7:00 A 8:30 EVACUACION MANUAL.
2o EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS I-8, H8, G8 Y VIGAS DE CIMENTACIÓN


3. Amarre de acero de zapatas I-8. y viga cimentacion 2 (6-H)
4. Amarre de acero de vigas eje 2 (F-6), eje 2 (H-I), eje H (2-8), viga eje 6 (2-8), viga eje 3 (D-E-F)
5. Testereo de viga de cimentacion 6 y H del 1 al 2.
6. Excavacion Mecanica con Retro SE 75
7. Demolicion de roca con retro 120 - Demoledor.


Firma:
Firma Interventoria

05-Noviembre-2022.

1. Fundida de solados de zapatas I-8, H8, 68.
2. Amarre de acero de zapatas I-8, H-8, 68
3. Amarre de acero de vigas de cimentacion eje 2 (F-6-H-I) viga de cimentacion eje H (2-8), viga de cimentacion eje 6 (2-8), viga de cimentacion eje 3 (D-E-F)
4. Testereo de viga cimentacion ejes 6-H (1-2), eje 1 (H-I)
5. Amarre de acero de columnas 2-I, H-2, 6-2, H-8, 6-8.
6. Evacuacion de aguas lluvias mecanicamente con motobomba.

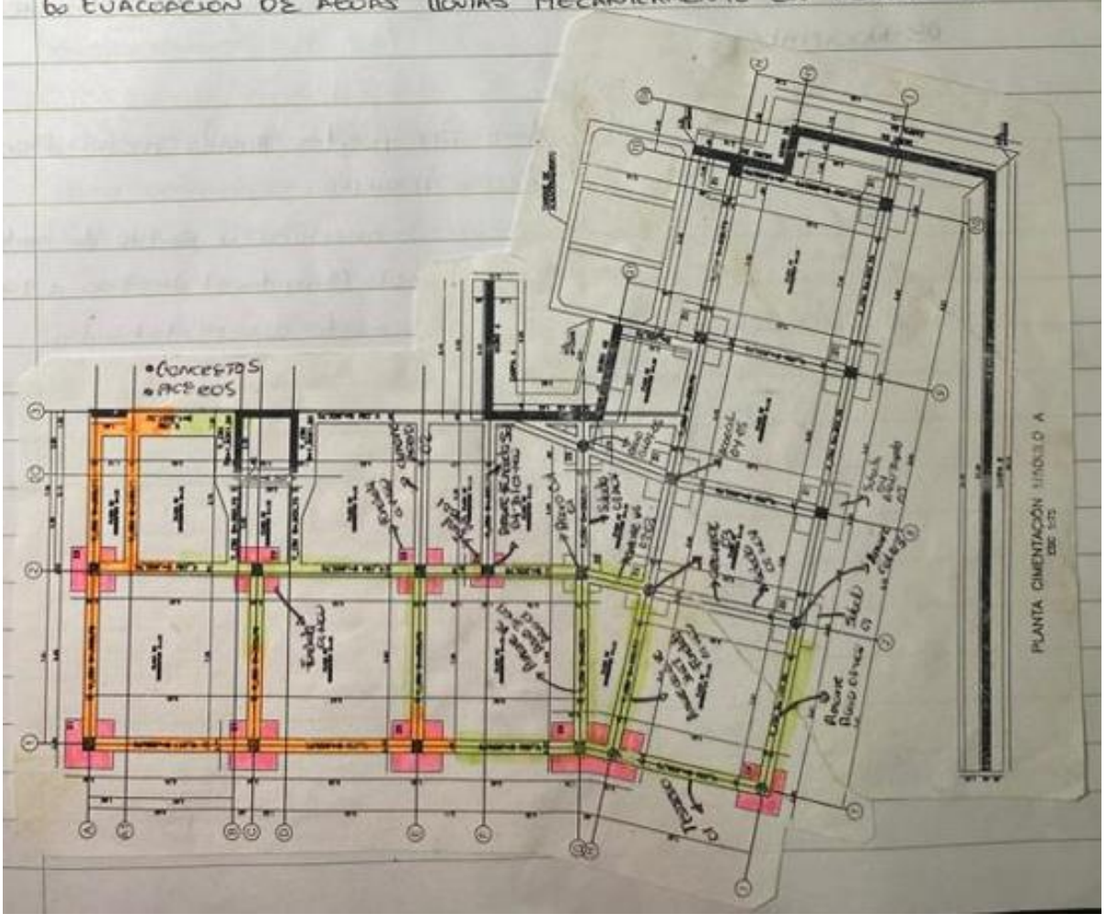

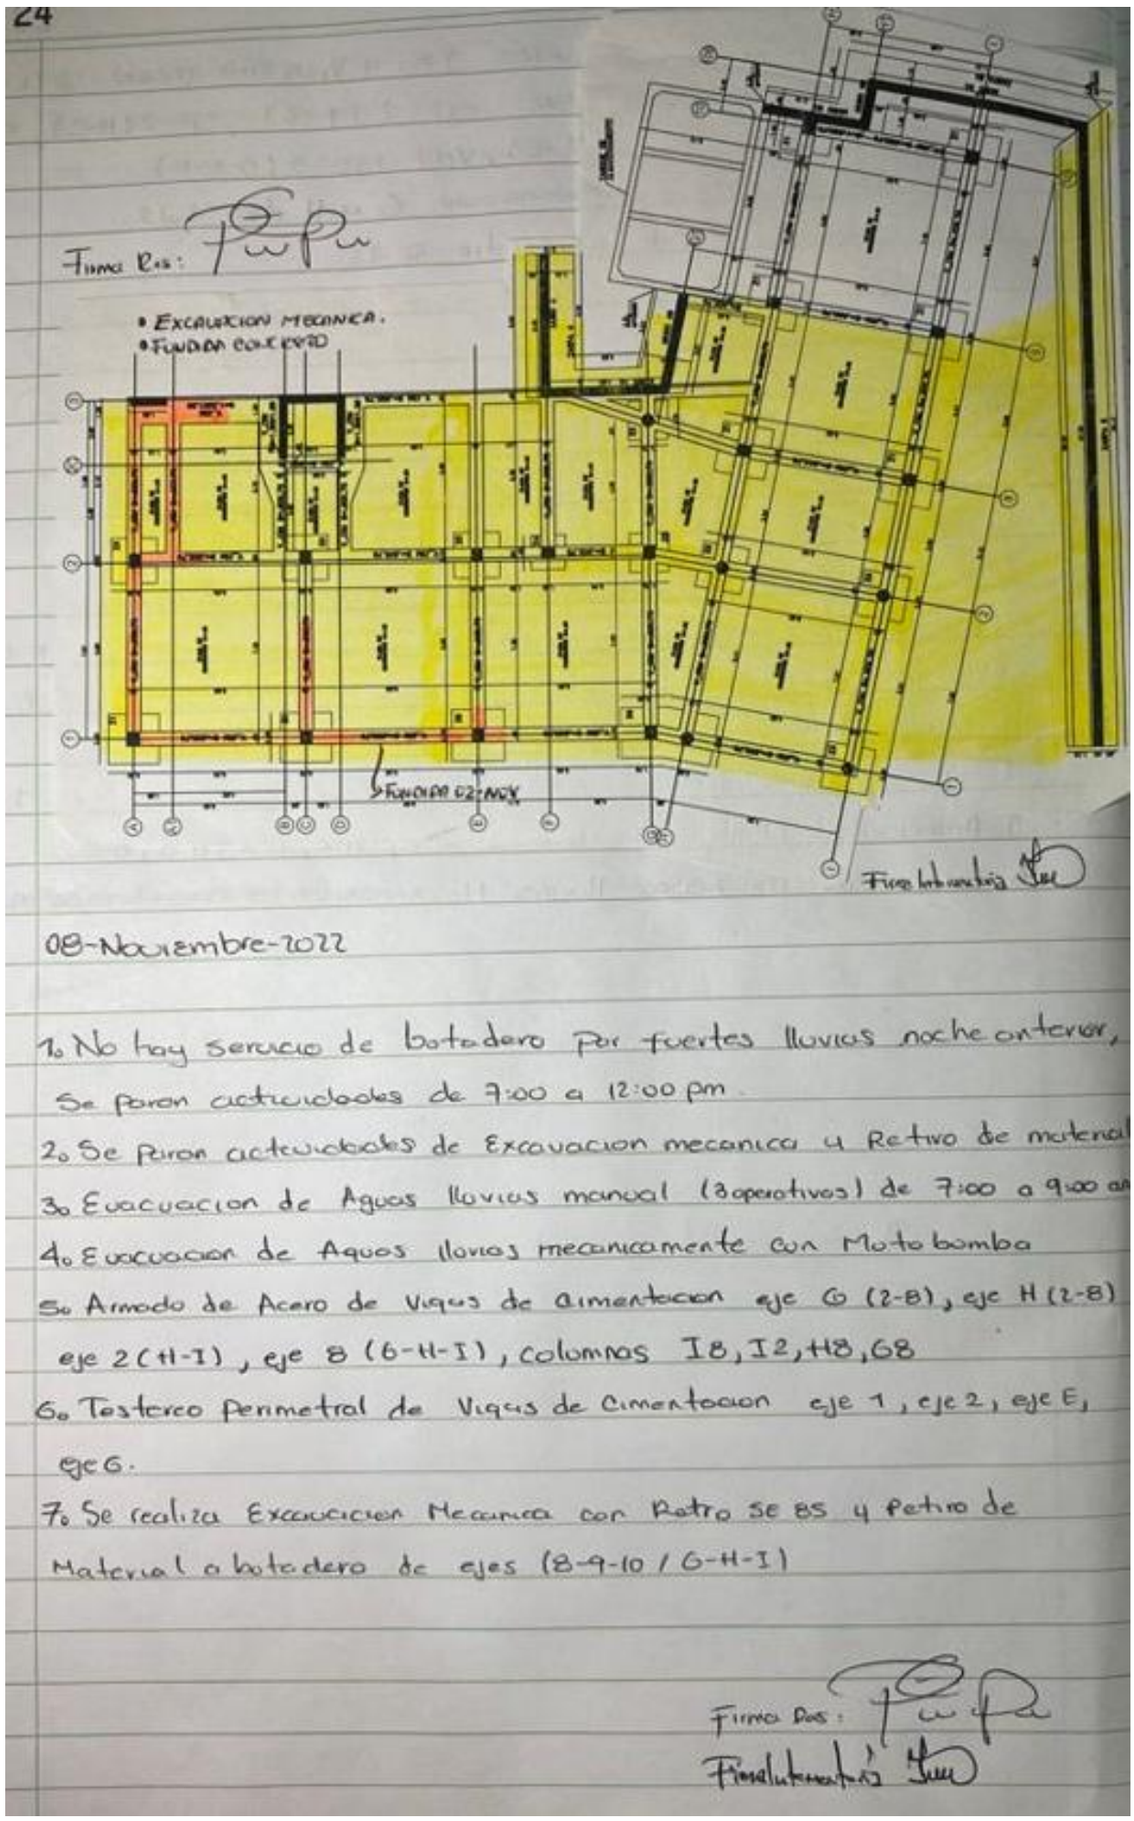
24
Firma Res:
• EXCAVACION MECANICA.
• FUNDIDA CON EPP
FUNDIDA CON MEX
Firma Interventoria
08-Noviembre-2022
1. No hay servicio de botadero por fuertes lluvias noche anterior, Se paran actividades de 7:00 a 12:00 pm
2. Se Paran actividades de Excavacion mecanica y Retiro de material
3. Evacuacion de Aguas lluvias manual (3 operativos) de 7:00 a 9:00 am
4. Evacuacion de Aguas lluvias mecanicamente con Motobomba
5. Armado de Acero de Vigas de cimentacion eje G (2-8), eje H (2-8) eje 2 (H-I), eje 8 (G-H-I), columnas I8, I2, H8, G8
6. Tasterco perimetral de Vigas de Cimentacion eje 1, eje 2, eje E, eje G.
7. Se realiza Excavacion Mecanica con Retro se BS y Retiro de Material a botadero de ejes (8-9-10 / G-H-I)
Firma Res:
Firma Interventoria

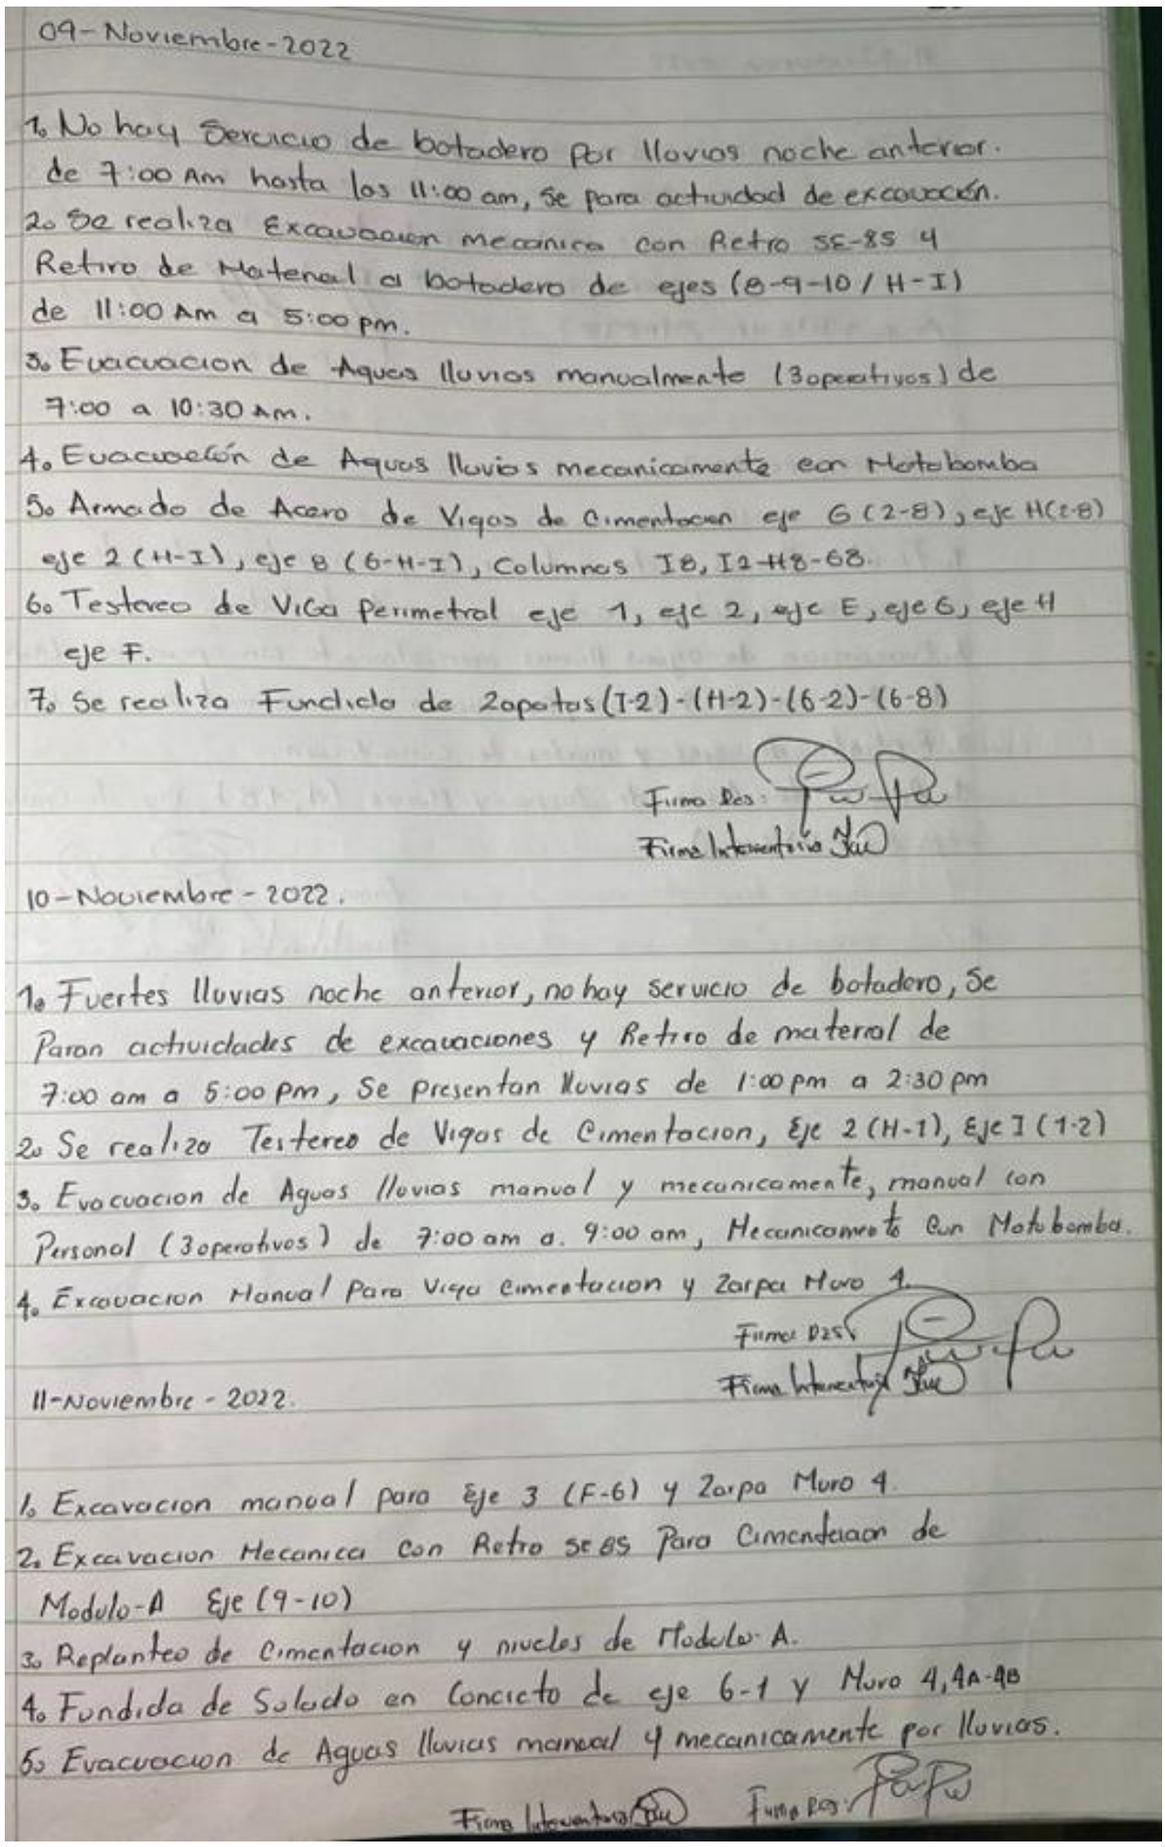

09-Noviembre-2022

1. No hay Servicio de botadero por lluvias noche anterior. de 7:00 Am hasta los 11:00 am, se para actividad de excavación.
2. Se realiza Excavacion mecanica con Retro SE-85 y Retiro de Material al botadero de ejes (8-9-10 / H-I) de 11:00 Am a 5:00 pm.
3. Evacuacion de Aguas lluvias manualmente (3operativos) de 7:00 a 10:30 Am.
4. Evacuación de Aguas lluvias mecanicamente con Motobomba
5. Armado de Acero de Vigas de Cimentacion eje G (2-8), eje H(2-8) eje 2 (H-I), eje 8 (G-H-I), Columnas I8, I2-H8-G8.
6. Testereo de Viga perimetral eje 1, eje 2, eje E, eje G, eje H eje F.
7. Se realiza Fundida de 2apatas (I-2)-(H-2)-(G-2)-(G-8)

Firma Dos:
Firma Interventoria

10-Noviembre-2022.


1. Fuertes lluvias noche anterior, no hay servicio de botadero, Se Paran actividades de excavaciones y Retiro de materal de 7:00 am a 5:00 pm, Se presentan lluvias de 1:00 pm a 2:30 pm
2. Se realizo Testereo de Vigas de Cimentacion, Eje 2 (H-1), Eje I (1-2)
3. Evacuacion de Aguas lluvias manual y mecanicamente, manual con Personal (3operativos) de 7:00 am a. 9:00 am, Mecanicamente Con Motobomba.
4. Excavacion Manual Para Viga cimentacion y Zarpa Muro 1.

Firma Dos:
Firma Interventoria

11-Noviembre-2022.

1. Excavacion manual para Eje 3 (F-6) y Zarpa Muro 4.
2. Excavacion Mecanica con Retro SE85 Para Cimentacion de Modulo-A Eje (9-10)
3. Replanteo de Cimentacion y niveles de Modulo A.
4. Fundida de Solado en Concreto de eje 6-1 y Muro 4,4A-4B
5. Evacuacion de Aguas lluvias manual y mecanicamente por lluvias.

Firma Interventoria
Firma Dos:

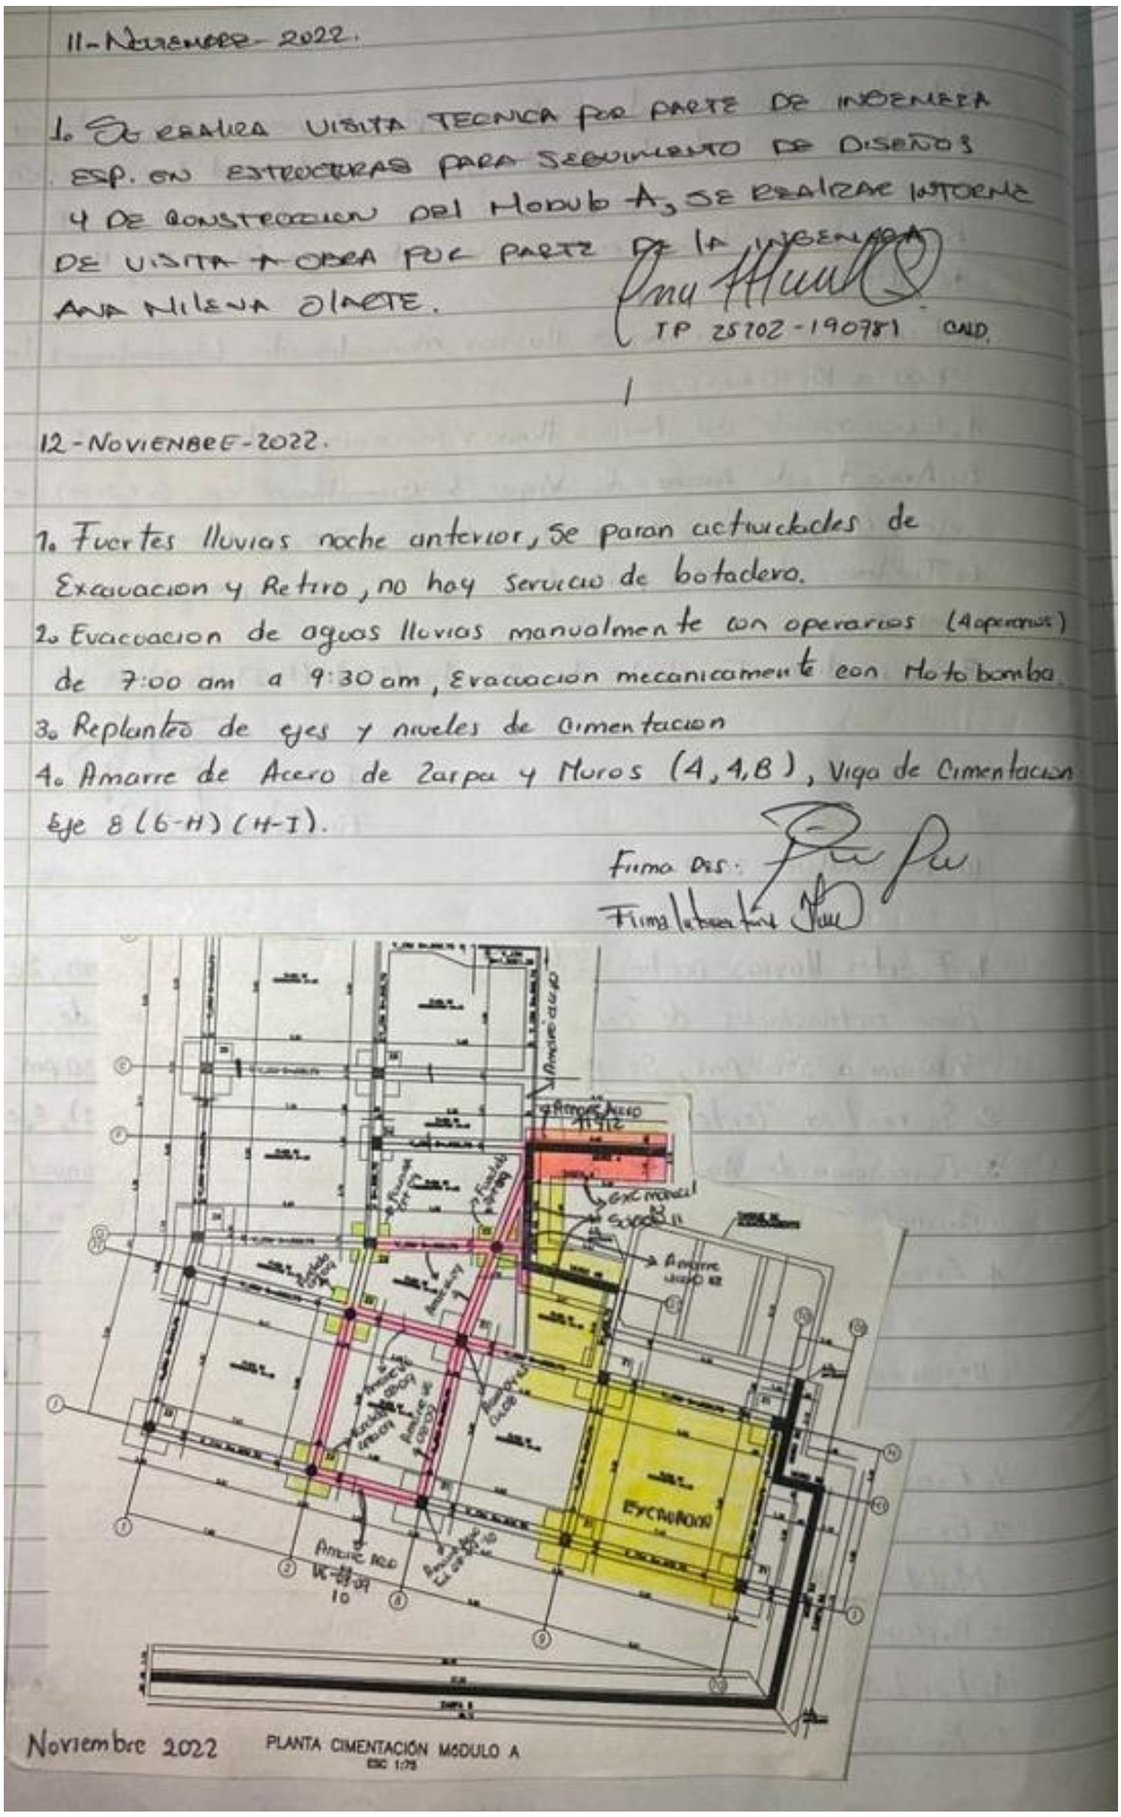

11-Noviembre-2022.

1. Se realiza visita tecnica por parte de ingeniera esp. en estructuras para seguimiento de diseños y de construccion del Modulo A, se realizar informe de visita a obra por parte de la ingeniera Ana Milena Olarte.

TP 25702-190781 CND.

12-Noviembre-2022.

1. Fuertes lluvias noche anterior, se paran actividades de Excavacion y Retiro, no hay servicio de botadero.
2. Evacuacion de aguas lluvias manualmente con operarios (4 operarios) de 7:00 am a 9:30 am, Evacuacion mecanicamente con Motobomba
3. Replanteo de ejes y niveles de Cimentacion
4. Amarre de Acero de Zarpa y Muros (4,1,B), Viga de Cimentacion Eje 8 (G-H) (H-I).

Firma Res:

Firma Interventoria

15 – Noviembre – 2022

1. Se recibe y atiende la visita de la secretaria de gobierno la inspección primera con el fin de actuar y solucionar las dudas sobre planimetria y licenciamiento de la obra, toman registro fotografico y se envia de manera digital la licencia de construccion y el informe 002 del mes de octubre
- Inspt
- Daniel Muñoz - Sec. gobierno control urbano
2. POR LLUVIAS NO HAY SERVICIO DE BOTADERO DE 7:00 A 10:00 AM Y SE PARAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION DE BLOQUE-A.
3. AMARRE DE ACERO DE MURO DE CONTENCION 4, 4A, 4B Y ZAPAS.
4. TESTEREO DE ZAPA DE MURO 4, 4A Y 4B.
5. EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS MANUAL Y MECANICAMENTE, MANUAL CON (3 operarios) DE 7:00 AM A 9:00 AM Y MECANICAMENTE CON MOTOBOMBA.
6. EXCAVACION MECANICA CON RETRO SE-75 PARA CIMENTACION DE MODULO A EJES 8-9-10 Y CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE PARA BOTADERO.
7. AMARRE DE ACERO DE REFORZO - PROLONGACION DE COLUMNA A-1/A2.
8. AMARRE DE ACERO DE VIGA DE CIMENTACION (EJE F-MURO)

Firma Res:
Firma Interventoría:

16-NOVIEMBRE-2022

6 Excavacion Mecanica con Retro SE-75 para Zona Urbanismo Calle 4 y Demolicion de Muro en Adobe y cargio de Escombro.
2. Ingreso Retro 120 para Realizar Excavacion de Modulo A Cimentacion en ejes 9-10 y sobre ancho Zarpa Muro 5.
3. Amarre de Acero de Reforzo de Viga eje 3 (E-F)
4. Amarre de Acero de Reforzo de Muro Contencion 4B y Viga C (G-1)
5. Amarre de Acero de Reforzo de prolongacion de Columnas C2-C1-B-A.
6. Evacuacion de Aguas lluvias Mecanicamente con Motobomba.

Firma Res:
Firma Interv.

28

17-Noviembre-2022

1. Excavacion Mecanica con Retro-Rio de Cimentacion de Modulo-A ejes 9-10 / H-I y Zapa Muro S Contencion.
2. Excavacion Mecanica con Retro SE-75 para Urbanismo, Acceso por Calle 4, Evacuacion de Demolicion Muro en Adobe y Escombros de Urbanismo Existe
3. Evacuacion de Aguas lluvias Manual y Mecanicamente, Mantenimiento con (3 operativos) de Cimentacion Modulo-A y Mecanicamente con Motobomba
4. Amarre de Acero de Vigas Eje E y Muro 4,9A,9B, Prolongacion y Amarre de Acero de Columnas E2/6-1/F1
5. Se realiza Fundida de Viga de Cimentacion y Zapata H8-I8, se termina Actividad a las 9:45 pm.

Firma Res:
Firma Laborator


18-Noviembre-2022


1. Secretaria de cultura; Superviccion retiro de Placas y traslado
- Nota: Predicto Traslado de Placa ubicada a calle 4 con Cra 8a.
2. Por lluvias de noche anterior no hay servicio de bombeo y se paran actividades de excavaciones y Retiro de 7:00 a 10:00 Am
3. Se evidencia precensia de lluvias de 7:00 a 9:30, se paran todas las actividades
4. Desencofrado de vigas de cimentacion de eje B-H-I-E-F.
5. Se realiza demolicion de muro de cerramiento costado de Calle 4 con Carrera 8.
6. Excavacion mecanica con Retro para Alcantarillado Aguas lluvias, Conexion con pozo Colector de Via Carrera 8.
7. Instalacion de tramo tuberia de 8" Durafort para alcantarillado Aguas lluvias, Relleno con capas de 0.30 y Compactacion mecanica, se realiza atraque con triturado a tuberia.

Firma Res:
Firma Laborator

19-Noviembre-2022.

1. Evacuacion de aguas lluvias manual y mecanicamente de excavacion de Cimentacion Modulo-A.
2. Fundida de Zarpa de muros de contencion A,4A y 4B
3. Retro SE-85 Realiza Excavación para cimientos de Modulo-A de ejes 9-10 / H-I.
4. Retro 120 Realiza excavacion de Alcantarillado de Aguas lluvias

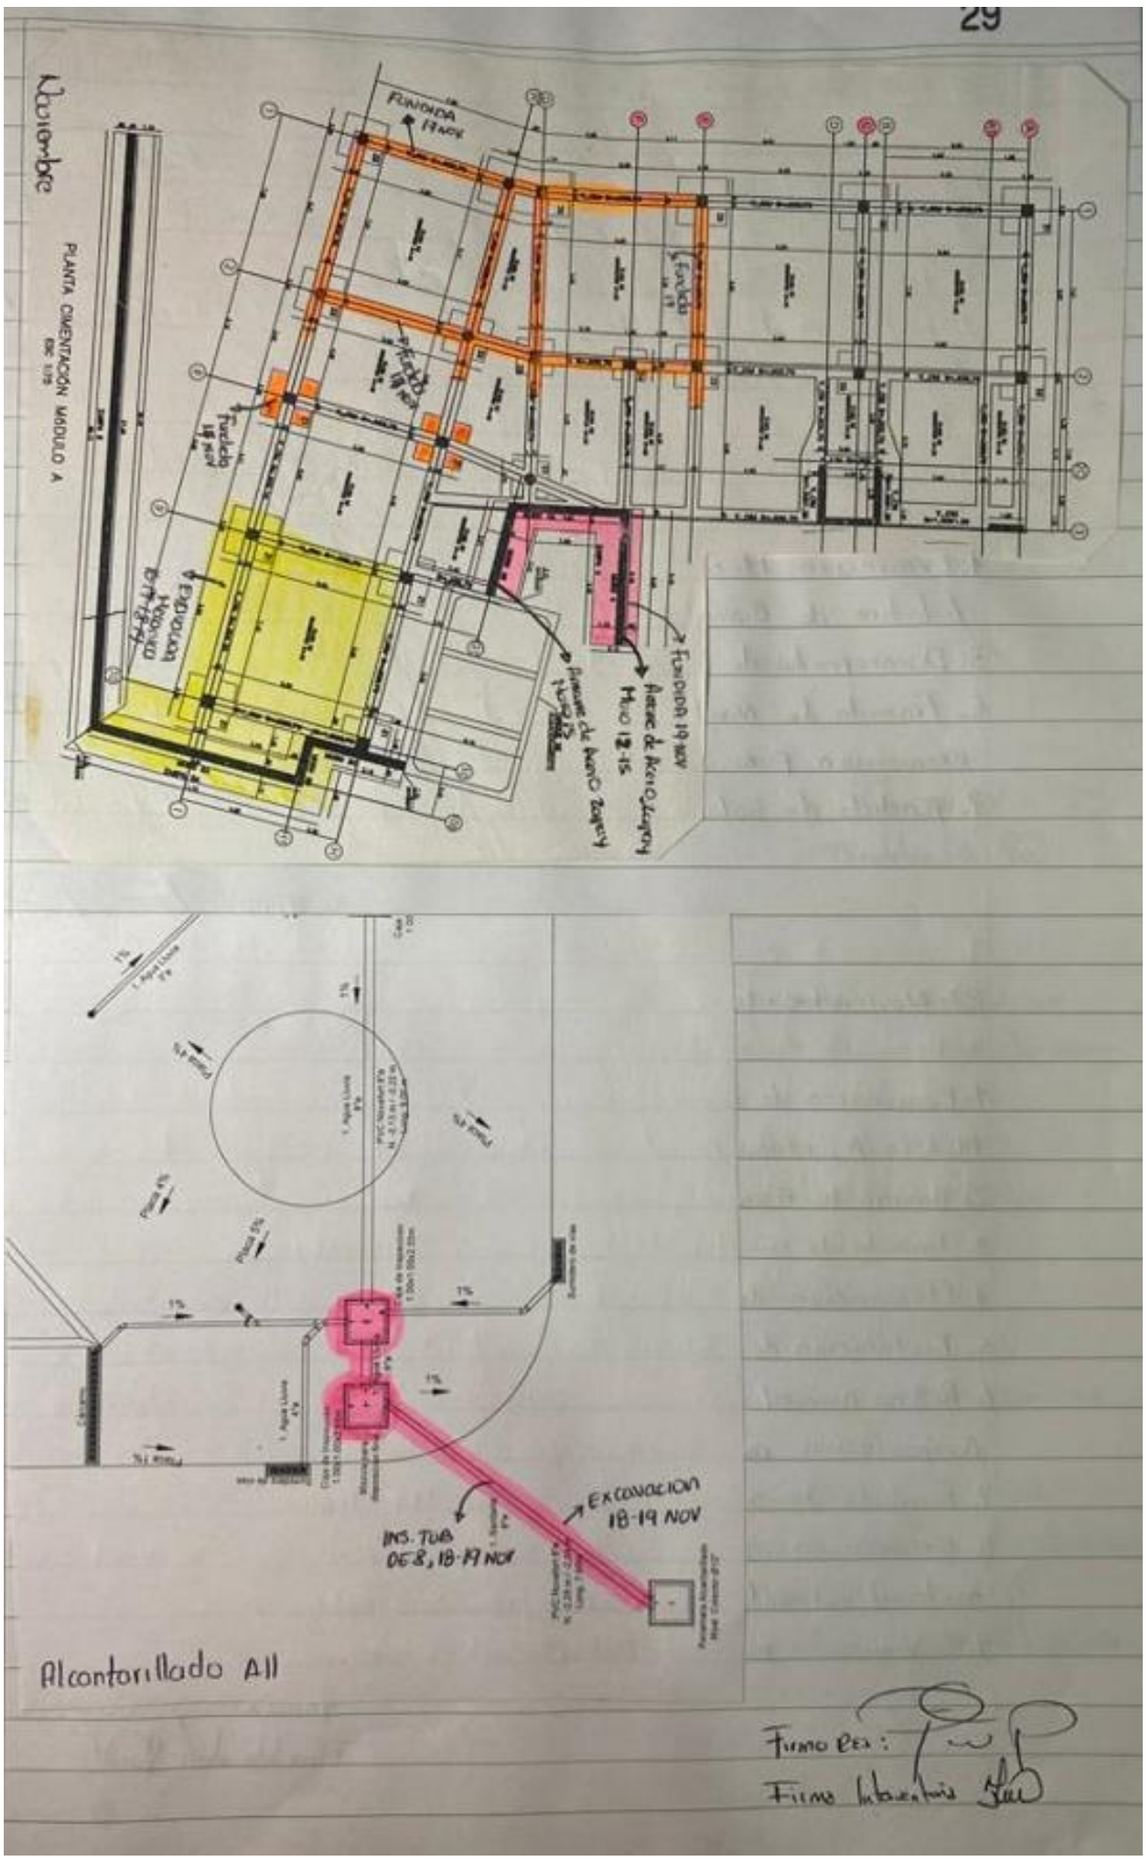
29
Noviembre
PLANTA CIMENTACION MODULO A
FUNDIDA 17 NOV
Fundido 18 nov
Fundido 19 nov
Fundido 18 nov
Fundido 19 nov
Fundido 19 nov
Fundido 19

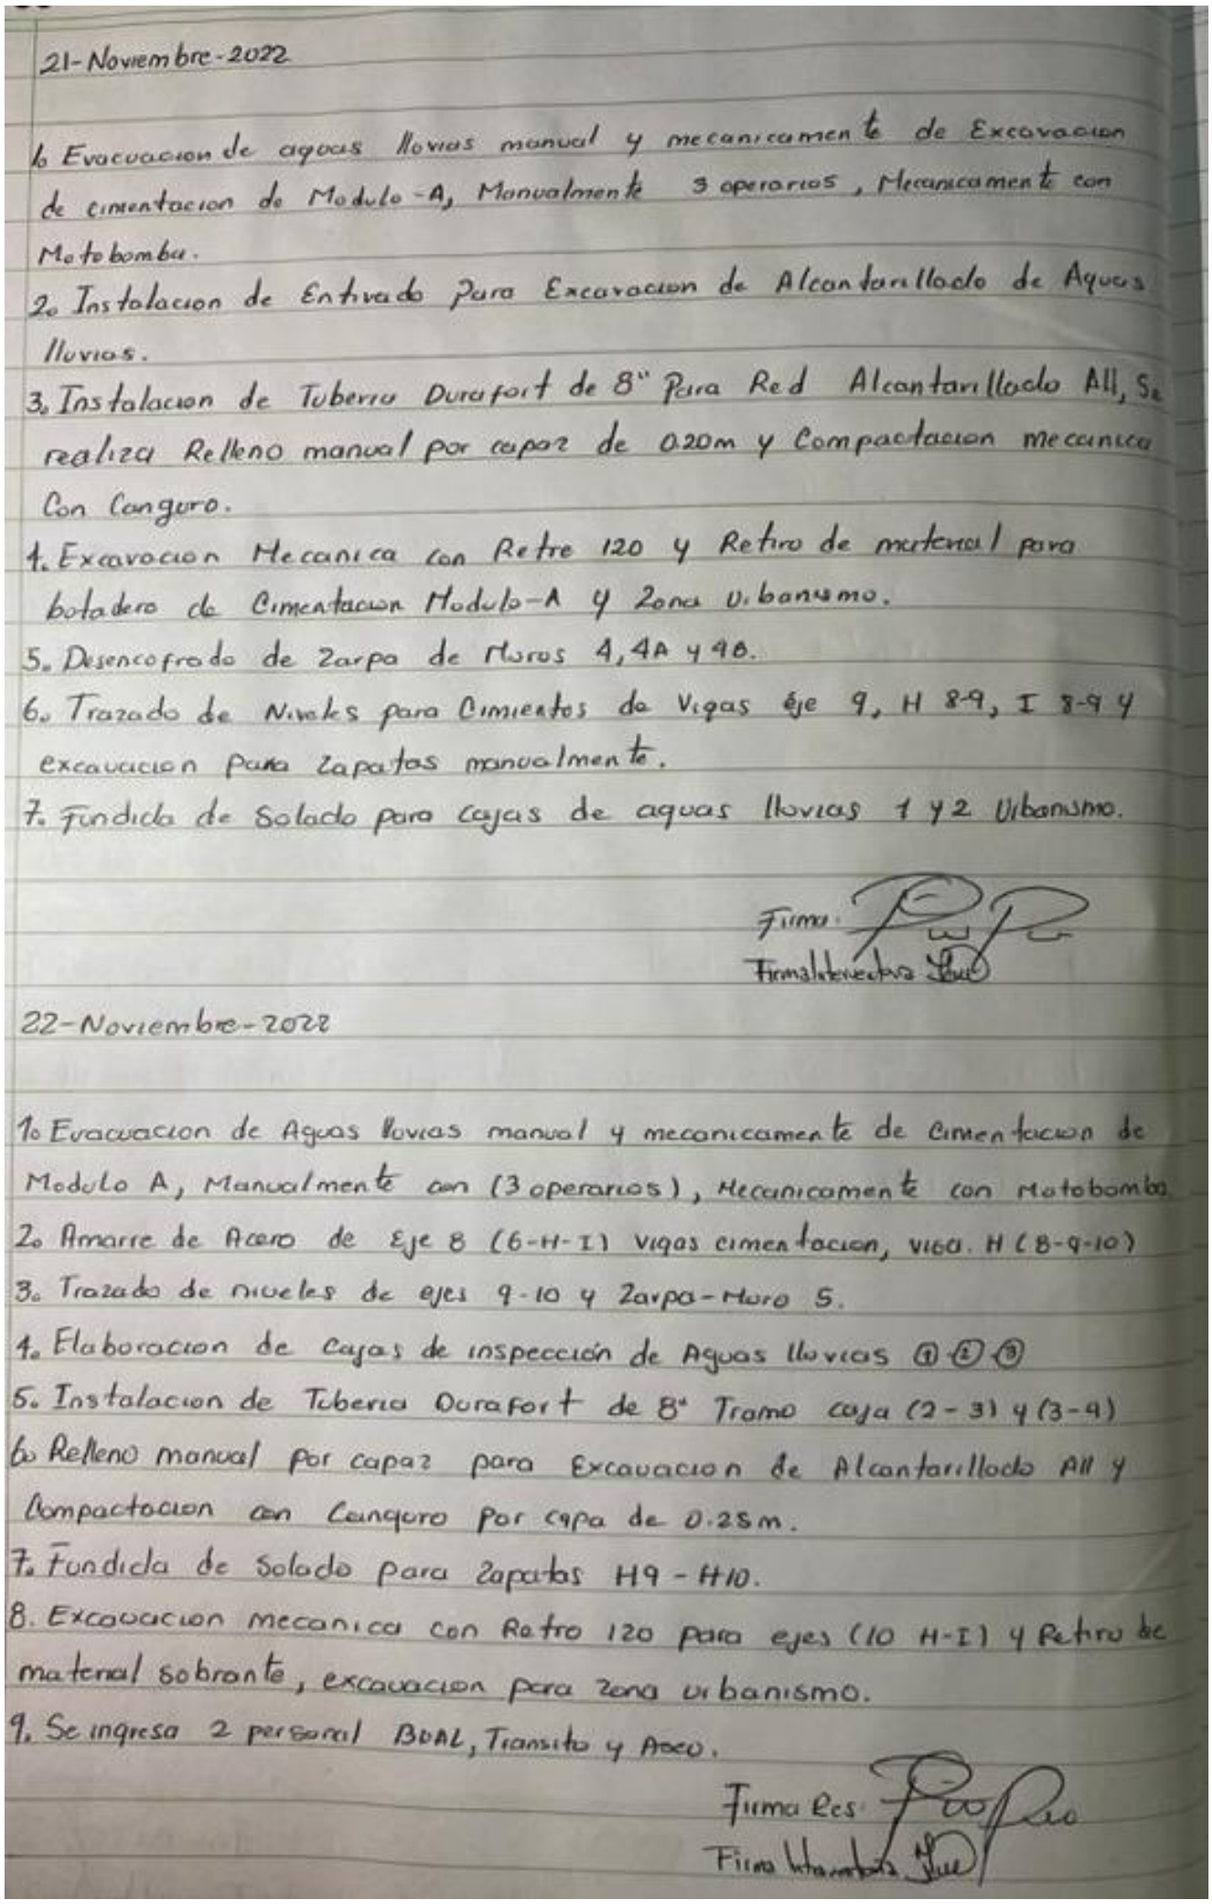

21-Noviembre-2022


1. Evacuacion de aguas lluvias manual y mecanicamente de Excavacion de cimentacion de Modulo-A, Manualmente 3 operarios, Mecanicamente con Motobomba.
2. Instalacion de Entivado para Excavacion de Alcantarillado de Aguas lluvias.
3. Instalacion de Tuberia Durafort de 8" Para Red Alcantarillado All, Se realiza Relleno manual por capas de 0.20m y Compactacion mecanica Con Canguro.
4. Excavacion Mecanica con Retro 120 y Retiro de material para botadero de Cimentacion Modulo-A y Zona Urbanismo.
5. Desencofrado de Zarpa de Muros 4, 4A y 4B.
6. Trazado de Niveles para Cimientos de Vigas eje 9, H 8-9, I 8-9 y excavacion para zapatas manualmente.
7. Fundida de Solado para cajas de aguas lluvias 1 y 2 Urbanismo.

Firma:
Firma Interventoria

22-Noviembre-2022

1. Evacuacion de Aguas lluvias manual y mecanicamente de Cimentacion de Modulo A, Manualmente con (3 operarios), Mecanicamente con Motobomba
2. Amarre de Acero de Eje 8 (6-H-I) Vigas cimentacion, viga. H (8-9-10)
3. Trazado de niveles de ejes 9-10 y Zarpa-Muro 5.
4. Elaboracion de Cajas de inspección de Aguas lluvias ① ② ③
5. Instalacion de Tuberia Durafort de 8" Tramo caja (2-3) y (3-9)
6. Relleno manual por capas para Excavacion de Alcantarillado All y Compactacion con Canguro por capa de 0.25m.
7. Fundida de Solado para Zapatas H9 - H10.
8. Excavacion mecanica con Retro 120 para ejes (10 H-I) y Retiro de material sobrante, excavacion para zona urbanismo.
9. Se ingresa 2 personal BOAL, Transito y Acero.

Firma Res:
Firma Interventoria

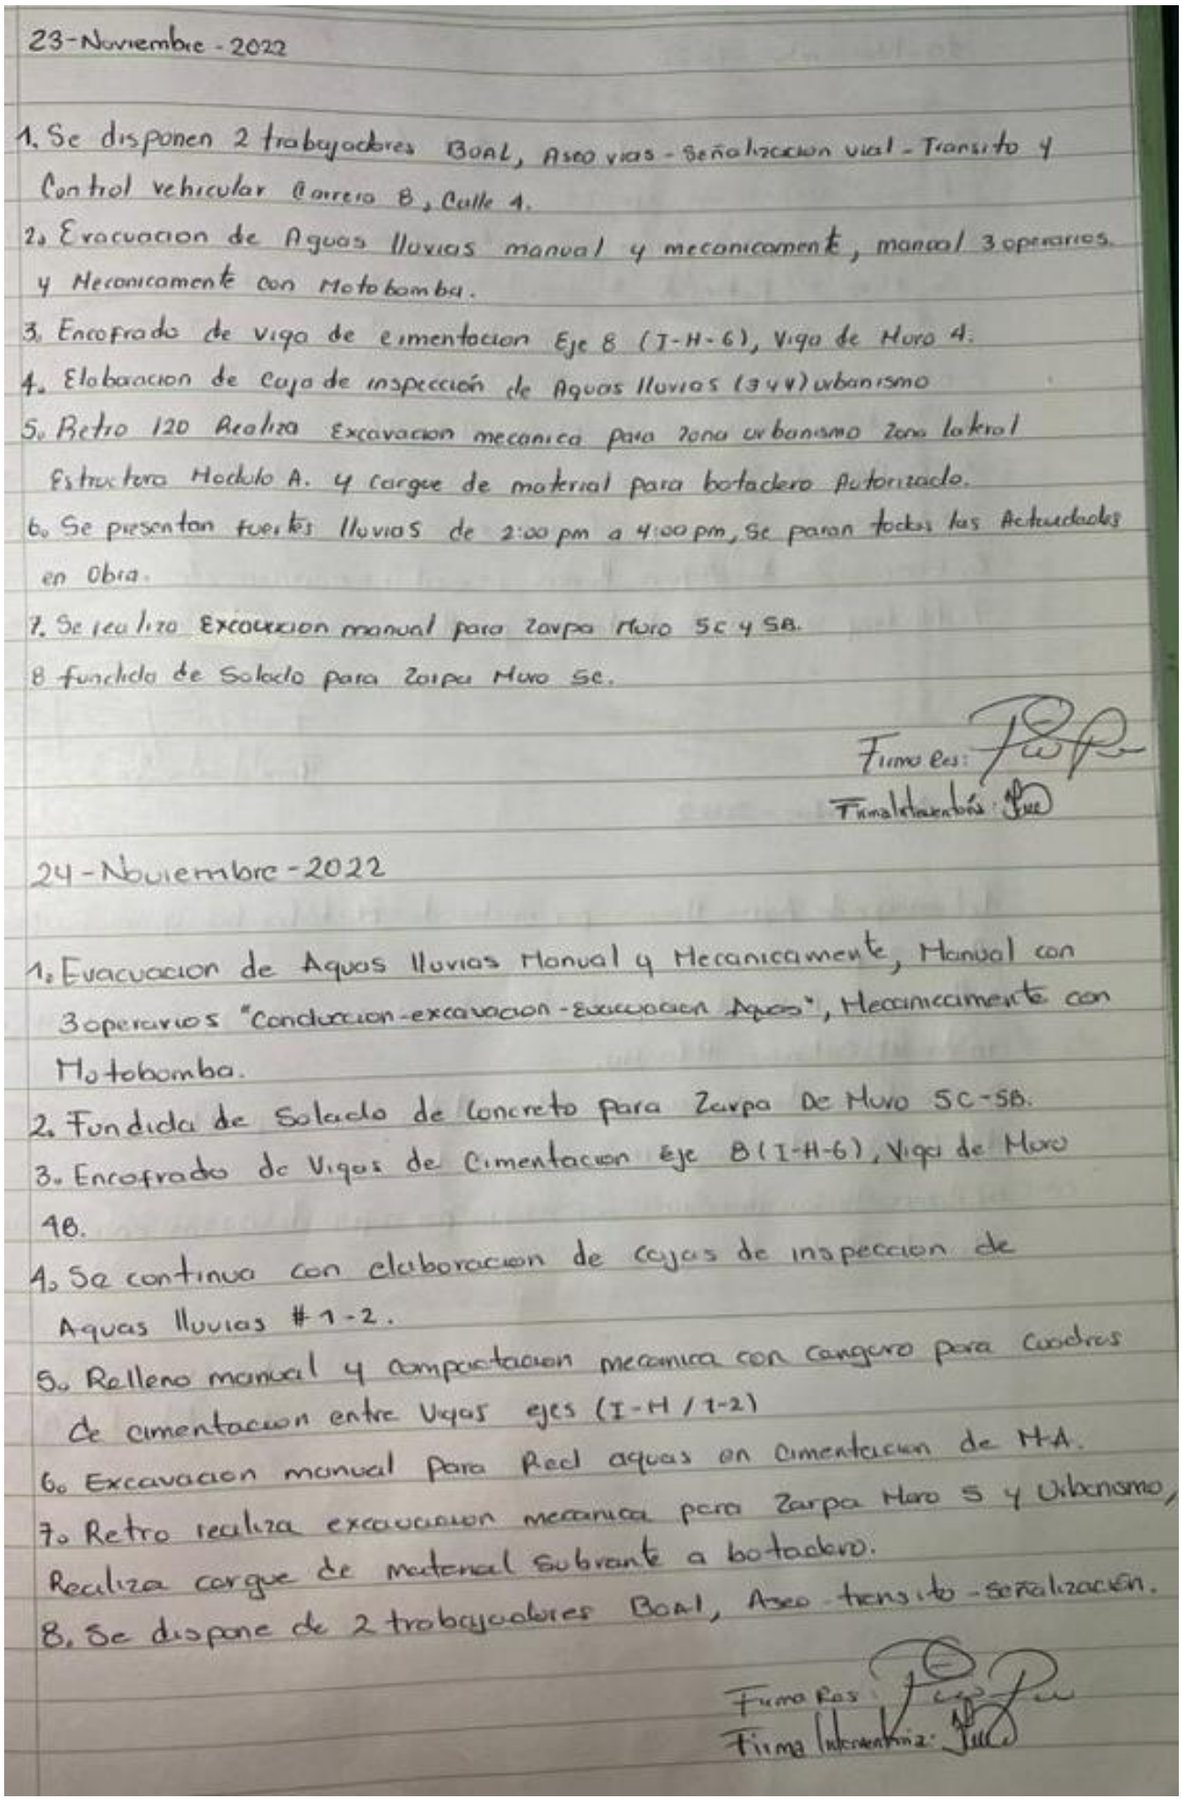

23-Noviembre-2022

1. Se disponen 2 trabajadores BOAL, Aseo vias - Señalizacion vial - Transito y Control vehicular @ carrera 8, Calle 4.
2. Evacuacion de Aguas lluvias manual y mecanicamente, manual 3 operarios. y Mecanicamente con Motobomba.
3. Encofrado de viga de cimentacion Eje 8 (I-H-6), Viga de Muro 4.
4. Elaboracion de Caja de inspección de Aguas lluvias (3 y 4) urbanismo
5. Retro 120 Realiza Excavacion mecanica para zona urbanismo zona lateral Estructura Modulo A. y cargue de material para botadero Autorizado.
6. Se presentan fuertes lluvias de 2:00 pm a 4:00 pm, Se paran todas las Actividades en Obra.
7. Se realizo Excavacion manual para zarpa Muro 5C y 5B.
8. Fundida de Solado para zarpa Muro 5C.

Firmas Res:
Firma Interventoría:

24-Noviembre-2022

1. Evacuacion de Aguas lluvias Manual y Mecanicamente, Manual con 3 operarios "Conduccion-excavacion-Evacuacion Aguas", Mecanicamente con Motobomba.
2. Fundida de Solado de Concreto para Zarpa De Muro 5C-5B.
3. Encofrado de Vigas de Cimentacion eje B (I-H-6), Viga de Muro 4B.
4. Se continua con elaboracion de cajas de inspeccion de Aguas lluvias #1-2.
5. Relleno manual y compactacion mecanica con canguro para Cuadros de cimentacion entre Vigas ejes (I-H / 1-2)
6. Excavacion manual para Red aguas en cimentacion de M.A.
7. Retro realiza excavacion mecanica para Zarpa Muro 5 y Urbanismo, Realiza cargue de material Sobrante a botadero.
8. Se dispone de 2 trabajadores BOAL, Aseo-transito-señalizacion.

Firmas Res:
Firma Interventoría:


25-Noviembre-2022

1. Excavacion manual para Red Aguas lluvias de poso Avanzar A caja inspeccion eje I-2.
2. Excavacion mecanica con Retro Para zona Urbanismo y Zanja de Nivo 5, Retiro de Material Sobrante a botadero,
3. Amarre de Acero de Viga de Cimentacion Eje I (8-9-10), Viga C eje 9 (I-H), Viga eje 10 (I-H), Columna I9
4. Testereo de Viga de Nivo 4B-4A.
5. Rellero de excavacion de Red Aguas lluvias de caja 2-3 Urbanismo y compactacion mecanica con canguro por capas.
6. Evacuacion de Aguas lluvias manual y mecanicamente.
7. No hay servicio de botadero por lluvias noche Anterior.


Firma Res:
Firma Interventoria

26-Noviembre-2022

1. Excavacion de Aguas lluvias por medio de Motobomba y manualmente Con 3 operarios.
2. Amarre de Acero de Viga de Cimentacion Eje I(9-10), Eje 9(I-H, Eje 10 (I-H). Columna I9 - I10.
3. Testereo de Viga de Nivo A-A, Vigas Eje H(12-8)
1. Elaboracion de caja inspeccion N°1.
5. Compactacion mecanica con canguro por capas de 0.25m en excavacion Alcantarillado de caja 2-3.

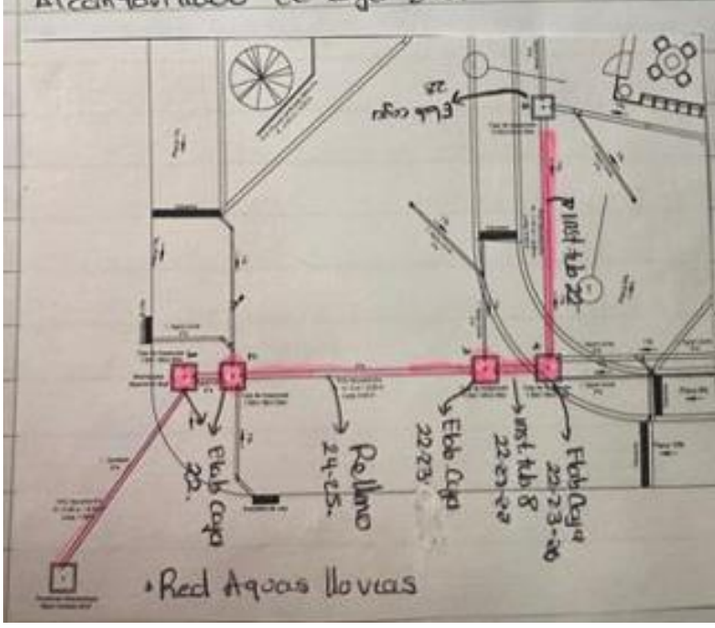


Firma Res:
Firma Interventoria

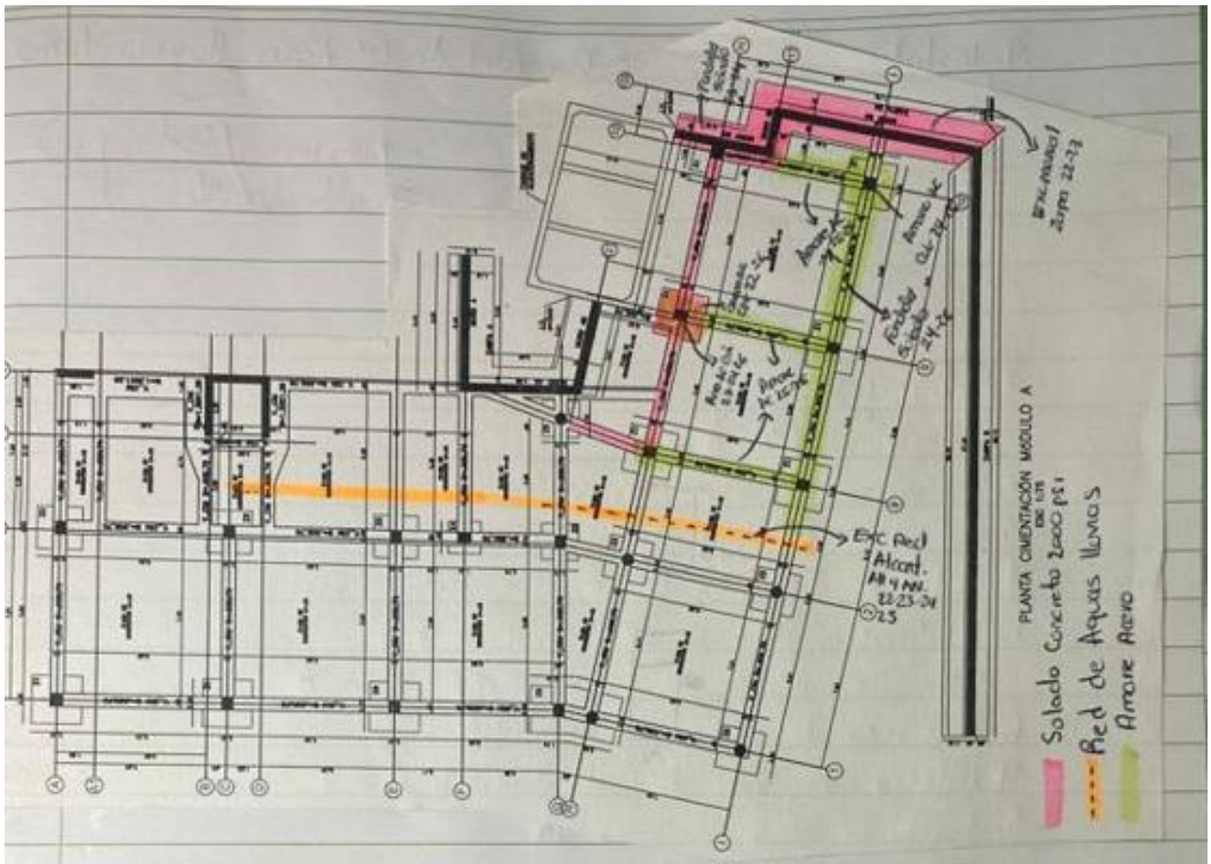

28-Noviembre-2022

1. Evacuacion de Aguas lluvias manual y mecanicamente de Excavación de Modelo-A, manual con 3 operarios "conduccion-Evacuacion-Excavacion", mecanicamente con Motobomba.
2. Testereo de Viga cimentacion de eje D(2-3), Eje E(2-3), Eje G(2-3)
3. Excavacion manual para Red Alcantarillado Aguas lluvias de Red interna de Modelo A Tramo de Foso A eje I salida a caja
4. Instalacion de tuberia de 6" Duratent de Alcantarillado Aguas lluvias de Foso Ascensor A conexion caja inspeccion.
5. Amarre de Acero de Zarpa Muro S-SC-SB
6. Por lluvias no hay servicio de Botadero.
7. Retro hace excavacion mecanica para Urbanismo y Sobreancho de Zarpa Muro S.
8. Relleno manual y compactacion mecanica para tuberia tramo de caja 6 a 5.

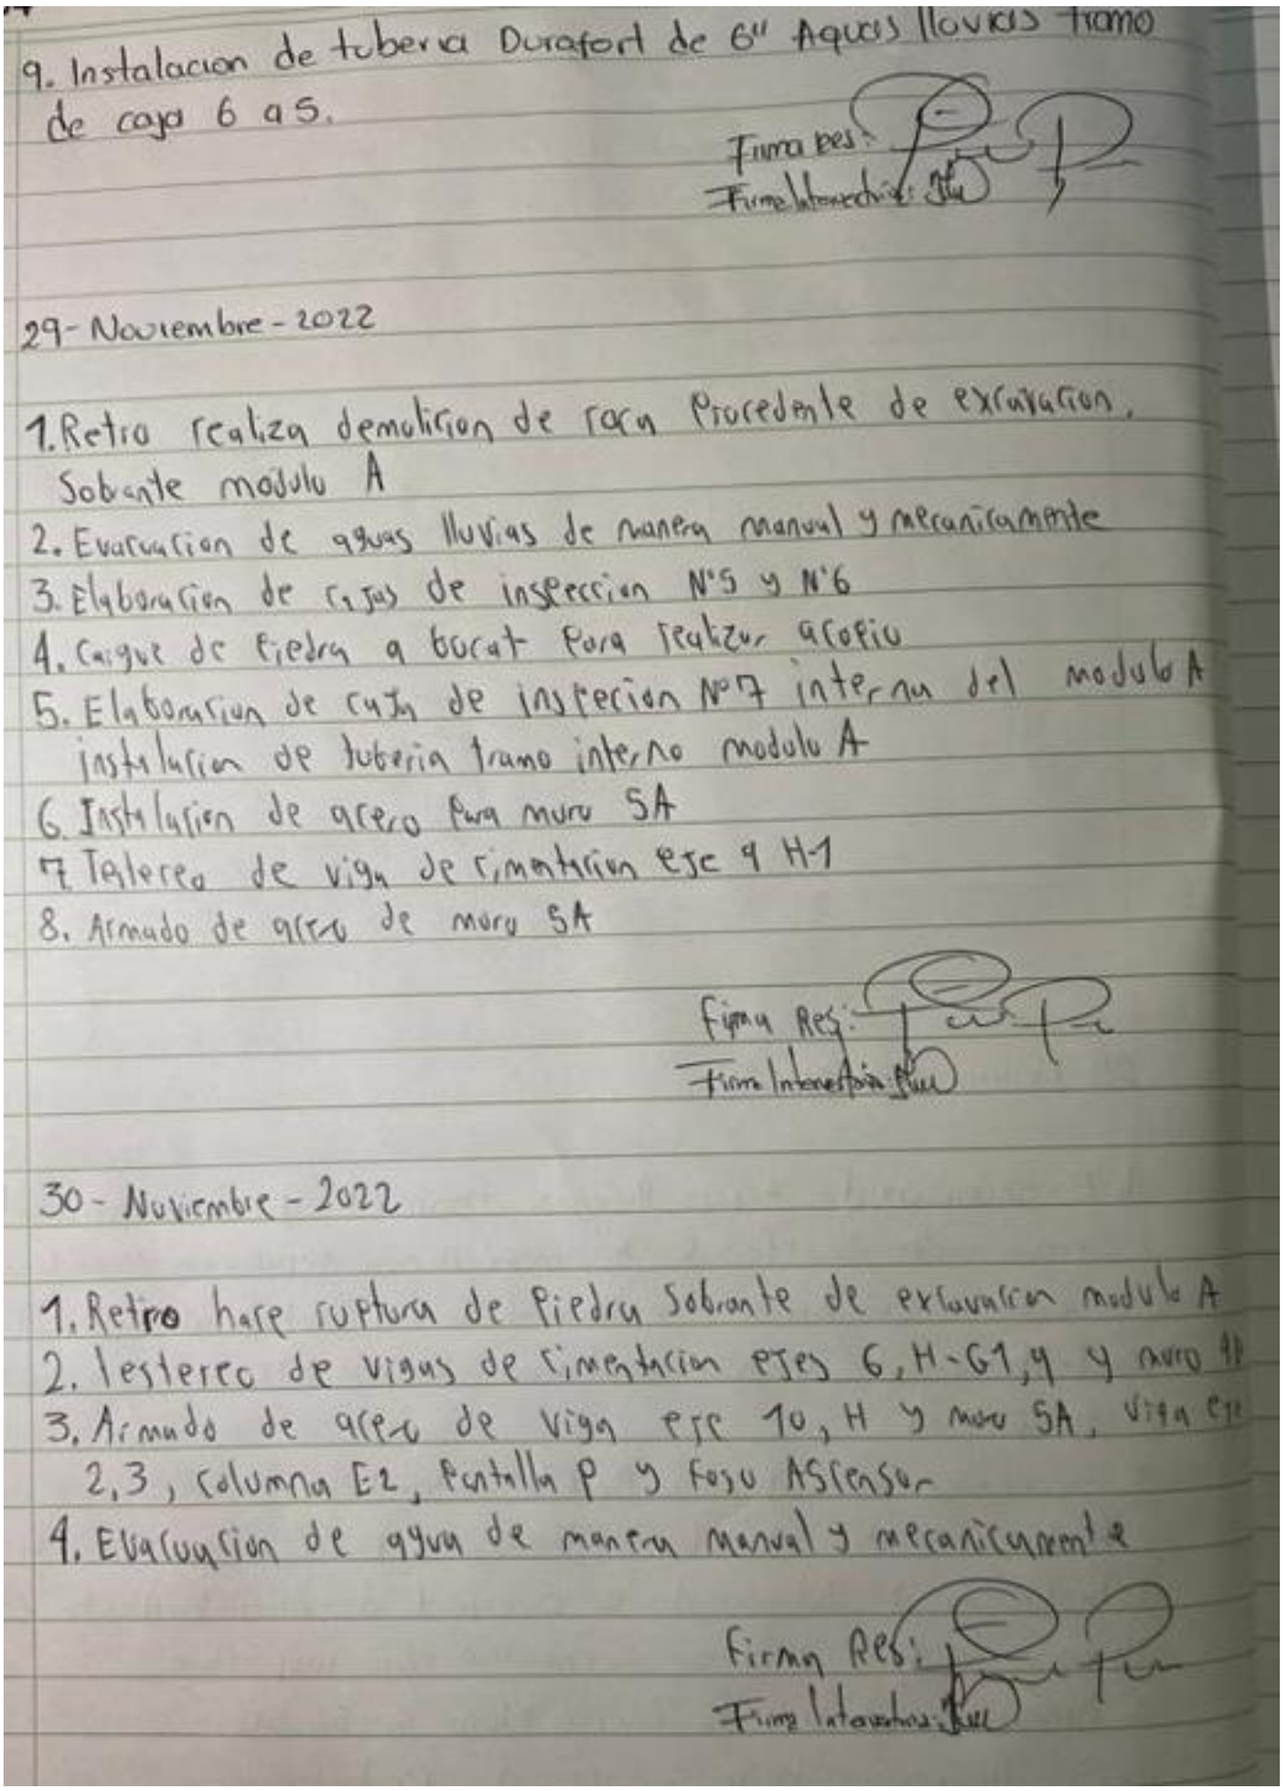

9. Instalacion de tuberia Durafort de 6" Aguas lluvias tramo de caja 6 a 5.

Firma Res:
Firma Interventoria:

29- Noviembre - 2022

1. Retro realiza demolicion de roca Procedente de excavacion, Sobante modulo A
2. Evacuacion de aguas lluvias de manera manual y mecanicamente
3. Elaboracion de cajas de inspeccion N°5 y N°6
4. Cargue de Piedra a bocat Para realizar acopio
5. Elaboracion de caja de inspecion N°7 interna del modulo A instalacion de tuberia tramo interno modulo A
6. Instalacion de acero Para muro SA
7. Tablero de viga de cimentacion eje 9 H-1
8. Armado de acero de muro SA

Firma Res:
Firma Interventoria:

30 - Noviembre - 2022

1. Retro hace ruptura de Piedra Sobrante de excavacion modulo A
2. Tablero de vigas de cimentacion ejes 6, H-G1, 9 y muro 9
3. Armado de acero de viga eje 10, H y muro SA, viga eje 2,3, columna E2, Pantalla P y Foso Ascensor
4. Evacuacion de agua de manera manual y mecanicamente

Firma Res:
Firma Interventoria:

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENESUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRAFICO

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022


	
ESTADO DE ENTREGA DE PREDIO (09/09/2022)	ESTADO ACTUAL DEL PREDIO (30/11/2022)

MARTES 1 DE NOVIEMBRE	
	
FUNDIDA DE ZAPATAS EJES C-2, E-2, F-2, I-1	

MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE	
	
FUNDIDA DE VIGAS A-1, A-2, A-3, A, B, C, D, E	

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE	
	
DESENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION	

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE	
	
ARMADO Y AMARRE DE VIGAS EJE 2, H, G, 3	

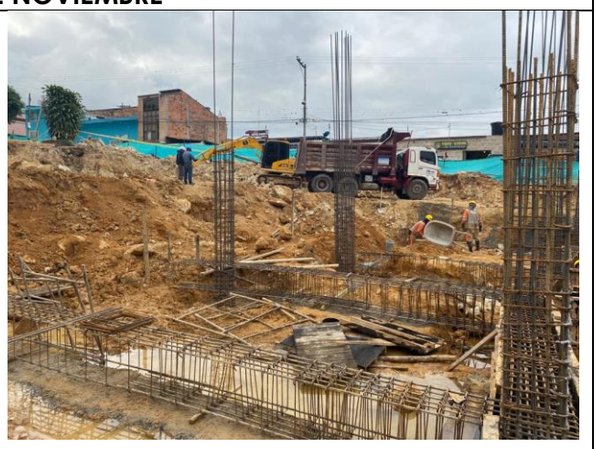SABADO 5 DE NOVIEMBRE	
	
FUNDIDA DE ZAPATASS I-8, H-8, H-8	


MARTES 8 DE NOVIEMBRE	
	
EVACUACION DE AGUA DE MANERA MANUALY MECANICA, AMARRE DE VIGAS EJE G, H, 2, 8, ARMADO Y AMARRE DE COLUMNAS I-8, I-2, H-8,G-8	

MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE	
	
FUNDICION DE ZAPATAS I-2, H-2, G-2, G-8	TESTEREO DE VIGAS


JUEVES 10 DE NOVIEMBRE	
	
EVACIACION DE AGUA DE MANERA MANUAL Y MECANICA	

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE	
	
TESTEREO VIGAS	FUNDIDA CONCRETO DE SOLADO ZARPAS

SABADO 12 DE NOVIEMBRE	
	
ARMADO MURO Y ZARPA 4, 4-B	ARMADO Y AMARRE VIGAS 8, 6-H, H, I

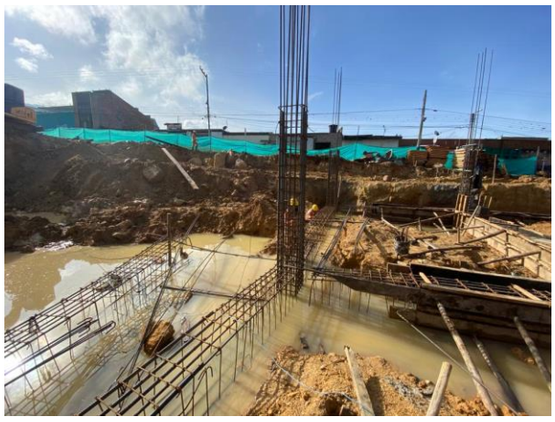MARTES 15 DE NOVIEMBRE	
	
EVACUACION DE AGUA DE MANERA MANUAL Y MECANICA	

MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE	
	
ARMADO Y AMARRE VIGAS EJE3	ARMADO Y AMARRE MURO 4-B, 4-C Y VIGA G-1

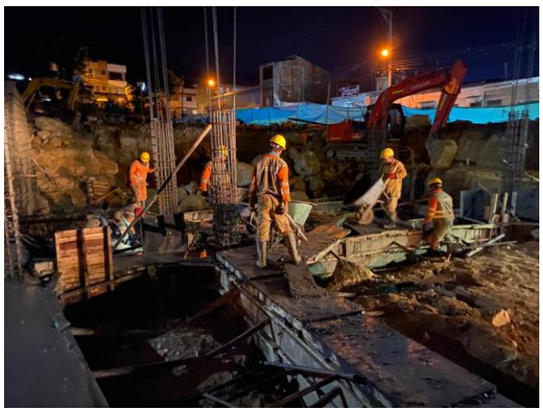JUEVES 17 DE NOVIEMBRE	
	
FUNDIDA DE VIGAS DE CIMENTACION	

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE	
	
CONEXIÓN DE RED SANITARIA CON ALCANTARILLADO MUNICIPAL	EXCAVACION RETIRO DE MATERIAL PARA TUBERIA SANITARIA

SABADO 19 DE NOVIEMBRE	
	
FUNDIDA ZARPA DE MURO 4	

LUNES 21 DE NOVIEMBRE	
	
ARMADO DE CAJAS DE INSPECCION	

MARTES 22 DE NOVIEMBRE	
	
ARMADO CAJAS DE INSPECCION	ARMADO Y AMARRE ACEROS EJE 8

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE	
	
ARMADO CAJAS DE INSPECCION	FUNDIDA DE CONCRETO DE SOLADO ZARPA MURO 5ª, 5B, 5C

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE	
	
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DE LA OBRA	EXCAVACION PARA REDES SANITARIAS

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE	
	
ARMADO Y AMARRE COLUMNAS EJE I-9, VIGAS EJES I, C, 9, 10	EXCAVACION PARA ZARPA Y MURO 5

SABADO 26 DE NOVIEMBRE	
	
COMPACTAR MATERIAL DE RELLENO CIMENTACION	

LUNES 28 DE NOVIEMBRE	
	
FUNDIDA DE ZAPATAS	

MARTES 29 DE NOVIEMBRE	
	
AMARRE ZARPA MURO 5 A	

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE	
	
RUPTURA DE PIEDRA PARA ACOPIO	

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 4 CERTIFICADOS DE ACEROS, REDES SANITARIAS Y CONCRETOS

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CERTIFICADOS DE ACEROS

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900.094.102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 6 Mosquera


REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FCH201 — Fecha Rev:18-12-17 — Version: 1

Fecha de Emision : 15/09/2022
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	6669M-I
Referencia de Malla	XX-131
Diámetro de Grafil Long:	5,0
Diamentro de Grafil Transv:	5,0
Fecha de Producción de la Malla	15/09/2022
Fecha de recepcion de muestra	15/09/2022
Fecha de Ensayo	15/09/2022

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA		
N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	9.466	SOLDADURA
2	9.747	SOLDADURA
3	4.956	SOLDADURA
4	6.634	SOLDADURA
5		
Promedio	7.701	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 8.5	2.381	
CUMPLE (SI/NO)	SI	

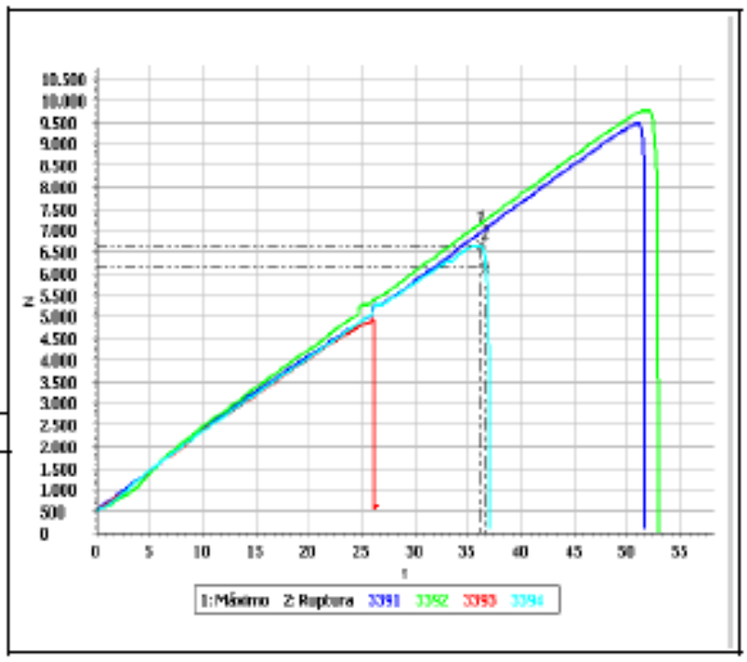

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)			
TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	15	15	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)			
TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.982	6.000	SI
Transversales	2.343	2.360	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°11)			
	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	150	150	SI
Transversales	151	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)				
TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	80	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Transversales	57	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	19,7	Humedad Relativa promedio (%HR)	57,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

Realizó: Freddy Rodriguez
LABORATORISTA
Ing. Freddy Rodriguez

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900.094.102 Aprobar
JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,054,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 6 Mosquera


REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FCH201 Fecha Rev:18-12-17 Version: 1

Fecha de Emision : 14/09/2022
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	8648-I
Referencia de Malla	XX-131
Diámetro de Grafil Long:	5,0
Diamentro de Grafil Transv:	5,0
Fecha de Producción de la Malla	14/09/2022
Fecha de recepcion de muestra	14/09/2022
Fecha de Ensayo	14/09/2022

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA		
N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	5.406	SOLDADURA
2	6.478	SOLDADURA
3	5.643	SOLDADURA
4	8.242	SOLDADURA
5		
Promedio	6.443	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 6.5	2.361	
CUMPLE (SI/NO)	SI	

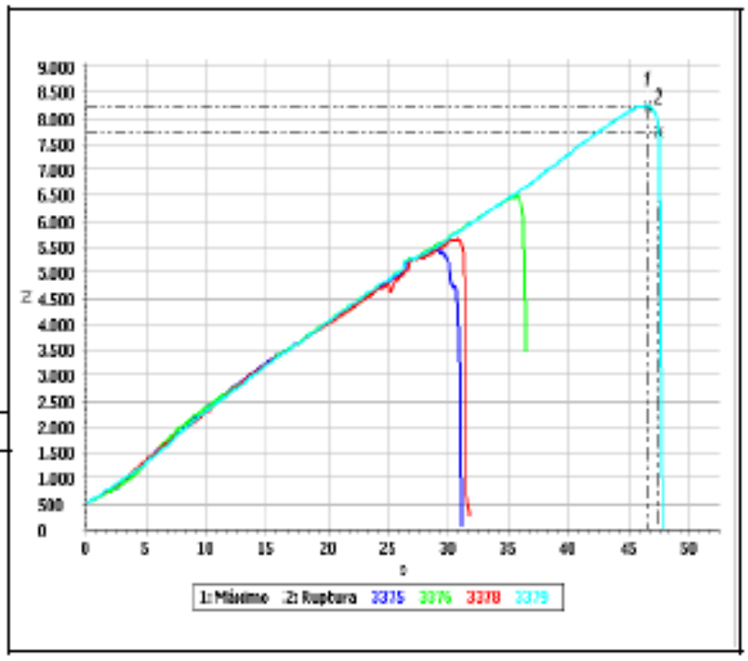

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)			
TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	15	15	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)			
TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.980	6.000	SI
Transversales	2.339	2.360	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°11)			
	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	152	150	SI
Transversales	152	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)				
TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	70	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±10mm)
Transversales	55	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±10mm)

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	19,5	Humedad Relativa promedio (%HR)	58,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

Realizó
Freddy Rodriguez
LABORATORISTA
Ing. Freddy Rodriguez

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900.054.102 Aprueba:
JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera
FO1201

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Resolución 3377 de 2015 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

Fecha Rev: 18-12-17 Versión 1


Fecha Emisión Certificado 14/10/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	10934-1
Diametro de Grafil (mm)	5,0
Lote	T-1207
Fecha de Fabricación	26/09/2022
Fecha de recepcion de la muestra	26/09/2022
Fecha de Ensayo	26/09/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

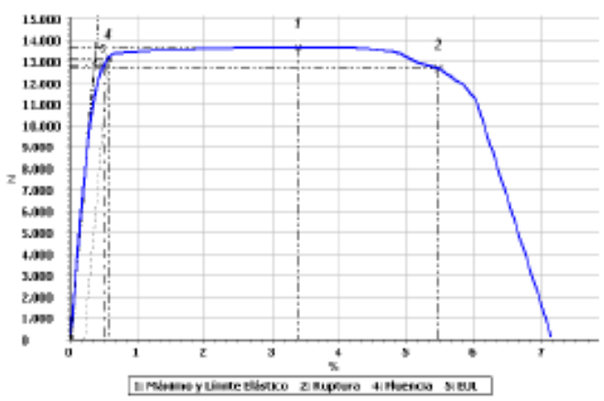

Condiciones ambientales de los ensayos			
Temperatura promedio °C	20,1	Humedad relativa (HR%)	41,0

DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	5,0	5,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	154	145,70	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,20	0,39	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,48	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	696,3	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	650,9	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	148	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Ing. Johan Palacios	Ing.Sebastian Olave	Ing.Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera
FQ1201

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC 5806 Alambre de acero grafilado y nervado electrosoldado con grafil.

Resolución 0377 de 2013 Alambre de acero grafilado y nervado electrosoldado con grafil.

Fecha Rev: 15-12-17 Versión 1


Fecha Emisión Certificado 14/09/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1156M-1
Diametro de Grafil (mm)	5,0
Lote	T-1194
Fecha de Fabricación	14/09/2022
Fecha de recepcion de la muestra	14/09/2022
Fecha de Ensayo	14/09/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

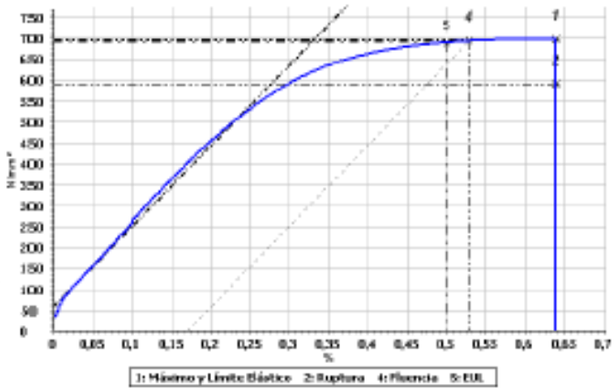

Condiciones ambientales de los ensayos					
Temperatura promedio °C	19,7	Humedad relativa (HR%)		61,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	5,0	5,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	154	146,70	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,20	0,30	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,48	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	696	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	650,1	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	153	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

Realiza:
FREDDY RODRIGUEZ
LABORATORISTA
Ing. Freddy Rodriguez

Revisa:
CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

Aprueba:
AM FERRETERÍA
JEFE DE CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 8 Mosquera


REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FOR201 | Fecha Rev:18-12-17 | Version: 1

Fecha de Emision : 10/10/2022
Cliente:

Decoripcion de la muestra	
N° de Ensayo	691M-1
Referencia de Malla	XX-131
Diámetro de Grafil Long:	5,0
Diamentro de Grafil Transv:	5,0
Fecha de Producción de la Malla	10/10/2022
Fecha de recepcion de muestra	10/10/2022
Fecha de Ensayo	10/10/2022

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA		
N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	6.312	SOLDADURA
2	5.256	SOLDADURA
3	3.568	SOLDADURA
4	7.834	SOLDADURA
5		
Promedio	6.250	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 9.3	2.361	
CUMPLE (SI/NO)	SI	

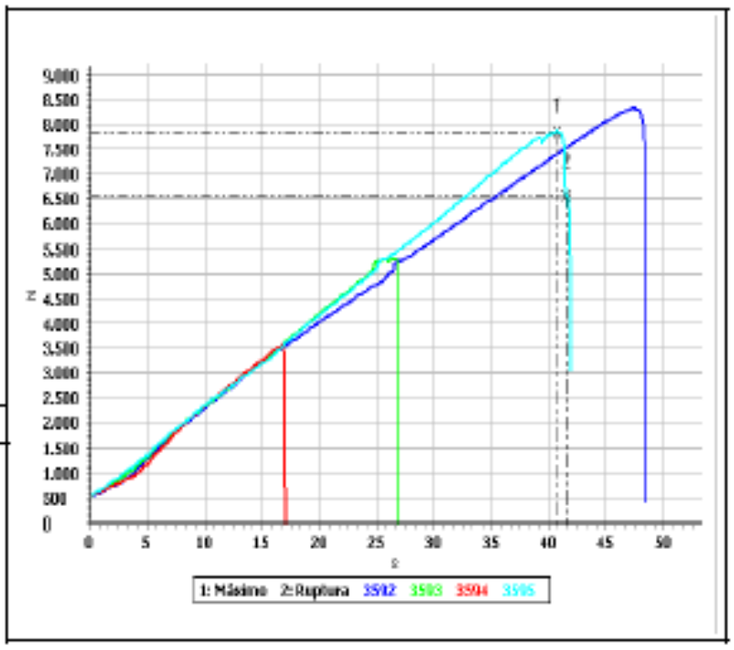

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)			
TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)			
TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.980	6.000	SI
Transversales	2.340	2.360	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°11)			
	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	150	150	SI
Transversales	151	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)				
TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	86	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Transversales	62	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	16,0	Humedad Relativa promedio (%HR)	69,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900.034.102 Aprueba:

Realizó: Freddy Rodriguez
LABORATORISTA
Ing. Freddy Rodriguez

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900.034.102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Resolución 0377 de 2015 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

FO1201 | Fecha Rev: 15-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 16/09/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1053M-1
Diametro de Grafil (mm)	5,0
Lote	T-1193
Fecha de Fabricación	13/09/2022
Fecha de recepcion de la muestra	13/09/2022
Fecha de Ensayo	13/09/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

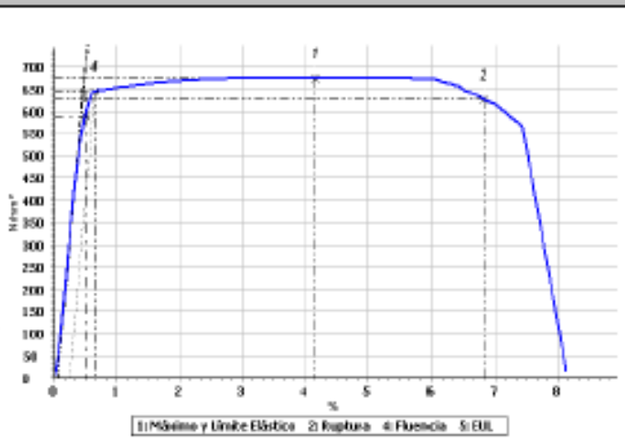

Condiciones ambientales de los ensayos					
Temperatura promedio °C	19,7	Humedad relativa (HR%)		68,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	5,0	5,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	154	145,20	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,20	0,34	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,48	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	674,7	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	588,1	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	148	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AMFERRETERÍA

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
Freddy Rodriguez		
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Ing. Freddy Rodriguez	Ing.Sebastian Olave	Ing.Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera
FQ1201

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y nervio electrosoldado con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y nervio electrosoldado con grafil.

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

Fecha Rev: 18-12-17 Versión 1


Fecha Emisión Certificado 14/10/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1089M-1
Diametro de Grafil (mm)	5,0
Lote	T-1206
Fecha de Fabricación	24/09/2022
Fecha de recepcion de la muestra	24/09/2022
Fecha de Ensayo	24/09/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

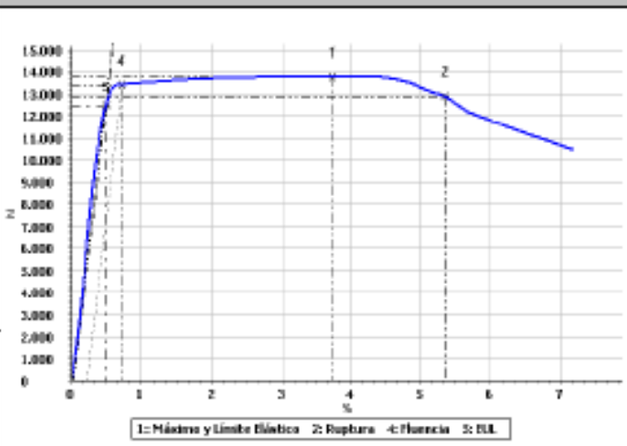

Condiciones ambientales de los ensayos					
Temperatura promedio °C	17,2	Humedad relativa (HR%)		69,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	5,0	5,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	154	145,72	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,20	0,37	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,48	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	701,4	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	635,1	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	141	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Ing. Johan Palacios	Ing.Sebastian Olave	Ing.Sebastian Olave

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900.034.102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Resolución 3277 de 2015 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

FQ1201 | Fecha Rev: 15-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 27/09/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	10976M-1
Diametro de Grafil (mm)	5,0
Lote	T-1208
Fecha de Fabricación	27/09/2022
Fecha de recepcion de la muestra	27/09/2022
Fecha de Ensayo	27/09/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

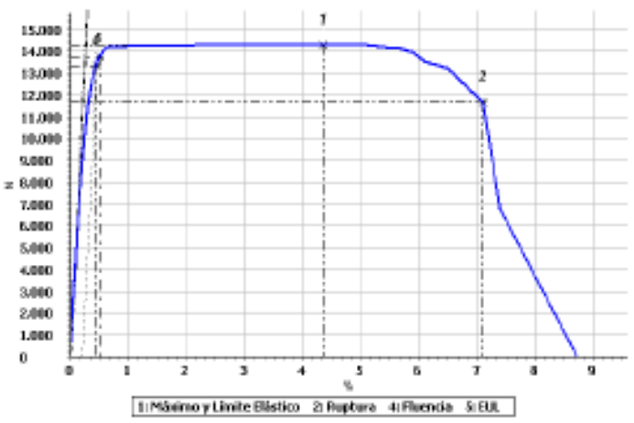

Condiciones ambientales de los ensayos			
Temperatura promedio °C	16,9	Humedad relativa (HR%)	58,0

DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	5,0	5,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	154	146,30	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,20	0,38	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,48	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	728,2	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	700,7	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	142	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
Freddy Rodriguez		
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Ing. Freddy Rodriguez	Ing.Sebastian Olave	Ing.Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900.694.103
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 6 Mosquera

REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada


FOR001 Fecha Rev:19-12-17 Versión: 1

Fecha de Emision : 30/08/2022
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	8548M-1
Referencia de Malla	XX-084
Diámetro de Grafil Long:	4,0
Diámetro de Grafil Transv:	4,0
Fecha de Producción de la Malla	30/08/2022
Fecha de recepcion de muestra	30/08/2022
Fecha de Ensayo	30/08/2022

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA

N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	5.488	GRAFIL
2	2.467	SOLDADURA
3	3.367	SOLDADURA
4	3.975	SOLDADURA
5		
Promedio	4.074	
Requisito de Norma NTC 5806 Nº 8.5	1.524	
CUMPLE (SI/NO)	SI	

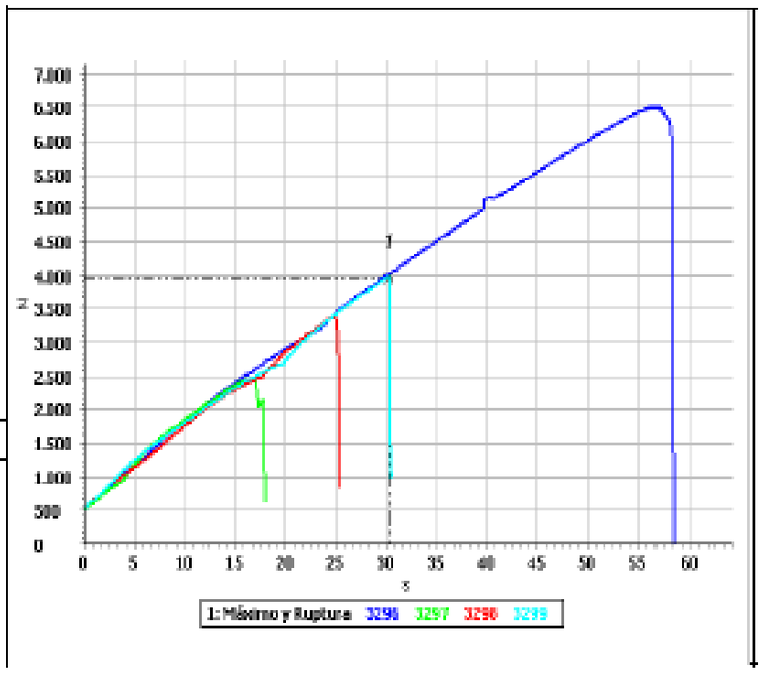

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)

TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)

TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.979	6.000	SI
Transversales	2.341	2.350	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°11)

	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	152	150	SI
Transversales	151	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)

TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	80	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Transversales	54	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales

Temperatura promedio °C	18,3	Humedad Relativa promedio (%HR)	65,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

Realizó: Freddy Rodriguez
LABORATORISTA
Ing. Freddy Rodriguez

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT. 900.694.103 Aprueba
JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AMFERRETERÍA
ANDRÉS PARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC 5806 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Resolución 2277 de 2015 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

FO1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 29/09/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1022M
Diametro de Grafil (mm)	4,0
Lote	T-1150
Fecha de Fabricación	17/08/2022
Fecha de recepcion de la muestra	17/08/2022
Fecha de Ensayo	17/08/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

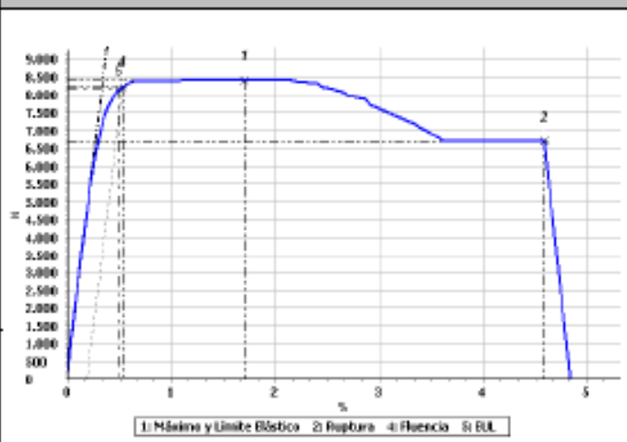

Condiciones ambientales de los ensayos					
Temperatura promedio °C	16,2	Humedad relativa (HR%)		62,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	4,0	4,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	99	93,90	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,16	0,34	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,21	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	35	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	670,1	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	648,8	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	149	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
Freddy Rodriguez		AMFERRETERÍA
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Ing. Freddy Rodriguez	Ing.Sebastian Olave	Ing.Sebastian Olave

AMFERRETERÍA
ANDRÉS PARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900.034.102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera
FO1201

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC 5806 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Fecha Rev: 15-12-17 Versión 1


Fecha Emisión Certificado 06/09/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1041M
Diametro de Grafil (mm)	4,0
Lote	RT-644
Fecha de Fabricación	06/09/2022
Fecha de recepcion de la muestra	06/09/2022
Fecha de Ensayo	06/09/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

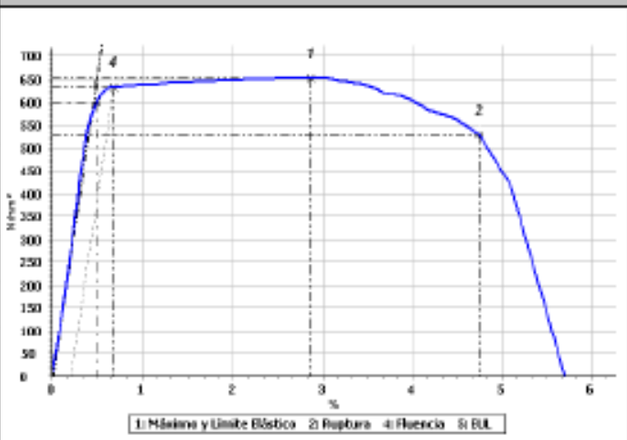

Condiciones ambientales de los ensayos			
Temperatura promedio °C	19,7	Humedad relativa (HR%)	51,0

DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	4,0	4,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	99	93,70	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,16	0,38	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,21	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	652,8	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	598	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	162	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AMFERRETERÍA

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
FREDDY RODRIGUEZ		
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Ing. Freddy Rodriguez	Ing.Sebastian Olave	Ing.Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900.894.102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 8 Mosquera


REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FOR201 — Fecha Rev:18-12-17 — Versión: 1

Fecha de Emision : 26/10/2022
Cliente:

Decripcion de la muestra	
N° de Ensayo	9108-I
Referencia de Malla	XX-084
Diámetro de Grafil Long:	4,0
Diametro de Grafil Transv:	4,0
Fecha de Producción de la Malla	25/10/2022
Fecha de recepcion de muestra	25/10/2022
Fecha de Ensayo	25/10/2022

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA		
N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	1.825	SOLDADURA
2	5.378	SOLDADURA
3	5.191	GRAFIL
4	3.068	SOLDADURA
5		
Promedio	3.870	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 9.5	1.524	
CUMPLE (SI/NO)	SI	

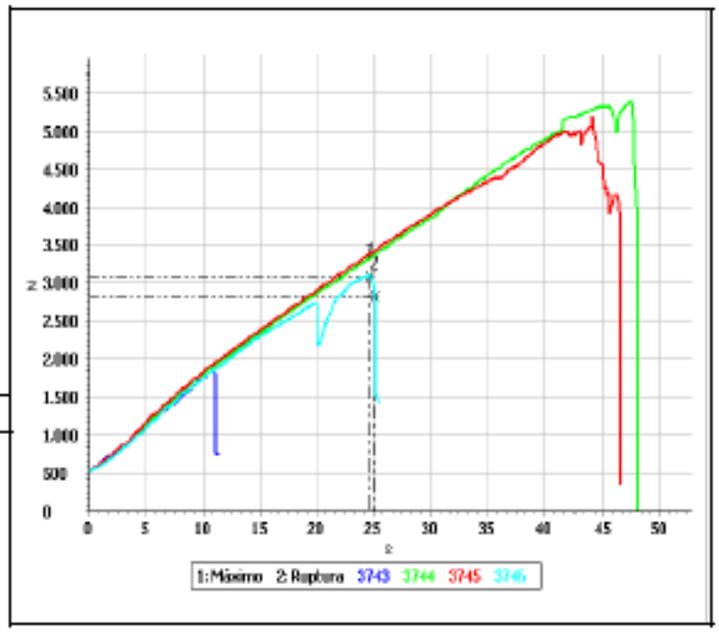

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)			
TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)			
TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.982	6.000	SI
Transversales	2.339	2.350	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°11)			
	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	152	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)				
TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	79	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Transversales	37	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales:			
Temperatura promedio °C	18,2	Humedad Relativa promedio (%HR)	57,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

Realizó — **LABORATORISTA** — **Ing. Johan Palacios**

Revisó — **CALIDAD** — **Ing. Sebastian Olave**

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900.894.102 Aprobado

JEFE DE CALIDAD — **Ing. Sebastian Olave**

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900.034.102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 5 Bodega 5 Mosquera
FQ1201

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y nudos electrosoldados con grafil.

Fecha Rev: 18-12-17 Versión 1


Fecha Emisión Certificado 05/09/2022

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1039M
Diametro de Grafil (mm)	4,0
Lote	RT-643
Fecha de Fabricación	05/09/2022
Fecha de recepcion de la muestra	05/09/2022
Fecha de Ensayo	05/09/2022
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

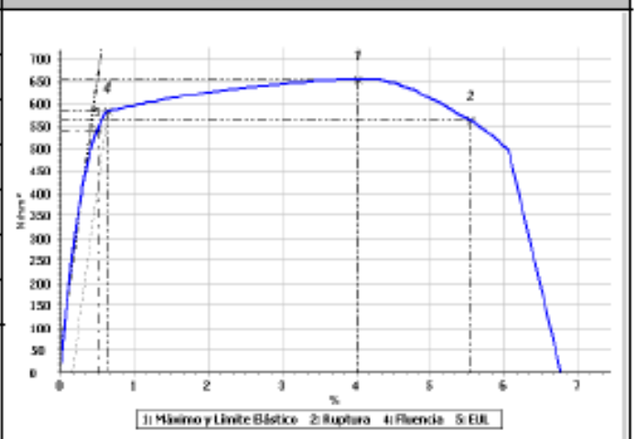

Condiciones ambientales de los ensayos			
Temperatura promedio °C	19,5	Humedad relativa (HR%)	59,0

DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	4,0	4,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	99	94,20	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,16	0,36	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,21	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Min 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	654,1	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	542,4	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	151	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA

Realiza:	Revisa:	Aprueba:
Freddy Rodriguez		
LABORATORISTA	**CALIDAD**	**JEFE DE CALIDAD**
Ing. Freddy Rodriguez	Ing.Sebastian Olave	Ing.Sebastian Olave

CALLE 24 N° 51-40 SALITRE ORIENTAL LOCALIDAD TEUSAQUILLO OFICINA 316, BOGOTA – CUNDINAMARCA TEL: 601-4673735
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@ESTUDIOS.COM.CO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1958:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 042377

FECHA: DD/MM/AA
11/11/2022

CLIENTE	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA
		VEHÍCULO No.	ZAP 585

PEDIDO No.	19378
REMISIÓN No.	19371
FACTURA No.	59536

						ENSAYOS FÍSICOS				COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												DIMENSIONES DE PROCESO			
						ENSAYOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO DE VENAS (mm)
R - No. 4	12	20223451	6	3024	✓	482.4	626.2	15.4	1.30	0.25	1.15	0.0115	0.037	0.20	0.28	0.11	0.10	0.035	0.00040	0.0014	0.46	0.976	0.800	8.500	2.040
		20223453	6		✓	480.6	614.2	16.4	1.28	0.25	1.18	0.01	0.029	0.18	0.20	0.08	0.07	0.028	0.00020	0.0012	0.46	0.973	0.860	8.500	2.050
		20223550	2		✓	478.0	608.6	15.6	1.27	0.25	1.16	0.0097	0.039	0.20	0.25	0.08	0.07	0.022	0.00023	0.0015	0.46	0.963	0.940	8.540	1.470
		20223552	4		✓	481.4	615.0	17.2	1.28	0.26	1.18	0.0109	0.029	0.20	0.24	0.07	0.08	0.017	0.00020	0.0015	0.47	0.986	1.080	8.590	1.920
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

02/08/2021 Ver. 02 CCA-FOR-013

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

PazdelRio

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 20.10.2022
HORA: 20:18:38
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORRU N.3.9R NTC 2289
CLIENTE: FERRET ANDRES MARTINEZ-FIGURADO

REPORTE: *60318
PLACA: WC0976

ORDEN DE ENTREGA: 8090523784

Análisis Químico y Propiedades Físicas Garantizadas

Propiedad:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	%V	%Ceq	Ru(MPa)	Fl (MPa)	Al(%)	Doblado	N/metro	Espa.Rel	Altura Nervio mm
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								555,40	426,60	14,96		526		0,38
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,60							0,550		560,00				6,65	

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%Nb	%V	%Ceq	Ru(MPa)	Fl (MPa)	Al(%)	Doblado	N/metro	Espa.Rel	Altura Nervio mm
654362-22	26.039,40	0,28	1,01	0,013	0,017	0,17	0,045	0,025	0,015	0,021	0,008	0,020	0,465	590,61	498,57	15,74	8	556	6,30	0,52
654354-22	13.224,60	0,27	1,01	0,017	0,026	0,18	0,044	0,030	0,016	0,041	0,005	0,022	0,448	631,03	566,41	16,40	8	560	6,10	0,50

Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.

Km 6 Vía Nobsa - Belencito
Planta Industrial
Nobsa - Boyacá
Tel: +57 (8) 7730200
Ext: 6848

Firma Autorizada: ING PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos

Firma Autorizada vigente a partir de: 11.03.2022

CALLE 24 N° 51-40 SALITRE ORIENTAL LOCALIDAD TEUSAQUILLO OFICINA 316, BOGOTA – CUNDINAMARCA TEL: 601-4673735
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@ESTUDIOS.COM.CO

GSR **GRUPO SIDERÚRGICO REYNA**
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1858:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 040133

FECHA: DD/MM/AA
08/09/202

CLIENTE	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA
		VEHÍCULO No.	JUZ 038

PEDIDO No.	18112
REMISIÓN No.	18096
FACTURA No.	55630

						ENSAYOS FÍSICOS				COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												DIMENSIONES DE PROCESO			
						ENSAYOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	D/DBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO METRO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO (mm)	ANCHO DE VENAS (mm)
R - No. 7	12	20222435	17	1008	✓	477.0	624.0	13.6	1.31	0.26	1.05	0.0097	0.035	0.18	0.18	0.07	0.11	0.021	0.00020	0.0022	0.45	2.925	1.580	14.970	3.360
		20222437	1		✓	511.6	648.8	13.0	1.27	0.25	1.03	0.0092	0.036	0.17	0.20	0.09	0.22	0.021	0.00037	0.0024	0.45	2.936	1.370	14.930	2.870
ESPECIFICACIONES DE NORMA																									
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Max: 8.5

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

02/08/2021 Ver. 02 CCA-FOR-013

CERTIFICADOS DE REDES SANITARIAS





(https://api.whatsapp.com/send?phone=573229439459)

(files/productos/Construccion/Conduit/Conduit-flexible-rollos-x-50m.jpg)

« regresar (JavaScript:void(history.back(-1)))

CONDUIT FLEXIBLE ROLLOS X 50 M.

Conduit flexible rollos x 50 m. de Celta, la mejor elección para su proyecto de construcción.

Este producto de Celta cuenta con garantía del Sello de Calidad ICONTEC NTC 979 y la certificación ICONTEC - RETIE, cumple con la norma ANSI/UL 651. Certificado No.CSC-0002-3 CELTA S.A.S. Plásticos,Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC) para alojar y proteges conductores eléctricos y cableado telefónico. Certificado No.CSR-CER605026 Resolución No.90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 Cap. 3, Art. 20.6 y 20.6.1.1 NTC 979 (2006). Certificado No.CSR-CER605150 Resolución No.90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 Cap. 3, Art. 20.5.1.

¿Desea cotizar Conduit flexible rollos x 50 m. para su proyecto? Haga clic en https://celta.com.co/aliados y consulte con nuestros Mayoristas Aliados más cercanos; con el asesor comercial de la zona o la gerencia comercial en https://celta.com.co/contacto

COLOR VERDE						
REFERENCIA	Diámetro nominal		Diámetro exterior promedio		Diámetro interior promedio	
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
2900122	1/2	21	0,838	21,240	0,84	17,19
2900123	3/4	26	1,050	26,670	0,81	20,47
2900181	1	33	1,315	33,400	1,04	26,40

CONSTRUCCIÓN

Tubería Presión (Construccion/Tuberia-Presion/Accesorios-Presion-Sch-40)





(https://api.whatsapp.com/send?phone=573229439459)

(files/productos/Construccion/Accesorios_Presi_n_SCH40/Ventilacion_tramos_6m..jpg)

« regresar [JavaScript:void(history.back(-1))]

VENTILACIÓN TRAMOS DE 6 M.

Somos los mejores aliados en su proyecto. Ofrecemos Ventilación tramos de 6 m. Este producto cuenta con garantía del Sello de Calidad ICONTEC NTC 1087 y el Certificado No.CSC-0002-2 Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016).

¿Desea cotizar Ventilación tramos de 6 m? Haga clic en https://celta.com.co/aliados y consulte con nuestros Mayoristas Aliados más cercanos; con el asesor comercial de la zona o la gerencia comercial en https://celta.com.co/contacto



COLOR NARANJA						
REFERENCIA	Diámetro nominal		Diámetro exterior		Espesor de pared	
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
2900339	1-1/2	48	1,900	48,26	0,060	1,52
2900342	2	60	2,375	60,32	0,070	1,78
2900345	3	82	3,250	82,55	0,070	1,78
2900348	4	114	4,500	114,30	0,083	2,10


CONSTRUCCIÓN

Tubería Presión (Construccion/Tuberia-Presion/Accesorios-Presion-Sch-40)

Tubería Sanitaria (Construccion/Tuberia-Sanitaria/Accesorios-Sanitaria)

Tubería Ventilación (Construccion/Tuberia-Ventilacion)



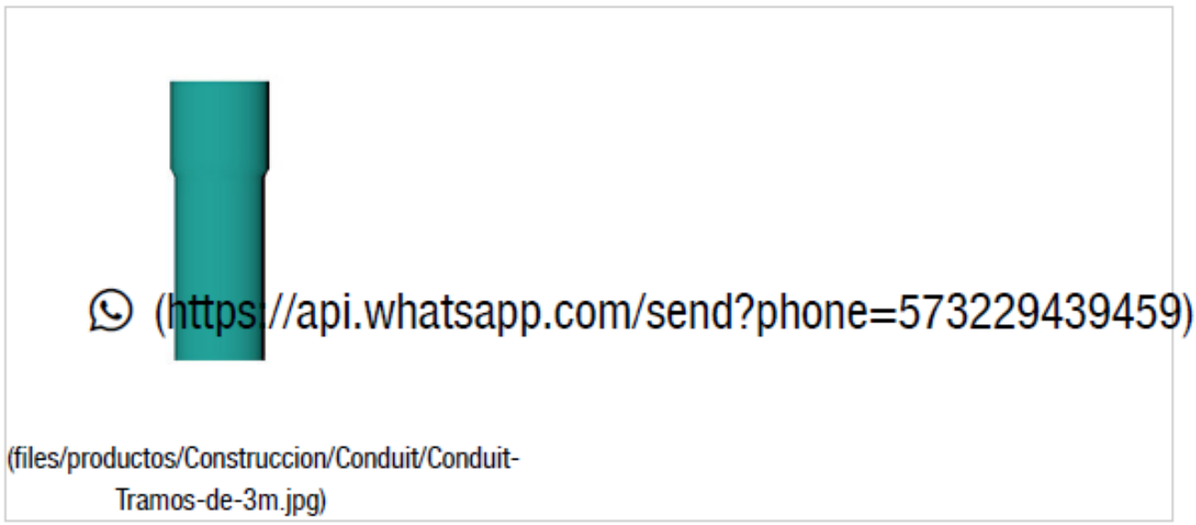


« regresar [JavaScript:void(history.back(-1))]

CONDUIT TRAMOS DE 3 M.

Ofrecemos el más amplio portafolio de tuberías y accesorios en PVC y CPVC para instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. La nueva oferta para el sector incluye la tubería para ductos eléctricos y telefónicos, con mayor resistencia física y mecánica, Duraconduit SCH 40.

La calidad y el buen precio los reúne nuestra Línea Azul, tuberías fabricadas bajo las normas técnicas Celta NTIC 0102 NTIC 0202 que garantizan resistencia al impacto, aplastamiento transversal, longitud y materia prima igual a la convencional.

La línea completa incluye:
Tuberías y accesorios presión, sanitaria, ventilación, eléctrica y para agua cliente.



COLOR VERDE						
REFERENCIA	Diámetro nominal		Diámetro exterior		Espesor de pared	
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
2900124	1-1/2	21	0,840	21,34	0,060	1,52
2900130	3/4	29	1,050	26,67	0,060	1,52
2900126	1	33	1,315	33,40	0,060	1,52
2900131	1-1/4	42	1,660	42,16	0,070	1,78
2900129	1-1/2	49	1,900	48,26	0,080	2,03
2900136	2	60	2,375	60,32	0,100	2,54

CONSTRUCCIÓN

Tubería Presión (Construccion/Tuberia-Presion/Accesorios-Presion-Sch-40)





(https://api.whatsapp.com/send?phone=573229439459)

(files/productos/Construccion/Tuberia-Sanitaria-Tramos-de-6m.jpg)

« regresar [JavaScript:void(history.back(-1))]

TUBERÍA SANITARIA

En Celta usted encuentra el más amplio catálogo de tuberías y accesorios para proyectos de construcción. Productos fabricados bajo los más estrictos estándares de calidad, con el cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas y amparados por las certificaciones de sellos de calidad que así lo avalan. Estos productos cuentan con Certificado No.CSC-0002-2 CELTA S.A.S. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Además cuentan con la garantía del Sello de Calidad ICONTEC NTC 1087 y del Reglamento Técnico Resolución 0501 del 2017. La línea completa incluye tuberías y accesorios sanitarios. ¿Desea cotizar la línea de Tubería Sanitaria Celta? Haga clic en https://celta.com.co/aliados (https://celta.com.co/aliados) y consulte con nuestros Mayoristas Aliados más cercanos; con el asesor comercial de la zona o la gerencia comercial en https://celta.com.co/contacto (https://celta.com.co/contacto)

Tubería Sanitaria de 8" y 10"

Color amarillo

Referencia	Diámetro nominal		Diámetro exterior		Espesor pared	
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
2900320	1 1/2	48	1.900	48.26	0.110	2.79
2900324	2	60	2.375	60.32	0.115	2.92
2900327	3	82	3.250	82.56	0.125	3.18
2900332	4	114	4.500	114.30	0.130	3.30
2900337	6	168	6.625	168.28	0.162	4.12
2909295	8	219	8.625	219.08	0.21	5.33
2909296	10	273	10.750	273.05	0.26	6.66

CONSTRUCCIÓN



(https://api.whatsapp.com/send?phone=573229439459)

(files/productos/Construccion/Tuberia-presion.png)

« regresar [JavaScript:void(history.back(-1))]

TUBERÍA PRESIÓN

En Celta ofrecemos el más amplio portafolio de tuberías y accesorios para su proyecto. Estos productos cuentan con garantía del Sello de Calidad ICONTEC NTC 382 y del reglamento Técnico Resolución 0501 del 2017 y cumplen con la norma ASTM D 2241. Certificado No.CSC-0002-1 CELTA S.A.S. Plásticos, Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE) NTC 382 (2011).

La línea completa incluye: tuberías y accesorios presión, sanitaria, ventilación, eléctrica y para agua caliente.

¿Desea cotizar la línea de Tubería Presión Celta? Haga clic en https://celta.com.co/aliados (https://celta.com.co/aliados) y consulte con nuestros Mayoristas Aliados más cercanos; con el asesor comercial de la zona o la gerencia comercial en https://celta.com.co/contacto (https://celta.com.co/contacto)









CERTIFICADOS DE CONCRETO

PRUEBAS MES DE OCTUBRE

CALLE 24 N° 51-40 SALITRE ORIENTAL LOCALIDAD TEUSAQUILLO OFICINA 316, BOGOTA – CUNDINAMARCA TEL: 601-4673735
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@ESTUDIOS.COM.CO

PRUEBAS GEOTECNICAS

CILINDROS DE CONCRETO - INFORME

CODIGO:	LB-PR-01-FT-06
VERSIÓN:	5
FECHA ELABORACIÓN:	2021-10-02

NORMA DE REFERENCIA NTC 673:2010 - INV E 410:2013

COMPAÑIA	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	LOCALIZACIÓN	FUSAGASUGA
DIRECCIÓN	CALLE 4 # 7 - 75	TELÉFONO	3204328889
CONTACTO	CESAR QUINTERO	INFORME PG N°	193/22
OBRA	CENTRO INTERACTIVO INNOVIA	FECHA INFORME	4/11/2022

CILINDRO N°	LOCALIZACIÓN	FECHA DE TOMA			FECHA DE ROTURA			EDAD DE FALLO	LONGITUD PROMEDIO	DIÁMETRO PROMEDIO	MASA DEL CILINDRO	TIPO DE CONCRETO		ÁREA SECCIÓN TRANSV.	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA NOMINAL	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		RESISTENCIA (%)	DENSIDAD D (kg/m³)	RELACIÓN L/D	TIPO DE FALLA	DEFECTOS DEL ESPÉCIMEN
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍAS	mm	mm	(kg)	N	A	cm²	kgf	kN	kgf/cm²	kgf/cm²	MPa					
1	ZAPAYOS EJES A1 A2 C1	27/10/2022			3/11/2022			7	295,0	160,0	13,512	X	-	201,06	52870	518,5	280	263	25,8	**93,9**	2280	1,84	-	-
2	ZAPAYOS EJES E1 G1H1	27/10/2022			10/11/2022			14	295,0	160,0	13,512	X	-	201,06	55226	541,6	280	275	26,9	**98,1**	2280	1,84		
3	ZAPATOS EJES	27/10/2022			24/11/2022			28	295,0	160,0	13,512	X	-	201,06	61721	605,3	280	307	30,1	**109,6**	2280	1,84		
4	ZAPATOS EJES	1/11/2022			8/11/2022			7	305,0	155,0	13,388	X	-	188,69	41440	406,4	280	220	21,5	**78,4**	2330	1,97		
5	ZAPATOS EJES C2 E 2	1/11/2022			15/11/2022			14	305,0	155,0	13,388	X	-	188,69	53758	527,2	280	285	27,9	**101,7**	2330	1,97		
6	ZAPATOS EJES I1	1/11/2022			29/11/2022			28	305,0	155,0	13,388	X	-	188,69	66381	651,0	280	352	34,5	**125,6**	2330	1,97		
7	VIGAS CIMENTACION	2/11/2022			9/11/2022			7	302,0	159,0	13,607	X	-	198,56	61283	601,0	280	309	30,3	**110,2**	2270	1,90	-	-
8	VIGAS CIMENTACION	2/11/2022			9/11/2022			7	300,0	160,0	13,854	X	-	201,06	59427	582,8	280	296	29,0	**105,6**	2300	1,88	-	-
9	VIGAS CIMENTACION	2/11/2022			16/11/2022			14	303,0	157,0	13,215	X	-	193,59	62853	616,4	280	325	31,8	**116,0**	2250	1,93	-	-
10	VIGAS CIMENTACION	2/11/2022			16/11/2022			14	305,0	153,0	13,155	X	-	183,85	61844	606,5	280	336	33,0	**120,1**	2350	1,99	-	-
11	VIGAS CIMENTACION	2/11/2022			30/11/2022			28	302,0	152,0	12,856	X	-	181,46	60997	598,2	280	336	33,0	**120,1**	2350	1,99		
12	VIGAS CIMENTACION	2/11/2022			30/11/2022			28	302,0	153,0	13,210	X	-	183,85	64026	627,9	280	348	34,2	**124,4**	2380	1,97		
-	-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N: CONCRETO NORMAL A 28 DIAS - **A**: CONCRETO ACELERADO



a) Cónica b) Cónica y dividida c) Cónica y transversal d) Transversal e) Columnar

DEFECTOS DEL ESPECIMEN:
F: FRACTURADO
SD: SUPERFICIES DESNIVELES
FA: FALTA DE ADHERENCIA
EA: ESCASEZ DE AGREGADO
DP: DESPORTILLADO
PV: PRESENTA VACÍOS (POROS)
CO: CONTAMINADO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

OBSERVACIONES	REALIZADO POR	APROBADO POR
	FIRMA	FIRMA
	NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
	CARGO	CARGO

Dirección: Calle 70A #57B-34
Teléfonos: 3206185 - 3504839301
Correos: coordinaciontecnica@pruebas geotecnicas.com
www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
INFORME MENSUAL No. 003
ANEXO 4

VERSIÓN 01
COP-0586-2022













CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 5 OBRAS NO PREVISTAS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022									
Contrato No.	No. 2022- 0586	**Fecha entrega de Acta**					22	11	2022
Objeto	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ								
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio.	**Fecha Acta de inicio**	31	8	2022	**Fecha de Terminación**	30	3	2023
Valor del Contrato	NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.124.368.887,93), M/CTE INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								

1.1. JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES NO PREVISTAS

INP 1	**DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)**	**M2**	2235,60	Se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato. Este capítulo se refiere a los trabajos necesarios para desmontar la cubierta de las zonas de adecuación contempladas en la estructura existente, debido a que, en el área a intervenir, los elementos que componen la unidad, se encuentran en condición de susceptibilidad de caída o rotura y en su efecto, propensa a considerarse como ruina, es necesario su desmonte, acorde las normas de seguridad en alturas y las precauciones que establezca SST, para retirar posteriormente columnas o elementos no estructurales presentes en sitio, que se superponen con la obra proyectada. Debe tenerse en cuenta, que al ser un residuo con fibras de crisotilo, su disposición final está sujeta a las consideraciones especiales emitidas por minambiente. El precio de este ítem corresponde al establecido para Fusagasugá en la lista de precios del ICCU 2022 como ítem 1,34
INP 2	**DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15M**	**M2**	1348,95	Se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial, acorde el desarrollo de las labores de demolición y tras la inspección de las unidades constructivas existentes, se precisa la presencia de muros en mampostería de espesor aparentes de 0.15m que hacen parte de la estructura, considerando la prioridad de demoler las instalaciones actuales para efectos de la ejecución presupuestal, no se tiene soporte que dentro de la programación inicial se haya contemplado el proceso en mención, el cual conlleva emplear recursos, materiales y equipo para su ejecución, adicional se evidencia que la mampostería encontrada no se encuentran bajo las normas técnicas, se evidencia mampostería no confinada y en el proceso de demolición se tiene que evitar accidentes y daños a terceros

INP 3	**DEMOLICION CIELO RASO FALSO**	**M2**	2752,15	No se contempla esta actividad dentro del presupuesto inicial, acorde el desarrollo de las labores de demolición y tras la inspección de las unidades constructivas existentes, se precisa la presencia de elementos de acabados de techo en detalle, un cielo raso "falso", considerando la prioridad de demoler las instalaciones actuales, para efectos de la ejecución presupuestal, no se tiene soporte que dentro del programa se haya contemplado el proceso constructivo en mención, el cual conlleva a emplear recursos, materiales y equipo para su ejecución.
INP 4	**DEMOLICIONES MANUALES DE OBRA DE MADERA ESTRUCTURAL ENTREPISOS, COLUMNAS, VIGAS A CUALQUIER ALTURA INCLUIDO ENCHAPES DE MADERA SIN INTERESAR ESTADO**	**M2**	3236,40	Se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato. Este capítulo se refiere a los trabajos necesarios para desmontar la cubierta de las zonas de adecuación contempladas en la estructura existente. Debido a que, en el área a intervenir, los elementos que componen la unidad, se encuentran en condición de susceptibilidad de caída o rotura y en su efecto, propensa a considerarse como ruina, es necesario su desmonte, acorde las normas de seguridad en alturas y las precauciones que establezca SST, para retirar posteriormente columnas o elementos no estructurales de madera presentes en sitio, que se superponen con la obra proyectada. debe tenerse en cuenta, y es de gran importancia para poder continuar con la demolición de la estructura.
INP 5	**DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.25M**	**M2**	4124,12	Se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial. acorde el desarrollo de las labores de demolición y tras la inspección de las unidades constructivas existentes, se precisa la presencia de muros en mampostería de espesor aparentes de 0.25m que hacen parte de la estructura, considerando la prioridad de demoler las instalaciones actuales para efectos de la ejecución presupuestal, no se tiene soporte que dentro de la programación inicial se haya contemplado el proceso en mención, el cual conlleva emplear recursos, materiales y equipo para su ejecución, adicional se evidencia que la mampostería encontrada no se encuentran bajo las normas técnicas, se evidencia mampostería no confinada y en el proceso de demolición se tiene que evitar accidentes y daños a terceros

INP 6	**DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS**	**M3**	163,46	Se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial. acorde el desarrollo de las labores de demolición y tras la inspección de las unidades constructivas existentes, se precisa la presencia de estructuras en concreto como vigas y columnas que hacen parte de la estructura, considerando la prioridad de demoler las instalaciones actuales para efectos de la ejecución presupuestal, no se tiene soporte que dentro de la programación inicial se haya contemplado el proceso en mención, el cual conlleva emplear recursos, materiales y equipo para su ejecución, adicional se evidencia que la mampostería encontrada no se encuentran bajo las normas técnicas, se evidencia mampostería no confinada y en el proceso de demolición se tiene que evitar accidentes y daños a terceros
INP 7	**DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M**	**M2**	703,55	Se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial, acorde el desarrollo de las labores de demolición y tras la inspección de las unidades constructivas existentes, se precisa la presencia de estructuras en concreto en placas de entrepisos que hacen parte de la estructura de soporte de los módulos existentes , considerando la prioridad de demoler las instalaciones actuales para efectos de la ejecución presupuestal, no se tiene soporte que dentro de la programación inicial se haya contemplado el proceso en mención, el cual conlleva emplear recursos, materiales y equipo para su ejecución, adicional se evidencia que la mampostería encontrada no se encuentran bajo las normas técnicas, se evidencia mampostería no confinada y en el proceso de demolición se tiene que evitar accidentes y daños a terceros
INP 8	**EXCAVACION MANUAL EN ROCA H= 0.0 - 2.0M (SECO SIN EXPLOSIVOS)**	**M3**	61.33	se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial, acorde el desarrollo de las labores de excavaciones manuales ya que el material encontrado en la excavación se evidencia con características distintas de las estipuladas, considerando la prioridad de tener avance en las actividades de cimentación se realiza procesó de excavación para los cimientos (zapatas de cimentación modulo A)

INP 9		**EXCAVAVCIONES VARIAS EN ROCA SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)**	**M3**	1590.32	se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial, acorde el desarrollo de las labores de excavaciones mecánicas ya que el material encontrado en la excavación se evidencia con características distintas de las estipuladas, (se evidencia mucha roca), considerando la prioridad de tener avance en las actividades de excavaciones de cimentación se realiza actividad (cimentación modulo A)
INP 10		**CONCRETO CLASE F, 2000PSI PARA SOLADOS**	**M3**	21.82	se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial, acorde el desarrollo de las labores de fundida o vaciado de concreto, considerando la prioridad y el buen proceso constructivo, para tener avance en las actividades de fundida de elementos estructurales de cimentación se realiza actividad (cimentación modulo A)
INP 11		**MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y FILTRADAS POR NIVEL FREATICO**	**DIA**	38	se requiere esta actividad ya que no se encuentra dentro de las actividades iniciales del contrato y dentro del presupuesto inicial, acorde el desarrollo de las actividades de excavaciones para cimientos de estructura de modulo a considerando la prioridad y el buen proceso constructivo de tener avance en las actividades de excavaciones es necesario el retiro del agua por lluvias y filtraciones por nivel freático.
1.2. JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES MAYORES DEL PROYECTO					
0.2	**ICUU 16,2**	**EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**	**M3**	1266.35	Se evidencia y se generan mayores cantidades, ya que según validación en campo se evidencian mayores cuantías, medidas con topografía.
18.2	**ICCU 1,45**	**RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 5 KM (INCLUYE CARGUE)**	**M3**	2046.05	Se evidencia y se generan mayores cantidades, ya que según validación en campo se evidencian mayores cuantías y mayor volumen del contractual.
1.3. JUSTIFICACIÓN DE CANTIDADES MENORES DEL PROYECTO					
4.0 ARQUITECTURA Y ACABADOS/INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
4.41	**ICCU 11,41**	**REVENTILACION 2"**	**ML**	10500	Se generan menores cantidades, ya que según validación por diseños se evidencian menores cantidades que las contractuales.

PRESUPUESTO DE OBRA FASE II / URBANISMO (PARQUE) FASE II					
9.0 ARQUITECTURA Y ACABADOS/DRENAJES Y SUBDRENAJE AGUA LLUVIA					
9.2	**ICCU 11,41**	**REVENTILACION 2"**	**ML**	9,068.61	Se generan menores cantidades, ya que según validación por diseños se evidencian menores cantidades que las contractuales.
18.1	**ICCU 1,23**	**DEMOLICION PLACA MACIZA 0,25M**	**M2**	784.58	Se generan menores cantidades, ya que según validación y cantidades ejecutadas se evidencian menores cantidades que las contractuales.
8.5	**ICCU 4.22**	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**	**KG**	5448.93	Se generan menores cantidades, ya que según validación y cantidades ejecutadas se evidencian menores cantidades que las contractuales.

ACTA No. 001

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA ACTA**	**PRESENTE**	31	08	2022			

X	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ____		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato No.	No. 2022-0586	**Fecha de Suscripción del Contrato**					21	06	2022
Objeto	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ								
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio.	**Fecha Acta de Inicio**	31	08	2022	**Fecha de Terminación**	30	03	2023
Fecha de Suspensión						**Nueva Fecha de Terminación**			
Valor del Contrato	NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.124.368.887,93), M/CTE INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								
Nombre del Contratista	CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022 Nit No. 901604402-9 R. L. IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA C.C. No. 79.952.890 de Bogotá D.C.								
Supervisor	**ING. OSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE** Secretario de Infraestructura								
Interventor	CONSORCIO INTERVENTORES 2022 NIT: 901.617.378-6 R.L OSCAR EDUARDO PINILLA PINILLA C.C 80.119.150								

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los 31 días del mes de agosto del año 2022, se reunieron en la secretaria de infraestructura, el **ING. OSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE** en calidad de supervisor, el ING. **IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA** con cedula de ciudadanía No. 79.952.890 de Bogotá D.C. representante legal del CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022, en calidad de CONTRATISTA, el **ING. OSCAR EDUARDO PINILLA PINILLA** con cedula de ciudadanía No. 80.119.150, representante legal de CONSORCIO INTERVENTORES 2022 en calidad de Interventor con el fin de dar inicio al contrato cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ". LP 2022-0586.**

Este contrato ya cuenta con aprobación de pólizas y Registro Presupuestales No. No. RES-2022080155 y RES-2022080156 del 17 de agosto del 2022.
No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los 31 días del mes de agosto del año 2022

Firmas		
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**
CONSORCIO INTERVENTORES 2022 OSCAR EDUARDO PINILLA PINILLA	**ING. OSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura**	**CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022 ING. IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA**
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Arq. Oscar Borbón – Profesional Universitario
Revisó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
126193	BOGOTÁ D.C.		11		30	400042873	0
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
22 / 8 / 2022	9 / 8 / 2022	00:00	9 / 3 / 2028	00:00	EXPEDICIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	NIT	901.604.402 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA CALLE 24 NO 51-40 OFC 316, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014672734

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	NIT	901.604.402 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA CALLE 24 NO 51-40 OFC 316, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014672734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	NIT	890.680.008 - 4	TELÉFONO	
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	NIT	890.680.008 - 4	TELÉFONO	

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZA LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO 2022-0586 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ".

SE REALIZA ACLARACION DEL VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULADO DEL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2022-0586 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022. POR EL CUAL SE DEJA COMO NUEVO VALOR DEL CONTRATO 9.124.368.887,93),M CTE.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/08/2022	09/09/2023	1.824.873.777.59	4.949.657,64
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/08/2022	09/03/2026	912.436.888.79	8.174.434,59
ESTABILIDAD DE LA OBRA	09/03/2023	09/03/2028	2.737.310.666.38	34.253.880,74

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO
				Día - Mes - Año
$ 47.377.972,97	$ 13.000,00	$ 9.004.284,86	$ 56.395.257,83	23/08/2022

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 5.474.621.332,76	CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SET

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	4005	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
CVARGAS

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	56.395.258,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
23/08/2022	$ 56.395.257,83

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 22 DE 2022



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400042873, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
NIT : 901.604.402 - 9
Asegurado : MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
NIT : 890.680.008 - 4

Se expide la presente certificación a los 22 días del mes de Agosto de 2022.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
126173	BOGOTÁ D.C.	11		15	400042864	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
19 / 8 / 2022	9 / 8 / 2022	00:00	9 / 3 / 2023	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	NIT	901.604.402 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA CALLE 24 NO 51-40 OFC 316, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014672734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	NIT	901.604.402 - 9	TELÉFONO	6014672734
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	500.000.000,00	500,000,000.00	500.000.000,00	871.232,88
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	500.000.000,00	500,000,000.00	500.000.000,00	0,00
GASTOS MEDICOS	200.000.000,00	200,000,000.00	200.000.000,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	500.000.000,00	500,000,000.00	500.000.000,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	500.000.000,00	500,000,000.00	500.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	500.000.000,00	500,000,000.00	500.000.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO
$ 871.232,88	$ 13.000,00	$ 168.004,25	$ 1.052.237,13	Día - Mes - Año 20/08/2022

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 500.000.000,00	QUINIENTOS MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	4005	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
GCASTRO

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400042864	0	BOGOTÁ D.C.	Día - Mes - Año 19 8 2022	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
9 8 2022	00:00	9 3 2023	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	NIT	901.604.402 - 9
DIRECCIÓN	AVENIDA CALLE 24 NO 51-40 OFC 316, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6014672734

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	NIT	901.604.402 - 9	TELÉFONO	6014672734
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZA LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR LA RESPONSABILDIAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO 2022-0586 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

SE REALIZA ACLARACION DEL VALOR DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULADO DEL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2022-0586 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022. POR EL CUAL SE DEJA COMO NUEVO VALOR DEL CONTRATO 9.124.368.887,93),M CTE.

********** **FIN PÓLIZA** **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400042864

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	1.052.237,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
20/08/2022	$ 1.052.237,13

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 19 DE 2.022

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

CLAUSULADO DEL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2022-0586 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y EL CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022.

Entre los suscritos, **DORIS MARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en Fusagasugá, identificada con la cédula de ciudadanía numero 39.619.464 expedida en Fusagasugá, en calidad de Secretaria de Hacienda en Comisión, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 831del 29 de Diciembre de 2021, según consta en el acta de posesión del 3 de Enero de 2022 y delegada por el Alcalde Municipal mediante Decreto No. 013 del 31 de enero de 2022, el cual rige a partir del 7 de febrerode 2022 "para celebrar contratos estatales de cualquiera de sus modalidades de selección así como los contratos interadministrativos que resulten necesarios para el logro de los objetivos de la entidad", de una parte, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO** y por la otra **SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ,** mayor de edad, identificada con la C.C. No. **52.381.164 de Bogotá D.C**, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022, con NIT No. 901604402-9 ,** quienpara efectos legales del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente Modificación No. 1 al contrato de obra pública No. **2022-0586,** el cual se regirá por las cláusulas que posteriormente se estipulan, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que con fecha 21 de junio de 2022 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 2022-0586, con la señora **SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. **52.381.164 de Bogotá D.C**. representante legal del consorcio **CONSTRUEDIFACIONES 2022,** con Nit No. **901604402-9**, cuyo objeto es "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ". 2)** Que al momento de realizar la corrección aritmética a la propuesta ganadora, por parte del miembro del comité evaluador encargado de la evaluación técnico económica, se cometió un error en el valor de unitario y total de algunos de los ítems del contrato siendo los valores correctos los siguientes :

FEF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ICCU 11,5	*BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"*	*120,00*	*ml*	*$ 37.391,00*	*$ 4.486.920,00*
2,2	*BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO e=3cm PARA ANDÉN*	*12,99*	*m³*	*$ 90.907,00*	*$ 1.180.881,93*
7.13	*JUEGOS TORRE PUENTE CON DESLIZADERO*	*1,00*	*und*	*28.859.403,00*	*$28.859.403,00*

3) Que previa suscripción del acta de inicio por parte de la entidad, se observó que al haberse incluido en el clausulado del contrato, la corrección aritmética errónea realizada a la propuesta económica presentada por el oferente, dicho clausulado presenta error en los valores de algunos ítems, los cuales deben ser corregidos. **4)** Que al realizarse las operaciones aritméticas correctas cambia el valor total de la obra a ejecutar por lo que debe modificarse el valor del contrato. **5)** Que al momento de elaborar el clausulado del contrato se realizó la numeración de los ítems hasta el ítem No. 14, por lo que se debe corregir realizando la numeración de la totalidad de los ítems. **6)** Que en vista de lo anterior se hace necesario modificar varios apartes del clausulado del contrato de obra pública No. 2022 - 0856 en los aspectos a que se ha hecho referencia en la parte considerativa. **7)** Que en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan modificar el contrato en los siguientes términos**:** **CLAUSULA PRIMERA**: MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. N° 2022-0586 suscrito entre el Municipio de Fusagasugá y la señora **SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ,** mayor de edad, identificada con la C.C. No. **52.381.164 de Bogotá D.C**, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO CONSTRUEDIFACIONES 2022, con NIT No. 901604402-9** cuyo objeto **es** "**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ**"., conforme a la parte motiva. **CLAUSULA SEGUNDA**: **MODIFIQUESE LA CLAUSULA NOVENA : DESCRIPCION DE LOS ITEMS A EJECUTAR,** la cual quedara así: CLAUSULA NOVENA: DESCRIPCION DE LOS ITEMS A EJECUTAR: El contratista se compromete a ejecutar la obra en cada uno de los ítems descritos de acuerdo a las unidades de medida, cantidades, precios, y especificaciones técnicas, condiciones requisitos y demás establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario y en los pliegos de condiciones de la Licitación Pública No. 2022-0579 así:

TEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211

		PRELIMINARES				
1	ICUU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	756,33	M2	$ 11.231,00	$ 8.494.342,23
2	ICUU 16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	1.119,13	M3	$ 19.041,00	$ 21.309.354,33
3	ICUU 16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	35,88	M3	$ 21.487,00	$ 770.953,56
		ZAPATAS MÓDULO A - NIVEL -1,00				
4	1,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA NIVELES BAJOS	42,26	m3	$ 595.507,00	$ 25.166.125,82
5	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (ZAPATAS)	1.581,16	kg	$ 8.086,00	$ 12.785.259,76
6	1,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA NIVELES BAJOS	86,50	m3	$ 595.507,00	$ 51.511.355,50
7	1,5	MEJORAMIENTO EN RECEBO CEMENTO PROPORCIÓN 8:1 (RECEBO TIPO B-400) COMPACTADO AL 95% DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO H=0,30m - (ÁREA 720,87m2)	216,26	m³	$ 208.535,00	$ 45.097.779,10
8	1,9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)-NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	720,87	m2	$ 62.155,00	$ 44.805.674,85
		VIGAS DE CIMENTACIÓN				
9	1,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA NIVELES BAJOS	127,85	m3	$ 595.507,00	$ 76.135.569,95
10	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (VIGAS NIVEL +3.50)	16.109,99	kg	$ 8.086,00	$ 130.265.379,14
		COLUMNAS NIVEL -1,0 A +7,40				
11	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	47,84	m3	$ 625.547,00	$ 29.926.168,48
12	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA COLUMNAS)	17.104,44	kg	$ 8.086,00	$ 138.306.501,84
		PANTALLAS				
13	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	39,95	m3	$ 625.547,00	$ 24.990.602,65
14	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PANTALLAS)	12.369,04	kg	$ 8.086,00	$ 100.016.057,44
		ASCENSOR				
15	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	5,82	m3	$ 625.547,00	$ 3.640.683,54
16	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA ASCENSORES FOSO Y PLACA)	416,62	kg	$ 8.086,00	$ 3.368.789,32
17	1,6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	5,76	m2	$ 133.551,00	$ 769.253,76
18	1,9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)-NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	11,52	m2	$ 62.155,00	$ 716.025,60
		MUROS 4, 4A, 4B, 5, 5A,5				
19	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	133,59	m3	$ 625.547,00	$ 83.566.823,73
20	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA MUROS)	10.045,44	kg	$ 8.086,00	$ 81.227.427,84
		PLACA NIVEL +3,50 -MODULO A				
		VIGAS NIVEL +3,50				
21	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	119,06	m3	$ 625.547,00	$ 74.477.625,82
22	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA VIGAS NIVEL +3.50)	16.904,63	kg	$ 8.086,00	$ 136.690.838,18

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

		RIOSTRAS				
23	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	6,63	m3	$ 625.547,00	$ 4.147.376,61
24	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA RIOSTRAS NIVEL +3.50)	379,02	kg	$ 8.086,00	$ 3.064.755,72
		TORTAS NIVEL +3,50				
25	1,3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	8,53	m3	$ 590.732,00	$ 5.038.943,96
26	1,9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)-NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR EINFERIOR)	1.441,74	m2	$ 62.155,00	$ 89.611.349,70
27	1,6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	720,87	m2	$ 133.551,00	$ 96.272.909,37
		ALIGERAMIENTO NIVEL +3,50				
28	1,7	CASETÓN EN ICOPOR DE ALTA DENSIDAD - SECCION VARIABLE - ALTURA 0,39m	53,32	m2	$ 49.908,00	$ 2.661.094,56
		BORDE DE PLACA NIVEL +3,50				
29	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	11,08	m3	$ 625.547,00	$ 6.931.060,76
30	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA BORDE DE PLACA NIVEL +3.50)	906,35	kg	$ 8.086,00	$ 7.328.746,10
		PLACA NIVEL +7,40 -MODULO A				
		VIGAS NIVEL +7,40				
31	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	127,39	m3	$ 625.547,00	$ 79.688.432,33
32	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI (PARA VIGAS NIVEL +7.40)	16.520,38	kg	$ 8.086,00	$ 133.583.792,68
		VIGA CIRCULAR DE CUBIERTA				
33	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	3,93	m3	$ 625.547,00	$ 2.458.399,71
34	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	563,76	kg	$ 8.086,00	$ 4.558.563,36
		RIOSTRAS - NIVEL +7,40				
35	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	6,63	m3	$ 625.547,00	$ 4.147.376,61
36	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	379,03	kg	$ 8.086,00	$ 3.064.836,58
		PLACA ALIGERADA				
37	1,3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	4,37	m3	$ 590.732,00	$ 2.581.498,84
38	1,9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)-NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	55,66	m2	$ 62.155,00	$ 3.459.547,30
39	1,7	CASETON EN ICOPOR DE ALTA DENSIDAD - SECCION VARIABLE - ALTURA 0,39m	27,33	m2	$ 49.908,00	$ 1.363.985,64
		PLACA CON METALDECK				
40	1,3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	45,39	m3	$ 590.732,00	$ 26.813.325,48
41	1,9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)-NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	398,20	m2	$ 62.155,00	$ 24.750.121,00
42	1,6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	398,20	m2	$ 133.551,00	$ 53.180.008,20
		ALIGERAMIENTO NIVEL + 7,40				
43	1,7	CASETÓN EN ICOPOR DE ALTA DENSIDAD - SECCION VARIABLE - ALTURA 0,39m	459,03	m2	$ 49.908,00	$ 22.909.269,24
		MURO DESCOLGADO NIVEL + 7,40				



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

44	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	0,83	m3	$ 625.547,00	$ 519.204,01
45	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	132,09	kg	$ 8.086,00	$ 1.068.079,74
		LUCARNAS (5)				
46	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	18,74	m3	$ 625.547,00	$ 11.722.750,78
47	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	4.055,52	kg	$ 8.086,00	$ 32.792.934,72
		PISO FLOTADO				
48	1,10	PREFABRICADO EN CONCRETO 4000PSI 0,90 X 0,20 X 0,08, (INCLUYE MURETES EN CONCRETO SIMPLE DE 0,05X0,05X0,07)	401,31	m2	$ 86.359,00	$ 34.656.730,29
		IMPERMEABILIZACION				
49	1,11	IMPERMEABILIZACION CON LIMPIEZA Y AJUSTE DE BOMBEOS PENDIENTADO, FIBERGLASS PX900, MANTO DE 3MM, PINTURA BITUMNOSA Y POLIETILENO CALIBRE 6 (GARANTIA DE 10 AÑOS)	401,31	m2	$ 108.646,00	$ 43.600.726,26
		TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
50	1,4	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	46,40	m3	$ 646.295,00	$ 29.988.088,00
51	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	4.918,37	kg	$ 8.086,00	$ 39.769.939,82
52	1,8	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1	28,30	ml	$ 51.230,00	$ 1.449.809,00
53	ICCU 4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	2,30	m3	$ 346.256,00	$ 796.388,80
54	ICCU 16,12	SUBSASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	13,85	m³	$ 186.532,00	$ 2.583.468,20
		CAFÉ TERRAZA				
		COLUMNETAS				
55	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	0,32	m3	$ 625.547,00	$ 200.175,04
56	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	79,36	kg	$ 8.086,00	$ 641.704,96
		VIGAS				
57	1,2	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2) PARA COLUMNAS Y NIVELES INTERMEDIOS	0,61	m3	$ 625.547,00	$ 381.583,67
58	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	87,16	kg	$ 8.086,00	$ 704.775,76
		PLACA				
59	1,3	CONCRETO DE F'c= 4000psi (280kg/m2) PARA TORTAS DIFERENTES NIVELES	1,12	m3	$ 590.732,00	$ 661.619,84
60	1,6	METALDECK GRADO 40-2" CALIBRE 22 (2,40 X2,40), M2	9,92	m2	$ 133.551,00	$ 1.324.825,92
61	1,9	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15 X 15 cm)-NIVEL PLACA SUPERIOR (TORTA SUPERIOR E INFERIOR)	19,84	m2	$ 62.155,00	$ 1.233.155,20
		2. ARQUITECTURA Y ACABADOS				
		2.1 ARQUITECTURA Y ACABADOS MODULO A				
		MUROS				
62	ICCU 5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	5,60	m²	$ 102.345,00	$ 573.132,00
63	ICCU 5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	1.228,63	m²	$ 45.907,00	$ 56.402.717,41
64	ICCU 5,1	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	171,29	ml	$ 34.905,00	$ 5.978.877,45
65	ICCU 5,5	DINTELES CONCRETO 2500 PSI 15X20	359,18	ml	$ 54.215,00	$ 19.472.943,70
		MORTEROS Y PAÑETES				
66	ICCU 8,8	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	20,12	m³	$ 516.272,00	$ 10.387.392,64

67	ICCU 6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	2.457,26	m²	$ 20.327,00	$ 49.948.724,02
68	ICCU 6,3	FILOS Y/O DILATACIONES S/MUROS	195,50	ml	$ 8.092,00	$ 1.581.986,00
		APARATOS SANITARIOS				
69	ICCU 17,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INLCUYE GRIFERIA)	5,00	und	$ 334.483,00	$ 1.672.415,00
70	ICCU 17,2	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA)	15,00	und	$ 978.974,00	$ 14.684.610,00
71	ICCU 17,8	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXÓMETRO INCLUYE GRIFERIA	4,00	und	$ 1.125.210,00	$ 4.500.840,00
72	ICCU 17,5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	4,00	und	$ 218.209,00	$ 872.836,00
73	ICCU 17,6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)	19,00	und	$ 202.923,00	$ 3.855.537,00
74	2,1	POCETA DE ASEO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 1.34X 0.45 H=0.50 INCLUYE LLAVE TIPO POCETA	4,00	und	$ 440.692,00	$ 1.762.768,00
75	ICCU 17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	2,00	und	$ 276.914,00	$ 553.828,00
76	ICCU 17,11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA	2,00	und	$ 93.576,00	$ 187.152,00
		CIELOS RASOS				
77	ICCU 15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	335,27	m²	$57.212,00	$ 19.181.467,24
		ACABADOS				
78	ICCU 14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RUSTICO 33 X 33	263,27	m²	$ 62.183,00	$ 16.370.918,41
79	ICCU 14,26	TABLÓN DE GRES LISO O RUSTICO 33 X 33	335,27	m²	$ 62.183,00	$ 20.848.094,41
80	2,2	ACABADO ESMALTADO DE CONCRETO A LA VISTA	72,00	m²	$ 213.912,00	$ 15.401.664,00
81	2,3	ENCHAPE SOBRE MURO CON PINTURA BIOCIDA SOBRE REVOQUE	251,47	m²	$ 42.054,00	$ 10.575.319,38
82	ICCU 14,17	GUARDAESCOBA EN GRES Y CERAMICA	1.583,58	ml	$ 10.732,00	$ 16.994.980,56
83	ICCU 18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	2.468,46	m²	$ 17.750,00	$ 43.815.165,00
84	ICCU 18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	913,86	ml	$ 11.060,00	$ 10.107.291,60
		CARPINTERÍA METÁLICA				
85	2,4	Ventana fija en perfilería de aluminio tipo pesado anodizado color negro de 14 micras + vidrio Energy Advantge de 6mm de Pilkignton o equivalente, con valor U 3,63w/m2°C, LT 0,82 y SHGC 0,70.	248,33	m²	$ 240.000,00	$ 59.599.200,00
86	2,5	Ventana batiente en perfilería de aluminio tipo pesado anodizado color negro de 14 micras + vidrio Energy Advantge de 6mm de Pilkignton o equivalente, con valor U 3,63w/m2°C, LT 0,82 y SHGC 0,70.	23,96	m²	$ 555.000,00	$ 13.297.800,00
87	2,6	Ventana con proyectante en perfilería de aluminio anodizado negro de 14 micras + vidrio Energy Advantge de 6mm de Pilkignton o equivalente, con valor U 3,63w/m2°C, LT 0,82 y SHGC 0,70	8,99	m²	$ 595.000,00	$ 5.349.050,00
88	2,7	Persiana fija en perfilería de aluminio anodizado color negro de 14 micras, ALN 315, con perfilería en lamina de acero Cal. 18 CR	119,76	m²	$ 398.000,00	$ 47.664.480,00
89	2,8	Puerta corrediza en vidrio templado de 10mm + perfiles de aluminio + cerradura, manijas, rieles, carriles, rodachines, marcos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	1,00	und	$ 1.724.249,00	$ 1.724.249,00
90	2,9	Puerta persiana metálica en lamina de acero cal 18 CR, acabado pintura epoxipoliamina color	1,00	und	$ 623.500,00	$ 623.500,00

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

		negro + marco				
91	2,10	Puerta batiente en vidrio templado de 10mm + marco +perfiles de aluminio ancho 1.00 m + herrajes y sistema de pivotes en acero inoxidable	26,00	und	$ 723.500,00	$ 18.811.000,00
92	2,11	Puerta batiente en vidrio templado de 10mm + marco+ perfiles de aluminio ancho 0.55 m + herrajes y sistema de pivotes en acero inoxidable	5,00	und	$ 450.249,00	$ 2.251.245,00
93	2,12	Puerta enrrollable en persiana en lamina de acero cal 16 CR, (3.00 x 2.90) acabado pintura epoxipoliamina color negro Incluye motor, malacate, cover, tapas y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento	1,00	und	$ 1.968.500,00	$ 1.968.500,00
94	2,13	Puerta enrrollable en persiana en lamina de acero cal 16 CR, (2.79 x 2.90) acabado pintura epoxipoliamina color negro Incluye marco, motor, malacate, cover, tapas y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento	1,00	und	$ 1.868.500,00	$ 1.868.500,00
95	2,14	Puerta plegable en persiana metálica en lamina de acero cal 18 CR, (7,50x2,90) acabado pintura epoxipoliamina negro incluye marco, manijas, rieles, rodachines, carriles, sistema mecánico, marcos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	1,00	und	$ 3.333.249,00	$ 3.333.249,00
96	2,15	DIVISIONES PARA SANITARIOS Y ORINALES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA AISI 304 CALIBRE 20, CON UNA ALTURA DE 1.80 METROS, INCLUYE: PUERTAS, PARALES, CHAPAS, BISAGRAS, EMPAQUES, MANIJAS DE APERTURA Y CIERRE, CON ACABADO EN LÁMINA DE ACERO POR AMBAS CARAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.ELABORADO EN TALLER Y MONTADO EN OBRA	44,10	m2	$ 586.790,00	$ 25.877.439,00
97	2,16	JUEGO DE BARRAS PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. 1 BARRA ABATIBLE O PLEGABLE, 1 BARRA DE APOYO DE 24" Y 1 BARRA DE APOYO DE 12".	3,00	und	$ 649.215,00	$ 1.947.645,00
98	2,17	Cerradura de manija en aleación de zinc satinado, para puertas de vidrio templado altura respecto al acabado de piso cerradura=0.8m manija=0.9m	21,00	und	$ 100.000,00	$ 2.100.000,00
99	2,18	Cerradura tipo cilindro con llave, para puertas de madera manija en aluminio satinado, altura respecto al acabado de piso cerradura=0.8m manija=0.9m	3,00	und	$ 39.900,00	$ 119.700,00
100	2,19	Cerradura de piso, tubular T*1102 y manijas en acero inoxidable 1"	2,00	und	$ 268.672,00	$ 537.344,00
101	2,20	Cerradura antipático o de leva en platina de acero galvanizado de 2mm con refuerzo	4,00	und	$ 349.000,00	$ 1.396.000,00
102	ICCU 5,5	DINTELES CONCRETO 2500 PSI 15X20	60,48	ml	$ 54.215,00	$ 3.278.923,20
		CARPINTERÍA EN MADERA				
103	2,21	Puerta entamborada, bastidor en madera pino, alma en honeycomb, caras y cantos en triplex okume 4 mm acabado tinta y laca wengue con manija de palanca, con rejilla inferior en aluminio anodizado color negro 5 de 14 micras ALN 315, con perfileria y marcos en lamina de acero Cal. 18 CR	3,00	und	$ 508.633,00	$ 1.525.899,00
		OTROS				
104	2,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE TIPO PUSH CORONA O SIMILAR	2,00	und	$ 287.233,00	$ 574.466,00
105	2,24	DISPENSADOR DE PAPEL DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE TIPO INSTITUCIONAL O SIMILAR CON LLAVE	4,00	und	$ 117.726,00	$ 470.904,00

106	2,25	Secador de manos con coraza exterior en acero inox. Tipo turbo con sistema sensor para manos libres Ref: SKU 210806 socoda o equivalente	2,00	und	$ 777.172,00	$ 1.554.344,00
107	2,26	Espejo flotado, biselado en vidrio de 5mm, calidad cristal (sin distorsión) flotado sobre estructura de soporte metálica interna	36,27	m2	$ 75.975,00	$ 2.755.613,25
108	2,27	Mesón vaciado en concreto reforzado, acabado enchape en granito negro san gil fondo negro grano 0, incluye cantos y mediacaña de 5cms, dilatador de aluminio cada dos metros y Placas de soporte de mesón en concreto reforzado, acabado en granito negro san gil fondo negro grano 0	6,72	m2	$ 640.826,00	$ 4.306.350,72
109	2,28	Media caña coextruida en PVC h: 9cm	84,62	m	$ 17.601,00	$ 1.489.396,62
110	2,29	Papelera de acero inox. con sistema de fijación y capacidad de 12 lts. Ref: 706630001 Corona o equivalente.	12,00	und	$ 403.191,00	$ 4.838.292,00
111	2,30	Cortasoles verticales en perfil de acero laminado en frio cal 18 ASTM A1008, dimensión 20x8cms, anclaje a piso y techo según detalle especifico acabado esmalte uretano color blanco.	29,70	m	$ 91.025,00	$ 2.703.442,50
112	2,31	Cortasol prefabricado en concreto 3.000psi, dimensión 60x8 cm según diseño, formaleta metálica, acabado a la vista fijación con platinas de acero según diseño estructural.	2,53	m3	$ 780.766,00	$ 1.975.337,98
}113	2,32	Pasarela 1 - Sum + Instalación Perfilería PINTADA ASTM A 532 GRADO 50 (IPE 220, PERFIL CUADRADO 150 X 100 X 4, PERFIL PHR 150 X 50 X 3, LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, REJILLA T 10 x 30 (2" x 3/16" GALVANIZADA) INCLUYE SOLDADURAS.	8.628,79	kg	$ 12.500,00	$ 107.859.875,00
114	2,33	Pasarela 2 - Sum + Instalación Perfileria PINTADA ASTM A 532 GRADO 50 (PERFIL CUADRADO 90 X 90 X 3, PERFIL PHR 150 X 50 X 3, LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, REJILLA T 10 x 30 (2" x 3/16" GALVANIZADA).	520,83	kg	$ 12.500,00	$ 6.510.375,00
115	2,34	Suministro e instalación de Fachada flotante Perfilería cuadrada ASTM A 500 GRADO C NEGRA	2.894,52	kg	$12.500,00	$ 36.181.500,00
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
116	3,1	TUBERÍA Ø 3" PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	3,00	m	$ 58.867,00	$ 176.601,00
117	ICCU 11,28	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	1,00	ml	$ 56.375,00	$ 56.375,00
118	ICCU 11,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	30,00	ml	$ 36.192,00	$ 1.085.760,00
119	ICCU 11,25	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	2,00	ml	$ 25.485,00	$ 50.970,00
120	3,2	TUBERÍA Ø 1-1/4" PVC PRESIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	28,00	m	$ 20.242,00	$ 566.776,00
121	ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	65,00	ml	$ 15.841,00	$ 1.029.665,00
122	ICCU 11,24	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	25,00	ml	$ 19.495,00	$ 487.375,00
123	ICCU 11,23	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	120,00	ml	$ 13.960,00	$ 1.675.200,00
124	3,3	TOTALIZADOR DE Ø 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA	5,00	und	$ 202.284,00	$ 1.011.420,00
125	3,4	VÁLVULA DE ENTRADA CON NIVEL DE REBOSE Ø1 1/4"	1,00	und	$ 51.987,00	$ 51.987,00
126	3,5	VÁLVULA DE Ø 3" TIPO RW	1,00	und	$ 192.737,00	$ 192.737,00
127	3,6	VÁLVULA DE Ø 2-1/2" TIPO RW	1,00	und	$ 165.112,00	$ 165.112,00
128	3,7	VÁLVULA DE Ø 2" TIPO RW	2,00	und	$ 137.487,00	$ 274.974,00
129	3,8	VÁLVULA DE Ø 1-1/2" TIPO RW	1,00	und	$ 123.887,00	$ 123.887,00
130	3,9	VÁLVULA DE Ø 1-1/4" TIPO RW	2,00	und	$ 120.737,00	$ 241.474,00
131	ICCU 11,35	REGISTRO 1"	9,00	und	$ 119.296,00	$ 1.073.664,00

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211



132	ICCU 11,37	REGISTRO 3/4"	8,00	und	$ 84.520,00	$ 676.160,00
133	ICCU 11,36	REGISTRO 1/2"	15,00	und	$ 66.636,00	$ 999.540,00
134	3,10	VÁLVULA DE GLOBO Ø 3"	9,00	und	$ 178.137,00	$ 1.603.233,00
135	3,11	VÁLVULA DE GLOBO Ø 2"	5,00	und	$ 152.637,00	$ 763.185,00
136	3,12	VÁLVULA DE GLOBO Ø 1-1/4"	1,00	und	$ 148.387,00	$ 148.387,00
137	3,13	VÁLVULA DE GLOBO Ø 1"	1,00	und	$ 122.887,00	$ 122.887,00
138	3,14	VÁLVULA CHEQUE (ANTIRRETORNO) Ø 2"	7,00	und	$ 115.887,00	$ 811.209,00
139	3,15	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 3"	1,00	und	$ 71.187,00	$ 71.187,00
140	3,16	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 2"	2,00	und	$ 57.587,00	$ 115.174,00
141	3,17	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 1"	1,00	und	$ 41.387,00	$ 41.387,00
142	3,18	MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Ø 3/4"	1,00	und	$ 35.887,00	$ 35.887,00
143	3,19	PUNTO AGUA FRÍA Ø 1" PVCP	13,00	pto	$ 79.575,00	$ 1.034.475,00
144	ICCU 11,17	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 3/4"	4,00	und	$ 74.755,00	$ 299.020,00
145	ICCU 11,16	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	38,00	und	$ 70.507,00	$ 2.679.266,00
146	ICCU 11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	40,00	und	$ 75.431,00	$ 3.017.240,00
147	ICCU 11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	28,00	und	$ 93.564,00	$ 2.619.792,00
148	ICCU 11,21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	15,00	und	$ 99.849,00	$ 1.497.735,00
149	3,20	TRAGANTES Ø 4"	60,00	pto	$ 59.274,00	$ 3.556.440,00
150	3,21	TUBO Ø 8" PVC ALCANTARILLADO (INCLUYE EXCAVACIÓN)	60,00	m	$ 131.300,00	$ 7.878.000,00
151	ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	120,00	ml	$ 97.601,00	$ 11.712.120,00
152	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	40,00	ml	$ 52.666,00	$ 2.106.640,00
153	ICCU 11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	7,00	ml	$ 38.871,00	$ 272.097,00
154	ICCU 11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	30,00	ml	$ 28.105,00	$ 843.150,00
155	ICCU 11,42	REVENTILACION 3"	40,00	ml	$ 24.807,00	$ 992.280,00
156	ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	11.041,53	ml	$ 19.683,00	$ 217.330.434,99
157	ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	380,00	ml	$ 37.391,00	$ 14.208.580,00
158	ICCU 11,6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	120,00	ml	$ 47.721,00	$ 5.726.520,00
159	3,22	CAJA DE INSPECCIÓN 0,70x0,70m	10,00	und	$ 132.439,00	$ 1.324.390,00
160	3,23	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80X0,80m	5,00	und	$ 189.227,00	$ 946.135,00
161	3,24	CAJA DE INSPECCIÓN 0,90X0,90m	10,00	und	$ 358.834,00	$ 3.588.340,00
162	3,25	CAJA DE INSPECCIÓN 1,00X1,00m	6,00	und	$ 464.596,00	$ 2.787.576,00
163	3,26	PUNTO REVENTILACIÓN Ø 2" PVCV	15,00	pto	$ 55.066,00	$ 825.990,00
164	ICCU 11,10	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	2,00	und	$ 716.753,00	$ 1.433.506,00
165	3,27	SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 2HP	2,00	und	$ 1.470.000,00	$ 2.940.000,00
4. INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIOS						
166	4,1	TUBO Ø4" SCH 10 HD (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	1,00	m	$ 154.224,00	$ 154.224,00
167	4,2	TUBO Ø3" SCH 10 HD (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	20,00	m	$ 122.602,00	$ 2.452.040,00
168	4,3	TUBO Ø2" SCH 10 HD (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	2,50	m	$ 86.798,00	$ 216.995,00
169	ICCU 11,59	GABINETE TIPO III	6,00	und	$ 1.112.569,00	$ 6.675.414,00

170	ICCU 11,62	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	1,00	und	$ 2.379.371,00	$ 2.379.371,00
171	ICCU 6,11 URB ANIS MO	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE	1,00	und	$ 3.665.760,00	$ 3.665.760,00
172	4,4	SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CONTRA INCENDIO	1,00	und	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
5. ACUSTICA Y SONIDO						
173	5,1	Piso en madera oak uso comercial	120,00	m²	$ 202.741,00	$ 24.328.920,00
174	5,2	Cielo raso panel acústico AQ espuma cubierta con listones de madera tipo formica de absorción acústica	120,00	m²	$ 519.141,00	$ 62.296.920,00
175	5,3	Muros de panel acústico AQ espuma cubierta con listones de madera tipo formica	70,00	m²	$ 510.711,00	$ 35.749.770,00
176	5,4	Suministro e instalación Vidrio DVH (Hermético)	42,00	m²	$ 850.000,00	$ 35.700.000,00
6. INSTALACIONES ELECTRICAS NORMALES Y REGULADAS E LUMINACION						
REDES ELECTRICAS E ILUMINACION						
177	6,1	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 3x250 MCM F+1x250 MCM N+1x 2/0 T AWG THHN	21,00	ML	$ 328.005,00	$ 6.888.105,00
178	6,2	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 3x6F+1X6N+1X8T AWG THHN HFFR	10,00	ML	$ 41.062,00	$ 410.620,00
179	6,3	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 3x8F+1X8N+1X10T HFFR	150,00	ML	$ 26.840,00	$ 4.026.000,00
180	6,4	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 1x10F+1X10N+1X12T HFFR	90,00	ML	$ 11.110,00	$ 999.900,00
181	6,5	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 1X8F +1X8 N+1X10T AWG (CASETAS EXTERIORES)	220,00	ML	$ 16.792,00	$ 3.694.240,00
182	6,6	Suministro e Instalación parcial en cable cobre 2X6F+1X6T AWG THHN (ILUMINACION EXTERIOR)	220,00	ML	$ 27.957,00	$ 6.150.540,00
183	6,7	Suministro e instalación salida toma 110VAC - CON CABLE HFFR	90,00	UN	$ 166.730,00	$ 15.005.700,00
184	6,8	Suministro e instalación salida toma 110VAC GFCI - CON CABLE HFFR	19,00	UN	$ 178.050,00	$ 3.382.950,00
185	6,9	Suministro e instalación salida de iluminación 110VAC - CON CABLE HFFR	220,00	UN	$ 126.717,00	$ 27.877.740,00
186	6,10	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared sencillo – CON CABLE HFFR	11,00	UN	$ 106.565,00	$ 1.172.215,00
187	6,11	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared doble - CON CABLE HFFR	1,00	UN	$ 108.144,00	$ 108.144,00
188	6,12	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared sencillo conmutable - CON CABLE HFFR	1,00	UN	$ 106.683,00	$ 106.683,00
189	6,13	Suministro e instalación salida de Interruptor de pared triple conmutable - CON CABLE HFFR	2,00	UN	$ 111.074,00	$ 222.148,00
190	6,14	Suministro e Instalación luminaria 60X60 de 40 W LED	70,00	UN	$ 196.148,00	$ 13.730.360,00
191	6,15	Suministro e Instalación luminaria redonda tipo Bala de 24W LED	25,00	UN	$ 69.648,00	$ 1.741.200,00
192	6,16	Suministro e Instalación luminaria aplique 1X24W LED	6,00	UN	$ 57.548,00	$ 345.288,00
193	6,17	Suministro e Instalación luminaria SYLPROOF ENCAPSULADA de 94 W LED	2,00	UN	$ 181.408,00	$ 362.816,00
194	6,18	Suministro e Instalación luminarias de emergencia autonomía 1 hora. 110- 130 V, <=4 W	4,00	UN	$ 135.758,00	$ 543.032,00
195	6,19	Suministro e Instalación luminaria TIPO REFLECTOR 15 W LED	4,00	UN	$ 390.176,00	$ 1.560.704,00
196	6,20	Suministro e instalación salida toma regulada 110VAC - CON CABLE HFFR	25,00	UN	$ 136.057,00	$ 3.401.425,00
197	6,21	Suministro e instalación salida toma bifásica 220VAC - CON CABLE HFFR	1,00	UN	$ 107.923,00	$ 107.923,00
198	6,22	Suministro e Instalación luminaria solar de 60 W	8,00	UN	$ 2.405.347,00	$ 19.242.776,00



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

199	6,23	Suministro e Instalación sensor para luminaria	2,00	UN	$ 108.247,00	$ 216.494,00
200	6,24	Suministro e Instalación tubería 1" PVC SCH 40	60,00	ML	$ 10.460,00	$ 627.600,00
201	6,25	Suministro e Instalación tubería 3/4" PVC SCH40 - DATOS	22,00	ML	$ 8.412,00	$ 185.064,00
202	6,26	Suministro e Instalación tubería 1" IMC (REFLECTORES)	80,00	ML	$ 30.181,00	$ 2.414.480,00
203	6,27	Suministro e Instalación tubería 6" PVC CORRUGADO - ACOMETIDA	15,00	ML	$ 51.274,00	$ 769.110,00
204	6,28	Suministro e Instalación Canaleta 12X5 CM metálica.	20,00	ML	$ 27.551,00	$ 551.020,00
205	6,29	Suministro e Instalación Bandeja Portacable tipo cerrada con división 30X8 CM (incluye curvas y accesorios)	60,00	ML	$ 195.461,00	$ 11.727.660,00
206	6,3	Suministro e Instalación Bandeja Portacable tipo cerrada con división 20X8 CM (incluye curvas y accesorios)	3,00	ML	$ 151.827,00	$ 455.481,00
207	6,31	Suministro e Instalación Caja CS276	2,00	UN	$ 1.152.799,00	$ 2.305.598,00
208	6,32	Suministro e Instalación Caja 30x30 para Tierra incluye varilla y accesorios	7,00	UN	$ 407.257,00	$ 2.850.799,00
209	6,33	Suministro e Instalación cable cobre 2/0 AWG	22,00	ML	$ 50.087,00	$ 1.101.914,00
210	6,34	Suministro e Instalación UPS trifásica de 20 KVA	1,00	UN	$ 20.148.155,00	$ 20.148.155,00
211	6,36	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1PB, TL2PB)	1,00	UN	$ 152.300,00	$ 152.300,00
212	6,37	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1PA)	1,00	UN	$ 164.207,00	$ 164.207,00
213	6,38	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1P1, TL2P1)	1,00	UN	$ 152.300,00	$ 152.300,00
214	6,39	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con totalizador (TD1)	1,00	UN	$ 820.088,00	$ 820.088,00
215	6,40	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TBOMBAS)	1,00	UN	$ 649.131,00	$ 649.131,00
216	6,41	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TR1)	1,00	UN	$ 747.862,00	$ 747.862,00
217	6,45	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con totalizador (TD3)	1,00	UN	$ 788.931,00	$ 788.931,00
218	6,46	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TR3)	1,00	UN	$ 704.022,00	$ 704.022,00
219	6,48	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TSON)	1,00	UN	$ 672.458,00	$ 672.458,00
220	6,49	Suministro e Instalación de tablero de medidor Norma AE 319	1,00	UN	$ 5.836.731,00	$ 5.836.731,00
221	6,51	Suministro e Instalación de Aire acondicionado 12000 BTU cuarto RACK	1,00	UN	$ 1.829.775,00	$ 1.829.775,00
222	6,52	Suministro e Instalación de Planta eléctrica de 100 KVA	1,00	UN	$ 52.512.922,00	$ 52.512.922,00
223	6,53	Suministro e Instalación de Transferencia automática de 300 A	1,00	UN	$ 7.763.375,00	$ 7.763.375,00
7. COMUNICACIONES, CABLEADO ESTRUCTURADO Y CCTV						
224	7,1	Suministro e Instalación Patchpanel de 48 puertos Categoría 6A	1,00	UN	$ 753.215,00	$ 753.215,00
225	7,2	Suministro e Instalación Patchpanel de 24 puertos Categoría 6A	1,00	UN	$ 488.616,00	$ 488.616,00
226	7,3	Suministro e Instalación jack Categoría 6A	70,00	UN	$ 46.055,00	$ 3.223.850,00
227	7,4	Suministro e Instalación patchcord 2m Categoría 6A	140,00	UN	$ 20.562,00	$ 2.878.680,00
228	7,5	Suministro e Instalación bandeja portacables	4,00	UN	$ 164.402,00	$ 657.608,00
229	7,6	Suministro e Instalación Cable UTP Categoría 6A	2.944,18	ML	$ 7.893,00	$ 23.238.412,74
230	7,7	Suministro e instalación salida de datos completa (incluye faceplate y marcación)	70,00	UN	$ 220.212,00	$ 15.414.840,00
231	7,8	Suministro e Instalación RACK 7' X 24"	1,00	UN	$ 492.922,00	$ 492.922,00
232	7,9	Suministro certificación punto de datos	70,00	UN	$ 12.000,00	$ 840.000,00
233	7.10	Suministro e Instalación Access point	3,00	UN	$ 1.346.091,00	$ 4.038.273,00
234	7.11	Suministro e Instalación FIREWALL	1,00	UN	$ 18.457.306,00	$ 18.457.306,00

235	7.12	Suministro e Instalación Switch CORE	1,00	UN	$ 10.505.131,00	$ 10.505.131,00
236	7.13	Suministro e Instalación Switch borde	2,00	UN	$ 10.835.356,00	$ 21.670.712,00
237	7.14	Suministro e Instalación DVR	1,00	UN	$ 3.408.656,00	$ 3.408.656,00
238	7.15	Suministro e Instalación camara CCTV	4,00	UN	$ 350.049,00	$ 1.400.196,00
PRESUPUESTO DE OBRA FASE I						
	ITEM	**URBANISMO (PARQUE)**				
	1	**PRELIMINARES**				
239	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	3.190,00	m²	$ 11.231,00	$ 35.826.890,00
240	ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE h=2,10m	192,18	ml	$ 23.760,00	$ 4.566.196,80
241	1,10	RETIRO O TRASLADO DE ESPECIAS ARBÓREAS PREEXISTENTES EN SITI	20,00	und	$ 259.568,00	$ 5.191.360,00
242	ICCU 16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE A 5km)	957,00	m³	$ 49.774,00	$ 47.633.718,00
243	ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	478,50	m³	$ 91.079,00	$ 43.581.301,50
	2	**ANDÉN**				
244	ICCU 4,44 VIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	649,51	m²	$ 10.109,00	$ 6.565.896,59
245	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	97,43	m³	$ 186.532,00	$ 18.173.812,76
246	2,2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO e=3cm PARA ANDÉN	19,49	m³	$ 90.907,00	$ 1.771.777,43
247	ICCU 5,1 URB	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6cm	649,51	m²	$ 82.001,00	$ 53.260.469,51
248	ICCU 5,11 URB	LOSETA PREFABRICADA A-40	163,71	m²	$ 68.372,00	$ 11.193.180,12
249	ICCU 5,12 URB	LOSETA PREFABRICADA A-60	12,00	m²	$ 98.526,00	$ 1.182.312,00
250	2,1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	19,70	m²	$ 65.861,00	$ 1.297.461,70
	3	**GENERAL URBANISMO**				
251	ICCU 6,8 URB	BORDILLO PREFABRICADO A80	799,18	ml	$ 75.310,00	$ 60.186.245,80
252	ICCU 5,15 URB	SARDINEL PREFABRICADO A10	69,65	ml	$ 115.727,00	$ 8.060.385,55
253	3,1	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A85 TIPO IDU	28,50	ml	$ 36.716,00	$ 1.046.406,00
254	3,2	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A100 TIPO IDU	6,00	und	$ 37.985,00	$ 227.910,00
255	3,3	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A105 TIPO IDU	6,00	und	$ 68.487,00	$ 410.922,00
	4	**ZONAS PEATONALES**				
256	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	151,59	m³	$ 186.532,00	$ 28.276.385,88
257	2,2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO DE 1/2 e=3cm PARA ZONAS PEATONALES	30,30	m³	$ 90.907,00	$ 2.754.482,10
258	ICCU 5,16 URB	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20cm)	1.010,60	m²	$ 66.110,00	$ 66.810.766,00
259	4,1	ADOQUÍN ECOLÓGICO EN CONCRETO e=7cm	60,48	m²	$ 66.536,00	$ 4.024.097,28

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

	5	**ESCALERAS**				
260	5,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	47,25	m³	$ 698.051,00	$ 32.982.909,75
261	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	3.544,00	kg	$ 8.086,00	$ 28.656.784,00
262	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	19,70	m³	$ 186.532,00	$ 3.674.680,40
	6	**PAISAJISMO**				
263	ICCU 5,10 URB	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	3,00	und	$ 615.125,00	$ 1.845.375,00
264	ICCU 6,7 VIAS	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	1.476,29	m²	$ 16.996,00	$ 25.091.024,84
265	6,1	ÁRBOL de mediano porte Yarumo	5,00	und	$ 2.040.178,00	$ 10.200.890,00
266	6,2	ÁRBOL de mediano porte Guayacán Amarillo	1,00	und	$ 2.014.042,00	$ 2.014.042,00
267	6,4	ÁRBOL de mediano porte Cresta de gallo	1,00	und	$ 1.979.056,00	$ 1.979.056,00
268	6,5	Especies menores de sombra Palmiche Curculigo (7 unidades por m2)	10,20	m²	$ 32.027,00	$ 326.675,40
269	6,6	Especies menores de sombra Helecho Cola de Pescado (4 unidades por m2)	13,80	m²	$ 34.842,00	$ 480.819,60
270	6,7	Especies menores de sombra Carey (6 unidades por m2)	9,84	m²	$ 31.272,00	$ 307.716,48
271	6,8	Especies menores de especies de luz Cebollino	99,31	m²	$ 12.402,00	$ 1.231.642,62
272	6,9	Especies menores de especies de luz Helecho Blechunum (4 unidades por m2)	96,08	m²	$ 35.617,00	$ 3.422.081,36
273	6,10	Especies menores de especies de luz Filodrendo Ala de Angel (3 unidades por m2)	101,02	m²	$ 34.332,00	$ 3.468.218,64
	7	**MOBILIARIO**				
274	7.1	MÓDULO COMERCIAL EN COLD ROLLED CON ESTRUCTURA METÁLICA PTES Y PLACA SOPORTE	2,00	und	$ 7.101.479,00	$ 14.202.958,00
275	7.2	MOBILIARIO CANECA DE RESIDUOS TRIPLE EN ACERO INOXIDABLE	3,00	und	$ 1.968.986,00	$ 5.906.958,00
276	7.3	MOBILIARIO URBANO (BANCAS EN CONCRETO 2500 PSI)	53,70	m	$ 442.329,00	$ 23.753.067,30
277	7.4	MOBILIARIO BOLARDOS	8,00	und	$ 199.232,00	$ 1.593.856,00
278	7.5	MOBILIARIO BICICLETEROS	1,00	und	$ 862.584,00	$ 862.584,00
	8	**MURO DE CONTENCIÓN**				
279	ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	26,55	m³	$ 216.583,00	$ 5.750.278,65
280	5,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	35,40	m³	$ 698.051,00	$ 24.711.005,40
281	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	2.300,00	kg	$ 8.086,00	$ 18.597.800,00
282	5,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	177,02	m³	$ 698.051,00	$ 123.568.988,02
283	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	9.390,00	kg	$ 8.086,00	$ 75.927.540,00
	9	**DRENAJES Y SUBDRENAJE AGUA LLUVIA**				
284	ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	120,00	ml	$37.391,00	$ 4.486.920,00
285	ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	3.095,33	ml	$ 19.683,00	$ 60.925.380,39
286	ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	58,23	ml	$ 97.601,00	$ 5.683.306,23
287	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	45,34	ml	$ 52.666,00	$ 2.387.876,44
288	ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	124,56	ml	$ 37.391,00	$ 4.657.422,96
289	ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	1.326,57	ml	$ 19.683,00	$ 26.110.877,31
290	9,1	CÁRCAMO HASTA 1,50m DE LONGITUD	5,00	und	$ 314.333,00	$ 1.571.665,00
291	9,2	CÁRCAMO DESDE 2,50m HASTA 3,50m DE LONGITUD	2,00	und	$ 656.963,00	$ 1.313.926,00



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

292	9,3	SUMIDERO DE VÍAS	2,00	und	$ 374.938,00	$ 749.876,00
293	9,4	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,70X0,70m PARA RED SANITARIA DRENAJE	3,00	und	$ 179.302,00	$ 537.906,00
294	9,5	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80m	3,00	und	$ 206.809,00	$ 620.427,00
295	9,6	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,90X0,90m	3,00	und	$ 268.893,00	$ 806.679,00
296	9,7	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1,00X1,00m	7,00	und	$ 341.834,00	$ 2.392.838,00
	10	**ELÉCTRICO**				
297	10,1	Suministro e Instalación luminaria TIPO EXTERIOR 44 W LED incluye fotocelda	31,00	UN	$ 550.072,00	$ 17.052.232,00
298	10,2	Suministro e Instalación tubería 1" PVC (CASETAS EXTERIORES)	19,00	ML	$ 13.269,00	$ 252.111,00
299	10,3	Suministro e Instalación tubería 2" PVC DB - REDES EXTERIORES	236,00	ML	$ 15.850,00	$ 3.740.600,00
300	10,4	Suministro e Instalación Caja de paso tipo AP280 (40X40)	37,00	UN	$ 285.487,00	$ 10.563.019,00
301	10,5	Suministro e Instalación Poste metálico de 4 m	47,00	UN	$ 539.775,00	$ 25.369.425,00
302	10,6	Suministro e Instalación de tablero monofásico (TL1PE, TL2PE, TL3PE, TL4PE)	4,00	UN	$ 152.300,00	$ 609.200,00
303	10,7	Suministro e Instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador (TEXT)	1,00	UN	$ 727.427,00	$ 727.427,00
304	10,8	Suministro e Instalación tubería 4" IMC - Bajante Transformador	6,00	ML	$ 211.194,00	$ 1.267.164,00
305	10,9	Suministro e Instalación Transformador 112,5 KVA	1,00	UN	$ 9.921.705,00	$ 9.921.705,00
306	10,10	Suministro e Instalación estructura CTU500	1,00	UN	$ 6.946.779,00	$ 6.946.779,00
307	10,11	Suministro e Instalación 3X Cable 70 mm2 AL XLPE	10,00	ML	$ 48.336,00	$ 483.360,00
308	10,12	Suministro certificación RETILAP y RETIE uso final, transformación y Red M.T.	1,00	GL	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
309	10,13	Suministro pruebas VLF cable red M.T.	1,00	GL	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
	11	**RESTAURACIONES**				
310	11,1	RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE GRUTA VIRGEN	1,00	GL	$ 1.429.546,00	$ 1.429.546,00
	12	**CARPINTERIA METALICA**				
311	12,1	BARANDA TIPO 1 TUBERIA SCHEDULE 40 ESPESOR DE PARED 5,16 mm SAND BLASTIADA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO , MINIMO 5 + 5 MILS DE ESPESOR DE PROTECCIÓN, ANCLADA APISO EN ESPACIO PUBLICO ALTURA LIBRE 0,8	37,80	m	$ 364.320,00	$ 13.771.296,00
PRESUPUESTO DE OBRA FASE II						
	ITEM	**URBANISMO (PARQUE) FASE II**				
	1	**PRELIMINARES**				
312	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	2.230,47	m²	$ 11.231,00	$ 25.050.408,57
313	ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE h=2,10m	128,12	ml	$ 23.760,00	$ 3.044.131,20
314	1,10	RETIRO O TRASLADO DE ESPECIAS ARBÓREAS PREEXISTENTES EN SITI	44,00	und	$ 259.568,00	$ 11.420.992,00
315	ICCU 16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE A 5km)	669,14	m³	$ 49.774,00	$ 33.305.774,36
316	ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	334,57	m³	$ 91.079,00	$ 30.472.301,03
	2	**ANDÉN**				
317	ICCU 4,44 VIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T2100 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	433,01	m²	$ 10.109,00	$ 4.377.298,09
318	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	64,95	m³	$ 186.532,00	$ 12.115.253,40



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

319	2,2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO e=3cm PARA ANDÉN	12,99	m³	$ 90.907,00	$ 1.180.881,93
320	ICCU 5,1 URB	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6cm	433,01	m²	$ 82.001,00	$ 35.507.253,01
321	ICCU 5,11 URB	LOSETA PREFABRICADA A-40	109,14	m²	$ 68.372,00	$ 7.462.120,08
322	ICCU 5,12 URB	LOSETA PREFABRICADA A-60	12,00	m²	$ 98.526,00	$ 1.182.312,00
323	2,1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	17,60	m²	$ 65.861,00	$ 1.159.153,60
	3	**GENERAL URBANISMO**				
324	ICCU 6,8 URB	BORDILLO PREFABRICADO A80	471,47	ml	$ 75.310,00	$ 35.506.405,70
325	ICCU 5,15 URB	SARDINEL PREFABRICADO A10	177,41	ml	$ 115.727,00	$ 20.531.127,07
326	3,1	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A85 TIPO IDU	33,43	ml	$ 36.716,00	$ 1.227.415,88
327	3,2	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A100 TIPO IDU	12,00	und	$ 37.985,00	$ 455.820,00
328	3,3	INSTALACIÓN DE BORDILLOS DE RAMPA TRANSICION CONCRETO 3000 PSI PREFABRICADOS A105 TIPO IDU	12,00	und	$ 68.487,00	$ 821.844,00
	4	**ZONAS PEATONALES**				
329	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	209,34	m³	$ 186.532,00	$ 39.048.608,88
330	2,2	BASE EN ARENA LAVADA DE RÍO e=3cm (PARA ZONAS PEATONALES)	41,86	m³	$ 90.907,00	$ 3.805.367,02
331	ICCU 5,16 URB	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20cm)	1.395,60	m²	$ 66.110,00	$ 92.263.116,00
	5	**ESCALERAS**				
332	5,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	126,02	m³	$ 698.051,00	$ 87.968.387,02
333	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	9.451,51	kg	$ 8.086,00	$ 76.424.909,86
334	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	7,68	m³	$ 186.532,00	$ 1.432.565,76
335	ICCU 5,1 URB	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6cm	38,40	m²	$ 82.001,00	$ 3.148.838,40
	6	**PAISAJISMO**				
336	ICCU 5,10 URB	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	9,00	un	$ 615.125,00	$ 5.536.125,00
337	ICCU 6,7 VIAS	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	726,48	m²	$ 16.996,00	$ 12.347.254,08
338	6,14	ÁRBOL de gran porte Guayacán Rosado	2,00	und	$ 1.950.802,00	$ 3.901.604,00
339	6,1	ÁRBOL de mediano porte Yarumo	2,00	und	$ 2.040.178,00	$ 4.080.356,00
340	6,2	ÁRBOL de mediano porte Guayacán Amarillo	4,00	und	$ 2.014.042,00	$ 8.056.168,00
341	6,15	ÁRBOL de mediano porte Ojo de Paloma	3,00	und	$ 1.993.642,00	$ 5.980.926,00
342	6,3	ÁRBOL de mediano porte Laurel	3,00	und	$ 1.988.542,00	$ 5.965.626,00
343	6,16	ÁRBOL de mediano porte Ariza	4,00	und	$ 1.973.242,00	$ 7.892.968,00
344	6,4	ÁRBOL de mediano porte Cresta de gallo	7,00	und	$ 1.979.056,00	$ 13.853.392,00
345	6,5	Especies menores de sombra Palmiche Curculigo (7 unidades por m2)	9,58	m²	$ 32.027,00	$ 306.818,66

346	6,6	Especies menores de sombra Helecho Cola de Pescado (4 unidades por m2)	12,96	m²	$ 34.842,00	$ 451.552,32
347	6,7	Especies menores de sombra Carey (6 unidades por m2)	20,78	m²	$ 31.272,00	$ 649.832,16
348	6,8	Especies menores de especies de luz Cebollino	184,45	m²	$ 12.402,00	$ 2.287.548,90
349	6,9	Especies menores de especies de luz Helecho Blechunum (4 unidades por m2)	178,41	m²	$ 35.617,00	$ 6.354.428,97
350	6,10	Especies menores de especies de luz Filodendro Ala de Angel (3 unidades por m2)	151,54	m²	$ 34.332,00	$ 5.202.671,28
351	6,11	Especies menores de especies para cubierta Iris Holándes	41,11	m²	$ 46.877,00	$ 1.927.113,47
352	6,12	Especies menores de especies para cubierta Hierba Pampa	75,60	m²	$ 41.267,00	$ 3.119.785,20
353	6,13	Especies menores de especies para cubierta Achira	77,85	m²	$ 22.092,00	$ 1.719.862,20
	7	**MOBILIARIO**				
354	7.1	MÓDULO COMERCIAL EN COLD ROLLED CON ESTRUCTURA METÁLICA PTES Y PLACA SOPORTE	2,00	und	$ 7.101.479,00	$ 14.202.958,00
355	7.2	MOBILIARIO CANECA DE RESIDUOS TRIPLE EN ACERO INOXIDABLE	6,00	und	$ 1.968.986,00	$ 11.813.916,00
356	7.3	MOBILIARIO URBANO (BANCAS EN CONCRETO 2500 PSI)	35,80	m	$ 442.329,00	$ 15.835.378,20
357	7.5	MOBILIARIO BICICLETEROS	5,00	und	$ 862.584,00	$ 4.312.920,00
358	7.6	JUEGOS PÉNDULO	1,00	und	$ 3.866.538,00	$ 3.866.538,00
359	7.7	JUEGOS ESCALADOR	1,00	und	$ 5.418.013,00	$ 5.418.013,00
360	7.8	JUEGOS RUEDA DE HOMBROS	1,00	und	$ 3.491.416,00	$ 3.491.416,00
361	7.9	JUEGOS REMO	1,00	und	$ 4.580.568,00	$ 4.580.568,00
362	7.10	JUEGOS BANCA INCLINADA ABDOMINALES	1,00	und	$ 2.486.440,00	$ 2.486.440,00
363	7.11	JUEGOS SKY	1,00	und	$ 4.496.700,00	$ 4.496.700,00
364	7.13	JUEGOS TORRE PUENTE CON DESLIZADERO	1,00	und	$ 28.859.403,00	$ 28.859.403,00
365	7.14	JUEGOS BALANCÍN DE MUELLE SENCILLO ANIMALES	1,00	und	$ 6.674.577,00	$ 6.674.577,00
366	7.15	JUEGOS BALANCÍN DE MUELLE SENCILLO ESTRELLA	1,00	und	$ 5.224.577,00	$ 5.224.577,00
367	7.16	JUEGOS CARRUSEL ORBITAL INCLINADO	1,00	und	$ 26.024.577,00	$ 26.024.577,00
368	7.17	JUEGOS COLUMPIO CANASTA EN RED	1,00	und	$ 16.508.445,00	$ 16.508.445,00
369	7.18	JUEGOS MURO INTERACTIVO INCLUYENTE	1,00	und	$ 22.640.909,00	$ 22.640.909,00
370	7,19	JUEGOS TORRE MULTIFUNCIONAL F7 MULTIFUERZA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	1,00	und	$ 16.440.909,00	$ 16.440.909,00
371	7.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DECK MADERA SOBRE BANCAS DE CONCRETO DE LA TERRAZA (LISTONES)	62,10	m2	$ 185.000,00	$ 11.488.500,00
	8	**MURO DE CONTENCIÓN**				
372	ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	59,01	m³	$ 216.583,00	$ 12.780.562,83
373	5,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	78,67	m³	$ 698.051,00	$ 54.915.672,17
374	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	5.901,00	kg	$ 8.086,00	$ 47.715.486,00
375	5,1	CONCRETO de F´c = 4000psi (280kg/m2)	393,38	m³	$ 698.051,00	$ 274.599.302,38
376	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	29.380,16	kg	$ 8.086,00	$ 237.567.973,76
	9	**DRENAJES Y SUBDRENAJE AGUA LLUVIA**				
377	ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	400,00	ml	$ 37.391,00	$ 14.956.400,00
378	ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	10.317,78	ml	$ 19.683,00	$ 203.084.863,74

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

379	ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	194,11	ml	$ 97.601,00	$ 18.945.330,11
380	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	151,13	ml	$ 52.666,00	$ 7.959.412,58
381	ICCU 11,5	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"	415,19	ml	$ 37.391,00	$ 15.524.369,29
382	ICCU 11,41	REVENTILACION 2"	4.421,90	ml	$ 19.683,00	$ 87.036.257,70
383	9,1	CÁRCAMO HASTA 1,50m DE LONGITUD	7,00	und	$ 314.333,00	$ 2.200.331,00
384	9,8	CÁRCAMO DESDE 1,50m HASTA 2,50m DE LONGITUD	13,00	und	$ 420.000,00	$ 5.460.000,00
385	9,2	CÁRCAMO DESDE 2,50m HASTA 3,50m DE LONGITUD	2,00	und	$ 656.963,00	$ 1.313.926,00
386	9,4	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,70X0,70m PARA RED SANITARIA DRENAJE	7,00	und	$ 179.302,00	$ 1.255.114,00
	11	**RESTAURACION**				
387	11,2	RESTAURACION Y CONSERVACIÓN DE MURO REFERENTE	1,00	Gbl	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
388	11,3	CONSERVACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO Y COMPLEMENTACIÓN DE PIEZAS ESTRUCTURALES INCLUYE COLOCACIÓN ESCUDO PINTADO DE ALCALDÍA	1,00	Gbl	$ 37.639.000,00	$ 37.639.000,00
	12	**CARPINTERIA METALICA**				
389	12,1	BARANDA TIPO 1 TUBERIA SCHEDULE 40 ESPESOR DE PARED 5,16 mm SAND BLASTIADA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO , MINIMO 5 + 5 MILS DE ESPESOR DE PROTECCIÓN, ANCLADA APISO EN ESPACIO PUBLICO ALTURA LIBRE 0,8	7,80	m	$ 364.320,00	$ 2.841.696,00
	13	**CICLORRUTA**				
390	ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	59,01	m³	$ 216.583,00	$ 12.780.562,83
391	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	78,67	m³	$ 186.532,00	$ 14.674.472,44
392	2,1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	393,38	m²	$ 65.861,00	$ 25.908.400,18
	14	**PARQUEADEROS**				
393	ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	30,09	m³	$ 216.583,00	$ 6.516.982,47
394	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	40,12	m³	$ 186.532,00	$ 7.483.663,84
395	4,1	ADOQUÍN ECOLÓGICO EN CONCRETO e=7cm	200,64	m²	$ 66.536,00	$ 13.349.783,04
396	2,1	ADOQUIN EN CONCRETO PARA RAMPAS INCLUYE MORTERO DE PEGA Y JUNTA DE ARENA	19,00	m²	$ 65.861,00	$ 1.251.359,00
	15	**PLAZA DE LA MEMORIA**				
397	ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	59,01	m³	$ 216.583,00	$ 12.780.562,83
398	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	78,67	m³	$ 186.532,00	$ 14.674.472,44
399	15,1	ARENA DE GUAMO (FINA) e=20cm	393,38	m³	$ 90.563,00	$ 35.625.672,94
	16	**PISO ZONA DE JUEGOS INFANITILES**				
400	ICCU 16,13	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	59,01	m³	$ 216.583,00	$ 12.780.562,83
401	ICCU 16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	78,68	m³	$ 186.532,00	$ 14.676.337,76
402	16,1	PISO SINTÉTICO EN CAUCHO RECICLADO EPDM e=1cm debe cumplir con norma de seguridad en 1177, dureza shore a de 55, mezclado en colores según diseño	393,38	m²	$ 396.450,00	$ 155.955.501,00
	17	**SEÑALIZACION**				
403	ICCU 7,1 URB	LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	503,81	ml	$ 4.375,00	$ 2.204.168,75

404	17,1	Suministro e Instalación Señal SC- 001 "Arroje la basura en las canecas" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	12,00	und	$ 265.527,00	$ 3.186.324,00
405	17,2	Suministro e Instalación Señal SC- 002 "Prohibido el ingreso de mascotas" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	2,00	und	$ 265.527,00	$ 531.054,00
406	17,3	Suministro e Instalacion Señal SC- 003 "Deja limpio el lugar que usa tu mascota" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	12,00	und	$ 265.527,00	$ 3.186.324,00
407	17,4	Suministro e Instalación Señal SC- 004 "Cuida las plantas. No las arranques" 0.30x0.40 lámina poste a 0.60 h del NPT Una cara. Idioma español/inglés. Dado de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	15,00	und	$ 265.527,00	$ 3.982.905,00
408	17,5	Suministro e Instalación Señal SG- 001 Plano ubicación parque dos caras (1.00 x2.00 Lámina. Poste a 0.60 h. del NPT). Dos dados de concreto de 3000 PSI (.30x.30x.60) paral empotrado 0.35. Idioma español/inglés. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	2,00	und	$ 1.799.999,00	$ 3.599.998,00
409	17,6	Suministro e Instalación Señal SG- 002 Identificación de Juegos Infantiles dos caras (0.80 x 1.20) Lámina. Poste a 1.00 h. del NPT). Dos dados de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Idioma español/inglés. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	1,00	und	$ 1.199.999,00	$ 1.199.999,00
410	17,7	Suministro e Instalación Señal SG- 003 Identificación de Gimnasio Biosaludable dos caras (0.80 x 1.20) Lámina. Poste a 1.00 h. del NPT). Dos dados de concreto de 3000 PSI (.25x.25x.50) paral empotrado 0.30. Idioma español/inglés. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución	1,00	und	$ 908.118,00	$ 908.118,00
411	17,8	Suministro e Instalación Señal SG- 004 Señal de Orientación Multidireccional (Tubular 3.00 m+ 4 veletas direccionales)+Dado de concreto de 3000PSI Ø=30cm H=0.80m tubular empotrado 0.50 m	6,00	und	$ 468.836,00	$ 2.813.016,00
412	ICCU 7,3 URB	Señal doble de cicloruta	6,00	und	$ 341.704,00	$ 2.050.224,00
413	17,9	Suministro e Instalación Señalización Vertical de Ciclorruta una cara SRC- 01 Conserve su derecha Lámina Ø =45cm tubular libre 2.20 +Dado de concreto de 3000PSI Ø=30cm H=0.80m tubular empotrado 0.50 m. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Debe cumplir las especificaciones de materiales, forma, color y dimensiones descritos en el Cap. 6 y 8 del Manual de Señalización Vial 2015 del Min. de Transporte	8,00	und	$ 265.132,00	$ 2.121.056,00

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

414	17,10	Suministro e Instalación Señalización Vertical de Ciclorruta una cara SRC- 02 Descenso obligatorio Lámina Ø =45cm tubular libre 2.20 +Dado de concreto de 3000PSI Ø=30cm H=0.80m tubular empotrado 0.50 m. Incluye suministro e instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Debe cumplir las especificaciones de materiales, forma, color y dimensiones descritos en el Cap. 6 y 8 del Manual de Señalización Vial 2015 del Min. de Transporte	3,00	und	$ 265.132,00	$ 795.396,00
415	17,11	Señalización Horizontal Flecha de Ciclorruta Unidireccional en pintura alquidílica con microesferas	6,00	und	$ 26.999,00	$ 161.994,00
416	17,12	Señalización Horizontal Bicicleta de Ciclorruta Unireccional 1.20 x 0.80 en pintura alquidíca con microesferas	6,00	und	$ 44.966,00	$ 269.796,00
417	17,13	Señalización Horizontal Distancia de Recorrido en metros en pintura alquidílica con microesferas cada 50 metros (letras)	5,00	und	$ 44.966,00	$ 224.830,00
418	ICCU 7,3 URB	Marca vial con pintura en frio	120,00	m2	$ 47.334,00	$ 5.680.080,00
419	17,14	Señalización Horizontal pintura alquídilica con microesferas logo discapacitados para zona de estacionamiento	1,00	und	$ 68.961,00	$ 68.961,00
420	17,15	Tope de estacionamiento de caucho virgen de alto impacto con laminado de alta densidad / capa reflejante 0.53 largo x 0.10 alto	18,00	und	$ 45.000,00	$ 810.000,00
DEMOLICION TOTAL INCLUIDO AIU						
421	ICCU 1,23	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,25M	3.586,34	m²	$ 78.285,00	$ 280.756.626,90
422	ICCU 1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 5 KM (INCLUYE CARGUE)	1.435,21	m³	$ 9.749,00	$ 13.991.862,29
423	2,22	Ascensor Schindler o similar con velocidad 1,0 m /seg, Modelo 3300 LA sin sala de máquinas, Embarque :Simple frontal (3) paradas, Tracción: Maquina Ecológica sin reductor, variación de frecuencia Velocidad 1,0 m /seg Acometida Principal (TN.S (3L + PE+ N) Voltaje requerido en acometida principal :208v 60 Hz. Cuarto Maquina :MRL (sin sala máquina) Control: Marco última parada Acometida de Iluminación: 120 V (+- 10%) Dimensión pozo Interno Existente : (2200) mm Frente x (12150) mm fondo Dimensiones de Cabina: Oferta básica 825 kg 1375 mm ancho x 1400 mm fondo Puertas de Cabina tipo centrales de 900 mm ancho x 2100 mm alto Sobre-reccorrido Mínimo 4040 mm Foso Negativo 1250mm Incluye lona de protección por cada equipo 1y ½ espejo Incluye 6 meses mantenimiento sin costo Incluye Certificación Puertas Anti fuego ABNT 120 Min Incluye Piso en Granito Incluye 2 pasamanos en Acero Inox. Incluye 1ª. Certificación ONAC	1,00	und	$ 100.138.500,00	$ 100.138.500,00
		COSTOS DIRECTOS				**$ 6.942.249.702,23**
		ADMINISTRACION			**25,050%**	$ 1.739.033.550,41
		IMPREVISTOS			**0,010%**	$ 694.224,97
		UTILIDAD			**4,930%**	$ 342.252.910,32
		AIU			**29,990%**	$ 2.081.980.685,70
		SUBTOTAL				$ 9.024.230.387,93
					ASCENSOR	**$ 100.138.500,00**

		TOTAL	**$ 9.124.368.887,93**

CLAUSULA TERCERA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA SEXTA la cual quedara así: **CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO** : El valor del presente contrato asciende a la suma **de NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.124.368.887,93),M/CTE INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,** equivalente a 9.124,368 SMMLV para el año 2022, el cual está respaldado por Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio de Fusagasugá. De conformidad conel estatuto tributario municipal Acuerdo No. 026 de 2016 y Decreto compilatorio del Estatuto Tributario Municipal 034 de 2021, para los contratos de obra pública tiene establecido los siguientes impuestos municipales: **a)** Estampilla pro cultura 2% (art. 252), **b)** Estampilla pro adulto mayor 3% (art. 262), **c)** Rete ica 1% (art. 95), **d)** Contribución al deporte 2.1% (art. 275 Decreto 34 de 2021), **e)** Contribución especial de seguridad 5% (art. 228), además, de los impuestos y tributos nacionales que apliquen. El Contratista, con lasuscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. **CLAUSULA CUARTA: GARANTIA UNICA**: El CONTRATISTA se obliga a modificar el valor de los amparos de la garantía única, con respecto a la modificación aquí contenida, allegando a la Dirección Contratación el correspondiente anexo; si a ello hubiere lugar. **CLAUSULA QUINTA : VALIDEZ DEL CONTRATO PRINCIPAL:** Todas las demás cláusulas y condiciones al contrato de obra publica N° 2022-0586, a que se ha hecho referencia, permanecerán inalterables y conservarán toda su vigencia y efecto, mientras no se encuentren en contradicción con lo estipulado en el presente Modificatorio No. 1. **CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato Modificatorio No. 1, se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma Secop II.

CONTRATO DE OBRA No.2022-0586

“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ”

INFORME SST

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES 2022

NOVIEMBRE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 0631 DE 2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INDICE DE MODIFICACIONES

Índice de Revisión	Fecha Modificación	Observaciones
00	25/11/20221	Versión inicial
01	30/11/2022	Observaciones

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Número de revisión		1
Elaborado por: CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022		
Responsable por elaboración Residente Ambiental del Proyecto	Nombre	SANDRA LILIANA GALINDO
	Firma	Sandra Galindo
Revisado y Aprobado por: **CONSORCIO INTERVENTORES 2022**		
Responsable por Revisión Residente Ambiental de interventoría	Nombre	
	Firma	Geraldine Cervera.
FECHA		**30/11/2022**

NOVIEMBRE 2022

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6

1. OBJETIVOS 6

1.1 OBJETIVO GENERAL 6

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 7

2.1. Datos del Contratista 8

1.1. LOCALIZACIÓN 8

1.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 9

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

2. RESUMEN EJECUTIVO 10

3. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11

4.1 Elementos Básicos de la Gestión SST 11

4.2 Socialización Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo 11

4.3 Socialización Política de SST 11

4.4 Afiliación y Pagos al Sistema General de Seguridad Social 11

4.5 Pago de para fiscales 11

4.6 Inducción 11

4.7 COPASST 12

4.8 Actualización Matriz de Peligros 12

4. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 12

5.1 Diagnóstico de Condiciones de salud 12

5.2 Exámenes Médicos Ocupacionales 12

5.3 Reubicación laboral 12

5. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 13

6.1 Campamento 13

6.2 Entrega Elementos de Protección Personal 13

6.3 Re evaluación de EPP 13

6.4 Unidades Sanitarias 13

6.5 Suministro de Hidratación 13

6.6 Reporte e Investigación y elaboración de Informes de Accidentes de Trabajo 14

6.7 Inspecciones 14

6.8 Indicadores De Gestión de Calidad y Accidentalidad 14

6.8.1 Indicadores de gestión 14

6.8.2 Indicadores de cumplimiento 14

6.8.3 Indicadores de cobertura 14
6.8.4 Frecuencia de accidentalidad 15
6.8.5 Severidad del accidente 15
6.8.6 Proporción de accidentes de trabajo mortales 15
6.8.7 Prevalencia de la enfermedad laboral 15
6.8.8 Incidencia de la enfermedad laboral 15
6.8.9 Ausentismo por causa médica: 16
6.9 Actividades de Capacitación 16
6.10 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 16
6.10.1 Conformación Brigadas de Emergencia 16
6.10.2 Simulacros 17
Estos serán llevados a Cabo según Cronograma de Capacitaciones. 17
6.10.3 Inspección a Botiquín y Extintor 17
6.10.4 Emergencias Presentadas 17
6.11 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 17
7 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 18
8 CONCLUSIONES 19

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. ANEXO 1 F17 AFILIACIONES Y PAGOS SS
ANEXO 2. REGISTRO DE INDUCCION, NOTIFICACION DE RIESGOS Y CAPACITACION
ANEXO 3. EXAMEN
ANEXO 4. COPASST
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 6. ENTREGA DE EPP´S
ANEXO 7. INSPECCIONES
ANEXO 8. CRONOGRAMA
ANEXO 9. MAQUINARIA Y EQUIPOS
ANEXO 10. CARACTERIZACION DE ACCIDENTALIDAD
ANEXO 11. ACCIDENTE LABORAL

Listado de tablas

Tabla 1. Datos contrato de obra
Tabla 2. Area de influencia del proyecto
Tabla 3. Resumen del personal existente
Tabla 4. Registros de inducción

INTRODUCCIÓN

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022, ejecutará las obras requeridas por el contrato 0586 de 2022 **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"** En este primer informe se describen las actividades desarrolladas por el área SST durante el tercer mes de ejecución, por tanto, se hace un seguimiento a las actividades preliminares programadas dentro del cronograma adjunto **al SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO**

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades realizadas por el área de seguridad y salud en el trabajo durante el período del presente informe, dentro de las actividades a ejecutar para el contrato 0586 de 2022 cuyo objeto es: **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Suministrar información y soporte sobre las labores SST desarrolladas por el Contratista durante el periodo del presente informe.

- Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales correspondiente a la ejecución del contrato de obra No 0586 de 2022.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se registran los datos más relevantes del proyecto en mención.

Nombre o Razón Social: CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

Nit: 901.604.402.-9

Dirección: AC 24-51 40 OF 316

Teléfonos: 601 4672734

Actividad Económica: 7020 Actividades de consultoría de gestión

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil

A continuación, se registran los datos más relevantes del proyecto en mención.

Tabla 1. DATOS CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	**0586-2022**
Objeto:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**
Contratante:	Alcaldía fusagasuga cudinamarca
Contratista:	Consorcio construedificaciones 2022
	NIT:901.604.402-9
Interventoría:	Consorcio interventores 2022
	NIT. 901.617.378-6
Valor Del Contrato:	$ 9-125.070.710
Plazo De Ejecución Inicial:	Siete (7) meses
Fecha De Inicio:	31 agosto 2022
Fecha de Terminación Inicial:	30 marzo 2023

2.1. Datos del Contratista

- **NOMBRE:** **CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022**
- **R/L NOMBRE:** **SANDRA LLIANA SANCHEZ**
- **TELEFONO:** 601.467.273.4
- **DIRECCIÓN:** AC 24-51 40 OF 316
- **EMAIL:** contabilidad@estudios.com.co

1.1. LOCALIZACIÓN

Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la Provincia del Sumapaz, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Con una población proyectada en el año 2020 de 147.631 habitantes, es el tercer municipio más poblado del departamento después de Bogotá y Soacha, también es el cuadragésimo quinto del país.5 Fue fundado el 5 de febrero de 1592, y es conocida como la "Ciudad Jardín de Colombia".

Fusagasugá está constituida en su zona urbana por 6 comunas: Centro, Norte, Occidental, Oriental, Sur Occidental y Sur Oriental, Comuna Centro, integrada por los siguientes barrios: Santander, Olaya, Centro, Emilio Sierra, Luxemburgo y Potosí.

Comuna Norte, integrada por los siguientes barrios: El Progreso, Nueva Esperanza, La Esmeralda, Gaitán, La Independencia, San Antonio, El Edén, Villa Natalia, José Antonio Galán, Gaitán II, La Cabaña, La Florida, Los Andes, Santa Librada, Mi Tesoro, Villa Rosalía, El Rosal, Villa Armerita, Villas de San Diego I, Villas de San Diego II, Monte Verde, Los Fundadores, Conj. Res. La Palma 2, Carlos Lleras, Porvenir y El Lucero.


Comuna Occidental, integrada por los siguientes barrios: San Jorge, Comboy, Mandalay, Nuevo Balmoral, San Mateo, Marcella, Manila, Santa Anita, La Salle, El Caney, Fontanar, Antiguo Balmoral, Urbanización Villa Alix, Piedra Grande, Santa Ana Campestre, Villa Country, Quintas de Balmoral, El Manantial, Santa Clara, Siboney, Teresita I y Teresita II.

Comuna Oriental, integrada por los siguientes barrios: Pekín, Cedritos, Coburgo, Bosque Bonnet, El Tejar, Los Robles, Bella Vista, Santa María de Los Ángeles, Antonio Nariño, Los Sauces, Urb. Altos de Pekín, Bonet, Villa de Los Sutagaos y Villa Aranzazu.

Comuna Sur Occidental, integrada por los siguientes barrios: Llano Largo, La Pampa, La Venta, Cooviprof, Maíz Amarillo, Ciudad Eben-ezer, Gran Colombia, Caminos de Llano Largo, Llano Verde, Villa Celeste, Urb. Las Brisas, Leidy Di, Urb. Pedregal de San Luis, Urb.

Parques de Occidente Etapas I y II, Urb. El Oasis, Urb. La Primavera, Llano Grande, Conj. Res. Asoveinte, Urb. San Diego La Venta, Conj. Res. Balcones de San José, Villas de La Pampa, Conj. Res. Villa Rosita, La Venta, Urb. Los Girasoles, Ciudad Jardín, Urb. Cádiz, Urb. Nueva Campiña, Urb. Ciudadela Comfenalco, San Francisco, Urb. Cambulos y Conj. Cerrado San Martín de Los Olivos.

Comuna Sur Oriental, integrada por los siguientes barrios: Balmoral, Fusacatán, Obrero, Los Comuneros, La Macarena, Pedro Pablo Bello, Camino Real, San Fernando, Santa Bárbara, Villa Leidy, Prados de Alta Gracia, Jaime Pardo Leal, El Mirador, Las Delicias, Prados de Bethel, Las Américas, Urbanización Bosques del Oriente, Urbanización Aires de Quinini, Popular Obrero, Santa Rosa, Bethel Bajo, Urbanización La Alejandra y Sauces Bajo.

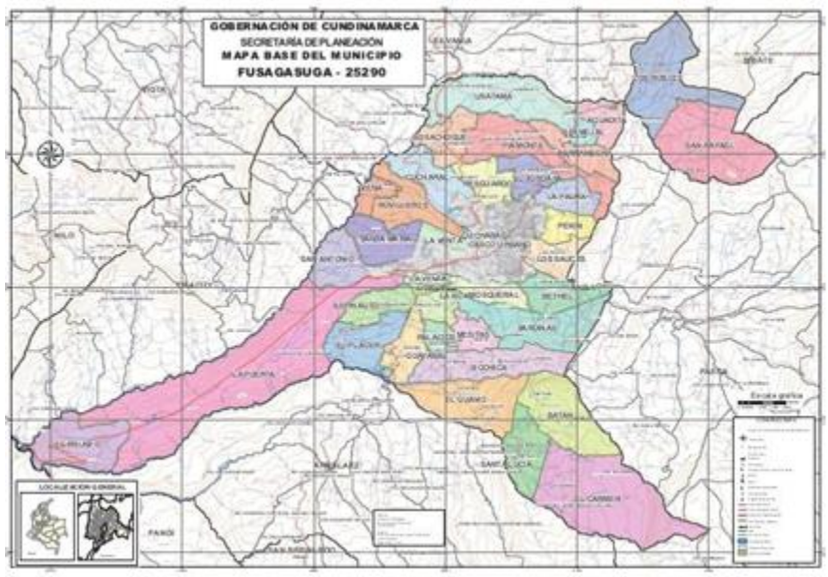

Fuente: Google maps

1.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se relaciona a continuación, en donde se encuentra el área de intervención.

Tabla 2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

No.	CONSTRUCCION
1	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actividades para ejecutar en el proyecto corresponden a la construcción del centro de integración e innovación social. En este sentido el área SST contribuirá a prevenir y mitigar los riesgos que se pudieran generar por la ejecución de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta que **LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA,** elaboró los respectivos estudios previos al presente contrato, se realiza la ejecución de la obra asignada, con previa autorización de la interventoría del contrato, entregado por la Alcaldía de Fusagasugá Cundinamarca.

2. RESUMEN EJECUTIVO

La alcaldía de Fusagasugá, celebró con CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022, el Contrato de obra 0586-2022, para las OBRAS Y ACTIVIDADES correspondientes al objeto:

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

La Interventoría está a cargo de **CONSORCIO INTERVENTORIA 2022**, Y el desarrollo de la obra a cargo del Contratista **CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022,** en cumplimiento de las obligaciones contractuales realizó la revisión de los compromisos y obligaciones SST. Desarrollando el SG-SST que contiene en detalle el cumplimiento de cada uno de los componentes de la Gestión SST. El presente Informe SST No.01 corresponde al período comprendido entre 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022, a continuación, se realiza una descripción de las actividades desarrolladas:

3. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 Elementos Básicos de la Gestión SST

4.2 Socialización Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo

Esta actividad se realiza a todos los trabajadores en la inducción, el reglamento se divulga y se mantiene visible en el campamento.

VER ANEXO NO.5 REGISTRO FOTOGRAFICO

4.3 Socialización Política de SST

La Socialización de ésta se realiza en la inducción general del proyecto.

4.4 Afiliación y Pagos al Sistema General de Seguridad Social

Los trabajadores que ingresen a laborar con el contrato No 0586 de 2022, durante el periodo se verificaran que se encuentren afiliados a ARL, EPS, AFP.

En el presente informe se anexan los soportes de afiliación del personal que ingreso en el período y los pagos al Sistema General de Seguridad Social del personal antiguo en la empresa y que ha sido trasladado de proyecto.

VER ANEXO NO. 1 formato 17 Afiliación y pago al sistema general de seguridad social.

4.5 Pago de para fiscales

El área SST, verifica que todo el personal que labora para el desarrollo del contrato de obra, cuenta con los pagos al sistema general de Seguridad Social.

VER ANEXO NO. 1 formato 17 Afiliación y pago al sistema general de seguridad social.

4.6 Inducción

El personal que ingreso durante el período se le realizo la respectiva inducción y Notificación de Riesgos, abarcando los siguientes temas: la política SST, Política de Alcohol y Drogas, funciones y responsabilidades, notificación al trabajador sobre los riesgos a los que se encuentra expuesto, notificación de derecho a examen de egreso, Reglamento de Higiene, Seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes, elementos de Protección personal, COPASST y su funcionamiento, se notifica de sus deberes y derechos como trabajador.

Tabla No.3 Reporte mensual de personal

TOTAL PERSONAL	*INGRESOS*	*RETIROS*	*INGRESO-RETIRO*	*PERSONAL ANTIGUO*
17	*6*	*1*	*0*	*11*

ANEXO NO.2 Registro de Inducción – Formato Notificación de riesgos.

4.7 COPASST

Se realizó la conformación del COPASST y del comité de convivencia laboral realizando elección de representantes por los trabajadores y profesionales sin ninguna novedad, para la presente conformación y las próximas reuniones se anexarán mensualmente el acta de cada reunión realizada.

ANEXO NO.4 Acta de conformación de COPASST – COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

4.8 Actualización Matriz de Peligros

Este documento se presentó en el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, y se actualizará cada vez que se presenten cambios de actividades o se requiera.

4. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

5.1 Diagnóstico de Condiciones de salud

Durante este periodo ingresaron (6) personas, la cuales presentaron las siguientes recomendaciones médicas, en el examen ocupacional:

- Actividad física regular
- Y consulta por optometría.
- Higiene postural.
- Uso de EPPs.
- Hábitos de vida Saludable - Nutrición
- Pausas activas.
- Uso EPPs Covid-19

5.2 Exámenes Médicos Ocupacionales

A todo el personal que ingreso durante el período, se le realizo el examen médico ocupacional de ingreso y así mismo se presenta el examen del personal antiguo en la empresa y que es vinculado al desarrollo del Contrato de Obra No 0586 – 2022

Los exámenes de ingreso se evidencian en el ***anexo 3***.

5.3 Reubicación laboral

De ser necesario se reubicará a los trabajadores según condiciones.

5. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1 Campamento

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 posee un campamento destinado para las funciones administrativas. Este sitio está dotado del equipo de atención de emergencias con elementos tales como camilla, extintor y botiquín.

El Consorcio busca desarrollar de manera permanente actividades SST, para la prevención de riesgos a la salud de sus trabajadores y la protección de recursos materiales obteniendo los mejores beneficios de productividad, eficiencia y eficacia de sus operaciones.

Teniendo en cuenta la dinámica del contrato, se determinó la instalación de un campamento móvil dentro de la obra objeto de intervención el cual se encuentra dotado de camilla, extintor multipropósito y botiquín, para la atención de emergencias. Para el caso del cambio de ropa de los trabajadores y el uso del baño, se realizó un convenio entre el CONSORCIO y uno de los residentes del sector, con el fin de alquilar el baño y una pequeña bodega para el cambio de ropa de los trabajadores.

VER ANEXO. 5 REGISTRO FOTOGRAFICO.

6.2 Entrega Elementos de Protección Personal

El personal que ingresa a laborar al contrato se le suministra los EPP requeridos para el desarrollo de sus actividades, los cuales son suministrados al inicio de las actividades de la obra.

Mensualmente se realiza inspección al uso y estado de los EPPS, información consignada en el registro correspondiente.

VER ANEXO. 6 ENTREGA DE EPPS

6.3 Re evaluación de EPP

Este ítem se evaluará cuando sea necesario.

6.4 Unidades Sanitarias

La obra cuenta con un Baño, para uso del personal administrativo y en el frente de obra se cuenta con un convenió de baño residencial para uso de los trabajadores.

6.5 Suministro de Hidratación

El suministro de hidratación al personal es permanente en la oficina y en el frente de obra.

VER ANEXO NO.5 REGISTRO FOTOGRAFICO

6.6 Reporte e Investigación y elaboración de Informes de Accidentes de Trabajo

Durante el periodo de noviembre se presentó un accidente laboral

6.7 Inspecciones

Se realiza inspección a Botiquín y Extintor en la carpa ubicada en el frente de obra para verificar que se encuentren al día y con su respectiva señalización.

VER ANEXO NO.7 INSPECCIONES

6.8 Indicadores De Gestión de Calidad y Accidentalidad

6.8.1 Indicadores de gestión

$$\frac{\text{Reuniones realizadas}}{\text{Reuniones planteadas}} * 100 \qquad \frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

se realizaron reuniones de conformación COPASST y CCL.

6.8.2 Indicadores de cumplimiento

$$\frac{\#\text{ actividades ejecutadas en el periodo}}{\#\text{ actividades programadas en el periodo}} * 100 \qquad \frac{6}{6} * 100 = 100\%$$

Actividades correspondientes a inducción, notificaciones de riesgo, divulgación de políticas, verificación de afiliaciones al SGSSI, divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial, divulgación del plan de emergencias en inducciones, divulgación del protocolo de bioseguridad.

6.8.3 Indicadores de cobertura

✓ $$\frac{\#\text{ de trabajadores que se practicaron examen de ingreso en el periodo}}{\#\text{ promedio de trabajadores en el periodo}} * 100$$

6/6 * 100 = 100%

El 100 % de los trabajadores del EEI se realizó su examen de ingreso dentro del período.

$$\frac{\#\text{ de trabajadores que recibieron inducción en el periodo}}{\#\text{ de trabajadores que ingresaron en el periodo}} * 100 \quad =$$

*6/6 *100 = 100%*

El 100 % de los trabajadores del Consorcio cuentan con inducción.

6.8.4 Frecuencia de accidentalidad

$$\left(No.\,de\,\frac{1}{1}\right) * k$$

Donde, *K = 100* = 0/20 * 100 N.A

6.8.5 Severidad del accidente

$$\left(No.\,días\,\frac{perdidos}{No.\ de\ trabajadores} + No.\,días\ cargados\right) *\ k \quad =$$

$$\frac{4 +}{25} * 100000 \quad = 2$$

6.8.6 Proporción de accidentes de trabajo mortales

$$\left(\frac{No.de\ accidentes\ mortales\ presentados\ durante\ el\ año}{Total\ accidentes\ de\ trabajo\ que\ se\ presentaron\ en\ el\ año}\right) *\ k \ = \left(\frac{2}{2}\right) *\ 100 \ = 100$$

6.8.7 Prevalencia de la enfermedad laboral

$$\left(\frac{No.de\ casos\ nuevos\ y\ antiguos\ de\ enfermedad\ laboral\ en\ el\ periodo}{Promedio\ de\ trabajadores\ en\ el\ período}\right) *\ k \quad =$$

Donde, K = 100.000

$$\frac{0}{25} * 100000 \quad = 0$$

6.8.8 Incidencia de la enfermedad laboral

$$\left(\frac{No.de\ casos\ nuevos\ de\ enfermedad\ laboral\ en\ el\ periodo}{Promedio\ de\ trabajadores\ en\ el\ período}\right) *\ k \quad =$$

$$\frac{0}{25} * 100000 \quad = 0$$

6.8.9 Ausentismo por causa médica:

$$\left(\frac{No.de\ días\ de\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral\ o\ común\ en\ el\ mes}{No.de\ días\ de\ trabajo\ programados\ en\ el\ mes}\right) * k =$$

$$\frac{0}{25} * 100 = 0$$

6.9 Actividades de Capacitación

En este ítem se plasman las actividades de inducción, capacitación y/o entrenamiento dirigidas al personal del consorcio.

Para el presente período se realizaron actividades de inducción en temas de Sistema de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP), Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST, Comité de Convivencia, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Plan de Emergencias, Brigada de Emergencias, Responsabilidades del Empleador y los Trabajadores, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Notificación de riesgos, Accidentalidad. Las inducciones realizadas se evidencian en el anexo 4.

VER ANEXO NO. 2 REGISTRO DE INDUCCIONES.

6.10 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022, implementará dicho Plan de acuerdo al documento entregado en el SG SST, así como los equipos y elementos necesarios para la atención de las mismas, el personal en obra, estarán debidamente capacitados y entrenados. Así mismo se contará con la señalización informativa y preventiva en los frentes de obra, con sus respectivos puntos de encuentro para casos de emergencias.

6.10.1 Conformación Brigadas de Emergencia

La conformación de las brigadas de emergencia se realizará entre personal operativo y administrativo del CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022, con el fin de atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar, dentro de las especificadas en el Plan de Emergencia. En el presente período no se realiza conformación de brigadas de emergencia, ya que aún no se da ingreso a todo el personal operativo quienes trabajaran en los frentes de obra y con quienes se realizará la conformación de las brigadas.

6.10.2 Simulacros

Estos serán llevados a Cabo según Cronograma de Capacitaciones.

6.10.3 Inspección a Botiquín y Extintor

Se realizaron inspecciones a estos, con el fin de verificar que se encuentren en óptimas condiciones en caso de presentarse alguna emergencia y ser necesario hacer uso de ellos.

VER ANEXO NO. 7 INSPECCIONES

6.10.4 Emergencias Presentadas

En el periodo no se presentaron ningún tipo de emergencias por lo tanto este ítem no aplica.

6.11 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante el presente periodo se presentó el siguiente ingreso de maquinaria, la documentación se refleja en el ***anexo 10 Documentación maquinaria.***

Tabla No.4 Reporte de maquinaria y equipos

TIPO DE MAQUINA	*SOAT*
VOLQUETA UVM 655	*8/03/2022*
VOLQUETA TGL323	*13/2/2022*
VOLQUETA FTD412	*6/02/2022*
VOLQUETA SSE096	*17/05/2022*
VOLQUETA PFA337	*5/09/2022*
VOLQUETA OCK	*19/01/2022*
EXACAVADORA MEXO3	*N/A*
EXCAVADORA MEX02	*N/A*
MINICARGADOR	*N/A*

7 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Dentro de las acciones realizadas en cumplimiento al PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD presentado por CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022, aprobado por la interventoría y la Alcaldía, se tienen las siguientes actividades:

- Diligenciamiento diario de los formatos de protocolo de aplicación del COVID, en donde se consigna la información referente a la toma de temperatura diaria de cada uno de los trabajadores.
- Diligenciamiento del formato de las condiciones de salud por cada uno de los trabajadores del contrato.
- Implementación en los frentes de obra de carpa para adecuación del kit de bioseguridad el cual comprende mesa y silla plástica, con alcohol, termómetro para la toma diaria de temperatura y los formatos aplicables a la actividad.
- Lavamanos portátil con gel anti bacterial y jabón para el cumplimiento del lavado de manos cada tres horas por parte de los trabajadores.
- Cacorro desinfectante para higienizar las herramientas, maquinaria y demás elementos, utilizando como producto principal el hipoclorito de sodio.
- Entrega de elementos de protección personal y reposición diaria de tapabocas.
- Disposición adecuada de los residuos biosanitarios generados.
- Implementación de señalización informativa referente a las medidas de protección ante el COVID-19.

8 CONCLUSIONES

- En el presente informe se plasma el seguimiento a las actividades propuestas dentro del SG-SST.
- Los trabajadores reportados en el presente período cumplen con examen de ingreso, inducción y pagos de seguridad social al día.
- Se da cumplimiento a las actividades propuestas dentro del cronograma.
- En el presente período se presentó un accidente laboral leve.

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 1 F17 AFILIACIONES Y PAGOS SST

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
FO-GIP-077	FORMATO No. 17- AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIODICOS Y EGRESO	1.0	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 30/11/2022

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO OBRA No. 586-2022 **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. **INTERVENTOR** CONSORCIO INTERVENTORIA 2022

OBJETO

PERIODO DE INFORME: 1/11/2022 A 30/11/2022

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR						ARP			EPS		AFP		FECHA EXAMENES			SI TIENE RESTRICCION ESPECIFIQUE LA
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	Nombre	FECHA AFILIACION A LA ARP	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO	EXAMEN DE INGRESO	EXAMEN PERIÓDICO	EXAMEN DE EGRESO	
	PERSONAL NUEVO																	
1	CIVILES BURGOS	LIBARDO ROMERO ALVAREZ	19374145	63	AYUDANTE	CALLE 4 7-75	3105976425	SURA	25/08/2022	N/A	SURA	N/A	PORVENIR	N/A	29/0872022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
2	ARK INGENIERIA	EDWIN GARZON HORTUA	11257299	43	AYUDANTE	CARRERA 14 Nº 56-38	312468741	SURA	21/172022	N/A	COMPENSAR	N/A	PROTECCION	N/A	30/11/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
3	ARK INGENIERIA	GULLERMO LEON CASTRILLON RESTREPO	1017172738	40	AYUDANTE	CARRERA 7 20 Nº 5-2	310859460	SURA	24/1172022	N/A	SAVIA SALUD	N/A	PORVENIR	N/A	29/11/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
4	ARK INGENIERIA	LEONARDO GARABITO BERNAL	82392861	45	AYUDANTE	CARRERA 6 Nº 12-53	3107978080	SURA	16/1172022	N/A	SALUD TOTAL	N/A	PORVENIR	N/A	30/11/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
5	ARK INGENIERIA	VILLANE MARCELA MENDEZ DIAZ	106971588	36	AYUDANTE	YAYATA BAJA SILVANIA	314481652	SURA	22/11/2022	NA	FAMISANAR	N/A	PORVENIR	N/A	29/11/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
6	ARK INGENIERIA	JULIO CESAR RODRIGUEZ QUINTANA	1059981845	36	OFICIAL	CALLE 4 7-75	310569850	SURA	4/11/2022	N/A	FAMISANAR	N/A	PORVENIR	N/A	9/11/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
	PERSONAL ANTIGUO																	
1	CIVILES BURGOS	JHON FREDY OLAYA QUIRIGA	1012374044	31	AYUDANTE	CALLE 10 5-57	320259876	SURA	14/1072022	18/11/2022	FAMISANAR	1871172022	PORVENIR	18711/2022	25/10/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
3	CONSORCIO ADECUACIONES 2022	CARLOS BUITRAGO	93296008	40	OFICIAL	CALLA 4 7-75	320598761	SURA	26/01/2022	8/1172022	FAMISANAR	8/1172022	PORVENIR	8/11/2022	21/06/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
4	ARK INGENIERIA	JUAN DE DIOS LARA ROJAS	11220269	45	OFICIAL	CALLE 5 10-56	315964825	SURA	14/1072022	8/1172022	SALUD TOTAL	8/11/2022	PORVENIR	8/11/2022	13710/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
5	ARK INGENIERIA	FELIPE MEJIA	1030527209	36	AYUDANTE	CALLE 6 ESTE 37-17	310293690	SURA	19/10/2022	18/1172022	SALUD TOTAL	18/1172022	PORVENIR	18/1172022	25/10/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
6	ARK INGENIERIA	JOSE ALBEIRO MUSE	1022967017	31	AYUDANTE	CALLE 25 31-24	318569523	SURA	14/10/2022	18/1172022	NUEVA EPS	18/11/2022	PORVENIS	18/1172022	9/05/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
7	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	JUAN JOSE OVALLE	1069764656	24	AUXILIAR DE INGENIERIA	CALLE 22 Nº 13-19	3208797247	COLMENA	17/1072022	18/11/2022	FAMISANAR	1871172022	PORVENIR	18/1172022	20/10/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
8	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ	79584718	51	RESIDENTE INGENIERO	CALLE 48C SUR Nº24-35APTO 33	3103219422	SURA	N/A	28/10/2022	FAMISANAR	28/10/2022	PROTECCION	28/10/2022	1/12/2021	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
9	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	ADRIANA CHACON GUERRERO	52811695	40	RESIDENTE SOCIAL	CALLE 23 Nº 13-37	3115582660	SURA	N/A	1/12/2022	COMPENSAR	1/12/2022	COLPENSIONES	1/12/2022	5/09/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
10	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ	52.361.164	45	RESIDENTE SST-MA	KR 64 A 22 14 TO 2 AP 603	4672735	COLMENA	N/A	3/11/2022	COMPENSAR	3/11/2022	COLPENSIONES	3/11/2022	1/12/2021	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
11	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CESAR RICARDO QUINTERO GARCIA	1.069.732.511	32	INSPECTOR	CALLE 25 Nº 10-80	3204328889	COLMENA	28/08/2022	2/1172022	FAMISANAR	2/11/2022	PORVENIR	2/11/2022	23/08/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
12	CIVILES BURGOS	POMPILIO RODRIGUEZ BURGOS	74.333.979	45	CONTRATISTA	CALLE 7 Nº 4- 27	3204959210	SURA	1/10/2021	8/11/2022	FAMISANAR	8/11/2022	PORVENR	8/1172022	2/09/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
13	ARK INGENIERIA	VICTOR ALFONSO CARDOZA JIMENEZ	1.056.929.914	29	OPEARIO	CALLE 7 Nº 4- 27	321647755	SURA	30/08/2022	18711/2022	SANITAS	18/11/2022	PORVENIR	18/1172022	29/08/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
14	ARK INGENIERIA	EDWN VALENCIA DIAZ	1.077.420.397	22	AYUDANTE	CALLE 7 Nº 4- 27	3053474089	SURA	8/09/2022	18/11/2022	NUEVA EPS	18/11/2022	PROTECCION	18/11/2022	25/03/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
15	ARK INGENIERIA	JHORMAN ALBERTO AVELLANA MONTAÑA	100.492.174	22	TOPOGRAFIA	CALLE 7 Nº 4- 27	322898456	SURA	31/05/2022	18/11/2022	NUEVA EPS	18/11/2022	PORVENIR	18/11/2022	26/09/2022	N/A	N/A	PAUSAS ACTIVAS - HIGIENE
17	CIVILES BURGOS	EVERLEY MUÑOS LEON	80.442.717	45	AYUDANTE	CALLE 7 Nº 4- 27	3226753940	SURA	13/09/2022	8/11/2022	SALUD TOTAL	8/1172022	PORVENIR	8/1172022	26/03/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
18	ARK INGENIERIA	JOSE OSVALDO ARENAS CAÑON	79.208.102	51	AYUDANTE	CALLE 7 Nº 4- 27	3124568348	SURA	22/0972022	18/11/2022	SANITAS	18/11/2022	COLFONDOS	18/11/2022	21/0972022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
19	ARK INGENIERIA	LUIS ALBERTO BARRAGAN GOMEZ	1.026.559.967	49	AYUDANTE	CALLE 7 Nº 4- 27	3156789809	SURA	21/09/2022	18/11/2022	FAMISANAR	18/11/2022	PORVENIR	18/11/2022	7/0972022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
	RETIROS																	
1	CIVILES BURGOS	ARISTIDES PARDO NIÑO	13526015	47	AYDUANTE	CALLE 4 7-75	32156492	SURA	28/08/2022	N/A	FAMISANAR	N/A	COLPENSIONES	N/A	7/10/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19
2	ARK INGENIERIA	JOSE GABRIEL DLUCAS	5873213	31	AYUDANTE	CALLE 25 31-24	324456151	SURA	21/10/2022	N/A	SALUD TOTAL	N/A	PORVENIR	N/A	25/10/2022	N/A	N/A	USO DE EPP COVID 19

N.A.P. : No aplica en el período

Para diligenciar columna Fecha de examen de egreso utilice las siguientes siglas:

Oe: entrega de orden para examen de egreso

RSA: retiro sin aviso

fecha: fecha en que se realizo en exaen de egreso

NOTA: EN ESTE FORMATO EL RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA RESALTARA EN VERDE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

(Firma) Sandra L. Galindo S.
(Nombre) SANDRAGALINDO

Residente SISO Contratista de Obra

(Firma)
(Nombre)

Residente SISO Interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Medellín, 20 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARK INGENIERIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C11257299	GARZON HORTUA EDWIN	21/11/2022		J1541973	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/11/2022 16:04:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.181.100, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación | Fecha de Radicación: 21 11 2022

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)*

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	1
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	
	C. Institucional [ ]				
	D. De oficio [ ]				

A. AFILIACIÓN **II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: GARZON	Segundo Apellido: HORTUA	Primer Nombre: EDWIN	Segundo Nombre:

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	11257299	Femenino [ ] Masculino [X]	02 07 1979

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo F N M Condición T P			SURA ARL	PORVENIR AFP

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia	Teléfono fijo	
$1.000.000	CARRERA 1 4# 56 - 38		3012458741

Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana / Rural	Localidad / Comuna	Departamento
notiene@gmail.com	FUSAGASUGA	Urbana [X] Rural [ ]		Cundinamarca

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres				25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo	
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre			Femenino	Masculino
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo (F N M)	31. Discapacidad Condición (T P)	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Cot	USS FUSAGASUGA IPS MEDICARE SAS	3026
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
ARK INGENIERIA SAS	NIT	901447769	

39. Ubicación				
Dirección: CALLE 136 157 A 10	3217534107	Correo electrónico	Cundinamarca	FUSAGASUGA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación datos básicos de identificación [ ]
2. Corrección datos básicos de identificación [ ]
3. Actualización documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ]
5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ]
6. Reinscripción en la EPS [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ]
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ]
14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ]
15. Reporte por fallecimiento [ ]
16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ]
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ]
18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	42. Fecha (2 1 1 1 2 0 2 2)
		Femenino [ ] Masculino [ ]		

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [✓]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [✓]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 [✓]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [✓]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva Institucional o de Oficio
edwin garzon	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] Cant. [ ] RC [ ] Cant. [ ] TI [ ] Cant. [ ] CC [✓] Cant. [1] PA [ ] Cant. [ ] CE [ ] Cant. [ ] CD [ ] Cant. [ ] SC [ ] Cant. [ ] Total [1]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo mediante el cual [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria [ ] los padres o la declaración suscrita por el cotizante [ ] [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte [ ] Superintendencia Nacional de Salud [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autor [ ] realizar afiliaciones colectivas [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación [ ]

B
21 NOV 2022
Cód. 433 Holiman López Arias
SUJETO A VERIFICACIÓN

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial	67. Datos del SISBÉN	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]	Número de la ficha [ ] Puntaje [ ] Nivel [ ]	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES: Aportes mes de Diciembre, documentos en base

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud
VIGILADO SuperSubsidio
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Ente Cooperativo

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

compensar | eps salud

	SI	NO
¿Previo diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	✔	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo la entrega de la carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	✔	
¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	✔	
¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	✔	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	✔	

Firma del afiliado (cotizante): edwin garzon

No. Identificación: 11257299

B
21 NOV 2022
Cód. 433 Holiman López Arias
SUJETO A VERIFICACIÓN

FIRMA A RUEGO (Diligenciar exclusivamente cuando el cotizante no pueda firmar)

A ruego de (la) señor (a) _____ con C.C. No. _____

lo hace en su nombre, el (la) señor(a) _____

con C.C. No. _____ mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que se está entregando, quien además actúa como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a) _____

Firma a Ruego: _____

Nombres y apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de domicilio: _____

Nombres y apellidos de quien no sabe firmar: _____

Identificación: _____

Huella

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, explicita, previamente informada e inequívoca a todos los servicios de salud Compensar EPS, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2012, para tratar mi información personal, según lo establecido en su Manual de Protección de Datos Personales, disponible en:www.compensar.com / vínculo protección Datos Personales; información que será utilizada en el desarrollo de las funciones propias para:

- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo y/o mis beneficiarios.
- Dar cumplimiento a requerimientos legales y de organismos de control.
- Proveer y/o evaluar la calidad de los productos y/o servicios requeridos por mí.
- La realización de estudios internos sobre fines estadísticos y analíticos de los datos, para mejoras de nuestros servicios o programas especializados de atención en salud; información sobre la cual podré, en cualquier momento, ejercer mis derechos de Habeas Data, para solicitar que no se me envíe información de los servicios en los casos que sea pertinente, y que no afecte el servicio de salud prestado por Compensar EPS.
- Transmitir mis datos personales a las administradoras encargadas de la seguridad social, con el fin de actualizar el estado de mi afiliación y/o traslado en el sistema.
- Compartir mis datos personales con la Caja de Compensación Familiar Compensar para efectos de la prestación de servicios de salud.

Cabe anotar, que la protección de los datos personales se efectúa a través de proveedores tecnológicos, con los cuales se tienen firmados contratos de transmisión de información, en aras de cumplir a cabalidad con los principios de acceso de la ley, así como de tomar las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para el aseguramiento de los datos.

Como titular de la información personal sobre la que Compensar EPS ejerce el tratamiento, se me informa sobre los canales a través de los cuales puedo ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir mis datos personales, entre ellos el correo electrónico protecciondedatos@compensar.com, y la central telefónica de la EPS.

La protección de datos personales efectuada por Compensar EPS, cumple con los principios de finalidad, necesidad, circulación restringida, confidencialidad y seguridad señalados en la Ley 1581 de 2012 y manifiesto expresamente que conozco dónde consultar la información sobre protección de datos personales, así como los efectos y alcance de la presente autorización y que estoy libre de todo vicio del consentimiento en el momento de otorgarla.

Firma del afiliado (cotizante): edwin garzon

No. Identificación: 11257299

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.404

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ARK INGENIERIA	**ARK INGENIERIA**
Nombre de la empresa	**Empresa en misión**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

GARZON HORTUA EDWIN	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	43 AÑOS 4 MESES 29 DÍAS	CC (Tipo)	11.257.299 (Número)
Apellidos y Nombres				

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON CRITERIOS MEDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
X1053D1J6404

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: GARZON HORTUA EDWIN

CC: 11.257.299

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **SANCHEZ CASTRO PEDRO** identificado(a) con **CC** número **3.166.735** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de mayo de 2002 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 22 de noviembre de 2022.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2022112208281

Medellín, 23 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARK INGENIERIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1017172738	CASTRILLON RESTREPO GUILLERMO LEON	24/11/2022		Cu0²2544	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/11/2022 16:46:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.181.100, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Codigo Verificación: 1522382

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.

CERTIFICA QUE:

GUILLERMO LEON CASTRILLON RESTREPO, identificado con Cedula Ciudadania 1017172738 aparece registrado(a) en SAVIA SALUD EPS con la siguiente información:

Tipo y N° de identificación:	Cedula Ciudadania 1017172738
Nombres y apellidos:	GUILLERMO LEON CASTRILLON
Nivel de Sisben:	No Aplica
Grupo Sisben:	
Fecha de afiliación:	2018-06-22
Ciudad:	MEDELLÍN
Régimen:	SUBSIDIADO
Estado de afiliacion:	Activo
Modelo de liquidación:	CAPITA
Fecha de retiro:	
Semanas de afiliación:	230

El presente documento fue generado el 2022-11-23 16:50:27, valido por 15 días a partir de la fecha de generación, sin embargo el estado de afiliación puede cambiar de acuerdo a la normatividad que rige el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO

SAVIA SALUD EPS

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.367

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	**11** MES	**2022** AÑO	**FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA)** Ciudad	**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ARK INGENIERIA	**ARK INGENIERIA**
Nombre de la empresa	**Empresa en misión**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

CASTRILLON RESTREPO GUILLERMO LEON	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	37 AÑOS 1 MESES 15 DÍAS	CC	1.017.172.738
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
VALORACIÓN POR EPS : CITA EN EPS MEDICO GENERAL CON TENSIONES ARTERIALES DE 8 DIAS	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR. HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
D1053J1P6367

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: CASTRILLON RESTREPO GUILLERMO LEON

CC: 1.017.172.738

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

GUILLERMO LEON CASTRILLON RESTREPO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.017.172.738**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Noviembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 08 de Noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ARK INGENIERIA SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1059981245	RODRIGUEZ QUINTANA JULIO CESAR	04/11/2022		19627W13	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10191206242231260043

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/11/2022 16:40:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.181.230, 198.143.41.21, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1986

PUERTO TEJADA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

B+
G.S. RH


M
SEXO

23-DIC-2004 PUERTO TEJADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-0700100-01075062-M-1059981245-20190514 00653 36262A 1 9907984249

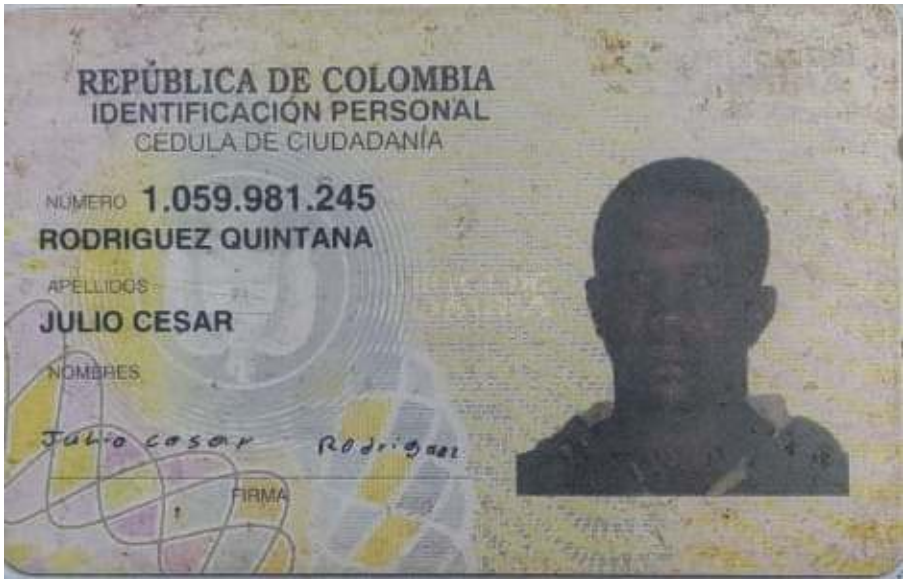

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.059.981.245

RODRIGUEZ QUINTANA
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

Julio Cesar Rodriguez

FIRMA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9009362324
9009362324

No. de Radicación: 25075500

Fecha de Radicación: 04 11 2022

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: RODRIGUEZ	Segundo Apellido: QUINTANA	Primer Nombre: JULIO	Segundo Nombre: CESAR

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1059981245	Femenino [ ] Masculino [X]	D D: 22 M M: 12 A A A A: 1986

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$1.000.000	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular

Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ARK INGENIERIA SAS	NT	901447769	

39. Ubicación				
CL 136 157 A 10 Dirección	3196647803 Teléfono	Correo electrónico	BOGOTA Municipio / Distrito	DISTRITO CAPITAL Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	42. Fecha novedad (D D M M A A A A)
		Femenino [ ] Masculino [ ]		04 11 2022

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] Total [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 5.963

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
09 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	**Empresa en misión**
ARK INGENIERIA	**ARK INGENIERIA**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ QUINTANA JULIO CESAR	MASCULINO	35 AÑOS 10 MESES 17 DÍAS	CC (Tipo)	1.059.981.245 (Número)

Cargo
OFICIAL DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON CRITERIOS MEDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA EJERCICIO, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR, ASISTIR A CAPACITACIONES EN SST POR PARTE DE LA EMPRESA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
T1053Z1F5963

Aspirante o Trabajador

JULIO R

Firma:

Nombre: RODRIGUEZ QUINTANA JULIO CESAR

CC: 1.059.981.245

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JULIO CESAR RODRIGUEZ QUINTANA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.059.981.245**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Noviembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 15 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARK INGENIERIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C82392861	GARAVITO BERNAL LEONARDO	16/11/2022		23232255	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/11/2022 07:29:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.181.112, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009270613	1|6|1|1|2|0|2|2

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual:
B. Institucional ☐
-Cotizante Cabeza de familia ☒
-Beneficiario afiliado adicional ☐
B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒
B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
GARAVITO Primer apellido	BERNAL Segundo apellido	LEONARDO Primer nombre	 Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	82392861	Femenino ☐ Masculino ☒	1|7|1|2|1|9|7|7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1000000

18.Residencia

CR 2 NUEMRO 22 29 COMUNEROS **Dirección**	**Telefono fijo**	3143194445 **Telefono celular**	ARK.INGENIERIASAS@GMAIL.COM **Correo electronico**
FUSAGASUGA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	CUNDINAMARCA **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		NUESTRA SEÑORA DE BELEN FUSAGASUGA SAS - NUESTRA SEÑORA DE BELEN FUSAGASUGA SAS	SMFUSA - SMFUSA
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
ARK INGENIERIA SAS	NIT	901447769	01

39.Ubicación

CL 136 57 A 10 Dirección	5837006 Teleéfono	ARK.IGENIERIASAS@GMAIL.COM Correo electrónico	BOGOTA Municipio/distrito	BOGOTA Departamento

No de Radicacion
4009270613

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		1|6|1|1|2|0|2|2

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

- ☐ **56.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.405

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
ARK INGENIERIA	ARK INGENIERIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GARAVITO BERNAL LEONARDO	MASCULINO	44 AÑOS 11 MESES 13 DÍAS	CC (Tipo)	82.392.861 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL : DEBE REALIZAR CORRECCION VISUAL Y USO PERMANENTE	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : CITA OPTOMETRIA, NUTRICION	SVE VISUAL	CONTROL DE PESO
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR. SEGUIMIENTO ESTRICTO DE SU CORRECCION VISUAL.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
C1053I1O6405

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: GARAVITO BERNAL LEONARDO

CC: 82.392.861

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LEONARDO GARAVITO BERNAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **82.392.861**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 17 de Noviembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 08 de Noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C19374145	ROMERO ALVAREZ LIBARDO	25/08/2022		U1331532	DEPENDIENTE	MORA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C743339792231259525

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/11/2022 16:32:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.181.230, 198.143.41.21, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
AFILIADOS COTIZANTES GENERAL

Documento **NI 901454513** Razón social **CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS**

Identificación	Nombre	Fecha inicio vigencia	Fecha fin vigencia	Período inicio obligación pagos
CC 19374145	LIBARDO ROMERO ALVAREZ	24/09/2022	VIGENTE	09/2022

Total de afiliados cotizantes **1**

MEDIPRO IPS
SALUD OCUPACIONAL
NIT. 830.592.359-3

1001864900 814618

CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL - INGRESO
PARA TRABAJO EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS

N 300/8725

FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2022	EXÁMEN DE INGRESO	X
NOMBRE:	LIBARDO ROMERO ALVARES	EXÁMEN DE EGRESO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	19.374.145	EXÁMEN PERIÓDICO	
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS-NIT 9014545133	EDAD 63	R.H. O+
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA-EPS.SURA	PESO 76	SEXO M

RESULTADOS EXÁMENES PARACLÍNICOS

ESPIROMETRÍA	NO	DEC.421-20/20
AUDIOMETRÍA	SI	OK
VISIOMETRÍA	SI	OK
ELECTROCARDIOGRAMA	SI	OK
PSICOLÓGICO		
RADIOLOGÍA (TÚNEL DEL CARPO / COLUMNA / TÓRAX)		
VACUNAS	SI	OK

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

CUADRO HEMÁTICO IVG		
SEROLOGÍA		
GLICEMIA	SI	OK
COLESTEROL	SI	OK
TRIGLICERIDOS	SI	OK
PARCIAL DE ORINA	SI	OK
SODIO		
POTASIO		
PLOMO		

FROTIS FARÍNGEO/CON CULTIVOS		
KOH UÑAS		
PRUEBA DE EMBARAZO		
HEMOCLASIFICACIÓN		
TSH		
AMILASA		
BACILOCOSPIA		

***IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA** A la fecha hacemos constar que el trabajador fué examinado y los resultados obtenidos fueron los siguientes:*

APTO	SI	*APTO CON RESTRICCIÓN*		*NO APTO*		*APLAZADO*	
APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI			*CONCEPTO*	SI		

RECOMENDACIONES

1.	CONTROL EPS	APTO PARA EL TRABAJO SIN NINGUNA RESTRICCION
2.	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
3.	HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	

RECOMENDACIONES: USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES SEGÚN CIRCULAR 030 DEL 2020.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, los beneficios, la interpretación y riesgos del exámen médico, paraclinico(s) y/o ocupacionales que me van a practicar. Garantizo que las respuestas suministradas por mi en estos exámenes y presentes en este documento son veráces y completas. Entendiendo que en este proceso es voluntario y libre de toda cohesión y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento antes de que se realizaran las pruebas, fui informado de las medidas que el Profesional de Salud Ocupacional de MEDIPRO tomará para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, los autorizo para que den a conocer, por cualquier medio electrónico o físico la información registrada a la persona o entidad ¿, contemplada en la legislación actual vigente, para el buen cumplimiento del programa de Salud Ocupacional de la empresa. De los cuales recibiré los resultados y aseguro estar de acuerdo con el proceso. Hago constar con mi firma que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi consentimiento.

Claudia Patricia Gonzalez S.
Medico Especialista
Gerencia en Salud Ocupacional
Res.11409-2014 C.C.52.503.829

MÉDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL R.M.

FIRMA TRABAJADOR

C.C. No.

HUELLA

***Declaración de CONFIDELIDAD:** El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En Concordancia Con la Resolución 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.*

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LIBARDO ROMERO ALVAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **19.374.145**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 04 de abril del 2022.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Medellín, 21 de noviembre de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARK INGENIERIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1069715880	MENDEZ DIAZ VILLANE MARCELA	22/11/2022		163128f1	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/11/2022 21:43:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.181.100, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9009422200
9009422200

No. de Radicación: 25168952

Fecha de Radicación: 23 / 11 / 2022

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: MENDEZ	Segundo Apellido: DIAZ	Primer Nombre: VILLANE	Segundo Nombre: MARCELA

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1069715880	Femenino [X] Masculino [ ]	12 / 08 / 1986

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$1.000.000	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular

Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios 29. Parentesco	30. Etnia
B1					D D M M A A A A		
B2					D D M M A A A A		
B3					D D M M A A A A		
B4					D D M M A A A A		
B5					D D M M A A A A		

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ARK INGENIERIA SAS	NT	901447769	

39. Ubicación				
CL 136 157 A 10 Dirección	3196647803 Teléfono	Correo electrónico	BOGOTA Municipio / Distrito	DISTRITO CAPITAL Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		[ ] [ ]	D D M M A A A A	23 / 11 / 2022

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] Total [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.


Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.368

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
ARK INGENIERIA	ARK INGENIERIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MENDEZ DIAZ VILLANE MARCELA	FEMENINO	36 AÑOS 3 MESES 17 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1.069.715.880

Cargo
AUXILIAR DE TRAFICO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON CRITERIOS MEDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: .

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : CITA NUTRICION	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
A1053G1M6368

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: MENDEZ DIAZ VILLANE MARCELA

CC: 1.069.715.880

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

VILLANE MARCELA MENDEZ DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.069.715.880**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Noviembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52811695	ADRIANA CHACON GUERRERO	KR 94C 131D 16	3115582660	adrichacongue@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	01/12/2022	63676788	$415.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	146.300	0		0		0	0	0	0	146.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	187.200	0	0	0	0	0	0		187.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	81.500				81.500	0	0	81.500			815	81.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	146.300	146.300
Pensión	1	187.200	187.200
Riesgos Laborales	1	81.500	81.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	415.000	415.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52811695	ADRIANA CHACON GUERRERO		KR 94C 131D 16	3115582660	adrichacongue@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	01/12/2022	63676788	$415.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52811695	CHACON GUERRERO ADRIANA	57	0			N																	25-14	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS008	1.170.000	146.300	14-11	1.170.000	5	81.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901447769	2	ARK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARK	calle 136-157a-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7534107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1762388730	9442792153	E	2022/11/17	2022/11/18	BANCO CAJA SOCIAL		$4,454,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARK (21 Afiliados)																							$14,333,336	$2,293,600			$14,400,003	$576,300			$14,400,003	$576,300			$14,400,003		$1,003,000		$0	$0		$4,449,200
Centro de Trabajo: ARK OBRA (21 Afiliados)																							$14,333,336	$2,293,600			$14,400,003	$576,300			$14,400,003	$576,300			$14,400,003		$1,003,000		$0	$0		$4,449,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																							$14,333,336	$2,293,600			$14,400,003	$576,300			$14,400,003	$576,300			$14,400,003		$1,003,000		$0	$0		$4,449,200
1	CC	4168664	ALARCON SOCHA JAIME																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	79208102	ARENAS CAÑON JOSE OSVALDO																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	1004912174	AVELLA MONTAÑA JHORMAN ALBERTO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1026559967	BARRAGAN GOMEZ LUIS ALBERTO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	7319225	CAMPOS CAICEDO LEONARDO FABIO																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
6	CC	1056929914	CARDOZO JIMENEZ VICTOR ALFONSO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	PT	5873213	D LUCAS BORDONES JOSE GABRIEL	X																	230301	10	$333,334	$53,400	EPS002	10	$333,334	$13,400	CCF24	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	6.960%	$23,300	10	$0	$0	Si	$103,500
8	CC	4950014	DIAZ FORERO FERMIN		X																230201	27	$900,000	$144,000	EPS005	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	6.960%	$62,700	27	$0	$0	Si	$278,700
9	CC	10265578	ECHEVERRI HENRY	X																	25-14	7	$233,334	$37,400	EPS002	7	$233,334	$9,400	CCF24	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	6.960%	$16,300	7	$0	$0	Si	$72,500
10	CC	80376153	GARZON CASTILLO SANTOS JORGE																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
11	CC	74333573	JIMENEZ BECERRA CARLOS																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
12	CC	11220269	LARA ROJAS JUAN DE DIOS	X																	230301	17	$566,667	$90,700	EPS002	17	$566,667	$22,700	CCF24	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	6.960%	$39,500	17	$0	$0	Si	$175,600
13	CC	1030527209	MEJIA PEDROZA LUIS FELIPE	X																	230301	12	$400,000	$64,000	EPS002	12	$400,000	$16,000	CCF24	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	6.960%	$27,900	12	$0	$0	Si	$123,900
14	CC	1022967017	MUSE QUILCUE JOSE ALBEIRO	X																	230301	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF24	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	6.960%	$27,900	12	$0	$0	Si	$123,900
15	PT	6349181	NAVARRO LUIS OMAR	X	X																230301	5	$166,667	$26,700	EPS002	5	$166,667	$6,700	CCF24	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$0	$0	Si	$51,800
16	CC	1012374044	OLAYA QUIROGA JOHN FREDY	X																	230301	17	$566,667	$90,700	EPS017	17	$566,667	$22,700	CCF24	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	6.960%	$39,500	17	$0	$0	Si	$175,600
17	CC	13526015	PARDO NIÑO ARISTIRES		X																231001	18	$600,000	$96,000	EPS017	18	$600,000	$24,000	CCF24	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	Si	$185,800
18	CC	11306686	PIÑEROS RODRIGUEZ JOSE MARCEL	X	X																	0	$0	$0	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	Si	$10,100
19	CC	1069712556	PIRANEQUE PARRA JUAN PABLO	X	X																230301	3	$100,000	$16,000	EPSC34	3	$100,000	$4,000	CCF24	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	6.960%	$7,000	3	$0	$0	Si	$31,000
20	CC	1077420397	VALENCIA RIVAS EDWIN																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
21	CC	1032393303	VARGAS RAMOS VICTOR ALFONSO	X	X																230301	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	Si	$20,800
Total			**Afiliados(21)**																				$14,333,336	$2,293,600			$14,400,003	$576,300			$14,400,003	$576,300			$14,400,003		$1,003,000		$0	$0		$4,449,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$2,293,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,056,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,003,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,003,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$576,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	$576,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$576,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$4,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$209,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$136,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$68,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$118,700
TOTAL				**21**	**$4,449,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901604402	9	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4612735	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1739258279	9442417353	Y	2022/11/02	2022/11/03	BANCOLOMBIA	1	$239,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52811695	CHACON ADRIANA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0	No	$69,600
2	CC	79584718	FARFAN LUIS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
3	CC	1069764656	OVALLE JUAN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	13	$433,334	$30,200	0	$0	$0	No	$30,200
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,433,334	$239,000		$0	$0		$239,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901604402	9	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4612735	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1739258279	9442417353	Y	2022/11/02	2022/11/03	BANCOLOMBIA	1	$239,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$239,000	$300	$0	$239,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$239,000	$300	$0	$239,300
TOTAL				3	$239,000	$300	$0	$239,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901604402	9	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4612735	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1739354694	9441532358	E	2022/11/02	2022/11/03	BANCOLOMBIA	1	$1,899,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1022999139	BULLA ANNIE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	1069732511	QUINTERO CESAR																		230301	30	$4,000,000	$680,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400
Total	**Afiliados(2)**																						$6,000,000	$1,000,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$417,600		$0	$0		$1,897,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901604402	9	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AC 24 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4612735	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1739354694	9441532358	E	2022/11/02	2022/11/03	BANCOLOMBIA	1	$1,899,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,000,000	$1,200	$0	$1,001,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,000,000	$1,200	$0	$1,001,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$417,600	$500	$0	$418,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$417,600	$500	$0	$418,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$240,000	$300	$0	$240,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$240,000	$300	$0	$240,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$240,000	$300	$0	$240,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$240,000	$300	$0	$240,300
TOTAL				**2**	**$1,897,600**	**$2,300**	**$0**	**$1,899,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901454513	3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1746402502	9442528021	E	2022/11/03	2022/11/08	BANCO CAJA SOCIAL	5	$12,781,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIOBUCARAMANGA (6 Afiliados)																							$2,533,335	$405,500			$2,533,335	$101,500			$2,533,335	$101,500			$2,533,335		$176,700		$0	$0		$785,200
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (6 Afiliados)																							$2,533,335	$405,500			$2,533,335	$101,500			$2,533,335	$101,500			$2,533,335		$176,700		$0	$0		$785,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																							$2,533,335	$405,500			$2,533,335	$101,500			$2,533,335	$101,500			$2,533,335		$176,700		$0	$0		$785,200
1	PT	1763161	BRAVO MONTES LINO JESUS	X	X																230301	3	$100,000	$16,000	EPS041	3	$100,000	$4,000	CCF40	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	6.960%	$7,000	3	$0	$0	Si	$31,000
2	CC	1127664141	FERIA BOSCAN LUIS FIDEL	X																	230301	20	$666,667	$106,700	EPS002	20	$666,667	$26,700	CCF40	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	6.960%	$46,500	20	$0	$0	Si	$206,600
3	PT	6760707	LOAIZA GARCIA FRANKLIN DE JESUS	X	X																230301	25	$833,334	$133,400	EPS002	25	$833,334	$33,400	CCF40	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	Si	$258,300
4	PT	5500526	MORILLO VILLASMIL JOSE ANGEL	X	X																230301	2	$66,667	$10,700	EPS041	2	$66,667	$2,700	CCF40	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	Si	$20,800
5	CC	1148693011	PINEDA ACOSTA JEVINSON	X																	230201	24	$800,000	$128,000	EPS002	24	$800,000	$32,000	CCF40	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	Si	$247,700
6	PT	5213396	ROJANO CHOURIO LUIS SEGUNDO	X	X																230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF40	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	Si	$20,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUSAGASUGA (11 Afiliados)																							$7,966,668	$1,274,800			$7,966,668	$318,800			$7,966,668	$318,800			$7,966,668		$554,900		$0	$0		$2,467,300
Centro de Trabajo: FUSAGASUGA (11 Afiliados)																							$7,966,668	$1,274,800			$7,966,668	$318,800			$7,966,668	$318,800			$7,966,668		$554,900		$0	$0		$2,467,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$7,966,668	$1,274,800			$7,966,668	$318,800			$7,966,668	$318,800			$7,966,668		$554,900		$0	$0		$2,467,300
7	CC	1069898948	AMAYA GOMEZ YOHAN ANGEL	X																	230201	8	$266,667	$42,700	EPS017	8	$266,667	$10,700	CCF24	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	6.960%	$18,600	8	$0	$0	Si	$82,700
8	CC	93296008	BUITRAGO CARLOS REINEL		X																230301	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF24	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	6.960%	$11,700	5	$0	$0	Si	$51,800
9	CC	74330071	CASTELBLANCO MELO HECTOR	X																	230201	28	$933,334	$149,400	EPS008	28	$933,334	$37,400	CCF24	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	6.960%	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
10	CC	1069745753	MEDELLIN FONSECA EDWIN ALEXIS		X																230201	27	$900,000	$144,000	EPS017	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	6.960%	$62,700	27	$0	$0	Si	$278,700
11	CC	1192890245	MENA CORDOBA CARLOS ANDRES																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
12	CC	11385663	MORALES LEON HECTOR AUGUSTO	X	X																230301	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF24	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	6.960%	$14,000	6	$0	$0	Si	$62,000
13	CC	80442717	MUÑOZ LEON EVERLEY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
14	CC	1030635521	PULIDO FAJARDO FERNEY		X																230301	27	$900,000	$144,000	EPS010	27	$900,000	$36,000	CCF24	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	6.960%	$62,700	27	$0	$0	Si	$278,700
15	CC	1055226732	RICO CARDENAS FILDARDO ANTONIO		X																230301	18	$600,000	$96,000	EPS017	18	$600,000	$24,000	CCF24	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	Si	$185,800
16	CC	74333386	RODRIGUEZ BURGOS PLINIO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
17	CC	74333979	RODRIGUEZ BURGOS POMPILIO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CLAUDIA (8 Afiliados)																							$4,733,335	$757,500			$5,733,335	$229,500			$5,733,335	$229,500			$5,733,335		$399,400		$0	$0		$1,615,900

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901454513	3	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOBUCARAMANGA	calle 136 157 10	BUCARAMANGA-SANTANDER	8537006	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1746402502	9442528021	E	2022/11/03	2022/11/08	BANCO CAJA SOCIAL	5	$12,781,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	$6,550,100	$33,000	$0	$6,583,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$810,800	$4,100	$0	$814,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$464,000	$2,400	$0	$466,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$3,173,700	$15,900	$0	$3,189,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$2,101,600	$10,600	$0	$2,112,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$2,850,600	$14,300	$0	$2,864,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	$2,850,600	$14,300	$0	$2,864,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				54	$1,638,000	$8,400	$0	$1,646,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$588,200	$3,000	$0	$591,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$101,500	$600	$0	$102,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	30	$948,300	$4,800	$0	$953,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				54	$1,678,100	$8,800	$0	$1,686,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$5,400	$100	$0	$5,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$113,500	$600	$0	$114,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$153,400	$800	$0	$154,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$476,100	$2,400	$0	$478,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$256,100	$1,300	$0	$257,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$45,400	$300	$0	$45,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$588,200	$3,000	$0	$591,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$40,000	$300	$0	$40,300
TOTAL				54	$12,716,800	$64,500	$0	$12,781,300

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN JOSE OVALLE RAMIREZ identificado(a) con CC 1069764656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: OVALLE RAMIREZ JUAN JOSE CC 1069764656

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9441931540	1000010069	I	2022-11-09	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	
9441931540	1000010069	I	2022-11-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	

APORTANTE: CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 NI 901604402

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9442417353	1739258279	Y	2022-11-03	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	13	X																

Este certificado se expide el día 2022-11-18 a las 09:11.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79584718	LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ	CL 48C SUR 24-35 INT 14 APTO 333	7904161	ing.luisfarfanv@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	28/10/2022	62858948	$1.327.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	562.500	0		0		0	0	0	0	562.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	720.000	0	0	22.500	22.500	0	0		765.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	562.500	562.500
Pensión	1	765.000	765.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.327.500	1.327.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79584718	LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ	CL 48C SUR 24-35 INT 14 APTO 333	7904161	ing.luisfarfanv@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	28/10/2022	62858948	$1.327.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79584718	FARFAN VELASQUEZ LUIS GABRIEL	3	0			N																	230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS017	4.500.000	562.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52381164	SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ	KR 64 A 22 14 TO 2 AP 603	4672735	rhumanos@estudios.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	04/11/2022	63092329	$780.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	275.000	0		0		0	0	0	0	275.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	153.200				153.200	0	0	153.200			1.532	153.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	275.000	275.000
Pensión	1	352.000	352.000
Riesgos Laborales	1	153.200	153.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	780.200	780.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52381164	SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ		KR 64 A 22 14 TO 2 AP 603	4672735	rhumanos@estudios.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	04/11/2022	63092329	$780.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52381164	GALINDO SANCHEZ SANDRA LILIANA	57	0			N																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	275.000	14-25	2.200.000	5	153.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 2 REGISTRO DE INDUCCION Y NOTIFICACION

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 25/02/2019

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN:	CARGO:
TEMA: Autocuidado y manipulacion de cargas	

FECHA: 18 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO
INDUCCIÓN [ ]
CHARLA INFORMATIVA [ ]
CAPACITACIÓN [x]
ENTRENAMIENTO [ ]
OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Everley Muñoz	8000 2717	Ayudante	Everley Muñoz
Leonardo Corralito	32 312 86	Ayudante	Leonardo Corralito
Jhon olaya	1012 37 0004	Ayudante	
[illegible]	110-2-72309	[illegible]	
Jose Luis Pozos	1122 0262	Oficial	Jose Luis Pozos
Leonardo Carpas	93 19 225	Oficial	
Carlos Andres Mena	11 923 20 202	Ayudante	
Julio Cesar Leal	1098-208	Oficial	JULIO L.
Jose alberto Hose	1022 967 6197	Oficial	
Oswaldo Arenas	79008 loc	Ayudante	

(Firma) _____

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 25/02/2019

Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Colmdo | CARGO: Residente

TEMA: Uso y importancia de los EPP,

FECHA: 8-Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA DE TERMINACIÓN: 3:30 Pm

TIPO

INDUCCIÓN [ ] | CAPACITACIÓN [x]

CHARLA INFORMATJVA [ ] | ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Carlos Andres Mena	1192590245	Ayudante	
Julio cesar Rodriguez	1059984205	Oficial	Julio R.
Diego Muñoz	8239223	Ayudante	
Everley Muñoz	80002717	Ayudante	Everley Muñoz C.
Edwin Corzo	1123799	Ayudante	
Leonardo campos	234 9225	Oficial	
Felipe Negret	1030522709	Ayudante	
Jose alberto Nuse	1022967617	Oficial	
Jose Olivos	19818999	Ayudante	Jose Olivos
Osvaldo Arenas	79008102	Ayudante	
Leonardo Carabito	3239286	Ayudante	Leonardo Carabito
Juan Lara Rojas	1122076	Oficial	Juan Lara Rojas

(Firma) Sandra Colmdo

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, David Penagos, identificado con la cédula de ciudadanía número 1100696559, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como Ayudante, para constancia y prueba firmo a los 21 días del mes de Nov de 2022.

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador: _____

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	29/08/2022	0

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Galindo **CARGO:** Residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 21 Noviembre 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [x] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
David Penagos	1067 69 559	Ayudante	

(Firma)

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, Diego Muñoz-, identificado con la cédula de ciudadanía número 82 392 423, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como Ayudante, para constancia y prueba firmo a los 15 días del mes de Nov de 2022.

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador: _____

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	2/03/2020	0

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Galindo **CARGO:** Residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 15 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Diego Muñoz	82 392 023	Ayudante	

(Firma) Sandra Galindo

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, Edwin Garzón Ortua, identificado con la cédula de ciudadanía número 11 257 299, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como Ayudante, para constancia y prueba firmo a los 21 días del mes de Nov de 2022.

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador: EDWIN GARZÓN HORTUA

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	29/08/2022	0

SEDE O PROYECTO: Parque llano verde

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Galindo **CARGO:** Residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 24 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Edwin Garzón O	44 252 299	Ayudante	

(Firma) Sandra Galindo

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, Guillermo León castrillón, identificado con la cédula de ciudadanía número 1017172738, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como Ayudante, para constancia y prueba firmo a los 23 días del mes de Nouj de 2022.

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador: GUILLERMO LEON CASTRILLON

CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	29/08/2022	0

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Galindo **CARGO:** Residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 23-Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
León castrillón	1017172738	Aydante	GUILLERMO LEON

(Firma) Sandra Galindo

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, Julio Cesar Rodriguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1059981865, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como Oficial, para constancia y prueba firmo a los 3 días del mes de 11 de 2022.

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador: Julio Cesar Rodriguez

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	2/03/2020	0

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Cealindo **CARGO:** Residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 3 - 11 - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Julio cesar Rodriguez	1059981265	oficial	Julio c Rodriguez

(Firma) Sandra Cealindo

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, Leonardo Garavito Bernal, identificado con la cédula de ciudadanía número 82.392.861, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como Ayudante, para constancia y prueba firmo a los 15 días del mes de Nov de 2022.

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador: Leonardo Garavito

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	2/03/2020	0

SEDE O PROYECTO: Centro de integración e innovación Social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Galindo **CARGO:** Residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 15-Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Leonardo Garabito Bernal	82 392 864	Ayudante	Leonardo Garavito

(Firma) Sandra Galindo

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, Libardo Romero, identificado con la cédula de ciudadanía número 19374145, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como vigilante, para constancia y prueba firmo a los 09 días del mes de NOV de 2022

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador: Libardo Romero

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	2/03/2020	0

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion & inclusion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Cedeño **CARGO:** Residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 5 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Libardo	1937414[illegible]	Vigilante	

(Firma) Sandra Cedeño

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGRO	SI	NO	NA	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA
Físico	X			
Químico	X			
Biológico	X			
Seguridad	X			
Biomecánico	X			
Psicosocial	X			

Yo, Guillome Marcelo Hendez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1069213880, declaro y doy testimonio de que fui notificado de los peligros a los cuales estoy expuesto de acuerdo a mi cargo y actividad a desarrollar como Agodonle, para constancia y prueba firmo a los 22 días del mes de Nov de 2022.

Así mismo realizo mi auto reporte de condiciones de salud:

Bueno

Firma del trabajador:

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST- F-01	
		FECHA	VERSION
	FORMATO DE ASISTENCIA	29/08/2022	0

SEDE O PROYECTO: centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION: Sandra Galindo **CARGO:** residente

TEMA: INDUCCION SST, AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI, SG-SST, EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, POST-INCAPACIDAD Y DE RETIRO, POLITICA SST, POLITICA TABACO, ALCOHOL Y DROGAS, POLITICA MA, POLITICA SEGURIDAD VIAL, RIT, RHSI, COPASST, CCL, PLAN DE EMERGENCIAS, USO ADECUADO DE EPP, REPORTE Y ATENCIÓN DE AT, NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, RESPONSABILIDADES SST SEGUN CARGO, AUTOREPORTE CONDICONES DE SEGURIDAD Y SALUD.

FECHA: 22-Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 9:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [x] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Marcela Mendez	1069 315 880	Agodank	

(Firma) Sandra Galindo

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 3 EXAMENES MEDICOS

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.404

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ARK INGENIERIA	**ARK INGENIERIA**
Nombre de la empresa	**Empresa en misión**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

GARZON HORTUA EDWIN	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	43 AÑOS 4 MESES 29 DÍAS	CC (Tipo)	11.257.299 (Número)
Apellidos y Nombres				

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON CRITERIOS MEDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
X1053D1J6404

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: GARZON HORTUA EDWIN

CC: 11.257.299

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.367

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	**11** MES	**2022** AÑO	**FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA)** Ciudad	**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

ARK INGENIERIA	**ARK INGENIERIA**
Nombre de la empresa	**Empresa en misión**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

CASTRILLON RESTREPO GUILLERMO LEON	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	37 AÑOS 1 MESES 15 DÍAS	CC	1.017.172.738
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
VALORACIÓN POR EPS : CITA EN EPS MEDICO GENERAL CON TENSIONES ARTERIALES DE 8 DIAS	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR. HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
D1053J1P6367

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: CASTRILLON RESTREPO GUILLERMO LEON

CC: 1.017.172.738

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 5.963

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
09 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	**EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO**

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	**Empresa en misión**
ARK INGENIERIA	**ARK INGENIERIA**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
RODRIGUEZ QUINTANA JULIO CESAR	MASCULINO	35 AÑOS 10 MESES 17 DÍAS	CC (Tipo)	1.059.981.245 (Número)

Cargo
OFICIAL DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON CRITERIOS MEDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	**TIPO**	**RECOMENDACIONES**
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	**RECOMENDACIONES OCUPACIONALES**	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES**
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA EJERCICIO, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR, ASISTIR A CAPACITACIONES EN SST POR PARTE DE LA EMPRESA.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
T1053Z1F5963

Aspirante o Trabajador

JULIO R

Firma:

Nombre: RODRIGUEZ QUINTANA JULIO CESAR

CC: 1.059.981.245

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.405

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
ARK INGENIERIA	ARK INGENIERIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GARAVITO BERNAL LEONARDO	MASCULINO	44 AÑOS 11 MESES 13 DÍAS	CC (Tipo)	82.392.861 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: .

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL : DEBE REALIZAR CORRECCION VISUAL Y USO PERMANENTE	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : CITA OPTOMETRIA, NUTRICION	SVE VISUAL	CONTROL DE PESO
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR. SEGUIMIENTO ESTRICTO DE SU CORRECCION VISUAL.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
C1053I1O6405

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: GARAVITO BERNAL LEONARDO

CC: 82.392.861

MEDIPRO IPS
SALUD OCUPACIONAL
NIT. 830.592.359-3

1001864900 814618

CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL - INGRESO
PARA TRABAJO EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS

N 300/8725

FECHA:	29 DE AGOSTO DEL 2022	EXÁMEN DE INGRESO	X
NOMBRE:	LIBARDO ROMERO ALVARES	EXÁMEN DE EGRESO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	19.374.145	EXÁMEN PERIÓDICO	
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES CIVILES BURGOS SAS-NIT 9014545133	EDAD 63	R.H. O+
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA-EPS.SURA	PESO 76	SEXO M

RESULTADOS EXÁMENES PARACLÍNICOS

ESPIROMETRÍA	NO	DEC.421-20/20
AUDIOMETRÍA	SI	OK
VISIOMETRÍA	SI	OK
ELECTROCARDIOGRAMA	SI	OK
PSICOLÓGICO		
RADIOLOGÍA (TÚNEL DEL CARPO / COLUMNA / TÓRAX)		
VACUNAS	SI	OK

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

CUADRO HEMÁTICO IVG		
SEROLOGÍA		
GLICEMIA	SI	OK
COLESTEROL	SI	OK
TRIGLICERIDOS	SI	OK
PARCIAL DE ORINA	SI	OK
SODIO		
POTASIO		
PLOMO		

FROTIS FARÍNGEO/CON CULTIVOS		
KOH UÑAS		
PRUEBA DE EMBARAZO		
HEMOCLASIFICACIÓN		
TSH		
AMILASA		
BACILOCOSPIA		

***IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA** A la fecha hacemos constar que el trabajador fué examinado y los resultados obtenidos fueron los siguientes:*

APTO	SI	*APTO CON RESTRICCIÓN*		*NO APTO*		*APLAZADO*	
APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI			*CONCEPTO*	SI		

RECOMENDACIONES

1.	CONTROL EPS	APTO PARA EL TRABAJO SIN NINGUNA RESTRICCION
2.	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
3.	HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	

RECOMENDACIONES: USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. NO PRESENTA MORBILIDADES PREEXISTENTES SEGÚN CIRCULAR 030 DEL 2020.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, los beneficios, la interpretación y riesgos del exámen médico, paraclinico(s) y/o ocupacionales que me van a practicar. Garantizo que las respuestas suministradas por mi en estos exámenes y presentes en este documento son veráces y completas. Entendiendo que en este proceso es voluntario y libre de toda cohesión y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento antes de que se realizaran las pruebas, fui informado de las medidas que el Profesional de Salud Ocupacional de MEDIPRO tomará para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, los autorizo para que den a conocer, por cualquier medio electrónico o físico la información registrada a la persona o entidad ¿, contemplada en la legislación actual vigente, para el buen cumplimiento del programa de Salud Ocupacional de la empresa. De los cuales recibiré los resultados y aseguro estar de acuerdo con el proceso. Hago constar con mi firma que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi consentimiento.

Claudia Patricia Gonzalez S.
Medico Especialista
Gerencia en Salud Ocupacional
Res.11409-2014 C.C.52.503.829

MÉDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL R.M.

FIRMA TRABAJADOR


C.C. No.

HUELLA

***Declaración de CONFIDELIDAD:** El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En Concordancia Con la Resolución 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.*

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 6.368

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	11 MES	2022 AÑO	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
ARK INGENIERIA	ARK INGENIERIA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MENDEZ DIAZ VILLANE MARCELA	FEMENINO	36 AÑOS 3 MESES 17 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1.069.715.880

Cargo
AUXILIAR DE TRAFICO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO (CUMPLE CON CRITERIOS MEDICOS PARA EL CARGO)

Observaciones: .

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : CITA NUTRICION	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES EN HÁBITOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. DIETA SALUDABLE, EFECTUAR EJERCICIO CARDIOVASCULAR DURANTE 30 MINUTOS DIARIOS, INICIAR PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE INCLUYAN ESTIRAMIENTOS, REALIZAR LAS PAUSAS ACTIVAS 5 MINUTOS CADA 2 HORAS, RECOMENDACIONES DE HIGIENE POSTURAL, USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA LABOR.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: VARGAS ARCILA SANDRA E

R. M.: 0698-03 **L.S.O.:** 2462-15

Código de Seguridad
A1053G1M6368

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: MENDEZ DIAZ VILLANE MARCELA

CC: 1.069.715.880

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 4 COPASST Y CCL

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"	OCTUBRE 2022	
CONTRATO No. 2022-0586	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Versión 0	

ACTA DE REUNION CCL

FECHA: 10/11/2022

ACTA Nº 1

ASISTENTES:

LUIS FARFAN

POMPILIO RODRIGUEZ

ORDEN DEL DIA:

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LO SULTIMOS TRES MESES

HORA DE INCIO: 9:00 AM

HORA DE FINALIZACION: 10:00AM

DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESENTARON CASOS DE ACOSO LABORAL.

FIRMA DE ASISTENTES



POMPILIO RODRIGUEZ



LUIS FARFAN

FECHA 11/10/2022

ACTA No 1

ASISTENTES:

- SANDRA GALINDO
- POMPILIO RODRIGUEZ
- LUIS GABRIEL FARFAN
- CESAR QUINTERO

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DE ACTA DE CONFORMACION DE COPASST
2. . PERSONAL EN OBRA
3. CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MES
4. CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES PRECENTADOS EN EL MES
5. OTROS

HORA DE INICIO: 9:00 AM

HORA FINALIZACION: 10:30 AM

FECHA PROXIMA REUNION: 10 NOVIEMBRE 2022

HORA PROXIMA REUNION: 10:00 AM

TEMAS TRATADOS	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
LECTURA DE ACTA DE CONFORMACION DE COPASST	CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES	COPPAST	11-10-2022	11-10-2022	DAR CUMPLIMIENTO POR CADA INTEGRANTE
PERSONAL EN OBRA	CUMPLIMINTO A LAS ACTIVIDADES	COPPAST	11-10-2022	11-10-2022	DAR CUMPLIMIENTO POR CADA INTEGRANTE
CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MES SEGÚN CRONOGRAMA	CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES	COPPAST	11-10-2022	11-10-2022	DAR CUMPLIMIENTO POR CADA INTEGRANTE
CASOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DON FUERON CERO EN ESTE MES	CUMPLIMINTO A LAS ACTIVIDADES	COPPAST	11-10-2022	11-10-2022	DAR CUMPLIMIENTO POR CADA INTEGRANTE
OTROS APACITACION PARA COPPAST	CUMPLIMINTO A LAS ACTIVIDADES	COPPAST	11-10-2022	11-10-2022	DAR CUMPLIMIENTO POR CADA INTEGRANTE

CONVERSIONES EN SEGUIMIENTO:

EJECUTADO ☐

PARCIAL ☐

PENDIENTE ☐

OBSEREVACIONES:

NINGUNA

FIRMA DE ASITENTES

Sandra Galindo

SANDRA GALINDO

POMPILIO RODRIGUEZ

LUIS GABRIEL FARFAN

CESAR RICARDO QUINTERO

CESAR QUINTERO

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRAFICO

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1. COMITÉ



FOTO 2. SEÑALIZACION





FOTO 3. ENTEGA EPPS	*FOTO 4. SEÑALIZACION*
	
FOTO 5. ENTREGA EPPS	*FOTO 6. ASEO Y LIMPIEZA*
	
FOTO 7. ENTREGA DE OBSEQUIO PARA EL DIA DEL NIÑO	*FOTO 8. . ENTREGA DE OBSEQUIO PARA EL DIA DEL NIÑO*

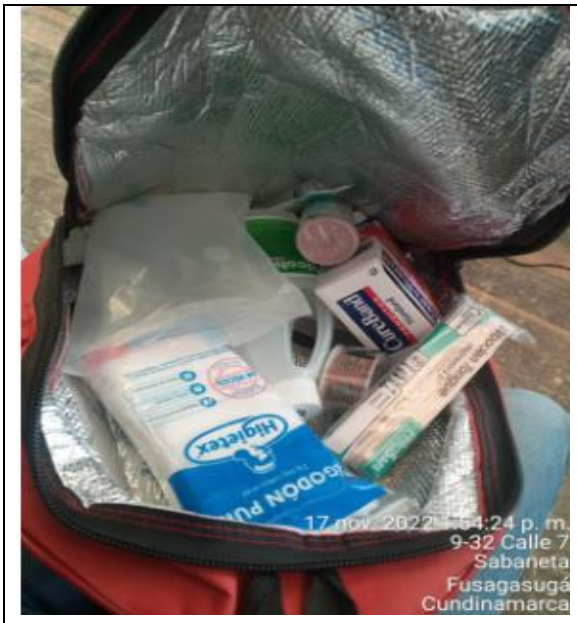


FOTO 9. BOTIQUIN



FOTO 10. ENTREGA DE EPPS



FOTO 11. ENTREGA DE EPPS



FOTO 12. CAMILLA



FOTO 13. ENTREGA DE EPPS



FOTO 14. ENTREGA DE EPPS



FOTO 15. ENTREGA DE EPPS



FOTO 16. ENTREGA DE EPPS



FIGURA 17 ENTREGA DE EPPS



FIGURA 18 ENTREGA DE EPPS

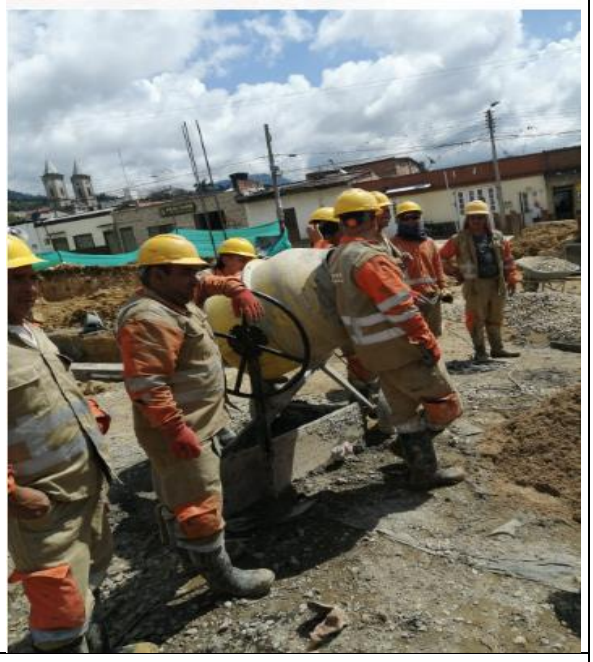


FIGURA 19 SEÑALIZACION



SEÑALIZACION

	
SEÑALIZACION	*SEÑALIZACION*
	
HIDRATACION	*CARPA*

	
CAPACITACION	*CAPACITACION*
	
SEÑALIZACION	*ASEO Y LIMPIEZA*

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 6 ENTREGA DE EPPS

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
	Fecha: 02/03/2020
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Guillermo Leon castrillon — C.C. No. 1019172938

CARGO: Ayudante — FECHA DE INGRESO: 23-11-2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO															Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	
23-11-22	X	X		X		X	X		X	X			X			GUILLERMO

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
	Fecha: 02/03/2020
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: David Penagos C.C. No. 1106769559

CARGO: Ayudante FECHA DE INGRESO: 21-Nov-2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO															Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	
21-11-22	X	X				X	X		X	X			X	X		

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
		Fecha: 02/03/2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edwin Garzon C.C. No. 11 252 249

CARGO: Ayudante FECHA DE INGRESO: 27-11-2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO															Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	
27-11-22	X	X		X		X	X		X	X			X			

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
	Fecha: 02/03/2020
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Leonardo Carabito Bernal — C.C. No. 82 392 864

CARGO: Ayudante — FECHA DE INGRESO: 15-11-2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO															Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	
15-11-22	X	X		X		X	X		X	X			X			Leonardo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
	Fecha: 02/03/2020
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Diego Muñoz	C.C. No.	82 392 023
CARGO:	Ayudante	FECHA DE INGRESO:	15 - Nov - 2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO															Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	
15-11-22	X	X		X		X	X		X	X			X			

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
	Fecha: 02/03/2020
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Libardo Ramirez | C.C. No. 193 214 5

CARGO: Ayudante - vigilante | FECHA DE INGRESO: 5-11-2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO															Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	
5-11-22	X	X		X		X	X		X	X		X				

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
		Fecha: 02/03/2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Julio cesar Rodriguez	C.C. No.	1053981248
CARGO:	Oficial	FECHA DE INGRESO:	3-11-2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO															Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	
3-11-22	X	X		X			X		X	X			X			Julio Rodriguez

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
		Fecha: 02/03/2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Villane Marcelo Mendez — C.C. No. 1069 715 880

CARGO: — FECHA DE INGRESO: 22-Nov-2022

Fecha	DETALLE DEL ARTICULO ENTREGADO														Firma del trabajador
	Camisa	Pantalon	Overol	Tapa oidos inserción	Tapa oidos copa	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas caucho	Botas material	Chaleco tipo periodista	Otros	

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
	Fecha: 02/03/2020
ENTREGA, REPOSICIÓN O CAMBIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

FECHA: Noviembre 2022

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	Pantalon	Camisa	Overol	Tapaoidos de inserción	Tapaoido de copa	Gafas	Casco	Barbuquejo	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas de caucho	Botas material	Chaleco	FIRMA
Felipe Mejia	1030527290								X							Felipe Mejia
Felipe Mejia	1030527289								X							Felipe Mejia
Jose Pinedo	19.818999					X			X							Jose Pinedo
Julio R	1059981945					X			X							Julio R
Jhon Fredy	1017374044					X			X							
Diego Muñoz	82392423					X			X							
Juan Esteban Rojas	1122069								X							
Isaac Arenas	7720851092					X			X							
Felipe Mejia	1030527209								X							Felipe Mejia
Leonardo Bonavito	82392861								X							Leonardo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST - F - 04
	Fecha: 02/03/20
ENTREGA, REPOSICIÓN O CAMBIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 1

FECHA: Noviembre 2022

NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	Pantalon	Camisa	Overol	tapaoidos de inserción	Tapaoido de copa	Gafas	Casco	Barbuquejo	Guantes	Tapabocas	Abrigo impermeable	Botas de caucho	Bolas material	Chaleco	FIRMA
Jose Oliveira Muñoz	1072967017								X							
Eudaldo Arrogas	1091081102								X							
Eveley Muñoz J	80447717								X							Eveley Muñoz
Jose D'Luca	19.818999								X							Jose D'Luca
Leonardo Garavito	82392861								X							Leonardo
Juan Cruz Rojas	1192969								X							Juan Cruz Ro
Diego Munoz	82392423								X							Diego
Jhon F. Ologa	1012374099								X							
Julio Rodriguez	1059981245								X							Julio R
Carlos Mena	1192 [illegible] 0245								X							

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 7 INPECCIONES

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-24
		Fecha: 02/03/2020
	FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	Versión 1

Nombre del que Inspecciona: Sandra Galindo

Cargo: Residente

Fecha de Inspección: 24 - Noviembre - 2022

Ubicación del Botiquín: centro de integración

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
Guantes quirúrgicos	B	100	N.A
Tapabocas	B	50	N.A
Copitos de algodón	—	—	—
Curas	—	—	—
Esparadrapo	B	2	N.A
Gasa	B	1	N.A
Yodopavinona	B	2	N.A
Bajalenguas	B	10	N A
Vendas elásticas	B	1	N.A
Vendaje triangular	—	—	—
Ganchos nodriza	—	—	—
Tijeras	—	—	—
Termómetro	B	1	N A
Pinzas	—	—	—
Linterna	—	—	—
Pilas para linterna	—	—	—
Libreta de notas	—	—	—
Lapiz	—	—	—

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SST-F-25
	Fecha: 02/03/2020
FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Versión 1

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Sandra Galindo **SEDE / OBRA:** centro de integracion

CARGO: Residente **FECHA:** 21 -Noviembre -2022

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	Multipropositos	centro integracion	40	Oct 2023	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-17
		Fecha: 02/03/2020
	INSPECCIÓN GENERAL SST	Versión 1

LUGAR: Centro de integracion e innovacion social

FECHA INSPECCIÓN: 21 - Noviembre - 2022

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN : Sandra Galindo **CARGO :** Residente

Marque según criterio: B= Bueno M= Malo NA= No aplica

B: la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimientos.	M: la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata.	NO APLICA " NA" : El parámetro evaluado no aplica en cuenta el criterio de evaluación.

PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	M	NA	OBSERVACIONES
Entrega y uso de Elementos De protección personal	B			
Orden y aseo de los lugares de trabajo	✓			
Estado de las instalaciones locativas de los lugares de trabajo	✓			
Exámenes médicos de los trabajadores	✓			
Pagos De Seguridad Social	✓			
Identificación de peligros actualizada	✓			
Identifiación de requisitos legales Actualizada	✓			
cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los trabajadores	✓			
Ejecución del programa de capacitación	✓			
Implementación de medidas de prevención y control de riesgos.	✓			

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 8 CRONOGRAMA

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CONS

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

ACTIVIDADES/GENERALES		SEPTEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
		MES 1				MES 2				MES 3				MES4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 9				MES 9				MES 9			
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I. GENERALIDADES																																																
Inducción y notificación de riesgos, Afiliaciones.	P	x				x					x																																					
	E	x				X					x																																					
Revisión/ Actualización de Matriz de Peligros	P																																															
	E																																														
Socializacion del Reglamento de HYSST y Politicas	P																																														
Entrega de informe mensual	P								x																																						
	E								X																																					
Pagos SGSS.	P											x																																				
	E											x																																				
Revisión de documentos.	P							x					x																																			
	E							x					x																																			
II. COPASST																																															
Conformación COPSSST	P			x																																											
	E			x																																											
Reunion Mensual COPASST	P								x				x																																			
	E								x				x																																			
Conformación CCL	P			x																																											
	E			x																																											
Capacitacion en Resolucion 2013/86, Inspecciones Planeadas de seguridad.	P																																														
	E																																														
Capacitacion en Resolucion 1401/2007	P																																														
	E																																														
Charlas diarias en protocolo de bioseguridad	P				x			x	x																																						
	E				x			x	x																																							
Capacitación en manejo de herramientas	P									x																																					
	E									x																																						
Capacitación en verificación de act	P																																														
	E																																														
Investigacion de accidentes de trabajo (Cada vez que se requiera)	P																																													
	E																																														
Realización de Inspecciones por COPASO	P																																														
	E																																														
III. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																																														
Realización de Exámenes médicos ocupacionales (Ingreso, por Cambio de Cargo, Reingreso, pot incapacidad, Egreso).	P	x								x																																				
	E	x								x																																					
IV. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL																																														
Material Particulado Y Ruido	P					x																																								
	E					X																																								
Capacitación sobre uso de EPP	P	x									x																																			
	E	x									x																																				
Higiene postural	P																																													
	E																																														
Capacitación Pausas Activas y/o Gimnasia Laboral	P																																													
	E																																														
Manipulación de cargas	P											x																																			
	E											x																																			
Capacitación Cuidado de las Manos	P				x																																									
	E				x																																										
Capacitación Sustancias Químias y su Manipulación	P						x																																							
	E						x																																							
Inspecciones de seguridad	P																																													
	E																																														
Revisión/ Actualización de las hojas de Seguridad y capacitación cuando se requiera	P							x																																					
	E							x																																							

NOTA: P, PROGRAMADO, E; EJECUTADO

Elaboró:

RESIDENTE SSTMA

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 9 MAQUINARIA Y EQUIPO

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO			
CÓDIGO FO-AC-41	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	**VERSIÓN** 4,0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **PERIODO EVALUADO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 10/11/2022 A 30/11/2022

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 586 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO: ""REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Periodo Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	1	1961	VOLQUETA	SENCILLA			0	MAQUINARIA CONTRATISTA
2	2	2014	VOLQUETA	SENCILLA			0	MAQUINARIA CONTRATISTA
3	3	2012	VOLQUETA	SENCILLA			0	MAQUINARIA CONTRATISTA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

NOTAS

No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo.,

TIPO : Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.

Sandra L. Calvo S.

(Nombre) (Firma)

(Nombre)

Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra **Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoría**

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : interventor

2da copia: contratista

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 82052

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC200326	HITACHI	ZX120	2001

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	HCM1S100P00062300

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	168838	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
12500 Kg	2740 mm	2690 mm	7610 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
ROCHA ZARAZA JEISON CAMILO	C.C. 1 069.7[illegible]

Escaneado con CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
26-03-2021	19-05-2021	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352006000020295	09/02/2006



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700001 5874

COSMOCOLOR-TM-20

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 10 CARACTERIZACION DE ACCIDENTES

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GIP-069	FORMATO No. 20 - CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES/ TERCEROS	2.0	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 30/09/2022

CONTRATO DE OBRA No. **0586-2022**

OBJETO OBJETO:"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

PERIODO DE INF: **31/08/2022** **A** **1/09/2022**

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Según NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Según NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCION/ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	VISITANTE	OTRO								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA										CODIGO	FACTORES PERSONALES	CODIGO	FACTORES DE TRABAJO	CODIGO	ACTOS SUBESTANDARES	CODIGO	CONDICIONES SUBESTANDARES				
1		X	12/09/2022		X				VICTOR ALFONSO CARDOZO JIMENEZ	1056929914	OPERRIO	45				X		X		X		12/09/2022	OBRA	OBRA	CAIDA DE OBJETO	LEVE	POR EXPOCION	FISICO	FISICO	FRACTURA	MANO				X		X				CHARLAS DE AUTO CUIDADO	13/09/2022	13/09/2022
2		X	**17/11/2022**		X				FELIPE MEGIA	1030527209	AYUDANTE	4				X		X		X		17/11/2022	OBRA	OBRA	CAIDA DE OBJETO	LEVE	EXPOCICON	FISICO	FISICO	APLASTAMIENTO LEVE	CUELLO				X		X				CHARLAS DE AUTO CUIDADO Y MEDIDAS PREVENTIVAS	18/117202	18/11/2022

Sandra L. Erdely S.

(Firma) _____

(Nombre): SANDRA ERDELY

Residente SISO del contratista

(Firma) _____

(Nombre)

Residente S&SO de la Interventoría

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 11 ACCIDENTE

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ SAS

TRANSVERSAL 12 N° 17-01 TELÉFONOS: 8868888/8889/8890

Clínica® BELÉN DE FUSAGASUGÁ

Fecha Actual : jueves, 17 noviembre 2022

NIT. 800174851-1

INCAPACIDAD MÉDICA

Nº144635

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 17/noviembre/2022 10:52 p. m.

Información Paciente: LUIS FELIPE MEJIA PEDROZA Tipo Paciente: Otro Sexo: Masculino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía Número: 1030527209 Edad: 36 Años / 4 Meses / 23 Días F. Nacimiento: 25/06/1986

Entidad: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. SURAMERICANA POLIZA VIDA, ACCIDENTE ESTUDIANTIL Y LABORAL

Médico: 1049621997 LAURA MELISSA LIZARAZO GONZALEZ

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Días de Incapacidad: 4 Fecha Inicial: 17/noviembre/2022 Fecha Final: 20/noviembre/2022

PACIENTE DE 36 AÑOS DE EDAD QUIEN ESTANDO EN EL TRABAJO PRESENTO CAIDA, CON CONTUSION EN MENTON Y REGION CERVICAL. PRESENTANDO COMPROMISO DE TEJIDO BLANDO,. SE DA INCAPACIDAD ,MEDICA POR 4 DIAS PARA CUIDADOS EN CASA .

DIAGNÓSTICO

S008 S008 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA

CC [redacted]

Profesional: LIZARAZO GONZALEZ LAURA MELISSA

Especialidad: MEDICINA GENERAL

SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ LTDA
TRANSVERSAL 12 N° 17-01 TELÉFONO: 8868888 / 8889 / 8890

Clínica BELÉN
NIT. 800174851-1

INDICACIÓN MEDICA

URGENCIAS

Nº Historia Clínica: 1030527209 — Nº Folio: 11 — Folio Asociado:

DATOS PERSONALES

Nombre Paciente:	LUIS FELIPE MEJIA PEDROZA	Identificacion:	1030527209 Sexo: Masculino
Fecha Nacimiento:	25/junio/1986 Edad Actual: 36 Años / 4 Meses / 23 Dias	Estado Civil:	Soltero
Dirección:	LA SALLLE	Teléfono:	3132130872
Procedencia:	FUSAGASUGA	Ocupación:	PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION

DATOS DE AFILIACIÓN

Entidad:	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	Régimen:	Regimen_Simplificado
Plan Beneficios:	SURAMERICANA POLIZA VIDA, ACCIDENTE ESTUDIANTIL Y LABORAL	Nivel - Estrato:	EXCENTO

DATOS DEL INGRESO

Responsable:	JOHANA RODRIGUEZ	Teléfono Resp:	3102933584
Dirección Resp:	LA SALLLE	Nº Ingreso:	1485244 Fecha: 17/11/2022 10:23:11 p. m.
Finalidad Consulta:	No_Aplica	Causa Externa:	Accidente_de_Trabajo

DIAGNÓSTICO

S008 S008 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA


S600 S600 - CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)

INDICACIÓN MEDICA

Tipo Indicacion: Urgencias_Observacion

Detalle:

CURACION
DICLOFENACO 75 MG IM AHORA
ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL AHORA
INCAPACIDAD MEDICA POR 4 DIAS.
CONTINUAR MANEJO DEL DOLOR EN CASA.

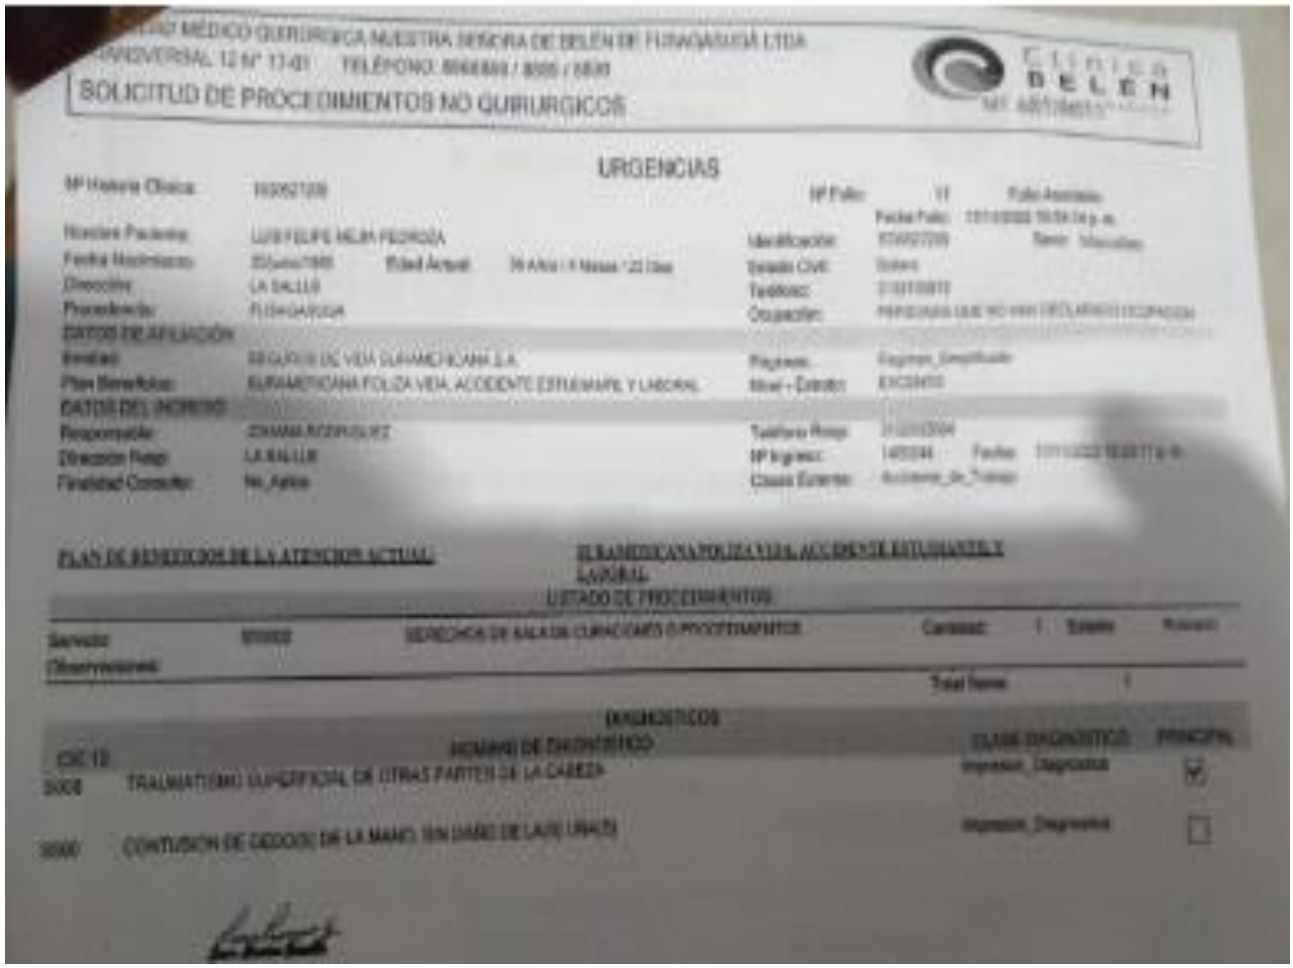

...MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FLORENCIA LTDA
...ANDIVERSAL 12 Nº 17-01 TELÉFONO: 8668868 / 8668 / 8668

SOLICITUD DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

Clínica BELÉN

URGENCIAS

Nº Historia Clínica: 1026527208 — Nº Folio: 11 — Folio Anexo:
Fecha Folio: [illegible]

Nombre Paciente: LUIS FELIPE MEJIA PEDROZA — Identificación: 1026527208 — Sexo: Masculino
Fecha Nacimiento: 25/Junio/1995 — Edad Actual: 26 Años 1 Meses 22 Días — Estado Civil: Soltero
Dirección: LA SALUD — Teléfono: 3138150872
Procedencia: FLOR GARZON — Ocupación: [illegible]

DATOS DE AFILIACIÓN
Entidad: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. — Régimen: Régimen_Simplificado
Plan Beneficios: SURAMERICANA POLIZA VIDA, ACCIDENTE ESTUDIANTIL Y LABORAL — Nivel - Estrato: ESCENTO

DATOS DEL INGRESO
Responsable: DIANA ROZO SUAREZ — Teléfono Resp: 3132512504
Dirección Resp: LA SALUD — Nº Ingreso: 1405344 — Fecha: [illegible]
Finalidad Consulta: No_Aplica — Causa Externa: Accidente_de_Trabajo

PLAN DE BENEFICIOS DE LA ATENCIÓN ACTUAL: SURAMERICANA POLIZA VIDA, ACCIDENTE ESTUDIANTIL Y LABORAL

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

Servicio			Cantidad	Estado	Autoriz.
Observaciones:	903895	SERVICIOS DE SALA DE CURACIONES O PROCEDIMIENTOS	1		
			Total Items	1	

DIAGNÓSTICOS

CIE 10	NOMBRE DE DIAGNÓSTICO	CLASE DIAGNÓSTICO	PRINCIPAL
S068	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA	Impresion_Diagnostica	☑
S600	CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)	Impresion_Diagnostica	☐

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	002	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

Nombre o razón social

ARK INGENIERIA SAS

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901447769

Dirección	Teléfono	Fax
CL 136 # 157A- 10 CASA	3217534107	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
AFILIACIONESOBRA2020@GMAIL.COM	BOGOTA D.C.	BOGOTA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5701001

EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

Dirección	Teléfono	Fax
CL 136 # 157A- 10 CASA	5837006	

Departamento	Municipio	Zona
BOGOTA D.C.	BOGOTA	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
MEJIA	PEDROZA	LUIS FELIPE

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1030527209	25061986	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CR 6 ESTE # 25 - 17	5837006	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
ALBAÑILES, MAMPOSTEROS Y AFINES	0:30

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
19102022	1000000	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
17112022 08:15:00	S	Jueves

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
9:15	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente (•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

( ) Almacenes o depósitos
( ) Áreas de producción
( ) Áreas recreativas o deportivas
( ) Corredores o pasillos
( ) Escaleras
( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
( ) Oficinas
( ) Otras áreas comunes
(•) Otro
FRENTE DE OBRA

Parte del cuerpo aparentemente afectado

(•) Cabeza
( ) Ojo
( ) Cuello
( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
( ) Tórax
( ) Abdomen
( ) Miembros superiores
( ) Manos
( ) Miembros inferiores
( ) Pies
( ) Ubicaciones múltiples
( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

( ) Fractura
( ) Luxación
( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
( ) Conmoción o trauma interno
( ) Amputación o ennucleación
( ) Herida
( ) Trauma superficial
(•) Golpe contusión o aplastamiento
( ) Quemadura
( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
( ) Asfixia
( ) Efecto de la electricidad
( ) Efecto nocivo de la radiación
( ) Lesiones múltiples
( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

( ) Máquinas y/o equipos
( ) Medios de transporte
( ) Aparatos
( ) Herramientas, implementos o utensilios
( ) Materiales o sustancias
( ) Radiaciones
(•) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
( ) Otros agentes no clasificados
( ) Animales (vivos o productos animales)
( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

( ) Caída de personas
( ) Caída de objetos
( ) Pisadas, choques o golpes
( ) Atrapamientos
( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
( ) Exposición o contacto con la electricidad
( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
(•) Golpes por o contra objetos
( ) Otro

Descripción del accidente

EL EMPLEADO LLEVABA UNA CARRETILLA CON MATERIAL CUANDO SE RESBALO GOLPEÁNDOSE LA CARA EN LA PARTE DE LA QUIJADA TIENE DOLOR SE REMITE A CENTRO MEDICO

Personas que presenciaron el accidente Hubo personas que presenciaron el accidente? (•) Si ( ) No

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	POMPILIO RODRIGUEZ BURGOS		
Cargo	CONTRATISTA	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	74333979
Apellidos y nombres	JHON FREDDY OLAYA	Documento de identidad	No.
Cargo	AYUDANTE	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1012374044

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	RODRIGUEZ JIMENEZ CLAUDIA YANETH	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1020719421
Cargo	ASISTENTE		

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

ARL | sura
17-11-2022 20:58:35
17-11-2022 20:58:34
RECIBIDO

Fecha Impresión 17-11-2022 20:58:39

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

CONTRATO DE OBRA No.2022-0586

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME AMBIENTAL

DEL 1 NOVIEMBRE E DEL 2022 AL 30 NOVIEMBRE DE SEPTIEMBRE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES 2022

NOVIEMBRE 2022

CONTRATO DE OBRA No.2022-0586

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INDICE DE MODIFICACIONES

Índice de Revisión	Fecha Modificación	Observaciones
00	29/11/2022	Versión inicial
01	29/11/2022	Observaciones

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Número de revisión		1
Elaborado por: CONSORCIO CONSTUEDIICACIONES 2022		
Responsable por elaboración Residente Ambiental del Proyecto	Nombre	SANDRA GALINDO
	Firma	Sandra Galindo
Revisado y Aprobado por: **CONSORCIO INTERVENTORIA 2022**		
Responsable por Revisión Residente Ambiental de interventoría	Nombre	
	Firma	Geraldine Cervera.
FECHA		

NOVIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

1. OBJETIVOS 5

1.1 OBJETIVO GENERAL 5

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5

2.1. Datos del Contratista 6

7.1. LOCALIZACIÓN 6

7.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 8

7.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

7.4. OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 8

1. GESTIÓN AMBIENTAL 9

3.1 COMPONENTE A GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10

3.2 MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJE 10

4 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 11

4.1 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio 11

4.2 Manejo de Materiales de Construcción 12

4.2.1 Control y Reporte de Materiales Reciclados Y Mezclas Asfálticas Mejoradas con GCR 13

4.3 Manejo Integral de Residuos Solidos 13

4.4. Control de Emisiones Atmosféricas 14

4.4.1 Manejo de maquinaria y equipos 14

4.5 Manejo Integral de Cuerpos de Agua 15

4.6 Plan de Señalización 15

4.7 Medidas ambientales dentro del protocolo de bioseguridad 16

4.8 Seguimiento Plan de Residuos de Construcción y Demolición 16

4.8.1 Indicadores del Plan de RCD´s 17

5 Unidades Sanitarias 18

6 CONCLUSIONES 18

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. INDUCCIÓN AMBIENTAL

ANEXO 2. FORMATO CONTROL DE MATERIALES

ANEXO 3. FORMATO DE GENERACION DE RCD

ANEXO 4. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

ANEXO 5. COI

ANEXO 6. VALES DE MATERIALESY ESCOMBROS

ANEXO 7. DOCUMENTACION DE MAQUINARIA

ANEXO 8. PLAN RCD

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1. DATOS CONTRATO DE OBRA

TABLA 2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

TABLA 3. PERSONAL AMBIENTAL EN OBRA.

TABLA 4. CAPACITACIONES EN EL PERIODO

TABLA 5. MATERIALES EN EL PERIODO

TABLA 6. REGISTRO DE RCD´S DISPUESTOS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

TABLA 7. MAQUINARIA Y VEHÍCULOS INGRESADOS

INTRODUCCIÓN

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022, ejecutará las obras requeridas por el contrato 0586 de 2022, **"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**

En este tercer informe se describen las actividades desarrolladas por el área ambiental durante la etapa de planeación, por tanto, se hace un seguimiento a las actividades preliminares programadas dentro del cronograma adjunto al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar las actividades realizadas por el área ambiental durante el período del presente informe, dentro de las actividades a ejecutar para el contrato 0582 de 2020 cuyo objeto es **: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se registran los datos más relevantes del proyecto en mención.

Nombre o Razón Social:	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
Nit:	901.604.402-9
Dirección:	AC 24-51 40 OF 36
Teléfonos:	601 467 2734
Actividad Económica:	7020 Actividades de consultoría de gestión 4290 construcción de otras obras de ingeniería civil

A continuación, se registran los datos más relevantes del proyecto en mención.

Tabla 1. DATOS CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	**0586-2022**
Objeto:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**
Contratante:	Alcaldía Fusagasugá Cundinamarca
Contratista:	Consorcio construedificaciones 2022
	NIT:901.604.402-9
Interventoría:	Consorcios interventores 2022
	NIT. 901.617.378-6
Valor Del Contrato:	$ $ 9-125.070.710
Plazo De Ejecución Inicial:	Siete (7) meses
Fecha De Inicio:	31 agosto 2022
Fecha de Terminación Inicial:	30 marzo 2023

2.1. Datos del Contratista

3. **NOMBRE:** CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
4. **R/L NOMBRE:** SANDRA LLIANA SANCHEZ
5. **TELEFONO:** 601.467.273.4
6. **DIRECCIÓN:** AC 24-51 40 OF 316
7. **EMAIL:** contabilidad@estudios.com.co

7.1. LOCALIZACIÓN

Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la Provincia del Sumapaz, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Con una población proyectada en el año 2020 de 147.631 habitantes, es el tercer municipio más poblado del departamento después de Bogotá y Soacha, también es el cuadragésimo quinto del país.5 Fue fundado el 5 de febrero de 1592, y es conocida como la "Ciudad Jardín de Colombia".

Constituida en su zona urbana por 6 comunas: Centro, Norte, Occidental, Oriental, Sur Occidental y Sur Oriental, Comuna Centro, integrada por los siguientes barrios: Santander, Olaya, Centro, Emilio Sierra, Luxemburgo y Potosí.


Comuna Norte, integrada por los siguientes barrios: El Progreso, Nueva Esperanza, La Esmeralda, Gaitán, La Independencia, San Antonio, El Edén, Villa Natalia, José Antonio Galán, Gaitán II, La Cabaña, La Florida, Los Andes, Santa Librada, Mi Tesoro, Villa Rosalía, El Rosal, Villa Armerita, Villas de San Diego I, Villas de San Diego II, Monte Verde, Los Fundadores, Conj. Res. La Palma 2, Carlos Lleras, Porvenir y El Lucero.

Comuna Occidental, integrada por los siguientes barrios: San Jorge, Comboy, Mandalay, Nuevo Balmoral, San Mateo, Marcella, Manila, Santa Anita, La Salle, El Caney, Fontanar, Antiguo Balmoral, Urbanización Villa Alix, Piedra Grande, Santa Ana Campestre, Villa Country, Quintas de Balmoral, El Manantial, Santa Clara, Siboney, Teresita I y Teresita II.

Comuna Oriental, integrada por los siguientes barrios: Pekín, Cedritos, Coburgo, Bosque Bonnet, El Tejar, Los Robles, Bella Vista, Santa María de Los Ángeles, Antonio Nariño, Los Sauces, Urb. Altos de Pekín, Bonet, Villa de Los Sutagaos y Villa Aranzazu.

Comuna Sur Occidental, integrada por los siguientes barrios: Llano Largo, La Pampa, La Venta, Cooviprof, Maíz Amarillo, Ciudad Eben-ezer, Gran Colombia, Caminos de Llano Largo, Llano Verde, Villa Celeste, Urb. Las Brisas, Leidy Di, Urb. Pedregal de San Luis, Urb. Parques de Occidente Etapas I y II, Urb. El Oasis, Urb. La Primavera, Llano Grande, Conj. Res. Asoveinte, Urb. San Diego La Venta, Conj. Res. Balcones de San José, Villas de La Pampa, Conj. Res. Villa Rosita, La Venta, Urb. Los Girasoles, Ciudad Jardín, Urb. Cádiz, Urb. Nueva Campiña, Urb. Ciudadela Comfenalco, San Francisco, Urb. Cambulos y Conj. Cerrado San Martín de Los Olivos.

Comuna Sur Oriental, integrada por los siguientes barrios: Balmoral, Fusacatán, Obrero, Los Comuneros, La Macarena, Pedro Pablo Bello, Camino Real, San Fernando, Santa Bárbara, Villa Leidy, Prados de Alta Gracia, Jaime Pardo Leal, El Mirador, Las Delicias, Prados de Bethel, Las Américas, Urbanización Bosques del Oriente, Urbanización Aires de Quinini, Popular Obrero, Santa Rosa, Bethel Bajo, Urbanización La Alejandra y Sauces Bajo.

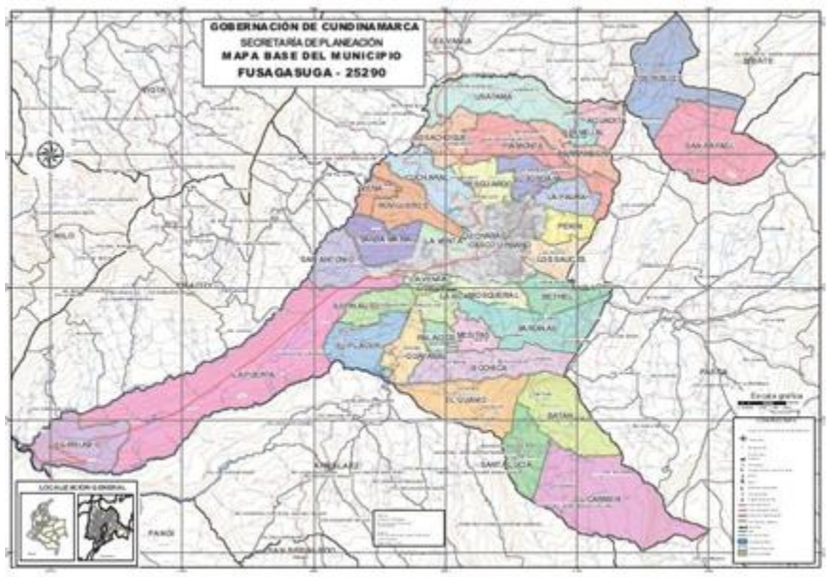

Fuente: Google maps

7.2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se relaciona a continuación, en donde se construirá el centro de integración social:

Tabla 2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

No.	OBRA
1	CENTRO DE INTEGRACION E INOVACION SOCIAL

7.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actividades para ejecutar en el proyecto corresponden la construcción y renovación del centro de integración social de Fusagasugá. este sentido el área ambiental contribuirá a prevenir y mitigar los impactos ambientales que se pudieran generar por la ejecución de las actividades constructivas.

7.4. OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO

Las actividades de obra realizadas con objeto de planificar la intervención, durante el periodo fueron las siguientes:

- **Centro de integración social**



Imagen 1. Centro de integración social

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR: Se trata construcción del centro de integración social

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN: Mantenimiento de PMT, Mantenimiento Cerramiento perimetral retiro de escombros.



Imagen 2. Actividad es ejecutadas

1. GESTIÓN AMBIENTAL

La implementación de los programas de manejo ambiental definidos para el contrato 0586 2022, se realizaron actividades constructivas. A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas.

3.1 COMPONENTE A GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se relaciona el personal con el cual se ejecutan las actividades ambientales en la obra.

- Personal Profesional

Tabla No.3 Personal Ambiental en obra

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
RESIDENTE SSTMA	SANDRA GALINDO	100 %

Durante el período se realizó actividad de inducción ambiental, al personal que ingresa, esta se realiza junto con la inducción SST, su contenido es el siguiente:

- Generalidades del plan de manejo ambiental, manejo de recurso agua, señalización, actividades de orden, aseo y limpieza, manejo de materiales y RCD´s en obra, protección de la fauna y flora del área de intervención.

Mensualmente se lleva a cabo una capacitación dirigida a todos los trabajadores, en cumplimiento al cronograma presentado, para este período el tema tratado fue:

- Capacitaciones en el periodo tema:

Tabla No.4 Capacitaciones en el periodo

TEMA	FECHA	No. De trabajadores
➢ Inducción ambiental	NOVIEMBRE 2022	7
➢ Manejo de vegetación y paisaje	21/11/2022	14
➢ Protocolo de bioseguridad. Medidas ambientales	9/11/2022	10

Ver Anexo No 1 – Registro de Inducción y Capacitación.

3.2 MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJE

En este período se realizó mantenimiento de la protección con polisombra de las especies forestales presentes en el frente de obra CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL, así no tengan afectación directa por las actividades constructivas. Dado que las actividades constructivas a realizar en el proyecto corresponden a mantenimiento, no se realizará ningún tipo de intervención a las especies forestales, por tanto, no se incluye identificación o chip de estas.

4 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4.1 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 campamento dentro de la obra dotado de equipos de atención de emergencias, camillas extintor botiquín, se realizó la instalación de cerramiento perimetral con el fin de evitar el ingreso de personal ajeno y su respetiva señalización para la ruta de emergencia y evacuación. Para el caso del baño se tiene convenio con una de las residencias cercanas para el acceso al baño.

	
CARPA	*LAVAMANOS*



BOTIQUIN



CUBRIMIENTO MATERIAL



ASEO Y LIMPIEZA



CAMPAMENTO

IMAGEN 10. CAMPAMENTOS DE OBRA.

4.2 Manejo de Materiales de Construcción

Consiste en verificación de canteras, sitios de acopio, señalización y protección adecuada de los materiales**.**

Ver anexo No. 2 Control de materiales

Tabla Nº 5 material utilizado

PROVEEDOR	MATERIAL	UND	M3
CEMEX	CONCRETO	N.A	74,8
TOTAL		***N.A***	***74,8***

4.2.1 Control y Reporte de Materiales Reciclados Y Mezclas Asfálticas Mejoradas con GCR

En el presente período no hubo la aplicación de GCR (gránulo de caucho reciclado).

4.3 Manejo Integral de Residuos Solidos

En el punto PAC y el campamento ubicado en obra se cuenta con un punto Ecológico donde se ubican 3 canecas para separación de los residuos), los residuos resultantes de las jornadas de orden, aseo y limpieza del campamento y punto PAC, corresponde a residuos sólidos domésticos, los cuales se recogen en bolsas para luego ser entregado a la empresa prestadora de aseo del sector.

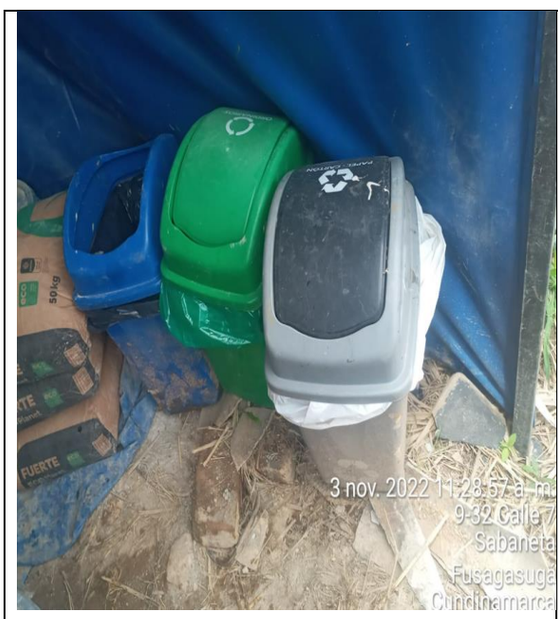
	
Punto Ecológico	*Punto Ecológico*

IMAGEN 11. PUNTOS ECOLOGICOS.

- ***Escombros Generados***

Durante este periodo, CONSORCIO CONSTRUEDIFIACIONES 2022 ha realizado generación de escombros provenientes de actividades de demolición de placa de los parques intervenidos, las cantidades de RCD´s generadas se relacionan a continuación:

Tabla 6. Registro de RCD´s dispuestos en sitios de disposición final

ESCOMBRERA	***Cantidad (mt3)***
CAMPO ALEGRE	*300*
Total	**300**

Ver Anexo No 3 reporte de escombros generados.

4.4. Control de Emisiones Atmosféricas

Las medidas implementadas en cuanto al control de emisiones atmosféricas consisten en controlar y mitigar la generación de material particulado realizando humectación en el caso de que haya áreas grandes desprovistas de acabados, controlar la generación de ruido en las actividades constructivas y realizar la verificación de la documentación que ingresa al frente de obra evidenciando que su documentación se encuentra al día.

4.4.1 Manejo de maquinaria y equipos

Durante el período del informe se efectuó el ingreso de maquinaria y vehículos como volquetas, de los cuales previamente a su ingreso se realizó la verificación de la documentación tal como mantenimientos preventivos, SOAT, revisión tecno mecánica y de gases.
A continuación, se relacionan los equipos ingresados en el período:

Tabla 7. Maquinaria y vehículos ingresados

TIPO DE MAQUINARIA	***PLACA***	***FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO/REVISION TECNOMECANICA***
VOLQUETA	*OCK565*	*06/01/2023*

VOLQUETA	*FTD412*	*25/03/2023*
VOLQUETA	*TGL323*	*12/02/2023*
VOLQUETA	*SSE096*	*21/01/2023*
BOBCAT	*N/A*	*13/01/2021*
EXCAVADORA FCRMEX02	*N/A*	*30/09/2022*
EXCAVADORA FCR EX03	*N/A*	*30/09/2022*

4.5 Manejo Integral de Cuerpos de Agua

Durante el período del informe se realizaron actividades de limpieza y mantenimiento a la protección instalada a los sumideros con afectación directa en el frente de obra.

El diligenciamiento de la información presentada se adjunta en el anexo 4.

4.6 Plan de Señalización

La demarcación utilizada en la intervención es de acuerdo con la aprobación del PMT, con el fin de aislar las actividades de obra, evitando así los riesgos a la comunidad y a los trabajadores.

Ver Anexo No 5 PMT

A continuación, se presenta la información y el registro fotográfico del mantenimiento.

	
Instalación de PMT	*Instalación de PMT*
	
Instalación de PMT	*Instalación de PMT*

IMAGEN 12. PMT INSTALADOS.

4.7 Medidas ambientales dentro del protocolo de bioseguridad

- Los residuos generados tales como tapabocas que cumplieron su ciclo de vida útil, fueron dispuestos de manera segura en bolsa cerrada destinada únicamente para ese tipo de elementos.
- Dentro de las actividades que se ejecutaron en el período se contó en los frentes de obra con lavamanos portátil el cual dispone de jabón y gel anti bacterial, así como toallas desechables, y bolsas para disposición diaria de residuos.

4.8 Seguimiento Plan de Residuos de Construcción y Demolición

Para el corte del presente informe una vez presentado el PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION – PGRCD.

Se anexan los formatos correspondientes al mes de octubre con su respectiva certificación al Plan de RCD´s, se presentan en un anexo aparte. ***Ver Anexo 8 Formatos del PLAN DE RCD´S.***

4.8.1 Indicadores del Plan de RCD´s

- Indicador de Eficiencia

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Gastos Mensuales de la implementación del PGRCD (\$)}}{\text{Presupuesto planteado para el PGRC (\$)}} * 100$$

.

$$\text{Eficiencia} = \frac{70.686.000(\$)}{68544000\ (\$)} * 100$$

$$\boldsymbol{Eficiencia} = \mathbf{103}\ \%$$

Durante el presente período, se invirtió el 103 % del presupuesto que se proyectó para la gestión de RCD.

- Indicador de eficacia

$$\text{Eficacia} = \frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (m3)}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (m3)}} * 100$$

$$\text{Eficacia} = \frac{0(\text{m3})}{2016(\text{m3})} * 100$$

$$\boldsymbol{Eficacia} = \mathbf{0}\ \%$$

El porcentaje de aprovechamiento en el presente período es del 0%.

- Indicador de Efectividad

$$\text{Efectividad} = \frac{\text{Cant de RCD dispuestos en sitios autorizados en el mes (m3)}}{\text{Cantidad estimada a generar de RCD en el mes (m3)}} * 100$$

$$\text{Efectividad} = \frac{2079(\text{m3})}{288(\text{m3})} * 100$$

$$Efectividad\ 722\%$$

Durante este período se llevó el 722% de los RCD proyectados mensualmente a los sitios de disposición final autorizados.

5 Unidades Sanitarias

Para uso del personal de obra se tiene cerca al frente de obra un baño vecinal par el uso del personal de obra.

6 CONCLUSIONES

- Se realizo la entrega del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -PGRCD.

- El residente ambiental realiza el cumplimiento del cronograma ambiental presentado dentro del PIPMA previamente aprobado por interventoría para el presente período.

- Se realiza disposición final de RCD´s en sitios autorizados que cuentan con licencia ambiental vigente.

- Las certificaciones de material y RCD´s se presentarán mes vencido, teniendo en cuenta el tiempo de entrega en los sitios de disposición final y proveedores.

- Al corte del presente informe se realizó aprovechamiento de RCD al señor Alirio Duarte, se realiza reutilización de 1000 m3 al señor Jairo Hortua anexo se adjuntan la carta de suministro del RCD, en obra se reutilizaron 52,27 m3 de RCD.

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 1 INDUCCION Y CAPACITACION

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

Contrato de obra No. 2022-0586

"CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL BARRIO LLANO VERDE DE LA COMUNA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

VERSION 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2022

ACTIVIDADES	Estado	MES 1 SEPTIEMBRE				MES 2 OCTUBRE				MES 3 NOVIEMBRE				MES 4 DICIEMBRE				MES 5 ENERO				Responsables
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
PLANIFICACIÓN																						
Identificación de aspectos e impactos ambientales	P																					Residente Ambiental
	E																					
Identificación de requisitos legales ambientales aplicables al proyecto	P																					Residente Ambiental
	E																					
Elaboración programa de implementación del plan de manejo ambiental PIPMA	P																					Residente Ambiental
	E																					
Elaboración programa de gestión de RCD´s	P																					Residente Ambiental
	E																					
Identificar posibles proveedores que cuenten con licencias y/o permisos ambientales	P																					Residente Ambiental
	E																					
PRELIMINARES																						
Cerramiento perimetral y señalización temporal	P																					Residente Ambiental
	E																					
Identificación e inventario de cuerpos de agua y sumideros en el área de influencia del contrato	P																					Residente Ambiental
	E																					
Identificación de individuos arbóreos y arbustivos en el área de influencia del contrato	P																					Residente Ambiental
	E																					
CONSTRUCCIÓN																						
Protección a la vegetación existente que pueda ser afectada por la obra	P																					Residente Ambiental
	E																					
Manejo y disposición final de escombros	P																					Residente Ambiental
	E																					
Clasificación y manejo de residuos sólidos	P																					Residente Ambiental
	E																					
Manejo integral de materiales de construcción	P																					Residente Ambiental
	E																					
Manejo adecuado a los acopios temporales	P																					Residente Ambiental
	E																					
Jornadas de limpieza, orden y aseo	P																					Residente Ambiental
	E																					
Verificación de cumplimiento de requerimientos legales ambientales, registro de generación de RCD´s	P																					Residente Ambiental
	E																					
Realizar informe de implementación del plan de manejo ambiental	P																					Residente Ambiental
	E																					
CAPACITACIONES AMBIENTALES																						
* Sistema de Gestión Ambiental	P																					Residente Ambiental
	E																					
	P																					Residente Ambiental
	E																					
* Manejo ambiental de Actividades Constructivas	P																					Residente Ambiental
	E																					
* Reciclaje, Reutilización y Reuso	P																					Residente Ambiental
	E																					
* Orden y aseo en frentes de obra	P																					Residente Ambiental
	E																					
* Protocolo de bioseguridad - medidas ambientales	P																					Residente Ambiental
	E																					
* Manejo y uso eficiente y ahorro del agua	P																					Residente Ambiental
	E																					
		100%				100%				100%				0%				0%				

Este programa estará sujeto a los cambios que se requieran de acuerdo al avance de las actividades constructivas del proyecto

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 25/02/2019

centro de integracion e innovacion social.

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Galindo | CARGO: Residente

TEMA: Manejo de vegetacion y paisaje

FECHA: 22- Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 1:00 Pm | HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 Pm

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
CARLOS ANDRES MENA	4492590245	AYUDANTE	
Julio cesar Rodriguez	1059981245	OFICIAL	Julio R
Diego Munoz	82392423	Ayudant	
Everley Muñoz 2	80442717	Ayudante	Everley Muñoz 2.
EDWIN GARZON HOR	PPCC#2572299	AYU	
Leonardo Campos C	7319225	oficial	
Felix Mejia	1020567209	ayu	Felix Mejia
Jose alberto MOSC	1022960101	ofi	
Jose Dimas	19.818.999	Ayudant	Jose Dimas
[illegible] Linares	7900810?	Ayudante	
Jhon Edison Q	1012374044	Ayudante	
juan Luis Rojas	1220469	oficial	Juan Luis Rojas
Oswaldo Fonseca Lopez	1106769559	Ayudante	
Leonardo Garavito	3232861	AY	Leonardo Garavito

(Firma) Sandra Galindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 25/02/2019

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Galindo — CARGO: Residente

TEMA: Protocolo de bioseguridad - medidas ambientales

FECHA: 9- Noviembre- 2022

HORA DE INICIO: 10:00 Am — HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN	[ ]	CAPACITACIÓN	[X]
CHARLA INFORMATIVA	[ ]	ENTRENAMIENTO	[ ]
		OTRO	[ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jose D Lucas	19.8189 99	Ayudante	Jose Dlucas
Julio Rodriguez	1059987245	oficial	Julio R
Sr. Freddy	1012370 44	AX 1	
Diego Muñoz	82342433	Ayudante	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Felipe Mejia	1030527 209	Ayudante	
Everlay Muñoz L	80442 717	Ayudante	Everlay Munoz
CARLOS SIERRA	1192690245	" " "	
Leonardo Garavito	82392861	AY	Leonardo
Leonardo Campos	7319225	oficial	

(Firma) Sandra Galindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Calindo | CARGO: Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 22-Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Pm

TIPO
INDUCCIÓN [X]
CHARLA INFORMATIVA [ ]
CAPACITACIÓN [ ]
ENTRENAMIENTO [ ]
OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Marcelo Mendez	1069 215 880	Ayudante	

(Firma) Sandra Calindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Carlindo **CARGO:** Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 3 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Pm

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Julio Cesar Rodriguez	1059981645	oficial	Julio C Rodriguez

(Firma) Sandra Carlindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion Social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Cealindo **CARGO:** Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 3 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 2:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Libardo	1937414	Vigilante	

(Firma) Sandra Cealindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Galindo **CARGO:** Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 15 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Diego Muñoz	82 392 423	Ayudante	

(Firma) Sandra Galindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: Centro de integración e innovación social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Galindo | CARGO: Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 15 - Noviembre - 2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [X]

CHARLA INFORMATIVA [ ]

CAPACITACIÓN [ ]

ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Leonardo Carabito	82 392 864	Ayudante	Leonardo Caravito

(Firma) Sandra Galindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: Centro de integracion e innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Galindo CARGO: Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 23-Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [x] CAPACITACIÓN [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Leon castrillon	1017172738	Ayudante	GUILLERMO LEON

(Firma) Sandra Galindo

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: centro de integracion de innovacion social

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: sandra Calonda | CARGO: Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 21-Noviembre-2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA DE TERMINACIÓN: 9:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN	X	CAPACITACIÓN	
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
David Penagos	1106269359	Ayudante	

(Firma)

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-F-01
		Fecha: 29/05/2020
	FORMATO DE ASISTENCIA	Versión 1

SEDE O PROYECTO: Parque Lleno verde

RESPONSABLE DE LA CAPACITACIÓN: Sandra Galindo **CARGO:** Residente

TEMA: GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL, MANEJO DE RECURSOS DEL AGUA, SEÑALIZACIO, ACTIVIDADES DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA, MANEJO DE MATERIALES Y RCD´S EN OBRA, PROTECCIO DE LA FAUNA Y FLORA DEL AREA DE INTERVENCION

FECHA: 24-Noviembre -2022

HORA DE INICIO: 7:00 Am

HORA DE TERMINACIÓN: 7:30 Am

TIPO

INDUCCIÓN [X]

CHARLA INFORMATIVA [ ]

CAPACITACIÓN [ ]

ENTRENAMIENTO [ ]

OTRO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Edwin Garzon D	1172528299	Ayudante	

(Firma) Sandra Galindo

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 2 CONTROL DE MATERIALES

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO - GIP - 058	FORMATO No. 9 CONTROL DE MATERIALES	3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA**

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. 586 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA"

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

MES: nov-22

DIA	V1	PROVEDOR V1	V2	PROVEDOR V2	V3	PROVEDOR V3	V4	PROVEDOR V4	Vtotal
1	7,25	CEMEX							7,25
2	27,5	CEMEX							27,5
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9	7,25	CEMEX							7,25
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17	20,5	CEMEX							20,5
18									0
19	5	CEMEX							5
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28	7,25	CEMEX							7,25
29									0
30									0
31									0
TOTAL									74,8

Tipo de Material 1: CONCRE

Tipo de Material 2:

Tipo de Material 3:

Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra

V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra

V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra

V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra

VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directorio de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el PIPMA

(Firma)

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 3 REPORTE DE ESCOMBRO

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GIP-064	FORMATO No. 12 - PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 30/11/2022

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. 586 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

PERIODO: nov-22

ESCOMBRERA: CAMPO ALEGRE

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN VOLQUETA	Nº VALE (APLICA PARA FRESADO)	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	VOLUMEN TRANSPORTADO M^3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA RESPONSABLE DE LA OBRA
1/11/2022	DYW982	N.A	33614	N.A	7		
1/11/2022	DYW982	N.A	27349	N.A	7		
2/11/2022	DYW982	N.A	33632	N.A	7		
2/11/2022	DYW982	N.A	33636	N.A	7		
17/11/2022	DYW982	N.A	33644	N.A	7		
17/11/2022	DYW982	N.A	33641	N.A	7		
17/11/2022	DYW982	N.A	33615	N.A	7		
17/11/2022	DYW982	N.A	31546	N.A	7		
17/11/2022	TCG848	N.A	35004	N.A	7		
17//11/2022	TCG848	N.A	35008	N.A	7		
17/11/2022	ZOD993	N.A	33645	N.A	7		
17/11/2022	ZOD993	N.A	35005	N.A	7		
1/11/2022	EWE709	N.A	33611	N.A	7		
1/11/2022	EWE709	N.A	33616	N.A	7		
1/11/2022	EWE709	N.A	31545	N.A	7		
1/11/2022	EWE709	N.A	31547	N.A	7		
1/11/2022	EWE709	N.A	27948	N.A	7		
1/11/2022	EWE709	N.A	33612	N.A	7		
2/11/2022	EWE709	N.A	33634	N.A	7		
2/11/2022	EWE709	N.A	33620	N.A	7		
1/11/2022	EWE709	N.A	31574	N.A	7		
3/11/2022	EWE709	N.A	33802	N.A	7		
17/11/2022	TOD293	N.A	33650	N.A	7		
1/11/2022	PFA337	N.A	33617	N.A	7		
15/11/2022	SSE096	N.A	33633	N.A	7		
TOTAL					175		

(Elaboró)

(Nombre) **SANDRA GALINDO**
Residente Ambiental de Obra

(Aprobo)

(Nombre) **IVAN PARDO**
Director de Obra

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
FO-GIP-064	FORMATO No. 12 - PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	3.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 30/11/2022

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. 586 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

PERIODO: nov-22

ESCOMBRERA: CAMPO ALEGRE

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN VOLQUETA	Nº VALE (APLICA PARA FRESADO)	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	VOLUMEN TRANSPORTADO M^3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA RESPONSABLE DE LA OBRA
15/11/2022	FTD412	N.A	31589	N.A	7		
15/11/2022	FTD412	N.A	33647	N.A	7		
17/11/2022	SSE012	N.A	35003	N.A	7		
17/11/2022	SSE012	N.A	35007	N.A	7		
17/11/2022	STF664	N.A	35006	N.A	7		
21711/2022	ZOD943	N.A	35010	N.A	7		
22/11/2022	ZOD943	N.A	33829	N.A	7		
22/11/2022	ZOD943	N.A	33832	N.A	7		
22/11/2022	ZOD943	N.A	33827	N.A	7		
22/11/2022	SBG065	N.A	33835	N.A	7		
22/11/2022	SBG065	N.A	33838	N.A	7		
22/11/2022	SDT013	N.A	33830	N.A	7		
22/11/2022	SBG065	N.A	33833	N.A	7		
22/11/2022	SBG065	N.A	35013	N.A	7		
22/11/2022	SSE012	N.A	33643	N.A	7		
22/11/2022	OME954	N.A	33649	N.A	7		
22/11/2022	OME954	N.A	33645	N.A	7		
22/11/2022	OME954	N.A	33642	N.A	7		
		N.A		N.A			
		N.A		N.A			
		N.A		N.A			
		N.A		N.A			
		N.A		N.A			
		N.A		N.A			
		N.A		N.A			
		N.A		N.A			
TOTAL					126		

(Elaboró)

(Nombre) **SANDRA GALINDO**

Residente Ambiental de Obra

(Aprobo)

(Nombre) **IVAN PARDO**

Director de Obra

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 4 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

CÓDIGO	FORMATO	VERSION	
FO-GIP-071	FORMATO No. 14 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** nov-22

CONTRATO No.	0586 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"**						
FRENTE DE OBRA	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL						
SUMIDEROS	X	**NUMERO DE SUMIDEROS**	1	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL		NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**				

PERIODO: JULIO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
JULIO	**REGULAR**	**MANTENIMIENTO**	**ASEO Y MANTENIMIENTO**
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCION



DURANTE LA INTERVENCION



DESPUES DE LA INTERVENCION

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 5 PMT

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com



1 Puerta de Ingreso de Materiales, insumos y materias primas

2 Puerta de Salida de Escombros

Sentido de la Vía

ALCADIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

con la FUERZA de la gente FUSAGASUGÁ

CONTIENE:
Plan de Manejo de Tráfico

CONTRATISTA:
Consorcio Cultural

NORTE

NOTAS IMPORTANTES

- NO SE REALIZARA NINGUN DESVIO
- LAS MEDIAS CALZADAS PROPUESTAS SE REALIZARAN SOLO EN CASO DE DEMORAS EN EL INGRESO DE VOLQUETAS O MAQUINARIA AL INGRESO DEL PREDIO Y DEBEN SER QUITADAS A DIARIO AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO.
- ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.
- VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN OBRA.

ESPECIALISTA DE LA CONSULTORIA:
Ing. Agapito Sierra Carrasquilla
M.P.17.118 CND

COLABORADORES:
Arq. Angelica Sierra Herrera

PROYECTO:
PARQUE CULTURAL
FUSAGASUGÁ

EMISIÓN:
Versión 1- 17 de Mayo 2021

ESCALA:
Sin escala

FECHA:
17 de Mayo 2021

PLANO:
3 DE 3

ARCHIVO:
Fusagasuga_PMT

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 6 VALES DE MATERIALES Y ESCOMBRO

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	28/11/2022	
Planta fusagasuga		FB630000003541

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8013566161		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
7.250		1-280-3-28-13	CARGO DE SOSTENIBILIDAD	7.250
SELLOS	CODIGO			ASENTAMIENTO
668408	20018270	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1/2 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")		5 DE ASENTAMIENTO (5")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1519	100038296	QUIROGA CABRERA HAMILTON

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
12:58:00	13:00:00			

OBSERVACIONES	

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO

_____ SÍ

_____
Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	02/11/2022	222243009
Planta fusagasuga		FB630000003084

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8013448432		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
5.000		1-280-5-28-13	CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGO ZONA SUBURBANA	27.500
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")		ASENTAMIENTO
668460	20018275			5 DE ASENTAMIENTO (5")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1536	100040952	RAMIREZ RUEDA FERNEY

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
13:46:00	13:30:00			

OBSERVACIONES	CONCRETO DEVUELTO
//	_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	19/11/2022	
Planta fusagasuga		FB630000003305

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8013514635		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
5.000		1-280-5-28-13		12.000
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")		ASENTAMIENTO
668240	20018275			5 DE ASENTAMIENTO (5")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1633	100041631	SALAZAR ECHEVERRI DAVID

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
07:52:00	07:00:00	8:30		

OBSERVACIONES	CONCRETO DEVUELTO
//	_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	02/11/2022	FB630000003075
Planta fusagasuga		

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	TELEFONO
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8013448432		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA	TOTAL PEDIDO
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	27.500
7.500		1-280-5-28-13 CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGO ZONA SUBURBANA	ASENTAMIENTO
SELLOS	CODIGO		5 DE ASENTAMIENTO (5")
668476	20018275	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")	

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1519	100040967	GARCIA TORRES PEDRO ALEJANDRO

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
09:37:00	10:30:00	08:15		

OBSERVACIONES

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	02/11/2022	FB630000003080
Planta fusagasuga		

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	TELEFONO
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8013448432		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA	TOTAL PEDIDO
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	27.500
7.500		1-280-5-28-13 CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGO ZONA SUBURBANA	ASENTAMIENTO
SELLOS	CODIGO		5 DE ASENTAMIENTO (5")
668498	20018275	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")	

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1539	100041149	CUPER LEON MILLER AUGUSTO

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
11:41:00	12:30:00	12:40		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

X NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	01/11/2022	222166518
Planta fusagasuga		FB630000003058

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	TELEFONO
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8013448885		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7.250		1-280-5-28-13	7.250
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
669617	20018275	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")	5 DE ASENTAMIENTO (5")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1538	100041631	SALAZAR ECHEVERRI DAVID

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
06:36:00	07:00:00	7:15		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ _____ Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos quimicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centimetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Asi mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

ANEXO 5. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ANEXO 6. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	02/11/2022	222229633
Planta fusagasuga		FB630000003078

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022 CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	TELEFONO
PEDIDO		DIRECCION OBRA	
8013448432		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA	
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7.500		1-280-5-28-13 CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGO ZONA SUBURBANA	27.500
SELLOS	CODIGO		ASENTAMIENTO
668458	20018275	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")	5 DE ASENTAMIENTO (5")

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1514	100041166	CARREÑO MONTERO JOSE REINALDO

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
10:44:00	11:30:00	11:30		

OBSERVACIONES

//

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ _____ Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos quimicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centimetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Asi mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	17/11/2022	
Planta fusagasuga		FB630000003275

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8013483816		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
7.500		1-280-5-28-13	CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGO ZONA SUBURBANA	35.500
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")		ASENTAMIENTO
668288	20018275			5 DE ASENTAMIENTO (5")
VEHICULO	COD. CONDUCTOR		NOMBRE CONDUCTOR	
CR-1536	1444521		FERNEY RAMIREZ	
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
16:15:00	15:00:00			
OBSERVACIONES				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos quimicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centimetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	17/11/2022	
Planta fusagasuga		FB630000003277

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA		
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION	
PEDIDO		DIRECCION OBRA		TELEFONO
8013483816		CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA		
M3		DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
5.500		1-280-5-28-13	CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGO ZONA SUBURBANA	35.500
SELLOS	CODIGO	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")		ASENTAMIENTO
668379	20018275			5 DE ASENTAMIENTO (5")
VEHICULO	COD. CONDUCTOR		NOMBRE CONDUCTOR	
CR-1519	100038296		QUIROGA CABRERA HAMILTON	
HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
18:51:00	17:00:00			
OBSERVACIONES				

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos quimicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centimetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centimetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	17/11/2022	FB630000003276
Planta fusagasuga		

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION

PEDIDO	DIRECCION OBRA	TELEFONO
8013483816	CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA	

M3	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		TOTAL PEDIDO
7.500	1-280-5-28-13	CARGO DE SOSTENIBILIDAD CARGO ZONA SUBURBANA	35.500
			ASENTAMIENTO
SELLOS / CODIGO	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")		5 DE ASENTAMIENTO (5")
668293 / 20018275			

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
CR-1538	1C0041416	MAYORGA BEDOYA ESNEIDER

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
18:19:00	16:00:00	19:00		

OBSERVACIONES

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de planta

DESPACHADOR

RECIBIDO OBRA

CEMEX

Planta	FECHA	No. Despacho
FB63	09/11/2022	FB630000003170
Planta fusagasuga		

COD. CLIENTE - OBRA		NOMBRE CLIENTE - OBRA	
51055448	67103683	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION

PEDIDO	DIRECCION OBRA	TELEFONO
	CR 7 3 2 A 3 92 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA COLOMBIA	

M3	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TOTAL PEDIDO
7.250	1-280-5-28-13	7.250
		ASENTAMIENTO
SELLOS / CODIGO	CONCRETOS DE LINEA CUATRO MIL 1 Pulgada 28 DÍAS AS13cm(5")	5 DE ASENTAMIENTO (5")
668319 / 20018275		

VEHICULO	COD. CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR

HRC	HPE	HLLD	HLLP	ADICIONALES
17:31:00	17:00:00	19:00		

OBSERVACIONES

CONCRETO DEVUELTO

_____ NO _____ SÍ

Nombre y firma del Cliente

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de + o - 2,5 centímetros. Para concretos especificados por flujo libre o auto compactados la tolerancia es de + o - 5 centímetros. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que han recibido una mezcla a satisfacción por cubicación y diseño. Así mismo implica la aceptación de las condiciones incluidas al reverso.

jefe de pl

DESPACHAI

RECIBIDO OBRA

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33614

FECHA: 1/4/22 PLACA: DJW 880

HORA: 11:38 AM

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 27949

FECHA: PLACA:

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33632

FECHA: 2/4/22 PLACA: DJW 880

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33636

FECHA: 2/4/22 PLACA: DJW 880

HORA:

TIPO: SENCILLA DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO


PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33644

FECHA: 12/1/23 PLACA: FCG 58

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33641

FECHA: 12/1/23 PLACA: FCG 58

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33615

FECHA: 12/1/23 PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 31546

FECHA: 12/1/23 PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35004

FECHA: 12/12/22 PLACA: TC6 [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

VALOR: 40000

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35008

FECHA: 12/12/22 PLACA: EC684

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

VALOR: 40000

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33645

FECHA: 12/12/22 PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40 000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35005

FECHA: 12/12/22 PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33611

FECHA: 1/11/22 PLACA: EUS 705

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33616

FECHA: 7/11/22 PLACA: EUS 705

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 31545

FECHA: 1/11/22 PLACA: WOJ 814

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 31547

FECHA: 1/11/22 PLACA: WOJ 814

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 27948

FECHA: [illegible] PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33612

FECHA: [illegible] PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33634

FECHA: [illegible] PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33620

FECHA: [illegible] PLACA: [illegible]

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 31574

FECHA: 1 NOV 2022 **PLACA:**

HORA:

TIPO: SENCILLA DOBLETROQUE X

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 94.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33802

FECHA: 3/11/22 **PLACA:** EWB 73

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33650

FECHA: 7/11/22 **PLACA:** SDT 743

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33617

FECHA: 1 11 22 PLACA: [illegible]

HORA: [illegible]

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40.000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33633

FECHA: 15 noviembre 2022 PLACA: SSE 096

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40.000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 31589

FECHA: 15/11/2022 PLACA:

HORA:

TIPO: SENCILLA DOBLETROQUE X

PESO:

VALOR: 40.000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33647

FECHA: PLACA:

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40.000

RCD CAMPO ALEGRE VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35003

FECHA: 12/12/22 PLACA: SRB613

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35007

FECHA: 12/12/22 PLACA: SRB613

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35006

FECHA: 12/12/22 PLACA: SRB613

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35010

FECHA: 12/12/22 PLACA: ZOD993

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33829

FECHA: 22/11/22 PLACA: ZOD 93

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE SAJ VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33832

FECHA: 22/11/22 PLACA: ZOD 94

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE SAJ VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33827

FECHA: 22/11/22 PLACA: ZOD 94

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE SAJ VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33835

FECHA: 22/11/22 PLACA:

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

RCD CAMPO ALEGRE SAJ VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33838

FECHA: 22/11/22 PLACA: SZC-015

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33830

FECHA: 22/11/22 PLACA: SDT 013

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33833

FECHA: 22/11/22 PLACA: SRC 015

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 35013

FECHA: 01/12/22 PLACA: SRC 015

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40000

CAMPO ALEGRE VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33643

FECHA: **PLACA:**

HORA:

TIPO: **SENCILLA** X **DOBLETROQUE**

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

PESO:

VALOR: 40.000

ESCOMBRERA CAMPOALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33649

FECHA: 12/6/22 PLACA: OMX 24

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40.000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33646

FECHA: 12/6/22 PLACA: OMX 24

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40.000

RCD CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE

AUTORIZADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE



COMPROBANTE DE DESCARGUE 33642

FECHA: 12/6/22 PLACA: OMX 24

HORA:

TIPO: SENCILLA X DOBLETROQUE

PESO:

VALOR: 40.000

CAMPO ALEGRE BAJO VERIFICADO

ESCOMBRERA CAMPO ALEGRE

AUTORIZADO

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 7 DOCUMENTCION MAQUINARIA

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 82052

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC200326	HITACHI	ZX120	2001

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	HCM1S100P00062300

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	168838	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
12500 Kg	2740 mm	2690 mm	7610 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
ROCHA ZARAZA JEISON CAMILO	C.C. 1 069.7[illegible]

Escaneado con CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
26-03-2021	19-05-2021	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352006000020295	09/02/2006



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700001 5874

COSMOCOLOR-TM-20

Escaneado con CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 90194

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC280127	SHANTUI	SE75	2021

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	66SE87EJNM8081359

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	CMA2101	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7658 Kg	2680 mm	2250 mm	6240 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
FCR CONTRATISTAS SAS	NIT 900.777.681

Escaneado con CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DE MOVILIDAD MPAL FUSAGASUGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
24-11-2021	24-11-2021	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352021000292360	20/08/2021

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM01000015095

Escaneado con CamScanner

FCR CONTRATISTAS S.A.S	FICHA HISTORIAL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA - EQUIPO	CODIGO FCR-F-08

MAQUINA/EQUIPO : EXCAVADORA ZX 120 HITACHI

DETALLE: Arreglo y mantenimientos preventivos

FECHA	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION	REPUESTOS EMPLEADOS	MECANICO	TIEMPO	OBSERVACIONES
16/07/22	Arreglo de balde roto	Soldar	soldadura y lamina	Juan Rubiano		Granja Santa Maria
19/07/22	Aceite bajo	Completar nivel	1 Galón de Jhon Deere	Operador	1 minuto	11
27/07/2022	Radiador tapado	Sondearlo, limpiarlo	-	Manuel Radiadores	1 día	11
30/09/2022	Desgaste de calsas del balde	Cambiar calsas o dientes de balde	5 dientes de medida 30	operador	½ HORA	11

Escaneado con CamScanner

FCR CONTRATISTAS S.A.S

FICHA HISTORIAL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA - EQUIPO

CODIGO FCR-F-08

MAQUINA/EQUIPO : 2x 120 HITACHI

DETALLE: Arreglos y mantenimientos preventivos

FECHA	DESCRIPCION DEL PROBLEMA	SOLUCION	REPUESTOS EMPLEADOS	MECANICO	TIEMPO	OBSERVACIONES
06/10 2022 JUEVES	Empaquetadura Dañada	Cambio de empaquetadura	empaquetadura nueva	Favian Cardenas	1 hora	Fuga agua Cond.

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 70816

No. DE REGISTRO: MI004217	MARCA: NEW HOLLAND	LINEA: L218 LOADER	AÑO MODELO: 2012
TIPO DE MAQUINARIA: INDUSTRIAL	CLASE: MINICARGADOR		No. SERIE: NCM447634
COLOR(ES): AMARILLO	No. MOTOR: 100003		RODAJE: NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2885 Kg	1974 mm	1829 mm	3585 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RODRIGUEZ JIMENEZ YUBER ARLEY

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.019.120.624

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
31-07-2017	08-07-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482013000273026	10/07/2013

COSMO-O-L3-19

ESTA TARJETA ... ORIO NACIONAL

TM07000003474

EMBRAGUES Y FRENOS DEL OCCIDENTE JC S.A.S.

Mecánica en general –Latonería Y Pintura
Diesel-Gasolina-Full Inyección
Mantenimiento Equipos de gas Vehicular
Montacargas y maquinaria amarilla

EMBRAGUES Y FRENOS DEL OCCIDENTE JC S.A.S.	MARCA: *NEW HOLLAND*	LINEA: *L218*	AÑO DE MODELO: *2012*	
PESO: *2885 KG*	ALTO: *1974 MM*	ANCHO *1829 mm*	LARGO: *3585 MM*	

TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLES	FECHA	PERSONA QUE INTERVINO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2021/01/13	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2021/01/13	JOSE COLORADO

FIRMA AUTORIZADA Jose Colorado.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Arley Rodriguez

AV 6 # 41 A 75 BARRIO PRIMAVERA – CEL: 3133427787- 3204171007 - Bogotá, D.C. – Colombia e-mail: joseac1011@hotmail.com

EMBRAGUES Y FRENOS DEL OCCIDENTE JC S.A.S.

Mecánica en general –Latonería Y Pintura
Diesel-Gasolina-Full Inyección
Mantenimiento Equipos de gas Vehicular
Montacargas y maquinaria amarilla

EMBRAGUES Y FRENOS DEL OCCIDENTE JC S.A.S.	MARCA: *NEW HOLLAND*	LINEA: *L218 LOADER*	AÑO DE MODELO: *2012*	
PESO: *2885 KG*	ALTO: *1974 MM*	ANCHO *1829 mm*	LARGO: *3585*	

TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLES	FECHA	PERSONA QUE INTERVINO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2013/03/13	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2014/02/25	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2014/05/17	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2015/07/28	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2015/12/18	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2016/02/17	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2016/07/10	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2017/01/12	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2017/06/24	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2018/01/18	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2018/07/26	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2019/01/23	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 250 HORAS DE TRABAJO.	2019/07/2	JOSE COLORADO
PREVENTIVO	CAMBIO DE TODO LOS FLUIDOS 1500 HORAS DE TRABAJO	2020/02/17	JOSE COLORADO

FIRMA AUTORIZADA Jose Colorado

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Arley Rodriguez

AV 6 # 41 A 75 BARRIO PRIMAVERA – CEL: 3133427787- 3204171007 - Bogotá, D.C. – Colombia e-mail: joseac1011@hotmail.com

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS DE HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2022-02-05	2022-02-06	2023-02-05

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
11192400012440	FTD412	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	14011	1981

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	SRS

LÍNEA VEHICUL	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD
BRIGADIER 229	10889161	CH053711		15.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL	No. DE DOCUMENTO DEL	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CARDENAS ROCHA, PEDRO FAVIAN	3202370456	CC	11258479	FUSAGASUGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	988198063	0	FUSAGASUGA

TARIF	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN SYNDROM	TASA RUNT
320	$ 694500	$ 361100	$ 1900

TOTAL A PAGAR

$ 1057500

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerda validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Foryga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente, hacer transferencia nacional o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativo la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:
- Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional.
- Sitio web: A través de las páginas www.segurosdelestado.com y www.segurosdevidadelestado.com
- Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 158811597

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSA

NIT: 901227244

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-074

Fecha de expedición: 2022/03/25

Fecha de vencimiento: 2023/03/25

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FTD412

CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1981

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 14011

NRO. MOTOR: 10889161

NRO. CHASIS: CH053711

VIN:

LÍNEA: BRIGADIER 229

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: CAMILO LAVERDE y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

LORENA ISABEL LOPEZ ALVAREZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2022	01	15

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2022	01	19
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2023	01	18

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
28069467	OCK565	VOLQUETA	PARTICULAR	7636	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	

LÍNEA VEHÍCULO
43004X2

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
466HM2U2203322	3HAMMAAR5EL499392	3HAMMAAR5EL499392	9193.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
YUBER RODRIGUEZ	3196647803	CEDULA	1019120624	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	248	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN ADRES	TASA RUNT
320	$ 694,500	$ 361,100	$ 1,900

TOTAL A PAGAR $ 1,057,500

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 157347362

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2022/01/06

Fecha de vencimiento: 2023/01/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OCK565

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2014

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7636

NRO. MOTOR: 466HM2U2203322

NRO. CHASIS: 3HAMMAAR5EL499392

VIN: 3HAMMAAR5EL499392

LÍNEA: 4300 4X2

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: YUBER A. RODRIGUEZ J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

SOAT

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2022 9 5 — VIGENCIA: 2022 9 6 — HASTA LAS 24 HORAS DEL: 2023 9 5

No. DE PÓLIZA: 83941294 / 602304394

PLACA No.: PFA337

CLASE DE VEHÍCULO: CARGA O MIXTOS

SERVICIO: PARTICULAR

No. PASAJEROS: 2

MARCA: CHEVROLET

LÍNEA / REFERENCIA: C 70

CILINDRAJE: 5600

MODELO: 1984

CARROCERÍA: PLATON

No. MOTOR: PFA33708G0100014

No. CHASIS o SERIE: PFA33708G0100014

No. VIN: NA

CAPACIDAD TON: 7,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: JOSE GARCIA AMAYA

IDENTIFICACIÓN DEL TOMADOR: 3105586638

TIPO DE DOCUMENTO DEL PROPIETARIO: CC

No. DOCUMENTO DEL PROPIETARIO: 823965332

CIUDAD DE MATRÍCULA VEHÍCULO: FUSAGASUGA

CLASIFICACIÓN ASEGURADORA: 1317

CLASE SINIESTRO: 31

CLASE PRODUCTO: 80002457

No. FORMULARIO: 83941294

CLASE EXPOSICIÓN: 5001

PASAJEROS: 32

PRIMA SOAT: $ 694.500

CONTRIBUCIÓN FONSAT: $ 361.100

OTROS COBROS: $ 1.900


TOTAL A PAGAR: $ 1.057.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPARO MUERTE ACCIDENTAL

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	





Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de accidente de tránsito:

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 152768817

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA S.A.S

NIT: 900336502

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-084-001

Fecha de expedición: 2022/09/27

Fecha de vencimiento: 2023/09/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: PFA337

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1984

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5600

NRO. MOTOR: PFA33708G0100014

NRO. CHASIS:

VIN:

LÍNEA: C 70

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: CARLOS E. MOGOLLON

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOHORA ALICIA ALCARCEL CEPEDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022989890

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PFA337	CHEVROLET	C 70	1984

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.600	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR: PFA337T09G0100014 — REG: N — VIN: ******

NUMERO DE SERIE: CM459420 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: ****** — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GARCIA AMAYA JOSE GABRIEL — IDENTIFICACIÓN: C.C. 82395332

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: *******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

IE: I

FECHA IMPORT.

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

****

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/02/1998	24/05/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE MOVILIDAD MPAL FUSAGASUGA

LT01008652881

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Seguros mundial

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022 8 17	2022 8 18	2023 8 17

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
83811721 - 600003947	SSE096	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	5700	1956

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FORD	PLATON

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F 600	08G0131265	F60Z6E25588	NA	6,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NELSON HERNANDO AMAYA MORENO	3107930715	CC	11257510	FUSAGASUGA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	23	13158	83811721	25290


TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 694.500	$ 361.100	$ 1.900

TOTAL A PAGAR

$ 1.057.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES




SEGURO TER-CERO

Ter-cero

Te respalda en caso de que [illegible] un accidente de tránsito y [illegible] daños a otros.

Consulta más información con el asesor [illegible] quien adquirió este SOAT o ingresa en:

www.segurotercero.com



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

En caso de accidente de tránsito:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- [illegible]

Habeas data

[illegible]

BENEFICIOS!

registro.tubeneficiomundial.com

www.tubeneficiomundial.com

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.08.17 16:58:58 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012137648

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SSE096	FORD	F 600	1956

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
08G0131265	N	F60Z6E25588

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
F60Z6E25588	N	F60Z6E25588	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
AMAYA MORENO NELSON HERNANDO	C.C. 11257510

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
1413	I	22/01/1956	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/02/1961	18/07/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/RICAURTE



LT01006851245

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 157636795

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CONTROL AUTOS DE FUSAGASUGA S.A.S

NIT: 900336502

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-084-001

Fecha de expedición: 2022/01/21

Fecha de vencimiento: 2023/01/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SSE096

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1956

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5700

NRO. MOTOR: 08G0131265

NRO. CHASIS: F60Z6E25588

VIN: F60Z6E25588

LÍNEA: F 600

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: NELSON H. AMAYA M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOHORA ALICIA ALCARCEL CEPEDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160658099

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2022/08/03

Fecha de vencimiento: 2023/08/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TGL323

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35295946

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT8CN088771

VIN: 3HTWYAHT8CN088771

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DAVIVIENDA SA

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022255185

PLACA: UVM655	MARCA: HINO	LINEA: FM1JLUD	MODELO: 2015
CILINDRADA CC: 7.961	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ: 19245
NÚMERO DE MOTOR: J08CTT51045		REG: N	VIN: 9F3FM1JLUFXX13307
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9F3FM1JLUFXX13307 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RODRIGUEZ JIMENEZ YUBER ARLEY

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1019120624

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 256

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32014092145749[illegible]

I/E: I

FECHA IMPORT.: 18/09/2014

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 18/02/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/02/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: ST RIA TTOYTTE MCPAL YOPAL



LT07000431779

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 158624219

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2022/03/12

Fecha de vencimiento: 2023/03/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UVM655

CLASE: VOLQUETA

MARCA: HINO

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7961

NRO. MOTOR: J08CTT51045

NRO. CHASIS: 9F3FM1JLUFXX13307

VIN: 9F3FM1JLUFXX13307

LÍNEA: FM1JLUD

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: YUBER A. RODRIGUEZ J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

Escaneado con CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	3	7	2022	3	8	2023	3	7

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
83105519 - 605419110	UVM655	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7961	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HINO	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: FM1JLUD	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J08CTT51045	9F3FM1JLUFXX13307	9F3FM1JLUFXX13307	19,24

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
YUBER RODRIGUEZ ARLEY	3217534107	CC	1019120624	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	83105519	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 878.400	$ 456.700	$ 1.900

TOTAL A PAGAR

$ 1.337.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Dando cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en https://www.segurosmundial.com.co/media/PoliticaProtecciondeDatosV2Enerode2019.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.07.07 10:55:41 -05:00

Escaneado con CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar
- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Escaneado con CamScanner

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

UVM655

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10022255185

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

HINO

LÍNEA:

FM1JLUD

Escaneado con CamScanner

MODELO:

2015

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

J08CTT51045

NÚMERO DE CHASIS:

9F3FM1JLUFXX13307

NÚMERO DE VIN:

9F3FM1JLUFXX13307

CILINDRAJE:

7961

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

18/02/2015

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTOyTTE MCPAL YOPAL

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

Escaneado con CamScanner



CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

ALIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS.
Nit: 830.082.968-6
Licencia Salud Ocupacional Resolución No. 7095/2015
202203684

Se certifica que al señor(a):	**JAIME ALARCON SOCHA**
Identificado(a) con documento:	**CC 4168664**
Se le practicaron los exámenes:	**AUDIOMETRIA** **EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL** **VISIOMETRIA**
Tipo de exámen:	**PREOCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR**
Empresa:	**ARK INGENIERIA SAS**
Cargo:	**CONDUCTOR**
Fecha:	**12/02/2022**

Los exámenes arrojaron como resultado: **APTO SIN RESTRICCIÓN**

Restricciones:

NO

Recomendaciones laborales:

APTO PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR.

USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS.
AUTOCUIDADO, PROPENDER POR LA REALIZACION DE ACTOS SEGUROS.
HIGIENE POSTURAL.
PAUSAS ACTIVAS.
CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE CARGAS.

EVITAR EXPOSICION A NIVELES ELEVADOS DE RUIDO SIN LA ADECUADA PROTECCION AUDITIVA.
CONDUCIR CON VENTANILLA CERRADA. REPOSO AUDITIVO.

CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE LA EMPRESA (RESOLUCIÒN 000666 DEL 24 DE ABRIL DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

Recomendaciones generales:

CONTROL MEDICO ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGO POR EPS.

DIETA. EJERCICIO FISICO Y RECREATIVO, EN FORMA REGULAR.

REALIZAR CONTROL MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL ANUAL O, ACORDE AL PROFESIOGRAMA DE LA EMPRESA.

ACTUALMENTE NO PRESENTA NI REFIERE SIGNOS, SÍNTOMAS NI COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19 DE ACUERDO CON CIRCULAR EXTERNA 030 DEL 8 DE MAYO DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

REALIZAR: LAVADO PERMANENTE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN. USO PERMANENTE DE TAPABOCAS. ETIQUETA RESPIRATORIA. DISTANCIAMIENTO SOCIAL. CONTROL DIARIO DE CONDICIÓN DE SALUD, REPORTAR EN FORMA OPORTUNA SINTOMATOLOGIA RELACIONADA CON COVID-19.



DR. PEDRO PABLO PEREZ SUAREZ
MEDICO - ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA :3804 DE 2018

JAIME ALARCON SOCHA
CC 4168664

Certifico, que los datos aportados por mí en la presente historia clínica son verídicos y no he omitido información actual o de antecedentes de mi salud, me hago responsable de la misma conociendo las implicaciones legales; así mismo, he recibido información clara por parte del personal médico sobre el procedimiento realizado y he conocido el resultado para acatar las recomendaciones

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901447769	2	ARK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARK	calle 136-157a-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7534107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1604877096	9438745467	E	2022/08/16	2022/08/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,219,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARK (22 Afiliados)																								$15,933,338	$2,549,800			$16,933,338	$762,800			$16,933,338	$677,800			$16,933,338		$1,179,100		$1,000,000	$50,000		$5,219,500
Centro de Trabajo: ARK OBRA (22 Afiliados)																								$15,933,338	$2,549,800			$16,933,338	$762,800			$16,933,338	$677,800			$16,933,338		$1,179,100		$1,000,000	$50,000		$5,219,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)																								$15,933,338	$2,549,800			$16,933,338	$762,800			$16,933,338	$677,800			$16,933,338		$1,179,100		$1,000,000	$50,000		$5,219,500
1	CC	4168664	ALARCON SOCHA JAIME																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1026559967	BARRAGAN GOMEZ LUIS ALBERTO	X	X																	230301	25	$833,334	$133,400	EPS017	25	$833,334	$33,400	CCF24	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	6.960%	$58,100	25	$0	$0	Si	$258,300
3	CC	83242044	CAMPO PALOMINO RAMON																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	1000454839	CARDONA GUTIERREZ JULIAN DAVID		X																	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
5	CC	74330071	CASTELBLANCO MELO HECTOR	X	X																	230201	19	$633,334	$101,400	EPS008	19	$633,334	$25,400	CCF24	19	$633,334	$25,400	14-11	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	Si	$196,300
6	CC	4950014	DIAZ FORERO FERMIN																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	CC	1007600867	DUCUARA PEREZ YEINSY ANDRES		X																	230201	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
8	CC	10265578	ECHEVERRI HENRY																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
9	CC	80376153	GARZON CASTILLO SANTOS JORGE																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
10	CC	74333573	JIMENEZ BECERRA CARLOS																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
11	CC	1192890245	MENA CORDOBA CARLOS ANDRES																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
12	CC	19453582	MONCADA VELANDIA DIOVISELDO																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
13	CC	1193133518	MONTIEL PERILLA JAVIER ANDRES		X																	230301	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF24	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	6.960%	$53,400	23	$0	$0	Si	$237,500
14	CC	1022967017	MUSE QUILCUE JOSE ALBEIRO																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
15	CC	12602197	PADILLA ACOSTA JOSE MIGUEL		X																	230301	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF24	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	6.960%	$39,500	17	$0	$0	Si	$175,600
16	CC	1006094742	QUIÑONES SANCHEZ ARVEY																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
17	CC	1055226732	RICO CARDENAS FILDARDO ANTONIO																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
18	CC	19374145	ROMERO ALVAREZ LIBARDO																				0	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$125,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$1,000,000	$50,000	No	$284,600
19	CC	1022971649	ROSAS NARANJO CRISTIAN ENRIQUE		X																	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
20	CC	4132243	SALAMANCA PIÑEROS VICTOR MANUEL																			230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
21	CC	1000458838	SERNA PALACIOS JHON FREDDY																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
22	CC	1018447740	TENORIO ORTIZ YERSON GILBERTO		X																	231001	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
Total			**Afiliados(22)**																					$15,933,338	$2,549,800			$16,933,338	$762,800			$16,933,338	$677,800			$16,933,338		$1,179,100		$1,000,000	$50,000		$5,219,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901447769	2	ARK INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARK	calle 136-157a-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7534107	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1604877096	9438745467	E	2022/08/16	2022/08/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,219,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$2,549,800	$0	$0	$2,549,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$5,400	$0	$0	$5,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$960,000	$0	$0	$960,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,157,600	$0	$0	$1,157,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$426,800	$0	$0	$426,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,179,100	$0	$0	$1,179,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$1,179,100	$0	$0	$1,179,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$677,800	$0	$0	$677,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$677,800	$0	$0	$677,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$762,800	$0	$0	$762,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$105,400	$0	$0	$105,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$237,600	$0	$0	$237,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$64,100	$0	$0	$64,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$190,700	$0	$0	$190,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				22	$5,219,500	$0	$0	$5,219,500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 158624219

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA

NIT: 900274028

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2022/03/12

Fecha de vencimiento: 2023/03/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UVM655

CLASE: VOLQUETA

MARCA: HINO

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7961

NRO. MOTOR: J08CTT51045

NRO. CHASIS: 9F3FM1JLUFXX13307

VIN: 9F3FM1JLUFXX13307

LÍNEA: FM1JLUD

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: YUBER A. RODRIGUEZ J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUDY ADELA GONZALEZ BERNAL

Escaneado con CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2022	3	7	2022	3	8	2023	3	7

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
83105519 - 605419110	UVM655	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7961	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HINO	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: FM1JLUD	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J08CTT51045	9F3FM1JLUFXX13307	9F3FM1JLUFXX13307	19,24

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
YUBER RODRIGUEZ ARLEY	3217534107	CC	1019120624	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	83105519	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 878.400	$ 456.700	$ 1.900

TOTAL A PAGAR

$ 1.337.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al **Club Tu Beneficio Mundial** y disfruta **descuentos y promociones** de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: **registro.tubeneficiomundial.com** Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Dando cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en https://www.segurosmundial.com.co/media/PoliticaProtecciondeDatosV2Enerode2019.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.07.07 10:55:41 -05:00

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE OBRA No. 0586-2022

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN EINNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

INFORME MENSUAL No. 003
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA

ANEXO 8 PLAN RCD

FUSAGASUGA, NOVIEMBRE 2022

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022
CP-0015-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Informe mensual de obra N-002

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía informe mensual de obra N-002 del proyecto CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL y se relacionan los siguientes documentos.

1. Informe mensual de obra
2. Anexo 1 correspondencia
3. Anexo 2 bitácora de obra
4. Anexo 3 registro fotográfico
5. Anexo 4 certificados de calidad acero
6. Anexo 5 Acta de Inicio
7. Anexo 6 Pólizas
8. Anexo 7 Modificatorio al contrato inicial
9. Anexo 8 Informe SST
10. Anexo 9 Informe Ambiental
11. Anexo 10 Informe social

Recibí, CNAR
04-11-2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre 2022

CP-0016-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Corte de obra N-001

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía Corte de obra N-001, se anexa archivo PDF de actas y memorias.

Cordialmente

Recibí. CMAR
04-11-2022

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0017-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Concepto revisoría estructural

Respetados señores:
Por medio de la presente se envía el concepto generado el día 17 de noviembre por la revisoría estructural, se anexa documento.

Recibí: 24/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

Bogotá D.C., 23 de noviembre 2022

CP-0018-0586-2022

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES 2022
Ciudad

Referencia: "LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"

Asunto: Entrega justificación obras no previstas, Mayores y Menores cantidades de obra.

Respetados señores:
Por medio de la presente se entrega la justificación de las obras no previstas, las Mayores y Menores cantidades se anexa documento.

Recibí:
30/11/2022

Cordialmente

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA

C.C 79.952.890 DE BOGOTA D.C
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
TEL. 467-27-35
DIRECCION. AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312 BOGOTA D.C
CORREO. construedificacionesfusa2022@gmail.com

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

Seguimiento y aprovechamiento

Descripción del material				Volúmenes proyectados en PGIRCD			3. Aprovechamiento o tratamiento de RCD				4. Lugar de disposición final	5. Acumulado				Mes de reporte: OCTUBRE 2022			
																Datos del mes del reporte			
Etapa	Tipología de residuo	Componente	Observaciones Descripción del RCD	1. Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (m3)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3)	2. Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (TON)	Disposición final de RCD (m3)	Volumen de RCD Reutilizado (m3)	Volumen de RCD Reciclado (m3)	Otros tratamientos (m3)		Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real generada (m3)	Cantidad real generada (TON)	Justificación	Volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)	Cantidad real de RCD generada (m3)	Cantidad real de RCD generada (TON)	Justificación
Demolición	RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes.	N.A							1200	VEREDA JORDAN ALTO, LA DORA Y JAIRO HORTUA		4458	7350	CAMPO ALEGRE		2079	3427	CAMPO ALEGRE
	RCD no Pétreos	Plásticos, Metales, Madera, Cartón, Papel, Vidrios, Otros.	N.A										0	0			0	0	
Excavación y Cimentación	Residuos Cespedón	Coberturas vegetales	N.A		**3097**	**5104**							0	0			0	0	
	Residuos finos expansivos y no expansivos	Tierras, arcillas (caolín), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría, arcillas (Caolín), limos y residuos inertes poco o no plástico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometría.	N.A										0	0			0	0	
Construcción	RCD Pétreos	Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfaltos y materiales inertes.	N.A	**2016,00**	**0**	**3324**						0				78,4			CEMEX CONCRETO
	RCD no Pétreos	Plásticos, Metales, Madera, Cartón, Papel, Vidrios, Otros.	N.A	**0**								0				0			
	Residuos de carácter metálico	Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc	N.A	**0**								0				0			
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas	N.A	**0**								0				0			
	Residuos peligrosos	Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que esté incluído en los anexos del Decreto 4741 de 2005.	N.A	**0**		**0**						0				0			
TOTAL				**2016**	**3097**	**8428**	**0**	**0,00**	**0**	**1200**		**0**	**4458**	**7350**	**0**	**78,4**	**2079**	**3427**	
25% DE RCD				**6492**															

ESTIMACION DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD DE LA OBRA											
RCD GENERADO	ESTIMACION RCD		EXPLICACION DE LA CONVERSION	UNIDAD	PRECIO DE GESTION EN PLANTA			DISPOSICION FINAL			
	CANTIDAD ESTIMADA SEGÚN PG-RCD	UNIDAD			COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA	UNIDAD	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	% DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA
Coberturas vegetales	0	M3	N.A.	M3	34000	$ 0	0,00	M3	$ 24.000	0	0,00
Tierras, arcillas (Caolin), limos y residuos inertes, plastico y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200 de granulometria, arcillas (caolin), limos y residuos inertes poco o no plastico y expansivos que sobrepasan el tamiz # 200 de granulometria	2079	M3	N.A.	M3	34000	$ 70.686.000	2,28	**M3**	$ 34.000	70686000	2,28
Concretos, ceramicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	0	M3	N.A.	M3	34000	$ 0	0,00	**M3**	$ 34.000	0	0,00
Plasticos, PVC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Maderas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Carton, Papel	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Vidrios	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Poliestireno, carton-yeso (drywall), llantas usadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, y desechos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del Decreto 4741 de 2005	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	**N.A.**	N.A.	N.A.	N.A.
Valor Total										**$ 70.686.000**	2,28%

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización con referencia de la zona.

N.A

2. Esquema del área para reutilización de los RCD´s

N.A

Altura: H
Ancho: A
Largo: L

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

N.A

4. Descripción del proceso a realizar. Definir el residuo y el coeficiente de compactación del material:

N.A

5. Registro fotográfico durante la reutilización

N.A

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización

N.A





7. Volumen total de material reciclado ingresado (m3):
N.A


8. Duración del proceso (meses):
N.A

9. Área final recuperada (m2):
N.A

10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra (%):
N.A

11. Al corte del presente informe NO se realizó aprovechamiento de RCD.

Cordialmente,



_____

SANDRA LLIANA GALINDO SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUEDIFICAIONES 2022

J. PACHON S.A.S
NIT: 900.298.031-2

Certificado No. 218-22
Fecha de emisión Octubre 15 de 2022

CERTIFICADO DE GESTION DE RESIDUOS

J PACHON S.A.S

NIT 900.298.031-2
Gestor final de RCD

DATOS BASICOS DEL GESTOR RCD			
No. Registro car	006	**Gestor**	Disposición final
Nombre o razón social	J PACHON SAS	**Nit**	900.298.031-2
Nombre establecimiento	Sitio de Disposición Final RCD – Campoalegre bajo		
Representante legal	Jorge Arnulfo Pachón Espitia		
Dirección	Calle 16 No. 12 – 07	**Ciudad**	Fusagasugá
Teléfono	3156864422	**Email**	ambiental@jpachon.net

CERTIFICA

Realizo la disposición final de residuos de construcción y demolición RCD presentados por:

DATOS BASICOS DEL GENERADOR					
Número único asignado por parte de la autoridad ambiental					
Nombre o razón social	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022			Nit	901.604.402-9
Representante legal	IVAN ALONSO PARDO AVILA				
Dirección de domicilio	AC 24 51 40 OF 316		**Ciudad**	Bogotá	
Teléfono	6014672734	**Email**	contabilidad@estudios.com.co		
Nombre del proyecto	Ancianato				
Dirección	CR 7 No. 3 – 27 Centro		**Ciudad**	Fusagasugá	

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	**m^3**	**t**
Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno	1477	1452,9
Productos de cimentaciones y pilotajes		
Pétreos		
Total	**1477**	**1452,9**
Fecha de recepción de los RCD	Del 01 de octubre al 15 de octubre del año 2022	

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de octubre del año 2022.

En constancia firma

CERTIFICADO J. PACHON S.A.S 900.298.031-2

JORGE ARNULFO PACHÓN ESPITIA
Representante Legal Suplente
J PACHON **S.A.S.**
NIT 900.298.031-2

QR verificación autenticidad

Powered by CamScanner

J. PACHON S.A.S
NIT: 900.298.031-2

Certificado No. 225-22
Fecha de emisión Octubre 31 de 2022

CERTIFICADO DE GESTION DE RESIDUOS

J PACHON S.A.S

NIT 900.298.031-2
Gestor final de RCD

DATOS BASICOS DEL GESTOR RCD			
No. Registro car	006	**Gestor**	Disposición final
Nombre o razón social	J PACHON SAS	**Nit**	900.298.031-2
Nombre establecimiento	Sitio de Disposición Final RCD – Campoalegre bajo		
Representante legal	Jorge Arnulfo Pachón Espitia		
Dirección	Calle 16 No. 12 – 07	**Ciudad**	Fusagasugá
Teléfono	3156864422	**Email**	ambiental@jpachon.net

CERTIFICA

Realizo la disposición final de residuos de construcción y demolición RCD presentados por:

DATOS BASICOS DEL GENERADOR					
Número único asignado por parte de la autoridad ambiental					
Nombre o razón social	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022			Nit	901.604.402-9
Representante legal	IVAN ALONSO PARDO AVILA				
Dirección de domicilio	AC 24 51 40 OF 316		**Ciudad**	Bogotá	
Teléfono	6014672734	**Email**	contabilidad@estudios.com.co		
Nombre del proyecto	Ancianato				
Dirección	CR 7 No. 3 - 27		**Ciudad**	Fusagasugá	

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	**m^3**	**t**
Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno	602	591,0
Productos de cimentaciones y pilotajes		
Pétreos		
Total	**602**	**591,0**
Fecha de recepción de los RCD	Del 16 de octubre al 31 de octubre del año 2022	

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 2022.

En constancia firma,

SARA MARCELA PACHON MELO
Representante Legal Suplente
J PACHON S.A.S.
NIT 900.298.031-2

QR verificación autenticidad

Powered by CamScanner

	INDICADORES RCD		

CONTRATISTA	**CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022**	**CONTRATO**	**2022-0586**

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL DE FUSAGASUGÁ"

MES OCTUBRE **DURACION** SIETE (7) MESES

INDICADOR DE EFICIENCIA

$$\frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PG RCD (\$)}}{\text{Presupuesto planeado para el PG RCD (\$)}} \times 100$$

$$\frac{70.686.000}{68.544.000} \times 100$$

EFICIENCIA **103%**

Este indicador permite conocer la inversión realizada mes a mes por parte del generador en la gestión de los RCD de la obra, con respecto a lo calculado en la fase de planeación y presentado en el Plan de Gestión de RCD

INDICADOR DE EFICACIA

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (m3)}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (m3)}} \times 100$$

$$\frac{0,00}{2.016,00} \times 100$$

EFICACIA **0%**

Este indicador permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los generados, y verificar el cumplimiento del porcentaje definido por la Resolución 1115 de 2012, de acuerdo con el año de vigencia.

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (m3)}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (m3)}} \times 100$$

$$\frac{2.079}{288,0} \times 100$$

EFECTIVIDAD **722%**

CONTRATO DE OBRA No 2022-0586

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGÁ DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA".

INFORME GESTION SOCIAL No 3

VERSIÓN 1

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

NOVIEMBRE 2022

TABLA 1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO	No. DE COPIAS
Alcaldía Fusagasugá	1
Archivo Proyecto	1

TABLA 2 ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


TÍTULO DEL DOCUMENTO:		Producto Social – Informe No 3				
DOCUMENTO No.:		01				
APROBACIÓN	**NÚMERO DE LA REVISIÓN**		**0**	**1**		
	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**Nombre:**	Adriana Chacon			
		Firma:				
		Fecha:	02-12-2022			
	Vo. Bo. DIRECTOR DEL PROYECTO	**Nombre:**	Ing. Luis G. Farfán			
		Firma:				
		Fecha:	02-12-2022			

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....5

1.1 OBJETIVO GENERAL....6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....7

2.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA....7
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....8
2.3. POBLACIÓN BENEFICIARIA....8

3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD "INFORME NO 3"....9

3.1 PERIODO REPORTADO:....9
3.2 TIEMPOS DE DEDICACIÓN DEL PERSONAL SOCIAL EN EL PROYECTO....9
3.3 FUNCIONES DEL PERSONAL SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL APÉNDICE E....9

4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD....11

4.1 PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO.....11
4.1.1 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIRTUAL....11
4.1.4 TIPOS DE REQUERIMIENTOS Y TIEMPOS DE RESPUESTA....12
4.1.4.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN....12
4.1.4.2 QUEJAS....12
4.1.4.3 RECLAMOS....12
4.1.4.4 SUGERENCIAS....12
4.1.4.5 DENUNCIAS....13
4.2 PROGRAMA DE DIVULGACION Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD. 13
4.2.1 REUNIONES INFORMATIVAS EXTRAORDINARIAS....13
4.2.2 PIEZAS COMUNICATIVAS....13
4.2.3. PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN....13
4.2.4. PLEGABLE DE SOSTENIBILIDAD....14
4.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS....14
4.3.1. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD....14
4.3.2. ACTAS DE COMPROMISO....15
4.3.3 LEVANTAMIENTO DE REGISTRO FÍLMICO DE ANDENES, Y DE LAS VÍAS QUE SERÁN ALEDAÑAS A EL PROYECTO....15
4.4 COMITÉ DE PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD....15

5. CLUSIONES Y RECOMENDACIONES....16

ANEXOS.

LISTADO DE TABLAS.

TABLA 1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2
TABLA 2 ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
TABLA 3 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 7
TABLA 4 TIEMPOS DE DEDICACIÓN PERSONAL SOCIAL 9
TABLA 5 PQRS DEL MES 11
TABLA 6 PIEZAS COMUNICATIVAS. 13
TABLA 7 PUNTOS SATELITES 14
TABLA 8 ENTREGA DE COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD 14

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía municipal de Fusagasugá, desde los diferentes contratos busca mejorar las condiciones con relación a la infraestructura existente en el barrio CENTRO, con el propósito de desarrollar programas y proyectos sociales que contribuyan en el bienestar social de la comunidad Fusagasugueña.

Este documento tiene como finalidad presentar el avance y gestión realizadas en atención al plan de gestión social, el cual en su contenido presenta actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2022 enfocadas a promover el diálogo constante con la ciudadanía, donde por medio de canales de participación y piezas informativas, brinda información sobre los alcances y beneficios del Contrato de obra No 2022 0586, **CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGÁ DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA.**

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Reportar las actividades ejecutadas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022 enmarcadas desde el área de Gestión Social del Consorcio Construedificaciones 2022, correspondientes a cada uno de los programas planteados en el Plan de gestión social, con el fin de proporcionar a la comunidad aferente toda la información acerca del proyecto.

.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INFORMAR

- Mantener informada a la comunidad aferente, sobre los beneficios y avances del proyecto.

MITIGAR

- Implementar las acciones necesarias para mitigar los impactos ocasionados por el desarrollo del proyecto.

ARTICULAR

- Consolidar y dinamizar estrategias de gobernanza para la coordinación y el trabajo colaborativo interinstitucional para el avance del proyecto que potencien los beneficios del mismo.

APROPIAR

- Generar espacios de participación y formación que posibiliten el diálogo ciudadano, el intercambio de saberes y la promoción de la cultura ciudadana para la apropiación y sostenibilidad del proyecto.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Implementar el sistema de servicio a la ciudadanía, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Información Del Contratista E Interventoría.

TABLA 3 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGÁ DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA".	
ENTIDAD CONTRATANTE	
Entidad	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
Nombre Supervisor	OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE
Dirección	Calle 6 No. 6-24
Teléfono	3152414733
Correo Electrónico	secretariadeinfraestructura@fusagasugacundinamarca.gov.co
CONTRATISTA	
Nombre	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
No. de Contrato	2022-0586
Representante Legal	SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ
Director de obra	ING. LUIS GABRIEL FARFAN
Dirección	AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 312
Teléfono	4-67-27-35
Correo Electrónico	construedificacionesfusa2022@gmail.com
INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO INTERVENTORES 2022
No. de Contrato	01617 DE 2022
Representante Legal	OSCAR EDUARDO PINILLA PINILLA
Director de Interventoría	NESTOR GUERRERO
Dirección	AV CALLE 24 N. 51-40 OFC 309
Teléfono	3144361675
	consorciointerventores2022@gmail.con
PROFESIONAL SOCIAL CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022	
Nombre	ADRIANA CHACON GUERRERO
Teléfono	3115582660
Correo Electrónico	adrichacongue@hotmail.com

2.2 Localización Del Proyecto

La construcción del Centro de Integración e Innovación Social se realizará en la comuna centro específicamente el barrio Gaitán ubicado en el municipio de Fusagasugá.



2.3. Población Beneficiaria

Si bien los habitantes del barrio centro serán los más beneficiados y tomados como Área de Influencia Directa, todos los habitantes tanto de la Comuna centro, integrada por los siguientes barrios: Santander, Olaya, Centro, Emilio Sierra, Potosí y Luxemburgo y en general los 147.631 Fusagasugueños. podrán ser beneficiarios los programas sociales y áreas de recreación construidas en este centro de integración.

3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD "INFORME No 3"

3.1 Periodo reportado:

El Consorcio Construedificaciones 2022, presenta este documento consolida acciones desarrolladas desde el 1 al 30 de noviembre 2022.

3.2 Tiempos de dedicación del personal social en el proyecto

TABLA 4 TIEMPOS DE DEDICACIÓN PERSONAL SOCIAL

PROFESIONAL SOCIAL	25% para la etapa de construcción

3.3 Funciones del personal sociales establecidas en el apéndice E

Las funciones generales para el desarrollo del proyecto desde el componente de gestión social:

- Recorridos de obra para el conocimiento territorial.
- Estrategia de articulación y coordinación entre los diferentes grupos del proyecto.
- Elaboración del plan de gestión social.
- Revisar con el acompañamiento de la interventoría y bajo los lineamientos del de la alcaldía municipal de Fusagasugá todo lo pertinente a la gestión social.
- Asistir al comité de seguimiento, en el que hará un recuento de las actividades desarrolladas, presentará las actividades a realizarse en el siguiente periodo, hará las observaciones y solicitudes necesarias para el buen desarrollo de la gestión y diálogo con la ciudadanía.
- Crear un sistema de atención al usuario y canalizar y dar respuesta con ayuda del equipo de trabajo a las diferentes PQRS.
- Presentar en medio magnético todos los soportes e informes relacionados con la gestión social.
- Desarrollar piezas de divulgación según las necesidades que exista en obra.
- Gestionar espacios de participación con el fin de socializar los avances de la obra.

GENERALIDADES DE LA GESTION SOCIAL:

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022 se desarrollaron diferentes actividades pertinentes tales como recorridos de obra junto a la interventoría esto con el objetivo de conocer la percepción de la comunidad.

Se realiza acercamientos con los comerciantes quienes solicitan la continua limpieza de las volquetas para que no se hagan barriales en las calles aledañas. Se informa que desde el área ambiental se realiza esta actividad cada que sale una volqueta.

Comité de Seguimiento Social

Durante el periodo reportado se generaron dos comités con la interventoría donde se trataron temas concernientes a la obra. Estos días fueron:

- 09 de noviembre 2022.
- 16 de noviembre 2022.
- 23 de noviembre 2022.

Comités Integrales de Obra

Durante el presente periodo se realizaron dos comités integrales de obra con la presencia del área social.

- 09 de noviembre 2022.
- 23 de noviembre 2022

4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD

4.1 PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO.

4.1.1 Oficina de atención al ciudadano virtual

Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre 2022 se realizaron las siguientes actividades:


- Para este periodo se realizó la propuesta dentro del PGS de realizar la atención al usuario atreves de una oficina virtual.
- Se realizo la gestión para realizar la adquisición de una línea exclusiva para la atención al usuario.
- Se genero un correo para la atención de la comunidad de uso exclusivo para el contrato en mención.

Oficina Virtual.	Correo Electrónico	Línea de Atención a la ciudadanía
	construedificacionesatencion@gmail.com 	**3104231617** 

TABLA 5 PQRS DEL MES

No. De Oficinas satélites	N° obra o contrato atendido	N° Total PQRS recibidas en el proyecto	N° PQRS Recibidas en el periodo	N° PQRS abiertas	N° PQRS cerradas periodo	N° PQRS cerradas en total
1	**2022-0586**	0	0	0	0	0

Durante el presente periodo no se abrieron PQRS, no se recibieron llamadas telefónicas, ni se recibieron correos, dirigidos al Consorcio Construedificaciones 2022.

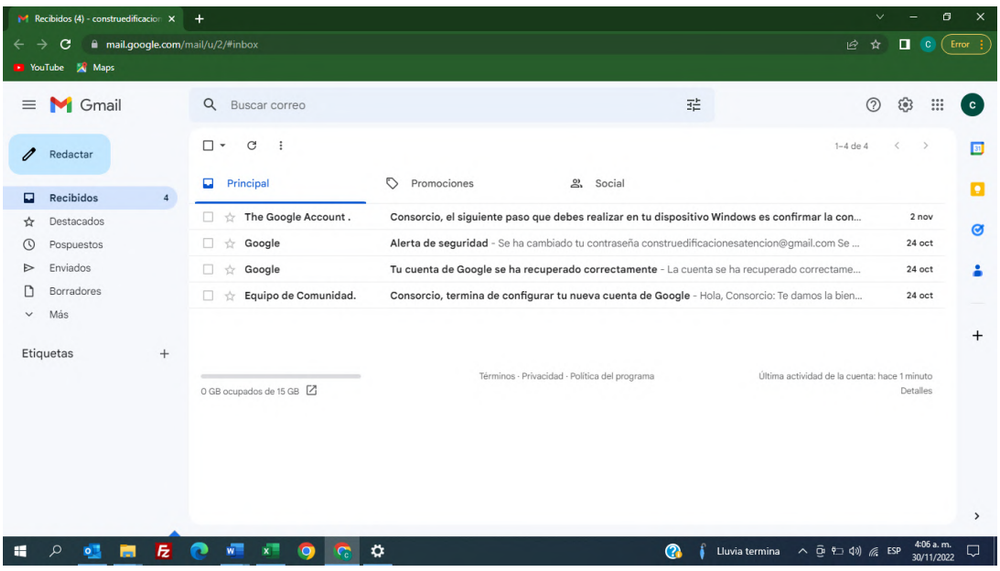

4.1.4 Tipos de requerimientos y tiempos de respuesta

Desde el Plan de gestión social los cuáles se han categorizado, a fin de simplificar el trámite y la respuesta de los mismos. A continuación, se describe cada uno de ellos:

4.1.4.1 Solicitud de información.

Las peticiones de información son solicitudes a la institución de documentos no reservados, ya sea por interés personal, por ejercer control, vigilancia o por el solo hecho de estar actualizado. El Derecho de Petición de información no solo recae sobre impresos o escritos, sino que también se extiende sobre cualquier objeto mueble de índole representativa o declarativa como planos, dibujos, fotografías, cintas cinematográficas o fonópticas, radiografías, grabaciones magnetofónicas, entre otros, mientras la constitución o la Ley no le otorgue el carácter de reservado.

4.1.4.2 Quejas

Son manifestaciones que se hacen a las autoridades sobre conductas, acciones o procederes irregulares de servidores públicos o de particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público. En cualquier caso, deberá informarse al denunciante, dentro los quince (15) días hábiles a la recepción del requerimiento acerca del trámite dado por la oficina correspondiente.

4.1.4.3 Reclamos

Los reclamos consisten en poner en conocimiento de las autoridades una irregularidad o la suspensión injustificada en la prestación de un servicio o su deficiente atención por parte de una autoridad administrativa. Es la insatisfacción sobre una inadecuada prestación del servicio por parte de los servidores públicos de la Entidad.

4.1.4.4 Sugerencias

Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública.

4.1.4.5 Denuncias.

Es la puesta en conocimiento de la presunta comisión de un delito por parte de algún o algunos servidores públicos de la Entidad; tiene como esencial efecto, el de movilizar al órgano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor; aclarando que la Ley castiga a los falsos denunciantes conforme al Código Penal, según artículos 435 y 436.

4.2 PROGRAMA DE DIVULGACION Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD.

Este programa genera espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para propiciar el conocimiento y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto. Además, busca minimizar los efectos y externalidades negativas del mismo, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y las problemáticas inherentes al desarrollo del proyecto.

Respecto a las reuniones participativas e informativas, su propósito será sensibilizar y motivar a la población frente al proyecto, recogiendo inquietudes y sugerencias para fortalecer los lazos de diálogo, comunicación y confianza para la apropiación del mismo.

4.2.1 Reuniones informativas extraordinarias

Para este periodo no se realizaron actividades enmarcadas en este programa.

4.2.2 Piezas Comunicativas.

Para este periodo se realizó la entrega de un volante a la comunidad aledaña con el objetivo de conformar la Veeduría del Centro de Integración e innovación integral social de Fusagasugá.

TABLA 6 PIEZAS COMUNICATIVAS.

Consecutivo de volante	Tipo de volante	No de volantes entregados	Fecha de entrega	Indicador
03	03. conformación de volantes.	26	28 nov 2022	Actividades planeadas*100/actividades ejecutadas. **1*100/1 =100%**

ANEXOS 01: Formato entrega de volantes y Volante No 03.

4.2.3. Puntos satélites de información.

Se realizo la instalación de un punto Satélite en la calle 3 No 69 A-21, se realizó la instalación del volante No 3 Sobre la conformación de las Veedurías.

TABLA 7 PUNTOS SATELITES

FECHA DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN PUNTO SATÉLITE	CONSECUTIVOS DE COMUNICADOS	PERSONA QUE FIRMA	REGISTRO FOTOGRAFICO	INDICADOR
28-noviembre 2022	calle 3 No 69 A-21	02	John Jairo Vizcaíno		Actividades planeadas*100/actividades ejecutadas. **1*100/1 =100%**

ANEXOS 02: Formato de actualización punto Satélite.

4.2.4. Plegable de Sostenibilidad.

Esta actividad está planteada para el final de la OBRA.

4.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS

Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad y debe realizar el área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales para el acercamiento y comunicación estratégica con el propósito de garantizar la ejecución del proyecto, así como el bienestar de la comunidad presente en el área de influencia de la obra; se realizará el acompañamiento al equipo técnico en las siguientes actividades:

- Inventario de predios a los que se levantará actas de vecindad incluidos Bienes de Interés Cultural.
- Registro estado actual vías autorizadas para los desvíos según el PMT – inicio y finalización

4.3.1. levantamiento de actas de vecindad

Para este periodo se realizó la entrega de 08 copias de actas de vecindad las cuales fueron entregadas a los propietarios el resto de actas de vecindad, se realizara una nueva entrega el día 3 de diciembre y las que no se encuentren los propietarios se les entregaran al presidente de la junta de acción comunal.

Tabla 8 Entrega de copias de actas de vecindad

FECHAS DE REALIZACIÓN	FECHA SEGUNDA VISITA	NO ACTAS LEVANTADAS	NO DE ACTAS POR ENTREGAR	INDICADOR
20 de noviembre 2022	Se programa para el 3 de diciembre	08	25	Actividades planeadas*100/actividades ejecutadas. **1*100/1 =100%**

Link drive registro fotográfico y base de datos. https://drive.google.com/drive/folders/16WxQbfDi42rnrGOzglgmBbpmLGPaPtlh?usp=sharing

ANEXOS 03: Formato entrega de actas de vecindad.

4.3.2. Actas de Compromiso

Para este periodo no se realizaron actas de compromiso.

4.3.3 Levantamiento de registro fílmico de andenes, y de las vías que serán aledañas a el proyecto.

Para este periodo se realizó un nuevo registro fílmico de las vías aledañas con el fin de en el link presentado a continuación se aclara que estas se realizaron en el periodo de septiembre de 2022.

- De la calle 4 desde carreras 7 y 8
- De la calle 3 desde carreras 7 y 8
- Carrera 7 desde calles 3 y 4
- Carrera 8 desde calles 3 y 4.

Link drive registro fílmico.
https://drive.google.com/drive/folders/16WxQbfDi42rnrGOzglgmBbpmLGPaPtlh?usp=sharing

ANEXOS 04: Entrega de videos en CD.

4.4 Comité de participación a la comunidad.

Durante este periodo se realiza la entrega de un volante invitando a la comunidad a conformar la veeduría ciudadana del centro de integración e innovación social de Fusagasugá. Para este mes no se desarrollaron actividades pertinentes a este Ítem ya que esta actividad debe ser coordinada con la alcaldía, para el próximo mes se convocará a la comunidad a reunión el día 14 de diciembre para conformar la veeduría y realizar los comités de seguimiento.

5. CLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizan y ejecutan actividades pertinentes que se hacen necesarias para da cumplimiento con el plan de gestión social entregado el 21 de septiembre de 2022 a la interventoría.

- Se realizará coordinación con los funcionarios encargados de la alcaldía con el fin de verificar fecha y hora de la reunión de participación comunitaria con los veedores.

- Las condiciones en que se desarrolla el contrato son a través de un Plan de gestión social diseñado por el Construedificaciones 2022 y entregado a la interventoría.

- Se mantiene activo los canales de participación e información a la comunidad.

- Se realizan recorridos junto con la interventoría con el fin de escuchar a la comunidad y sus inquietudes, en estos recorridos la comunidad solicita una reunión con el Consorcio Parques 2022, se está realizando la gestión con la gestora social de la alcaldía.

ANEXOS

ANEXOS 01: Formato entrega de volantes y Volante No 03.

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA

Comunicado No. 03
Contrato de obra. No 2022-0586
Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGÁ DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA".

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ. El CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022, Invitan a los vecinos del sector, a ser parte de la veeduría ciudadana correspondiente a la construcción del Centro de Integración e innovación integral social de Fusagasugá. en cual se esta desarrollando en donde antes era el antiguo ancianato San Rafael. Para tal fin se solicita poner un mensaje en el correo electrónico de atención al usuario o llamar al numero telefónico que se encuentra a continuación.

Horario de atención Oficina Virtual.	Correo Electrónico	Teléfono
8:00 am a 12 m	construedificacionesatencion@gmail.com	3104231617

Hacer parte de la Veeduría es brindar un espacio de confianza y trasparencia en la construcción de centro de integración e innovación social de Fusagasugá, y cuidar de los recursos del municipio.

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN Y ATENCIÓN.
Cualquier información y/o queja o reclamo comunicarse a la;

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO.

Teléfono: **3104231617**
Correo electrónico: construedificacionesatencion@gmail.com
Residente Social: Adriana Chacon Guerrero.
Horario de atención: 8:00 am a 12 m

FORMATO

ENTREGA DE VOLANTES

CÓDIGO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA"
	GESTION SOCIAL

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

TIPO DE PIEZA: Conformacion Cedula.

CONTRATO N°: 2022-0586 RESPONSABLE: Diana Chacon FECHA 23-NOV-2022.

BARRIO: Centro Olaya.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Pedro Hernandez	Cra 7 #4-11	3155049115	Centro		1	
2		Cra 4 - 7-39		Centro		1	Bajo Puerta
3		Cra 4 - 7-51				1	Bajo Puerta
4		Calle 4 7-63				1	Bajo Puerta
5		Calle 4 7-75				1	
6		Calle 4 7-89				1	Entregado
7	Luz Marina Cifuentes	Calle 4 7-79	3243553134	Centro Olaya	Luz Sabogal	1	
8	Paola Malagon	Calle 4 con 8-01	3168785505	Florida		1	Entregado
9	Nubia Ramirez	Cra 8 # 3-47	3202222144	Florida	Nubia Ramirez	1	Entregado
10		Cra 8 3-31		florida		1	Bajo Puerta
11		Cra 8 3-29		florida		1	Bajo Puerta
12		Cra 8 3-27		florida		1	Bajo Puerta
13		Cra 8 3-25		florida		1	Bajo puerta
14		Cra 8 3-23		florida		1	Bajo Puerta
15		Calle 3 - 7-60		florida		1	Bajo Puerta
16		Calle 3 7-38		florida		1	Bajo Puerta
17		Calle 3 7-34		florida		1	Bajo Puerta
18		Calle 3 7-32		florida		1	Bajo Puerta
19	Leidy Castro	Cr 7 # 2-49	3044169888	Florida	Leidy Castro	1	Casa verde
20	jose yesid Carmona	calle 7 con calle 3	3142789520	florida		1	
				TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:		20	

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Diana Chacon G.	Maria Paula Diaz.
FIRMA		Maria Paula Diaz.

FORMATO

ENTREGA DE VOLANTES

CÓDIGO	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA".

GESTION SOCIAL

CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022

TIPO DE PIEZA: Odonto conformacion Oeedonci.

CONTRATO N°: 2022-0586 RESPONSABLE: Aliana Quacoy FECHA 28 NOV. 2022.

BARRIO: Centro Oloya

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1		Cra 7 # 3-30		florida		1	Bajo Puerta
2		Cra 7 3-42		florida		1	Bajo Puerta
3		Cra 7 3-48		florida		1	Bajo Puerta
4		Cra 7 3-54		florida		1	Bajo Puerta
5		Cra 7 3-60		florida		1	Bajo Puerta
6	Angela Izquierdo	Cra 7 3-68	3123497370	florida	Angela Izquierdo	1	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 6.

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Aliana Quacoy G.	Maria Paula Diaz
FIRMA		Maria Paula Diaz.

ANEXOS 02: Formato de actualización punto Satélite.

FORMATO			
ACTA DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD			
CODIGO	PROCESO	VERSION	CONSORCIO CONSTRUEDIFICACIONES 2022
	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

FECHA			CONTRATONo 2022-586 "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL DE FUSAGASUGÁ DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA".
28 DD	Nov MM	2022 AA	



2. DATOS DE PUNTO SATÉLITE:

NOMBRE : Jhon Vizcaina.
DIRECCIÓN: Cll 4 N°7 59
TELÉFONO: 311 823 1005.
CORREO ELEC: JohnJairoVizcaina@gmail.

3. COMPROMISO

Se instala punto satelite.
1 volante.

Se deja volantes para conformacion de veeduria, se instala punto satelite.

6. FIRMAS

John Jairo Vizcaino S
Propietario /o quien autoriza el punto satélite

Residente Social del Contratista o Consultor

Maria paula Diaz.
Residente Social Interventoría (Cuando aplique)

ANEXOS 03: Formato entrega de actas de vecindad.

FORMATO
ENTREGA DE VOLANTES

CÓDIGO	OBJETO DEL CONTRATO:
	GESTION SOCIAL

TIPO DE PIEZA: Entrega Copia actos de Vecindad.

CONTRATO N°: 2022-0586. RESPONSABLE: Adriana Olaya FECHA 20 NOV 2022.

BARRIO: Centro Obya.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Dalia Ramirez	Cra 8 # 3-47	3202722445	Florida	Dalia Ramirez	1	
2	Pedro Hernandez	Cra 7 # 4-11	3139049168	Centro	Pedro	1	
3	Maria Paula Rodriguez	Calle 4 # 7-39	3243163361	C. Obya	Maria Paula	1	
4	Judy Castro	Cra 7 # 2-49	3012009895	Florida	Judy Castro	1	
5	Jose Pertuz	Calle 7 con calle 3	3142189520	Florida		1	
6	Paola Marroquin	Calle 4 con calle 8-01	3168645703	Florida		1	
7	Paula Vargas	Calle 3 # 7-60	—	Florida		1	
8	Maria del Pilar	Calle 3 # 7-52	—	Florida		1	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 8

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Adriana Olaya	Maria Paula Diaz
FIRMA		Maria Paula Diaz

ANEXOS 04: Entrega de videos en CD.
