2. Continuan actividades de mampostera y pañetes para jardinera plazoleta externa Costados norte y sur.
3. Se llevan a cabo actividades de pintura blanco entimax en espacios domos y blanco en techos
4. Se trabaja en instalaciones de A.A. en areas de C3 y 2 con instalacion de tuberia en cobre
5. Llega a obra tuberia para instalaciones Red contra incendio, se llevan a cabo instalación de puntos de anclaje

Contratista

Arq Residente
Interventoria

Sabado 22 de Septiembre de 2018

personal en obra:

Residente de Obra

Residente Interventoria

Maestro
Oficiales
Ayudantes
P. R.C.I.
P. Simuladores.
P. A.A.

Actividades

1. Amare acero de refuerzo para muros tanques de agua
2. pintura muros Anguiel area de domos.
3. se labora en actividades de pañete de muros jardineras plazoleta externa.
4. En tanque de agua se deben hacer los refuerzos de acuerdo a los traslapos dados en los planos de diseño. de interventoria no recibira no recibira dicho

Norma

tanque si no se hace de acuerdo a los diseños de los planos contractuales
5. el personal de Aire Acondicionado, Laborara en instalaciones de oficina Cacom 7.

Contratista

Arq [redacted]
Interventoria.

Jueves 24 de Septiembre de 2015
personal en obra:
Arquitecto Gustavo
Residente Ing. Helmut
Maestro.
Oficiales
Ayudantes
Pers. A.C.I.
Pers. A.A.
Pers. Simuladores
Actividades.

Residente Interventoria
Director interventoria
Siso interventoria.

1. Amarre acero de refuerzo para tanque de agua en sección muros.
2. Se lleva a cabo pañete en muros de jardineras de plazoleta externa
3. Se lleva a cabo instalación de las losas de concreto que conformaran las bancas, se hacen observaciones por parte de Interventoria en cuanto al acabado, textura, el nivel los bordes, las cuales deben ser corregidos para recibo de dichas actividades y pago de las mismas.
4. Continuan actividades de pintura en domos de drywall. area de simuladores
5. Se da inicio a demolicion piso (acabado) en terrazo para ampliación base para los equipos de aire acondicionado.

6. No se laboro en excavaciones para inst. tuberia voz y datos. ni excavaciones desague (rebose) tanque
7. No se laboro en pintura de perfil metalico para estructura de cubierta, sistema fotovoltaico

Contratista

Arq [illegible]
Interventoria

Martes 25 de Septiembre de 2018.
personal en obra:
Director de Obra: 1 Director Interventoria
Residente de Obra: 1 Residente Interventoria
Siso Obra: 1 Siso Interventoria
Maestro 1
Oficiales
Ayudantes
pers. A.A
pers. A.C.I 3
Simuladores: 2

1. Amarre acero de refuerzo para tanque de agua en muros laterales y perimetrales
2. personal obra civil hace resanes, ajustes e intenta corregir todos los detalles encontrados en la instalación de las placas que conformaran los bancos de la plazoleta, para posterior revisión.
3. Se corrigen detalles de acabado en domos de drywall area de simuladores.
4. Continuan trabajos de red Aire Acondicionado en cacom 7 con instalación de soportería y tubería en cobre, horario nocturno.
5. Se llevan a cabo trabajos de Red contra incendio con instalacion puntos de anclaje, apertura e instalación varilla y soporte

Norma

para tubería de 4" y 2½"

Contratista

Arq [illegible]
Interventoría

Miércoles. 26 de septiembre de 2018
Personal en obra:
Director de obra - Residente Obra - siso
Residente Interventoría - Director Interventoría - siso
Maestro obra - Personal Red Contra Incendio
Oficiales Obra personal Red Aire Acondicionado
Ayudantes Obra Simuladores.

1. Personal de obra suspenden actividades, argumentado falta de pago. (obra civil) torreje, plazoleta, V/D. Se solicita a contratista aclarar dicha situación
2. Labora personal de Aire Acondicionado en area de Oficina.
3. Labora personal de Red contra Incendio en instalación tubería 4" en corredores e circulación de plazoleta interior, e inst. gabinetes contra incendio
4. Continua detallado de actividad de pintura
5. No se labora en actividades de estructura de cubierta, aun no se presenta diseño estructural para reforzamiento columnas de terraza (posterior instalación sistema fotovoltaico)
6. personal AA labora en horas de la tarde y noche

Contratista

Arq [illegible]
Interventoría

Jueves 27 de Septiembre de 2018

personal en obra

Director de obra	Director de Interventoria
Residente de obra	Residente de Interventoria
Siso de obra	Siso de Interventoria
Maestro	
Oficiales	
Ayudantes	
personal A.A	
personal R.C.I.	
personal Simuladores	

tiempo : Seco, sin vientos, soleados

Actividades

1. Se da inicio a actividades de Cerramiento en teja de zinc plazoleta interna xa trabajos de porcelanato liquido.
2. Se Labora en actividades de instalación tubería 4" de red contraincendio. areas de circulación
3. personal A.A. Labora en instalaciones de Grua. en instalación tubería y accesorios
4. Se lleva a cabo desmonte cerramientos para posterior instalación de fachada ventilada en WPC.
5. No se Labora en actividades torque de agua
6. No se Labora en excavaciones de Red U/Datos. y relose de torque agua.
7. llego formaleta a obra al final de la tarde
8. Se solicita a contratista llevar a cabo la Corrección de los detalles constructivos encontrados en la instalación de las losas para bancas de plazoleta externa, de no poderse llevar a cabo estas deben ser cambiadas y fundidas en sitio por su cuenta y cargo.
9. A La fecha no ha sido llevado a cabo la actividad de construcción de la base sobre la cual se colocaron los equipos

Norma

de Aire Acondicionado en el area de terraza.
so. se solicita a contratista los resultados de las pruebas realizadas al concreto.

Contratista.

Arq [illegible]
Interventoria

Viernes. 28 de September de 2018.
personal en obra.

Director de Obra	Director Interventoria
Residente de Obra	Residente Interventoria
Siso obra.	Siso Interventoria
Maestro	
Oficiales	
Ayudantes.	
personal R.C.I.	
personal Sanitarios.	
personal Aire Acondicionado.	

Tiempo: Seco, sin vientos, soleado.
Actividades:

ANEXOS

INFORMES SEMANALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-155
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRA PÚBLICA	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	Nº. 6 DE 16/08/2018	PERIODO REPORTADO DEL:	30/08/2018	AL:	06/09/2018

CONTRATO Nº	035-A-COFAC-DINSA-2018	CONTRATISTA:	NEOGLOBAL S.A

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS,INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION " MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA.

FECHA DE INICIACIÓN:	26/07/2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2018

VALOR INICIAL	$ 2,764,331,275	VALOR ADICIONAL	$ -	VALOR	2,764,331,275

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 17-07-2018 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No.15-44-101199066 DE SEGUROS DEL ESTADO Y EL ACTA DE INCIO SE FIRMO EL 26 JUL 2018.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
Densidades	Cumplen Especificaciones	CEMENTO	140	COMPACTADOR (	1	ARQ. DIRECTOR	1
		ARENA	1	OMPACTADOR (CA	1	ING. RESIDENTE	1
		ROCA MUERTA	1	MEZCLADORA	1	MAESTRO	1
						OFICIALES	2
						AYUDANTES	8
						TEC. VOZ Y DATOS	3
						TEC. AIRE A.	3
						INST. DRYWALL	3
						TOTAL	22

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
viene Mes agosto	1.31%			
Semana 1	1.12%	2.43%	10.00%	-7.57%
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					10.00%
EJECUTADO																					2.43%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PRELIMINARES	P																					0.77%
	E																					0.40%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	P																					0.76%
	E																					0.26%
CIMENTACION	P																					0.38%
	P																					0.27%
ESTRUCTURAS DE CONCRETO	P																					0.47%
	E																					0.45%
INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO	P																					0.001%
	E																					0.02%
INST. HIDRAULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO AGUA	P																					
	E																					
INSTALACIONES ELECTRICAS	P																					
	E																					
INSTALACIONES DE SISTEMAS	P																					
	E																					
INSTALACIONES MECANICAS	P																					
	E																					
INSTALACIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA	P																					
	E																					
MAMPOSTERIA MUROS	P																					0.42%
	E																					0.37%
PAÑETES FILOS Y DILATACIONES	P																					0.08%
	E																					0.06%
CUBIERTAS	P																					0.00%
	E																					0.16%
CIELORASOS	P																					0.00%
	E																					0.03%
BASES PISOS ACABADOS	P																					1.14%

[illegible]	E																					0.16%
ENCHAPES	P																					
	E																					
CARAPINTERIA METALICA	P																					
	E																					
CARPINTERIA DE MADERA	P																					
	E																					
PINTURA	P																					
	E																					
CERRAJERIA	P																					
	E																					
ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	P																					
	E																					
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	P																					
	E																					
OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO	P																					0.00%
	E																					0.25%
EQUIPOS HIDRAULICOS	P																					
	E																					
EQUIPOS ELECTRCOS	P																					
	E																					
ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL																						
	P																					
	E																					

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	128	42	86
Proyección	138	42	96

6- REGISTRO FOTOGRAFICO






7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
42	-10	10/12/2018	32.81%

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO								
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?							
Se concluyo actividad de compactacion de relleno en roca muerta en area de tanque de agua		SI		NO					
Se llevo a cabo actividad de concreto de limpieza en tanque de agua		SI		NO					
comenzo actividad de pañete en jardineras en plazoleta externa		SI		NO					
Soldadura y pintura en anticorrosivo perfiles metalicos de estructura de soporte para sistema fotovoltaico		SI		NO					
Encintada, masillada y primera mano de pintura en 2 domos de area de simuladores		SI		NO					
Desmonte cieloraso area de simuladores para instalacion soportes y tuberia aire acondicionado		SI		NO					
	Desmonte celosia aluminio fachada	SI		NO	X				
	cerramiento provisional teja de zinc, para el area de insttlacion piso porcelanato liquido h= 2,4 mt	SI		NO	X				
	Muro en bloque de arcilla No. 5 (Muro base para conformacion y continuidad del cerramiento en el area operativa	SI		NO	X				
	Piso piedra Cid de Alfa o similar color negro y beis (similar al existente) para reparacion de enchae en tapas/cajas internas de pasillos. Incluye agarraderas	SI		NO	X				
	Piso porcelanato liquido con imagen HD, institucional para plazoleta central	SI		NO	X				
	Regata pisos en area localizadas en planos. Incluye posterior recuperacion de	SI		NO	X				
	localizacion y replanteo de instalaciones hidraulicas	SI	X	NO					
	excavacion manual para redes profundidad (o mts y 2.0 mt)	SI	X	NO					
	Acometida tuberia tipo PVC presion RDE 21 Ø 2"	SI	X	NO					

JUSTIFICACIÓN : SE PRESENTAN ATRASOS EN ALGUNAS ACTIVIDADES SEGÚN ULTIMA PROGRAMACION ENTREGADA A LA FECHA, ACTUALMENTE SE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES EN 5 FRENTES DE TRABAJO: TANQUE, PLAZOLETA EXTERNA, SIMULADORES, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO, LOS DEMAS SERAN ABIERTOS TAN PRONTO SEAN RESUELTAS ALGUNAS DUDAS POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DE ASESORES.

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

APERTURA DE DOS NUEVOS FRENTES DE TRABAJO, AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 67,173,250	2.43%	$ 2,697,158,025.02	97.57%
Obras Adicionales	$ -	$ -	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 67,173,250	2.43%	$ 2,697,158,025.02	97.57%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 2,764,331,275.00	
VALOR ADICIONAL	$ -	
VALOR FINAL	$ 2,764,331,275.00	
ANTICIPO	$ 1,105,732,510.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC VI BIMESTRE DE 2018	$ 552,866,254.90	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 1ER BIMESTRE DE 2019	$ 1,105,732,510.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA		

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	NO		ESTA EN REVISION
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	APROBADO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	NO	NO	PENDIENTE CORREGIR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PLAN DE CALIDAD	SI	NO	NO	SE DEVOLVIO PARA CORRECCION
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	NO	NO	NO	REVISION EN PROCESO, PENDIENTE PARTE DE ASESORES FRENTES FOTOVOLTAICO, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICO Y VOZ DATOS
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	SI	SI	APROBADO DIRECTOR INTERVENTORIA
PRESENTACION DE APORTES PARAFISCALES	SI	SI	SI	APROBADO

14- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITO AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATO COMO ES LA PERMANENCIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA, ASI COMO DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE LOS NUEVOS FRENTES DE TRABAJO

15- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI: SECO, SOLEADO, SIN VIENTOS

Elaboró:	Revisó:
Ingeniero o Arquitecto **Residente de Interventoria o Supervisor Técnico** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Director de Interventoria (Cuando contrato Interv)** Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-155
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRA PÚBLICA	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: N°. 7 DE 16/08/2018 — PERIODO REPORTADO DEL: 06/09/2018 AL: 13/09/2018

CONTRATO Nº: 035-A-COFAC-DINSA-2018 — CONTRATISTA: NEOGLOBAL S.A

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS,INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION " MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA.

FECHA DE INICIACIÓN: 26/07/2018 — FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2018

VALOR INICIAL: $ 2,764,331,275 — VALOR ADICIONAL: $ - — VALOR TOTAL: 2,764,331,275

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 17-07-2018 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No.15-44-101199066 DE SEGUROS DEL ESTADO Y EL ACTA DE INCIO SE FIRMO EL 26 JUL 2018.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
DENSIDADES	S / ESPECIFICACIONES	CEMENTO	115			ARQ. DIRECTOR	1
		ARENA	2			ING. RESIDENTE	1
		LAMINAS DRYWALL	50			TEC. SISO	1
						MAESTRO	1
						OFICIALES	2
						AYUDANTES	6
						TEC. VOZ Y DATOS	
						TEC. AIRE A.	3
						TEC. R C. I	3
						INST. DRYWALL	2
						TOTAL	20

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
Semana 1	2.43%	3.04%	13.00%	-9.96%
Semana 2	0.61%			
Semana 3				
Semana 4				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					13.00%
EJECUTADO																					3.04%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PRELIMINARES	P																					0.79%
	E																					0.40%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	P																					0.76%
	E																					0.26%
CIMENTACION	P																					0.38%
	E																					0.29%
ESTRUCTURAS DE CONCRETO	P																					0.81%
	E																					0.65%
INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO	P																					0.01%
	E																					0.10%
INST. HIDRAULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO AGUA	P																					0.03%
	E																					0.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	P																					0.43%
	E																					0.06%
SISTEMA FOTOVOLTAICO	P																					
	E																					
INSTALACIONES DE SISTEMAS	P																					
	E																					
INSTALACIONES MECANICAS	P																					
	E																					
INSTALACIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA	P																					
	E																					
MAMPOSTERIA MUROS	P																					0.64%
	E																					0.54%
PAÑETES FILOS Y DILATACIONES	P																					0.24%
	E																					0.11%
CUBIERTAS	P																					0.00%

7 1

	E																				0.18%
CIELORASOS	P																				0.00%
	E																				0.03%
BASES PISOS ACABADOS	P																				1.14%
	E																				0.16%
ENCHAPES	P																				
	E																				
CARPINTERIA METALICA	P																				
	E																				
CARPINTERIA DE MADERA	P																				
	E																				
PINTURA	P																				0.04%
	E																				0.00%
CERRAJERIA	P																				
	E																				
ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	P																				
	E																				
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	P																				
	E																				
OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO	P																				0.00%
	E																				0.26%
EQUIPOS HIDRAULICOS	P																				
	E																				
EQUIPOS MECANICOS	P																				
	E																				
EQUIPOS ELECTRICOS	P																				
	E																				
ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL																					
	P																				
	E																				

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	128	49	79
Proyección	141	49	92

6- REGISTRO FOTOGRAFICO






7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Dias (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
49	-13	13/12/2018	38.28%

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO											
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?										
Se da comienzo a instalacion estructura de acero para tanque de agua			SI		NO							
En area de simuladores, continua instalacion laminas de drywall parte posterior y en la parte frontal encintada, masillada, lijada y pintura base.			SI		NO							
Mamposteria en bloque para jardineras de plazoleta externa			SI		NO							
Pañete de jardineras en plazoleta externa			SI		NO							
Pintura anticorrosivo y esmalte de perfiles metalicos de estructura en sistema fotovoltaico			SI		NO							
Instalacion soportes y tuberia aire acondicionado en simuladores y Gruco			SI		NO							
	Desmonte celosia aluminio fachada		SI		NO	X						
	cerramiento provisional teja de zinc, para el area de insttlacion piso porcelanato liquido h= 2,4 mt		SI		NO	X						
	Muro en bloque de arcilla No. 5 (Muro base para conformacion y continuidad del cerramiento en el area operativa		SI		NO	X						
	Piso piedra Cid de Alfa o similar color negro y beis (similar al existente) para reparacion de enchae en tapas/cajas internas de pasillos. Incluye agarraderas		SI		NO	X						

	Piso porcelanato liquido con imagen HD, institucional para plazoleta central	SI		NO	X		
	Regata pisos en area localizadas en planos. Incluye posterior recuperacion de	SI		NO	X		
	localizacion y replanteo de instalaciones hidraulicas	SI	X	NO			
	excavacion manual para redes profundidad (o mts y 2.0 mt)	SI	X	NO			
	Acometida tuberia tipo PVC presion RDE 21 Ø 2"	SI	X	NO			

VER CUADRO ANEXO

JUSTIFICACIÓN : ALGUNAS ACTIVIDADES PRESENTAN ATRASO SEGÚN PROGRAMACION APROBADA, DEBIDO A POCO PERSONAL EN LA EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

EN ESTA SEMNA SE DIO INICIO A ACTIVIDADES DE INSTALACION RED CONTRAINCENDIO

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 84,035,671	3.04%	$ 2,680,295,604.24	96.96%
Obras Adicionales	$ -	$ -	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 84,035,671	3.04%	$ 2,680,295,604.24	96.96%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 2,764,331,275.00	
VALOR ADICIONAL	$ -	
VALOR FINAL	$ 2,764,331,275.00	
ANTICIPO	$ 1,105,732,510.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC VI BIMESTRE DE 2018	$ 552,866,254.90	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 1ER BIMESTRE DE 2019	$ 1,105,732,510.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA		

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	NO	NO	PENDIENTE ENTREGR INFORMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	APROBADO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	NO	NO	PENDIENTE CORREGIR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PLAN DE CALIDAD	SI	NO	NO	PENDIENTE POR ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	NO	NO	REVISION EN PROCESO, PENDIENTE PARTE DE ASESORES FRENTES FOTOVOLTAICO, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICO Y VOZ DATOS
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	NO	NO	PENDIENTE POR ENTREGAR INFORMACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRESENTACION DE APORTES PARAFISCALES	SI	SI	SI	APROBADO

14- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITO A CONTRATISTA UN PLAN DE CONTIINGENCIA, ASI COMO EL INCREMENTO DE PERSONAL EN ACTIVIDADES COMO EL TANQUE DE AGUA.

15- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI: SECO, SOLEADO, SIN VIENTOS

Elaboró:	Revisó:
Ingeniero o Arquitecto **Residente de Interventoria o Supervisor Técnico** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Director de Interventoria (Cuando contrate Interv)** Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-155
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRA PÚBLICA	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: Nº. 8 DE 16/08/2018 — PERIODO REPORTADO DEL: 13/09/2018 AL: 20/09/2018

CONTRATO Nº: 035-A-COFAC-DINSA-2018 — CONTRATISTA: NEOGLOBAL S.A

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS,INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION " MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA.

FECHA DE INICIACIÓN: 26/07/2018 — FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2018

VALOR INICIAL: $ 2,764,331,275 — VALOR ADICIONAL: $ - — VALOR TOTAL: 2,764,331,275

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 17-07-2018 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No.15-44-101199066 DE SEGUROS DEL ESTADO Y EL ACTA DE INCIO SE FIRMO EL 26 JUL 2018.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		CEMENTO	88			ARQ. DIRECTOR	1
		ARENA	1			ING. RESIDENTE	1
		LAMINAS DRYWALL	7			TEC. SISO	1
						MAESTRO	1
						OFICIALES	2
						AYUDANTES	7
						TEC. VOZ Y DATOS	
						TEC. AIRE A.	3
						TEC. R C. I	2
						INST. DRYWALL	2
						TOTAL	20

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
Semana 1	2.43%	3.67%	19.00%	-15.33%
Semana 2	0.61%			
Semana 3	0.63%			
Semana 4				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					19.00%
EJECUTADO																					3.67%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PRELIMINARES	P																					0.79%
	E																					0.40%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	P																					0.76%
	E																					0.26%
CIMENTACION	P																					0.38%
	E																					0.29%
ESTRUCTURAS DE CONCRETO	P																					1.16%
	E																					0.90%
INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO	P																					0.01%
	E																					0.10%
INST. HIDRAULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO AGUA	P																					0.42%
	E																					0.001%
INSTALACIONES ELECTRICAS	P																					0.43%
	E																					0.00%
SISTEMA FOTOVOLTAICO	P																					1.01%
	E																					0.00%
INSTALACIONES DE SISTEMAS	P																					0.05%
	E																					0.00%
INSTALACIONES MECANICAS	P																					0.08%
	E																					0.38%
INSTALACIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA	P																					
	E																					
MAMPOSTERIA MUROS	P																					0.73%
	E																					0.54%
PAÑETES FILOS Y DILATACIONES	P																					0.33%
	E																					0.11%
CUBIERTAS	P																					0.08%

CUBIERTAS	E																					0.18%
CIELORASOS	P																					0.00%
	E																					0.05%
BASES PISOS ACABADOS	P																					1.14%
	E																					0.16%
ENCHAPES	P																					0.53%
	E																					0.00%
CARPINTERIA METALICA	P																					
	E																					
CARPINTERIA DE MADERA	P																					
	E																					
PINTURA	P																					0.29%
	E																					0.03%
CERRAJERIA	P																					
	E																					
ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	P																					
	E																					
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	P																					
	E																					
OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO	P																					0.00%
	E																					0.26%
EQUIPOS HIDRAULICOS	P																					
	E																					
EQUIPOS MECANICOS	P																					
	E																					
EQUIPOS ELECTRICOS	P																					
	E																					
ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL																						
	P																					
	E																					

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	128	56	72
Proyección	148	56	92

6- REGISTRO FOTOGRAFICO






7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Dias (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
56	-20	20/12/2018	43.75%

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO							
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?						
		SI		NO		
Coninua instalacion estructura de acero para tanque de agua		SI		NO		
En area de simuladores, continua instalacion laminas de drywall parte posterior y en la parte frontal , masillada, lijada y pintura base.		SI		NO		
Pañete y mamposteria faltante para jardineras de plazoleta externa		SI		NO		
Instalacion soportes y tuberia Aire Acondicionado en Simuladores, CACOM 7 y GRUCO		SI		NO		
Se da inicio a la instalacion y fijacion de puntos de Anclaje, fijacion varilla y soporte para tuberia de 4" y 2 1/2"		SI		NO		
	Desmonte celosia aluminio fachada	SI	X	NO		Se autorizo en comité el inicio de la actividad
	cerramiento provisional teja de zinc, para el area de insttlacion piso porcelanato liquido h= 2,4 mt	SI	X	NO		Se autorizo en comité el inicio de la actividad
	Muro en bloque de arcilla No. 5 (Muro base para conformacion y continuidad del cerramiento en el area operativa	SI		NO	X	Pendiente por definir
	Piso piedra Cid de Alfa o similar color negro y beis (similar al existente) para reparacion de enchae en tapas/cajas internas de pasillos. Incluye agarraderas	SI	X	NO		Pendiente dar inicio a actividades de voz y datos para tapar cajas

	Piso porcelanato liquido con imagen HD, institucional para plazoleta central	SI	X	NO		Contratista argumenta se esta trabajando en taller de proveedor
	Regata pisos en area localizadas en planos. Incluye posterior recuperacion de	SI		NO	X	Pendiente por definir
	Tanque - Acometida tuberia tipo PVC presion RDE 21 Ø 2"	SI	X	NO		Actividad parada, falta de personal
	Estructura perfil PHR metalico tipo Acesco o similar para reforzamiento de estructura de cubierta en terraza por instalacion de paneles solares	SI	X	NO		Actividad suspendida por parte del contratista
	Piso Deck para exterior plazoleta	SI	X	NO		Contratista aun no da inicio a esta actividad, pendiente modelo o diseño columnas
	Cerramiento fachada ventilada en WPC, en paneles dilatados, incluye estructura de soporte, anclajes y demas elementos necesarios	SI	X	NO		Autorizada ultimo comité de obra, pendiente diseño por parte del proveedofr
	Suministro, instalacion y puesta en servicio derivacion unidad exterior hasta 88716 BTU/H (26 KW), Incluye el suministro de equipos, herramientas, bancos, mano de obra, transporte e insumos requeridos) en la fase III, del edificio administrativo de la EMAVI	SI	X	NO		Contratista aun no da inicio a esta actividad, Pendiente llegada de equipos

VER CUADRO ANEXO

JUSTIFICACIÓN : LA GRAN MAYORIA DE ACTIVIDADES QUE PRESENTAN ATRASO ES DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

EN ESTA SEMANA SE DIO INICIO A ACTIVIDADES DE INSTALACION RED CONTRAINCENDIO

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 101,450,958	3.67%	$ 2,662,880,317.21	96.33%
Obras Adicionales	$ -	$ -	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 101,450,958	3.67%	$ 2,662,880,317.21	96.33%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 2,764,331,275.00	
VALOR ADICIONAL	$ -	
VALOR FINAL	$ 2,764,331,275.00	
ANTICIPO	$ 1,105,732,510.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC VI BIMESTRE DE 2018	$ 552,866,254.90	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 1ER BIMESTRE DE 2019	$ 1,105,732,510.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA		

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	NO	NO	PENDIENTE POR ENTREGAR INFORMACION POR PARTE
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	APROBADO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	NO	NO	EN REVISION NUEVAMENTE
PLAN DE CALIDAD	SI	SI	SI	APROBADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	NO	NO	REVISION EN PROCESO, PENDIENTE PARTE DE ASESORES FRENTES FOTOVOLTAICO, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICO Y VOZ DATOS
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	NO	NO	PENDIENTE POR ENTREGAR INFORMACION DE SOPORTES POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRESENTACION DE APORTES PARAFISCALES	SI	SI	SI	APROBADO

14- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE EL PLAN DE CONTIINGENCIA, ASI COMO EL INCREMENTO DE PERSONAL PARA TODAS LAS ACTIVIDADES EN EJECUCION

15- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI: SECO, SOLEADO, SIN VIENTOS

Elaboró:	Revisó:
Ingeniero o Arquitecto **Residente de Interventoria o Supervisor Tècnico** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Director de interventoria (Cuando contrate Interv)** Firma y posfirma

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-155
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN - OBRA PÚBLICA	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: N°. 9 DE 16/08/2018 — PERIODO REPORTADO DEL: 20/09/2018 AL: 27/09/2018

CONTRATO Nº: 035-A-COFAC-DINSA-2018 — CONTRATISTA: NEOGLOBAL S.A

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS,INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION " MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA.

FECHA DE INICIACIÓN: 26/07/2018 — FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2018

VALOR INICIAL: $ 2,764,331,275 — VALOR ADICIONAL: $ - — VALOR TOTAL: 2,764,331,275

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 17-07-2018 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No.15-44-101199066 DE SEGUROS DEL ESTADO Y EL ACTA DE INCIO SE FIRMO EL 26 JUL 2018.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		CEMENTO	137			ARQ. DIRECTOR	1
		ARENA	1			ING. RESIDENTE	1
		LAMINAS DRYWALL	2			TEC. SISO	1
						MAESTRO	1
						OFICIALES	2
						AYUDANTES	4
						TEC. VOZ Y DATOS	
						TEC. AIRE A.	3
						TEC. R C. I	3
						INST. DRYWALL	2
						TOTAL	18

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
Semana 1	2.43%	6.94%	30.00%	-23.06%
Semana 2	0.61%			
Semana 3	0.63%			
Semana 4	3.27%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					30.00%
EJECUTADO																					6.94%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PRELIMINARES	P																					0.79%
	E																					0.40%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	P																					0.76%
	E																					0.26%
CIMENTACION	P																					0.38%
	E																					0.29%
ESTRUCTURAS DE CONCRETO	P																					1.16%
	E																					0.90%
INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO	P																					0.01%
	E																					0.10%
INST. HIDRAULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO AGUA	P																					0.42%
	E																					0.001%
INSTALACIONES ELECTRICAS	P																					0.43%
	E																					0.00%
SISTEMA FOTOVOLTAICO	P																					1.01%
	E																					0.00%
INSTALACIONES DE SISTEMAS	P																					0.05%
	E																					0.00%
INSTALACIONES MECANICAS	P																					0.08%
	E																					0.38%
INSTALACIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA	P																					0.00%
	E																					0.00%
MAMPOSTERIA MUROS	P																					0.73%
	E																					0.54%
PAÑETES FILOS Y DILATACIONES	P																					0.33%
	E																					0.11%
CUBIERTAS	P																					0.08%
	E																					0.18%
CIELORASOS	P																					0.00%
	E																					0.05%

BASES PISOS ACABADOS	P																					1.14%
	E																					0.16%
ENCHAPES	P																					0.53%
	E																					0.00%
CARPINTERIA METALICA	P																					
	E																					
CARPINTERIA DE MADERA	P																					
	E																					
PINTURA	P																					0.29%
	E																					0.03%
CERRAJERIA	P																					
	E																					
ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	P																					
	E																					
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	P																					
	E																					
OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO	P																					0.00%
	E																					0.26%
EQUIPOS HIDRAULICOS	P																					
	E																					
EQUIPOS MECANICOS	P																					
	E																					
EQUIPOS ELECTRICOS	P																					
	E																					
ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL																						
	P																					
	E																					

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	128	63	65
Proyección	158	63	95

6- REGISTRO FOTOGRAFICO






7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Dias (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
63	-30	30/12/2018	49.22%

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO							
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?						
Continua amarre de estructura de acero para muros perimetrales y divisorios en tanque de agua		SI		NO				
En area de simuladores, se llevan a cabo actividades de masilla, lija y pintura base, se hacen observaciones que estan en proceso de correccion.		SI		NO				
Continua pañete en jardineras de plazoleta externa, y construccion bases para bancas, se instala la primera losa de conformacin bancas y se solicita a contratista la colocacion de una base intermedia, para evitar la deformacion de dicha placa hacia el centro de la misma		SI		NO				
Se define tamaño para construccion de la base para instalacion de los equipos de A.A. en la terraza		SI		NO				
Instalacion soportes y tuberia aire acondicionado en Simuladores, CACOM 7, GRUCO y GRUIA		SI		NO				
Se dio inicio a desmonte de cerramiento provisional para posterior instalacion de fachada ventilada en WPC		SI		NO				
Se llevo a cabo cerramiento provisional teja de zinc, para el area de instalacion piso porcelanato liquido h= 2,4 mt		SI		NO				
	Muro en bloque de arcilla No. 5 (Muro base para conformacion y continuidad del cerramiento en el area operativa	SI		NO	X	Pendiente por definir		
	Piso piedra Cid de Alfa o similar color negro y beis (similar al existente) para reparacion de enchae en tapas/cajas internas de pasillos. Incluye agarraderas	SI	X	NO		Pendiente dar inicio a actividades de voz y datos para tapar cajas		

	Piso porcelanato liquido con imagen HD, institucional para plazoleta central	SI	X	NO		Contratista argumenta se esta trabajando en taller de proveedor
	Regata pisos en area localizadas en planos. Incluye posterior recuperacion de piso	SI		NO	X	Pendiente por definir
	Acometida tuberia tipo PVC presion RDE 21 Ø 2"	SI	X	NO		Actividad parada, falta de personal
	Estructura perfil PHR metalico tipo Acesco o similar para reforzamiento de estructura de cubierta en terraza por instalacion de	SI	X	NO		Actividad suspendida por parte del contratista,
	Piso Deck para exterior plazoleta	SI	X	NO		Contratista aun no da inicio a esta actividad, pendiente modelo o diseño columnas
	Cerramiento fachada ventilada en WPC, en paneles dilatados, incluye estructura de soporte, anclajes y demas elementos necesarios	SI		NO	X	Autorizada ultimo comité de obra, pendiente diseño por parte del proveedofr
	Suministro, instalacion y puesta en servicio derivacion unidad exterior hasta 88716 BTU/H (26 KW), Incluye el suministro de equipos, herramientas, bancos, mano de obra, transporte e insumos requeridos) en la fase III, del edificio administrativo de la EMAVI	SI	X	NO		Contratista aun no da inicio a esta actividad

VER CUADRO ANEXO

JUSTIFICACIÓN : SE PRESENTAN ATRASOS EN OBRA DEBIDO A QUE EL PERSONAL DE OBRA CIVIL SUSPENDE ACTIVIDADES EN PLAZOLETA EXTERNA, TANQUE, EXCAVACIONES PARA RED DE VOZ Y DATOS, EXCAVACIONES PARA DESAGUE REBOSE TANQUE, SE LABORA EN RED CONTRAINCENDIO, AIRE ACONDICIONADO, Y SIMULADORES.

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

Aire Acondicionado., se instala soporteria, tuberia y accesorios, Red Contraincendio colocacion y fijacion de varilla y soporte para tuberia de 4" y 2 1/2"

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 191,844,590	6.94%	$ 2,572,486,684.52	93.06%
Obras Adicionales	$ -	$ -	0.0	0%	0.0	0%
TOTAL	$ 2,764,331,275	$ 2,764,331,275.00	$ 191,844,590	6.94%	$ 2,572,486,684.52	93.06%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 2,764,331,275.00	
VALOR ADICIONAL	$ -	
VALOR FINAL	$ 2,764,331,275.00	
ANTICIPO	$ 1,105,732,510.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC VI BIMESTRE DE 2018	$ 552,866,254.90	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 1ER BIMESTRE DE 2019	$ 1,105,732,510.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA		

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	NO	NO	SE ENVIO POR CORREO HOJA DE VIDA FALTANTE DEL ASESOR HIDROSANITARIO, PENDIENTE VERIFICACION PARA APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	APROBADO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	NO	NO	FALTA FIRMA DEL INGENIERO AMBIENTAL EN LA DOCUMDNTACION ENTREGADA
PLAN DE CALIDAD	SI	SI	SI	APROBADO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	NO	NO	REVISION EN PROCESO, PENDIENTE PARTE DE ASESORES FRENTES FOTOVOLTAICO, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICO Y VOZ DATOS
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	NO	NO	PENDIENTE POR ENTREGAR INFORMACION Y SOPORTES POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRESENTACION DE APORTES PARAFISCALES	SI	SI	SI	APROBADO

14- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTRATISTA ENTREGO PLAN DE CONTINGENCIA, PERO NO FUE APROBADO POR NO PRESENTAR LISTADO DE CANTIDAD DE PERSONAL A UTILIZAR NI DISTRIBUCION DE TIEMPO O JORNADAS DE TRABAJO ENTRE LOS EQUIPOS DE TRABAJADORES CONFORMADOS.

15- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI: SECO, SOLEADO, SIN VIENTOS

Elaboró:	Revisó:
Ingeniero o Arquitecto **Residente de Interventoria o Supervisor Técnico** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Director de Interventoria (Cuando contrate interv)** Firma y posfirma

ANEXOS

PLANILLA DE SEGURIDAD

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93132059		LEAL QUIÑONEZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 9 N 13-28	ESPINAL-TOLIMA	2461230	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-07	81310948	8481325486	I	2018/07/16	2018/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	16	$280,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,600	$0	$126,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$125,000	$1,600	$0	$126,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$54,400	$700	$0	$55,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$54,400	$700	$0	$55,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$1,200	$0	$98,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$97,700	$1,200	$0	$98,900
TOTAL				1	$277,100	$3,500	$0	$280,600

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93132059		LEAL QUIÑONEZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 9 N 13-28	ESPINAL-TOLIMA	2481230	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-07	81310948	8481329486	I	2018/07/16	2018/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	16	$280,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$781,242	$54,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$781,242**	**$125,000**			**$781,242**	**$97,700**			**$0**	**$0**			**$781,242**	**$54,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					**$781,242**	**$125,000**			**$781,242**	**$97,700**			**$0**	**$0**			**$781,242**	**$54,400**		**$0**	**$0**
1	CC	93132059 LEAL GUSTAVO	230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0	14-23	30	$781,242	$54,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			**$781,242**	**$125,000**			**$781,242**	**$97,700**			**$0**	**$0**			**$781,242**	**$54,400**		**$0**	**$0**

PAGADO

2018/08/01 09:59 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79709889		MURILLO PALMA HELMUNT AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 Nro. 8-34 barrio centro	ESPINAL-TOLIMA	2485474	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-07	81476356	8482366069	I	2018/07/24	2018/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	8	$228,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$800	$0	$125,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$125,000	$800	$0	$125,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,100	$100	$0	$4,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,100	$100	$0	$4,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,700	$600	$0	$98,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$97,700	$600	$0	$98,300
TOTAL				1	$226,800	$1,500	$0	$228,300

PAGADO

Aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79709889		MURILLO PALMA HELMUNT AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 Nro. 8-34 barrio centro	ESPINAL-TOLIMA	2485474	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-07	81476356	8482366069	I	2018/07/24	2018/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	8	$228,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79709889	MURILLO HELMUNT	X																	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0	14-23	30	$781,242	$4,100	0	$0	$0	No	$226,800
Total	Afiliados(1)																						$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$0	$0			$781,242	$4,100		$0	$0		$226,800

PAGADO

2018/08/02 05:55 PM

ARL | sura

Medellín, 03 de Septiembre de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de INTEGRATED SERVICE A.M. S.A.S que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000005 - 000000005, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C94496077	PABLO PALACIOS SALAZAR	04/09/2018		9188o225	03/09/2018 07:45:22
C16654879	HERNAN PERDOMO RAMIREZ *	04/09/2018		17523822	03/09/2018 07:46:57
C1002923765	OLMER ENRIQUE VIDAL CAICEDO	04/09/2018		25214824	03/09/2018 07:48:43
C14892819	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTAÑO	04/09/2018		g6192148	03/09/2018 07:49:32

William Marques Monteresa.
Cesar Fenn perea.
Arnulo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C144670441824628214

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Dirección IP: 186.81.58.143, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 04 de Septiembre de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de EFECTIVOS COMPANY SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0005201001 - RIESGO 5, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C94382787	ALEXANDER RIVERA PEREA	05/09/2018		5231P136	04/09/2018 19:40:32
C5827024	JAVIER ALFONSO TOQUICA ORTIZ	05/09/2018		12J194Go	04/09/2018 19:42:53
C8058123	WILLIAM ENRIQUE MARQUEZ MONTERROSA	05/09/2018		h196a221	04/09/2018 19:43:57

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C670029771824771048

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Dirección IP: 186.81.58.143, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 17 de Septiembre de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de EFECTIVOS COMPANY SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0005201001 - RIESGO 5, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin vigencia	Código de transacción	Fecha de proceso
C16792363	LUIS FERNANDO PALACIOS	18/09/2018		166Wx210	17/09/2018 11:35:35

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C670029771826041763

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Dirección IP: 186.81.58.143, 172.16.42.236

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. 7682..

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
NI	900747318	EFECTIVOS COMPANY S.A.S	BERNARDOCL3	2018-09	2018-08	PRIVADO	A	14-28	ARL SURA	E	SI	N/A

Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Fecha Pago	No. Radicación
CALI VALLE	CALI	458	VALLE DEL CAUCA	76	2232222	2232222	CALI3EFECTIVOS@GMAIL.COM	7020	2018-09-05	366442056

DETALLE DE LOS APORTES:

Datos del Afiliado								Novedades	Días Cot.	Valor IBC				Liquidación de Aportes								
Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación Familiar	ING RET TDE TDP TAP VSP VST VSE SLN IGE LMA AVC VCT AFP AEP ACF		IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	94424996	SALINAS LASPRILLA ALFREDO ANDRES		EPS-S EMSSANAR	ARL SURA	5	CAMPESINA COMCAJA	X	0 30 30	0	781,242	781,242	1	0	31,300	54,400	100	Exonerado	Exonerado	0	0	85800

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	subtotal SIN intereses DE MORA
				0.00	31,300.00	54,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00

PAGADO
FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
FEDECAJAS

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. 768220

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social			Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
NI	900747318	EFECTIVOS COMPANY S.A.S			BERNARDOCL3	2018-09	2018-08	PRIVADO	A	14-28	ARL SURA	E	SI	N/A
Dirección		Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico			Actividad Económica	Fecha Pago		No. Radicación
CALI VALLE		CALI	458	VALLE DEL CAUCA	76	2232222	2232222	CALI3EFECTIVOS@GMAIL.COM			7020	2018-09-05		366442056

DETALLE DE LOS APORTES:

Datos del Afiliado								Novedades														Días Cot.	Valor IBC			Liquidación de Aportes								
Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación Familiar	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	AFP	EPS	ARP	ACF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	5664686	REYES FABIAN WILLIAM		FAMISANAR CAFAM-COLSUBSIDIO	ARL SURA	5	CAMPESINA COMCAJA	X													0	30	30	30	0	781,242	781,242	1	0	31,300	54,400	100	Exonerado	Exonerado	0	0	85800

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	subtotal SIN intereses DE MORA
				0.00	31,300.00	54,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00

FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR FEDECAJAS

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. 768220

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
NI	900747318	EFECTIVOS COMPANY S.A.S	BERNARDOCL3	2018-09	2018-08	PRIVADO	A	14-28	ARL SURA	E	SI	N/A

Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Fecha Pago	No. Radicación
CALI VALLE	CALI	458	VALLE DEL CAUCA	76	2232222	2232222	CALI3EFECTIVOS@GMAIL.COM	7020	2018-09-05	366442056

DETALLE DE LOS APORTES:

Datos del Afiliado								Novedades														Días Cot.	Valor IBC				Liquidación de Aportes								
Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación Familiar	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	AFP	APS	ARP	ACF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	1144183651	ORTIZ AGUDELO IVAN DARIO		SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	5	CAMPESINA COMCAJA	X													0	30	30	30	0	781,242	781,242	1	0	31,300	54,400	100	Exonerado	Exonerado	0	0	85800

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	subtotal SIN intereses DE MORA
				0.00	31,300.00	54,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00

PLANILLA NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR FEDECAJAS

RECAUDO INTEGRADO D SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. 7682

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
NI	900747318	EFECTIVOS COMPANY S.A.S	BERNARDOCL3	2018-09	2018-08	PRIVADO	A	14-28	ARL SURA	E	SI	N/A

Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Fecha Pago	No. Radicación
CALI VALLE	CALI	458	VALLE DEL CAUCA	76	2232222	2232222	CALI3EFECTIVOS@GMAIL.COM	7020	2018-09-05	366442056

DETALLE DE LOS APORTES:

Datos del Afiliado

Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación Familiar	Novedades														Días Cot.	Valor IBC				Liquidación de Aportes								
								ING	RET	TDE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AFP	APS	ACF		IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	1113521522	MALAVA MICOLTA ALBEIRO		EPS-S EMSSANAR	ARL SURA	5	CAMPESINA COMCAJA	X													0	30	30		0	781,242	781,242		0	31,300	54,400	100	Exonerado	Exonerado	0	0	85800

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	subtotal SIN intereses DE MORA
				0.00	31,300.00	54,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR FEDECAJAS

Ved Sep 05 19:21:56 COT 2018

ANEXOS

ACTAS DE VECINDAD

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-106
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

CONTRATO N°	OBRA CIVIL 035-00-A-COFAC-DINSA-2018 E INTERVENTORIA CONTRATO N°052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16 DE JULIO DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADM. FASE III DE LA ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO	$2.764.331.274.32
CONTRATISTA	NEOGLOBAL S.A.S
INTERVENTOR	HBC HERNAN BARRIOS CASTILLO
SUPERVISOR	CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	CALI VALLE DEL CAUCA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE DEL 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	128 DIAS

El día 22.del mes de agosto del 2018 a las 08:30 am se reunieron: CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de supervisor, respectivamente; SISO Lady Johana Mejia , en calidad de contratista y Arquitecta Rosa Maria Moreno y la SISO Johana Saavedra Ortiz., en calidad de interventor, con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR

Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

ANEXOS

VIP 1 ER. PISO : Estado actual de la construccion

Puerta no funciona cerradura (puerta al interior de la plazoleta), antepachos fisurados , columna contra puerta posterior con fisura , reponer tapa electrica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CONTRATISTA Firma	INTERVENTOR Firma
SUPERVISOR Firma	

AREA VIP






AREA
VIP




















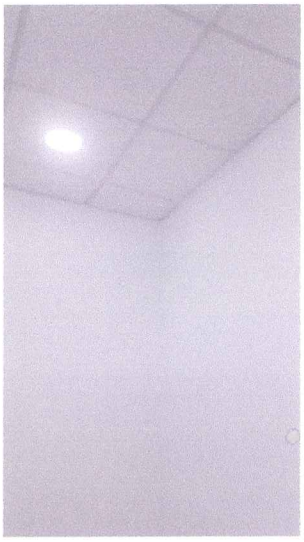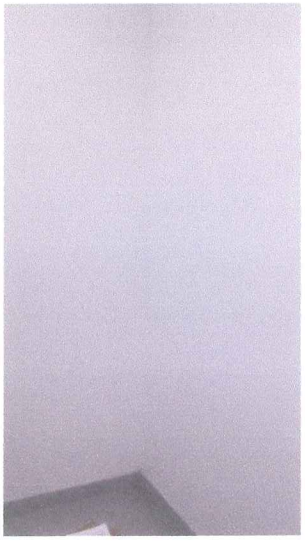


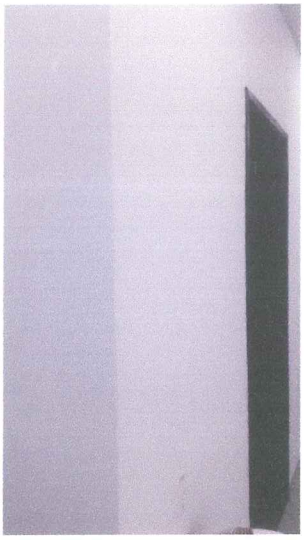



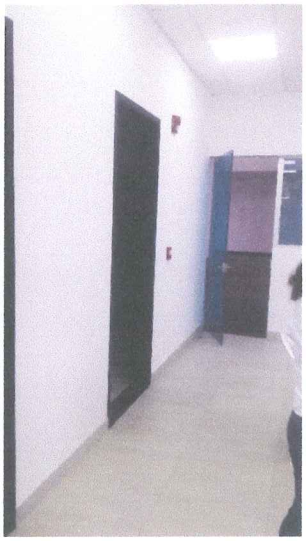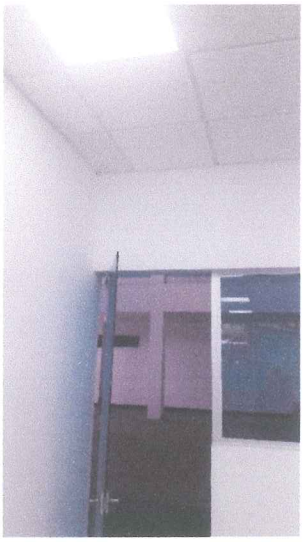



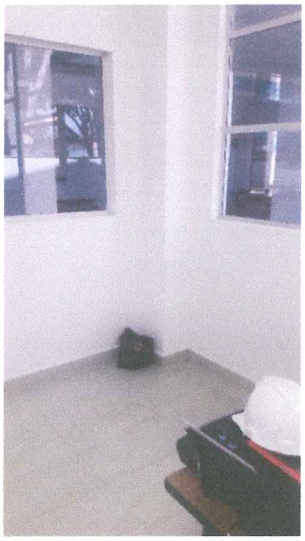











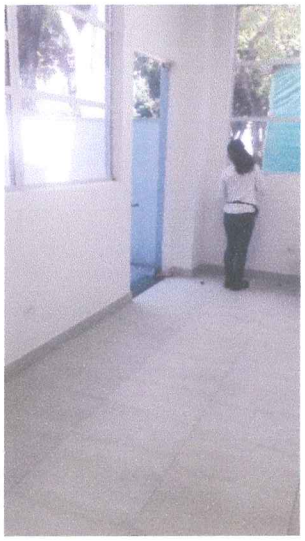

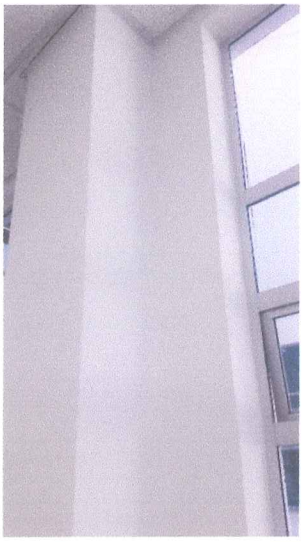




















GRUCO



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-106
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

CONTRATO N°	OBRA CIVIL 035-00-A-COFAC-DINSA-2018 E INTERVENTORIA CONTRATO N°052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16 DE JULIO DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADM. FASE III DE LA ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO	$2.764.331.274.32
CONTRATISTA	NEOGLOBAL S.A.S
INTERVENTOR	HBC HERNAN BARRIOS CASTILLO
SUPERVISOR	CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	CALI VALLE DEL CAUCA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE DEL 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	128 DIAS

El día 22.del mes de agosto del 2018 a las 08:30 am se reunieron: CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de supervisor, respectivamente; SISO Lady Johana Mejia , en calidad de contratista y Arquitecta Rosa Maria Moreno y la SISO Johana Saavedra Ortiz., en calidad de interventor, con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR

Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

ANEXOS

GRUCO 1 ER. PISO : Estado actual de la construccion

muros microfisurados , cieloraso en buen estado.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CONTRATISTA Firma	INTERVENTOR Firma
SUPERVISOR Firma	





GRUCO












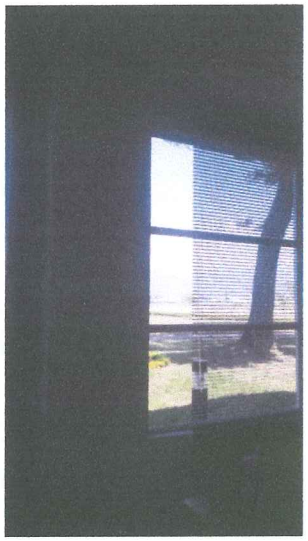

















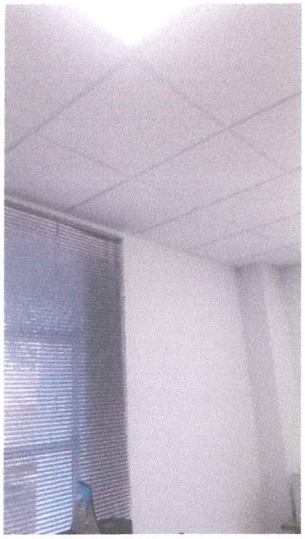














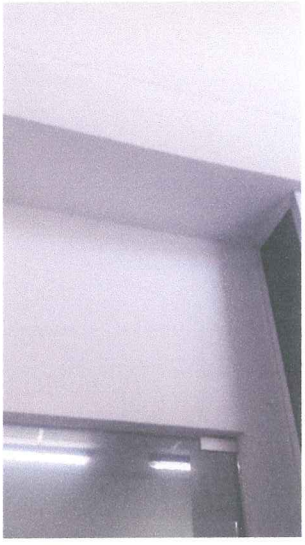


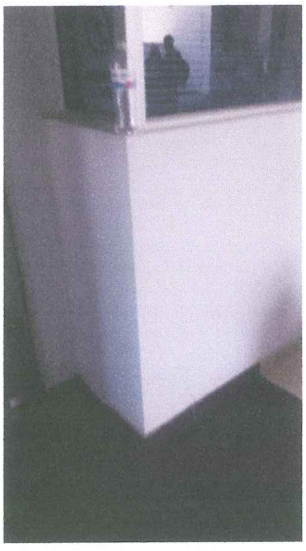



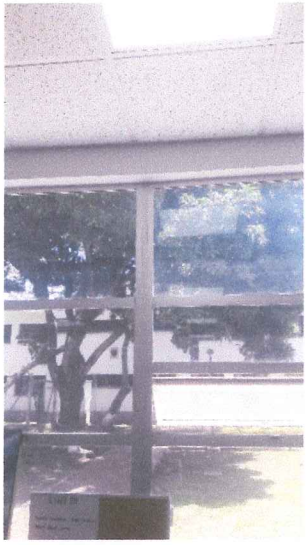

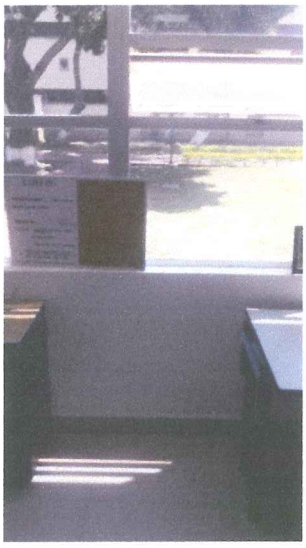
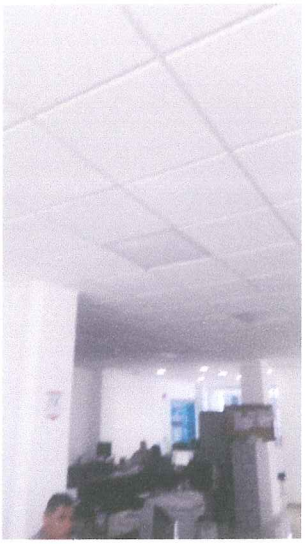


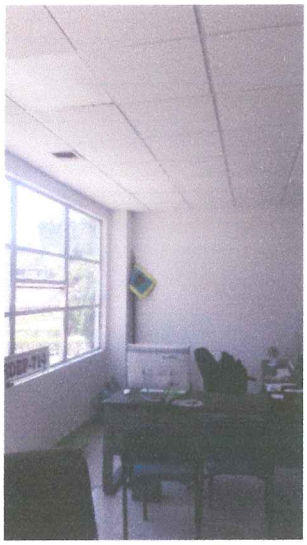SDEF-714














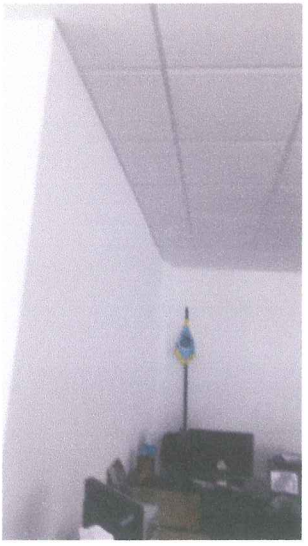



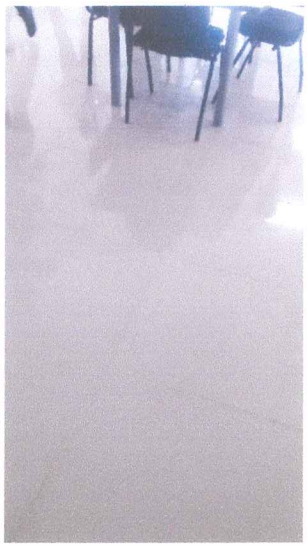




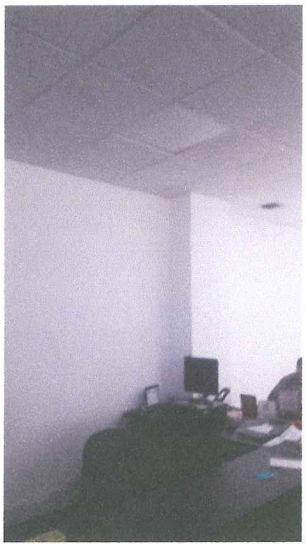



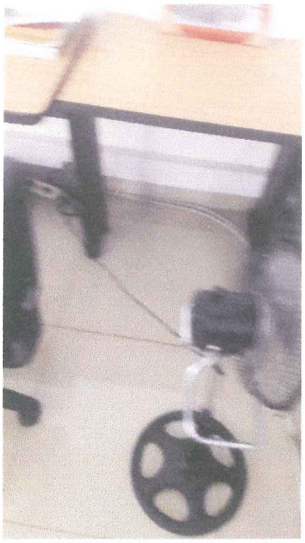














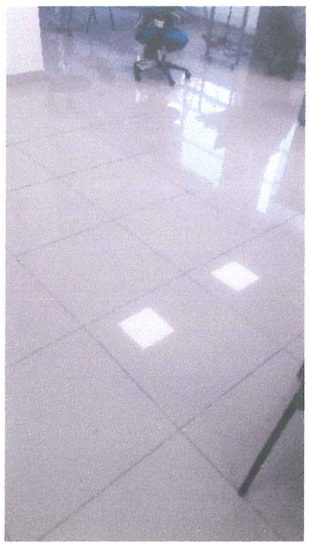









	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-106
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

CONTRATO N°	obra civil 035-00--a-cofac-dinsa-2018 e interventoria contrato N°052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16 DE JULIO DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADM. FASE III DE LA ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO	$2.764.331.274.32
CONTRATISTA	NEOGLOBAL S.A.S
INTERVENTOR	HBC HERNAN BARRIOS CASTRO
SUPERVISOR	CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	CALI VALLE DEL CAUCA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE DEL 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	31 DE MARZO DEL 2019

El día 22....del mes de.....agosto..... del 2018.... a la 08:30 am.....se reunieron: CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS, ., por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de .....supervisor....., respectivamente; SISO Lady Johana Mejia , en calidad de contratista y Arquitecta Rosa Maria Moreno y la SISO Johana Saavedra Ortiz., en calidad de interventor, con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

ANEXOS



BAÑOS 1 e PISO.


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CONTRATISTA Firma	INTERVENTOR Firma
SUPERVISOR Firma	

BAÑO CABALLEROS























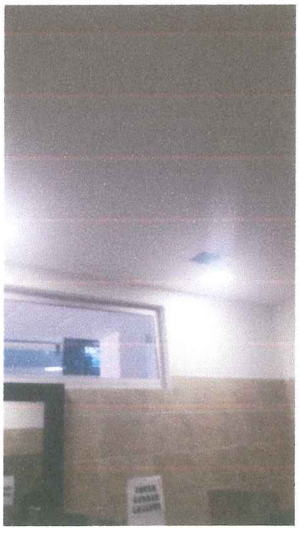
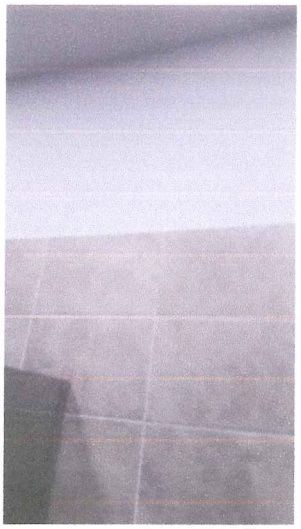

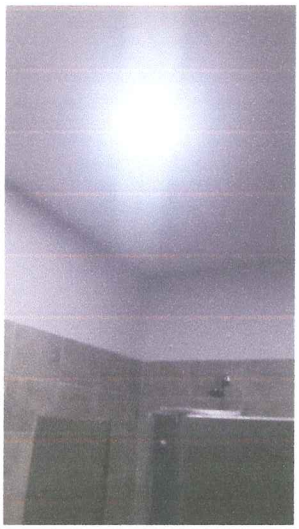
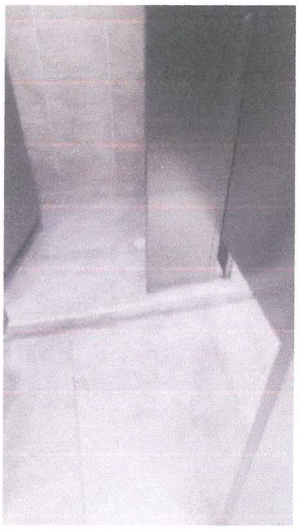


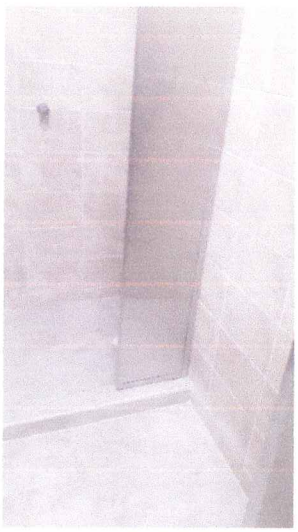
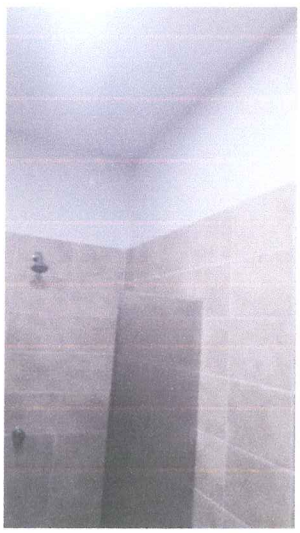




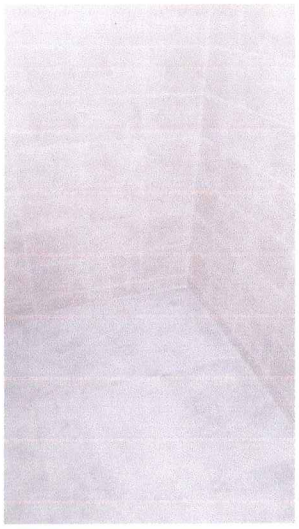
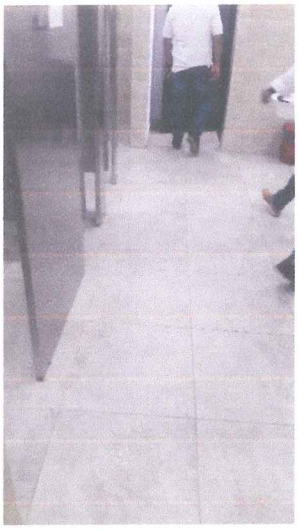
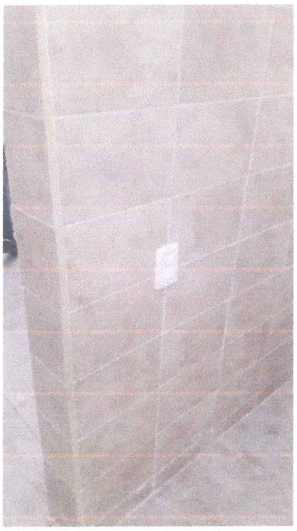

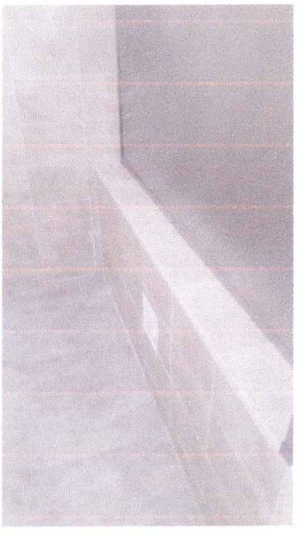
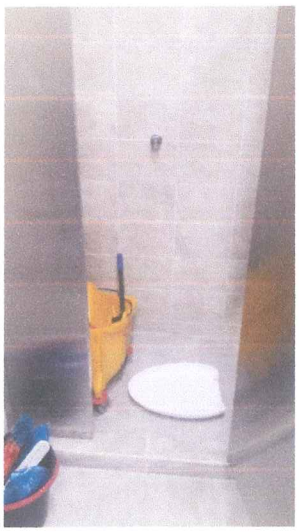

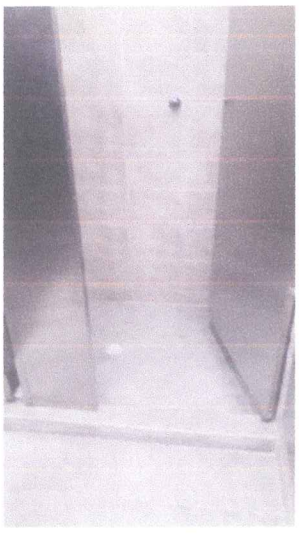


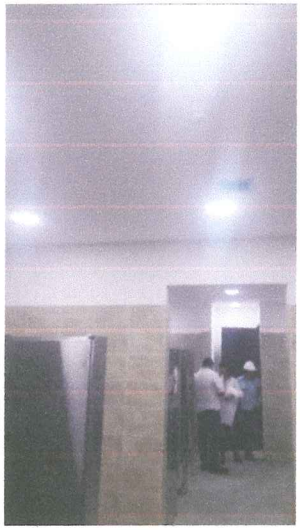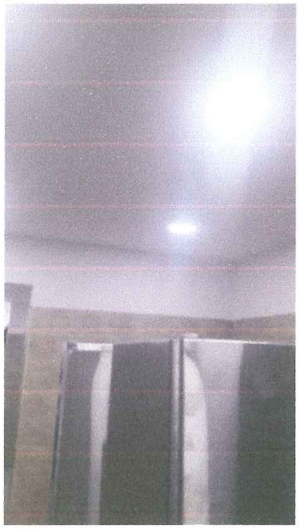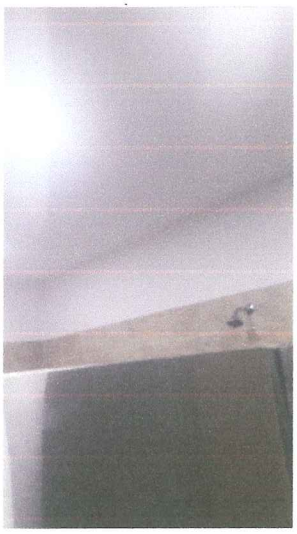












	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-106
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

CONTRATO N°	obra civil 035-00--a-cofac-dinsa-2018 e interventoria contrato N°052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16 DE JULIO DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADM. FASE III DE LA ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO	$2.764.331.274.32
CONTRATISTA	NEOGLOBAL S.A.S
INTERVENTOR	HBC HERNAN BARRIOS CASTRO
SUPERVISOR	CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	CALI VALLE DEL CAUCA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE DEL 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	31 DE MARZO DEL 2019

El día 22....del mes de.....agosto..... del 2018.... a la 08:30 am.....se reunieron: CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS, ., por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de .....supervisor....., respectivamente; SISO Lady Johana Mejia , en calidad de contratista y Arquitecta Rosa Maria Moreno y la SISO Johana Saavedra Ortiz., en calidad de interventor, con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

ANEXOS


Plazoleta exterior.
en optimas Cond. puerta exterior no cierra.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:


CONTRATISTA Firma	INTERVENTOR Firma
SUPERVISOR Firma	


PLAZOLETA EXTERNA



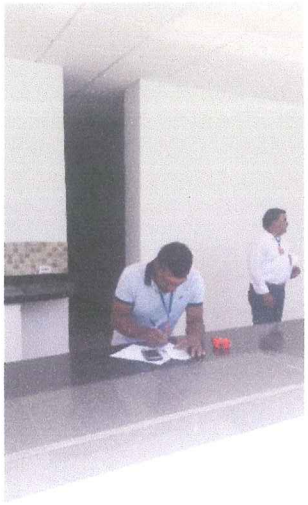



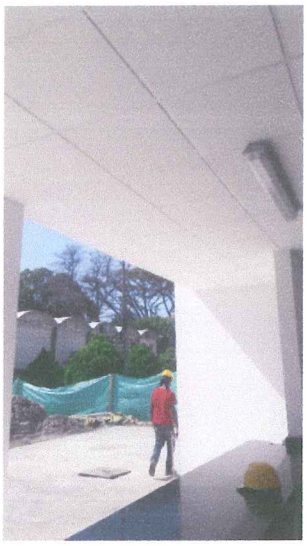
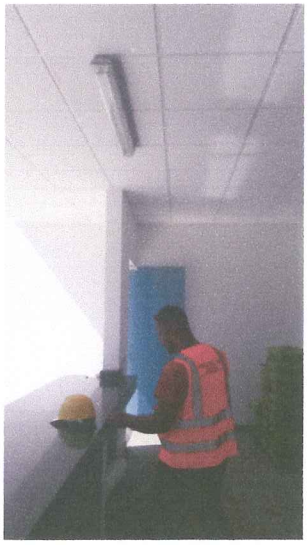
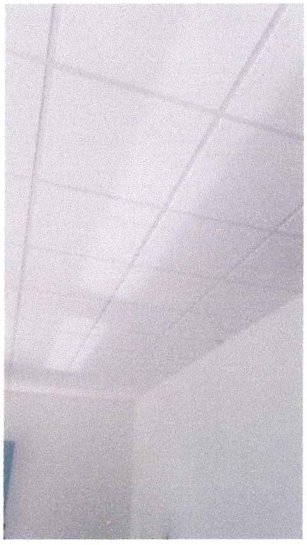
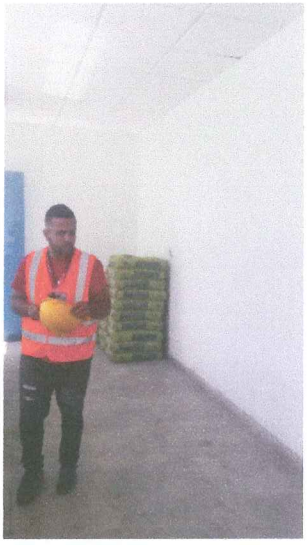



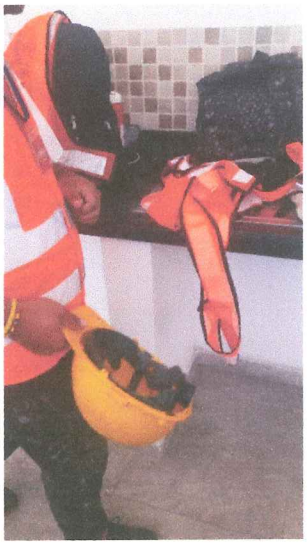


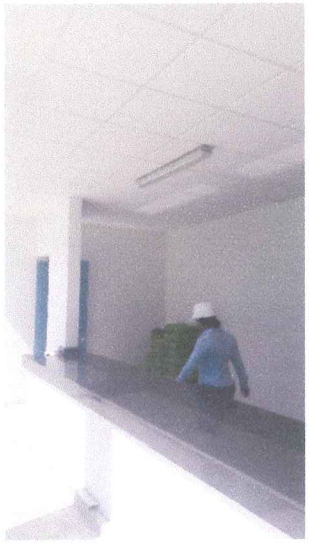






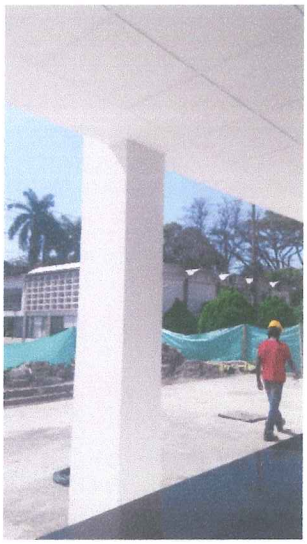



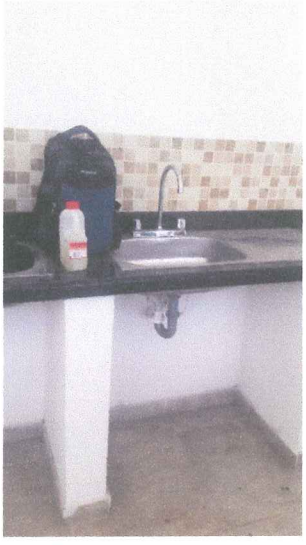


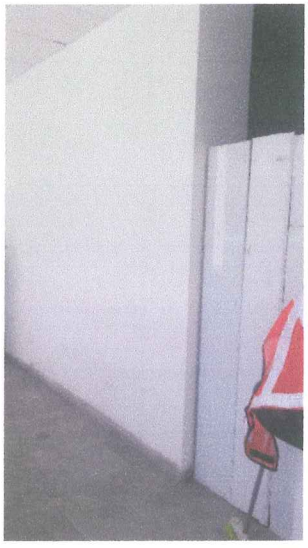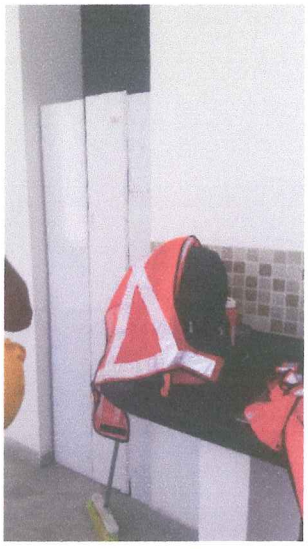


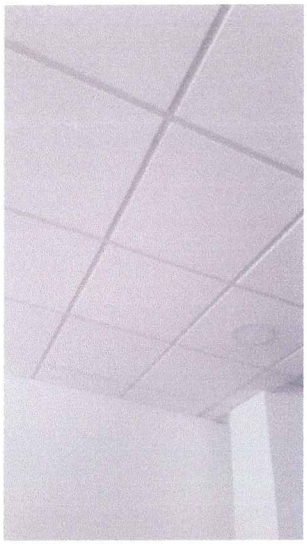





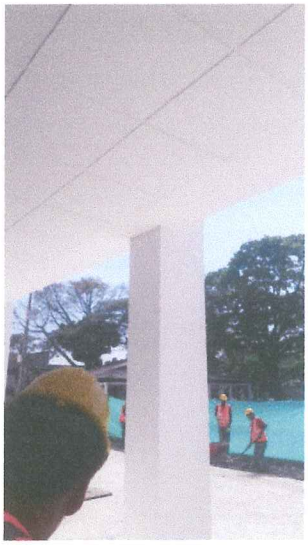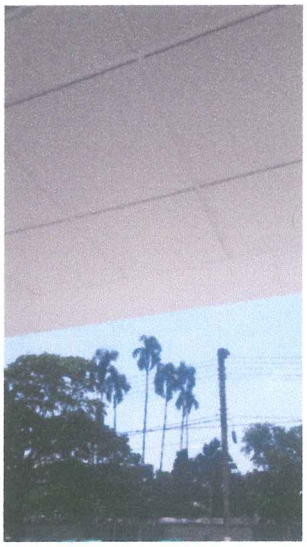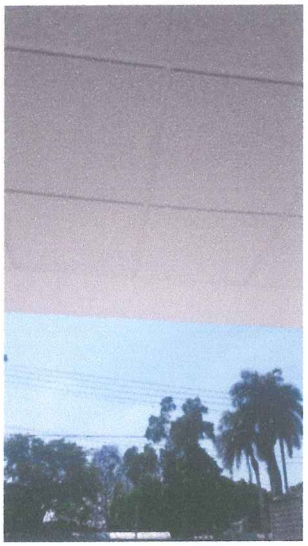







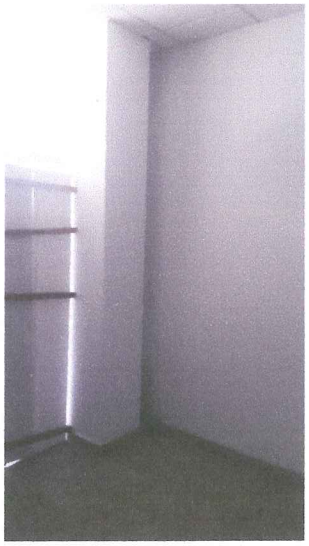
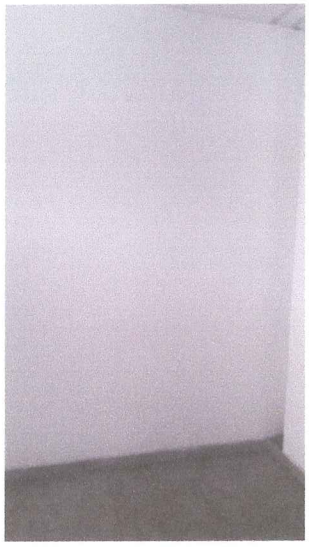
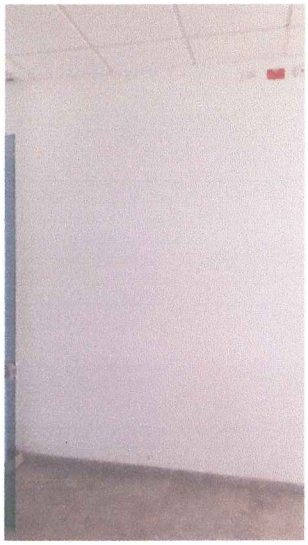
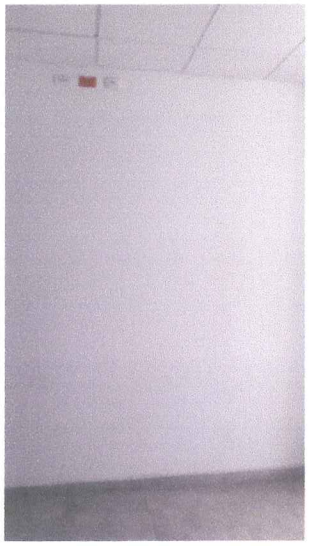













	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-106
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

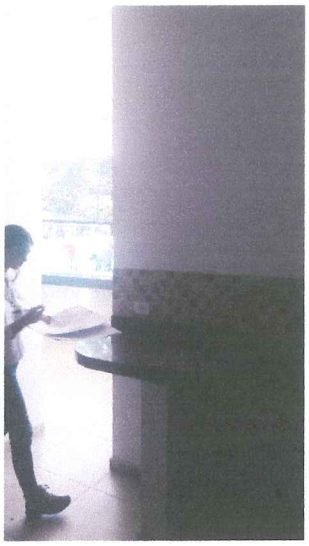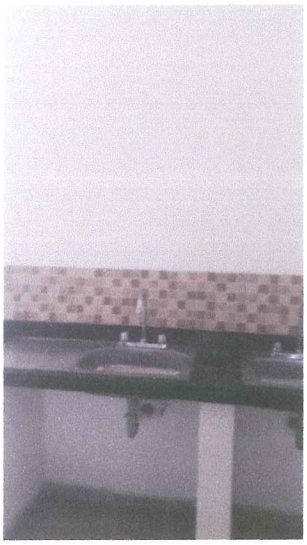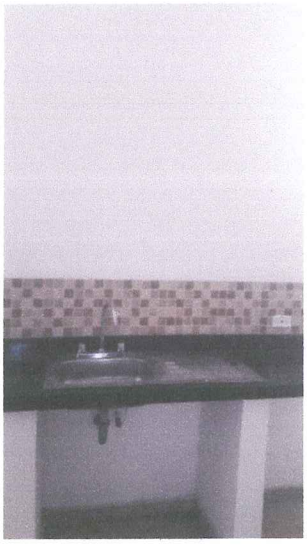CONTRATO N°	obra civil 035-00--a-cofac-dinsa-2018 e interventoria contrato N°052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	26 DE JULIO DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADM. FASE III DE LA ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO	$2.764.331.274.32
CONTRATISTA	NEOGLOBAL S.A.S
INTERVENTOR	HBC HERNAN BARRIOS CASTRO
SUPERVISOR	CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	CALI VALLE DEL CAUCA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE DEL 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	31 DE MARZO DEL 2019

El día 16....del mes de.....agosto..... del 2018.... a las08:30.....se reunieron: CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS, ., por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de .....supervisor....., respectivamente; y, ...Ing.Helmunt Murillo, SISO Lady Johana Mejia , en calidad de contratista y Arquitecta Rosa Maria Moreno y la SISO Johana Saavedra Ortiz., en calidad de interventor, con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

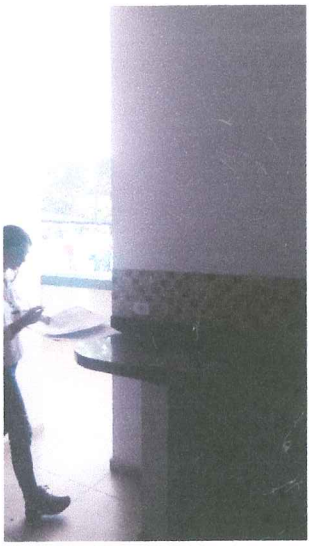
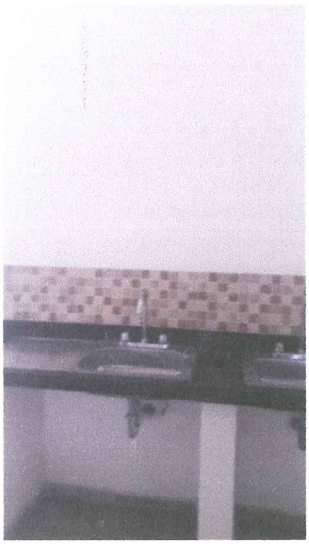
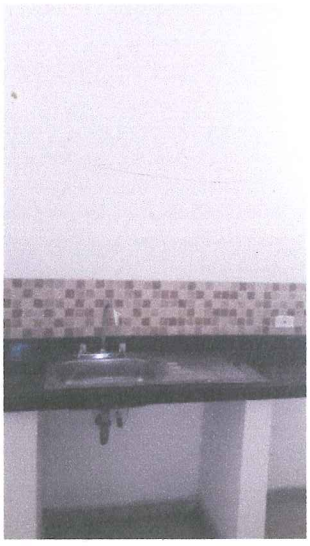
Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

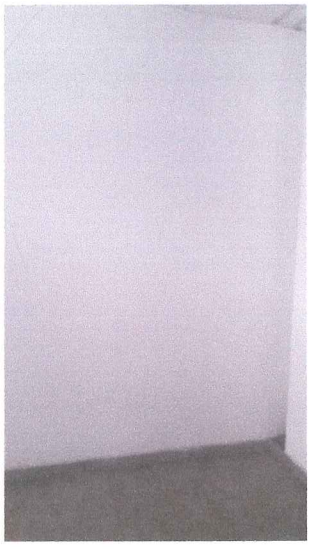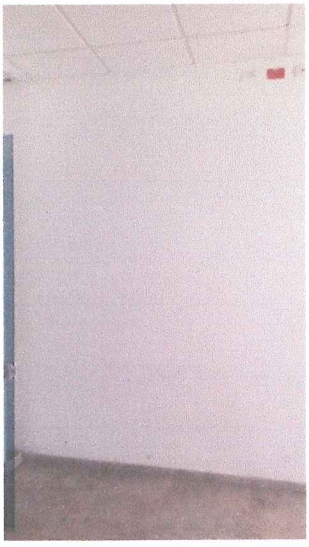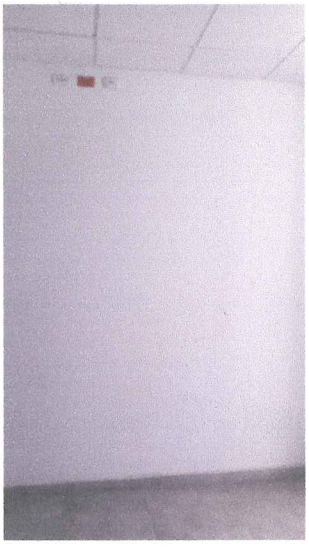
ANEXOS

planeación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:


CONTRATISTA Firma	INTERVENTOR Firma
SUPERVISOR Firma	

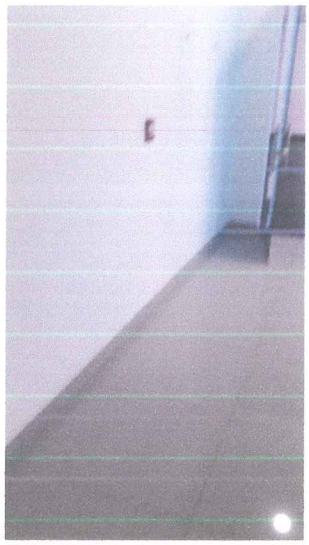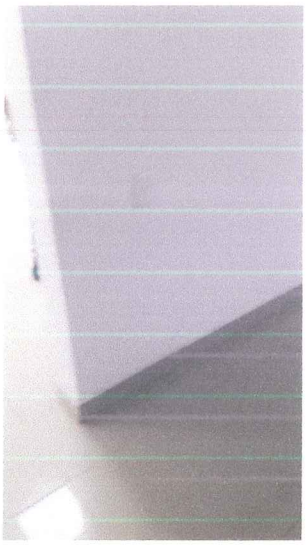
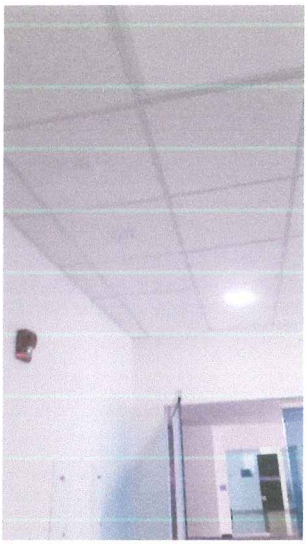




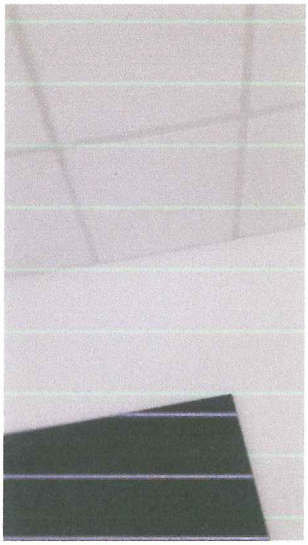















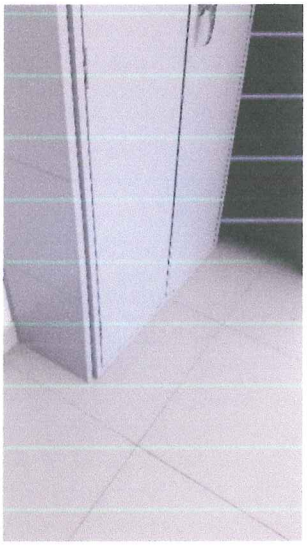
SECCIÓN
PLANEACIÓN

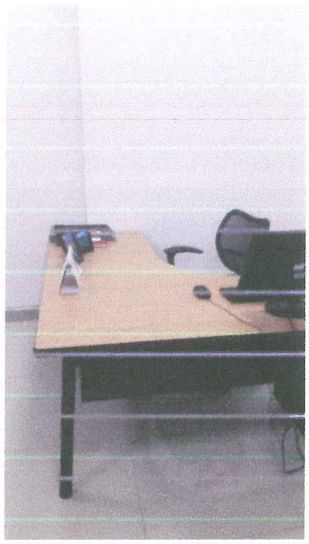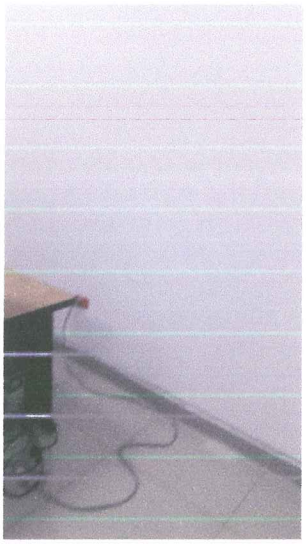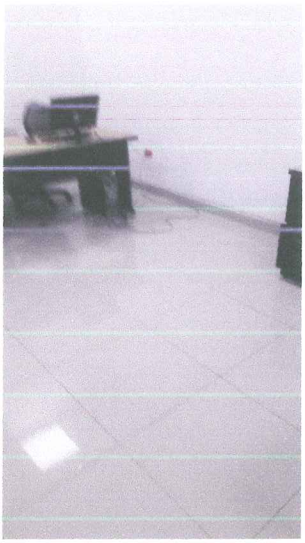
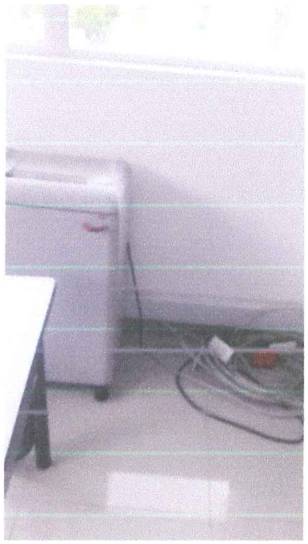


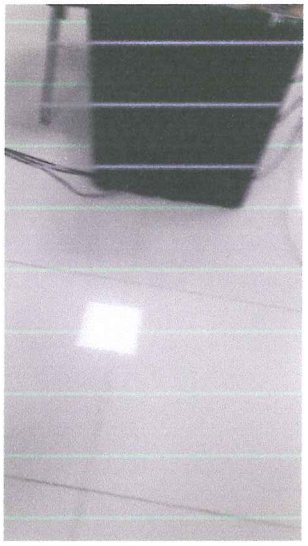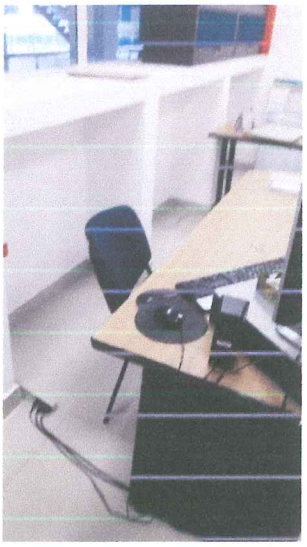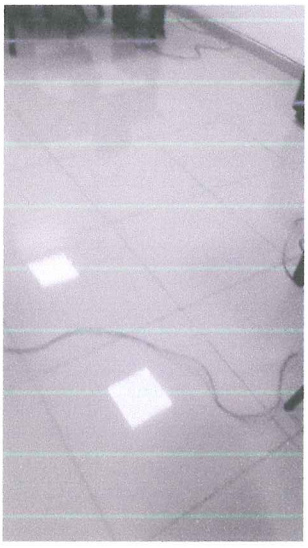



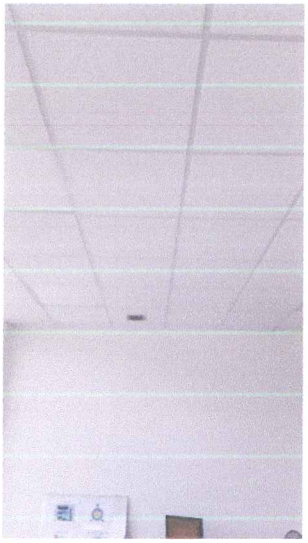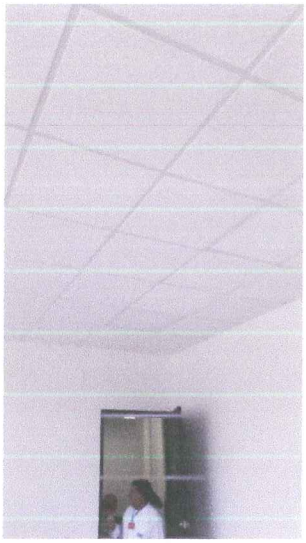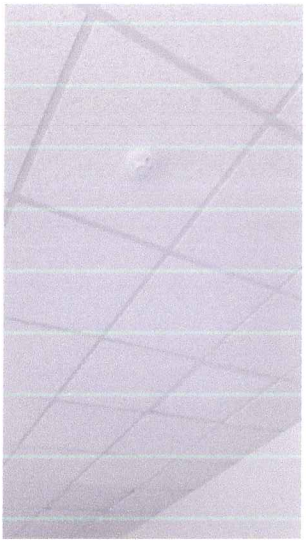




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	LS-FR-106
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión:	1
		Vigencia:	19/04/2017

CONTRATO N°	obra civil 035-00--a-cofac-dinsa-2018 e interventoria contrato N°052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	26 DE JULIO DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADM. FASE III DE LA ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO	$2.764.331.274.32
CONTRATISTA	NEOGLOBAL S.A.S
INTERVENTOR	HBC HERNAN BARRIOS CASTRO
SUPERVISOR	CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	CALI VALLE DEL CAUCA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ
PLAZO DE ENTREGA	30 NOVIEMBRE DEL 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	31 DE MARZO DEL 2019

El día 16....del mes de.....agosto..... del 2018.... a las08:30.....se reunieron: CAPITAN LUIS ARIEL CARO COBOS, ., por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de .....supervisor....., respectivamente; y, ...Ing.Helmunt Murillo, SISO Lady Johana Mejia , en calidad de contratista y Arquitecta Rosa Maria Moreno y la SISO Johana Saavedra Ortiz., en calidad de interventor, con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

ANEXOS

GRUA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CONTRATISTA Firma	INTERVENTOR Firma
SUPERVISOR Firma	



GRUIA

