MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2018-10-19-2 39 p m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	451518	Fecha Registro:	2018-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	35.958.811,78	Valor Total Dperaciones:	0.00			Valor Actual:	35.958.811,78	Saldo x Ordenar:	35.958.811,78
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	1.616.635,00	Valor Neto:	34.342.176,78			Nro. Compromiso:	118818	Nro. Cdp:	61618
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	852267 853169

TERCERO

Identificacion:	1143326526	Razon Social:	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	51234863154	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	259918	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	009	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR DPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:	35.958.811,78	0.00	35.958.811,78	35.958.811,78

Objeto:	CTO 052-00-A-CDFAC-DIFRA-2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-22	Generada	35.958.811,78

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.217.488,00	2,000 %	604.350,00	604.350,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.217.488,00	0,500 %	151.087,00	151.087,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.741.322,89	15,000 %	861.198,00	861.198,00

CR. ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR

ORDENADOR DEL GASTO

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA

CONTADORA COFAC

51 /1137

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 01

FECHA: **20 DE SEPTIEMBRE 2018**

LA SUSCRITA ***CORONEL ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR ORDENADORA DEL GASTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA,*** NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, EN USO DE LAS FACULTADES Y FUNCIONES CONTENIDAS EN RESOLUCION DE DELEGACION MINISTERIAL No. 4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LAS RESOLUCIONES No. 5662 DEL 27 DE JUNIO DE 2016 Y 1417 DEL 8 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **052-00-A-COFAC-DIFRA-2018**
PROVEEDOR: **HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO**
VALOR TOTAL: **$ 234.999.653**
VALOR A PAGAR: **$ 35.958.811,78**
MES DE PAGO: **PAC OCTUBRE**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago	1
COPIA	Cuenta por Pagar SIIF	1
COPIA	Acta de Recibido a Satisfacción	3
COPIA	Facturas	1
COPIA	SAP	1
COPIA	Certificación pago aportes parafiscales	3
COPIA	PRIMER CORTE DE INTERVENTORIA	12
COPIA	RUT	1
TOTAL FOLIOS		23

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR
ORDENADOR DE GASTO

ELABORO AS11 JENIFER HERRERA

VALOR PAC'S 35.958.811 78 52-COFAC-18

CONCEPTOS	BASE	TARIFA	
[illegible]ENTE	30'217.488 89	2%	604.350
[illegible]ENTE			
[illegible]ERCA	Cali		
[illegible]ERCA			
[illegible]ESERVA	5.741.322 89	15%	861.198
[illegible]ESTUDIOS OBRAS Y MANT			
[illegible]S U. NACIONAL	30'217.488 89	0,5%	151.087

Oct 1/18

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjherrera Jenifer Lorena Herrera Gonzalez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora: 2018-09-20-8:30 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	259918	**Fecha Registro:**	2018-09-20	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x**	Compra de Bienes a		**Nro.**	118818	**Nro. Cdp:**	61618
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	30.217.488,89	**Valor Iva:**	5.741.322,89		**Valor Total:**	35.958.811,78	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	1143326526	**Razon Social:**	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
009	FACTURA	2018-09-20

Objeto.:	CTO 052-00-A-COFAC-DIFRA-2018 // PAC OCTUBRE

AS11 JENIFER HERRERA
ASITENTE ADMINISTRATIVO

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
Nit. 1.143.326.526-2
Resolucion DIAN 18762000768979
Num.1 a 1000 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.

Factura de Venta No.	

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
13/09/2018	23/10/2018

NIT O C.C:	800.141.629-9	**CLIENTE:**	MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA
DIRECCION:	CARRERA 54 No.26-25	**C.COSTO**	
CONCEPTO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**TELEFONO:**	

DETALLE	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VALOR
ACTA PARCIAL N . 1, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No.052-00-A-COFAC-DIFRA-2018 CUYO OBJETO ES CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ". EN SANTIAGO DE CALI – VALLE CAUCA			$ 30.217.488,89
		Subtotal	30.217.488,89
		IVA 19%	5.741.322,89
Favor girar a la cuenta de ahorros número 51234863154 de bancolombia a nombre de HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO.		**Descuentos**	0
Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE		**TOTAL**	35.958.811,78

	APROBADA	RECIBIDA POR
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.		

CALLE 13C # 16-65 VALLEDUPAR - CESAR

Impreso por litografia Italiana S.A Nit 800.092.752-2

CRP. 25-9-18

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 13/09/2018
CONTRATO N°	052-00-A-COFAC-DIFRA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DE JULIO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PAC QUITO BIMESTRE DE 2018 POR UN VALOR DE 70'500.000,00 SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMENTRE 2018 POR UN VALOR DE 70'500.000,00 ULTIMO PAGO PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUANTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE 93'999.653,00
CONTRATISTA	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. LUIS ARIEL CARO COBOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 234.999.653,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	138 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	26-07-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 234.999.653,00

En Santiago de Cali, el día 13 del mes de septiembre de 2018, se reunieron la señora Coronel Ana Patricia Barrera Palomar en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor Capitán Caro Cobos Luis Ariel en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Hernán Julio Barrios Castillo en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA	Lo referenciado en el corte anexo	Ver cuadro de corte de interventoría anexo al presente documento

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y más fuera objeto de ponderación y exigencias del contratista, para y seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Participación del 50 % del Director de Interventoría para un total del 100%	50%	Se contó con la asistencia del Director de Interventoría el 100% de la ejecución de las actividades desarrolladas a la fecha.
Participación del 40 % del Técnico en construcción (inspector SISOMA) de Interventoría para un total del 100%	40%	Se contó con la asistencia de la Técnico en construcción (inspector SISOMA) el 100% de la ejecución de las actividades desarrolladas a la fecha.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trata de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA POR TRATARSE DE UN CONTRATO DE INTERVENTORIA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 234.999.653,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 234.999.653,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PAC QUINTO BIMESTRE DE 2018	35'958.811,78	De acuerdo a corte de interventoría anexo en donde se describen las dedicaciones, entrega de informes y entregables previstos por la entidad contratante y Factura No.009 del 13/09/2018
SEGUNDO PAGO PAC SEXTO BIMESTRE 2018	70'500.000,00	Pendiente por ejecutar
ULTIMO PAGO PAC DICIEMBRE 2018 Y/O CUANTAS X PAGAR 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019	Ultimo pago saldo del contrato	Pendiente por ejecutar

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 009	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaron los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
CONTRATISTA INTERVENTORIA

CAPITAN CARO COBOS LUIS ARIEL
SUPERVISOR CONTRACTUAL

CORONEL ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR
ORDENADOR DEL GASTO

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE COPNTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA PARA EL CASO EN EL QUE APLIQUE.

PRIMER CORTE DE INTERVENTORIA

	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	VALOR DIA	TOTAL DIAS	VALOR DIAS	% DEDICACION MIN.	V. UNITARIO
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO. DISPONER DIRECTAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DOTACION Y EQUIPAMIENTO. YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE Y AUXILIARES)								
1,1	Director de interventoría	1	mes	$ 3.500.000,00	$ 116.666,67	40	$4.666.666,67	50,00%	$ 2.333.333,33
1,2	Residente de interventoria	1	mes	$ 2.900.000,00	$ 96.666,67	40	$3.866.666,67	100,00%	$ 3.866.666,67
1,3	Ingeniero Sanitario y/o Ambiental y Sanitario	1	mes	$ 2.400.000,00	$ 80.000,00	0	$0,00	40,00%	$ 0,00
1,4	Ingeniero Electricista	1	mes	$ 2.200.000,00	$ 73.333,33	0	$0,00	40,00%	$ 0,00
1,5	Ingeniero Mecánico	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	0	$0,00	40,00%	$ 0,00
1,6	Ingeniero de sistemas o electrónico	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	2	$133.333,33	40,00%	$ 13.333,33
1,7	Abogado	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	0	$0,00	10,00%	$ 0,00
1,8	Contador	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	40	$2.666.666,67	10,00%	$ 266.666,67
1,9	Inspector SISOMA	1	mes	$ 2.000.000,00	$ 66.666,67	40	$2.666.666,67	40,00%	$ 1.066.666,67
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO									$ 7.546.666,67
SUBTOTAL 1 (CON MULTIPLICADOR)								2,50	$ 18.866.666,67
2	SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECIFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere este termino a la nomina del personal que labore en la oficina del interventor en forma regular y permanente , y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la interventoria)								
2,1	Secretaria	1	mes	$ 1.500.000,00	$ 50.000,00	40	4,6	20,00%	$ 460.000,00
2,2	Mensajero	1	mes	$ 1.000.000,00	$ 33.333,33	40	4,6	20,00%	$ 306.666,67
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO									$ 666.666,67
SUBTOTAL 1 (CON MULTIPLICADOR)								2,50	$ 1.666.666,67
3	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA EN CAMPAMENTO (incluyendo los gastos de comunicaciones, utiles de oficina y papeleria, elementos de dibujo, conservacion de muebles y enseres y depreciacion. erc)								
3,1	Comunicación(celular, internet) residente y oficina director	1	mes	$ 2.800.000,0	$ 93.333,3	40	4,6	100,00%	3.733.333,33
3,2	Viajes y viáticos	1	mes	$ 2.166.666,67	$ 72.222,22	40	4,6	100,00%	2.888.888,89
4	EQUIPOS Y CAMPAMENTO								
4,1	Ensayos y laboraterios.	1	glb	$ 7.500.000	$ 0	0	1	100,00%	-
4,2	Oficina campamento (dotación , equipos y mobiliario).	1	mes	$ 1.221.450	$ 40.715	40	4,6	100,00%	1.628.600,00
4,3	Elaboración de informes (incluye fotografias)	1	mes	$ 1.000.000	$ 33.333	40	4,6	100,00%	1.333.333,33
SUBTOTAL 2									$ 9.584.156
SUBTOTAL (1 + 2)									$ 30.217.489
IVA (19%)									$ 5.741.323
TOTAL									$ 35.958.811,79

CAPITAN CARO COBOS LUIS ARIEL
SUPERVISOR CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	AI-FR-004
	FORMATO: [ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD]	Versión N°:	05
		Vigencia:	31-07-2015

Le agradecemos responder las siguientes preguntas.

El Departamento de Acción Integral ha diseñado la siguiente encuesta con el propósito de medir el grado de aceptación y confianza de la Fuerza Aérea Colombiana en la población que habita en los municipios apadrinados y en las zonas aledañas a las Bases Aéreas. Su opinión es de gran importancia en el momento de orientar acciones, que contribuyan al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la Seguridad de los Colombianos.

Unidad _____ **Fecha** _____
Ciudad _____ **Municipio** _____ **Vereda** _____

1. ¿Considera usted que la relación que tienen los Hombres y Mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana con la población de su comunidad es?

   Buena ____
   Mala ____ ¿Por qué? _____

2. ¿Usted y/o su comunidad han recibido algún apoyo por parte de la Fuerza Aérea?
   SI ____
   NO ____

3. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con el comandante de la unidad aérea?

   SI ___
   NO ___

4. ¿Cree usted que la Fuerza Aérea Colombiana contribuye al desarrollo y progreso de esta región?

   SI ___
   NO ___ ¿Por qué? _____

5. ¿Informaría usted a la Base Aérea sobre los hechos, actos, situaciones sospechosas que puedan afectar la seguridad de su comunidad y/o de la Base Aérea?

   SI ___
   NO __ ¿Por qué? _____

Sugerencias: _____
_____
_____
_____

Julio 30 / 2018. (Lunes).
Se continua con los estudios de seguridad del personal de obra y personal de la interventoria, no se realizo ningun tipo de actividad contractual.

Por/

Contratista.

Interventoria

Julio 31 / 2018 (Martes)
Se continua con los estudios de seguridad del personal de obra, el cual fue entregado al supervisor del contrato para los fines pertinentes.
No se realizo ningun tipo de actividad contractual

Por/

Contratista

Interventoria

Agosto 01 de 2018. (Miercoles)
Se esta a la espera de la autorizacion para el ingreso del personal de obra, ya que se realizo el estudio de seguridad del personal a Laborar
No se realizo ningun tipo de actividad contractual

Por/

contratista

Interventoria

Julio 26 / 2018. (Jueves)
Se realizó el primer comite de obra con la asistencia de la firma contratista (Director de Obra), Ingeniero residente de Contratista, Director de la Interventoria, Supervisor del contrato y el gerente de proyecto por parte de la fuerza Aerea colombiana, s
Se hizo las respectivas presentaciones, asi mismo se determino que todos los jueves, se realizara el comite de obra.
por otra lado se realizo el acta de inicio de obra, entre el director de Interventoria y director del contratista
Seguidamente se llevo a cabo un recorrido en los sitios que se van a intervenir en el proyecto

Contratista.

Interventoria.

Julio 27 / 2018 (viernes)
El contratista empieza el proceso de selección de personal para laborar en la obra, por lo que se requiere del estadio de Seguridad ESP. de cada uno del personal.
Por dal motivo no se presento ningun tipo de actividad contractual

contratista

Interventoria

Agosto 04 /2018. [Sábado]
personal en obra:
Maestro obra : 1
oficial obra : 2
Ayudantes obra: 5
Tiempo : Soleado, seco, sin vientos
Actividades
1. Continuan con excavacion manual, ya que el terreno era apto para realizar dicha actividad, para intervenir esta area con retroexcavadora
Se trabajo hasta medio dia.

Por:

Contratista

Interventoría

Agosto 06 /2018. (Lunes).
personal en obra.
Maestro obra : 1
oficial obra: 2.
Ayudantes obra: 5
Tiempo : Soleado, seco, sin vientos.
Actividades.
1. se realizaron despreces de lleno de retorzo para tanque en plano.
2. Se hizo presentación de la Residente de Interventoría al supervisor de Contrato
3. Se construye campamento en la zona de trabajos del tanque
4. Se realizan charlas en las horas de la mañana con el personal de obra.

personal de Interventoría
Director : 1
Arq Residente: 1

Agosto 02/2018. (Jueves)
Se realizo segundo comite de obra entre gerente de proyecto, supervisor de contrato, contratista (Director y Residente) y la persona encargada de la verificación de los planos de diseño, concluyendo en el inicio de Labores en los frentes de Trabajo.
1. Localización y replanteo para el 1er frente de Obra consistente en la construcción de los tanques, con las siguientes secciones (13 x 5.5) mt y 3.50 mt de profundidad
2. Se construyó cerramiento en polisombra.

Por.

Contratista

Interventoria

(Viernes)
Agosto 03/2018.
personal en obra:
Maestro obra: 1.
oficiales obra: 2
Ayudantes obra: 5.
Tiempo: soleado, seco, sin vientos.
Actividades:
1. Se da inicio a actividades de excavación manual. area de tanques.
2. Continua construcción cerramiento en polisombra.



Por.

Contratista

Interventoria



Contratista R. Interventoría

(Martes)

Agosto 07/2018: No se realizo ningun tipo de actividad por ser festivo.

Agosto 08/2018 (Miercoles)

personal en obra.	personal Interventoría
Maestro obra: 1	Ing. Director: 1
Oficial Obra: 2	Arq. Residente: 1
Ayudantes Obra: 5	
Director: 1	
Residente: 1	


Tiempo: soleado, seco, sin vientos.

Actividades:

1. Continua excavación para torque con maquina retroexcavadora.
2. Se da inicio a labores de cerramiento en plazoleta exterior
3. Comienzan demoliciones en area de columnas existentes y rampa plazoleta exterior
4. Se hace retiro de material area torque en dos volquetas, llevandola al respectivo sitio autorizado como botadero.

Norma



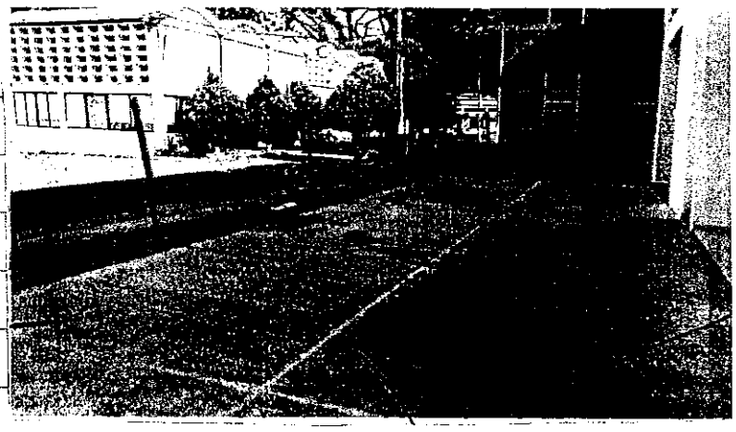

Contratista

Interventoría

Agosto 09/2018 (Jueves)

personal en Obra		personal Interventoría	
Arq Director :	1	Ing. Director:	1
Ing. Residente:	1	Arq Residente:	1.
Maestro:	1		
Oficiales:	2		
Ayudantes.	5.		

Tiempo: Seco, soleado, sin vientos

Actividades

1. Continua excavación terreno con maquina retroexcavadora.
2. Se concluye cerramiento area plazoleta exterior.
3. Se hace cerramiento para el sector de la garita, contiguo al ingreso de la zona operativa.
4. Se da inicio a demolición de la garita por lo que la interventoría suspende esta actividad ya que se encuentra en ella un RACK, de seguridad de la zona
5. Se lleva a cabo comite de obra Nº 3 s/acta

Contratista R.

Interventoría

Agosto 10 de 2018. (viernes).


Personal en Obra.		Personal Interventoría.	
Ing. Director:	1	Ing. Director:	1
Ing. Residente:	1	Arq. Residente:	1
Maestro:	1		
oficiales:	2		
Ayudantes:	5.		

Tiempo: Seco, soleado, sin vientos.

Actividades

1. continua excavación tanque con maquina retroexcavadora, así como el retiro de dicho material en volqueta a sitio autorizado
2. concluye demoliciones en placa rampa y columnas, plazoleta exterior
3. Se hacen observaciones por parte de interventoría al contratista de Obra, mediante oficio 004 de no iniciar actividades sin la autorización de la interventoría.



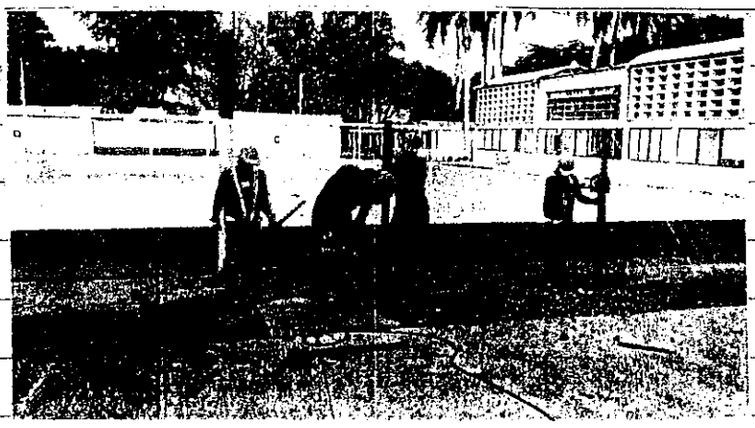

Contratista R.

Interventoría.

Agosto 11 de 2018. (sábado).

personal en obra		personal Interventoría	
Arq. Director:	1	Ing. Director:	1
Ing. Residente:	1	Arq. Residente:	1
Maestro:	1		
Oficial:	2		
Ayudantes:	5		

Tiempo: Seco, soleado, sin vientos.

Actividades

1. continua excavación tanque con personal de obra, ya que se encuentra en la etapa de nivelación del terreno, por encontrarse cerca de la cota de diseño.



Contratista R.

Interventoría

Agosto 13 de 2018. (Lunes).


personal de Obra		personal Interventoría	
Arq. Director:	1	Ing. Director:	1
Ing. Residente:	1	Arq. Residente:	1
Maestro:	1	Tec. SISO:	1
Oficial:	2		
Ayudantes:	6		
Tec. Datos/voz:	2		

Actividades.

1. Continua trabajos de perfilado y nivelación en terraplen hacia cota de diseño.
2. Llega revisión de datos/voz por parte del contratista para revisión de planos y visita a las oficinas donde se realizan estas actividades
3. En el día de hoy llega al sitio de la obra, el Capitan Tovar, Ingeniero civil de seguimiento Fuerza Aerea.
4. La encargada siso, por parte de interventoria realiza una charla sobre seguridad y cuidados a tener en el dia a dia.
5. El Arquitecto director de obra no se presento en obra

Se hace presencia en obra para realizar seguimiento a la misma, se identifica que hasta la fecha NO se tiene en obra documentos como cronograma de obra y bitacora actualizada, entre otros documentos, a lo anterior se realiza una socialización completa de los documentos contractuales que son exigidos al inicio del contrato, asi mismo se indica que ya han pasado 20 dias desde el inicio del contrato y esos documentos debieron realizarse hace varios dias atras, se solicita se subsanen con plazo inmediato de lo contrario se informará a la ordenadora del gasto y departamento de contratos FAC. CT. YCS16

Tovar R. 26/4/19

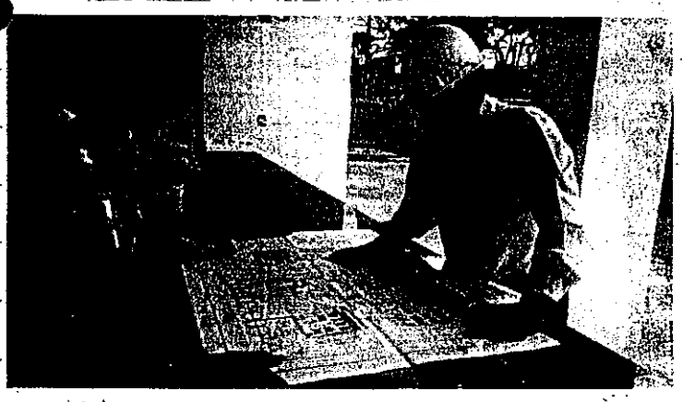



Contratista

Interventoria

Agosto 14 de 2018 (Malla)


personal en obra		personal Interventoría	
Ing. Director:	1	Ing. Director:	1
Ing. Residente:	1	Arq Residente:	1
Maestro:	1	Tec. siso	1
Oficial:	2		
Ayudantes:	6		
Tec. voz y Datos:	2		


Tiempo: Seco, soleado, sin vientos.

Actividades: Se presentan lluvias horas de la tarde

1. Continuan trabajos de perfilado y nivelación en tanque hasta cota de diseño.
2. Continua revisión de comisión de voz y datos en areas para ejecución trabajos, e identificación red e inspección cajas (18 und)
3. Se concluye demolición de parte concreto en area placa loseta externa.
4. Se inicio la construccion de bordillos parte externa.

Se realiza presencia en obra, Contratista continua con excavacion del tanque y demoliciones en zona de cadenas, Se presenta a la Interventoria de forma preliminar por parte del contratista un cronograma de obra pero se identifican varios novedades por lo cual no se acepta y se ordena corregir, igualmente no se ha subsanado ningun documento de los relacionados ayer. Cr. Yesid Tovar B.

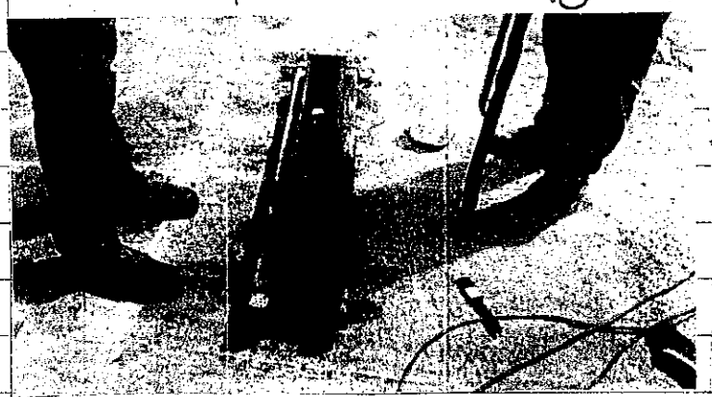

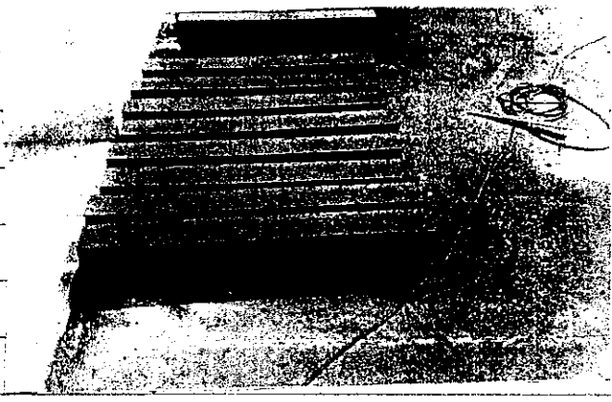

Contratista R

Interventoría

Agosto 15 de 2018. (Miercoles)

personal en obra		personal Interventoria	
Arq. Director:	1	Ing. Director:	1
Ing. Residente:	1	Arq. Residente:	1.
Maestro:	1	Tec. Siso:	1
Oficial:	3		
Ayudantes:	8		
Tec voz y Datos:	2		

Tiempo: Seco, soleado, sin vientos.

Actividades:

1. Se continua con los Trabajos de pertilado y nivelacion en el Tanque en la cota de diseño.
2. Se continua con revision de instalacion de voz y datos en AREAS para ejecutar Trabajos.
3. Se realizo el cerramiento, se construye los bordillos. para los andenes y se realiza la plantilla para la instalacion del piso. d wpc. demarde a los diseños presentados.
4. Se continua con visita de seguimiento, se realiza acompañamiento en obra a los diferente areas del proyecto, como items puntuales, se socializa la ubicacion de la rejas del Grilla, asi mismo se identifica zonas de demolicion y sardineles; se solicita muestra del acero estructura del dect por instalar en la zona de cadetes. C.T. Yesid Tovar R

— ♡ — ○ —

→ EL DIA DE HOY EL DIRECTOR ESTUVO EN OBRA CUMPLIENDO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS y POR MOTIVOS DE TRAFICO PARA HACER LA IMPRECION DE DOCUMENTOS (PROGRAMACION DE OBRA) FISICO LLEGO RETRAZADO AL COMITE Y NO FUE TENIDO EN CUENTA EN EL ACTA SE COMPROMETE A ESTAR PUNTUAL EN LOS PROXIMOS COMITES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Norma

AGosto 16, de 2018 (Jueves)

Personal en obra
Arq. director: 1
Ing. Residente: 1
Maestro: 1
Oficial: 3
Ayudantes: 10
Tec. voz y datos: 2

Personal interventor
Ing. Director 1
Arq. Residente: 1
Tec. Siso: 1
Tecnico elect: 1

Tiempo: Seco, Soleado, sin vientos

Actividades:

1. Se inicio la mañana con Medicion por parte de la Arq. Rosa Maria
2. se fabrican bordillos en obra (prefabrica
3. continuan demoliciones en andenes a lo largo de plazoleta externa
4. perfilado y nivelacion en excavacion de tanque subterraneo.
5. Se lleva a cabo comite de obra N° 4.



6. Continua aislado de piso en area de plazoleta externa.
7.

Contratista R

Interventoria

Agosto 17 de 2018 (Viernes)

Personal	Personal Interventoria
Ing. director : 1	Ing director : 1
Ing. Residente : 1	Arq. Residente : 1
Maestro : 1	Siso obra = 1
Oficial : 2	Siso Interventoria = 1
Ayudantes : 6	

Tiempo : Seco, Soleado, Sin vientos

Actividades

1. Al ingresar en las horas de la mañana se presente inconveniente con el horario del personal de obra ya que el dia anterior se habia dejado un compromiso del ingreso a la 6:30 Todo el personal y este no se cumplio.
2. continuan excavaciones de perfilado en tanque de agua
3. Sigue fabricación bordillos en concreto
4. Continua alistado de piso en area de plazoleta externa
5. Siguen demoliciones de anden perimetral a La plazoleta externa.
6. Se concluye cerramiento en area plazoleta externa, el cual fue modificado por ampliación hacia area de anden perimetral



Contratista R.

Interventoría

Norma

Sabado, 18 de Agosto de 2018
Personal en obra
Arq. director de Obra 1 Ing. Director Interv
Ing. Residente Obra 1 Arq Residente Interve
Maestro 1 Sisa Int.
oficiales 2
Ayudante 6
Sisa. 1
Tiempo: seco, soleado, sin vientos.
Actividades
1. Se continua fabricación bordillos en area plazoleta externa
2. Excavaciones para pertilado fenreco en area tanque de agua
3. Continuan demoliciones de onda perimetral de plazoleta externa.
4. Se concluye alistado de piso en area de plazoleta externa.



Contratista R.

Interventoria.

Martes, 21 de AGOSTO de 2018.


Persona en obra		Personal Interventoria	
Arq. director de obra	1	Ing. Director	1
Ing. Residente	1	Arq. Residente	1
Maestro	1	tec. SISO.	1

Oficiales: 1
Ayudantes: 9
Tiempo: Seco, Soleado, Con vientos
Actividades:
1. Contratista hace una presentación de como quedara el bordillo en area plazoleta externa
2. Continua excavación y perfilado hacia cota de diseño tanque de agua

→ SE SOLICITO RESPETUOSAMENTE AUTORIZACION PARA INICIAR LA INTERVENCION EN EL SECTOR DE SIMULTADORES

→ CUADRILLA DE LA RED CONTRA INCENDIOS ESTA LISTA PARA INICIAR EL JUEVES LO MISMO QUE LA DE LA PARTE ELECTRICA PERO NECESITAMOS DEFINIR POR DONDE COMENZAMOS LOS TRABAJOS

DEL DIRECTOR DE OBRA

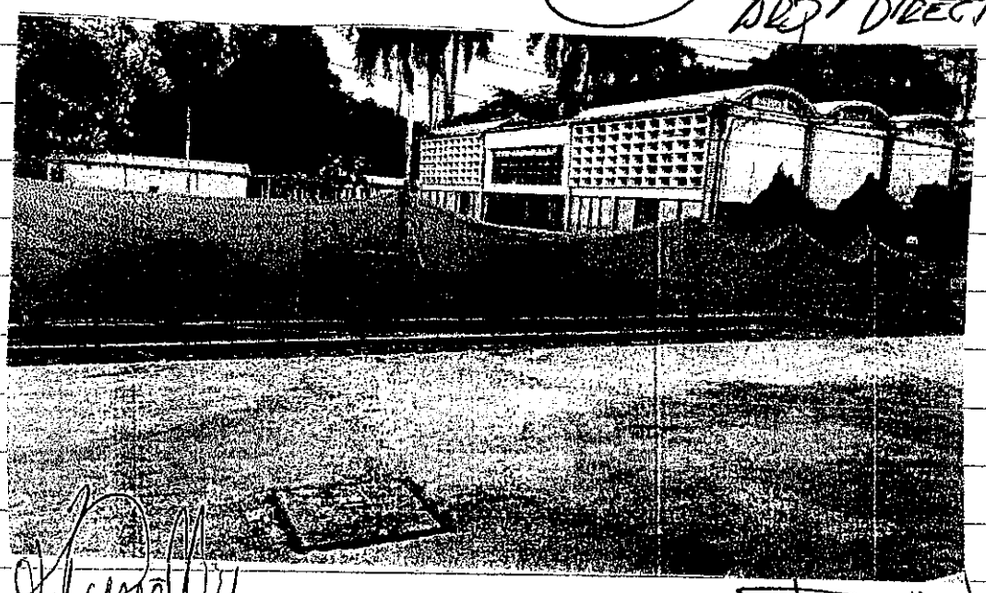

Contratista R.

Interventoria

Norma

Miercoles, 22 de Agosto de 2018


Personal de obra

Arq. directa de obra	1	Ing. director Interventoria	
Ing. Residente obra	1	Arq. resid. Interventoria	
Maestro	1	Siso Int.	
Oficiales	2		
Ayudante	6		
siso obra	1		

tiempo: Seco, Soleado, Sin vientos

Actividades

1. Revisión de documentación entregada por parte del Arq. Gustavo Adolfo I. de neoglobal.
2. Se hacen oficios para contestar de forma legal a neoGlobal.
3. en compañía de: Capitan Cano, Ing. German Arq. Rosa. M. Moreno, siso de obra, siso de interventoria; se realiza Actas de vecindad que se llevaron acabo en la mañana y parte de la tarde.
4. El capitan Cano nos reunio a interventoria a las 4:20 pm, para hablar de los puntos faltantes en la acta del comite anterior.
5. Observaciones: el personal de obra fueron citados a las 2:30 pm para hacerse ex. de ingreso y capacitacion solicitada por la siso de interventoria.



Contratista R.

Interventoria

Norma

Jueves 23 de Agosto de 2018

Personal en obra.

Arq Director de Obra	1	Voz y datos:	2
Ing. Residente Obra.	1	Red Cont. Incend.:	2
Maestro	1		
Oficiales	2	Ing. director interv.	1
Ayudantes	6	Arq. Residente Interv.	1
Siso Obra.	1	siso interventoria	1

Tec Voz y Datos

Tiempo: Seco, Soleado, Sin vientos

Actividades

1. Se Reunio el personal, Requerido por el Capitan Cabo.
2. Comite de interventoria.
3. Se termina excavacion y pañetado tanque de agua.
4. Se da inicio de instalacion bordillo area perimetral plazoleta externa
5. Se hace entrega del area de trabajo para tercer frente (simuladores)



Contratista. R.

Interventoria

Norma

Viernes 24 de Agosto 2018.


Personal de obra

Arq. direct de obra	1	Ing. direct Interventoria	
Ing. Res. "obra	1	Arq. Residente"	
MAESTRO	1	SISO	"
oficiales	2		
Ayudante	6		
Siso obra	1		
Voz y datos.	2		

tiempo: Seco, Soleado, Sin vientos

Actividades.

1. Fotos del estado en que se dejo la obra el dia anterior (2 frentes).
2. Reunion de interventoria con el capitan Caro.
3. Llega material Recebo a obra para areas de torque y anden
4. Continua instalacion bordillo en area perimetral plazoleta externa
5. Se da inicio a instalacion cerramiento en 3er frente de trabajo, area simuladores.



Contratista. I.A.

Interventoria

Norma

Sábado 25 de Agosto - 2018.


personal en obra.

Arq. director obra.		Ing. director Interventoría	1
Ing. Residente obra	1	Arq. Residente Interventoría	1
Maestro	1	siso. Interventoría	1
oficiales obra	2		
Ayudantes Obra	6		
siso. obra.	1		

Tiempo: Seco, soleado, sin vientos

Actividades:

1. Se lleva a cabo extendida de Recebo y posterior compactación en area de anden perimetral plazoleta exterior.
2. Se inicia extendida recebo en area de tanque de agua.
3. En horas de la tarde se da inicio a fundida anden en concreto. escobiado.
4. Se inicia instalación estructura de soporte para drywall area de simuladores.

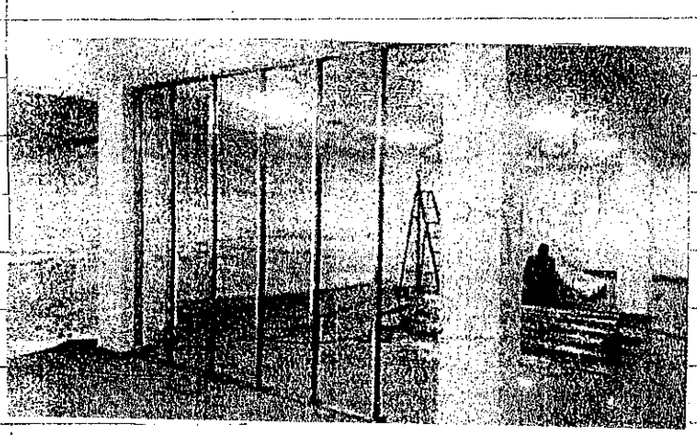

Contratista

Interventoría

Martes 28 de Agosto de 2018.

Personal de obra

Arq. Dir. de obra		Ing. dir. Intervent.	1
Ing. Resid. obra	1	Arq. Resident Int.	1
Siso obra	1	Siso Inter.	1
Maestro	1		
Oficiales			
Ayudantes			

Tiempo: Seco, Soleado, sin vientos, lluvia leve.

Actividades:

1. Se fundieron zapatas costado sur jardinera.
2. Excavaciones para rompa lateral costado Norte. Se suspendio actividad a las 8 de la mañana en el Tanque Subterraneo Todo el dia. Por visita del Presidente. Personal parado y maquinaria de compactación

ATT. [signature]

Maestro obra.

3. Se lleva a cabo instalacion tomina Drywall en area simuladores.

[signature]

Contratista.

[signature]

Interventoria

Norma

JUEVES 30 DE AGOSTO 2018.

personal de obra
Arq. Direct de obra
Ing. Res. Obra 1
siso obra 0
Maestro 1
Oficiales 2
Ayudantes 8

Ing. de. Int 1
Arq. Resid Int 1
Siso Int 1

Tiempo: Seco, soleado, sin vientos

1. Medicion de obra con el fin de valorar el % ejectada a la fecha.
2. Reunion de interventoria.
3. continuan excavaciones en area de jardineras plazoleta exterior.
4. se instalan laminas de Drywall en espacio domos - simuladores
5. se realiza compactación de relleno en roca muerta en area de tanque de agua
6. se funde concreto anden costado sur. plazoleta externa

Contratista

Interventoria

HBC

CERTIFICADO PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

Yo, **HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, me encuentra a la fecha de este documento, y durante los últimos seis (6) meses, al día con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado a los 13 días del mes de Septiembre de 2018.

Atentamente,

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
CC. 1.143.326.526 de Cartagena
Ingeniero Civil

Hernan Julio Barrios Castillo
Ingeniero Civil
Calle 13c #16-65 Valledupar
Hernanbarriosc@gmail.com
Cel:3214201227

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143326526		BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACESAR	cll 19c N16 65	VALLEDUPAR-CESAR	5722376	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	367144269	8483804884	E	2018/09/07	2018/09/07	BANCOLOMBIA	0	$3,720,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	idp			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)																								$12,014,968	$1,922,400			$12,014,968	$480,800			$12,014,968	$480,800			$12,014,968	$836,600		$0	$0		$3,720,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																								$12,014,968	$1,922,400			$12,014,968	$480,800			$12,014,968	$480,800			$12,014,968	$836,600		$0	$0		$3,720,600
1	CC	86468 42	ARAUJO LUIS	X																		230301	30	$880,000	$128,000	EPS005	30	$800,000	$32,000	CCF15	30	$800,000	$32,000	14-23	30	$800,000	$55,700	30	$0	$0	SI	$247,700
2	CC	72255113	BERRIO GERMAN	X																		25-14	30	$960,000	$153,600	EPS010	30	$960,000	$38,400	CCF15	30	$960,000	$38,400	14-23	30	$960,000	$66,900	30	$0	$0	SI	$297,300
3	CC	1065733902	DIAZ GENRRY	X																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF15	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$0	$0	SI	$242,000
4	CC	1065479751	DIAZ JAIS	X																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$31,300	CCF15	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$0	$0	SI	$242,000
5	CC	84032380	FLOREZ ALFREDIS	X																		230301	30	$880,000	$140,800	EPS037	30	$880,000	$35,200	CCF15	30	$880,000	$35,200	14-23	30	$880,000	$61,300	30	$0	$0	SI	$272,500
6	CC	71626152	MARTINEZ EDGAR																			230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS037	30	$1,750,000	$70,000	CCF15	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0	SI	$541,800
7	CC	77152470	MARTINEZ RAUL	X																		25-14	30	$781,242	$125,000	EPS018	30	$781,242	$31,300	CCF15	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$0	$0	SI	$242,000
8	CC	52006197	MORENO ROSA																			230301	30	$2,900,000	$464,000	MIN001	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0	SI	$897,900
9	CC	1143329267	OSORIO CARLOS	X																		230301	30	$800,000	$128,000	EPS005	30	$800,008	$32,000	CCF15	30	$800,000	$32,000	14-23	30	$800,000	$55,700	30	$0	$0	SI	$247,700
10	CC	12599689	REYES ELKIN	X																		230301	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF15	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$781,242	$54,400	30	$0	$0	SI	$242,000
11	CC	1143624584	SAAVEDRA JOHANA																			230301	30	$800,000	$120,000	EPS016	30	$800,000	$32,000	CCF15	30	$800,000	$32,000	14-23	30	$800,000	$55,700	30	$0	$0	SI	$247,700
Total		**Afiliados(11)**																						$12,014,968	$1,922,400			$12,014,968	$480,800			$12,014,968	$480,800			$12,014,968	$836,600		$0	$0		$3,720,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143326826		BARRIOS CASTILLO HERNAN JULIO	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACESAR	cll 13c N16 65	VALLEDUPAR-CESAR	5722376	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	367144269	8483904884	E	2018/09/07	2018/09/07	BANCOLOMBIA	0	$3,720,600

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,922,400	$0	$0	$1,922,400
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	2	$278,600	$0	$0	$278,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,179,800	$0	$0	$1,179,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$464,000	$0	$0	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$836,600	$0	$0	$836,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$836,600	$0	$0	$836,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$480,800	$0	$0	$480,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$480,800	$0	$0	$480,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				11	$480,800	$0	$0	$480,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$31,300	$0	$0	$31,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$38,400	$0	$0	$38,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$31,300	$0	$0	$31,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$116,000	$0	$0	$116,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$105,200	$0	$0	$105,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$32,000	$0	$0	$32,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$95,300	$0	$0	$95,300

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA® Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14404309441

(415)7707212489984(8020) 000001440430944 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 2 6 5 2 6	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 1 4 3 3 2 6 5 2 6	2 0 0 7 0 1 2 2

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARRIOS	CASTILLO	HERNAN	JULIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CR 17 9 A 73 BRR SAN JOAQUIN

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
hernanbarriosc@gmail.com		3 2 1 4 2 0 1 2 2 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 9 0 6 1 2	7 1 1 0	2 0 1 2 0 1 0 1	2 5 9 9	4 2 2 0	8 3 3 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	1	1	2	2		7	9																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales a
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2 0 1 7 0 2 1 4

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: BRITO AGUILAR AMERICA TERESA
985. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 16-02-2017 09:11:17AM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200178416

CONTRATO:

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	**FECHA DE RECIBO**	28.09.2018
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200178416, contrato interno de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200178416	00010	1001125197	INTERVENTORIA EDIFIO EMAVI				35.958.811,78
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	35.958.811,78

OBSERVACIONES

CTO 052-00-Z-COFAC-DIFRA-2018 INTERVENTORIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO EMAVI FACTURA 009 HERNAN JULIO BARRIOS POR $35.958.811.78

FIRMAS



T2. DAVID GAMBA BUITRAGO
SUBDIRECTOR MEDIOS ELECTRONICOS
