1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [X]	INTERVENTORÍA [ ]
Informe Número: ___4_____	Periodo comprendido entre el 1 de abril de 2023 hasta el 30 de abril de 2023

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4152.010.26.1.405.2022	
Nombre Completo del Contratista: SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS	
Documento de identificación del contratista: 900.564.496-4	
Nombre (s) del interventor (es): CONSORCIO INTERVIAS CD	
Organismo: Secretaria de Movilidad de Cali	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 23.60%	Obra Física Ejecutada Acumulada 68.27%
Objeto del contrato: “REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS DE LA CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924”.	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
21 de octubre de 2022	30 de junio de 2023

Modificación del contrato:

MODIFICACIÓN No. 1 Suscrita el 15 de diciembre de 2022 por la cual se acuerda modificar la cláusula Octava, y el numeral 6) del Numeral 10.7 de la cláusula Decima del complemento del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 (ver anexo contrato SECOP II)

MODIFICACIÓN No. 2 Suscrita el 27 de diciembre de 2022 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 21 de febrero de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

MODIFICACIÓN No. 3 Suscrita el 21 de febrero de 2023 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 31 de mayo de 2023 (ver anexo contrato SECOP II) y se acuerda incorporar nueve (9) ítems no previstos.

MODIFICACIÓN No. 4 Suscrita el 31 de mayo de 2023 por la cual se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 30 de junio de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Suspensión:
N/A

Reanudación:
N/A

Cesión:
N/A

Terminación anticipada:
N/A

Acta de recibo final de obra:
N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato:
Tres mil diecinueve millones setenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte. ($3.019.072.646).

Adición:
N/A

Prórroga:

Mediante MODIFICACIÓN No. 2 Suscrita el 27 de diciembre de 2022 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 21 de febrero de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Mediante MODIFICACIÓN No. 3 Suscrita el 21 de febrero de 2023 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 31 de mayo de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Mediante MODIFICACIÓN No. 4 Suscrita el 31 de mayo de 2023 se acuerda prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4152.010.26.1.405.2022 hasta el 30 de junio de 2023 (ver anexo contrato SECOP II)

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$3.019.072.646	$712.353.578	$ 1.348.819.740	$ 957.899.328

PERSONA JURIDICA: SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.564.496-4
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 23 de mayo de 2023
Firmada por MONICA AVENDAÑO FRANCO identificada con CC. 67.004.218 y tarjeta profesional No 97195-T de la junta central de contadores, quien actúa como Revisor Fiscal de SOLUTRAFFIC INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.564.496-4

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

- El contratista cumplió con la presencia del equipo profesional de acuerdo a los requerimientos del anexo técnico.
- El contratista presentó su plan de trabajo el cual ya se encuentra aprobado por interventoría.
- El contratista realizó las solicitudes de intervención ante las entidades correspondientes y las cuales ya se han recibido y está pendiente el trámite ante el DAGMA.
- El contratista presentó las pólizas actualizadas y estas se encuentran vigentes a la fecha.
- El contratista acató el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades programadas.
- El contratista ejecutó las actividades de acuerdo con lo estipulado en el anexo técnico.
- El contratista designó el personal competente para interacción con la interventoría y supervisión.
- El contratista levanto registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al interventor.
- Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo.
- El contratista cumplió con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato.
- El contratista cumplió las normas del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de la obra.
- El contratista adoptó las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
- El contratista asistió a las reuniones programadas por la interventoría del contrato.
- El contratista levantó la bitácora de obra, de acuerdo con los términos requeridos.

- El contratista presentó la documentación correspondiente para manejo de RCDs y cumplió con los requerimientos del mismo.
- El contratista cumplió con normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.
- El contratista dotó a los trabajadores con el vestuario y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL requerido.
- El contratista presentó los informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro fotográfico.
- El contratista informó por escrito a la interventoría de los evento y circunstancias presentadas.
- El contratista elaboró el acta de obra la cual fue verificada por interventoría
- El contratista cumplió de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de marzo de 2019, donde se compromete con la vinculación de Mujeres Cabeza de Familia en el 1% del personal a vincular.
- Las intersecciones intervenidas en el mes de abril son: CL 10 KR 66 – CL. 10 KR 39 – CLS. 23 Y 25 KR 23 – TV. 25 KR 23 - -TV 29 KR 23 – CL 33C KR 23 – CL 34 KR 23 – CL 44 KR 23 – CL 52 KR 23 – CLS 25 Y 26 KR 10 - CLS 25 Y 26 KR 8 – CL 25 KR 5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	
1	Localización y replanteo por intersección. Incluye visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro fotográfico y acta de levantamiento técnico donde incluya el estado en que se encuentra el espacio público que delimita la intersección, mediante formato suministrado por la entidad contratante.	UN	0.0	13	
5	Inspección y sondeo de ductería para D<=4". Incluye hilado y plano de levantamiento de la canalización existente.	ml	0.0	1357.52	
9	Retiro de base semafórica en concreto, existente. Incluye: excavación perimetral y corte de tubería para liberar el elemento, izaje, carque, retiro y disposición final a botadero autorizado.	un	4	12	

15	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	95.65	195.88	
16	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	0.0	18.6	
17	Canalización mediante excavación a cielo abierto 2 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc) , excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	60.6	243.10	

20	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=2" DB en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC DB de 2" de diámetro, relleno con material de sitio seleccionado compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	0.0	63.40	
21	Canalización mediante excavación a cielo abierto con tubería PVC D=3" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 3" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	0.0	21.36	
23	Canalización mediante excavación a cielo abierto 2 tubos PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona blanda. Incluye localización, replanteo, excavación manual, lecho o cama de arena, tubo en PVC de doble pared (TDP) de 4" de diámetro, relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado (P.M. 90%), trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	ml	19.40	19.40	
28	Canalización mediante equipo de perforación neumática (topo) con suministro e instalación de tubería PVC D=4" de doble pared (TDP) en zona dura. Incluye localización, replanteo, cajas de lanzado con las siguientes actividades: corte y demolición de acabado (anden, adoquin o loseta en concreto, adoquín en arcilla, concreto estampado, etc), excavación manual, relleno con material importado compactado (P.M. 95%), recuperación de andén, trasiego,	ml	1113.71	2709.66	

	acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.				
32	Suministro e instalación tubo 2" galvanizado para paso en puentes vehiculares y peatonales. Incluye elementos de sujeción a la estructura.	ml	0.0	29	
37	Construcción de base (80cm x 80cm x 80cm) para poste semafórico. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importantado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	un	19	63	
38	Construcción de base (70cm x 70cm x 153cm) para poste semafórico con ménsula de 8.5m. Incluye corte y demolición de andén, excavación manual, mejoramiento de subrasante implementando material importantado compactado P.M. 90% h=10cm, armadura especificada, concreto f'c: 3000 Psi, recuperación de andén, trasiego, acopio, cargue, retiro y disposición final a botadero autorizado de material sobrante.	Ud	0	1	
49	Suministro e instalación de tubería para acometida eléctrica o de telecomunicaciones. Incluye: curva de 2", Tubo conduict 2" hasta 1m, Tubo galvanizado 2" x 3ml, capacete galvanizado, sujeción a poste con zunchos metálicos de 5/8" (3 puntos mínimo), localización, replanteo, corte y demolición de acabado, excavación, conexión a caja hasta 1m, recuperación de anden f'c:3000 psi, trasiego y retiro de material sobrante en lugar autorizado.	Un	1	3	

56	Construcción de anden en concreto e= 10 cms. Incluye concreto f'c: 3000 Psi con sus respectivas juntas de dilatación y sellador elástico.	m2	51.34	51.34	
57	Construcción de anden en concreto e= 15cm para accesos vehiculares. Incluye concreto f'c: 3000, malla electrosoldada 15 x 15 x 6mm, juntas de dilatación y sellador elástico.	M2	15.60	15.60	
81	Realizar socialización puerta a puerta en el área de influencia directa en un rango de 300 metros en las intersecciones a intervenir.	Ud	2	14	
82	Establecer un punto de atención a la ciudadanía, y habilitar un canal de comunicación para el trámite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos establecidos. El punto de atención, así como el canal de comunicación deben estar disponibles durante la totalidad de ejecución del proyecto.	Ud	0.12	0.875	
NP1	CAJA SENCILLA DE CONCRETO	Ud	14	87	
NP2	CAJA DOBLE DE CONCRETO	Ud	3	5	
NP3	DIRIGIDA 4" x 2 TUB PEAD	ml	388.85	1201.07	
NP5	PEDESTAL CONROLADOR	Ud	3	5	

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

			
Foto No. 1	Apiques de lanzamiento de topo	Foto No. 2	Descripción: Demolición de anden
			
Foto No. 3	Perforación neumática.	Foto No. 4	Descripción: Canalización con perforación

			
Foto 5-	Caja doble y pedestal	Foto 6	Construcción de anclajes
			
Foto 7	Canalización a cielo abierto zona dura	Foto 8	Perforación dirigida

			
Foto 9	Halado de tubería PHD	Foto 10	Anden 10

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Forman parte integral del presente informe de supervisión el acta parcial de obra No 4, las actas parciales por intersección y la bitácora de obra.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA DE OBRA CONCENTRARSE EN ENTREGAR LAS INTER-SECCIONES INTERVENIDAS.

7. FIRMAS RESPONSABLES

_____

Nombre y firma del interventor
María Teresa Varona Arcila
Directora de Interventoría
CONSORCIO INTERVIAS CD

Fecha de suscripción del informe: 13 de junio de 2023

Fecha Validadición Dian: diciembre 30, 1899
Fecha y Hora de Impresión: junio 13, 2023,08:39 pm

SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S
NIT. 900564496-4
CARRERA 19A No. 15A -41
Tel. 4893017
director@solutraffic.com
CALI - COLOMBIA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 2610 ICA 203 - 5 (7.7 x 1000)
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- NI RETENEDORES DE IVA AL RESPONSABLE IVA
- NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA E ICA

O. Compra: ACTA 4 CTO.405-2022
Remision:

Señores: **DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SEC.MOV**
NIT. 890399011
Dirección: CL 56 3 46
Telefono: 4184215
Ciudad: CALI-COLOMBIA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. **FE - 268**

FECHA FACTURA: junio 13, 2023
FECHA VENCIMIENTO: julio 13, 2023

Forma de pago: **CREDITO 30 DIAS** **Medios de Pago:** **Crédito**

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DCTO	TOTAL
11.01.01.1182		CONTRATO 4152.01.26.1.405-2022 / ACTA 04 O.CIVIL IMPLEMENTA SISTE.SEMAFORIZACIÓ	1.00	530,419,641.00	0	530,419,641
16.01.01.0010		ADMINISTRACION 29.3%	1.00	155,412,955.00	0	155,412,955
16.01.01.0012		UTILIDAD 5%	1.00	26,520,982.00	0	26,520,982

ACTA No.4

CONTRATO 4152.010.26.1.405.2022

REALIZAR OBRAS CIVILES, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI),
MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS
DE LA CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26002924

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra decambio segun Art. 774 del Codigo de Comercio y podra causar intereses de mora al maximo legal vigente, sin perjuicio de la accion legal por incumplimiento.

VALOR BRUTO:	**712,353,578**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**712,353,578**
I.V.A 19%:	**0**
RETE FUENTE DIAN:	**0**
RETEIVA:	**0**
RETEICA:	**0**
NETO A PAGAR:	**712,353,578**

Firma Autorizada *Recibido*

RESOLUCION DIAN 18764019915606 HABILITA PREFIJO FE 151 A FE 2000 22/10/2021 VIGENCIA 12 MESES

Cufe:

Documento generado por Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 485 2040 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.

SOLUTRAFFIC
Soluciones para la movilidad
NIT: 900.564.496-4

CONTRATO No.4152.010.26.1.405.2022

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

MONICA AVENDAÑO FRANCO identificada con la cedula No.67.004.218 de Cali, y con tarjeta profesional No.97195-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. con NIT.900.564.496-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali - Valle, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados*,* por la compañía durante el término de la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los 23 días del mes de mayo de 2023.



MONICA AVENDAÑO FRANCO
CC.67.004.218 de Cali
M.P. 97195-T
Revisora Fiscal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 67.004.218


AVENDAÑO FRANCO

APELLIDOS

MONICA

NOMBRES

FIRMA

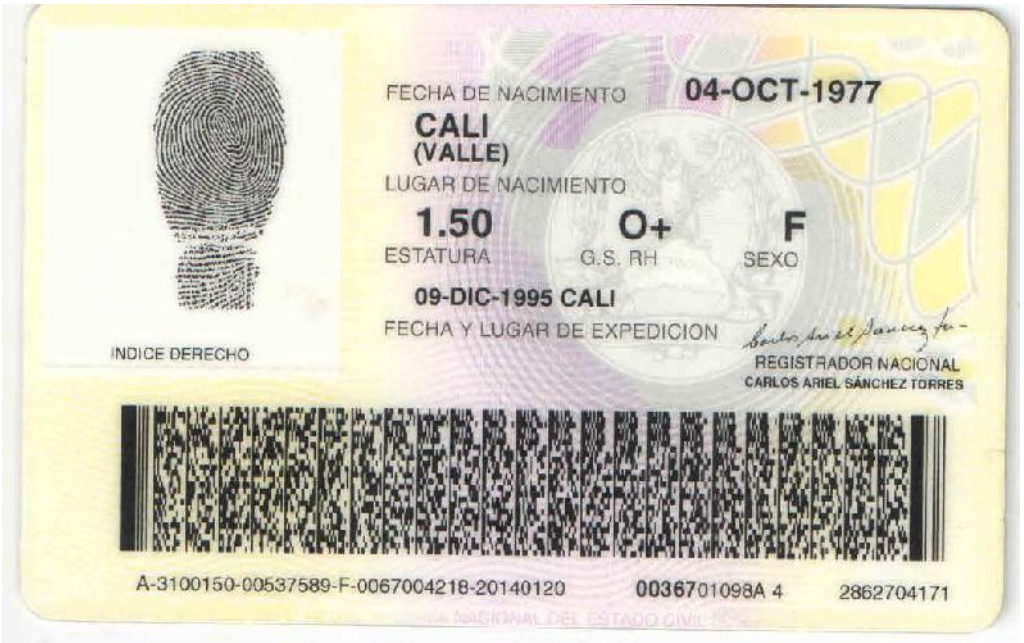

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1977

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

09-DIC-1995 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00537589-F-0067004218-20140120 0036701098A 4 2862704171


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
97195-T
MONICA
AVENDAÑO FRANCO
C.C. 67004218
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE


016691
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9278480806E0806EAB4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA AVENDAÑO FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 67004218 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 97195-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900564496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUTRAFIC INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 A # 15 A 41	TELÉFONO:	4893017
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de componentes y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881122261**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	mayo
	AÑO:	2023		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2071284013

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA				
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 736.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 4.497.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 517.300
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 632.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.030.700
SUBTOTAL:			16	**$ 8.414.600**

SALUD

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
ADMINISTRADORA				
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	2	$ 444.000
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	2	$ 193.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 342.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 76.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 491.100
901021565	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	$ 90.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 849.000
SUBTOTAL:			19	**$ 2.487.100**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
ADMINISTRADORA				
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 46.400
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	17	$ 2.295.700
SUBTOTAL:			18	**$ 2.342.100**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
ADMINISTRADORA				
800226175	14-25	14-25-COLMENA	18	$ 2.194.300
SUBTOTAL:			18	**$ 2.194.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 15.438.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900564496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUTRAFIC INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 A # 15 A 41	TELÉFONO:	4893017
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de componentes y tableros electrónico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7881122261**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2071284013

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 632.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632.800	$ 0	$ 632.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.000	$ 0	$ 736.000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.030.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.030.700	$ 0	$ 2.030.700
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 517.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.300	$ 0	$ 517.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 4.342.800	$ 0	$ 0	$ 77.500	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 4.497.800	$ 0	$ 4.497.800
SUBTOTALES:										**$ 8.414.600**	**$ 0**	**$ 8.414.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 491.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.100	$ 0	$ 0	$ 491.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 76.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 342.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.700	$ 0	$ 0	$ 342.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 849.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.000	$ 0	$ 0	$ 849.000
EPS018	EPS018-S.O.S.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 444.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000	$ 0	$ 0	$ 444.000
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 90.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.000	$ 0	$ 0	$ 193.000
SUBTOTALES:													**$ 2.487.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.487.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.194.300	$ 2.194.300	$ 0	$ 0	$ 2.194.300
SUBTOTALES:									**$ 2.194.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.194.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	17	$ 2.295.700	$ 0	$ 2.295.700
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:			**$ 2.342.100**	**$ 0**	**$ 2.342.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005978296	LOPEZ VIVAS JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.356.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.686.525	$ 269.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.686.525	$ 67.500	$ 0	$ 67.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.686.525		$ 117.400	30	$ 1.686.525	CCF57-COMFANDI	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010006302	LOPEZ OSORIO CRISTHIAN JAVIER	DEPEND		$ 4.520.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.520.000	$ 723.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 723.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 4.520.000	$ 180.800	$ 0	$ 180.800	14-25-COLMENA	30	$ 4.520.000		$ 23.600	30	$ 4.520.000	CCF57-COMFANDI	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1020837485	DUARTE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1088008385	BUITRAGO CORREA XIOMARA	DEPEND		$ 1.921.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.921.000	$ 307.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.921.000	$ 76.900	$ 0	$ 76.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.921.000		$ 10.100	30	$ 1.921.000	CCF57-COMFANDI	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1107078044	LIBREROS RIVERA ANGELA MARIA	DEPEND		$ 2.090.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.090.500	$ 334.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 334.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.090.500	$ 83.700	$ 0	$ 83.700	14-25-COLMENA	30	$ 2.090.500		$ 11.000	30	$ 2.090.500	CCF57-COMFANDI	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1107835863	TORRES ORDOÑEZ DAVID	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 1.160.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1130667229	VASQUEZ PASQUEL EDWARD NICOLE	DEPEND		$ 1.356.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.356.000	$ 217.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.356.000	$ 54.300	$ 0	$ 54.300	14-25-COLMENA	30	$ 1.356.000		$ 94.400	30	$ 1.356.000	CCF57-COMFANDI	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900564496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUTRAFIC INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 A # 15 A 41	TELÉFONO:	4893017
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de componentes y tableros electrónico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881122261**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2071284013

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1143989917	ALVAREZ MATURANA ADRIAN FELIPE	DEPEND		$ 1.921.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.921.000	$ 307.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.921.000	$ 76.900	$ 0	$ 76.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.921.000		$ 133.800	30	$ 1.921.000	CCF57-COMFANDI	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1144026385	PATIÑO FRANCO ANA MARIA	DEPEND		$ 2.034.000	FIJO			SI												10-16					231001-COLFONDOS	7	$ 316.401	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 50.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	7	$ 316.401	$ 12.700	$ 0	$ 12.700	14-25-COLMENA	7	$ 316.401		$ 0	7	$ 316.401	CCF57-COMFANDI	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1144026385	PATIÑO FRANCO ANA MARIA	DEPEND		$ 2.034.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	23	$ 1.559.400	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	23	$ 1.559.400	$ 62.400	$ 0	$ 62.400	14-25-COLMENA	23	$ 1.559.400		$ 8.200	23	$ 1.559.400	CCF57-COMFANDI	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1144077510	SERNA OSORIO ANGIE LIZETH	DEPEND		$ 2.260.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.260.000	$ 361.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.600	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 2.260.000	$ 90.400	$ 0	$ 90.400	14-25-COLMENA	30	$ 2.260.000		$ 11.800	30	$ 2.260.000	CCF57-COMFANDI	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1144190459	MORIANO POLINDARA ANGIE TATIANA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.900.000		$ 10.000	30	$ 1.900.000	CCF57-COMFANDI	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 13890310	RUIZ QUINTERO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 9.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 9.000.000	$ 1.440.000	$ 45.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.530.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 360.000	14-25-COLMENA	30	$ 9.000.000		$ 626.400	30	$ 9.000.000	CCF57-COMFANDI	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 16658365	BARCO GUENGUE RUBICO ALONSO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 3.466.866	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS042 - COOSALUD	30	$ 3.466.866	$ 138.700	$ 0	$ 138.700	14-25-COLMENA	30	$ 3.466.866		$ 18.100	30	$ 3.466.866	CCF57-COMFANDI	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 31901407	BARCO GUENGUE GEMA LULI	DEPEND		$ 4.533.127	FIJO			SI												01-25					25-14 COLPENSIONES	25	$ 2.518.406	$ 403.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 403.000	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 2.518.406	$ 100.800	$ 0	$ 100.800	14-25-COLMENA	25	$ 2.518.406		$ 0	25	$ 2.518.406	CCF57-COMFANDI	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 31901407	BARCO GUENGUE GEMA LULI	DEPEND		$ 4.533.127	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	5	$ 755.522	$ 120.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 120.900	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 755.522	$ 30.300	$ 0	$ 30.300	14-25-COLMENA	5	$ 755.522		$ 4.000	5	$ 755.522	CCF57-COMFANDI	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 39690366	RUIZ QUINTERO MARTHA LUCIA	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 3.452.039	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.452.039	$ 138.100	$ 0	$ 138.100	14-25-COLMENA	30	$ 3.452.039		$ 18.100	30	$ 3.452.039	CCF57-COMFANDI	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 6199429	PATIÑO PARDO CARLOS AUGUSTO	DEPEND		$ 4.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.600.000	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 736.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 4.600.000	$ 184.000	$ 0	$ 184.000	14-25-COLMENA	30	$ 4.600.000		$ 320.200	30	$ 4.600.000	CCF57-COMFANDI	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 66768906	MARCILLO PATIÑO MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-25-COLMENA	30	$ 3.600.000		$ 156.600	30	$ 3.600.000	CCF57-COMFANDI	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 94400597	APONTE GUTIERREZ SIUL FERNANDO	DEPEND		$ 6.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.500.000	$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.105.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-25-COLMENA	30	$ 6.500.000		$ 452.400	30	$ 6.500.000	CCF57-COMFANDI	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 94526308	VELEZ BUITRAGO OCTAVIO ANDRES	DEPEND		$ 3.955.000	FIJO			SI																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 3.955.000	$ 632.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 632.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.955.000	$ 158.200	$ 0	$ 158.200	14-25-COLMENA	30	$ 3.955.000		$ 172.100	30	$ 3.955.000	CCF57-COMFANDI	$ 158.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.438.100**

Planilla Pagada
