No. GS 2023-0810 3-DIREAD-GRULO-29.25

Bogotá, 12 de junio 2023.

Coronel
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá (E)
Avenida Caracas No. 6-05
Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 10-2-10045-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde:	**01/05/2023**	**Hasta:**	**31/05/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto, a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2022-486121-MEBOG del 4 de octubre de 2022, el señor Brigadier General CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRÁN en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor del contrato 10-2-10045-22 al señor Mayor JUAN CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ Jefe Grupo Logístico de la Policía Metropolitana de Bogotá.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 7

    1. Mediante comunicación oficial GS-2022-552129-MEBOG de fecha 10/11/2022, se reportó el periodo comprendido entre el 01/10/2022 al 31/10/2022.
    2. Mediante comunicación oficial GS-2022-596939-MEBOG de fecha 07/12/2022, se reportó el periodo comprendido entre el 01/11/2022 al 30/11/2022.
    3. Mediante comunicación oficial GS-2023-006969-MEBOG de fecha 07/01/2023, se reportó el periodo comprendido entre el 01/12/2023 al 31/01/2023
    4. Mediante comunicación oficial GS-2023-060235-MEBOG de fecha 10/02/2023, se reportó el periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/01/2023
    5. Mediante comunicación oficial GS-2023-121562-MEBOG de fecha 08/03/2023, se reportó el periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023

6. Mediante comunicación oficial GS-2023-166511-MEBOG de fecha 08/04/2023, se reportó el periodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023
7. Mediante comunicación oficial GS-2023-225440-MEBOG de fecha 08/05/2023, se reportó el periodo comprendido entre el 01/04/2023 al 30/04/2023

Información del contrato

Contrato No.	**10-2-10045-22**
Objeto del Contrato	Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá
Contratista	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022
Representante legal	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES
Valor inicial del contrato	ONCE MIL SETENCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($11.790.784.983,64) M/CTE
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	ONCE MIL SETENCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($11.790.784.983,64) M/CTE
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso, será hasta el 20 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de inicio	30 de septiembre de 2022
Fecha de terminación	31 de mayo de 2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	No1 de fecha 20/12/2022 hasta el 20/02/2023 No2 de fecha 31/01/2012 hasta el 31/03/2023 No3 de fecha 31/03/2012 hasta el 31/05/2023
Prorrogas	3
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

1) Para el día 29/10/2022, el contrato 10-2-10045-22, el cual tiene por objeto " ***Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá***", se encuentra en la etapa de finalización de replanteo del edificio, en el cual se han verificado lo insumos y cantidades contratadas con la capacidad espacial de los diferentes áreas a dotar del proyecto, proceso en el cual se le han realizado una serie de mesas de trabajo con el insumo de los informes entregados a la supervisión del contrato de los hallazgos evidenciados en los diferentes niveles del proyecto, con el fin de definir alternativas de solución a los inconvenientes presentados.

2) En el proceso de replanteo desarrollado por el componente técnico de la empresa, evidenciaron inconsistencias arquitectónicas de acuerdo a la diferencia de medidas de la planimetría suministrada por la Secretaria de Convivencia, seguridad y Justicia a la Policía Metropolitana de Bogotá, a las dimensiones reales en sitio, por lo que al ser verificadas con las cantidades contratadas de los diferentes insumos no son ajustables a la capacidad espacial de las diferentes áreas por las dimensiones o por la obstrucción con elementos estructurales, como la existencia de puntos eléctricos instalados en puntos específicos proyectados para la ubicación como también los puestos de trabajo que presentan inconvenientes para su respectiva instalación y puesta en funcionamiento de la red de voz y datos; así mismo se evidencio que espacios específicos a dotar con muebles fijos, como closets, mubles de baños, cocinas en los que se encuentran suiches, toma corrientes, funcionamiento de ventanas e inexistencia de puntos de gas respectivamente para la correcta instalación del mobiliario.
3) De igual manera se está en el diseño de los puntos impacto en el desarrollo del edificio, como lo son la áreas destinadas para salas de juntas, salas de crisis, salas de capacitación, las áreas comunes de comedores, restaurantes, gimnasio, oratorio, y los diversos espacios de las zonas de estar ubicados en las circulaciones, con el fin de proporcionarte al edificio un diseño exclusivo y una gama de colores selecta que permita generar un ambiente agradable de acuerdo al uso proyectado de cada espacio.
4) De acuerdo a lo anterior, la empresa contratante tiene proyectado realizar solicitud de un modificatorio al contrato, en el cual se relacionan los diferentes ítems donde la representante legal evidencia la necesidad de modificarlos de acuerdo a las cantidades insuficientes o las dimensiones de algunos elementos unifuncionales a instalar en algunas áreas especificas del edificio.
5) Mediante acta No 428, se realiza mesa de trabajo precedida en las instalaciones del Nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la cual se socializa ante la señor Teniente LAURA MARIA CARVAJAL, quien es la estructuradora del estudio previo, supervisor del contrato y representante legal, los ITEMS no previstos en el estudio. (documento anexo)
6) El día 30/09/2022, se realiza acompañamiento técnico por parte de la supervisión del contrato mediante acta No 429. (documento anexo).
7) Mediante acta No 433 de fecha 05/10/2022, se realiza socialización sobre el comité de obra precedida en las instalaciones de la secretaria de Seguridad, Justicia y Convivencia, (documento anexo).
8) Mediante comunicación oficial No GS-2022-496066 de fecha 10/10/2022, se envían compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del día 05/10/2022, (documento anexo).
9) Mediante acta No 435 de fecha 11/10/2022, se realiza las coordinaciones en la adquisición en los insumos para la parroquia del Comando MEBOG, precedía por el Párroco CARLOS MANCERA, en las instalaciones de la casa cural de la MEBOG.
10) Mediante comunicación No. GS-2022-504947 de fecha 13/10/2022, se emite orden a la supervisión del contrato sobre información detallada de ejecución de mismo firmada por el señor Jefe Administrativo Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES; el cual mediante comunicación oficial No GS-2022-509693 la supervisión emite respuesta (documento anexo).
11) Mediante comunicación oficial No GS-2022-506508, se inicia cronograma enviado por el contratista en la proyección en la fabricación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo.
12) Mediante solicitud No GS-2022-034867 DIRAF, la cual solicita la programación de pagos del contrato en mención, la cual mediante comunicación oficial No GS-2022-536485 MEBOG, se emite respuesta (documento anexo).
13) Mediante acta No 440 de fecha 19/10/2022, se realiza mesa de trabajo sobre la ejecución de la etapa del replanteo (documento anexo).
14) Mediante acta No 436 de fecha 21/10/2022, se realiza la socialización de la visita del señor comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN en las instalaciones de la obra del nuevo comando de la MEBOG, con el fin de realizar definición de los puestos de trabajo del piso 3, (documento anexo).
15) Acta No 437 de fecha 25/10/2022, socialización del comité semanal que se realizo de manera virtual, (documento anexo).
16) Acta No. 459 de fecha 25/10/2022, la cual se realiza aclaración de las obligaciones contractuales dentro del contrato No. 10-2-10045-22, (documento anexo).

17) Mediante acta No 430 de fecha 26/10/2022 se realiza revista a las instalaciones de la empresa MADE MUEBLES con el fin de revisar las fichas técnicas, (documento adjunto).
18) Mediante comunicación oficial No GS-2022-529282, de fecha 27/10/2022, orden a la supervisión en presentar informe al señor Mayor ANGEL GIOVANNI LOPEZ OSTOS, el cual mediante comunicación oficial No GS-2022-536207 se envia informe de actividades relacionadas dentro del contrato en mención, (documento anexo).
19) Mediante acta No 431 de fecha 27/10/2022 se realiza visita a la estación de Policía Santa Fe, con el fin de realizar una proyección del diseño de Armerillo para armas, (documento anexo).
20) Mediante acta No 438 de fecha 28/10/2022, se realiza visita a las instalaciones de la Dirección Nacional de Escuelas con el fin de verificar los espacios de los Armerillo, (documento anexo).
21) Mediante acta No 432 de fecha 29/10/2022, se realiza la revisión del proceso del replanteo del piso 3 y 4 del edificio Nuevo Comando, (documento anexo).
22) Con fecha 31/10/2022, la empresa contratista envía mediante comunicación oficial envía el primer informar preliminar Piso 1, (DOCUMENTO ANEXO).
23) Mediante comunicación oficial No GS-2022-540495, se envía solicitud de avances de obra, dirigido al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO, Director de Bienes Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, con base en las observaciones arquitectónicas realizadas por la empresa contratista, (documento anexo); de la cual no se emito respuesta por parte de la Secretaria.
24) El 09 de noviembre de 2022, mediante correo electrónico AREAD-GRULO 526, se realizó la solicitud a la representante legal de la Unión Temporal Metropolitana 2022, de que sea informada la ubicación de los puntos eléctricos, sanitarios e hidráulicos para la peluquería y la radicación del plan de manejo de tránsito (PMT) para la descarga de elementos de dotación del Nuevo comando sobre el acceso en la carrera 60; la cual mediante comunicación No RC-UTM2022-002, emite respuesta a este requerimiento, (documento anexo).
25) Mediante acta No 439 de fecha 8 de noviembre, se realiza reunión con el comité de obra para tratar temas de novedades encontradas en el avance del replanteo realizado por la empresa contratista.
26) El 10 de noviembre de 2022, mediante comunicado oficial No.GS-2022-551503-MEBOG dirigido a Mi General comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se informa las novedades encontradas en el proceso de replanteo del proyecto como las inconsistencias arquitectónicas, realizado por la empresa contratista, (documento anexo).
27) Mediante comunicación oficial la empresa Unión Temporal Metropolitana 2022, con fecha 03/11/2022 realiza solicitud de prorroga al contrato NO 10-2-10045-22 por un periodo de 4 meses, dirigida al señor Ordenador del gasto Señor Brigadier General CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN y al señor Supervisor del contrato No 10-2-100475-22 Mayor JUAN CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ, (documento anexo) por lo anterior la supervisión realiza solicitud al Ordenador del gasto mediante Comunicación No GS-2022-552532 de fecha 10/11/2022; por lo cual siguiendo del señor Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES, Jefe Administrativo MEBOG, el cual indica solicitar a la empresa ampliar los fundamentos, realizar cronograma reduciendo tiempos de ejecución el cual se emite respuesta a la representante legal de la Unión Temporal Metropolitana 20022 mediante comunicación No GS-2022-577178 MEBOG. (documentos anexos).
28) El día 11 de noviembre de 2022, mediante comunicado oficial GS-2022-553332-MEBOG, se realizó la solicitud a la representante legal Unión Temporal Metropolitana 2022, con el fin de que emitan concepto del porcentaje de avance de fabricación de los pisos proyectados a entregar, pendiente respuesta por parte del contratista.
29) mediante comunicado oficial GS-2022-553471-MEBOG, dirigido a el Señor director de bienes de la secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, se realiza la solicitud de memorias de acabados y entrega de pisos, con base la solicitud de la Unión Temporal, con el fin de generar un cronograma detallado de la instalación de los diferentes tipologías de mobiliarias contratadas para dotación del proyecto de nuevo comando, (documento anexo): por lo anterior la secretaria no ha emitido respuesta a esta supervisión.

30) Mediante correo electrónico del día 12/11/2022, la Unión Temporal Metropolitana 2022, envía fichas técnicas que requieren cambio para modificatorio, (documento anexo).

31) Mediante comunicado oficial GS-2022-558440-MEBOG, se envía informe de avance del replanteo realizado por la empresa Unión Temporal Metropolitana 2022, (documento anexo), dirigido al Ordenador del Gasto Brigadier General CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de informar las diferentes inconsistencias verificadas cada uno de los ítems de las áreas a dotar.

32) Mediante el comunicado oficial GS-2022-558721-MEBOG, se envía informe de inconsistencias arquitectónicas de obra Nuevo Comando MEBOG, dirigido al Señor ANDRES ALVEIRO CORDOBA VALLEJO, director de Bienes Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo), los cuales a la fecha no han emitido respuesta oficial.

33) mediante el comunicado oficial GS-2022-559351-MEBOG, se solicita concepto de avance de obra por pisos, dirigido al Señor ANDRES ALVEIRO CORDOBA VALLEJO, Director de Bienes Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo), a la fecha no han emito respuesta oficial.

34) El día 15 de noviembre de 2022, mediante comunicado oficial GS-2022-559590-MEBOG, se realizó la solicitud a la representante legal Unión Temporal Metropolitana 2022, solicitud información dotación del nuevo comando anexando un cronograma detallado acerca de la fabricación e instalación del mobiliario, (documento anexo).

35) Mediante comunicación oficial No GS-2022-563424 MEBOG, se solicita a la representante legal de la empresa Unión Temporal Metropolitana 2022, la información completa de todos los ítems que presentaron cambios en cantidades, especificaciones técnicas, valores y demás, (documento anexo), a la fecha la empresa no ha entregado el consolidado total del ítem.

36) El 17 de noviembre de 2022, mediante comunicado oficial GS-2022-563212-MEBOG, se realizó la solicitud al Señor Intendente JAIME ANDRES LAZO CRUZ Responsable Activos Fijos En Servicio, de emitir de manera organizada y detallada las especificaciones técnicas de la Policía Nacional de algunos elementos para la adquisición de estos con el fin de remitir dicha información al contratista, seguido a esto mediante comunicado oficial GS-2022-563424-MEBOG, se realizó la solicitud a la representante legal Unión Temporal Metropolitana 2022, de la revisión de los ítems propuestos para el modificatorio teniendo en cuenta las diferentes mesas de trabajo desarrolladas en el proceso del replanteo y se debe anexar documento se deben los ítems por pisos, incluyendo la capilla y demás elementos correspondientes, de igual forma la Unión Temporal Metropolitana 2022 realizo un correo electrónico remitió respuesta de los comunicados oficiales GS-2022-563424-MEBOG y GS-2022-548990-MEBOG, (documento anexo).

De lo anterior el señor intendente emite respuesta al comunicado GS-2022-563212-MEBOG mediante comunicación oficial GS-2022-578321-MEBOG oando respuesta (documento anexo).

37) En atención a la orden mediante comunicación oficial No GS-2022-529282, el día 21/11/2022 se emite respuesta al señor Mayor ANGEL LOPEZ Jefe Administrativo (E), sobre el avance del contrato 10-2-10045-22 que tiene por objeto "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá" el cual se encuentra en la etapa de fabricación de los elementos contratados, mediante comunicado oficial GS-2022-569824-MEBOG se realizó la solicitud a la representante legal Unión Temporal Metropolitana 2022 del cronograma y plan de distribución dotación del nuevo comando, de igual forma la Unión Temporal Metropolitana 2022 realizo un correo electrónico remitió respuesta al comunicado oficial GS-2022-569824-MEBOG del cronograma de instalación de los pisos de acuerdo a las obligaciones contractuales, (documento anexo).

38) Mediante comunicado oficial GS-2022- 571861 -MEBOG, de fecha 22/11/2022, se realiza la solicitud a la representante legal Unión Temporal Metropolitana 2022, sobre el plan de manejo de tránsito del

proyectó del nuevo comando con el fin de emitir respuesta a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo).

39) Mediante solicitud No S-UTM2022-009, firmada por la señora GLORIA ELIZABETH OSORIO, representante legal de la empresa Unión Temporal Metropolitana 2022, solicita la modificación al contrato (FICHAS TECNICAS Y FORMA DE PAGO), de acuerdo a lo manifestado en la primera solicitud de prórroga, (documento anexo).

40) Mediante comunicado oficial GS-2022- 572522 -MEBOG, de fecha 22/11/2022, se realizó la solicitud a la representante legal Unión Temporal Metropolitana 2022, de la información acerca del avance de fabricación de los diferentes elementos contratados para la dotación del proyecto del Nuevo Comando, de igual forma la Unión Temporal Metropolitana 2022 realizo un correo electrónico con el fin de solicitar la modificación al contrato de acuerdo a las cotizaciones, con fichas técnicas contratadas y fichas técnicas ajustadas a la cotización, (documento anexo).

41) Mediante comunicado oficial GS-2022-563212-MEBOG, de fecha 23/11/2022, se realizó la solicitud al Señor Intendente CLOVIS EDUARDO ROMERO ROMERO responsable Activos Fijos En Servicio, de emitir de manera organizada y detallada las especificaciones técnicas de la Policía Nacional de algunos elementos para la adquisición de estos con el fin de remitir dicha información al contratista.

42) Mediante comunicado oficial GS-2022-573487-MEBOG, de fecha 23/11/2022, dirigido al señor ANDRES ALVEIRO CORDOBA VALLEJO Director de Bienes secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, se solicita emitir concepto y autorización de ingreso al contratista Unión Temporal Metropolitana 2022, con el fin de realizar la instalación del contenedor para el almacenamiento de los elementos de mobiliario, de igual forma las respuesta a los comunicados oficial anteriormente radicados así: No. GS-2022-540495-MEBOG, radicado ante la SDSCJ No.20225410664381 solicitud información avance de obra y el GS-2022-553471-MEBOG, radicado ante la SDSCJ No.20225410680891 solicitud memorias de acabados y la entrega de los pisos, los cuales a la fecha no se recibida respuesta.

43) el día 24/11/2022, la empresa contratista Unión Temporal Metropolitana 2022, envía mediante correo el segundo informe General de mobiliario del Nuevo Comando de la MEBOG, (documento anexo).

44) Mediante comunicado oficial GS-2022-576186-MEBOG, de fecha 24/11/2022, dirigido al señor ANDRES ALVEIRO CORDOBA VALLEJO Director de Bienes secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, se envía , el cronograma del proceso del mobiliario del proyecto del Nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cual fue emitido a la supervisión por el contratista del proceso, con el fin de ser evaluado de acuerdo a las fechas de entrega de los diferentes elementos contratados para la dotación del edificio, (documento anexo).

45) Mediante Comunicación oficial No GS-2022-576891 MEBOG, de fecha 24/11/2022, dirigido al señor ANDRES ALVEIRO CORDOBA VALLEJO, director de Bienes secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, se envía informe de inconsistencias arquitectónicas del Nuevo Comando, (documento anexo).

46) Mediante comunicación oficial No. GS-2022-579743, MEBOG, se realiza solicitud de información de acuerdo a las obligaciones contractuales dentro del contrato No 10-2-10045-22 dirigido a la empresa contratista Unión Temporal Metropolitana 2022, (documento anexo) la cual la empresa emite respuesta mediante el día 29/11/2022, (documento anexo).

47) Mediante Comunicación oficial No GS-2022-579668 MEBOG, de fecha 26/11/2022, dirigido al señor ANDRES ALVEIRO CORDOBA VALLEJO, director de Bienes secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, se envía informe de inconsistencias arquitectónicas del Nuevo Comando, (documento anexo).

48) Mediante comunicación S-UT2022-010, de fecha 25/11/2022, la empresa solicita prorroga al contrato en mención y solicitud de modificación la forma de pago.
El día 28/11/2022 mediante comunicado No C-UTM2022-005, realiza solicitud cambio de costado Aluminio Extruido 6065 T5.
El día 29/11/2022 mediante comunicación oficial No S-UTM2022-011, realiza solicitud de modificación al contrato especificaciones técnicas.

En atención a las comunicaciones mencionadas y como supervisor del contrato No 10-2-10045-22, se realiza solicitud modificatorio No 1, contrato mediante comunicación oficial No GS-2022-613756 MEBOG con fecha 17/12/2022, y comunicado oficial No GS-2022-616213 MEBOG de fecha 19/12/2022. (documento anexo); por lo anterior se realiza el modificatorio No 1 al contrato de compraventa No 10-2-10045-22, celebrado entre la policía metropolitana de Bogotá y la unión temporal metropolitana 2022 cuyo objeto es la "dotación del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá, con fecha 20/12/2022.

Actividades diciembre

49) Mediante comunicación oficial No GS-2022-595211 MEBOG de fecha 06/12/2022, se brinda respuesta a los diferentes requerimientos allegados a esta supervisión (documento anexo).
50) Mediante comunicación oficial No GS-2022-595302 MEBOG de fecha 06/12/2022 solicita adoptar el plan logístico entregado a la supervisión o informar alternativas de organización (documento anexo) a la espera de respuesta por parte del contratista.
51) Mediante comunicación oficial No GS-2022-595320 MEBOG de fecha 06/12/2022 se solicita cronograma detallado del proceso de fabricación e instalación de los elementos contratados (documento anexo) a la espera de respuesta por parte del contratista.
52) Mediante comunicación oficial No GS-2022-595339 MEBOG de fecha 06/12/2022 se solicita información de acuerdo a las obligaciones contractuales (documento anexo) a la espera de respuesta por parte del contratista.
53) Mediante comunicación oficial No GS-2022-597510 MEBOG de fecha 07/12/2022 se envía informe de actividades del contrato en mención al señor Jefe Administrativo Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES (documento anexo).
54) Mediante comunicación oficial No GS-2022-598323 MEBOG de fecha 08/12/2022 se solicita aceptación ítems no previstos dentro del objeto del contrato No 10-2-10045-22 (documento anexo) a la espera de respuesta por parte del contratista.
55) Mediante comunicación oficial No GS-2022-618416 MEBOG de fecha 20/12/2022 se brinda respuesta a los comunicados emitidos de solicitud de prorroga al contratista (documento anexo).

56) Mediante comunicación oficial No GS-2022-621090 MEBOG de fecha 22/12/2022 se solicita informe de porcentaje de avance de la instalación de los diferentes elementos contratados dentro del proyecto Nuevo Comando (documento anexo) a la espera de respuesta por parte del contratista.
57) Mediante comunicación oficial No GS-2022-625281 MEBOG de fecha 26/12/2022 se solicita ajuste de cronograma para realizar pagos parciales dentro del modificatorio No 1 del contrato No 10-2-10045-22 (documento anexo) el cual el contratista emite respuesta mediante comunicación oficial No RCUTM2022-009.
58) Mediante comunicación oficial No GS-2022-625911 MEBOG de fecha 26/12/2022 se solicita al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, emitir concepto de instalación de los archivadores en los diferentes niveles del proyecto, lo anterior debido a las necesidades de realizar perforaciones en las placas (documento anexo) a la espera de respuesta por parte del Director de Bienes de la SSCJ.
59) Mediante comunicación oficial No GS-2022-625937 MEBOG de fecha 26/12/2022 se ENVIA INFORME DEL ESTADO ACTAUL DEL CONTRATO No 10-2-10045-22 dirigido al señor Director Administrativo y Financiero (E), Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ (documento anexo)

60) Mediante comunicación oficial No GS-2022-626530 MEBOG de fecha 26/12/2022 se emite respuesta a la comunicación oficial No GS-2022-500292, INFOMANDO AL SEÑOR comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los aspectos relevantes a los contratos correspondientes de obra y dotación de mobiliaria de nuevo comando MEBOG (documento anexo).
61) Mediante comunicación oficial No GS-2022-626653 MEBOG de fecha 26/12/2022 se solicita al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se solicita la entrega de espacios que se encuentren en la etapa final (documento anexo) a la espera de respuesta por parte del Director de Bienes de la SSCJ.

ACTIVIDADES ENERO

62) Mediante comunicación oficial No GS-2023-002673 MEBOG, se envía respuesta a la empresa contratante a la solicitud No GE-2022-1115136 MEBOG, información ajuste al cronograma de entregas (documento anexo)
63) Mediante comunicación oficial No GS-2023-004687, , GS-2023-006267, GS-2023-0048557 MEBOG, se emite justificación reserva presupuestal contrato No 10-2-10045-22, dirigido al señor ordenador del gasto. (documento anexo)
64) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-006267 MEBOG, se envía respuesta a la a la solicitud informe de reserva presupuestal GS-2022-0433697 DIRAF, dirigido al señor Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ. (documento anexo)
65) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-006267 MEBOG y GS-2023-008116, se envía respuesta a la solicita por parte de la representante legal, en el cambio de materiales para unos item, (documento anexo)
66) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-008132 MEBOG, se envía solicitud a la empresa contratante sobre el plan estratégico de avance de instalación del contrato No 10-2-10045-22. (documento anexo)
67) Mediante comunicación oficial No 20234300085972 SSCJ, solicita información sobre la ausencia del personal del contrato de mobiliario, por lo cual se envía solicitud mediante radicado No GS-2023-02120 MEBOG, La cual mediante comunicación oficial se emite respuesta RCUTM2023-10, dando alcance al oficio en mención. (documento anexo)
68) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-001327 DIRAF, solicita la programación de instalación del contrato en mención, el cual mediante comunicación oficial, GS-2023-025241 MEBOG, se emite respuesta al requerimiento. (documento anexo)
69) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-025273 MEBOG, se envía requerimiento ante la secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, la continuidad en la etapa de instalación del mobiliario del nuevo comando de la MEBOG. (documento anexo)
70) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-024064 MEBOG, se solicita a la representante legal, la conclusión de temas relacionados con las obligaciones contractuales. (documento anexo)
71) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-024321 MEBOG, se solicita a la representante legal, soportes de cumplimiento a las obligaciones contractuales. (documento anexo)
72) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-026105 MEBOG, se envía solicitud a la representante lgal, envio de cronograma de entregas. (documento anexo)

ACTIVIDADES FEBRERO

73) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-057038 MEBOG, se envía informe de novedad a la representante legal, sobre novedades presentadas en el proceso de instalación. (documento anexo)
74) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-057048 MEBOG, se envía incumplimiento en la etapa de instalación del mobiliaria del nuevo comando. (documento anexo)
75) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-058455 MEBOG, se envía solicitud a la empresa modificatorio y solicitud envió de cronograma de entregas.(documento anexo)
76) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-057038 MEBOG, se envía informe de novedad a la representante legal, sobre novedades en el proceso de instalación. (documento anexo)

77) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-060424 MEBOG, se envía solicitud cronograma de entregas de fecha 08 de febrero del presente año a la empresa contratista. (documento anexo)
78) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-046975 MEBOG, se envía solicitud plan logístico ala empresa contratista. (documento anexo)
79) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-057038 MEBOG, se envía informe de novedad a la representante legal, sobre novedades en el proceso de instalación. (documento anexo)
80) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-062397 MEBOG, se solicita a la empresa el envío del cronograma de entregas actualizado. (documento anexo)
81) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-066063 MEBOG, se solicita información a la empresa contratista de solicitudes anteriores las cuales no han emitido respuesta. (documento anexo)
82) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-057038 MEBOG, se envía informe de novedad a la representante legal, sobre novedades en el proceso de instalación. (documento anexo)
83) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-079003 MEBOG, se solicita informe detallado en las demoras de la instalación del mobiliario del nuevo comando (documento anexo)
84) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-068162 MEBOG, se solicita a la representante legal cronograma de instalación con el fin de verificar porcentaje de ejecución del objeto del contrato. (documento anexo)
85) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-076676 MEBOG, se solicita a la representante legal ajuste en el cronograma de instalación del contrato. (documento anexo)
86) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-076690 MEBOG, se solicita a la representante legal resultado final de la planimetría realizada desde el inicio del contrato. (documento anexo)
87) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-073256 MEBOG, se emite orden al señor Mayor ANGEL GIOVANNI LOPEZ OSTOS, jefe del Grupo de Bienes Raíces MEBOG, firmada por el señor subcomandante de la MEBOG, el cual presentara propuesta de distribución de parqueaderos. (documento anexo)
88) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-072329 MEBOG, se emite orden a la señora Capitán JEHIMY PAOLA RUBIANO ARDILA jefe del Almacén de Armamento de la MEBOG, la cual debe realizar el traslado del material de guerra que tiene bajo custodia de este almacén y demás elementos (documento anexo)
89) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-074669 MEBOG, se emite orden al señor capitán DANIEL REMBERTO MARTINEZ VARGAS, jefe del Seguridad de Instalaciones MEBOG, firmada por el señor subcomandante de la MEBOG, el cual presentara propuesta de distribución de parqueaderos. (documento anexo)
90) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-081839 MEBOG, se emite respuesta al señor ordenador del gasto Brigadier General CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN comandante Policía Metropolitana de Bogotá, de la comunicación oficial No GS-2022-500292, informe del mes de febrero del nuevo comando (documento anexo)
91) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-067112 MEBOG, y radicado ante la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá No 20235410064821 se envía cronograma de instalación del nuevo comando MEBOG. (documento anexo)
92) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-079159 MEBOG, y radicado ante la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá No 20235410081351 en el cual se solicita concepto de instalación del mobiliario del nuevo comando MEBOG. (documento anexo)
93) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-083029 MEBOG, en el cual se solicita a la SSCJ nos sean expedido copia de las diferentes actas realizadas donde intervinieron el componente de mobiliario. (documento anexo).

Actividades Marzo

94) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-110396 MEBOG, se envía el informe de actividades de la semana 28/02/2023 a 06/03/2023 a mi CR DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES. (documento anexo)
95) Mediante comunicación oficial No GS-2023-112243 MEBOG de fecha 07/03/2023 se envía los compromisos del piso 5 al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)

96) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-113137 MEBOG, se envía documentos de la factura FE6 del contrato 10-2-10045-22 al señor capitán ALFONSO ALEJANDRO ESTEBAN OJEDA, jefe Grupo de Contratos. (documento anexo)
97) Mediante comunicación oficial No GS-2023-113436 MEBOG de fecha 08/03/2023 se envía el informe de la revista programada al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
98) Mediante comunicación oficial No GS-2023-114336 MEBOG de fecha 08/03/2023 se envía el informe de la revista programada al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
99) Mediante comunicación oficial No GS-2023-114345 MEBOG de fecha 08/03/2023 se envía el informe de la revista programada a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo).
100) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-116584 MEBOG, de fecha 10/03/2023 se envía avances del contrato 10-2-10045-22 a la señora Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA Jefe Area Infraestructura (DIREF). (documento anexo).
101) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-116636 MEBOG, de fecha 10/03/2023 se solicita la modificación a la orden de servicios de la revista programada a la empresa INDUSTRIAS ROMIL S.A.S, al señor ordenador del gasto Brigadier General CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN comandante Policía Metropolitana de Bogotá, (documento anexo)
102) Mediante comunicación oficial No GS-2023-119306 MEBOG de fecha 11/03/2023 se envía la solicitud entrega nivel del sótano al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
103) Mediante comunicación oficial No GS-2023-119322 MEBOG de fecha 11/03/2023 se envía el incumplimiento del cronograma a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo)
104) Mediante comunicación oficial No GS-2023-119544 MEBOG de fecha 11/03/2023 se informa la novedad en las instalaciones del nuevo comando al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
105) Mediante comunicación oficial No GS-2023-120136 MEBOG de fecha 12/03/2023 se solicita la asistencia de la entrega del cuarto piso en las instalaciones del nuevo comando al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO director de Bienes secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
106) Mediante comunicación oficial No GS-2023-119756 MEBOG de fecha 12/03/2023 se solicita la asistencia de la entrega del sexto piso en las instalaciones del nuevo comando al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
107) Mediante comunicación oficial No GS-2023-120394 MEBOG de fecha 12/03/2023 se solicita la petición perimetral en las instalaciones del nuevo comando al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
108) Mediante comunicación oficial No GS-2023-120403 MEBOG de fecha 12/03/2023 se solicita la subsanación de novedad de filtraciones en los pisos 6.5 y1 en las instalaciones del nuevo comando al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
109) Mediante comunicación oficial No GS-2023-120755 MEBOG de fecha 13/03/2023 se solicita el servicio de energía en las instalaciones del nuevo comando al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
110) Mediante comunicación oficial No GS-2023-121200 MEBOG de fecha 13/03/2023 se informa la inasistencia a la entrega del piso 6 y 7 en las instalaciones del nuevo comando al Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)
111) Mediante comunicación oficial No GS-2023-121226 MEBOG de fecha 13/03/2023 se solicita la entrega de áreas del primer piso en las instalaciones del nuevo comando al Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)

112) Mediante comunicación oficial No GS-2023-121245 MEBOG de fecha 13/03/2023 se solicita la entrega del nivel sotano en las instalaciones del nuevo comando al Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)

113) Mediante comunicación oficial No GS-2023-121366 MEBOG de fecha 13/03/2023 se solicita la entrega del piso 3 ya que se observa un retraso en el avance de ejecución a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo)

114) Mediante comunicación oficial No GS-2023-121539 MEBOG de fecha 13/03/2023 se solicita la entrega del piso 4 ya que se observa un retraso en la instalación de los archivadores a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo)

115) Mediante comunicación oficial No GS-2023-122782 MEBOG de fecha 14/03/2023 se remite información del piso 6 en el área de peluquerías en las instalaciones del nuevo comando al Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)

116) Mediante comunicación oficial No GS-2023-127974 MEBOG de fecha 16/03/2023 se solicita PAC extraordinario recurso de inversión contrato No 10-2-10045-22 a la señora ADRIANA PARRADO CARDENAS Jefe Grupo Financiero (documento anexo)

117) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-128533 MEBOG de fecha 16/03/2023 se envía documentos de la factura FE7 del contrato 10-2-10045-22 al señor capitán ALFONSO ALEJANDRO ESTEBAN OJEDA, jefe Grupo de Contratos. (documento anexo)

118) Mediante comunicación oficial No GS-2023-129761 MEBOG de fecha 17/03/2023 se envía el incumplimiento del cronograma de entrega piso 3 a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo)

119) Mediante comunicación oficial No GS-2023-120755 MEBOG de fecha 17/03/2023 se solicita el servicio de energía permanente en las instalaciones del nuevo comando Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)

120) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-130094 MEBOG, de fecha 17/03/2023 se envía avances del contrato 10-2-10045-22 a la señora Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA Jefe Area Infraestructura (DIRAF). (documento anexo).

121) Mediante comunicación oficial No GS-2023-130116 MEBOG de fecha 17/03/2023 se envía el informe remisorio de la solicitud de energía permanente en las instalaciones del nuevo comando a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo)

122) Mediante comunicación oficial No GS-2023-132217 MEBOG de fecha 18/03/2023 se envía el incumplimiento del cronograma de entrega piso 3 a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo)

123) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-135970 MEBOG, de fecha 21/03/2023 se envía el informe de actividades del contrato 10-2-10045-22 de la semana 14/03/2023 a 20/03/2023 a mi CR DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES. (documento anexo)

124) Mediante comunicación oficial No GS-2023-141086 MEBOG de fecha 24/03/2023 se solicita información de viabilidad para perforación del piso del sótano en las instalaciones del nuevo comando Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)

125) Mediante comunicación oficial No GS-2023-145637 MEBOG de fecha 26/03/2023 se envía el incumplimiento del cronograma de entrega piso 2 a la señora ELIZABETH OSOSRIO Representante Legal Unión Temporal Metropolitana 2022. (documento anexo)

126) Mediante comunicación oficial No GS-2023-148450 MEBOG de fecha 28/03/2023 se solicita la planimetría de instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo en las instalaciones del nuevo comando al señor ANDRES CORDOBA VALLEJO Director de Bienes Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (documento anexo)

127) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-151850 MEBOG, de fecha 28/03/2023 se remite comunicación oficial del avance detallado del contrato 10-2-10045-22 a mi CR DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES. (documento anexo)

ACTIVIDADES ABRIL

128) Mediante comunicación oficial No GS-2023-159872 MEBOG, de fecha 03/04/2023 se remite comunicación oficial a la señora representante solicitud información de instalación (documento anexo).

129) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-159600 MEBOG, de fecha 03/04/2023 se remite comunicación oficial al señor Director de Bienes de la SSCJ solicitud ingreso instalación de mobiliario en el proyecto nuevo comando MEBOG (documentó anexo)

130) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-159927 MEBOG de fecha 04/04/2023 se remite comunicación oficial al señor director de Bienes de la SSCJ Solicitud instalación de ARCHIVADORES en el proyecto nuevo comando MEBOG (documento anexo)

131) Mediante comunicación oficial No.GS 2023-159675 MEBOG, de fecha 03/04/2023, se remite comunicación oficial a la señora representante incumplimiento al cronograma en relación al contrato en mención. (documento anexo)

132) Mediante comunicación oficial No-GS-2023-160170 MEBOG de fecha 04/04/2023 se remite comunicación oficial al secretario de seguridad convivencia y justicia de la SSCJ respuesta comunicado "proyecto nuevo comando mebog No 20234300181842(documento anexo)

133) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-161432 MEBOG, de fecha 05/04/2023 se remite comunicación oficial' al señor director de bienes de la SSCJ reiterando inconsistencias arquitectónicas proyecto nuevo comando (documento anexo)

134) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-168906 MEBOG, de fecha 10/04/2023, se remite comunicación oficial a la señora representante reiterando incumplimiento al' contrato en mención (documento anexo)

135) Mediante comunicación No.GS-2023-168933 MEBOG, de fecha10/04/2023, se remite comunicación a la señora representante informe reiterando solicitud de novedades (documento anexo)

136) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-169143 MEBOG, de fecha 1004/2023, se remite comunicación oficial a la señora representante presunto incumplimiento al contrato en mención, (documento anexo)

137) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-176908 MEBOG de fecha 14/04/2023 se remite comunicación Mediante comunicación oficial al señor Director de Bienes de la SSCJ solicitud ingresó a pisos (documento se anexo)

138) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-171976 MEBOG de fecha 12/04/2023 remite comunicación oficial al señor comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la unión temporal metropolitana

139) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-176023 MEBOG de fecha 14/04/2023 remite comunicación oficial al señor oficial Mayor LUIS FERNANDO ROMERO ROA, impartiendo orden de infirmar las acciones adelantadas sistema tecnológico (documento anexo) el cual mediante comunicación oficial GS-2023-189925 MEBOG brinda respuesta (documento anexo)

140) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-182800 MEBOG, de fecha 18/04/2023 se remite comunicación oficial' al señor director de bienes de la SSCJ solicitud ingreso a pisos (documento anexo)

141) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-182528 MEBOG, de fecha 05/04/2023 se remite comunicación oficial' al señor director de bienes de la SSCJ reiterando inconsistencias arquitectónicas proyecto nuevo comando (documento anexo.

142) Mediante comunicación No.GS-2023-180191 MEBOG, de fecha 17/04/2023, se remite comunicación a la señora representante legal informando incumplimiento al contrato en mención (documento anexo).

143) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-185995 MEBOG, de fecha 19/04/2023 se remite comunicación oficial' al señor director de bienes de la SSCJ reiterando solicitud (documento anexo)

144) Mediante comunicación No.GS-2023-188046 MEBOG, de fecha 20/04/2023, se remite comunicación a la señora representante legal enviando recomendaciones de anclajes de archivos en sótano por barrera de vapor (documento anexo).

145) Mediante comunicación No.GS-2023-189101 MEBOG, de fecha 19/04/2023, se remite comunicación a la señora representante legal informando incumplimiento al contrato en mención (documento anexo).

146) Mediante comunicación No.GS-2023-198715 MEBOG, de fecha 26/04/2023, se remite comunicación al jefe de contratos para el pago de la 3 factura (documento anexo)

147) Mediante comunicación No.GS-2023-198715 MEBOG, de fecha 26/04/2023, se remite comunicación al jefe de contratos para el pago de la 3 factura (documento anexo)

ACTIVIDADES MAYO

148) Mediante comunicación oficial No.GS-2023-208038 MEBOG, de fecha 01/05/2023 se remite comunicación oficial' al señor director de bienes de la SSCJ solicitud nivel del sótano (documento anexo)

149) Mediante comunicación No.GS-2023-208105 MEBOG, de fecha 01/05/2023, se remite comunicación a la señora representante legal incumplimiento al cronograma contrato (documento anexo).

150) Mediante comunicación No.GS-2023-215953 MEBOG, de fecha 04/05/2023, se remite comunicación al señor Comandante de la MEBOG, solicitud modificatorio No 4 (documento anexo).

151) Mediante comunicación No.GS-2023-218710 MEBOG, de fecha 04/05/2023, se remite comunicación al señor Comandante de la MEBOG, informe de actividades nuevo comando (documento anexo).

152) Mediante comunicación No.GS-2023-218076 MEBOG, de fecha 05/05/2023, se remite informe de actividades de la semana del 26/04/2023 al 02/05/2023 (documento anexo).

153) Mediante comunicación No.GS-2023-225551 MEBOG, de fecha 09/05/2023, se remite comunicación al señor director de bienes de la SSCJ solicitud nivel del sótano (documento anexo).

154) Mediante comunicación No.GS-2023-227273 MEBOG, de fecha 10/05/2023, se remite comunicación al señor director de bienes de la SSCJ solicitud ingreso piso 6 y 2 (documento anexo).

155) Mediante comunicación No.GS-2023-218076 MEBOG, de fecha 05/05/2023, se remite informe de actividades de la semana del 03/05/2023 al 09/05/2023 (documento anexo).

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento al Comando de Policía MEBOG y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Constituir en debida forma y aportar a través de la plataforma SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022

Restituir a LA POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado		Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Para la facturación de los bienes contratados deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito", la cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado" y la Resolución número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la facturación electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de la factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Cumplir con el compromiso de anticorrupción manifestado que se encuentre dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el Formulario Compromiso Anticorrupción.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Cumplir con el objeto contractual, de acuerdo a la indicado en el anexo no. 1 de presente documento.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
El contratista deberá suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de inicio, una vez aprobada la Garantía Única por parte de la administración	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Con el fin de verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato, el contratista entregará a la supervisión en la segunda semana posterior a la firma del acta de inicio, informe y balance presupuestal, en el cual se relacione la verificación de las cantidades establecidas en el Anexo Presupuesto Oficial Dotación Nuevo Comando Policía Metropolitana de Bogotá	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
El contratista deberá entregar en la segunda semana posterior a la firma del acta de inicio la programación de instalación y entrega del mobiliario, en donde se priorizará la entrega de puestos de trabajo.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista en las semanas siete (7) y ocho (8) de ejecución del contrato, deberá iniciar la instalación del mobiliario del sótano, el piso 4 y el piso 5, teniendo en cuenta que son pisos priorizados para la instalación de redes de voz y datos, actividades que deben ser articuladas con el contratista de obra y la interventoría.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANADE BOGOTÁ establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que se le formule.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022

El contratista deberá presentar muestra de los elementos contemplados en el Anexo Presupuesto oficial Dotación Nuevo Comando Policía Metropolitana de Bogotá, para aprobación del supervisor designado por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, diez (10) días calendario después de la presentación del informe de visitas de verificación de cantidades, con el fin de ser aprobados para la producción en cantidades, el cual se deberá diligencia acta de aprobación.	SI	Mediante actas No 428,429,433,376,435, 440,437,459,430, 432, se deja socialización en cada visita de verificación realizada a la empresa y las instalaciones del nuevo comando
CATALOGACIÓN – EL CONTRATISTA: deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y las condiciones señaladas por el supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesario para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumpla las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Garantizará la calidad de los trabajos realizados.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista se compromete a la subsanación de las novedades que presenten los elementos instalados en un plazo no mayor a quince (15) días calendario	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá entregar al supervisor, de manera física y digital, un informe mensual del estado y avance del contrato, el cual debe incluir registro fotográfico, estado del contrato en los campos financiero, legal, administrativo, técnico y ambiental	SI	La empresa a la fecha a entregado dos informes de avance (documentos anexos)
El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución del contrato. El costo de los consumos correrá por cuenta del contratista.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
El contratista deberá diligenciar junto con contratista de obra: Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital, acta de inventario detallado a fin de definir el estado al momento de recibir el espacio y posteriormente el contratista de dotación elaborará acta de entrega para el recibo de las mismas al Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital. Estas deberán incluir filmaciones, registro fotográfico detallado de cada espacio tanto del interior como el exterior.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista de dotación recibirá por parte del contratista de obra el manual de uso de pisos, puertas, techos y muros e instalaciones técnicas, las cuales se encuentran ejecutadas y recibidas por la entidad contratante, de lo cual se dejará constancia mediante acta.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Revisar cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo como; uso de E.P.P. y uso de maquinaria y equipos adecuados para la tarea	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la

		obligación (documento anexo)
El residente SST (PROFESIONAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) de dotación, garantizará que el personal no circule por áreas no permitidas en el momento de ejecutar las labores y realizar acompañamiento constante del personal que se tenga a cargo.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá respetar señalización y demarcaciones, hacer siempre uso de senderos peatonales al interior y exterior del proyecto	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Si el contratista de dotación requiere ingresar vehículos a las instalaciones del proyecto Nuevo Comando MEBOG, deberá coordinar previamente con la Residente SST del Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra) el lugar donde pueden dejarse parqueados de manera provisional.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El uso de parqueaderos de vehículos, motocicletas o bicicletas debe ser solicitada al área de seguridad industrial del Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra), el uso será designado y autorizado exclusivamente por dicha área.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Respetar las señales de prevención e información tanto de salud y seguridad industrial como de preservación del medio ambiente.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
El contratista debe abstenerse de ingresar a cualquier oficina y/o los almacenes del contratista de obra si no cuentan con la respectiva autorización y con la presencia de alguien o de la misma persona que autorice el Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra).	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Está prohibido fumar dentro de las instalaciones del proyecto Nuevo Comando de MEBOG, solo se debe hacer afuera de los espacios mencionados.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Todo paquete que ingrese o retire cualquier Contratista de dotación será revisado por el personal de vigilancia del Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra).	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
El Contratista deberá permitir requisas en el momento que se determine por parte del personal de Seguridad del proyecto.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Deberá ser relacionado e inventariado y revisado en la portería del proyecto Nuevo Comando MEBOG, toda herramienta, equipo o maquinaria que ingrese al mismo; solo podrá retirarse la herramienta o equipo previamente autorizado por escrito por el representante del Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra), donde se está realizando el trabajo contratado. No se permitirá sacar elemento alguno sin cumplimiento de esta medida.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Todo daño que por su actividad se genere a las actividades ya realizadas por el Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra), en el proyecto MEBOG, tendrá un costo y un valor, que será asumido en su totalidad por el contratista de dotación, por cuanto la infraestructura esta entregada en su totalidad a la firma interventora CONNECTA.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
El contratista contará con un plan o procedimiento para responder ante posibles eventos que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades (derrames de líquidos, incendios, fugas de gases, accidentes, etc.) y definir la organización y recursos disponibles para su atención (brigadas, extintores, botiquín, camilla, kit para derrames), en caso de requerirse. El plan debe estar alineado a lo establecido por el Consorcio de	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022

Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra), el cual será entregado a la supervisión a los treinta (30) días de haberse firmado el acta de inicio.		
Instalar previamente al inicio de labores, un contenedor con el nombre de la empresa Contratista de dotación frente al mismo. El sitio de ubicación será designado por el Director de obra del Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra), según espacio disponible. Este contenedor se destinará para cambio de ropa de trabajadores, almacenamiento de herramientas y equipos portátiles, algunos insumos, batería de sanitaria y como uso de oficina en caso de requerirse.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones provisionales, así como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Para el consumo de alimentos se debe realizar solo en sitios autorizados por CSUDC, para lo cual el contratista de dotación deberá proveer los elementos básicos como son mesas, sillas, hornos y demás elementos necesarios, en ningún momento se permite el consumo en áreas de producción o donde se desarrolla la obra.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Es responsabilidad del contratista asegurar la separación, presentación y almacenamiento de los diferentes tipos de residuos que pueda generar antes, durante y después de prestado el bien o servicio, según los procedimientos establecidos por Consorcio de Seguridad Urbana de Distrito Capital (contratista de obra). Los retiros de estos residuos serán a cargo del contratista de dotación.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Adoptar las medidas necesarias que se han establecido desde el gobierno nacional, de acuerdo con las fases que se han construido para el manejo de la pandemia por COVID 19, y apropiar las medidas en el lugar de instalación, para reducir el impacto de la enfermedad, enfocadas a disminuir la velocidad de transmisión, cumplir con los requisitos de vacunación, y todas aquellas en el marco de la emergencia sanitaria, manteniendo las condiciones de prevención y autocuidado.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista se obliga a contar con el personal profesional y técnico mínimo para el normal desarrollo de la dotación de acuerdo con los siguientes tiempos y permanencias. **PERSONAL PROFESIONAL - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO – DOTACIÓN**	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)

DESCRIPCIÓN	% DEDICACIÓN	
	D	%
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O INGENIERO INDUSTRIAL)	1	50%
PROFESIONAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST	1	100%
SUPERVISOR No. 1 ARQUITECTO	1	100%
SUPERVISOR No. 2 ARQUITECTO	1	100%
INGENIERO ELECTRICISTA VOZ Y DATOS	1	50%
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y LOGÍSTICA	1	100%
INSTALADORES DE MOBILIARIO	5	100%

El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecución del contrato, tendrá que ser sustituido por otro que reúna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la propuesta presentada en la selección abreviada subasta inversa, previa aprobación de la supervisión y solicitud ante el Ordenador del gasto.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022
Cumplir con los parámetros establecidos en materia ambiental en la Resolución No. 00090 del 15/01/2018 "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*" y la demás normatividad legal ambiental vigente que contemple el Sistema de Gestión Ambiental del complejo del nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá garantizar durante la fabricación de los elementos a contratar, no se utilizaron materiales peligrosos que pudieran afectar la salud de las personas o contaminar el ambiente. Debe certificar qué proceso de fabricación se cumplió con la normatividad legal vigente en cuanto al manejo de desechos que pudieran generarse.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá garantizar su compromiso con el sistema de gestión ambiental fomentando buenas prácticas y cumpliendo con la normatividad aplicable para el manejo de residuos generados por la prestación de su servicio, sea en instalaciones policiales o instalaciones propias.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá identificar los impactos y aspectos ambientales, generados de la prestación de su servicio, disponiendo de manera oportuna de los controles que permitan disminuir los impactos ambientales generados por estos.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá garantizar qué los materiales de los empaques y embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclaje (en lo posible es superior al 50%) o provenir de una fuente sustentable (declaración del fabricante, especificaciones y fichas técnicas), de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos de acuerdo a los parámetros contemplados por la autoridad ambiental competente.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá garantizar los elementos a adquirir en relación al título 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 "*por el cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones*". Garantizando el manejo, tratamiento y destrucción y/o aprovechamiento de los mismos, con su respectivo certificado de disposición final cuando finalice su vida útil ante el gestor autorizado. Conforme la Resolución No.1652 / 2007. "*Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones*".	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las fichas técnicas de las sustancias químicas que empleará para la elaboración y color de textiles, con el fin de garantizar que no sean sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones.	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)

El Contratista debe asegurarse de cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional relacionada en el anexo No. 2. El contratista deberá cumplir con las obligaciones del fabricante de establecer un plan de gestión de devolución de productos pos consumo conforme Resolución No. 372 de 2009 "*por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos consumo de baterías usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones*" e incluir a la institución con el fin de dar el tratamiento adecuado a los RAEE que se generen por cumplimiento de la vida útil, según lo establece la NTC ISO 14001:2015 en el numeral "*3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final*".	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El contratista deberá presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva; (*Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras civiles, así como muebles comerciales e industriales)*, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del futuro contratista. Conforme la Ley 1333 de 21/07/2009, "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*".	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El Contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos que se adquieran cumplan como mínimo los valores de eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas de iluminación y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 "*Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones*".	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
El Contratista deberá garantizar la compra de muebles no proviene de las operaciones ilegales en el sector forestal tienen lugar cuando se extrae, transporta, elabora, compra o vende madera, infringiendo leyes nacionales *Pacto Intersectorial Por La Madera Legal En Colombia, según Proyecto Bosques FLEGT/Colombia (Convenio Carder-Union Europea) WWF y Fedemaderas y* Ministerio Del Medio Ambiente. "Estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres".	SI	La empresa mediante comunicación oficial No. RC-UTM2022-007 de fecha 29/11/2022, emite respuesta en referencia a la obligación (documento anexo)
Demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Se socializa mediante acta de inicio No 376 del 07/10/2022

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PISO 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL - SIJIN					
Unidad investigativa delitos contra la vida, DH y DIH, desaparecidos					
1	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	101	$2.780.777,86	$280.858.563,86

2	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	170	$434.295,00	$73.830.150,00
3	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
4	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
5	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	2	$7.015.311,90	$14.030.623,80

	SIJIN - Unidad investigativa delitos contra el patrimonio				
6	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	4	$8.406.986,10	$33.627.944,40
7	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	251	$2.780.777,86	$697.975.242,86
8	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	315	$434.295,00	$136.802.925,00

	SIJIN- Unidad de delitos contra la administración pública				
9	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	22	$2.780.777,86	$61.177.112,92
10	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	29,1	$434.295,00	$12.637.984,50
	SIJIN - Unidad de análisis de evidencia fílmica				
11	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	6	$2.780.777,86	$16.684.667,16
12	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	2,8	$434.295,00	$1.216.026,00

	SIJIN -Sala Línea Investigativa				
13	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
14	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$3.629.987,35	$3.629.987,35
15	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	11	$2.780.777,86	$30.588.556,46
16	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	11,8	$434.295,00	$5.037.822,00

	SIJIN - Unidad Investigativa de fiscalía				
17	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	148	$2.780.777,86	$411.555.123,28
18	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	185	$434.295,00	$80.344.575,00
19	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
20	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	4	$8.406.986,10	$33.627.944,40
21	CREDENZA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, 1,00 X 0,50 X 0,60H, FRENTES DE CAJONERAS EN AGLOMERADO ENCAPADAS EN FORMICA F8, TIENE SUPERFICIE ARRIBA EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN	2	$1.178.387,10	$2.356.774,20
	SIJIN - Gastos Reservados Jefatura				

22	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes. pasacables).	UN	6	$2.780.777,86	$16.684.667,16
23	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
24	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	3	$434.295,00	$1.302.885,00
25	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
26	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$1.644.530,40	$1.644.530,40
27	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
28	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS, INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10

SIJIN - Subjefatura					
29	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
30	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 5.90 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$5.330.108,01	$5.330.108,01
31	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 4.77 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$4.636.750,32	$4.636.750,32

32	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.00 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.197.387,87	$2.197.387,87
33	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	5	$533.700,30	$2.668.501,50
34	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	5	$523.187,59	$2.615.937,95
35	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
SIJIN - Bodega de Intendencia					
36	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$2.780.777,86	$5.561.555,72
37	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.92 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8(Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.265.137,45	$2.265.137,45
38	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.50 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.770.237,45	$1.770.237,45
39	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$533.700,30	$533.700,30
40	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59

41	ESTANTERÍA ENTREPAÑOS GRADUABLES Y TENDIDOS EN AGLOMERADO DE 19 MM. DE 2 X 1 MTS H= 2.40 MTS, EL ESTANTE DEBE ESTAR COMPUESTO DE TRES JUEGOS DE TENDIDOS, CAPACIDAD 1500 KLG POR NIVEL. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14, LOS MARCOS CON SISTEMA DE ENGANCHE TIPO GOTA, UNIONES DIAGONALES Y HORIZONTALES DEBIDAMENTE SOLDADAS, TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE. VIGAS ELABORADAS EN CALIBRE 14, CON CHAPETA DE TRES PINES, BATIENTE DE 2 CMS PARA EL TENDIDO Y TERMINADAS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE	UN	26	$2.802.278,72	$72.859.246,72
42	ESTIBAS PLASTICAS EN POS INDUSTRIAL Y POLIPROPILENO, PARA TRABAJO PESADO SUPERFICIE EN TABLETA TIPO MADERA PARA ALMACENAMIENTO MUNICIÓN GARMA, COLOR NEGRO, FONDO 1 MTR, ANCHO 1.20 MTR, ALTO 15 CMS, ENTRADAS DOS Y CUATRO, RESISTENCIA EN ESTÁTICA DESDE 3.000 KG A 5.000 KG, RESISTENCIA EN DINÁMICA DE 1,000 KG A 1,500 KG, RESISTENCIA AL IMPACTO, RIGIDEZ, FRÍO Y CALOR, ALMACENAMIENTO PISO, PISO Y RACK	UN	60	$265.177,27	$15.910.636,20
43	ESCALERA METALICA PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACION DE MERCANCIA EN BODEGAS COLOR NEGRO, ALTO 200 CM, ALUMINIO • PASAMANOS DE ALUMINIO. • PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES, ALUMINIO RANURADO. • ZAPATAS ANTIDESLIZANTES, ACERO GALVANIZADO. • BARANDAS EN ALUMINIO ALFAJOR. • PLATAFORMA EN ALUMINIO ALFAJOR. • PIES DE AMIGOS EN ACERO GALVANIZADO. • RUEDAS INDUSTRIALES. • CAPACIDAD DE CARGA, MINIMO 150 KG."	UN	3	$1.843.341,00	$5.530.023,00
44	ESTIBADOR HIDRÁULICO PARA TRANSPORTE DE INSUMOS, CAPACIDAD DE CARGA 1500 KG, ESTIBADOR MANUAL CON 01 ESTIBA PLÁSTICA PARA CARGAS LARGAS DENTRO DE PASILLOS ANGOSTOS, OPERACIÓN DENTRO DE CAMIONES, ENTRE OTRAS. INCLUYE MANIJA DE DIRECCIÓN ERGONÓMICA Y ESTRUCTURA ROBUSTA Y DURABLE, CON BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA ESPECIFICACIÓN QUE ASEGURA LARGA VIDA ÚTIL Y BAJOS COSTOS DE MANTENIMIENTO. CUENTA CON UN JUEGO DE RUEDAS DE CARGA ADICIONALES.	UN	4	$5.446.884,46	$21.787.537,84
SIJIN – Control Armerillo					
45	MUEBLE ARMERILLO DE 1.88 X 0,63 MTS H = 2,25 MTS. COSTADOS, DIVISIONES Y TAPAS EN MADERA CEDRO MACIZA DE e = 2,00 cm. LAS PUERTAS EN MADERA CEDRO CON BISAGRAS DE 3 X 1/2 COBRIZADA, AGARRADERA EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURIA DE SEGURIDAD. PINTURA GENERAL (SELLADO, TINTILLA Y LACA).	UN	10	$6.808.605,58	$68.086.055,80
46	ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO CHALECOS BALISTICOS, FONDO 600 MM, LONGITUD 1,220 MM, ALTURA 1,760 MM, PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA METÁLICA CON TERMINADOS EN SOLDADURA MIG UNA (1) BASE METÁLICA UNA (1) SOPORTE METÁLICO CUATRO (4) SEPARADORES Y CLASIFICADORES (SEGÚN ALTURA DEL CHALECO) CAPACIDAD DE CARGA 270 KG PARA ALMACENAR, EXPONER Y TRASLADAR MERCANCÍAS CUATRO (4) RUEDAS ANTIHUELLAS EN GOMA TERMOPLÁSTICA DE 125 MM ORIENTABLES, CON FRENO.	UN	2	$2.723.442,23	$5.446.884,46
47	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	3	$2.780.777,86	$8.342.333,58
SIJIN - Habitación Armerillo					
48	CAMA SENCILLA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,00 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$1.703.642,78	$1.703.642,78
49	COLCHON JACQUART SENCILLO ACOLCHADO 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.390.388,93	$1.390.388,93

50	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$136.009,30	$136.009,30
51	PROTECTOR AJUSTABLE SENCILLO PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$86.902,43	$86.902,43
52	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
53	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
SIJIN - Almacenamiento protección balística					
54	ESTANTES PARA ALMACENAMIENTO CHALECOS BALÍSTICOS, FONDO 600 MM, LONGITUD 1.220 MM, ALTURA 1,760 MM, PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA METÁLICA CON TERMINADOS EN SOLDADURA MIG UNA (1) BASE METÁLICA UNA (1) SOPORTE METÁLICO CUATRO (4) SEPARADORES Y CLASIFICADORES (SEGÚN ALTURA DEL CHALECO) CAPACIDAD DE CARGA 270 KG PARA ALMACENAR, EXPONER Y TRASLADAR MERCANCÍAS CUATRO (4) RUEDAS ANTIHUELLAS EN GOMA TERMOPLÁSTICA DE 125 MM ORIENTABLES, CON FRENO.	UN	4	$2.723.442,23	$10.893.768,92
SIJIN - Almacén de vehículos					
55	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 3.50 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$3.286.764,76	$6.573.529,52
56	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.92 X 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.770.744,13	$2.770.744,13
57	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$533.700,30	$1.067.400,60
58	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
SIJIN - Unidad de planeación					
59	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.18 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.187.881,70	$2.187.881,70
60	SUPERFICIE DE TRABAJO CURVA DE 2.95 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.972.345,53	$1.972.345,53

61	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.10 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.313.304,90	$2.313.304,90
62	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.76 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$845.700,48	$845.700,48
63	SUPERFICIE DE TRABAJO CURVA DE 0,90 x 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$845.700,48	$845.700,48
64	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.24 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.110.877,76	$1.110.877,76
65	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	5	$533.700,30	$2.668.501,50
66	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	5	$523.187,59	$2.615.937,95
67	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,45 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.096.436,41	$2.096.436,41
68	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
69	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,80 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10

SIJIN - Sala de juntas

70	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
71	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24
72	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 5.72 X 0.75 MTS H=0.70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA,RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$11.253.549,98	$11.253.549,98
SIJIN - Cocineta					
73	MUEBLE PARA COCINA DE 5.54 X 0.70 MTS H= 0.90 MTS EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$12.912.169,41	$12.912.169,41
74	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE 3.00 X 0,70 MTS, INCLUYE LAVAPLATOS DE 0.46 X 0,46 MTS	UN	1	$2.875.998,00	$2.875.998,00
75	GRECA CAPACIDAD 120 TINTOS, ALTO 75 CM, CONSUMO ENERGIA 1600 WATTS, FILTRO TELA, FONDO 32 CM EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26.	UN	1	$1.137.442,51	$1.137.442,51
SIJIN - Perito en topografia					
76	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	3	$2.780.777,86	$8.342.333,58
77	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,14 X 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.514.739,37	$1.514.739,37
78	MESA PARA BOSQUEJO TOPOGRÁFICO COLOR NEGRO, FONDO 95 CM, ANCHO 132 CM, ALTO 117 CM, PINTURA ELECTROSTÁTICA ESTRUCTURA METÁLICA CON TERMINADOS EN SOLDADURA MIG, VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE AL IMPACTO, 01 BASE METÁLICA, 01 ESTANTE DESLIZABLE PARA GUARDAR PLANOS, 03 CAJONES DESLIZABLES, 01 TABURETE REGULABLE, 01 LÁMPARA PARA VIDRIO.	UN	2	$3.675.936,56	$7.351.873,12
SIJIN- Perito contable					
79	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	5	$2.780.777,86	$13.903.889,30
SIJIN - Perito en dactiloscopia					

80	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	12	$2.780.777,86	$33.369.334,32
81	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	6	$434.295,00	$2.605.770,00
SIJIN - Unidad de identificación de automotores					
82	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	4	$2.780.777,86	$11.123.111,44
83	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	4,4	$434.295,00	$1.910.898,00
SIJIN - Cuarto Técnico					
84	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	12	$1.168.687,85	$14.024.254,20
SIJIN - Sala técnica de identificación de automotores					
85	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$1.977.400,36	$3.954.800,72
86	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	6	$1.168.687,85	$7.012.127,10
87	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.44 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	4	$1.732.760,44	$6.931.041,76
SIJIN - Unidad criminalística de campo					
88	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	4	$1.977.400,36	$7.909.601,44

89	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	4	$523.187,59	$2.092.750,36
SIJIN - Laboratorio de quimicos					
90	MESON DE 2,82 X 0,50 CON LAVAMANOS	UN	1	$3.188.690,40	$3.188.690,40
SIJIN - Laboratorio de equipos					
91	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 6.0 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$6.495.123,00	$12.990.246,00
92	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
SIJIN - Prueba PIPH					
93	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$1.977.400,36	$3.954.800,72
94	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
SIJIN - Laboratorio de Macroscopio					
95	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.977.400,36	$1.977.400,36

96	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59
97	MESON DE 3.40 X 0,70 CON LAVAMANOS	UN	1	$2.915.397,96	$2.915.397,96
SIJIN - Jefe Laboratorios					
98	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
SIJIN - Secretario Laboratorios					
99	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.780.777,86	$2.780.777,86
SIJIN - Laboratorio de cianocrilato					
100	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 3,00 x 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$3.523.828,84	$7.047.657,68
101	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1,00 x 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
102	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$533.700,30	$1.067.400,60
103	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
SIJIN - Perito en documentología					

104	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	8	$2.780.777,86	$22.246.222,88
SIJIN - Laboratorio para comparador - SUCOBA					
105	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$2.780.777,86	$5.561.555,72
106	MESON DE 2,00 X 0,70 CON LAVAMANOS	UN	1	$2.261.229,30	$2.261.229,30
SIJIN - Perito en arte forense					
107	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACION 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	10	$2.780.777,86	$27.807.778,60
SIJIN - Perito en fotografía					
108	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	10	$2.780.777,86	$27.807.778,60
109	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	9,5	$434.295,00	$4.125.802,50
SIJIN -Toma de imágenes					
110	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.44 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.732.760,44	$1.732.760,44
111	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59

112	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$533.700,30	$533.700,30
113	CREDENZA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, 1,00 X 0,50 X 0,60H, FRENTES DE CAJONERAS EN AGLOMERADO ENCAPADAS EN FORMICA F8, TIENE SUPERFICIE ARRIBA EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN	1	$1.178.387,10	$1.178.387,10
SIJIN - Laboratorio audiovisuales					
114	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$2.780.777,86	$5.561.555,72
115	MESON DE 2,93 X 0,70 CON LAVAMANOS	UN	1	$3.313.188,30	$3.313.188,30
SIJIN - Perito Audiovisuales					
116	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$2.780.777,86	$5.561.555,72
SIJIN - Laboratorio en disparo					
117	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.77 x 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.109.951,03	$2.109.951,03
118	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59
119	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$533.700,30	$533.700,30
120	CREDENZA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, 1,00 X 0,50 X 0,60H, FRENTES DE CAJONERAS EN AGLOMERADO ENCAPADAS EN FORMICA F8, TIENE SUPERFICIE ARRIBA EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN	1	$1.178.387,10	$1.178.387,10
SIJIN - Perito en balistico					
121	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	8	$2.780.777,86	$22.246.222,88

122	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	6	$434.295,00	$2.605.770,00
SIJIN - Almacenamiento equipos especiales					
123	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	14	$1.166.687,85	$16.361.629,90
SIJIN - Perito en informática forense					
124	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	15	$2.780.777,86	$41.711.667,90
125	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	13,7	$434.295,00	$5.949.841,50
SIJIN - Archivo rodante					
126	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	4	$8.406.986,10	$33.627.944,40
SIJIN - Trabajo y almacenamiento					
127	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 4,80 x 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$5.465.431,15	$5.465.431,15
128	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2,41 x 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.928.417,10	$2.928.417,10
129	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
130	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$533.700,30	$1.067.400,60
SIJIN - Perito unidad explosivos					
131	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	20	$1.172.596,50	$23.451.930,00
131	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	15	$1.166.687,85	$17.530.317,75

132	LOCKERS DE 12 CASILLEROS DE 1,23 M X 1,80 M X 0.40 M (ANCHO X ALTO X FONDO), EN AGLOMERADO, MELANINA DE ALTA RESISTENCIA F8, PUERTAS EN AGLOMERADO, CERRADURA PASADOR, CERRADURA CON LLAVE, APERTURA: BISAGRA TIPO "PUSH" O BISAGRA DE CIERRE LENTO.	UN	2	$2.367.390,30	$4.734.780,60
SIJIN - Archivo					
133	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
SIJIN - SALA DE JUNTAS 1					
134	MESA DE JUNTAS, SUPERFICIE LINEAL DE 3,44 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. (SEGUN DISEÑO)	UN	2	$2.936.010,14	$5.872.020,28
135	MESA DE JUNTAS, SUPERFICIE LINEAL DE 1,70 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. (SEGUN DISEÑO)	UN	2	$1.450.935,24	$2.901.870,48
136	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	14	$494.519,78	$6.923.276,92
SIJIN - SALA DE JUNTAS 2					
137	MESA DE JUNTAS, SUPERFICIE LINEAL DE 3,44 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. (SEGUN DISEÑO)	UN	2	$2.936.010,14	$5.872.020,28
138	MESA DE JUNTAS, SUPERFICIE LINEAL DE 1,70 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. (SEGUN DISEÑO)	UN	2	$1.450.935,24	$2.901.870,48
139	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	14	$494.519,78	$6.923.276,92
SIJIN - DEPENDENCIAS AGREGADAS					
140	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40

141	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
142	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
143	PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIES DE 3,00 X 0.60 MTS Y 1.00 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$4.371.512,48	$4.371.512,48
SIJIN - SALA DE PRIORIZADOS					
144	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
SIJIN - Sala de denuncias					
145	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
SIJIN - Sala de denuncias automotores					
146	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	4	$6.274.443,44	$25.097.773,76
147	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
148	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
149	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24

150	PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIES DE 3,00 X 0.60 MTS Y 1,00 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORO DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA	UN	1	$4.371.512,48	$4.371.512,48
SIJIN - Sala de atención víctimas sexuales y homicidios					
151	PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIES DE 3,30 X 0,60 MTS Y 1.00 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORO DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA	UN	1	$4.371.512,48	$4.371.512,48
152	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59
153	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.430.160,40	$4.860.320,80
154	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	4	$1.644.530,40	$6.578.121,60
155	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,80 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48
156	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$593.700,30	$593.700,30
157	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8; CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	10	$6.274.443,44	$62.744.434,40
SIJIN - Sala de antecedentes					

158	PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE DE 1.78 X 0,80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$2.121.902,69	$2.121.902,69
159	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
160	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
161	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
162	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
SIJIN - SALA DE JUNTAS					
163	MESA DE JUNTAS, SUPERFICIE LINEAL DE 3,44 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. (SEGUN DISEÑO)	UN	2	$2.936.010,14	$5.872.020,28
164	MESA DE JUNTAS, SUPERFICIE LINEAL DE 1,70 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18. (SEGUN DISEÑO)	UN	2	$1.450.935,24	$2.901.870,48
165	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	14	$494.519,78	$6.923.276,92
SIJIN -TALENTO HUMANO					
Jefa Talento Humano					

166	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS, (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
Unidades de Reacción inmediata - URIS					
167	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$2.780.777,86	$5.561.555,72
168	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
Radicación					
169	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	3	$2.780.777,86	$8.342.333,58
170	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
Jefe URI's					
171	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS, (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
Archivo					
172	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
SIJIN - Responsables de Gestión (Talento Humano					
173	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	9	$2.780.777,86	$25.027.000,74

SIJIN - Recepción					
174	RECEPCIÓN DE OFICINA ISLA CURVA DE LONGITUD 6,00 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$20.068.289,40	$20.068.289,40
175	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE, MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
176	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$533.700,30	$1.067.400,60
177	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
178	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
179	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
SIJIN - GESTIÓN DOCUMENTAL					
180	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
181	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	3	$2.780.777,86	$8.342.333,58
182	PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE DE 3,00 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO DON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$4.366.759,11	$4.366.759,11

183	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,52
184	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$533.700,30	$533.700,30
Deposito					
185	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	1	$1.168.687,85	$1.168.687,85
Baños					
186	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	22	$106.161,00	$2.335.542,00
SIJIN - Unidad Investigativa de delincuencia organizada					
187	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	66	$2.780.777,86	$183.531.338,76
SIJIN - Jefes Unidad Investigativa de delincuencia organizada					
188	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	5	$6.274.443,44	$31.372.217,20
189	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	49,5	$434.295,00	$21.497.602,50
SIJIN - Unidad investigativa de terrorismo					
190	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	10	$2.780.777,86	$27.807.778,60
191	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	13,1	$434.295,00	$5.689.264,50
SIJIN - Grupo de información análisis criminal					

192	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	81	$2.780.777,66	$225.243.006,66
193	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELASORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	60	$434.295,00	$26.057.700,00
194	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
195	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,85 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
TEMPLO MEBOG					
Elementos logisticos					
196	SAGRARIO ESTÁ EN EL PRESBITERIO DEBE ESTAR UBICADO POR ENCIMA DE LA CABEZA DEL CELEBRANTE DE MANERA QUE SEA VISIBLE ELABORADO DE UN MATERIAL METÁLICO DORADO, SU FORMA ES CAJA CUBICA, LA PUERTA PRINCIPAL SE APRECIA DOS ÁNGELES A CADA LADO Y QUEDA EXPUESTO EL OSTENSORIO, CON DOS COLUMNAS A CADA LADO Y EN LA PARTE SUPERIOR DOS ÁNGELES CUSTODIOS. MEDIDAS ALTO: 650 CM, LARGO: 50CM Y ANCHO 50 CM.	UN	1	$48.611.092,05	$48.611.092,05
197	IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, ESCULTURA EN BULTO EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE, DE 1.20 CM, DE ALTURA.	UN	1	$2.693.574,20	$2.693.574,20
198	IMAGEN DE SAN JOSE, ESCULTURA EN BULTO EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE, DE 1.20 CM DE ALTURA.	UN	1	$2.693.574,20	$2.693.574,20
199	IMAGEN DE SAN MIGUEL ARCANGEL, ESCULTURA EN BULTO EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE, DE 1.20 CM DE ALTURA.	UN	1	$2.693.574,20	$2.693.574,20
200	IMÁGENES DE LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS, ESCULTURA EN BULTO EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE, EN BLANCO CON DORADO, SOSTIENEN UNA COLUMNA QUE EN LA PARTE SUPERIOR SE ENCUENTRA UNA BOMBILLA, DE 1.20 CM DE ALTURA.	UN	2	$2.693.574,20	$5.387.148,40
201	CRUCES PEQUEÑAS PARA LA CONSAGRACIÓN DE LOS MUROS DEL TEMPLO, ELABORADO EN BRONCE DE 20 CM DE ALTO.	UN	12	$183.369,00	$2.200.428,00
202	CUSTODIA GRANDE CON VIRIL Y PORTA DIOS, RECIPIENTE DISEÑADO PARA LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. EN TODAS LAS PIEZAS DE ORFEBRERÍA, SE EMPLEA EL CRISTAL, PARA PERMITIR QUE EL CONTENIDO SE DISTINGA FÁCILMENTE, EL ORBE Y LOS RAYOS DE UNA CUSTODIA DEBEN SER DORADOS Y DEBE ESTAR CORONADA, POR UNA CRUZ, SU MATERIAL DEBE SER EN SOLERA DE BRONCE, REPUJADO Y CINCELADO A MANO CON UN TERMINADO EN BAÑO DE ORO, MEDIANTE PROCESO ELECTROLÍTICO. EL VIRIL TIENE UN DIÁMETRO DE 10 CM, CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 83 CM. EL DIÁMETRO DEL RESPLANDOR ES DE 40 CM Y SU BASE ES DE 24 CM.	UN	1	$16.226.226,30	$16.226.226,30
203	EXPOSITOR PARA CUSTODIA, EXPOSITOR ELABORADO EN METAL PLATEADO Y DORADO. LA BASE MIDE 40 X 30 CM Y LA PEANA SUPERIOR 27 X 28 CM, ALTURA DE 34 CM EN LA CABEZA DEL ÁNGEL.	UN	1	$912.984,60	$912.984,60
204	CRISTO PEQUEÑO, CRUZ Y CRISTO TALLADO A MANO EN MADERA DE 80 CM DE ALTO X 40 CM DE ANCHO.	UN	1	$253.512,86	$253.512,86
205	CRISMERAS PARA LOS SANTOS ÓLEOS, FABRICADO EN METAL PLATEADO DE 4,5 CM. DE ALTURA, CRISMERA CON 2,6 CM DE DIÁMETRO, TAPA CON CRUZ GRABADA Y CIERRE MEDIANTE ROSCA.	UN	3	$370.762,56	$1.112.287,68

206	CANDELABROS GRANDES, CANDELABRO METÁLICO TORNEADOS DE COLOR DORADO EN LA PARTE SUPERIOR UNA SUPERFICIE PARA QUE DESCANSE EL CIRIO DE 1 MT DE ALTURA.	UN	4	$7.209.272,13	$28.837.088,52
207	ORNAMENTO COLOR BLANCO SOLEMNE, ORNAMENTOS EN TELA ITALIANA CON GALON Y BORDE ITALIANO, COLOR BLANCO: ORNAMENTO EN TELA ITALIANA (LAMPAZO), CON LUREX DORADO Y GALÓN ITALIANO CON FIGURAS LITÚRGICAS EN LUREX DORADO, EL CUAL LLEVA UNA ENTRE TELA EN LA PARTE INTERNA, FORRADO EN BRIONI, COLOR BEIGE, DE ANCHO 16 CENTÍMETROS; SESGO EN LAME DORADO ITALIANO DE 14 MILÍMETROS DE ANCHO. DEBE DE SER CONFECCIONADO A MANO.	UN	1	$1.348.244,70	$1.348.244,70
208	ORNAMENTO COLOR MORADO SOLEMNE, ORNAMENTOS EN TELA ITALIANA CON GALÓN Y BORDE ITALIANO, COLOR MORADO: ORNAMENTO EN TELA ITALIANA (LAMPAZO), CON LUREX DORADO Y GALÓN ITALIANO CON FIGURAS LITÚRGICAS EN LUREX DORADO, EL CUAL LLEVA UNA ENTRE TELA EN LA PARTE INTERNA, FORRADO EN BRIONI, COLOR BEIGE, DE ANCHO 16 CENTÍMETROS; SESGO EN LAME DORADO ITALIANO DE 14 MILÍMETROS DE ANCHO. DEBE DE SER CONFECCIONADO A MANO.	UN	1	$1.348.244,70	$1.348.244,70
209	ORNAMENTO COLOR ROJO SOLEMNE, ORNAMENTOS EN TELA ITALIANA CON GALON Y BORDE ITALIANO, COLOR ROJO: ORNAMENTO EN TELA ITALIANA (LAMPAZO), CON LUREX DORADO Y GALÓN ITALIANO CON FIGURAS LITÚRGICAS EN LUREX DORADO, EL CUAL LLEVA UNA ENTRE TELA EN LA PARTE INTERNA, FORRADO EN BRIONI, COLOR BEIGE, DE ANCHO 16 CENTÍMETROS; SESGO EN LAME DORADO ITALIANO DE 14 MILÍMETROS DE ANCHO. DEBE DE SER CONFECCIONADO A MANO.	UN	1	$1.348.244,70	$1.348.244,70
210	ORNAMENTO COLOR AZUL MARIANO SOLEMNE, ORNAMENTOS EN TELA ITALIANA CON GALON Y BORDE ITALIANO, COLOR AZUL MARIANO: ORNAMENTO EN TELA ITALIANA (LAMPAZO), CON LUREX DORADO Y GALÓN ITALIANO CON FIGURAS LITÚRGICAS EN LUREX DORADO, EL CUAL LLEVA UNA ENTRE TELA EN LA PARTE INTERNA, FORRADO EN BRIONI, COLOR BEIGE, DE ANCHO 16 CENTÍMETROS; SESGO EN LAME DORADO ITALIANO DE 14 MILÍMETROS DE ANCHO. DEBE DE SER CONFECCIONADO A MANO.	UN	1	$1.348.244,70	$1.348.244,70
211	ORNAMENTO COLOR ROSADO SOLEMNE, ORNAMENTOS EN TELA ITALIANA CON GALON Y BORDE ITALIANO, COLOR ROSADO: ORNAMENTO EN TELA ITALIANA (LAMPAZO), CON LUREX DORADO Y GALÓN ITALIANO CON FIGURAS LITÚRGICAS EN LUREX DORADO, EL CUAL LLEVA UNA ENTRE TELA EN LA PARTE INTERNA, FORRADO EN BRIONI, COLOR BEIGE, DE ANCHO 16 CENTÍMETROS; SESGO EN LAME DORADO ITALIANO DE 14 MILÍMETROS DE ANCHO. DEBE DE SER CONFECCIONADO A MANO.	UN	1	$1.348.244,70	$1.348.244,70
212	CAPA PLUVIAL CON VELO HUMERAL Y ESTOLA, CAPA PLUVIAL CON VELO HUMERAL Y ESTOLA EN TELA ITALIANA: CAPA PLUVIAL EN BRODERI ITALIANO, CON LUREX DORADO, DE LARGO 140 X 6 METROS DE ANCHO, CONFECCIONADA EN TRES PIEZAS: FORRADA EN BRIONI ROJO, GALÓN CON FIGURAS LITÚRGICAS EN LUREX DORADO DE ANCHO 6 CENTÍMETROS, BROCHE EN ALPACA Y BAÑO DORADO, BASEADO EN ESTILO FILIGRANA, BORLA CON BASE EN MADERA E HILOS DORADOS. DEBE DE SER CONFECCIONADO A MANO.	UN	1	$2.396.343,30	$2.396.343,30
213	ALBAS TALLA S. ALBAS TALLAS S BORDADAS A MANO, EN LINONUEVEMIL: ALBA CALADA A MANO, CALADO GIGLIUCCIO, DOBLE VUELTA.	UN	4	$779.800,80	$3.119.203,20
214	ALBAS TALLA M, ALBAS TALLA M BORDADAS A MANO, EN LINO NUEVEMIL: ALBA CALADA A MANO, CALADO GIGLIUCCIO, DOBLE VUELTA.	UN	4	$779.800,80	$3.119.203,20
215	ALBAS TALLA L, ALBAS TALLA L BORDADAS A MANO, EN LINO NUEVEMIL: ALBA CALADA A MANO, CALADO GIGLIUCCIO, DOBLE VUELTA.	UN	2	$779.800,80	$1.559.601,60
216	CÍNGULOS, ELABORADOS EN HILO TERLENKA, NAYLON DE REFERENCIA N° 9 CON HILO DORADO IMPORTADO, HECHO A AMANO. MEDIDAS A DEFINIR	UN	4	$138.733,13	$554.932,52
217	PURIFICADORES BLANCOS, PURIFICADOR (EN LINO PURO Y BORDADO A MANO): DOBLADILLO DE OJO A MANO Y UNA CRUZ INTERNA BORDADA A MANO. MEDIDAS A DEFINIR	UN	20	$126.756,44	$2.535.128,80
218	CORPORALES BLANCOS, CORPORAL, (EN LINO PURO Y BORDADO A MANO): DOBLADILLO DE OJO A MANO Y UNA CRUZ INTERNA BORDADA A MANO, MEDIDAS A DEFINIR.	UN	20	$126.756,44	$2.535.128,80
219	PALIAS, TELA EN LINO, BORDADO CON HILO DORADO A MANO EN COLORES LITÚRGICOS (ROJO, VERDE, MORADO, BLANCO Y BLANCO CEREMONIA). MEDIDAS A DEFINIR.	UN	5	$126.756,44	$633.782,20
220	PATENAS PARA REPARTIR LA COMUNIÓN, FABRICADO EN METAL CON ACABADO EN BAÑO DORADO SU BASE DE 16 CM DE	UN	4	$224.868,30	$899.473,20

	DIÁMETRO, COPA TOTALMENTE LISA, BASE DECORADA CON ELEMENTOS EN RELIEVE.				
221	ESTOLAS PARA CONCELEBRANTES BEIGE CON BORDADO DEL ESCUDO LA POLICÍA, ESTOLAS BLANCAS EN BORDADO ELECTRÓNICO: TELA DACRÓN – LANA, MEDIDAS A DEFINIR.	UN	10	$303.041,40	$3.030.414,00
222	TURIFERARIO (INCENSARIO, NAVETA, CALDERETA CON HISOPO), PIE DE INCENSARIO, FABRICADO EN LATÓN. MEDIDAS:44X28X120CM., NAVETA DE METAL EN PLATEADO: MEDIDAS DE: 14 CM DE LARGO Y 8 CM DE ALTO, INCENSARIO: FABRICADO EN METAL DORADO ESTILO BOTAFUMEIRO: ALTURA 24CM CUELGA DE CUATRO CADENAS DE UN METRO DE LONGITUD, CALDERETA CON HISOPO LITÚRGICOS FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO, CALDERETA CON HISOPO: HECHA EN ACERO QUIRÚRGICO, MEDIDAS: ALTO 14 CM ANCHO 10 CM. LARGO DEL HISOPO 18 CM ANCHO BOLA DE ASPERSIÓN 5 CM.	UN	1	$9.348.923,70	$9.348.923,70
223	JUEGO DE CRUZ ALTA PROCESIONAL CON CIRIALES (2); CRUZ PROCESIONAL CON CIRIALES Y BASE EN FUSIÓN DE LATÓN PULIDO, SU ALTURA ES 2,46 CM. SEGÚN MODELO.	UN	1	$1.693.750,50	$1.693.750,50
224	JUEGO DE LECCIONARIOS, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	1	$313.657,50	$313.657,50
225	MISAL ROMANO DE ALTAR, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	2	$78.173,10	$156.346,20
226	MISAL DE SEDE, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	1	$46.324,80	$46.324,80
227	BENDICIONAL, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	1	$70.452,30	$70.452,30
228	LIBRO DE ORACIÓN DE LOS FIELES, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	1	$55.975,80	$55.975,80
229	RITUAL DE BAUTISMO DE NIÑOS, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	2	$16.406,70	$32.813,40
230	RITUAL DE MATRIMONIO, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA	UN	2	$16.406,70	$32.813,40
231	RITUAL DE CONFIRMACION, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	2	$16.406,70	$32.813,40
232	RITUAL PENITENCIAL, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	2	$16.406,70	$32.813,40
233	RITUAL DE EXEQUIAS, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	2	$16.406,70	$32.813,40
234	LECCIONARIO MARIANO, AUTORIZADOS POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA.	UN	1	$48.255,00	$48.255,00
235	CÁLIZ CON PATENA, CÁLIZ CON PATENA EN FUSIÓN DE LATÓN CON BAÑO DE PLATA Y ORO, SU TAMAÑO ES DE 17 CM, EL DIÁMETRO DEL CÁLIZ ES DE 10,5 CM Y EL DIÁMETRO DE LA PATENA ES DE 13,5 CM. SEGÚN MODELO.	UN	2	$1.078.981,80	$2.157.963,60
236	COPONES GRANDES, COPÓN DE METAL CON CRUZ EN LA PARTE SUPERIOR, SU TAMAÑO ES DE 23 CM Y SU DIÁMETRO ES DE 14 CM. SEGÚN MODELO.	UN	4	$1.953.362,40	$7.813.449,60
237	MANTELES PARA EL ALTAR, ELABORADO EN TELA BOSTON SPECIAL CON UN ENCAJE EN ALGODÓN, TEJIDOS A MANO. MEDIDAS A DEFINIR.	UN	4	$357.087,00	$1.428.348,00
238	ATRIL PARA EL ALTAR (MISAL), ATRIL PARA MESA FABRICADO EN BRONCE CON DISTINTOS GRADOS DE INCLINACIÓN, DECORADO CON ÁNGELES, SU BASE CON CUATRO APOYOS Y SUS MEDIDAS 29,5 CM. POR 25,5 CM. SEGÚN MODELO.	UN	1	$2.142.183,71	$2.142.183,71
239	ATRIL PARA LA SEDE, ATRIL PARA ALTAR FABRICADO EN BRONCE CON ACABADO DORADO DE 115 CM. DE ALTURA HASTA EL SOPORTE DONDE SE APOYAN LAS SAGRADAS ESCRITURAS, REGULABLE EN ALTURA CON 10 CM. DE SUBIDA, SOPORTE PARA LOS TEXTOS SAGRADOS CON 40 CM. DE ANCHO POR 30 CM. DE ALTO, ATRIL DE PIE CON BASE FABRICADA CON TRES APOYOS DE 22 CM. DE ANCHO TOTAL.	UN	1	$2.455.214,40	$2.455.214,40
240	CANDELABRO PARA EL CIRIO DEL SANTÍSIMO, CANDELABRO FABRICADO EN BRONCE SU BASE CON 25 CM. ANCHO Y 30 CM. ALTURA, CON 115 CM. DE ALTURA HASTA EL PLATO, PIE CON TRES APOYOS Y CON TUBO SALOMÓNICO. SEGÚN MODELO.	UN	1	$852.183,30	$852.183,30
241	EQUIPO DE MISA PORTÁTIL, BOLSO TIPO PORTAFOLIOS COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1 TECA, 1 CRUZ, 1 ASPERSOR, 1 CRISMERA, 1 PANERA, 1 ACCESORIO COMPLEMENTARIO PARA LA TECA, 2 RECIPIENTES A MODO DE VINAJERAS, 1 CÁLIZ, 2 VELAS, 1 SERVICIO DE ALTAR, 1 ESTOLA, 1 ALTAR CON SOPORTE PARA CRUZ Y VELAS, SU TAMAÑO ES DE 35 X 26 X 12CM.	UN	1	$1.747.796,10	$1.747.796,10
242	CAMPANILLA DE COMUNIÓN DE 13,5 CM. DE ALTURA, FABRICADA EN BRONCE PULIDO CON MANGO DE BRONCE.	UN	1	$525.014,40	$525.014,40

243	CAMPANA MEDIANA, CAMPANA EN COBRE Y BRONCE CON UNA ALTURA DE 21 CM Y UN DIÁMETRO DE 11,5 CM.	UN	1	$646.617,00	$646.617,00
244	PALIO PARA PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO, PALIO PARA USO RELIGIOSO, FABRICADO CON TELA BROCADA BLANCA Y DORADA, CONTORNO DECORADO CON FLECO DE CANUTILLO DORADO, PALIO RELIGIOSO PARA 4 VARAS, CAÍDAS LATERALES DE APROXIMADAMENTE 40 CM, TIENE 180 CM. DE LARGO POR 160 CM. DE ANCHO, VARAS DE PALIO FABRICADAS EN METAL PLATEADO, REMATADAS EN FORMA DE PIÑA DORADA, VARAS CON UNA LONGITUD DE 2,75 M, INCLUYENDO LAS PIÑAS, TUBO DE 2,5 CM. DE DIÁMETRO. MEDIDAS A DEFINIR.	UN	1	$10.361.313,60	$10.361.313,60
245	MANTELES PROTECTORES ALTAR, TELA BOSTON SPECIAL CON ENCAJES DELGADO EN ALGODÓN. MEDIDAS A DEFINIR.	UN	4	$887.295,03	$3.549.180,12
246	BALDAQUINOS FRONTALES (PARES COLORES LITÚRGICOS), TELA LINO DORCELL MERINO, CON FORRO EN SEDA POLIÉSTER, CON BORDADOS ELECTRÓNICOS Y TERMINACIONES A MANO. EN COLORES LITÚRGICOS (ROJO, BLANCO, MORADO Y VERDE). MEDIDAS A DEFINIR.	UN	8	$781.731,00	$6.253.848,00
247	CONOPEOS PARA COPONES GRANDES, CONOPEOS: EN TELA ITALIANA (LAMPAZO), CON LUREX DORADO.	UN	8	$475.336,62	$3.802.692,96
248	JUEGO DE VINAJERAS, VINAJERAS FABRICADAS EN CRISTAL, INCLUYEN ASA DE CRISTAL CON TAPÓN DE METAL DORADO DECORADO CON UNA CRUZ, BANDEJA REALIZADA EN METAL DORADO, SUJECIÓN PARA JARRAS.	UN	2	$411.132,60	$822.265,20
249	IMAGEN DEL SANTO CURA DE ARS, ESCULTURA EN BULTO EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE DE 1.20 METROS DE ALTURA. SEGÚN MODELO.	UN	1	$3.168.910,82	$3.168.910,82
250	IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ESCULTURA EN BULTO EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE DE 1.20 METROS DE ALTURA. SEGÚN MODELO.	UN	1	$3.168.910,82	$3.168.910,82
251	CARRO SOPORTE FUNERARIO, SOPORTE EXTENSIBLE HASTA 120 CM CON UNA ALTURA DE 50 CM, ESPECIAL PARA TÚMULO CON RUEDAS, ACABADO EN COLOR NEGRO Y SOPORTE FABRICADO EN METAL, CON RODAMIENTOS. SEGÚN MODELO.	UN	1	$6.323.335,20	$6.323.335,20
252	CANDELABROS DE BASE PARA ALTAR MAYOR, CANDELABRO LITÚRGICO DE ALTAR LATÓN MACIZO, PORTA VELA DE MESA - CRUZ DE PLATA, TRABAJADO Y ACABADO A MANO, DE 20 CM DE ALTURA, 4 CM DE DIÁMETRO Y 20 CM DE BASE. SEGÚN MODELO.	UN	6	$852.183,30	$5.113.099,80
253	SANTO CRISTO DE BASE PARA ALTAR MAYOR, CRUCIFIJO DE MESA FABRICADO EN METAL CON BAÑO DE ORO DE 80 CM DE ALTO. SEGÚN MODELO.	UN	1	$4.943.500,89	$4.943.500,89
254	PALANGANAS, PALANGANAS CON UN DIÁMETRO APROXIMADO DE 35 CM Y PLATO TOTALMENTE LISO.	UN	2	$782.720,97	$1.565.441,94
255	JARRAS METÁLICAS, JARRA Y PLATO FABRICADOS EN METAL PULIDO, CON 20 CM. DE ALTURA Y PLATO CON 22 CM. DE DIÁMETRO.	UN	2	$411.132,60	$822.265,20
256	CONCHA METÁLICA PARA BAUTISMOS, CONCHA CON 14 CM. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN METAL NIQUELADO CON APOYOS.	UN	1	$1.153.483,54	$1.153.483,54
257	OFRENDARIOS, OFRENDARIO FABRICADO EN IMITACION A PIEL (POLIPIEL), MANGO HUECO DE METAL CON 15 CM. DE LARGO, ADAPTABLE A UN ALARGADOR, BOCA DE FORMA OVALADA CON 16 CM. POR 13 CM Y UNA PROFUNDIDAD DE 26 CM.	UN	4	$337.785,00	$1.351.140,00
258	FLOREROS METÁLICOS GRANDES, FLORERO FABRICADO EN BRONCE CON UNA ALTURA DE 32 CM, DECORADA CON ELEMENTOS EN RELIEVE.	UN	8	$75.277,80	$602.222,40
259	EVANGELIARIO, LIBRO DE CUBIERTA DURA CON LA ICONOGRAFÍA DE LOS CUATRO EVANGELISTA Y EN EL CENTRO JESUCRISTO, ELABORADO SU TAPA EN PLATA Y PLATA DORADA TALLADA. MEDIDAS 36 CM. DE ALTO X 25 DE ANCHO X 5 DE LOMO Y UN MÍNIMO DE 33 CM. DE ALTO X 22 DE ANCHO X 3 DE LOMO.	UN	1	$748.022,30	$748.022,30

Mobiliario y enseres TEMPLO - Recepción - secretaría

260	PUESTO DE TRABAJO SUPERFICIE DE 3,00 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$4.366.759,11	$4.366.759,11
261	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59
262	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO. FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$533.700,30	$533.700,30
263	SILLA TANDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	1	$1.075.042,99	$1.075.042,99
264	CREDENZA DE 1,30 X 0,50 X 0,70 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN	1	$1.003.761,91	$1.003.761,91

Despacho Párroco					
265	PUESTO DE TRABAJO TIPO GERENCIAL DE 1.80 X 1.80, SUPERFICIES EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR, LATERALES EN VIDRIO TEMPLADO DE 19MM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. CAJONERA 2 X1: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CON FRENTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA F8. CREDENZA: MUEBLE AUXILIAR EN TABLEXY ENCHAPADO EN, LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F-8, CANTOS EN PVC DE 2MM TERMOFUNDIDO. ENTREPAÑOS GRADUABLES Y ARCHIVADOR EMPOTRABLE CON ALMACENAMIENTO EN CAJONES TIPO AUXILIAR Y TIPO CARPETERO. SOPORTES LATERALES EN AGLOMERADO DE 60MM DE ESPESOR EN TABLEX ENCHAPADOS EN FORMICA F8.	UN	1	$2.568.131,10	$2.568.131,10
266	SILLA GERENCIAL, ESPALDAR MALLA DE NYLON, ASIENTO EN ESPUMA DENSIDAD 42 +/- 3, APOYA CABEZA Y ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO DE POLIPROPILENO (SPACER NGERO), CARCASA EN POLIPROPILENO NEGRO, ESTRELLA DE 5 PATAS EN ACERO CROMADO, RODACHINAS DOBLES NYLON 65 MM DIÁMETRO, CILINDRO NEUMÁTICO PARA GRADUAR ALTURA DEL ASIENTO, MECANISMO QUE CONTROLA ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE ESPALDAR Y ASIENTO, AJUSTE DEL APOYO LUMBAR, BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA Y ESCUALIZABLES, APOYA CABEZA GRADUABLE EN ALTURA Y POSICIÓN O PUEDE SER RETIRADO, SISTEMA "SLIDER": CORRE EL ASIENTO HACIA FUERA DÁNDOLE MAYOR PROFUNDIDAD, TENSOR DE POSTURA.	UN	1	$1.024.874,32	$1.024.874,32

267	BIBLIOTECA EN MADERA, COLOR CHANTIGIE, CON DIVISIONES EN MADERA Y VIDRIO DE DIFERENTES TAMAÑOS (TENER EN CUENTA IMAGEN), CON 5 GAVETAS, UNA PUERTA DE DOS ABRAS, CON ESPACIO INTERNO DE FORMA RECTANGULAR PARA UBICAR LAS BANDERAS. LAS MEDIDAS GENERALES DEL MUEBLE SON DE: 3 MT DE LARGO, 44 CM DE ANCHO Y 2.40 CM DE ALTO.	UN	1	$7.985.655,28	$7.985.655,28
Oficina Vicario					
268	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FS, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/TS, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA FS, , SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
Sala de Estar					
269	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$1.644.530,40	$1.644.530,40
270	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.196.055,20	$2.196.055,20
271	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
272	BARRA PARA COCINA, SUPERFICIE EXTREMO CURVO EN AGLOMERADO DE MADERA DE 0,80 X 0,60 MTS, INCLUYE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$1.053.542,13	$1.053.542,13
273	SILLAS TIPO BAR, ACABADO EN TELA VINILICA NEGRA, ESTRUCTURA EN ACERO, ACABADO CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER.	UN	2	$537.483,49	$1.074.966,98
Elementos para el templo					
274	COLUMNAS PARA ARREGLOS FLORALES, LA COLUMNA MACIZA DE MÁRMOL CON TALLADO DE COLOR DORADO Y BLANCO, UNA BASE PLANA DONDE DESCANSARAN LOS JARRONES O ARREGLOS FLORALES, DONDE SUS MEDIDAS DEBEN SER DE 1 M DE ALTURA CON UN DIÁMETRO DE 28 CM.	UN	10	$1.521.077,19	$15.210.771,90
275	BANCAS CON ARRODILLADEROS, MUEBLE LARGO DE ESTRUCTURA EN MADERA, COLOR CHANTIGIE, EN EL QUE SE PUEDEN SENTAR UN MÁXIMO DE 8 PERSONAS, EN LA PARTE TRASERA LLEVA UN ARRODILLADERO, TAPIZADO EN TELA O HULE ACOLCHADO, LA SILLA QUE SE PUEDE TRANSFORMAR EN RECLINATORIO PLEGANDO EN LA PARTE TRASERA ASÍ MISMO LLEVA UN ESPACIO PARA COLOCAR LOS LIBROS. SUS MEDIDAS SON DE 2.50 CM DE LARGO, 43 CM DE ALTO, 47 CM DE PROFUNDIDAD. LOS RECLINATORIOS DEBEN TENER UN ANCHO DE 14 CM, SEGÚN MODELO.	UN	72	$3.456.988,20	$248.903.150,40
276	RECLINATORIOS PARA BANCAS DE ADELANTE, RECLINATORIO DE COLOR CHANTIGIE, TIENE UNA PIEZA LLANA SOBRE LA CUAL LA PERSONA SE ARRODILLA, SU TEXTURA ACOLCHADA, DE COLOR OCRE, EN CUERO DE 2.50 CM DE LARGO POR 14 CM DE ANCHO; UN TAPIZADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA APOYAR LOS BRAZOS Y LAS MANOS DE 2.50 CM DE LARGO POR 17 CM DE ANCHO, COLOR OCRE; TRAE UN COMPARTIMIENTO PARA COLOCAR LIBROS DE 18 CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO. LA ALTURA TOTAL DEL RECLINATORIO DEBE SER DE 90 CM.	UN	4	$1.812.616,99	$7.250.467,96
277	RECLINATORIOS, RECLINATORIO EN MADERA, COLOR CHANTIGIE, TIENE UNA PIEZA LLANA SOBRE LA CUAL LA PERSONA SE ARRODILLA DE 40 X 55 CM, SU TEXTURA ACOLCHADA DE COLOR OCRE EN CUERO, UN TAPIZADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA APOYAR LOS BRAZOS Y LAS MANOS MIENTRAS QUE SE REZA DE 50 X 20 CM, COLOR OCRE, EN LA MITAD UNA CRUZ, TIENE UN COMPARTIMIENTO PARA DEPOSITAR LIBROS DE 15 X 18 CM. EL RECLINATORIO EN TOTAL DEBE CONTAR CON UNA ALTURA DE 90 CM POR 55 CM DE ANCHO. SEGÚN MODELO.	UN	6	$1.321.435,81	$7.928.614,86
278	RECLINATORIO GRANDE PARA MATRIMONIOS, JUEGO DE 4 PIEZAS EN MADERA, COLOR CHANTIGIE: CONSTA DE DOS RECLINATORIOS Y DOS ASIENTOS DE 46 CM DE ANCHO POR 48 CM DE ALTO, ACOLCHADOS, EN CUERO DE COLOR OCRE; LOS RECLINATORIOS DE 90 CM DE ALTO POR 55 CM DE ANCHO, COLOR OCRE, DONDE LA PERSONA SE ARRODILLA 55 CM DE LARGO POR 15 CM, SU TEXTURA ACOLCHADA DE COLOR OCRE EN CUERO, UN TAPIZADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA APOYAR LOS BRAZOS DE 50 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO, COLOR OCRE. SEGÚN MODELO	UN	1	$3.018.803,11	$3.018.803,11

279	SILLAS EN MADERA PARA MATRIMONIOS, SILLA EN MADERA DE PINO, COLOR CHANTIGIE, DE 1,08 CM DE ALTO, 50 CM DE ANCHO, 48 CM DE PROFUNDIDAD, TALLA EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN TAPIZADO ACOLCHADO EN CUERO DE COLOR OCRE EN ASIENTO Y ESPALDAR DELANTERO Y TRASERO. SEGÚN MODELO.	UN	4	$1.162.250,63	$4.649.002,52
280	SILLAS EN MADERA PARA LOS PAJECITOS, SILLA EN MADERA PINO, COLOR CHANTIGIE, DE 78 CM DE ALTO, 37 CM DE ANCHO, 39 CM DE PROFUNDIDAD, CON PATAS TORNEADAS, CON UN TAPIZADO ACOLCHADO EN CUERO DE COLOR OCRE, Y UN ARCO EN FORMA DEL ESPALDAR. SEGÚN MODELO.	UN	2	$1.113.725,40	$2.227.450,80
281	CONFESIONARIO, MUEBLE EN MADERA TRIPLEX, COLOR CHANTIGIE, GEOMETRÍA SEGÚN DISEÑO DE DETALLE. LA SILLA INTERNA DEL SACERDOTE DEBE TENER SU TAPIZADO EN COLOR OCRE, AL IGUAL QUE EL RECLINATORIO; EN TOTAL DEBE TENER 2.20 CM DE ALTO, 2.15 CM DE ANCHO Y 1,05 DE PROFUNDIDAD. SEGÚN MODELO.	UN	2	$1.330.942,54	$2.661.885,08
282	SILLA PLÁSTICA CON DESCANSABRAZOS DE 82.5 CM DE ALTO, 59 CM DE ANCHO Y 58 CM DE PROFUNDIDAD, SIN RELLENO Y SIN TAPIZ.	UN	80	$238.620,98	$19.089.678,40
283	MESA PARA LA CREDENCIA, MESA RECTANGULAR EN MARMOL DE COLOR BLANCO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 87 CM DE ALTO, 97 CM DE ANCHO Y 40 CM DE PROFUNDIDAD.	UN	1	$3.650.585,27	$3.650.585,27
284	CARTELERA EN ALUMINIO Y VIDRIO, CARTELERA INFORMATIVA FABRICADA EN ALUMINIO Y DOS CORREDERAS EN VIDRIO. MEDIDAS 1.80 CM DE LARGO, 1.40 CM DE ALTO POR 25 CM DE ANCHO. SEGÚN MODELO.	UN	1	$2.465.431,91	$2.465.431,91
285	ALFOMBRA TIPO CAMINO COLOR ROJO, ALFOMBRA DE COLOR ROJO, TIPO CAMINO, CON BORDES EN DORADO, DE MATERIAL DE FIBRAS ALTAMENTE RESISTENTES. MEDIDAS 2.50 CM DE ANCHO POR 20 M DE LARGO. SEGÚN MODELO.	UN	1	$3.168.910,82	$3.168.910,82
286	ALFOMBRA PARA EL PRESBITERIO, ALFOMBRA DE COLOR ROJO DE FORMA RECTANGULAR CON BORDE LABRADO DE COLOR DORADO CON EL ESCUDO DE LA PARROQUIA EN EL CENTRO. MEDIDAS 3 M DE LARGO POR 2 M DE ANCHO.	UN	1	$3.884.488,65	$3.884.488,65
287	POSTES SEPARADORES CON CORDON PARA DELIMITAR, POSTE SEPARADOR DE TUBO DORADO, BASE DE LATÓN, RESISTENTE Y DE GRAN ESTABILIDAD, PARA SEPARACIONES DE ÁREAS Y GUIADO PEATONAL, CON UNA ALTURA DE 95 CM, CON CORDÓN TRENZADO COLOR ROJO, SEGÚN MODELO.	UN	30	$434.295,00	$13.028.850,00
288	MUEBLE PARA EL SONIDO, MUEBLE EN MADERA CON PUERTA DE VIDRIO, COLOR CHANTIGIE, EN LA PARTE INTERNA CON 6 COMPARTIMIENTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, EN LA PARTE TRASERA DEBE IR CON UNAS ABERTURAS POR DONDE DEBEN SALIR LOS CABLES PARA LAS CONEXIONES. MEDIDAS ALTO: 1,50 CM LARGO: 1. 10CM, ANCHO: 80 CM, MADERA.	UN	1	$2.646.040,53	$2.646.040,53
289	ARMARIO GRANDE PARA GUARDAR ORNAMENTOS Y VASOS SAGRADOS, EN MADERA, MEDIDAS LARGO: 2,20 MTS, ALTO: 1,80 MTS Y ANCHO: 0,70 MTS, COLOR CHANTIGIE, CON MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS COMO SE MUESTRA EN LOS ANEXOS DE ESPECIFICACIONES, CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS Y GABETEROS.	UN	1	$1.330.942,54	$1.330.942,54
290	ARMARIO GRANDE PARA GUARDAR ORNAMENTOS Y VASOS SAGRADOS, EN MADERA, MEDIDAS LARGO: 2,20 MTS. ALTO: 2,00 MTS Y ANCHO: 0,60 MTS, COLOR CHANTIGIE, CON MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS COMO SE MUESTRA EN LOS ANEXOS DE ESPECIFICACIONES, CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS Y GABETEROS.	UN	1	$5.545.464,60	$5.545.464,60
291	MESA GRANDE PARA REVESTIRSE EL SACERDOTE EN MADERA DE H= 0,90 MTS, A=1,00 MTS Y L=1,60 MTS, COLOR CHANTIGIE, CON MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS ASÍ: PARTE FRONTAL CONSTA DE 6 GAVETAS, EN LA PARTE DE LOS COSTADOS TRAE DOS PUERTAS Y EN SU INTERIOR UNA DIVISIÓN PARA DOS COMPARTIMIENTOS EN LA PARTE DE ARRIBA EN REPISA FLOTANTE CON TRES DIVISIONES.	UN	1	$4.273.462,80	$4.273.462,80
292	SILLA EN MADERA PARA LOS MÚSICOS, SIN BRAZOS, EN TELA COLOR AZUL OSCURO, DIMENSIONES DE 90 CM DE ALTO, 60 CM DE ANCHO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, SEGÚN MODELO.	UN	10	$855.078,60	$8.550.786,00
293	MUEBLE EN MADERA PARA PIANO, COLOR CHANTIGIE, DE 70 CM DE ALTO, 160 CM DE LARGO Y 45 CM DE ANCHO. SEGÚN MODELO.	UN	1	$2.687.803,50	$2.687.803,50
294	GUITARRA ACÚSTICA, PARTE SUPERIOR DE ABETO SITKA CON PARTE TRASERA Y LATERALES DE MADERA DE ARCE, 5 CAPAS SUPERIOR Y TRASERA ENCUADERNACIÓN Y TRADICIONAL DE ESTRELLA DOBLE ROSETA, MÁSTIL DE ARCE CON UN PERFIL REDONDO Y UN COMPUESTO DE COLA DE MILANO CUELLO CONJUNTA, DIAPASÓN DE PALISANDRO Y MADRE DE PERLA CORONA INLAYS, GROVER ROTOMATICS TUNING MÁQUINAS EN ORO.	UN	2	$1.693.750,50	$3.387.501,00

295	CUADRO DE MANDO EN MADERA, COLOR CHANTIGIE, DE 120 CM DE ALTO X 160 CM DE ANCHO, INTERNAMENTE LETRAS EN MAYÚSCULA SOSTENIDA "LINEA DE MANDO ECLESIÁSTICO", ESCUDO DEL OBISPADO CASTRENSE DE COLOMBIA, GRABADO EN VIDRIO DE 30 X 30 CM. SEGÚN MODELO.	UN	1	$1.048.098,60	$1.048.098,60
296	TAPETE PLÁSTICOS DE RECIBIMIENTO, COLOR NEGRO, DE 2 MT. DE LARGO POR 1.50 CM DE ANCHO, CON LA DESCRIPCIÓN BIENVENIDOS, CON LOGO DE LA PARROQUIA.	UN	4	$559.022,35	$2.236.089,40
297	ATRIL CON PLATAFORMA PARA COMENTARIOS EN MADERA MDF Y MADERA EN MADERA ROBLE, COLOR CHANTIGIE., CON ESTANTE INTERNO PARA ALMACENAMIENTO - AJUSTE DE 6.4CM; PARTE SUPERIOR EN ÁNGULO DE 15° PARA UNA VISIÓN ÓPTIMA DEL ALTAVOZ, CON PRÁCTICA BANDEJA PARA BOLÍGRAFOS. SUS MEDIDAS: 1.15 CM DE ALTURA, 50 CM DE ANCHO POR 45 CM DE LARGO.	UN	1	$3.168.910,82	$3.168.910,82
298	SILLA EN MADERA TAPIZADA PARA CONCELEBRANTES CON DESCANSABRAZOS, FABRICADA EN MADERA, COLOR CHANTIGUIE, DE CASTAÑO, TAPIZADA EN TELA DE COLOR OCRE CON 60 CM. DE ANCHO, 55 CM. DE FONDO, LA SILLA TIENE 108 CM. DE ALTO Y MULLIDO EN ASIENTO Y RESPALDO.	UN	6	$1.533.543,90	$9.201.263,40

Piso 2 (Templo)

Casa Cural

299	CAMA DOBLE EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,40 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$2.025.503,63	$2.025.503,63
300	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA.	UN	1	$480.185,87	$480.185,87
301	COLCHON JACQUART DOBLE ACOLCHADO 1,40 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.648.399,24	$1.648.399,24
302	JUEGO DE SABANAS DOBLES PARA COLCHON DE 1,30 X 1,40 MTS DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$157.311,30	$157.311,30
303	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHON DOBLE DE 1,90 X 1.40 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$71.031,36	$71.031,36
304	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
305	MUEBLE MULTIFUNCIONAL EN MADERA, COLOR CHANTIGIE CON ENTREPAÑOS PARA LIBROS Y ESPACIO PARA UBICAR TV, GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS (TENER EN CUENTA IMAGEN). EL TAMAÑO GENERAL DEL MUEBLE ES DE 2.70 CM DE LARGO, 2.30 CM DE ALTO Y 40 CM DE ANCHO.	UN	1	$4.315.939,24	$4.315.939,24
306	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.70 x 0.50 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.603.260,24	$2.603.260,24
307	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59
308	COMEDOR EN MADERA DE OCHO PUESTOS DE 3,00 X 1,00 MTS.	UN	1	$6.053.107,20	$6.053.107,20
309	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
310	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.196.055,20	$2.196.055,20
311	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$1.644.530,40	$1.644.530,40
312	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
313	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46

314	BARRA PARA COCINA, SUPERFICIE EXTREMO CURVO EN AGLOMERADO DE MADERA DE 3,00 X 0,60 MTS, INCLUYE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$3.776.984,36	$3.776.984,36
315	SILLAS TIPO BAR, ACABADO EN TELA VINILICA NEGRA, ESTRUCTURA EN ACERO, ACABADO CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER.	UN	3	$537.483,49	$1.612.450,47
316	CAMA SENCILLA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,00 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$1.703.642,78	$1.703.642,78
317	COLCHÓN JACQUART SENCILLO ACOLCHADO 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.390.388,93	$1.390.388,93
318	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$138.009,30	$138.009,30
319	PROTECTOR AJUSTABLE SENCILLO PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$86.902,43	$86.902,43
320	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
321	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	6	$106.161,00	$636.966,00
	SUBTOTAL PISO 1				$34.316.362.690,51
	PISO 2				

GUARDIA PRINCIPAL (COMPLEJO)

322	RECEPCIÓN PRINCIPAL DE 1,82 X 8,65 MTS, ELABORADA EN CORIAN DUPONTTM CORIAN ES UN MATERIAL PARA SUPERFICIES HOMOGÉNEAS, SÓLIDO Y SIN POROS, COMPUESTO POR ± 1/3 DE RESINA ACRÍLICA (TAMBIÉN DENOMINADA POLYMETHYL METHACRYLATE O PMMA) Y ± 2/3 DE MINERALES NATURALES, EL PRINCIPAL MINERAL ES EL ALUMINIUM TRIHYDRATE(ATH) DERIVADO DE LA BAUXITA, UNO DE LOS COMPONENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO.LLEVA UN SUSTRATO EN AGLOMERADO DE RE ENGRUESE DE 30MLM,CANALETA Y BAJANTE: EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20, LA CANALETA LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS.	UN	1	$11.739.469,40	$11.739.469,40
323	CAJONERA 2X1, LLEVA DOS CAJONERAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO EPOXIC, MICRO TEXTURIZADO, LOS TRES CAJONES LLEVAN CORREDERAS EXTENSIBLES.	UN	5	$533.700,30	$2.668.501,50
324	LÁMPARA; EN ESTRUCTURA METÁLICA CON MEMBRANA DE RECUBRIMIENTO, CON LUZ LED ANCALADA A TECHO MEDIANTE GUAYAS EN ACERO, DISEÑO EN FORMA DE AMEBA.	UN	1	$494.131,20	$494.131,20
325	MURO H= 2.40 MTS X A= 8,65, ELABORADO EN TABLEX ENCHAPADO EN FORMICA F8 SEGÚN DISEÑO, CON MURO DE VEGETACIÓN ARTIFICIAL.	UN	1	$10.647.540,37	$10.647.540,37
326	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO. COLOR NEGRO.	UN	5	$523.187,59	$2.615.937,95
VENTANILLA - ARMERILLO GUARDIA					
327	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.50 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.770.237,45	$1.770.237,45

329	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59
329	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$533.700,30	$533.700,30
330	MUEBLE ARMERILLO DE 1.86 X 0,83 MTS H = 2,25 MTS. COSTADOS, DIVISIONES Y TAPAS EN MADERA CEDRO MACIZA DE e = 2,00 cm, LAS PUERTAS EN MADERA CEDRO CON BISAGRAS DE 3 X 1/2 COBRIZADA, AGARRADERA EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURIA DE SEGURIDAD. PINTURA GENERAL (SELLADO, TINTILLA Y LACA).	UN	3	$6.808.605,58	$20.425.816,74
CONMUTADOR EDIFICIO					
331	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	4	$2.780.777,86	$11.123.111,44
332	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML	4,4	$434.295,00	$1.910.898,00
	CENTRAL DE CÁMARAS				
333	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	12	$2.780.777,86	$33.369.334,32
334	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
335	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	4	$1.014.051,46	$4.056.205,84
336	CREDENZA DE 1,30 X 0,60 X 0,70 H EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPACAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN	6	$1.047.403,73	$6.284.422,38
337	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
338	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 3.58 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.024.874,32	$1.024.874,32

359	CLOSET, MEDIDAS LARGO: 1,00 MTS, ALTO: 2,10 MTS, ANCHO. 0,60 MTS DE ACUERDO A PLANOS CON 4 PUERTAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 15 MM HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS).	UN	1	$2.630.271,84	$2.630.271,84

ALOJAMIENTOS HOMBRES Y MUJERES SEGURIDAD A INSTALACIONES					
360	MUEBLE PARA T.V. EN AGLOMERADO DE MADERA DE 2.79 X 0.69 MTS H=0.75 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$5.227.575,70	$5.227.575,70
361	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	3	$2.196.055,20	$6.588.165,60
362	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
363	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
364	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	2	$1.014.051,46	$2.028.102,92
365	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48
366	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE). MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
367	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
368	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
369	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
370	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
371	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	4	$106.161,00	$424.644,00

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OAC					
372	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L. EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	2	$3.726.457,33	$7.452.914,66
373	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORO DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	2	$7.015.311,90	$14.030.623,80
374	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20

375	SILLA TÁNDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. -NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	2	$1.075.042,99	$2.150.085,98
376	SUPERFICIE DE TRABAJO CURVA DE 2.95 x 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.154.859,37	$2.154.859,37
377	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE, MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	1	$523.187,59	$523.187,59
378	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y DOS SILLAS INTERLOCUTORAS.	UN	7	$6.173.613,52	$43.215.294,64
379	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
DEPOSITO					
380	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	6	$1.168.687,85	$7.012.127,10
BAÑOS					
381	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
GRUPO FINANCIERO					
382	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	3	$6.274.443,44	$18.823.330,32

383	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	13	$3.726.457,33	$48.443.945,29
384	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	3	$8.406.986,10	$25.220.958,30

GRUPO DE CONTRATOS

385	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	10	$3.726.457,33	$37.264.573,30
386	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
387	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	3	$2.196.055,20	$6.588.165,60
388	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE, COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
389	MESA DE JUNTAS DIAMETRO EN AGLOMERADO Y FORMICA D= 1,00 MTS, INCLUYE PATAS.	UN	1	$1.179.680,51	$1.179.680,51
390	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8". EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	4	$410.650,05	$1.642.600,20
391	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	4	$8.406.986,10	$33.627.944,40
392	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FORMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
393	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24

GRUPO DE BIENES RAICES

394	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	7	$3.726.457,33	$26.085.201,31
395	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
396	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
397	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
398	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE, COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
GRUPO LOGISTICO					
399	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	8	$3.726.457,33	$29.811.658,64
400	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
401	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	3	$8.406.986,10	$25.220.958,30
402	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.196.055,20	$2.196.055,20

403	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
ARCHIVO					
404	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	5	$1.168.687,85	$5.843.439,25
BODEGA USUARIOS					
405	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
406	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
Responsable Sistemas de Información					
407	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H, INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	5	$3.726.457,33	$18.632.286,65
408	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	3	$6.274.443,44	$18.823.330,32

409	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	3	$2.780.777,86	$8.342.333,58
410	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS, INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
411	MUEBLE ARMERILLO DE 1.68 X 0,63 MTS H = 2,25 MTS. COSTADOS, DIVISIONES Y TAPAS EN MADERA CEDRO MACIZA DE e = 2,00 cm, LAS PUERTAS EN MADERA CEDRO CON BISAGRAS DE 3 X 1/2 COBRIZADA, AGARRADERA EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURIA DE SEGURIDAD. PINTURA GENERAL (SELLADO, TINTILLA Y LACA).	UN	8	$6.808.605,58	$54.468.844,64
412	CAMA SENCILLA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,00 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$1.703.642,78	$1.703.642,78
413	COLCHON JACQUART SENCILLO ACOLCHADO 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.390.388,93	$1.390.388,93
414	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$135.009,30	$135.009,30
415	PROTECTOR AJUSTABLE SENCILLO PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$86.902,43	$86.902,43
416	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
417	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
Bodega General (Deposito Armamento y Munición) MEBOG					
418	MUEBLE ARMERILLO DE 1.68 X 0,63 MTS H = 2,25 MTS. COSTADOS, DIVISIONES Y TAPAS EN MADERA CEDRO MACIZA DE e = 2,00 cm, LAS PUERTAS EN MADERA CEDRO CON BISAGRAS DE 3 X 1/2 COBRIZADA, AGARRADERA EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURIA DE SEGURIDAD. PINTURA GENERAL (SELLADO, TINTILLA Y LACA).	UN	83	$6.808.605,58	565.114.263,14
Almacenistas de Armamento/ Armeros					
419	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
420	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
421	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	4	$2.780.777,86	$11.123.111,44
422	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 0.78 X 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$976.024,54	$976.024,54
423	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.17 X 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR	UN	1	$1.166.159,19	$1.166.159,19

	BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).				
424	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.00 X 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
425	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.00 X 0.70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.197.387,87	$2.197.387,87
Almacenista de Intendencia					
426	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
Taller - Grupo de Armamento					
427	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	3	$2.780.777,86	$8.342.333,58
428	CLOSET, MEDIDAS LARGO: 2.27 MTS, ALTO: 2,20 MTS, ANCHO: 0,60 MTS DE ACUERDO A PLANOS CON 4 PUERTAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS).	UN	1	$3.549.180,12	$3.549.180,12
429	CLOSET, MEDIDAS LARGO: 1,29 MTS, ALTO: 2,20 MTS, ANCHO: 0,60 MTS DE ACUERDO A PLANOS CON 4 PUERTAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS).	UN	1	$3.071.311,81	$3.071.311,81

430	CLOSET, MEDIDAS LARGO: 4,53 MTS, ALTO: 2,20 MTS, ANCHO: 0,60 MTS DE ACUERDO A PLANOS CON 4 PUERTAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR, (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS).	UN	1	$6.084.308,79	$6.084.308,79
Cuarto de Insumos de Aseo- Grupo de Servicios Generales					
431	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	11	$1.168.687,85	$12.855.566,35
Almacén Auxiliar - Grupo de Servicios Generales					
432	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	6	$1.168.687,85	$7.012.127,10
433	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$2.780.777,86	$5.561.555,72
Baños					
434	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	10	$106.161,00	$1.061.610,00
Bodega General (carpas, mesas, tarimas, etc) Grupo de Servicios Generales					
435	ESTANTERÍA METÁLICA PESADA, COLOR AZUL – AMARILLO, FONDO 1.00 MTS, ANCHO 2.00 MTS, ALTO 2.40 CM, CAPACIDAD DE CARGA 600 KG POR NIVEL ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN POLVO, ESTRUCTURA METÁLICA ACERO COLD ROLLED, ENTRE PAÑOS CON REFUERZOS INTERNOS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. 4 NIVELES, SISTEMA MODULAR, REMOVIBLE Y GRADUABLE.	UN	22	$3.368.468,02	$74.106.296,44
AREA PARA ESCOLTAS (ESQUEMAS DE SEGURIDAD)					
436	LOCKERS PARA 28 CASILLEROS DE 3,15 M X 1.77 M X 0.50 M (ANCHO X ALTO X FONDO), EN AGLOMERADO, MELANINA DE ALTA RESISTENCIA F8, PUERTAS EN AGLOMERADO, CERRADURA PASADOR, CERRADURA CON LLAVE, APERTURA: BISAGRA TIPO "PUSH" O BISAGRA DE CIERRE LENTO.	UN	1	$5.442.198,90	$5.442.198,90
437	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 18. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	8	$410.650,05	$3.285.200,40
438	MESA DE JUNTAS DIAMETRO EN AGLOMERADO Y FORMICA D= 1,00 MTS. INCLUYE PATAS.	UN	2	$1.179.680,51	$2.359.361,02
439	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	6	$2.196.055,20	$13.176.331,20
440	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
441	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24

442	MUEBLE PARA HORNOS MICROONDAS DE 1.20 m x 1.90 m x 0.60 m EN EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 16 MM, MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (Ancho x Alto x Fondo), CON DOS ENTREPAÑOS, PARTE INFERIOR DOS PUERTAS.	UN	1	$1.470.658,80	$1.470.658,80

Enfermeria

443	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y DOS SILLAS INTERLOCUTORAS.	UN	1	$6.173.613,52	$6.173.613,52
444	CAMILLA PARA ENFERMERIA, ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA TAPIZADA ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCA. MEDIDAS CAMILLA, LARGO 1.70 MTS, ALTO 0,70 MTS, ANCHO 0.60 MTS.	UN	1	$945.798,00	$945.798,00

Baños

445	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	10	$106.161,00	$1.061.610,00

Comedor Servicio

446	BARRA PARA COCINA, SUPERFICIE RECTA EN AGLOMERADO DE MADERA DE 2.30 X 0,60 MTS, INCLUYE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$3.217.962,01	$3.217.962,01
447	SILLAS TIPO BAR, ACABADO EN TELA VINILICA NEGRA, ESTRUCTURA EN ACERO, ACABADO CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER.	UN	3	$537.483,49	$1.612.450,47

Despensa

448	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	4	$1.168.687,85	$4.674.751,40

Jefatura Area Administrativa

449	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	3	$3.726.457,33	$11.179.371,99
450	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
451	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS, INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
452	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
455	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	2	$1.014.051,46	$2.028.102,92

454	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
455	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24
456	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44

Grupo de Infraestructura

457	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	4	$3.726.457,33	$14.905.829,32
458	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
459	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
460	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.198.055,20	$2.198.055,20
461	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46

Tesorería MEBOG

462	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	4	$3.726.457,33	$14.905.829,32

463	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
464	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
465	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
466	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
467	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24
Pasillos internos (zonas libres)					
468	SALA DE ESPERA TAPIZADO: MICROFIBRA – VINILICA ESTRUCTURA EN AGLOMERADO Y LAMINA ASIENTO COMPLETO EN ESPUMA DENSIDAD 26 Y COJÍN EN ESPUMA CON DENSIDAD 23 KG/M3. 1.40 X 1.50 MTS	UN	11	$2.673.273,56	$29.406.009,16
469	SILLA PARA SALA DE ESPERA TAPIZADO EM MICROFIBRA, ANCHO 80 CMS, ALTURA 103 CMS, ALTURA ASIENTO 45 CMS, PROFUNDIDAD: 58 CMS, ALTURA ESPALDAR: 66 CMS DIÁMETRO DEL ASIENTO: 47 CMS, ACABADOS BASE EN TUBERÍA CROMADA. ASIENTO COMPLETO Y COJÍN EN ESPUMA CON DENSIDAD 60 KG/M3.	UN	12	$1.147.503,90	$13.770.046,80
SUBTOTAL PISO 2				**$1.722.411.605,15**	

PISO 3

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA - Coordinadores red de apoyo

470	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1.00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	16	$6.274.443,44	100.391.095,04
PRECI - Administrador del Sistema de Información					

471	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
PRECI - Promotores Corresponsabilidad para Prevención					
472	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	4	$6.274.443,44	$25.097.773,76
PRECI - Jefe					
473	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
PRECI - Secretaria					
474	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA	UN	2	$7.015.311,90	$14.030.623,80
Prevención y Educación Ciudadana					
Promotores de cultura y educación ciudadana					
475	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,66 H, INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	18	$3.726.457,33	$67.076.231,94

Analistas y Operadores					
476	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,98 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	20	$3.726.457,33	$74.529.146,60
Secretaría					
477	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA	UN	2	$7.015.311,90	$14.030.623,80
JefeCentro de Información Estrategico Policial Seccional CIEPS					
478	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
479	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA	UN	4	$8.406.986,10	$33.627.944,40
Baños					
480	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Prevención y Educación Ciudadana					
Sala Múltiple 30 personas					
481	SILLA TIPO UNIVERSITARIA ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO PARA ASEGURAR RESISTENCIA Y ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV Y MAYOR SOLIDEZ A LA LUZ. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA REDONDA DE ACERO COLD ROLLED DIAMETRO 7/8" CALIBRE 16 PINTURA ELÉCTROSTATICA EPOXY-POLYESTER. TAPIZADO ASIENTO: INSERTO PLÁSTICO INYECTADO RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO, SUPERFICIE DE ESCRITURA DERECHA O IZQUIERDA EN AGLOMERADO DE 15 MM, CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 Y BALANCE INFERIOR. CANTOS DE PVC 1 MM. ABATIBLE A 90° ANTIPÁTICO, TAPONES EN POLIPROPILENO.	UN	30	$294.708,71	$8.841.261,30
482	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.50 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$1.770.237,45	$3.540.474,90

483	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE, MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
484	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 4.00 X 0.70 MTS H=0,70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FORMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	4	$7.307.425,52	$29.229.702,08
Archivo					
485	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	4	$8.406.986,10	$33.627.944,40
Sala de Juntas					
486	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 8 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
487	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24
Analistas de Proceso IRIS					
488	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	4	$6.274.443,44	$25.097.773,76
Baños					
489	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Comando Operativo de Seguridad Ciudadana -COSEC					
494	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,66 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	4	$3.726.457,33	$14.905.829,32
495	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40

496	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
497	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
498	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA	UN	2	$7.015.311,90	$14.030.623,80

Deposito

499	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	6	$1.168.687,85	$7.012.127,10
Archivo					
500	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
Administrador Sistema Información					
501	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44

Sala de Juntas					
502	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1.80 X 0,80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.840.053,55	$3.840.053,55
503	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	6	$494.519,78	$2.967.118,68
Oficina Comando Operativo de Seguridad Ciudadana - COSEC					

504	PUESTO TIPO GERENCIAL DE 1.90 X 1.90 MTS, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 30 MM RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, LATERALES EN VIDRIO TEMPLADO DE 19MM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, CAJONERA 2 X1: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 FRENTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FROMICA F8, MUEBLE AUXILIAR TIPO "CREDENZA" EN TABLEXY ENCHAPADO EN, LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F-8, CANTOS EN PVC DE 2MM TERMOFUNDIDO. ENTREPAÑOS GRADUABLES Y ARCHIVADOR EMPOTRABLE CON ALMACENAMIENTO EN CAJONES TIPO AUXILIAR Y TIPO CARPETERO, SOPORTES LATERALES EN AGLOMERADO DE 60MM DE ESPESOR EN TABLEX ENCHAPADOS EN FORMICA F8. CONDUCCIÓN ELÈCTRICA: POR VÉRTEBRA CON MULTITOMA A NIVEL DE SUPERFICIE, INCLUYE SILLA GERENCIAL Y DOS SILLAS INTERLOCUTORAS.	UN	1	$4.906.496,19	$4.906.496,19
505	MESA DE JUNTAS DIAMETRO EN AGLOMERADO Y FORMICA D= 1,00 MTS, INCLUYE PATAS.	UN	1	$1.179.680,51	$1.179.680,51
506	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	4	$410.650,05	$1.642.600,20
507	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.196.055,20	$2.196.055,20
508	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.878.248,42	$2.878.248,42
509	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$1.644.530,40	$1.644.530,40
510	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
511	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
Sala de Juntas Comunal					
512	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
513	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24
Oficinas disponibles					
514	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	8	$3.726.457,33	$29.811.658,64
Espacio Disponible					

515	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	9	$3.728.457,33	$33.536.115,97
516	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2,40 X 1,20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
517	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24
518	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44

Sala de Juntas Comunal					
519	MESA LINEAL DE 4,64 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	2	$1.083.820,65	$8.167.641,30
520	MESA LINEAL DE 1.25 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	2	$1.545.704,16	$3.091.408,32
521	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	16	$494.519,78	$7.912.316,48
CIESP Centro de Información Estratégico Policía Seccional					
522	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 16 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	33	$1.594.761,54	$52.627.130,82

523	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	33	$523.187,59	$17.265.190,47
SALA DE JUNTAS COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA -COSEC					
524	MESA DE JUNTAS PARA SALA DE CRISIS, CONFORMADA POR (2) SUPERFICIES FABRICADAS EN AGLOMERADO DE MADERA DE 6.50 X 0.80 MTS Y (2) SUPERFICIES DE 3.10 X 0.80 MTS, TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 80MS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ, DATOS Y AUDIO; CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18; CON LOS COMPONENTES QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS COMO SON: MONITORES ROSOTIZADOS DE 15", MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO, EQUIPOS ACTIVOS DE RED, ENTRE OTROS; INCLUYENDO ILUMINACIÓN TIPO LED QUE PERMITA SU GRADUACIÓN EN DIFERENTES ESCALAS DE COLORES UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE.	UN	1	$7.034.364,61	$7.034.364,61
525	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	30	$494.519,78	$14.835.593,40
SALA DE ESTAR					
526	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	4	$2.196.055,20	$8.784.220,80
527	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE. SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48
SUBTOTAL PISO 3				$804.472.375,83	

PISO 4					
Cuarto Técnico (Archivo)					
528	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS, INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.985,10
Gestión Documental -GUGED					
529	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	18	$3.726.457,33	$67.076.231,94

530	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,50 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$8.274.443,44	$8.274.443,44
531	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
532	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1,80 X 0,80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.840.053,55	$3.840.053,55
533	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	6	$410.650,05	$2.463.900,30

CIEPS					
534	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	2	$3.726.457,33	$7.452.914,66
535	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
536	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90

537	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	11	$3.726.457,33	$40.991.030,63
538	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO. SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
539	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2.90 X 1.10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
540	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$8.274.443,44	$8.274.443,44

Subcomando Policia Metropolitana de Bogotá - SUBCO (despacho)					
541	PUESTO TIPO GERENCIAL DE 2.00 X 2.00 MTS, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 30 MM RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, LATERALES EN VIDRIO TEMPLADO DE 19MM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, CAJONERA 2 X1: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 FRENTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FROMICA F8, MUEBLE AUXILIAR TIPO "CREDENZA" EN TABLEXY ENCHAPADO EN, LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F-8, CANTOS EN PVC DE 2MM TERMOFUNDIDO. ENTREPAÑOS GRADUABLES Y ARCHIVADOR EMPOTRABLE CON ALMACENAMIENTO EN CAJONES TIPO AUXILIAR Y TIPO CARPETERO, SOPORTES LATERALES EN AGLOMERADO DE 60MM DE ESPESOR EN TABLEX ENCHAPADOS EN FORMICA F8. CONDUCCIÓN ELÉCTRICA: POR VÉRTEBRA CON MULTITOMA A NIVEL DE SUPERFICIE, INCLUYE SILLA GERENCIAL Y DOS SILLAS INTERLOCUTORAS.	UN	1	$3.802.592,99	$3.802.592,99
542	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1.80 X 0.80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.840.053,55	$3.840.053,55
543	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.518,78	$2.967.118,68

544	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	1	$3.691.507,50	$3.691.507,50
545	SOFA DE TRES PUESTO TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	1	$3.030.020,47	$3.030.020,47
546	MESAS DE CENTRO ELABORADA EN MADERA NOGAL, CRISTAL DE 10 MM, PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1,00 X 1,00 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	1	$2.508.256,30	$2.508.256,30
547	CAMA DOBLE EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,40 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$2.025.503,63	$2.025.503,63
548	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA.	UN	1	$480.185,87	$480.185,87
549	COLCHON JACQUART DOBLE ACOLCHADO 1,40 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.648.399,24	$1.648.399,24
550	JUEGO DE SABANAS DOBLES PARA COLCHON DE 1,00 X 1,40 MTS DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$157.311,30	$157.311,30
551	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHON DOBLE DE 1,90 X 1,40 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$71.031,36	$71.031,36
552	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
553	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
554	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 1.80 X 0.50 MTS H=2.00 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$3.295.667,26	$3.295.667,26

Oficina Subcomando (zona de trabajo)					
555	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	6	$3.726.457,33	$22.358.743,98
556	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
557	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
558	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
Sala de Juntas Externa (SUBCO)					
559	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
560	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24

Inspección Delegada Especial MEBOG - Control Disciplinario Interno.

561	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	15	$3.726.457,33	$55.896.859,95
562	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
563	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA,	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
Sala de reuniones grupo control disciplinario interno -INSDE CODIN					
564	SILLA TIPO UNIVERSITARIA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA REDONDA DE ACERO COLD ROLLED Ø7/8" CALIBRE 16 PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXY-POLYESTER, TAPIZADO ASIENTO: INSERTO PLÁSTICO INYECTADO RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO. SUPERFICIE DE ESCRITURA DERECHA O IZQUIERDA EN AGLOMERADO DE 15 MM, CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 Y BALANCE INFERIOR. CANTOS DE PVC 1 MM. ABATIBLE A 90° ANTIPÁTICO, TAPONES EN POLIPROPILENO.	UN	30	$293.839,32	$8.815.179,60
565	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	1	$1.594.761,54	$1.594.761,54
566	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18

BAÑOS					
567	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Oficina Comando Metropolitana de Bogotá (despacho)					

568	PUESTO TIPO PRESIDENCIAL (COMANDANTE), ESCRITORIO TOTALMENTE EN CEDRO MACIZO RECUBIERTO EN POLIURETANO, DE 5 CMS DE ESPESOR, CON SUPERFICIE PRINCIPAL DE 240 X 80 CON RETORNO DE 150 X 70, CAJONERA 2 X1 TOTALMENTE EN CEDRO, SOPORTES EN 5 CMS DE ESPESOR , FALDÓN EN CEDRO, CANALETA PARA CABLEADO CON MULTITOMA EN ALUMINIO. CREDENZA TOTALMENTE EN CEDRO MACIZO RECUBIERTO CON POLIURETANO DE 2.40 MTS X 0.50 MTS X 0.73 H, LLEVA MARCO EN 5 CMS DE ESPESOR MOSIZO EN CEDRO CON PUERTAS EN 18MM EN CEDRO MANIJAS Y CERRACURAS. REPISAS EN CEDRO MACIZO RECUBIERTAS EN POLIURETANO, DE ESPESOR 5CMS.	UN	1	$9.877.798,50	$9.877.798,50
569	SILLA PRESIDENCIAL EN CUERO MCL DE PRIMERA CALIDAD, TEÑIDO CON SEMI ANILINA, 100 % PIEL PLENA FLOR, ACABADOS DE REVESTIMIENTO CONTRA POLVO EN LA BASE Y LA ESTRUCTURA, JUNTO CON EL ALUMINIO PULIDO TRADICIONAL, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS CUENTAN CON RUEDAS GIRATORIAS PARA PISOS O ALFOMBRAS.	UN	1	$4.056.205,86	$4.056.205,86
570	SOFA DE TRES PUESTO TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	3	$3.030.020,47	$9.090.061,41
571	MESAS DE CENTRO ELABORADA EN MADERA NOGAL, CRISTAL DE 10 MM, PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1,00 X 1,00 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	2	$2.508.256,30	$5.016.512,60
572	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	2	$3.691.507,50	$7.383.015,00
573	MUEBLE EN MADERA EN CEDRO MACIZO RECUBIERTO EN POLIURETANO DE 6.80 X 0.50 MTS H=2.00 MTS, INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS Y ESPALDAR.	UN	1	$7.856.898,84	$7.856.898,84
574	MESA DE JUNTAS EN MADERA EN CEDRO MACIZO RECUBIERTO EN POLIURETANO SUPERFICIE DE 2,40 X 1.20 MTS	UN	1	$5.417.106,30	$5.417.106,30
575	SILLA PARA MESA DE JUNTAS PRESIDENCIAL EN CUERO MCL DE PRIMERA CALIDAD, TEÑIDO CON SEMI ANILINA, 100 % PIEL PLENA FLOR, ALTURA DE ESPALDAR DE 0.42 MTS APROXIMADAMENTE, ACABADOS DE REVESTIMIENTO CONTRA POLVO EN LA BASE Y LA ESTRUCTURA, JUNTO CON EL ALUMINIO PULIDO TRADICIONAL, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS CUENTAN CON RUEDAS GIRATORIAS PARA PISOS O ALFOMBRAS.	UN	6	$2.281.515,79	$13.689.694,74
576	CAMA DOBLE EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,40 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$2.025.503,63	$2.025.503,63
577	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA.	UN	1	$480.185,87	$480.185,87
578	COLCHON JACQUART DOBLE ACOLCHADO 1,40 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.648.399,24	$1.648.399,24
579	JUEGO DE SABANAS DOBLES PARA COLCHON DE 1,00 X 1,40 MTS DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$157.311,30	$157.311,30
580	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHON DOBLE DE 1,90 X 1,40 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$71.031,36	$71.031,36
581	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
582	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
583	WALK IN CLOSET CON CAJONES, PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM HERRAJES, CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.949.917,95	$2.949.917,95
Recepción Comando MEBOG					
584	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.430.160,40	$4.860.320,80
585	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
586	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	3	$3.691.507,50	$11.074.522,50

587	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22. PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8. VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
588	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 5.00 X 0.5 MTS H=0.70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$6.844.847,38	$6.844.847,38
Enlace SIPOL					
589	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22. PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8. VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
Secretario Privado- Suboficial de Comando y Protocolo					
590	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
591	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22. PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8. VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
Sala de Juntas Interna Comando MEBOG					

592	MESA DE JUNTAS PARA SALA DE CRISIS CONFORMADA POR (2) SUPERFICIES FABRICADAS EN AGLOMERADO DE MADERA DE 2,45 X 0.80 MTS Y (2) SUPERFICIES DE 3.00 X 0.80 MTS, TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ, DATOS Y AUDIO; CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18; CON LOS COMPONENTES QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS COMO SON: MONITORES ROBOTIZADOS DE 15", MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO, EQUIPOS ACTIVOS DE RED, ENTRE OTROS; INCLUYENDO ILUMINACIÓN TIPO LED QUE PERMITA SU GRADUACIÓN EN DIFERENTES ESCALAS DE COLORES UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE.	UN	1	$6.202.036,92	$6.202.036,92
593	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	16	$494.519,78	$7.912.316,48
Funcionarios y Protocolo Comando (áreas comunes)					
594	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	10	$3.726.457,33	$37.264.573,30
595	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
Recepción oficina comando / Subcomando (áreas comunes)					
596	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	3	$7.015.311,90	$21.045.935,70
597	SALA DE ESPERA TAPIZADO: MICROFIBRA – VINILICA ESTRUCTURA EN AGLOMERADO Y LAMINA ASIENTO COMPLETO EN ESPUMA DENSIDAD 26 Y COJÍN EN ESPUMA CON DENSIDAD 23 KG/M3. 1.40 X 1.50 MTS (DE ACUERDO A DISEÑO)	UN	5	$2.415.162,75	$12.075.813,75
Sala de espera y T.V					
598	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.430.160,40	$4.860.320,80
599	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	4	$3.691.507,50	$14.766.030,00
600	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	2	$1.014.051,46	$2.028.102,92

601	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 3.10 X 0.30 MTS H=0.70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$8,937,610,73	$8.937.610,73
602	BARRA RECEPCIÓN DE ALIMENTOS, EN FORMA DE L SUPERFICIES DE 3.60 X 0.50 MTS Y 1.60 X 0,50 MTS EN AGLOMERADO, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE CAJONES.	UN	1	$4.303.380,90	$4.303.380,90

Sala de crisis - Salón Especial

603	MESA DE JUNTAS PARA SALA DE CRISIS (3) SUPERFICIES FABRICADAS EN AGLOMERADO DE MADERA (2) DE 4.60 X 0.80 MTS Y (1) DE 4.56 X 0.80 MTS, EN TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ, DATOS Y AUDIO; CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16; CON LOS COMPONENTES QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS COMO SON: MONITORES ROBOTIZADOS DE 15", MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO, EQUIPOS ACTIVOS DE RED, ENTRE OTROS; INCLUYENDO ILUMINACIÓN TIPO LED QUE PERMITA SU GRADUACIÓN EN DIFERENTES ESCALAS DE COLORES UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE.	UN	1	$10.423.973,98	$10.423.875,98
604	SILLA PRESIDENCIAL EN CUERO, ASIENTO ANCHO: 53 X 48 CM, ESPALDAR CON GABEGERO ANCHO: 45 CM ALTURA: 85 CM, ÓPTIMO SOPORTE LUMBAR, DISPONE DE UN SISTEMA BASCULANTE CON REGULACIÓN DE INTENSIDAD EN LA OSCILACIÓN Y BLOQUEO DE 6 POSICIONES. SISTEMA ANTISHOCK. BRAZOS AJUSTABLES DE ACERO CROMADO CON APOYABRAZOS TAPIZADO EN CUERO. BASE DE ALUMINIO PULIDO CROMADO FIJAS	UN	20	$3.422.423,69	$68.448.473,80
605	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.05 x 0.60 MTS En AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR SAJANTE COLD ROLLED CAL. 16. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$1.052.132,72	$2.104.265,44
606	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO. AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
607	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$533.700,30	$1.067.400,60
608	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00

Sala de estar

Oficina Derechos Humanos					
609	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
610	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
611	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	16	$3.726.457,33	$59.623.317,28
612	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS, INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
Asociación de Obras Sociales (AOS)					
613	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
614	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	2	$3.726.457,33	$7.452.914,66

615	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
616	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
617	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
618	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1.80 X 0.80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.840.053,55	$3.840.053,55
619	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	6	$410.650,05	$2.463.900,30

OFICINA DE PLANEACIÓN - MEBOG

620	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
621	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	1	$3.726.457,33	$3.726.457,33

Responsable Planeación, Gestión Ambiental, Responsable Planeación Estrategica, Responsable Gestión procesos Planeación Servicios de Polica, Mejora. Continua, Doctrina policial y Responsable Plan de Compras

622	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACION 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	26	$3.726.457,33	$96.887.890,58
623	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
624	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA), ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 18. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	8	$410.650,05	$3.285.200,40
625	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.988,10	$8.406.988,10
AULA DE REUNIONES PLANE MEBOG					
626	SILLA TIPO UNIVERSITARIA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA REDONDA DE ACERO COLD ROLLED Ø7/8" CALIBRE 16 PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXY-POLYESTER, TAPIZADO ASIENTO: INSERTO PLÁSTICO INYECTADO RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO. SUPERFICIE DE ESCRITURA DERECHA O IZQUIERDA EN AGLOMERADO DE 15 MM, CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 Y BALANCE INFERIOR. CANTOS DE PVC 1 MM. ABATIBLE A 90° ANTIPÁTICO, TAPONES EN POLIPROPILENO.	UN	30	$293.839,32	$8.815.179,60
627	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	1	$1.594.761,54	$1.594.761,54
628	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
BAÑOS					
629	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Sala de Juntas Externa (circulación) SUBCOMANDO					

630	MESA DE JUNTAS PARA SALA DE CRISIS CONFORMADA POR (2) SUPERFICIES FABRICADAS EN AGLOMERADO DE MADERA DE 2,45 X 0.80 MTS Y (2) SUPERFICIES DE 3.00 X 0.80 MTS, TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FÓRMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 60MS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ, DATOS Y AUDIO; CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18; CON LOS COMPONENTES QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS CON CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS COMO SON: MONITORES ROBOTIZADOS DE 15", MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO, EQUIPOS ACTIVOS DE RED, ENTRE OTROS; INCLUYENDO ILUMINACIÓN TIPO LED QUE PERMITA SU GRADUACIÓN EN DIFERENTES ESCALAS DE COLORES UBICADA EN LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE.	UN	1	$6.202.036,92	$6.202.036,92
631	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	16	$494.519,78	$7.912.316,48
Salas de Juntas Disponibles X 2 (circulación)					
632	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2.40 X 1.20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 8 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	2	$3.562.398,55	$7.124.797,10
633	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	16	$410.650,05	$6.570.400,80
Comando Operativo de Seguridad Ciudadana - COCOR					
634	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
635	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,88 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	20	$3.726.457,33	$74.529.146,60

636	SILLA TÁNDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16, - NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	2	$1.075.042,99	$2.150.085,98
637	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
638	MESA LINEAL DE 4.64 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	2	$4.083.820,65	$8.167.641,30
639	MESA LINEAL DE 1.25 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	2	$1.545.704,16	$3.091.408,32
640	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	16	$494.519,78	$7.912.316,48

AUDITORIO PRINCIPAL DEL COMPLEJO					
641	SILLA PARA AUDITORIO, DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EJES: 54 CM, SENTADERO ABATIBLE POR GRAVEDAD, LATERALES 2 INTERMEDIAS EN MADERA LACADA, EXCELENTE CONFORT Y RESILIENCIA ACÚSTICA. ESPALDAR Y ASIENTO EN PAÑO DE POLIPROPILENO (SPACER NEGRO). PAÑO O TELA VINÍLICA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. COLOR A ESCOGER	UN	280	$623.524,94	174.586.983,2
642	MESA CENTRAL DE 5,00 X 0.8 MTS H= 0,73 CON FALDERO EN MADERA FLOR MORADO O CEDRO PUERTO ASIS. INCLUYE ESCUDO DE LA POLICIA EN BRONCE	UN	1	$7.616.344,90	$7.616.344,90
643	SILLA TIPO UNIVERSITARIA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA REDONDA DE ACERO COLD ROLLED Ø7/8" CALIBRE 16 PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXY-POLYESTER. TAPIZADO ASIENTO: INSERTO PLÁSTICO INYECTADO RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO. SUPERFICIE DE ESCRITURA DERECHA O IZQUIERDA EN AGLOMERADO DE 15 MM. CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 Y BALANCE INFERIOR. CANTOS DE PVC 1 MM. ABATIBLE A 90° ANTIPÁTICO. TAPONES EN POLIPROPILENO.	UN	294	$293.839,32	$86.386.760,08
SUBTOTAL PISO 4				$1.354.860.302,42	

PISO 5
Grupo de Talento Humano MEBOG

644	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	55	$3.726.457,33	204.955.153,15
645	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM, BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	1	$3.691.507,50	$3.691.507,50
646	SILLA TÁNDEM PARA CINCO PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. - NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	4	$1.791.738,31	$7.166.953,24
647	ARCHIVO METÁLICO, DOS PUERTAS, PARTE SUPERIOR CON AGLOMERADO Y FORMICA. ANCHO 0,90 MTS; PROFUNDIDAD 0,50 MTS; ALTO 0,70 MTS	UN	3	$853.148,40	$2.559.445,20
648	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	3	$8.406.986,10	$25.220.958,30
649	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8 SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44

Responsable historias laborales - GUTAH

650	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	19	$3.726.457,33	$70.802.689,27
651	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	24	$8.406.986,10	201.767.666,4

BAÑOS

652	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00

Archivos Rodantes Historias Laborales

Oficina de Asuntos Jurídicos

653	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	24	$3.728.457,33	$89.434.975,92
654	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
655	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
656	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
657	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
658	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$8.274.443,44	$8.274.443,44

Responsable historias laborales - GUTAH					
650	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	19	$3.726.457,33	$70.802.689,27
651	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS, INCLUYE PUERTA.	UN	24	$8.406.986,10	201.767.666,4
BAÑOS					
652	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Archivos Rodantes Historias Laborales					
Oficina de Asuntos Jurídicos					

653	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	24	$3.726.457,33	$89.434.975,92
654	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA . CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORC DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
655	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
656	MESA AUXILIAR EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 0,60 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE. COLOR A ESCOGER.	UN	1	$1.014.051,46	$1.014.051,46
657	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20
658	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS, (incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44

Oficina de Telemática - Mesa de Ayuda					
673	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	16	$2.780.777,86	$44.492.445,76
674	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
Oficina de Telemática					

675	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
676	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	8	$3.726.457,33	$29.811.658,64
677	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
Comunicaciones Estrategicas - COEST					
Sala de Prensa					
678	SILLA TÁNDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. -NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	6	$1.075.042,99	$6.450.257,94
679	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 4.00 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldon en aglomerado).	UN	1	$3.853.650,30	$3.853.650,30
680	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA	UN	4	$523.187,59	$2.092.750,36

	PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.				
681	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	4	$538.700,30	$2.134.801,20
682	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 1.65 X 0.40 MTS H=0.70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$3.210.115,54	$3.210.115,54
Cabina Emisora					
683	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22. CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	2	$3.726.457,33	$7.452.914,66
684	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88
Bodega Impresos - COEST					
685	ARCHIVO METALICO, DOS PUERTAS, PARTE SUPERIOR CON AGLOMERADO Y FORMICA, ANCHO 0,90 MTS; PROFUNDIDAD 0,50 MTS; ALTO 0,70 MTS	UN	3	$853.148,40	$2.559.445,20
Administración de Medios -COEST					
686	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	17	$3.726.457,33	$63.349.774,61
Secretaria COEST					

687	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	1	$7.015.311,90	$7.015.311,90
688	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
689	SILLA TÁNDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. -NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	2	$1.075.042,99	$2.150.085,98
Jefe Comunicaciones COEST					
690	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
Jefe Emisora					
691	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	1	$6.274.443,44	$6.274.443,44
Baños					
692	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Sala de Espera Externa					
693	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1	$2.430.160,40	$2.430.160,40
694	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24
695	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	2	$3.691.507,50	$7.383.015,00

698	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,50 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20, LLEVA CUATRO TROQUELES PARA INSTALACIÓN DE CORRIENTE, VOZ Y DATOS, CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22. PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8, INCLUYE SILLA OPERATIVA.	UN	2	$7.015.311,90	$14.030.623,80
Grupo de Talento Humano - Consultorio Psicosocial					
697	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS, (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	10	$6.274.443,44	$62.744.434,40
Aula No. 2 Grupo Talento Humano					
698	SILLA TIPO UNIVERSITARIA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA REDONDA DE ACERO COLD ROLLED Ø7/8" CALIBRE 16 PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXY-POLYESTER, TAPIZADO ASIENTO: INSERTO PLÁSTICO INYECTADO RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO. SUPERFICIE DE ESCRITURA DERECHA O IZQUIERDA EN AGLOMERADO DE 15 MM, CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 Y BALANCE INFERIOR. CANTOS DE PVC 1 MM. ABATIBLE A 90° ANTIPÁTICO, TAPONES EN POLIPROPILENO.	UN	48	$293.839,32	$14.104.287,36
699	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	2	$1.594.761,54	$3.189.523,08
700	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
SUBTOTAL PISO 5				$1.045.736.613,14	

PISO 6
Seccional de Inteligencia Policial-SIPOL
Seccional de Inteligencia Policial - Jefatura

701	PUESTO TIPO GERENCIAL DE 2.00 X 2.00 MTS, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 30 MM RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, LATERALES EN VIDRIO TEMPLADO DE 19MM DE ESPESOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, CAJONERA 2 X1: FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 FRENTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FROMICA F8, MUEBLE AUXILIAR TIPO "CREDENZA" EN TABLEXY ENCHAPADO EN, LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F-8, CANTOS EN PVC DE 2MM TERMOFUNDIDO. ENTREPAÑOS GRADUABLES Y ARCHIVADOR EMPOTRABLE CON ALMACENAMIENTO EN CAJONES TIPO AUXILIAR Y TIPO CARPETERO, SOPORTES LATERALES EN AGLOMERADO DE 60MM DE ESPESOR EN TABLEX ENCHAPADOS EN FORMICA F8. CONDUCCIÓN ELÉCTRICA: POR VÉRTEBRA CON MULTITOMA A NIVEL DE SUPERFICIE, INCLUYE SILLA GERENCIAL Y DOS SILLAS INTERLOCUTORAS.	UN	1	$3.802.892,99	$3.802.892,99
702	SOFÁ DE TRES PUESTO TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM, BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	1	$3.030.020,47	$3.030.020,47
703	MESAS DE CENTRO ELABORADA EN MADERA NOGAL, CRISTAL DE 10 MM, PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1,00 X 1,00 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	1	$2.508.256,30	$2.508.256,30
704	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 2,40 X 1,20 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FÓRMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	1	$3.562.398,55	$3.562.398,55
705	SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL EN MALLA CON BRAZOS CON BASE CROMADA Y RODACHINES.	UN	8	$494.519,78	$3.956.158,24
SIPOL - Area Administrativa					
706	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	12	$3.726.457,33	$44.717.487,96
707	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	12	$410.650,05	$4.927.800,60
708	ARCHIVO RODANTE METÁLICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10
SIPOL - Sala de Audiencias					

709	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	6	$2.780.777,86	$16.684.667,16
710	SILLA TÁNDEM PARA CINCO PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. -NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	10	$1.791.738,31	$17.917.383,10
SIPOL - Área de operaciones de Inteligencia - Area de Operaciones					
711	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	32	$3.726.457,33	$119.246.634,56
712	SILLA TÁNDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS. CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	1	$1.075.042,99	$1.075.042,99
SIPOL - Jefatura de Operaciones					
713	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	15	$3.726.457,33	$55.896.859,95
SIPOL - Area de Operaciones					
714	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	15	$3.726.457,33	$55.896.859,95
SIPOL - Archivo					

715	ARCHIVO RODANTE METALICO MANUAL DE 2,90 X 1,10 X H=2,15 MTS. INCLUYE PUERTA.	UN	18	$8.406.986,10	$151.325.749,80
Baños					
716	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Alojamiento No.1 Patrulleros Hombres					
717	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O ROR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
718	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR. ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
719	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
720	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
721	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
722	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
723	CLOSET, MEDIDAS 3.62 X 0.63 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 8 PERSONAS.	UN	1	$7.132.551,86	$7.132.551,86
Alojamiento Patrulleros Mujeres					
724	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O ROR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
725	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
726	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
727	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
728	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
729	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
730	CLOSET, MEDIDAS 2.20 X 0.63 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS.	UN	1	$5.932.469,70	$5.932.469,70
731	CLOSET, MEDIDAS 1.10 X 0.63 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS. (DE ACUERDO A DISEÑO)	UN	1	$2.966.717,40	$2.966.717,40

Alojamiento No. 2 Patrulleros Hombres

732	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O FIOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
733	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
734	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
735	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
736	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
737	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	1	$106.161,00	$106.161,00
738	CLOSET, MEDIDAS 2.20 X 0.63 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS.	UN	1	$5.932.469,70	$5.932.469,70
739	CLOSET, MEDIDAS 1.10 X 0.63 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS. (DE ACUERDO A DISEÑO)	UN	1	$2.966.717,40	$2.966.717,40
Alojamiento No. 2 Patrulleros Mujeres					
740	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O FIOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
741	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
742	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
743	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
744	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
745	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
746	CLOSET, MEDIDAS 3.62 X 0.50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS.	UN	1	$7.290.224,83	$7.290.224,83
Alojamiento No. 3 Patrulleros Hombres					
747	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O FIOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
748	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
749	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
750	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90

751	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
752	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
753	CLOSET, MEDIDAS 3.80 X 0.50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS.	UN	1	$7.492.189,57	$7.492.189,57
754	CLOSET, MEDIDAS 2.78 X 0.50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS.	UN	1	$5.481.128,17	$5.481.128,17
Alojamiento No. 4 Patrulleros Hombres					
755	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
756	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
757	JUEGO DE SÁBANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
758	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
759	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
760	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
761	CLOSET, MEDIDAS 3.80 X 0.50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS.	UN	1	$7.492.189,57	$7.492.189,57
762	CLOSET, MEDIDAS 2.78 X 0.50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 4 PERSONAS.	UN	1	$5.481.128,17	$5.481.128,17
Alojamiento No. 5 Patrulleros Hombres					
763	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE). MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
764	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
765	JUEGO DE SÁBANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
766	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
767	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
768	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00

769	CLOSET, MEDIDAS 3.16 X 0,50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 8 PERSONAS.	UN	1	$6.230.347,12	$6.230.347,12
Alojamiento No. 6 Patrulleros Hombres					
770	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O flOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2.00 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
771	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2,00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
772	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
773	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
774	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
775	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
776	CLOSET, MEDIDAS 3.16 X 0,50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 8 PERSONAS.	UN	1	$6.230.347,12	$6.230.347,12
Alojamiento No. 7 Patrulleros Hombres					
777	CAMAROTE DESMONTABLE ELABORADO EN MADERA CEDRO O flOR MORADO, CON SISTEMA DE DESMONTE MEDIANTE TORNILLOS DE ANCLAJE PERMITIENDO SU RÁPIDA INSTALACIÓN, LOGRANDO DOS USOS FUNDAMENTALES, COMO CAMAS INDEPENDIENTES O UNA CAMA SOBRE OTRA (CAMAROTE), MEDIDAS 2,00 MTS DE LARGO X 1,00 MTS DE ANCHO X 1.85 MTS DE ALTO. INCLUYE TENDIDO DE 11 TABLAS CEPILLADAS Y ESCALERA.	UN	1	$2.558.602,31	$2.558.602,31
778	COLCHONETA FORRADA DE 1.00 X 2.00 MTS ESPUMA NARANJA DE 15 CM DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD.	UN	1	$497.654,59	$497.654,59
779	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHONETA DE 1.00 X 2.00 MTS DE 15 CM DE ALTO	UN	1	$99.405,30	$99.405,30
780	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
781	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHONETA1.00 X 2.00 MTS DE 15 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$63.791,71	$63.791,71
782	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
783	CLOSET, MEDIDAS 3.16 X 0,50 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 8 PERSONAS.	UN	1	$6.230.347,12	$6.230.347,12
Casino/Sala de Estar - T.V					
784	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.430.160,40	$4.860.320,80
785	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
786	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48

787	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM, BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	2	$1.651.266,03	$3.302.532,06
788	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 3.10 X 0.30 MTS H=0.70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$6.937.610,73	$6.937.610,73
Baños - Casino/Sala de Estar - T.V					
789	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
Cuarto de Aseo					
790	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	2	$1.168.687,85	$2.337.375,70
Hall Reparto Patrulleros					
791	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 4.00 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8(Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$3.853.650,30	$3.853.650,30
792	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	3	$533.700,30	$1.601.100,90
793	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	3	$523.187,59	$1.569.562,77
SIPOL - GRUPO DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN					
794	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	28	$3.726.457,33	$104.340.805,24

795	SILLA TANDEM PARA TRES PUESTOS. ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LUZ. PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	1	$1.075.042,99	$1,075,042,99
SIPOL- CRI					
796	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.27 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.584.522,16	$2.584.522,16
797	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO. COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
SIPOL- SALA DE MONITOREO					
798	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 2.27 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$2.584.522,16	$2.584.522,16
799	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO. COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
SIPOL- SALAS DE POLIGRAFÍA					
SALA 1 y SALA 2					

800	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,70 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	2	$2.780.777,86	$5.561.555,72
801	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 18, ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	2	$410.650,05	$821.300,10
802	SILLA TÁNDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS, TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16, NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	2	$1.075.042,99	$2.150.085,98
803	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48
SIPOL- CONTRAINTELIGENCIA					
804	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DE L, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, CREDENZA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, DE 1,00 X 0,50 X 0,86 H. INCLUYE SILLA OPERATIVA Y PANTALLAS EN VIDRIOS LAMINADOS 4+4.	UN	37	$3.726.457,33	$137.878.921,21
805	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,85 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,60 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, faldón en formica).	UN	10	$6.274.443,44	$62.744.434,40
806	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.241.927,30	$4.483.854,60
807	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.265.771,24	$2.265.771,24

808	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	2	$3.691.507,50	$7.383.015,00
SUBTOTAL PISO 6				$975.964.797,52	

PISO 7					
ALOAMIENTOS SUBOFICIALES					
809	CAMA SENCILLA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,00 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$1.703.642,78	$1.703.642,78
810	COLCHON JACQUART SENCILLO ACOLCHADO 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.390.386,93	$1.390.386,93
811	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$138.009,30	$138.009,30
812	PROTECTOR AJUSTABLE SENCILLO PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$86.902,43	$86.902,43
813	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
814	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	12	$106.161,00	$1.273.932,00
815	CLOSET, MEDIDAS 2.60 X 0.60 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES; CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 2 PERSONAS.	UN	12	$5.126.234,98	$61.514.819,76
ALOAMIENTOS OFICIALES					
816	CAMA SENCILLA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,00 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$1.703.642,78	$1.703.642,78
817	COLCHON JACQUART SENCILLO ACOLCHADO 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.390.386,93	$1.390.386,93
818	JUEGO DE SABANAS SENCILLAS PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$138.009,30	$138.009,30
819	PROTECTOR AJUSTABLE SENCILLO PARA COLCHON DE 1,00 X 1,90 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$86.902,43	$86.902,43
820	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.	UN	1	$47.289,90	$47.289,90
821	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	14	$106.161,00	$1.486.254,00
822	CLOSET, MEDIDAS 2.60 X 0.60 MTS H= 2.10 CON PUERTAS CORREDIZAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM, HERRAJES; CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS). COMPARTIMIENTO PARA 2 PERSONAS.	UN	14	$5.126.234,98	$71.767.289,72
ALOAMIENTOS TIPO SUITE X 2					
823	CAMA DOBLE EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,40 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN	1	$2.025.503,63	$2.025.503,63
824	COLCHON JACQUART DOBLE ACOLCHADO 1,40 X 1,90 MTS DE 27 CM DE ESPESOR	UN	1	$1.648.399,24	$1.648.399,24
825	JUEGO DE SABANAS DOBLES PARA COLCHON DE 1,00 X 1,40 MTS DE 27 CM DE ALTO	UN	1	$157.311,30	$157.311,30
826	PROTECTOR AJUSTABLE PARA COLCHON DOBLE DE 1,90 X 1,40 MTS DE 27 CMS DE ALTO, COLOR BLANCO	UN	1	$71.031,36	$71.031,36
827	ALMOHADA SILICONADA EN DOBLE FORRO.		1	$47.289,90	$47.289,90
828	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA.	UN	1	$480.185,87	$480.185,87
829	CLOSET, MEDIDAS LARGO: 2,90 X 0,60 MTS, ALTO: 2,20 MTS, ANCHO: 0,60 MTS DE ACUERDO A PLANOS CON 4 PUERTAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS. TUBO OVALADO PORTA GANCHOS).	UN	2	$5.717.723,62	$11.435.447,24

830	CLOSET, MEDIDAS LARGO: 1.80 X 0.70 MTS, ALTO: 2.20 MTS, ANCHO: 0,60 MTS DE ACUERDO A PLANOS CON 4 PUERTAS Y CAJONES ELABORADOS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM HERRAJES: CAJONES CON RIEL TIPO OCULTO Y MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (INCLUYE BISAGRAS, ENTREPAÑOS, TUBO OVALADO PORTA GANCHOS).	UN	2	$3.548.931,91	$7.097.863,82
831	BARRA PARA COCINA, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 2.45 X 0,60 MTS, INCLUYE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE.(SUITE 1 NORTE)	UN	1	$3.224.900,95	$3.224.900,95
832	BARRA PARA COCINA, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 1.30 X 0,60 MTS, INCLUYE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE.(SUITE 2 SUR)	UN	1	$2.508.256,30	$2.508.256,30
833	SILLAS TIPO BAR, ACABADO EN TELA VINILICA NEGRA, ESTRUCTURA EN ACERO, ACABADO CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER.	UN	6	$537.483,49	$3.224.900,94
834	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.430.160,40	$4.860.320,80
835	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$1.644.530,40	$3.289.060,80
836	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS. PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48
Casino/Zona de Estar T.V					
837	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.430.160,40	$4.860.320,80
838	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
839	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48
840	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER, DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	2	$3.691.507,50	$7.383.015,00
841	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 3.10 X 0.30 MTS H=0.70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN FB (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$6.937.610,73	$6.937.610,73
Casino/Estar T.V 2					
842	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.430.160,40	$4.860.320,80
843	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$2.196.055,20	$4.392.110,40
844	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN	2	$2.265.771,24	$4.531.542,48
845	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO 100% CUERO CALIBRE 18, ESTRUCTURA EN MADERA SECA E INMUNIZADA, RELLENO EN MEMORY FOAM. BASE ESCUADRA EN ALUMINIO DE 11 CM DE ALTURA, COLOR A ESCOGER, DE ACUERDO A DISEÑO.	UN	2	$3.691.507,50	$7.383.015,00
846	MUEBLE EN AGLOMERADO DE MADERA DE 3.10 X 0.30 MTS H=0.70 MTS (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN FB (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA.RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UN	1	$6.937.610,73	$6.937.610,73
Baños - Casino/Estar T.V					
847	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
Cuarto de Aseo					
848	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	3	$1.168.687,85	$3.506.063,55

Hall Reparto Oficiales					
849	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 4.00 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8(Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$3.853.650,30	$3.853.650,30
850	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$533.700,30	$1.067.400,60
851	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
Hall Reparto Suboficiales					
852	SUPERFICIE DE TRABAJO DE 4.00 x 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, PANELES FRONTALES Y CORNIZA EN SUPERCORD DE 3 CMS DE ESPESOR EN AGLOMERADO ENCHAPADOS EN FORMICA F8, VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO, CAUNTER EN FORMICA Y VIDRIO LAMINADO BLANCO HIELO CON BUJES EN ACERO, SOPORTES EN AGLOMERADO DE 6 CMS ENCHAPADOS EN FORMICA F8(Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	1	$3.853.650,30	$3.853.650,30
853	ARCHIVO 2X1 CON TAPAS EN LOS CAJONES EN AGLOMERADO, FORMICA Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN	2	$533.700,30	$1.067.400,60
854	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR, MANUALMENTE AJUSTABLE EN ALTURA, MEDIO ALTO RECLINABLE CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD, ASIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 42 +/-3, SILLA GIRATORIA, ESTRELA DE 5 PATAS EN NYLON COLOR NEGRO DE 50 MM DIAMETRO, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO, MOVIMIENTO SINCRONIZADO DEL ASIENTO Y LA ESPALDA, PERILLA PARA AJUSTE MANUAL DE TENSIÓN, AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. RESPALDO CONTORNEADO ERGONÓMICAMENTE. MECANISMO CON MOVIMIENTO SINCRONIZADO DE ASIENTO Y ESPALDAR, CON UNA PALANCA Y TRES POSICIONES DE BLOQUEO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO. BRAZOS AJUSTABLES ALTURA Y ANCHO, COLOR NEGRO.	UN	2	$523.187,59	$1.046.375,18
Gimnasio					
855	MAQUINA TROTADORA TRAFICO PESADO	UN	5	$6.708.268,23	$33.541.341,15
856	BICICLETA ESTATICA	UN	5	$2.211.693,78	$11.058.468,90
857	MULTIGIMNASIO TRÁFICO PESADO	UN	2	$4.584.225,00	$9.168.450,00
858	BANCO PARA ABDOMEN INCLINABLE TRÁFICO PESADO	UN	2	$1.093.458,30	$2.186.916,60
859	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00

860	ESTANTERIA METALICA DE 0,40 X 0,90 X 2,00 MTS	UN	1	$1.168.687,85	$1.168.687,85
Recinto Para Orar					
861	BANCAS CON ARRODILLADEROS, MUEBLE LARGO DE ESTRUCTURA EN MADERA, COLOR CHANTIGIE, EN LA PARTE TRASERA LLEVA UN ARRODILLADERO, TAPIZADO EN TELA O HULE ACOLCHADO, LA SILLA QUE SE PUEDE TRANSFORMAR EN RECLINATORIO PLEGANDO EN LA PARTE TRASERA ASÍ MISMO LLEVA UN ESPACIO PARA COLOCAR LOS LIBROS. SUS MEDIDAS SON DE 3.60 MTS DE LARGO 0.43 MTSDE ALTO 0.47 MTS DE PROFUNDIDAD. LOS RECLINATORIOS DEBEN TENER UN ANCHO DE 14 CM, SEGÚN MODELO.	UN	1	$4.135.867,36	$4.135.867,36
862	BANCAS CON ARRODILLADEROS, MUEBLE LARGO DE ESTRUCTURA EN MADERA, COLOR CHANTIGIE, EN LA PARTE TRASERA LLEVA UN ARRODILLADERO, TAPIZADO EN TELA O HULE ACOLCHADO, LA SILLA QUE SE PUEDE TRANSFORMAR EN RECLINATORIO PLEGANDO EN LA PARTE TRASERA ASÍ MISMO LLEVA UN ESPACIO PARA COLOCAR LOS LIBROS. SUS MEDIDAS SON DE 2.27 MTS DE LARGO 0.43 MTSDE ALTO 0.47 MTS DE PROFUNDIDAD. LOS RECLINATORIOS DEBEN TENER UN ANCHO DE 14 CM, SEGÚN MODELO.	UN	1	$3.945.661,70	$3.945.661,70
863	BANCAS CON ARRODILLADEROS, MUEBLE LARGO DE ESTRUCTURA EN MADERA, COLOR CHANTIGIE, EN LA PARTE TRASERA LLEVA UN ARRODILLADERO, TAPIZADO EN TELA O HULE ACOLCHADO, LA SILLA QUE SE PUEDE TRANSFORMAR EN RECLINATORIO PLEGANDO EN LA PARTE TRASERA ASÍ MISMO LLEVA UN ESPACIO PARA COLOCAR LOS LIBROS. SUS MEDIDAS SON DE 1.68 DE LARGO 0.43 MTSDE ALTO 0.47 MTS DE PROFUNDIDAD. LOS RECLINATORIOS DEBEN TENER UN ANCHO DE 14 CM, SEGÚN MODELO.	UN	1	$2.599.979,40	$2.599.979,40
PELUQUERÍA OFICIALES					
864	TOCADOR PARA PELUQUERÍA MEDIDAS 0.95 MTS DE ANCHO X 1.80 MTS DE ALTO, EN AGLOMERADO DE DE 15 MM, CON TRES CAJONES, (INCLUYE ESPEJO Y REPISAS) COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.687.803,50	$2.687.803,50
865	SILLA PARA PELUQUERÍA, GIRATORIA 360 GRADOS, CON REPOSAMUÑECAS Y BASE CUADRADA, BASE ACERO CROMADO. ALTURA AJUSTABLE, LA ALTURA DE ESTA SILLA ES AJUSTABLE POR LA PALANCA INFERIOR, MÁXIMO A 5 PULGADAS, QUE SE ADAPTA A DIFERENTES CLIENTES. ADEMÁS, EL REPOSABRAZOS ES DE MADERA MACIZA, ASIENTO Y ESPALDAR EN CUERO SINTÉTICO O PRANNA COLOR NEGRO. INCLUYE DESCANSA PIES CROMADO.	UN	1	$2.417.575,50	$2.417.575,50
866	SILLÓN LAVA CABEZAS PARA SHAMPOO, PARA SALÓN/PELUQUERÍA. CÓMODO ELEGANTE CON BRAZOS. POSO DE CERÁMICA. TAPIZADOS DE COLOR A ESCOGER MEDIDAS 1.30 X 0.65 X 0.97 MTS.	UN	1	$2.369.671,90	$2.369.671,90
867	SILLA TÁNDEM PARA CUATRO PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. -NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	1	$1.853.957,10	$1.853.957,10
PELUQUERÍA SUBOFICIALES					
868	TOCADOR PARA PELUQUERÍA MEDIDAS 0.95 MTS DE ANCHO X 1.80 MTS DE ALTO, EN AGLOMERADO DE DE 15 MM, CON TRES CAJONES, (INCLUYE ESPEJO Y REPISAS) COLOR A ESCOGER.	UN	1	$2.687.803,50	$2.687.803,50
869	SILLA PARA PELUQUERÍA, GIRATORIA 360 GRADOS, CON REPOSAMUÑECAS Y BASE CUADRADA, BASE ACERO CROMADO. ALTURA AJUSTABLE, LA ALTURA DE ESTA SILLA ES AJUSTABLE POR LA PALANCA INFERIOR, MÁXIMO A 5 PULGADAS, QUE SE ADAPTA A DIFERENTES CLIENTES. ADEMÁS, EL REPOSABRAZOS ES DE MADERA MACIZA, ASIENTO Y ESPALDAR EN CUERO SINTÉTICO O PRANNA COLOR NEGRO. INCLUYE DESCANSA PIES CROMADO.	UN	1	$2.417.575,50	$2.417.575,50
870	SILLÓN LAVA CABEZAS PARA SHAMPOO, PARA SALÓN/PELUQUERÍA. CÓMODO ELEGANTE CON BRAZOS. POSO DE CERÁMICA. TAPIZADOS DE COLOR A ESCOGER MEDIDAS 1.30 X 0.65 X 0.97 MTS.	UN	1	$2.369.671,90	$2.369.671,90

871	SILLA TÁNDEM PARA CUATRO PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. -PATAS EN ALUMINIO Y TUBO ELÍPTICO CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA O GRIS. -TRAVESAÑO EN TUBO DE ACERO CR RECTANGULAR DE 1X3", CALIBRE 16. -NIVELADORES EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA -MESA PARA TÁNDEM CON ACABADO EN FÓRMICA Y CANTO RÍGIDO.	UN	1	$1.853.957,10	$1.853.957,10
Baños					
872	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	9	$106.161,00	$955.449,00
Comedor General					
873	MESAS PARA CAFETERÍA, ESTRUCTURA DE 1 1/4" CALIBRE 16, SOPORTE TAPA EN LÁMINA CALIBRE 16, CONECTOR DE PATAS EN TUBERÍA 1,9 CALIBRE 16, NIVELADORES ROTULADOS EN ABS, PORTA NIVELADORES EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA DESENSAMBLABLE, PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA, SUPERFICIE EN TABLERO AGLOMERADO FENOLICO DE 25 MM CON LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN FORMICA MÁS BALANCE CON PVC RIGIDO 2 MM. MEDIDAS DE 1,80 X 0,70 MTS.	UN	24	$619.224,76	$14.861.394,24
874	SILLA CONCHA EN POLIPROPILENO, TRATAMIENTO ANTI UV Y ANTIESTÁTICO, ESTRUCTURA CUATRO (4) PATAS FABRICADA EN TUBO D. 19 MM ESPESOR 1,5 MM, CROMADA.	UN	144	$336.846,81	$48.505.940,64
Comedor Oficiales					
875	COMEDOR EN MADERA DE CUATRO PUESTOS DE 1,00 X 1,50 MTS.	UN	8	$3.772.575,90	$30.180.607,20
Cocina					
876	CAMPANA EXTRACTORA; TIPO ISLA PARA CUBRIMIENTO DE AREA CALIENTE FABRICADA INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE 430 CALIBRE 20 FILTROS EN FORMA DE LABERINTO INCLUYE LUZ, NO INCLUYE MOTOR NI DUCTERIA. DIM. 2,40X2,60X0,70 (Incluye Ductería de 0,50 x 0,40 en lámina galvanizada)	UN	1	$8.846.775,11	$8.846.775,11
877	MESA CENTRAL TAPA LISA CUBIERTA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18, SIN SALPICADERO, BORDE REDONDEADO Y LEVANTADO SOBRE EL NIVEL DE LA CUBIERTA. INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL EN PARTE INFERIOR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 T430 Y REFUERZOS TRANSVERSALES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE 430 CALIBRE 20. AMARRES EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE 1 1/4& DE DIÁMETRO. PATAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, DE 1 5/8& DE DIÁMETRO, CON BASES NIVELADORAS EN ALUMINIO., SIN ENTREPAÑO, DIMENSIONES 2,27X0,70X0,90 (INCLUYE AZAFATES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1	$8.096.223,90	$8.096.223,90
878	MESA DE APOYO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRE 18, CON SALPICADERO EN LA PARTE DE CONTACTO CON LA PARED, ENTREÑO EN 430. MONTADO SOBRE PATAS TUBULARES EN ACERO CON AJUSTES A NIVEL EN ALUMINIO. DIMENSIONES 0,50X0,90X0,90	UN	1	$3.001.584,41	$3.001.584,41
879	MUEBLE BANDEJERO CUBIERTERO TAPA SUPERIOR EN GRANITO NEGRO REFERENCIA SAN GABRIEL CON 6 AZAFATES CIRCULARES EMPOTRADOS. REMOBIBLES PARA CUBIERTOS, AREA PARA BANDEJAS FABRICADA EN ACERO INOX 304 SATINADO ESTRUCTURA MONTADA SOBRE PATAS CON AJESTES A NIVEL Y/O RUEDAS DE 4 PULGADAS 2 FIJAS Y 2 LOCAS DIM 0,80X0,70X0,90	UN	1	$3.001.584,41	$3.001.584,41
880	LICUADORA INDUSTRIAL, HECHA PARA EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 15 LT, ELABORADA CON LOS MAYORES ESTÁNDARES DE CALIDAD, 110 V 1 FASE.	UN	1	$7.898.906,35	$7.898.906,35

881	PROCESADOR DE ALIMENTOS PROCESADOR DE VEGETALES. EQUIPO ROBUSTO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA CON PRODUCCIÓN DE HASTA 250KG/H Y UN RENDIMIENTO DE 5KG/MIN. LOS ACCESORIOS QUE ESTÁN EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS SON DESMONTABLES PARA OBTENER UNA LIMPIEZA PERFECTA Y EVITAR CONTAMINACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. EL EQUIPO CONSTA DE TOLVA SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA CORTAR HORTALIZAS VOLUMINOSAS LA CUAL NOS PRESTA LA POSIBILIDAD DE PROCESAR HASTA 10 TOMATES EN UNA SOLA OPERACIÓN.110 VOLT. 1 FASE INCLUYE 5 DISCOS DE CORTE.	UN	1	$2.053.715,65	$2.053.715,65
882	MESA DE TRABAJO EN "L" CON DOBLE ENTREPAÑO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304-2B CALIBRA 18, CON SALPICADERO EN LA PARTE DE CONTACTO CONLA PARED, DOBLE ENTREÑO EN 430. MONTADO SOBRE PATAS TUBULARES EN ACERO CON AJUSTES A NIVEL EN ALUMINIO. DIMENSIONES 3,75X0,70X0,90	UN	1	$5.051.333,40	$5.051.333,40
883	MESA DE REFRIGERACIÓN 2 PUERTAS: MESA DE TRABAJO REFRIGERADA DE 2 PUERTAS, CON CAPACIDAD DE 340LT. FABRICACIÓN DEL EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y DEL INTERIOR CON PAREDES EN ABS, PISO EN ACERO INOXIDABLE Y TECHO EN ALUMINIO PINTADO. TEMPERATURA: 0°C /+ 7°C. 110 VOLTIOS 1 FASE. GAS REFRIGERANTE R134A.	UN	1	$14.683.031,40	$14.683.031,40
884	MOLINO DE CAFÉ MOLINO DOSIFICADOR INDUSTRIAL, CREADO PARA MOLER CAFÉ EN GRANO, EQUIPO DE MOLIENDA MANUAL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DOSIFICACIÓN AJUSTABLE, CAPACIDAD DE TOLVA DE 1KG, DOSIFICA DE ACUERDO CON LA MOLIENDA QUE SE REQUIERA EN LA MÁQUINA ESPRESSO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA TAZA DE CAFÉ. 110 V 1 FASE.	UN	1	$831.912,50	$831.912,50
885	DISPENSADOR DE JUGOS 3 JUGOS DISPENSADOR DE JUGO, CON CONTENEDORES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ATOXICO, PRÁCTICOS DE EXTRAER PARA UN FÁCIL ASEO. DOTADOS DE ESCALA GRADUADA PARA LA PREPARACIÓN EXACTA DE LA BEBIDA, GRIFOS DE ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO. SU REFRIGERACIÓN SE EFECTÚA POR MEDIO DE UN COMPRESOR HERMÉTICO, ENFRIADO MEDIANTE AIRE FORZADO. CADA TANQUE CON CAPACIDAD DE 18 LT PARA UN TOTAL DE 54 LT DE CAPACIDAD, 110 V, 1 F.	UN	1	$18.051.230,40	$18.051.230,40
886	SANDUCHERA DOBLE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE. DOS PLANCHAS ESTRIADAS EN FUNDICIÓN DE HIERRO, CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. LUZ PILOTO DE "ENCENDIDO" Y "LISTO". RECOLECTOR DE GRASAS. DIMENSIONES: 48 X 40 X 24 CM. POTENCIA: 1.800 WH., 220 V.	UN	1	$252.856,20	$252.856,20
887	HORNO MICROONDAS. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE. USO COMERCIAL. TRABAJO PESADO. ESPECIAL PARA DOBLES PORCIONES. DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. 10 BOTONES PROGRAMABLES EN DIFERENTES OPCIONES. MEMORIA ANTI FALLOS DE LUZ. RELOJ INDICADOR DE GRAN VISIBILIDAD. IDEAL PARA CALENTAR UN GRAN VOLUMEN DE ALMUERZOS.	UN	1	$1.502.660,70	$1.502.660,70
888	HORNO COCCION RAPIDA COCCIÓN POR CONVECCIÓN, RÁPIDA Y UNIFORME. PERMITE INYECTAR VAPOR PARA EVITAR QUE LOS ALIMENTOS SE RESEQUEN. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO BANDEJAS DE 35 X 35 CM C/U. AMPLIO VISOR FRONTAL EN VIDRIO TEMPLADO. PANEL FRONTAL DIGITAL, CON CONTROL DE TEMPERATURA, TEMPORIZADOR	UN	1	$1.747.567,27	$1.747.567,27
889	ESTANTERIA IMPORTADA TRES (3) MODULOS DE CUATRO (4) ENTREPAÑOS PARA ALMACENAMIENTO.	UN	2	$1.769.355,02	$3.538.710,04
890	ESTANTERIA EN POLIURETANO CON 4 ENTREPAÑOS	UN	2	$919.432,70	$1.838.865,40
Baños Cocina					
891	PAPELERA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE DE 5 LTS.	UN	2	$106.161,00	$212.322,00
COMPLEMENTARIOS					
892	SEÑALIZACION EN ACRILICO CRISTAL DE 10 MM, DE 28 X 20 CM, O DE ACUERDO A LAS DIMENCIONES ESPACIALES.	UN	1	$88.467,75	$88.467,75

893	BANDERA DE COLOMBIA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	1	$353.871,01	$353.871,01
894	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	1	$353.871,01	$353.871,01
895	BANDERA DE LA METROPOLITANA DE BOGOTA DE 1,35 MTS DE ANCHO X 1,10 MTS DE ALTO, BORDADA A MANO, SATÍN RASO, GUSANILLO DE ORO Y SEDAS FINAS CON FLECO EN LA PUNTA DE LA BANDERA DE 5 CMS Y EN LA PUNTA DEL MOÑO FLECO DE ORO DE 8 CMS.	UN	1	$353.871,01	$353.871,01
896	ASTAS EN MADERA CON LA PUNTA EN FORMA DE ROMBO EN BRONCE.	UN	1	$379.147,51	$379.147,51
897	SOPORTES EN MADERA MASILLADOS, LIJADOS, PINTADOS Y LACADOS.	UN	1	$486.410,40	$486.410,40
898	BANDERA DE COLOMBIA DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN	1	$606.636,00	$606.636,00
899	BANDERA DE LA METROPOLITANA DE BOGOTADE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN	1	$606.636,00	$606.636,00
900	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN	1	$707.742,00	$707.742,00
901	CUADRO LINEA DE MANDO EN ACRÍLICO ALTO 50 CMS, LARGO: 160 CM (ver anexos para referencia)	UN	1	$869.827,26	$869.827,26
902	GALERIA DE COMANDANTES DE 160 CM X 140 CM, EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE, 22 A 20, ELECTROSTÁTICO GRIS CLARO, SUJETO A LA PARED CON HERRAJES CILÍNDRICOS DE ALUMINIO Y/ O ACERO NIQUELADO, TAMAÑO FOTOGRAFÍAS: 20 X 25 CM TIPO DE LETRA: ARIAL BOLD, 40 PTS, ALTAS Y BAJAS "RANGO" Y ARIAL REGULAR, 40 PTS, ALTAS Y BAJAS "NOMBRE Y CARGO" (ver anexo)	UN	1	$2.691.663,90	$2.691.663,90
903	DISPENSADOR DE AGUA TIPO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO, MEDIDAS FONDO 0.37 MTS X ANCHO 0.31 MTS X ALTO 1.00 MTS, CAPACIDAD 2 LITROS, USO PRACTICO CON BOTONES Y FÁCIL LIMPIEZA.	UN	1	$859.401,01	$859.401,01
904	PERCHEROS EN MADERA, HERRAJE METALICO X4, FONDO 28,5 CM, ANCHO 34 CM, ALTO 149 CM, ALTO TOTAL 149 CM.	UN	1	$492.891,76	$492.891,76
905	BACKING MOVIL, FONDO BLANCO – LETRA NEGRA - ESCUDO VERDE, FONDO 5 CM, ANCHO 5 M, ANCHO 5 M, PANELES DE ACRÍLICO 1X2,5M, 5 PANELES ACRÍLICOS ARMABLES.	UN	1	$3.885.092,54	$3.885.092,54
906	PANEL DECORATIVO SALA DE PRENSA MDF LAMINADO, ENCHAPE EN LAMINADO, COLOR ROBLE NUEVO MEDIC, FONDO 5 CM, ANCHO 4,5 M, ALTO PISO A TECHO, PANELES DE MDF DE 4X7X2,5 METROS, LETRAS EN ACRÍLICO E= 5MM 10X11 CM. NOTA ACLARATORIA: LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS SON TAN SOLO UNA REFERENCIA YA QUE DEBERÁN SER OBJETO DEL ÁREA DISPONIBLE EN LOS PLANOS FINALES.	UN	1	$4.928.917,56	$4.928.917,56
907	MACETAS EN MADERA AGLOMERADA, PARA VEGETACIÓN - MOBILIARIO DECORATIVO, COLOR WENGUÉ, FONDO 45CM, ANCHO 1,35 M, ANCHO 1,35 M, INCLUYE 6 RODACHINES NEGROS 5 CM DE ALTO, VEGETACIÓN ARTIFICIAL POR MACETA.	UN	1	$733.018,50	$733.018,50
908	TABLERO ACRÍLICO MEDIDAD 1.94 X 1.17 X 0.66 MTS, ESPESOR TABLERO 2 CM BASE EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR SUPERCOR, SUPERFICIE RAYABLE Y PORTA-BORRADOR, FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO DE 18 MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BASE CON 4 RODACHINAS EN PVC BLANCO TIPO PLATAFORMA, CADA UNA CON SISTEMA DE FRENO PARA BLOQUEO DE TODO EL TABLERO.	UN	11	$1.529.583,50	$16.826.518,50
909	DESCANSA PIES COLOR NEGRO 40 X 30 X 14,5 CM, SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PESO 2 KG, INCLINACIÓN DE 0 -35°, ALTURA MÁXIMA 14.5 CM, ALTURA MÍN. 10 CM.	UN	1	$421.748,70	$421.748,70
910	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD MÍNIMO PARA 16 HOJAS; DESTRUYE TARJETAS DE CRÉDITO, CD Y DVD (UNO A LA VEZ) TRITURA PAPEL, TAMAÑO DE CORTE 16 HOJAS (DIN A4/80G/M2) 1CD/DVD, VOLTAJE DE ENTRADA 110 VAC/60 HZ.	UN	1	$2.780.415,04	$2.780.415,04

	- HOJA DE MICRO CORTE.				
	- NIVEL DE SEGURIDAD P3.				
	- AUTOMÁTICO PARA DESPEJAR ATASCOS INTELIGENTES.				
	- AUTOLIMPIEZA DE CORTADORES.				
911	BANCO DE TRABAJO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE ARMAS DE FUEGO CORTAS Y LARGAS, ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y PUESTOS DE TRABAJO, FONDO 60 CMS, ANCHO 210 CMS, ALTO 90 CMS, ALTO TOTAL 250 CMS, ESTRUCTURA METÁLICA CON TERMINADOS EN SOLDADURA MIG.	UN	1	$9.438.678,00	$9.438.678,00
	- 1 BASE METÁLICA RESISTENTES A ALTAS CARGAS DE PESO.				
	- 3 CAJONES METÁLICOS DE FONDO 50 CMS, ANCHO 41 CMS Y ALTO 15 CMS CON CORREDERAS DE ALTA RESISTENCIA.				
	- 1 COMPARTIMIENTO METÁLICO CON PUERTAS ABISAGRADAS Y CIERRE DE SEGURIDAD.				
	- 1 SOPORTE METÁLICO CON ILUMINACIÓN LED.				
	- 1 REPISA DE FONDO 30 CMS CON UN REBORDE DE 15 CMS PARA EVITAR LA CAÍDA DE OBJETOS.				
	- 2 TABLEROS PORTAN HERRAMIENTAS.				
	- 2 CANALETAS METÁLICAS CON 1 PARADA DE EMERGENCIA, 1 BOMBILLO DE ENCENDIDO EN LUZ LED, 1 INTERRUPTOR, 2 BANANAS Y 6 TOMAS LEVITÓN DOBLES.				
	ESTRUCTURA METÁLICA CON LAMINA SUPERIOR CR CALIBRE 12 PARA TRABAJO PESADO, CON EL FIN DE INSTALAR UN TALADRO TIPO ÁRBOL, UN ESMERIL, UN TORNO S/M Y UNA PRENSA.				
	1 SOPORTE PARA EL MONTAJE, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE ARMAS LARGAS Y CORTAS.				
912	DESHUMIDIFICADOR, APARATO QUE REDUCE LA HUMEDAD AMBIENTAL FILTRANDO EL AIRE DE UNA HABITACIÓN Y DEPOSITANDO EL AGUA RESULTANTE DE LA CONDENSACIÓN EN UN DEPÓSITO PARA ELLO.	UN	1	$1.642.972,52	$1.642.972,52
913	ARMARIO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁMARAS, ALMACENAMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO Y FOTOGRÁFICAS CON SUS ACCESORIOS, COLOR NEGRO O GRIS, DE 0,60 X 1,40 X 1,80 MTS, ESTRUCTURA METÁLICA CON RECUBRIMIENTO E PINTURA ELECTROSTÁTICA, GAVETEROS FABRICADOS EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. PUERTAS ABISAGRADAS CON MANIJAS Y CIERRE DE ALTA SEGURIDAD.	UN	2	$3.652.454,29	$7.304.908,58
914	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL	UN	1	$3.917.857,55	$3.917.857,55
	- Uso del producto: Calentar, descongelar y cocinar				
	- Capacidad: Área util interior 12 pies cúbicos (34 litros)				
	- Caracteristicas especificas: Salida de energia 1200 vatios				
	- luz interior				
	- temperatura máxima 248 grados centigrados				
	- Voltaje: 110 voltios				
	- Fases: Monofásico				
	- Frecuencia: 60 hertz				
915	PLANOTECA COLOR BLANCA, BASE 0,20 DE ALTO, 1,15 DE FRENTE, 0,85 DE FONDO, FRENTE: 1,15 MTS, ALTO 0,55 MTS, FONDO: 0,85 MTS, ELECTROSTÁTICA, FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED, CON 5 GAVETAS, SOPORTADAS SOBRE CORREDORAS DE EXTENSIÓN TOTAL DE 0,60 MTS * 100 LBS, DOBLE CHAPA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA, TERMINADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS CLARO GOFRADO HERRAJE METÁLICO XS.	UN	1	$1.124.804,27	$1.124.804,27
916	SOPORTE PARA TELEVISOR MÓVIL CON ACABADO DE ALTA CALIDAD Y ASPECTO, INCLUYE COLUMNAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO RÍGIDAS Y RESISTENTES PARA SOPORTAR UNA PANTALLA TOTAL DE 1524 MM (60") Y UN PESO MÁXIMO DE 36 KG (80 KG), LA BANDEJA DE LA CÁMARA ESTÁNDAR Y LOS ACCESORIOS ESTANTE AV. BASE DE CONTORNO DE ALUMINIO GRANDE Y RÍGIDA PARA PROPORCIONAR UN BUEN EQUILIBRIO Y UN BUEN SOPORTE DE PESO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD.	UN	5	$492.891,76	$2.464.458,80

917	BUZÓN DE SUGERENCIAS EN MADERA MÓDULO 1 DE 27 CM X 12CM X 33 CM, MÓDULO 2 DE 8CM X 14 CM X 12 CM.	UN	2	$366.738,00	$733.476,00
918	SEÑALIZACIÓN BRAILLER PARA LAS PERSONAS INVIDENTES Y SEÑALIZACIÓN EN IDIOMA CASTELLANO ESTA SEÑALIZACIÓN DEBE CONTENER EL NOMBRE DE LA "OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO" UNA DE ELLAS CORRESPONDE AL BAÑO HOMBRES, MUJERES Y BAÑO DE DISCAPACITADOS CADA UNA DE ELLA EN BRAILLE, EN ACRILICO.	UN	1	$164.329,47	$164.329,47
919	GRECA CAPACIDAD 120 TINTOS, ALTO 75 CM, CONSUMO ENERGÍA 1800 WATTS, FILTRO TELA, FONDO 32 CM EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26.	UN	2	$1.137.442,51	$2.274.885,02
920	ATRIL EN MADERA DE ACUERDO A DISEÑO	UN	1	$1.516.590,02	$1.516.590,02
921	PURIFICADOR DE AIRE, FILTRACIÓN HEPA CON FILTRO DE POLVO ULTRAFINO. • 04 FILTROS DE REPUESTO. • CAPACIDAD 60 M2, • NIVEL DE RUIDO 48DBA. • PREFILTROS, • RECOLECCIÓN DE POLVO, • FILTRO DESODORIZANTE."	UN	1	$2.988.914,70	$2.988.914,70
922	CAJA DE MADERA COLOR CAFÉ PARA ALMACENAMIENTO DE TELÉFONOS MÓVILES EN SALA DE REUNIONES DE 30 X 30 X 45 CM HECHA EN MADERA DE PINO.	UN	1	$505.530,01	$505.530,01
923	TUBO DE DESCARGUE PISTOLAS COLOR negro, diámetro de boca 15 cm, peso 11 kg, largo 100 cm, cilindro y base fabricado de acero, relleno de gel balístico para absorber proyectiles, acabado en pintura epóxica con tratamiento antióxido de base.	UN	4	$4.928.917,56	$19.715.670,24
924	ORGANIZADOR CARNET, COLOR NEGRO BRILLANTE, ANCHO 65 CM, ALTO 7 CMS, LARGO 40 CM, FILAS 20, COLUMNAS 6 TAMAÑO DE CADA CASILLA PARA TODOS LOS FICHEROS DE MESA 11 CM DE LARGO, 1 CM DE ANCHO Y 4,5 CM DE PROFUNDIDAD, EN ACRÍLICO, ENCABEZADO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, REGLAS NUMERADAS, DIVISORES CON INCLINACIÓN DE 15° PARA MEJOR VISIBILIDAD DE CARNÉ O FICHA.	UN	2	$884.677,51	$1.769.355,02
925	ARMERO HOMOLOGADO PARA ARMAS LARGAS, LARGO 160 CMS, ANCHO 28 CMS, FONDO 24 CMS, VOLUMEN 59 LITROS, PESO 82 KG, EN MADERA BARNIZADA COLOR NEGRO O CAOBA, DIVIDIDA CAJONES, MEDIDAS INTERIORES DE 1373 CMS DE ALTO, ANCHO 25,3 CMS Y FONDO 17 CMS, CON CAPACIDAD PARA 4 ARMAS LARGAS, CUERPO Y PUERTA CONSTRUIDOS CON CHAPA DE ACERO Y MATERIAL AISLANTE, CIERRE CON 6 BULONES.	UN	2	$5.055.300,06	$10.110.600,12
926	BANCO DE TRABAJO ALISTAMIENTO DE EQUIPOS COLOR AZUL, FONDO 61 CMS, ANCHO 91 CMS, ALTO 144,5 CMS, PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA, 3 BALDAS RECLINABLES, CAJÓN PARA GUARDAR HERRAMIENTAS, 5 ESTANTES, 1 AGLOMERADO, 1 DM, 6 CARTELAS, 2 PERFILES.	UN	1	$4.461.657,30	$4.461.657,30
927	BANDEJA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS, APTA PARA PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO, A4., MALLA DE ALAMBRE, ALMACENAMIENTO 3 NIVELES CANTIDAD DE BANDEJAS: 3 TEXTURA: MALLA METÁLICA LARGO: 34.5 CMS, ANCHO: 24.5 CMS, ALTO: 2.5 CMS, METÁLICO.	UN	18	$464.900,25	$8.368.204,50
928	LAMPARA DE PIE METALICA, DE 60W, 12,5 CENTÍMETROS, 0.14 CC, 155 CENTÍMETROS, CÓDIGO 283683.	UN	10	$353.671,01	$3.536.710,10
929	NEVERA - Capacidad: 298 lts - Color: Plateado - No frost: Si - Color: Platcado - Capacidad refrigerador: 236 lts - Capacidad del congelador: 62 lts - Dispensador de agua: Si - Dispensador de Hielo: Si	UN	2	$3.665.092,54	$7.330.185,08

	- Materiales de las bandejas: Cristal templado - Iluminación: Si - Cajón de frutas y verduras con control de humedad - Alto: 176 cm - Ancho: 61 cm - Profundidad: 69 cm - Tipo energía: 110W - Tres Anaqueles en la conta puerta - La instalación y materiales que se requieran en la misma deben estar incluidos en el costo del producto				
930	ALFOMBRA POLIPROPILENO ALTURA DEL PELO 22 MM STRAIGHT, 160 CENTÍMETROS DE ANCHO, 230 CENTÍMETROS DE LARGO. NOBLESE, REFERENCIA 6211687316023O8,00.	UN	10	$758.295,01	$7.582.950,10
931	DIFUSOR DE AROMA PLASTICO COLOR BLANCO, MODELO HM-03, 18X18X25 CARACTERÍSTICAS CON LUZ, CONTROL REMOTO, APAGADO AUTOMÁTICO, MODELO HM-03, CÓDIGO 438810.	UN	18	$313.657,50	$5.645.835,00
932	JUEGO DE ESCUDOS ALTO RELIEVE EN BRONCE, (POLICIA, COLOMBIA Y BOGOTÁ), ENCRUSTADOS EN FONDO DE MADERA AL COLOR DEL MOBILIARIO DE LA RECEPCIÓN, CONSERVANDO ESPACIOS Y DIMENSIONES IGUALES.	UN	2	$4.111.748,71	$8.223.497,42
933	TARIMA PRINCIPAL DIMENSIONES 11.00 MTS DE LARGO X 2.20 MTS DE ANCHO, ESTRUCTURA METALICA.	UN	1	$13.343.472,80	$13.343.472,80
934	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑOS PARA HORNOS MICROHONDAS FONDO 0.60 MTS X ANCHO 0.70 MTS ALTO 1.80 MTS	UN	4	$2.442.668,10	$9.770.672,40
935	LOCKERS PARA CELULARES METALICO PARA 12 CASILLEROS 12X17X29 CM	UN	2	$1.059.679,80	$2.119.359,60
936	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MÁXIMA CLAVE DIGITAL DE 50 X 55 X 80 CM, CLAVE DIGITAL AMERICANA.	UN	2	$1.449.722,25	$2.899.444,50
937	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD PARA ALMACENAMIENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL, EN ACERO REFORZADO. MEDIDAS 50 X 55 X 80 CM.	UN	1	$1.516.590,02	$1.516.590,02
938	ESTANTERÍA PARA ARMAS MUEBLE METÁLICO EN CÓLROLED CAL.18 CON DIVISIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN EL MISMO MATERIAL TAPAS LATERALES, SUPERIOR INFERIOR Y DE FONDO, ACABADO FINAL EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE TRES MANOS COLOR A DEFINIR EN OBRA. CADA CELDA DEBE TENER DIMENSIONES DE 12 X 15 X 30 Y DEBE ESTAR PREVISTO DE PUERTA MANIJA Y CERRADURA	UN	10	$2.401.267,53	$24.012.675,30
939	LAVADORA -Capacidad: 18 Kl -Color: Blanco -Tipo Carga: Superior -Tipo de panel: Manual -Material Tambor: Acero porcelanizado -Centrifugado: Si -Profundidad: 69 cm -Alto: 107 cm -Ancho: 70 cm -Tipo energía: 110W -Ciclos automaticos: 7 -Ciclos manuales: 4 - La instalación y materiales que se requieran en la misma deben estar incluidos en el costo del producto	UN	1	$3.759.352,49	$3.759.352,49
940	CORTINA ENROLLABLE MATERIAL 30% POLIÉSTER(PE) + 70% PVC. ESPESOR 0,53 MM. PESO 400 GR/M2. NIVEL DE PRIVACIDAD TRANSPARENCIA. FACTOR DE APERTURA 5%. TRANSMISIÓN SOLAR 22%. REFLEXIÓN SOLAR 67%. ABSORCIÓN SOLAR 11%.	M2	120	$320.802,31	$38.496.277,20

941	CORTINA ENROLLABLE BLACK-OUT MATERIAL 25% FIBRA DE VIDRIO + 75% PVC. ESPESOR 0,35 MM. PESO 407 GR/M2. NIVEL DE PRIVACIDAD BLACKOUT/OPACIDAD. FACTOR DE APERTURA 0%. TRANSMISIÓN DE RAYOS UV 0%. BLOQUEO DE RAYOS UV 100%. RETARDANTE AL FUEGO SEGÚN NORMA NFPA 701.	M2	120	$227.488,50	$27.298.620,00
942	CANECAS VAIVEN, FABRICADA CON POLIETILENO (CONTENEDORES) DE PRIMERA CALIDAD, RESISTENTE A MALTRATO Y AL TRABAJO DURO. CON ADITIVO U.V., RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y A LA INTEMPERIE, DE FÁCIL LIMPIEZA, QUE NO SE CORROAN, NI SUELTEN SEDIMENTOS. TRIO DE 53 LTS, CON TABLERO, TAPA DE VAIVEN. TUBO CUADRADO CR DE 5 X CAL. 1 PLATINA DE 2 X 1/8 Y LÁMINA CR X CAL. 18, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA (SOPORTE). CANECAS DE COLOR AZUL, VERDE Y GRIS.	UN	1	$505.530,01	$505.530,01
943	CORTINA ELABORADA CON DISEÑO INTERCALADO DE TELENOS OPACOS Y VELO PERMITIENDO DIVERSAS POSICIONES Y ENTRADAS DE LUZ DE ACUERDO AL JUEGO DE LAS FRANJAS. CABEZAL DE LUJO EN ALUMINIO, ACABADO MATE DE 9 CM. QUE CUBRE EL TUBO DE ALUMINIO. PERFIL DE SISTEMA DOBLE QUE DEBE INCORPORAR EL PERFIL INTERIOR QUE GUIA LA TELA AL ACCIONAMIENTO Y UN PERFIL PLANO PARA DAR PESO Y LA CAIDA A LA MISMA EN COORDINACIÓN AL COLOR DE LA TELA.	M2	300	$366.509,25	$109.952.775,00
944	TELÓN MANUAL DE 2,44 X 2,44 MTS.	UN	6	$1,011,060,01	$6.066.360,06
945	PERCHERO EN MADERA	UN	4	$492.891,76	$1,971,567,04
Baños alojamientos Piso 7					
946	MUEBLE PARA BAÑOS DE 0.70 x 0.00 x 0,55 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO (Incluye herrajes, platinas, soportes,).	UN	30	$1.153.294,50	$34.598.835,00
Cocinetas suit 1 - alojamientos Piso 7					
947	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 2.23 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1	$9.770.672,40	$9.770.672,40
Cocinetas suit 2 - alojamientos Piso 7					
948	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 2.23 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1	$9.770.672,40	$9.770.672,40
Cocinetas externas Piso 7					
949	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 1,52 X 0.70 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	2	$7.492.071,30	$14.984.142,60
Baños alojamientos Piso 6					
950	MUEBLE PARA BAÑOS DE 0.70 x 0.00 x 0,55 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO (Incluye herrajes, platinas, soportes,).	UN	1	$1.153.294,50	$1.153.294,50
Cocina Piso 5					

951	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 1.52 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	2	$6.659.190,00	$13.318.380,00
Cocina Piso 4					
952	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 1.52 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	2	$6.659.190,00	$13.318.380,00
Cocina Piso 3					
953	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 1,52 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	2	$6.659.190,00	$13.318.380,00
Cocina Piso 2					
954	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 3.05 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS. (INCLUYE ESTUFA).	UN	2	$26.727.479,40	$26.727.479,40
955	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 1.52 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1	$6.659.190,00	$6.659.190,00
956	SUPERFICIE EN CORIAN DE 1.90X 0.50 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,15 MTS MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1	$4.449.111,00	$4.449.111,00
Enfermería					
957	MUEBLE PARA BAÑOS DE 0,70 X 0.00 x 0.55 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5 SISTEMA AUTOSOPORTADO (Incluye herrajes, platinas, soportes.).	UN	1	$1.153.294,50	$1.153.294,50
Cocina Piso 1					
958	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 5,55 X 0.70 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1	$24.317.624,70	$24.317.624,70
959	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 2,41 X 0.70 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1	$10.559.159,10	$10.559.159,10
960	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 1.80 X 0.80 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,30 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE	UN	1	$9.332.517,00	$9.332.517,00

	APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.				
961	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN CORIAN DE 5.87 X 0.60 MTS, SALPICADERO EN CORIAN DE 0,60 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 30 Y 18 MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, PERFILARÍA EN ALUMINIO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.	UN	1	$21.719.915,00	$25.719.915,00
SUBTOTAL PISO 7				**$1.130.521.555,60**	

VALOR TOTAL PRESUPUESTO **$41.379.230.940,17**

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**CERTIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (CUMPLE - NO CUMPLE)** El oferente deberá comprometerse con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cantidades del Anexo PRESUPUESTO DOTACIÓN NUEVO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, anexando diligenciado la Certificación de compromiso del fabricante. Justificación: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cantidades, toda vez que en ellas está contenido el alcance, procedimientos y calidad de los elementos que componen el objeto del contrato.	X	
2	**CERTIFICACIÓN AÑO DE FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS (CUMPLE - NO CUMPLE)** El proponente deberá diligenciar el formato de certificación donde señale que los elementos a adquirir no deben haber sido producidos antes del año 2022. **Justificación:** es importante que se garantice por parte del oferente, que los elementos a instalar hayan sido fabricados en la vigencia que se ejecute el contrato, anexando una certificación donde indique dicho compromiso (Certificación año de fabricación de los elementos).	X	
3	**CERTIFICACIÓN ESTUDIO DE SEGURIDAD.** El contratista certifica que, si la Policía Nacional considera pertinente someter a estudio de seguridad a todo el personal que realice la instalación, permitirá y facilitará toda la información y los medios que la entidad le requiera para tal fin, de igual forma que reemplazará aquellos funcionarios que la Policía Metropolitana de Bogotá así lo considere pertinente.	X	
4	**CERTIFICACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO: El contratista certifica que se compromete a mantener, el siguiente personal con el tiempo de dedicación, así:**	X	

ÍTEM	DESCRIPCION	% DEDICACION D	%
	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
1	DIRECTOR DE PROYECTO (ARQUITECTO O INGENIERO INDUSTRIAL)	1	50%
2	PROFESIONAL SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SST	1	100%
3	SUPERVISOR No. 1 ARQUITECTO	1	100%
4	SUPERVISOR No. 2 ARQUITECTO	1	100%
5	INGENIERO ELCTRICISTA VOZ Y DATOS	1	50%

		6	AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y LOGISTICA	1	100%		
5	COSTOS INDIRECTOS: El contratista certifica que al momento de la presentación de la propuesta, ha tenido en cuenta los costos directos e indirectos, fijos y variables, tales como: personal profesional de acuerdo a las funciones específicas requeridas en el presente proceso contractual, personal administrativo, personal logístico, conductores, transporte, bodegaje, campamentos, materiales y herramientas para los montajes e instalación entre otros.					X	
6	NORMAS AMBIENTALES: El contratista garantiza su compromiso con el Sistema de gestión Ambiental, fomentando buenas prácticas y cumpliendo con la normatividad aplicable para el manejo de residuos generados por la ejecución del contrato, sea en instalaciones policiales o instalaciones propias El contratista garantiza que en el ejercicio del cumplimiento del objeto de del contrato, realizará el control de los aspectos e impactos ambientales que se puedan generar, sea en instalaciones policiales o instalaciones propias.					X	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOTACIÓN NUEVO COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
Las especificaciones aquí consignadas, corresponden a las actividades de "DOTACIÓN DEL NUEVO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ", en estas se definen las dimensiones, procedimientos constructivos generales y materiales a utilizar en cada uno de los ítems a realizar. Para todos los casos se debe verificar el procedimiento de fabricación y de cada uno de los materiales.

El Contratista deberá llevar un Control, gestión sobre la cual la supervisión técnica requerirá permanentemente al Contratista o su personal técnico encargado en sitio de la tarea indicada, para comprobar el cumplimiento de lo citado. Con respecto al Manual de mantenimiento debe ser entregado antes de suscribir el Acta Final de Recibo del contrato, se hace especial énfasis en su contenido y alcance, de tal manera que se indique claramente la forma de utilizar, mantener y asear cada uno de los ítems ejecutados, acorde con las recomendaciones del fabricante.

A continuación, se anotan una serie de aspectos básicos que se deben tener en cuenta por el contratista, para el buen desarrollo del contrato y que serán de estricto cumplimiento

x	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El contratista deberá aportar todas las herramientas e implementos mecánicos necesarios para la correcta ejecución del contrato, inclusive desde los puntos de acopio y comercialización natural, según sea el caso de cada material.	X	
2	Los elementos y materiales que se utilicen en el contrato acorde con las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems de instalación que hacen parte del contrato, deberán ser previamente aprobados por la supervisión técnica del contrato y/o el diseñador, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación; ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones técnicas. Para el caso de los materiales de acabados, el contratista debe presentar a la supervisión técnica en un término de 8 días calendario después de la iniciación del contrato, las muestras físicas de cada uno de los materiales	x	
3	El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación del espacio hasta la entrega y recibo en forma definitiva; la reparación de daños, si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión técnica del contrato	x	
4	Los valores presentados en la propuesta sin derecho a reajustes, deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, Control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato	x	
5	Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.	x	

6	En la ejecución del contrato, el Contratante será exigente y por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá a través de la supervisión técnica del contrato, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.	x	
7	Serán por cuenta del Contratista, el uso obligatorio y la adquisición de elementos de seguridad industrial para su personal, como cascos, overoles, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquie12r otro elemento necesario que la supervisión técnica del contrato exija, así como la implementación y puesta en marcha de un riguroso programa de seguridad industrial para las respectivas instalaciones, el cual será revisado y aprobado por la supervisión técnica. Mantendrá en el sitio de instalación elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la ley colombiana. Será condición para Control de personal un carnet con nombres, apellidos, cédula de ciudadanía y logotipo de la empresa contratista, el cual se verificará al momento de ingresar y salir del edificio, por el personal de seguridad.	x	
8	Donde se estipule, bien en las cantidades del contrato o en las especificaciones marca o nombre de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la supervisión técnica, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad y precio y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios	x	
9	Para la iniciación de cualquier actividad o ítem del contrato, el Contratista deberá presentar muestras indicando claramente el proceso de instalación y así obtener el visto bueno de la supervisión técnica del contrato.	x	
10	Es de responsabilidad absoluta del Contratista, la elaboración los manuales de mantenimiento, señalando que la supervisión técnica del contrato revisará permanentemente y aprobará la veracidad de los manuales según corresponda. Se advierte que para el pago final o de la última acta de entrega, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá exigirá la entrega del manual referido, como requisito previo al trámite del mismo	x	
11	El proponente deberá presentar certificación donde se compromete a garantizar la calidad de los materiales por un término no inferior a cuatro (4) años en oficina abierta (divisiones en aluminio, divisiones en vidrio templado puestos de trabajo, paneles móviles, archivadores 2x1, archivadores especiales, salas de espera, muebles especiales en madera como: bibliotecas, closet, atril, mesas, etc.), por defecto de fabricación, en las partes móviles como rieles, correderas y chapas. Sillas de oficina tres (3) años. estantería metálica liviana tres (3) años, archivo rodante tres (3) años, comedor en madera, camas en madera, mesa de noche y camarotes metálicos tres (3) años, colchones, colchonetas, sabanas, protectores de colchones y almohadas un (1) año, cortinas enrollables y blackout un (2) años, electrodomésticos un (01) año. Así mismo, debe ofrecer la visita preventiva gratuita para verificación del funcionamiento de los elementos, la cual se prestará dentro de los tres meses siguientes a la firma del Acta de Recibo o a solicitud del cliente	x	
12	Todos los ítems mencionados en el proceso se entregarán debidamente instalados y en completo funcionamiento y en el lugar que la supervisión determine.	N/A,	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DOTACIÓN "DOTACIÓN DEL NUEVO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ			
1	**GENERALIDADES:** El Proponente se compromete a entregar instalados los sistemas de oficinas integrales a través del uso de sistemas modulares de reconocida trayectoria y de verificar en los sitios la totalidad de las medidas de los planos suministrados por la Entidad, con el fin de adaptarlos a su propio sistema y así garantizar un perfecto montaje, verificando el número exacto de puestos de trabajo de acuerdo con las tipologías específicas y los elementos que las componen: superficies de trabajo de diferentes tipos, muebles especiales, unidades de almacenamiento (archivos 2x1,	N/A, no se han recibido ningún elemento	

	bibliotecas), accesorios, sillas de las diferentes topologías y demás requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.	

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Mediante comunicación electrónica No. GS-2022-504947 MEBOG, solicitud información contrato inmobiliario firmada por el señor Coronel, Domingo Alfredo López dales Jefe Administrativo MEBOG, el cual mediante comunicación electrónica No GS-2022-509693 MEBOG, se brinda respuesta informando los avances del contrato No 10-2-10045-22.

La empresa contratista se encuentra realizando el diseño de puntos de impacto en el edificio, como son: áreas destinadas para salas de juntas, salas de crisis, salas de capacitación, áreas comunes para comedores, restaurantes, gimnasio, oratorio y los diversos espacios de circulación, con el fin de proporcionar en el edificio un diseño exclusivo y una gama de colores selecta que permita generar un ambiente agradable de acuerdo a lo proyectado de cada uno de los espacios.

De acuerdo a lo anterior, es importante establecer que se está evaluando la viabilidad de un modificatorio al contrato solicitado por la empresa contratista Unión Temporal Metropolitana 2022 en el cual se relacionan los diferentes ítems a los que es necesario realizar la modificación de acuerdo a las cantidades insuficientes o las dimensiones de algunos elementos unifuncionales a instalar en algunas áreas específicas del edificio los cuales se pudieron evidenciar en la visita realizada,

El día 25/11/2022, se realizó una mesa de trabajo en las instalaciones de la obra liderada por la contraloría de Bogotá con el personal de la interventoría, del constructor, de la secretaría de seguridad, convivencia y justicia, en la que se dé socializo el tema de avance de la obra, las acciones adelantadas con los trámites con las entidades externas para los permisos correspondientes para las obras de las áreas urbanas del proyecto y el porcentaje de avance del contrato del mobiliario en el cual se expuso el estado actual, el cual está sobre la semana 7 de ejecución en la cual se están coordinando las acciones pertinentes con el constructor para el ingreso de los vehículos de carga pesada, para el inicio de la instalación de los elementos contratados para la dotación del proyecto.
El día 25/11/2022, se desarrolló el comité semanal de seguimiento al contrato No 10-2-10045-22, con el personal del contratista del mobiliario, en el cual se verificaron las obligaciones contractuales correspondientes al tiempo de ejecución del mismo, los elementos pendientes como el documento logístico solicitado por la obra en el comité del 22 de noviembre de 2022, el trámite de los modificatorios el cual se encuentra en proceso, la entrega de especificaciones por parte del Almacén de Intendencia de los elementos complementarios, y la solicitud pendiente a telemática para el apoyo en la etapa de instalación.
El día 26/11/2022, por parte de la supervisión del contrato No 10-2-10045-22, mediante comunicación oficial No. GS-2022 – 579668 – AREAD – GRULO, ,se radica ante el director de bienes de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, el informe detallado de las inconsistencias arquitectónicas, las cuales fueron evidenciadas en la etapa de replanteo del proceso, en el que se solicita la posibilidad de subsanar las novedades referentes a la existencia de puntos eléctricos ubicados en áreas específicas de la instalación de muebles fijos como closets, mubles de baños y cocinas, puestos de trabajo que presentan inconvenientes para su respectiva instalación y puesta en funcionamiento de la red de voz y datos, el funcionamiento de ventanas en el área a instalar los muebles de los closets de las habitaciones y la Inexistencia de puntos de gas en los espacios destinados para las cocinas.

El lunes 28 de noviembre de 2022, se realizó comité en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá con el personal de la unión temporal METROPOLITANA 2022, esto con el fin de verificar la información correspondiente para la solicitud del Modificatorio No. 1 del contrato, y poder realizar las coordinaciones pertinentes para la propuesta a exponer en el próximo comité de obra, en cuanto al ingreso a las instalaciones del proyecto e inicio de la etapa de instalación del mobiliario, donde se definirá la cantidad de personal, la correspondiente ARL que deben tener por poder transitar en estas áreas, tipos de vehículos donde se transportaran los elementos del nobiliario y los elementos que se entregarían en la primera semana.

El miércoles 30 de noviembre de 2022, se realiza al comité de obra, al proyecto en compañía del personal de la unión temporal y liderado por el director de Bienes de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el que se expone ante el componente técnico del proyecto, el estado actual del proceso, se entrega el plan de trabajo.

El día 20/12/2022 se realiza modificatorio No 1 al contrato de compraventa No 10-2-10045-22, celebrado entre la policía metropolitana de Bogotá y la unión temporal metropolitana 2022 cuyo objeto es la "dotación del nuevo comando de la policía metropolitana de Bogotá, por un periodo de (02) meses plazo de finalización 20/02/2023.

Mediante comunicado GE-2023-006909 MEBOG, de fecha 27 de enero, el contratista UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022, se solicita prorroga No 2, al contrato, teniendo en cuenta los antecedentes que no les ha permitido cumplir con el cronograma para la instalación del modificatorio, quedando aprobada la modificación al contrato No 2 de fecha 31/02/2023, por un periodo de 39 días con fecha de finalización al 31/03/2023.

Mediante correo electrónico, de fecha 24 de marzo, el contratista UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022, se solicita prorroga No 3, al contrato anexando oficio número C-UTM2022-0015, teniendo en cuenta los antecedentes que no les ha permitido cumplir con el cronograma para la instalación del modificatorio, quedando aprobada la modificación al contrato No 3 de fecha 29/03/2023, mediante comunicación electrónica GS-2023-149509-MEBOG por un periodo de 61 días con fecha de finalización al 31/05/2023.

Mediante comunicado GS-2023-178903 MEBOG, de fecha 16/04/2023 se envía informe de actividades del nuevo comando, en la semana comprendida del 05/04/2023 al 11/04/2023

Mediante comunicado GS-2023-202557 MEBOG, de fecha 27/04/2023 se envía informe de actividades del nuevo comando, en la semana comprendida del 19/04/2023 al 25 /04/2023

Durante la ejecución en el mes de abril se realizaron las siguientes actas así:

- Acta 181 del 04/04/2023, acta de recorrido por las instalaciones del proyecto del nuevo comando con el fin de verificar los puntos eléctricos, voz y datos en conjunto con SDSCJ, POLICIA, CONSTRUCTOR, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE MOBILIARIO (documento anexo)
- Acta 183 del 04/04/2023, acta sobre la asistencia al comité de obra virtual del proyecto del nuevo comando No22, en coordinación a la ejecución del contrato No 10-2-10045-22 cuyo objeto es la DOTACION DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA (DOCUMENTO ANEXO)
- Acta 195 del 14/04/2023, acta de reunión de verificación y concertación de empalme del contrato de dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá con los contratistas de la SDSCJ a cargo de la construcción e interventoría del proyecto (documento anexo)

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (185) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana de Bogotá se obliga a cancelar el valor del contrato en PAGOS PARCIALES, contra entrega e instalación de los bienes por cada pisos dotado en su totalidad, en pesos colombianos, en la ciudad de Bogotá, los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación del PAC correspondiente que efectué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo No1 "DATOS DEL CONTRATO".

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	$11.790.784.983,64	100%
Valor total de las entregas	2.188.611.884,12	18%
Valor total facturado	0.0	0%
Valor facturado pendiente de pago	2.188.611.884,12	18%
Valor pagado	0.0	18%
Valor pendiente de entrega	9.602.173.099,52	82%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
UNO	$1.414.820.532,25	29/03/2023	$1.414.820.532,25	No6	$1.314.308.829,25	$100.511.703,00	84726823
DOS	$772.791.351,87	29/03/2023	$772.791.351,87	No7	$718.819.652,87	$54.971.699,00	8469223

5. RECOMENDACIONES: N/A

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Capitán PAVEL ANDRES RODRIGUEZ SOLORZANO
Jefe Grupo Logístico MEBOG (E)
Supervisor Contrato No.18-2-10045-22
mebog.arlog@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3208029123

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

CEA 3.0-07
18-ECD-009

AREAD-GRULO - 2.1

Bogotá D.C., 01 de mayo de 2023


Señor Coronel (R)
Leonardo Mejía Martínez
Director de Bienes
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Avenida calle 26 57 – 83 piso 13
Bogotá.

Asunto: solicitud entrega nivel del sótano


De acuerdo a la ejecución articulada entre el contrato No. 10-2-10045-22 cuyo objeto es la "DOTACIÓN DEL NUEVO COMANDO DE LA POLICÍA METROPLITANA DE BOGOTÁ" a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el contrato de obra No. 1132 del 19/12/2018 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ", y conforme a la mesa de trabajo desarrollada con el Señor General (R) Óscar Gómez Heredia, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la que se estableció la fecha de entrega de 1.500 m2 correspondientes a las áreas del nivel del sótano en las que se había culminado la instalación de la barrera de vapor y el acabado de linóleo para el día 23 de abril de 2023, y a la fecha solo se ha realizado la entrega de 8 espacios de los cuales no se requiere la intervención de la instalación de la barrera de vapor, por lo que se presenta el incumplimiento al compromiso de entrega de dicha área acordado entre el Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el componente de obra (constructor – interventoria) y el componente de mobiliario.

Conforme a lo anterior, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar la posibilidad de emitir un cronograma de entrega de los espacios correspondientes a este nivel, con el fin generar una proyección de cronograma de instalación acorde al plazo de ejecución estimado del contrato de dotación, debido a que en la circulación del primer piso se encuentran acopiados los elementos correspondientes del nivel del sótano para instalación en las áreas correspondientes.



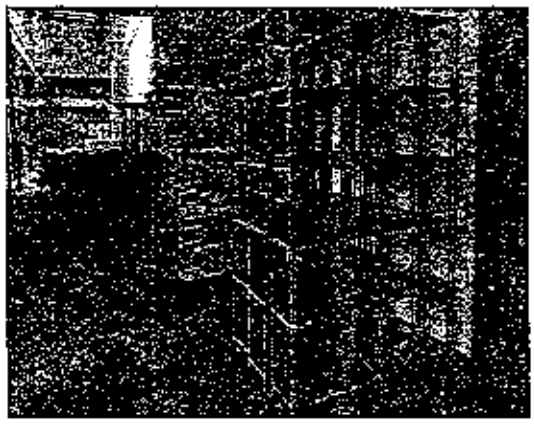

GS-2023-208038-MEBOG

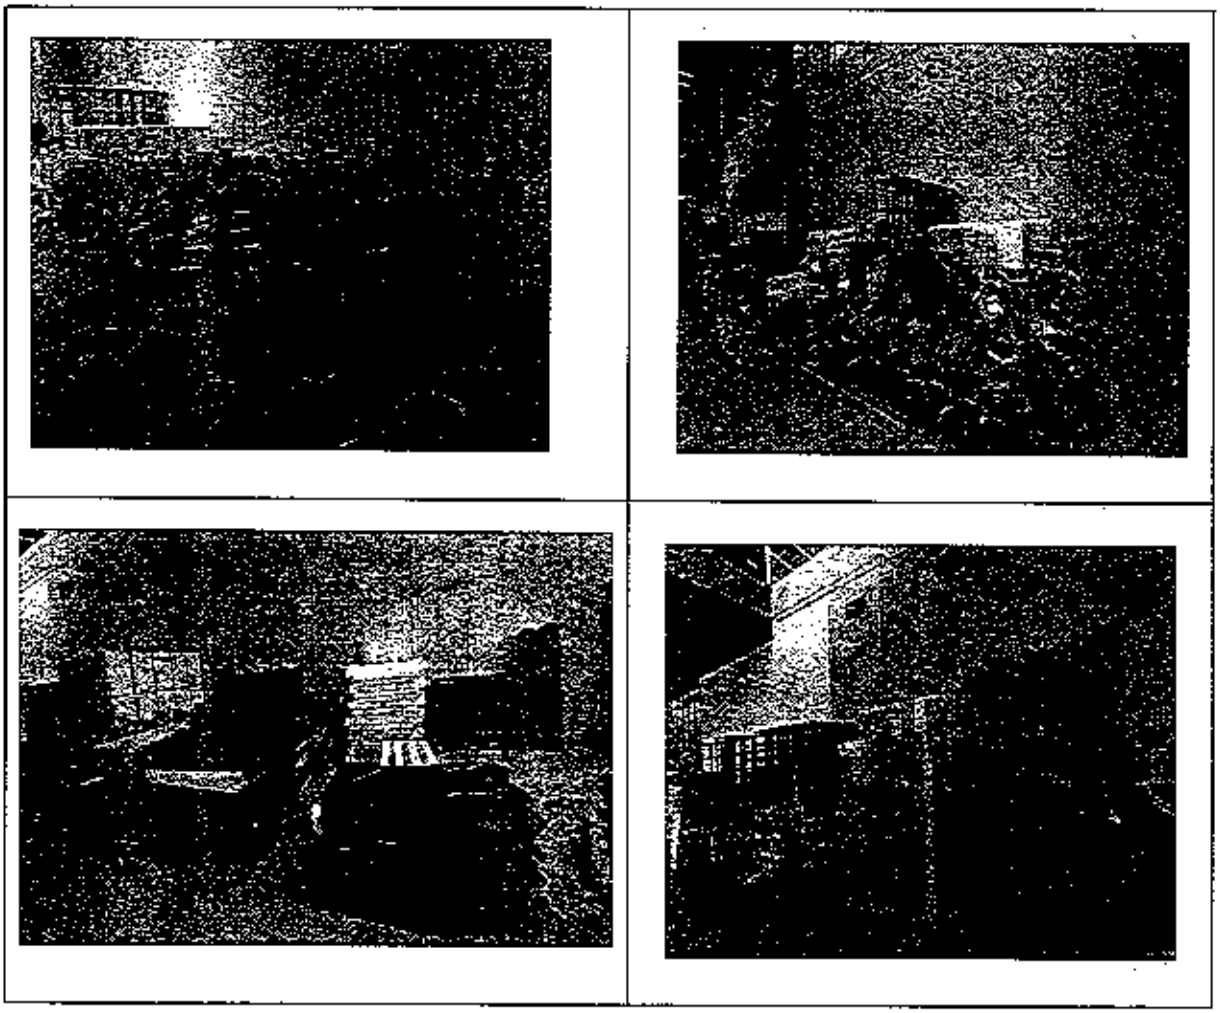

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
1/05/2023 5:52:04 p. m.

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGISTICO

CEA-3.0-07
15-ECD-003

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 01 de mayo de 2023

Señora
ELIZABETH OSORIO
Representante legal Unión Temporal Metropolitana 2022
Transversal 60c # 93ª - 45
Bogotá D.C.

Asunto: incumplimiento cronograma

En relación al contrato 10-2-10045-22, que tiene por objeto Dotación del Nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y conforme al cronograma proyectado de manera articulada con la supervisión del contrato y la Unión temporal Metropolitana 2022, en el que se especifican las fechas de entrega de los elementos faltantes por instalar en todos los niveles del proyecto, de manera atenta me permito informar el incumplimiento al cronograma de los elementos proyectados para entrega del día 28 de abril de 2023.

Es importante establecer que por parte de la supervisión se realizó la verificación del inventario en sitio, estableciendo el incumplimiento de entrega de los elementos que se relacionan a continuación:

PISO	SECCION	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. FINAL A INSTALAR	UBICACION
1	SIJIN - Gastos Reservados Jefatura	26	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 22,H-I.
1	SIJIN - Gastos Reservados Jefatura	27	MESA DE CENTRO EN PUERTO ASIS O FLOR MORADO DE 0,60 X 1,00 MTS, PATAS EN ACERO INOXIDABLE, SELLADOR CATALIZADO, TINTES MINERALES Y DOS CAPAS DE LACA EN POLIURETANO TRANSPARENTE . COLOR A ESCOGER.	UN		Eje 22,H-I.
1	SIJIN - Habitación Armerillo	48	CAMA SENCILLA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,00 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN		ejes 21-22,g-h

GS-2023-208105-MEBOG

1	SIJIN - Prueba PIPH	93	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/TS, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL 18. INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTES ENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO Y SILLA OPERATIVA (incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UN	[redacted]	Ejes 14,K-L
1	SIJIN - Toma de imágenes	113	CREDENZA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, 1,00 X 0,50 X 0,60H, FRENTES DE CAJONERAS EN AGLOMERADO ENCAPADAS EN FORMICA F8, TIENE SUPERFICIE ARRIBA EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN		Eje 12,G-H

1	SIJIN – Laboratorio en disparo	120	CREDENZA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22, 1,00 X 0,50 X 0,60H, FRENTES DE CAJONERAS EN AGLOMERADO ENCAPADAS EN FORMICA F8, TIENE SUPERFICIE ARRIBA EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN		Eje 12,H.
1	SIJIN - DEPENDENCIAS AGREGADAS	140	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje H',8-9
1	SIJIN - DEPENDENCIAS AGREGADAS	141	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje H',8-9
1	SIJIN - Sala de denuncias automotores	147	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 8,J.
1	SIJIN - Sala de denuncias automotores	148	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 8,J.
1	SIJIN - Sala de atención víctimas sexuales y homicidios	153	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Ejes 7'-8 ,K-L

GS-2023-208105-MEBOG

1	SIJIN - Sala de atención víctimas sexuales y homicidios	154	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Ejes 7'-8 ,K-L
1	SIJIN - Sala de antecedentes	159	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		eje K-7'
1	SIJIN - Sala de antecedentes	160	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		eje K-7'
1	SIJIN - Recepción	177	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje G-H, 3-4
1	SIJIN - Recepción	178	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje G-H, 3-4
1	SIJIN - Unidad investigativa de terrorismo	191	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML		Eje 7-10, D
1	SIJIN - Grupo de información análisis criminal	193	PANTALLA EN VIDRIO LAMINADO DE 4 + 4 MM BLANCO HIELO. H= 0,40 MTS. INCLUYE PERFIL DE PANTALLA ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5.	ML		Ejes 7-12,A-D

1	Elementos logísticos	220	PATENAS PARA REPARTIR LA COMUNIÓN, FABRICADO EN METAL CON ACABADO EN BAÑO DORADO SU BASE DE 16 CM DE DIÁMETRO, COPA TOTALMENTE LISA.	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	223	JUEGO DE CRUZ ALTA PROCESIONAL CON CIRIALES (2): CRUZ PROCE SIONAL CON CIRIALES Y BASE EN FUNDICIÓN DE BRONCE PULIDO, SU ALTURA ES 2 METROS	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	235	CALIZ CON PATENA, CÁLIZ CON PATENA EN LAMINA BRONCE CON BAÑO DE PLATA Y ORO, SU TAMAÑO ES DE 17 CM, EL DIÁMETRO DEL CÁLIZ ES DE 10,5 CM Y EL DIÁMETRO DE LA PATENA ES DE 13,5 CM. SEGÚN MODELO.	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	236	COPONES GRANDES, COPÓN DE METAL CON CRUZ EN LA PARTE SUPERIOR, SU TAMAÑO ES DE 23 CM Y SU DIÁMETRO ES DE 14 CM. SEGÚN MODELO.	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	237	MANTELES PARA EL ALTAR, ELABORADO EN TELA BOSTON SPECIAL CON UN ENCAJE EN ALGODÓN, TEJIDOS A MANO, MEDIDAS A DEFINIR	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	243	CAMPANA MEDIANA, CAMPANA EN COBRE Y BRONCE CON UNA ALTURA DE 18 CM Y UN DIÁMETRO DE 11,5 CM.	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	245	MANTELES PROTECTORES ALTAR, TELA BOSTON SPECIAL CON ENCAJES DELGADO EN ALGODÓN. MEDIDAS A DEFINIR	UN		Eje C-E,12

306994 - -

GS-2023-208105-MEBOG

1	Elementos logísticos	246	BALDAQUINOS FRONTALES (PARES COLORES LITÚRGICOS). TELA LINO DORCELL MERINO, CON FORRO EN SEDA POLIÉSTER, CON BORDADOS ELECTRÓNICOS Y TERMINACIONES A MANO. EN COLORES LITÚRGICOS (ROJO, BLANCO, MORADO Y VERDE). MEDIDAS A DEFINIR.	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	247	CONOPEOS PARA COPONES GRANDES, CONOPEOS: EN TELA ITALIANA (LAMPAZO), CON LUREX DORADO.	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	252	CANDELABROS DE BASE PARA ALTAR MAYOR, CANDELABRO LITÚRGIC O DE ALTAR LATÓN MACIZO, PORTA VELA DE MESA, ACABADO A MANO, DE 20 CM DE ALTURA, 4 CM DE DIÁMETRO. SEGÚN MODELO	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	253	SANTO CRISTO DE BASE PARA ALTAR MAYOR, CRUCIFIJO DE MESA FABRICADO EN METAL CON BAÑO DE ORO DE 58.5 CM DE ALTO . SEGÚN MODELO.	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	256	CONCHA METÁLICA PARA BAUTISMOS, CONCHA CON 14 CM. DE DIÁMETRO, FABRICADA EN METAL NIQUELADO CON APOYOS	UN		Eje C-E,12
1	Elementos logísticos	259	EVANGELIARIO, LIBRO DE CUBIERTA DURA CON ICONOGRAFÍA RELACIONADA A LA IGLESIA, SU TAPA ES EN PASTA DURA. SOLO EL CANTO ES DORADO. VERSIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. FORMATO 23.7 ANCHO, 33.7 DE ALTO	UN		Eje C-E,12

1	Mobiliario y enseres TEMPLO - Recepción - secretaria	264	CREDENZA DE 1,30 X 0,50 X 0,70 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN		Eje 5,A.
1	Sala de Estar	269	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 2-3,A
1	Sala de Estar	270	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 2-3,A
1	Casa Cural	300	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA	UN		Eje 7,B.
1	Casa Cural	309	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 6, C-D
1	Casa Cural	310	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 6, C-D
1	Casa Cural	311	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 6, C-D.
1	Casa Cural	314	BARRA PARA COCINA, SUPERFICIE EXTREMO CURVO EN AGLOMERADO DE MADERA DE 3,00 X 0,60 MTS, INCLUYE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 7D

GS-2023-208105-MEBOG

1	Casa Cural	315	SILLAS TIPO BAR, ACABADO EN TELA VINILICA NEGRA, ESTRUCTURA EN ACERO, ACABADO CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER.	UN		Eje 7E
2	CENTRAL DE CÁMARAS	334	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 9, 10 H
2	CENTRAL DE CÁMARAS	336	CREDENZA DE 1,30 X 0,60 X 0,70 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8.	UN		Eje 9, 10 H
2	ALOJAMIENTOS HOMBRES Y MUJERES SEGURIDAD A INSTALACIONES	361	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 10, 11 G
2	ALOJAMIENTOS HOMBRES Y MUJERES SEGURIDAD A INSTALACIONES	362	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 10, 11 G
2	ALOJAMIENTOS HOMBRES Y MUJERES SEGURIDAD A INSTALACIONES	363	POLTRONA CON BRAZOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 10, 11 G
2	GRUPO DE CONTRATOS	387	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 15E.
2	GRUPO DE CONTRATOS	389	MESA DE JUNTAS DIAMETRO EN AGLOMERADO Y FORMICA D= 1,00 MTS. INCLUYE PATAS.	UN		Eje 14F.

2	GRUPO DE CONTRATOS	390	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN		Eje 14F.
2	GRUPO DE BIENES RAICES	397	SOFA DE TRES PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		
2	GRUPO LOGÍSTICO	402	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 12D
2	Control Armenito - Complejo	412	CAMA SENCILLA EN MADERA CEDRO O FLOR MORADO DE 1,00 X 1,90 MTS INCLUYE TENDIDO DE TABLAS.	UN		

GS-2023-208105-MEBOG

2	AREA PARA ESCOLTAS (ESQUEMAS DE SEGURIDAD)	437	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN		Eje 28E
2	AREA PARA ESCOLTAS (ESQUEMAS DE SEGURIDAD)	438	MESA DE JUNTAS DIAMETRO EN AGLOMERADO Y FORMICA D= 1,00 MTS. INCLUYE PATAS.	UN		Eje 28E
2	AREA PARA ESCOLTAS (ESQUEMAS DE SEGURIDAD)	439	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 27 E
2	AREA PARA ESCOLTAS (ESQUEMAS DE SEGURIDAD)	442	MUEBLE PARA HORNOS MICROONDAS DE 1,20 m x 1,90 m x 0,60 m EN EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 18 MM. MANIJAS DE ALUMINIO DE 20 CMS. CON ESPALDAR. (Ancho x Alto x Fondo). CON DOS ENTREPAÑOS. PARTE INFERIOR DOS PUERTAS.	UN		

2	Enfermeria	444	CAMILLA PARA ENFERMERÍA, ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA TAPIZADA ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCA. MEDIDAS CAMILLA, LARGO 1.70 MTS, ALTO 0,70 MTS, ANCHO 0.60 MTS.	UN		
2	Comedor Servicio	446	BARRA PARA COCINA, SUPERFICIE RECTA EN AGLOMERADO DE MADERA DE 2.30 X 0,60 MTS, INCLUYE PEDESTAL EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 25E.
2	Jefatura Área Administrativa	452	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Ejes 23, 24-E, F.
2	Grupo de Infraestructura	460	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		
2	Tesorería MEBOG	464	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		Eje 19E

GS-2023-208105-MEBOG

3	Sala de Juntas	502	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1.80 X 0.80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FORMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN		Eje 25,C
3	Oficina Comando Operativo de Seguridad Ciudadana - COSEC	505	MESA DE JUNTAS DIAMETRO EN AGLOMERADO Y FORMICA D= 1,00 MTS. INCLUYE PATAS.	UN		Eje 25,C

3	Sala de Juntas Comunal	519	MESA LINEAL DE 4.64 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	[redacted]	Ejes 29-30,F

GS-2023-208105-MEBOG

3	Sala de Juntas Comunal	520	MESA LINEAL DE 1.25 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	[redacted]	Ejes 29-30,F
3	SALA DE ESTAR	526	SOFA DE DOS PUESTOS TAPIZADO EN PRANNA, PATAS EN ACERO INOXIDABLE.	UN		EJES 24-25,D-E

4	Gestión Documental - GUGED	532	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1.80 X 0.80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	[redacted]	Ejes I-12

GS-2023-208105-MEBOG

4	Gestión Documental - GUGED	533	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	[redacted]	Ejes f-12

4	Subcomando Policia Metropolitana de Bogotá - SUBCO (despacho)	542	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1.80 X 0.80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN		Eje 17-f
4	Subcomando Policia Metropolitana de Bogotá - SUBCO (despacho)	546	MESAS DE CENTRO ELABORADA EN MADERA NOGAL, CRISTAL DE 10 MM, PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1,00 X 1,00 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN		Eje 17-F
4	Subcomando Policia Metropolitana de Bogotá - SUBCO (despacho)	548	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA	UN		Eje 16-F
4	Oficina Comando Metropolitana de Bogotá (despacho)	571	MESAS DE CENTRO ELABORADA EN MADERA NOGAL, CRISTAL DE 10 MM, PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1,00 X 1,00 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN		Eje 19-C y Eje 17,D-E

GS-2023-208105-MEBOG

4	Oficina Comando Metropolitana de Bogotá (despacho)	577	MESA DE NOCHE EN MADERA EN CEDRO O FLOR MORADO, UNA GAVETA Y UN CAJON ZAPATERO CON PUERTA.	UN	[redacted]	Eje 18-C
4	Asociación de Obras Sociales (AOS)	618	MESA DE JUNTAS SUPERFICIE DE 1.80 X 0.80 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. FALDÓN FRONTAL Y LATERAL EN AGLOMERADO EN 18 mm, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6 CMS DE ESPESOR POR DONDE SUBE EL CABLEADO, DOS MULTITOMAS EN ALUMINIO CON TRES TROQUELES PARA COLOCAR TOMAS DE CORRIENTE VOZ Y DATOS, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN		Ejes 24-C

4	Asociación de Obras Sociales (AOS)	619	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	[redacted]	Ejes 24-C

GS-2023-208105-MEBOG

4	Responsable Planeación, Gestión Ambiental, Responsable Planeación Estrategica, Responsable Gestión procesos Planeación Servicios de Polica, Mejora. Continua, Doctrina policial y Responsable Plan de Compras	624	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN		Ejes 28-29,C

4	Comando Operativo de Seguridad Ciudadana - COCOR	638	MESA LINEAL DE 4.64 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FORMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8. SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 60MS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	[redacted]	Eje 28, D-E

GS-2023-208105-MEBOG

4	Comando Operativo de Seguridad Ciudadana - COCOR	639	MESA LINEAL DE 1.25 X 0.60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA (TABLEX DE 30 MM, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN F8 (FORMALITE O FÓRMICA) BALANCE INFERIOR EN UREA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO. PLATINAS DE AMARRE SUPERIOR EN PLATINA HR DE 3/16", SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA FIJACIÓN DE LA SUPERFICIE.FALDÓN FRONTAL Y LATERAL: EN MADERA AGLOMERADA EN 18MM, ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO FORMICA F8, SOPORTES EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA DE 6CMS, MULTITOMA EN ALUMINIO CON TROQUELES, CANALETA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18.	UN	[redacted]	Eje 28, D-E

5	Sala de Juntas	660	SILLA INTERLOCUTORA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO Y FIBRA DE VIDRIO POR PROCESO DE INYECCIÓN ASISTIDA POR GAS, CON ADITIVOS UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ. ESPALDAR TAPIZADO CON TELA DE ESPECIAL RESISTENCIA Y TEJIDO DE ORIFICIOS (MALLA). ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8", EN ACERO C.R. CALIBRE 16. ESTRUCTURA CON ACABADO CROMADO. TAPIZADO PARA ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO, ACABADO EN TELA.	UN	[redacted]	Eje 29-C
6	Seccional de Inteligencia Policial - Jefatura	703	MESAS DE CENTRO ELABORADA EN MADERA NOGAL, CRISTAL DE 10 MM, PATAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1,00 X 1,00 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO.	UN		Ejes 12-13.C
7	COMPLEMENTARIOS	892	SEÑALIZACION EN ACRILICO CRISTAL DE 10 MM, DE 29 X 20 CM, O DE ACUEDO A LAS DIMENCIONES ESPACIALES.	UN		No se sabe ubicación
7	COMPLEMENTARIOS	898	BANDERA DE COLOMBIA DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN		COMPLEMETARIO
7	COMPLEMENTARIOS	900	BANDERA DE LA POLICIA NACIONAL DE 3,00 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO, TEMPESTAD IMPERMEABLE, DOBLE FAZ CON OJETES Y REFUERZOS ALREDEDOR.	UN		COMPLEMETARIO

GS-2023-208105-MEBOG

7	COMPLEMENTARIOS	901	CUADRO LÍNEA DE MANDO EN ACRÍLICO ALTO 50 CMS, LARGO: 160 CM (ver anexos para referencia)	UN	[redacted]	COMPLEMETARIO

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
1/05/2023 6:12:36 p. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

CEA.3.0-07
16-ECD-008

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2023

Coronel
HERBERT LUGUYI BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá (E)
Avenida Caracas 6 - 05
Bogotá.

Asunto: solicitud modificatorio No. 4 contrato 10-2-10045-22

En relación al comunicado de consecutivo C-UTM2022-0016 del 17 de abril de 2023 de la UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022, identificada con NIT. 901.629.691-9, persona jurídica con quien se celebró el contrato 10-2-10045-22, y que tiene por objeto la *"Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá"*, me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien estudiar la viabilidad de autorizar el trámite del Modificatorio No. 4 al contrato en mención, en el cual se proyecta la modificación e inclusión de unos ítems del contrato inicial, lo anterior, debido a que la planeación para la elaboración de los estudios previos del presente proceso, se estableció mediante planimetría de diseño más no de acuerdo a los espacios físicos de la obra lo que imposibilita la correcta instalación de los elementos contratos impidiendo el correcto tránsito de las rutas de evacuación y áreas laborales infuncionales por las circulaciones angostas; por otro lado la supervisión realizó el análisis de la compensación económica de manera conjunta con el contratista, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes para el respectivo ajuste del valor contractual.

Teniendo en cuenta los ajustes verificados, se puede evidenciar mejoramiento de las especificaciones técnicas en el cambio del material de los muebles de los armerillos establecidos inicialmente en madera y que fue necesario modificarlos a lámina metálica según la RESOLUCIÓN *NO. 05884 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, EN LA QUE SE EXPIDE EL MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA*, en la que se establece de manera textual, *..." las unidades policiales que proyecten la adquisición de estanterías para mejorar el almacenamiento de estos bienes, deben solicitar que la elaboración de las mismas sea en aleación de metal..."*, además, en este ítem se presentó un error de digitación referente a las cantidades contratadas, lo que nos obliga a retomar la cantidad inicial establecida en el contrato No. 10-2-10045-22, que corresponde a (104) unidades, sin embargo es importante señalar que el valor unitario ($ 10.177.237,00) establecido en el modificatorio No. 2, se mantiene para el presente requerimiento de modificación, el cual es el resultado del análisis de mercado que realizó la supervisión por el cambio de la condición técnica establecida en el acto administrativo que regula el material para la instalación de los armerillos.

NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	ELEMENTO COTIZADO	VALOR UNITARIO
ESPACIOS Y DISEÑOS SIGLO XXI	900.425.814-8	ARMERILLO DE SEGURIDAD ALTA: DIMENSIONES DEL GABINETE 0,92 X 0,40 X 2,40 MTS DE ALTURA INCLUIDA LA BASE. ESTRUCTURA LATERA, ESPALDAR EXTERNO, PISO, TECHO Y PUERTAS FABRICADAS EN LAMIAN COLD ROLLED CALIBRE 18, ESPALDAR ENTAMBORADO PARTE INTERNA EN LAMINA CAL 16, LATERALES Y PUERTAS PUNZONADO REDONDO DISEÑO DE ACUERDO AL SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD, ESPALDAR INTERNO PUNZONADO PARA GRADUACIÓN DE SOPORTES Y ENTREPAÑOS, BASE EN ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1-1/2 X 3/16", TERMINADOS EN PINTURA EPOXI POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, PUERTAS SOPORTADAS CON BISAGRA DE PIANO, CON PASADORES A PISO Y TECHO CON DOBLE PORTA CANDADO. EL ARMARILLO ESTÁ EQUIPADO CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES ESPACIO INFERIOR PARA 11 FUSILES – 3 SOPORTES PARA 15 PISTOLAS C/U – 10 CAJILLAS PARA MUNICIONES Y UN ENTREPAÑO	$ 10.677.275,00
GEZCO SAS	901.230.320		$ 10.177.237,00
PG MUEBLES	24.621.925-1		$ 10.425.800,00


GS-2023-215953-MEBOG

Es importante indicar que en el contrato inicial, se establecieron (961) ítems en general, los cuales se encuentran discriminados por pisos de acuerdo al programa arquitectónico establecido del proyecto del Nuevo Comando MEBOG, en el que se relacionan 7 pisos, determinando el primer piso como el nivel del sótano y así sucesivamente de manera ascendente; por lo que se requiere modificar las cantidades establecidas inicialmente, con el fin de realizar la compensación económica de los ítems proyectados a mayor valor por el mejoramiento de la calidad de las especificaciones técnicas acondicionadas al respectivo espacio de instalación.

Por otro lado, se requiere el aumento de cantidades de los ítems No. 10 y 128 correspondientes a superficies de trabajo, que permita dotar adecuadamente la SALA CIEPS ubicada en el tercer piso según lo establecido en el negocio jurídico, supliendo la necesidad de dotación del espacio en mención, valor que también será compensado con los ítems relacionados anteriormente.

Adicionalmente se requiere incluir un nuevo ítem para el suministro e instalación de accesorios tipo canaleta, que permita realizar la conexión adecuada del cableado estructurado desde la ubicación de los puntos de red fijados en la obra hasta la ubicación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo, debido a que el reforzamiento estructural del edificio impidió realizar el respectivo traslado de los puntos especificados en la planimetría de diseño, dicho accesorio se requiere con el fin de garantizar la funcionalidad de las diferentes áreas operativas del proyecto, siendo un imprevisto al momento de la instalación de los puestos de trabajo.

Es importante establecer que en la plataforma transaccional SECOPII, se realizó un evento de cotización (solicitud de cotización 034-2023) para el ítem propuesto a incluir, con el fin de garantizar los principios de publicidad y transparencia en los procedimientos que adelanta la entidad, una vez agotado los tiempos por el sistema, no se obtuvo información por parte de los oferentes inscritos en relación con el objeto contractual, como se evidencia en la siguiente imagen:

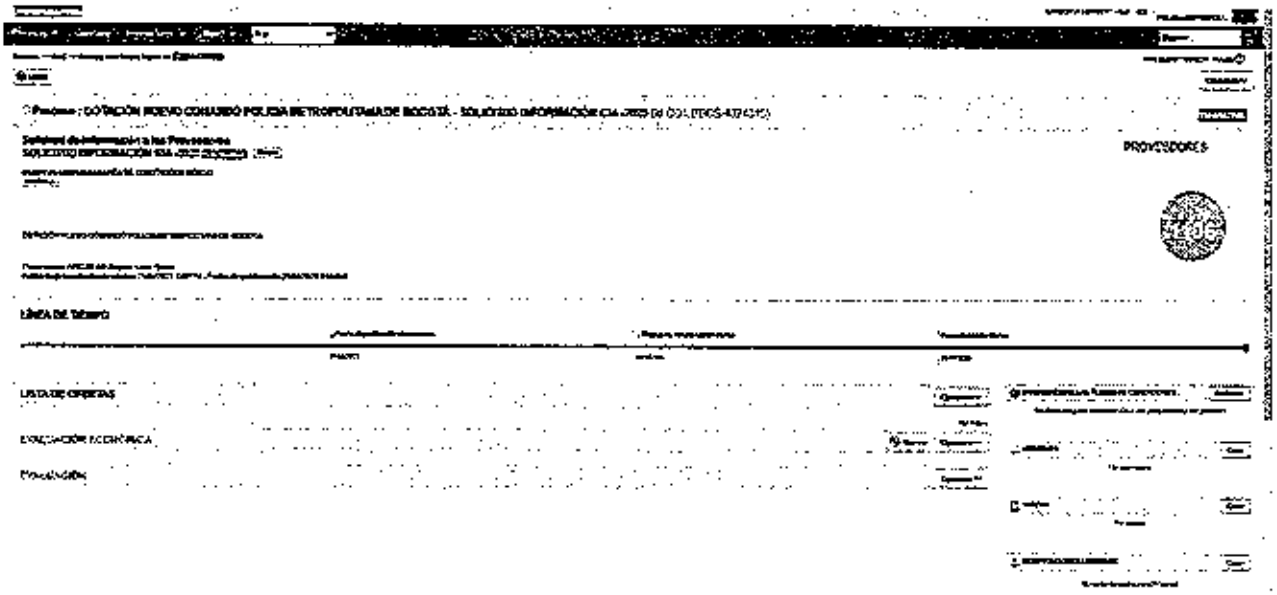

Por lo anterior, se procedió mediante los comunicados oficiales No. GS-2023-202572-MEBOG, GS-2023-202580-MEBOG, GS-2023-202575-MEBOG, a solicitar información de cotización a tres (3) empresas diferentes del ítem en mención, con el fin de realizar un estudio de mercado que estableciera un valor que se ajuste al mercado, obteniendo las siguientes cotizaciones, así:

NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT DE LA EMPRESA	ELEMENTO COTIZADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
METÁLICAS ORDÚZ	80.124.902-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TIPO CANALETA, ELABORADA EN COLD ROLLED CALIBRE 20, PINTURA EPOXIPOLIESTER COLOR A ELECCION, LA CUAL SE ADAPTA A LA NECESIDAD DE CADA PUNTO POR PUESTO DE TRABAJO INSTALADO. CANTIDAD 40 UNIDADES.	$583.100,00	$23.324.000,00
MAXI SAS DISTRIBUCIONES	900.622.492-4		$585.600,00	$23.424.000,00
MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES M&C S.A.S.	900.935.818-5		$595.000,00	$23.800.000,00

Verificando los valores se puede evidenciar que la cotización más favorable referente al menor precio del elemento cotizado, que corresponde a la empresa Metálicas Ordúz identificada con NIT: 80.124.902-2, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS ($583.100,00) moneda legal colombiana, siendo este el valor que se acogería por parte de la entidad.

DESCRIPCION	CANTIDAD	MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO	VALOR TOTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TIPO CANALETA, ELABORADA EN COLD ROLLED CALIBRE 20, PINTURA EPOXIPOLIESTER COLOR A ELECCION, LA CUAL SE ADAPTA A LA NECESIDAD DE CADA PUNTO POR PUESTO DE TRABAJO INSTALADO.	40	$583.100,00	$ 23.324.000,00

La supervisión recomienda modificar la descripción de los ítems No. 865 - 869, correspondientes a las sillas de la peluquería, debido a que en el modificatorio No. 2 se incluyeron por error en la descripción técnica de los ítems, estableciendo una condición en la calidad de las sillas, cuando no es pertinente este tipo de elemento por la función del espacio destinado a la peluquería, por consiguiente, es necesario retomar la descripción inicial de los ítems enunciados en el contrato, así:

PISO	ÁREA	ITEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN NUEVA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UBICACIÓN	CANT. FINAL ITEM
7	PELUQUERIAS	865 - 869	SILLA OPERATIVA ERGONÓMICA CON ESPALDA EN MARCO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MALLA TRASLUCIDA COLOR SEGÚN ELECCIÓN. CONJUNTO GIRATORIO QUE PERMITE BLOQUEAR LA SILLA PARA QUE NO SE RECUESTE, PERILLA PARA QUE TENSIONES Y DISTENSIONES A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. ASIENTO INTERNO EN MADERA CONTRACHAPADA ABULLONADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PAÑO SEGÚN ELECCIÓN DE EXCELENTE CALIDAD. GRADUACIÓN EN ALTURA MEDIANTE PALANCA EN EL MECANISMO QUE ACTIVA CILINDRO NEUMÁTICO A	SILLA PARA PELUQUERÍA, GIRATORIA 360 GRADOS, CON REPOSAMUÑECAS Y BASE CUADRADA, BASE ACERO CROMADO, ALTURA AJUSTABLE, LA ALTURA DE ESTA SILLA ES AJUSTABLE POR LA PALANCA INFERIOR, MÁXIMO A 5 PULGADAS, QUE SE ADAPTA A DIFERENTES CLIENTES ADEMÁS, EL REPOSABRAZOS ES DE MADERA MACIZA, ASIENTO Y ESPALDAR EN CUERO SINTÉTICO O PRANNA COLOR NEGRO. INCLUYE DESCANSA PIES CROMADO.	UN	$2.417.575,50	$4.835.151,00	Ejes 19,C	2

GS-2023-215953-MEBOG

			GAS CON TELESCOPIO EN POLIPROPILENO NEGRO. RUEDAS 100% EN NYLON DOBLE PISTA DE SUAVE RODAMIENTO E INMEDIATA RESPUESTA A CAMBIO DE DIRECCIÓN. BRAZOS FIJOS SEGÚN ELECCIÓN. BASE CROMADA						

También es necesario que, dentro del modificatorio, se reubique los ítems que se relacionan a continuación por la capacidad espacial, ya que no es viable la instalación y sería conveniente ubicarlos en puntos que permita la funcionalidad operativa, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. CONTRACTUALES	CANT. FINAL MODIFICADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UBICACIÓN ANTERIOR ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	UBICACIÓN FINAL
522	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	33	33	$1.594.761,54	$52.627.130,82	SALA CIEPS	Ubicación en servicios generales
585	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTICA CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	1	1	$1.594.761,54	$1.594.761,54	Sala de reuniones grupo control disciplinario interno	Ubicación en servicios generales
627	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES	UN	1	1	$1.594.761,54	$1.594.761,54	Aula de reuniones Plane Mebog	Ubicación en servicios generales

	CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTIC A CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.							
666	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTIC A CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	1	1	$1.594.761,54	$1.594.761,54	Aula de Reuniones Oficina de Asuntos Jurídicos	Ubicación en servicios generales
669	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTIC A CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	1	1	$1.594.761,54	$1.594.761,54.	Aula Grupo de Talento Humano	Ubicación en servicios generales
699	MESA PLEGABLE, SUPERFICIE PRINCIPAL DE 1,10 X 0,70 MTS Y ALTURA 0,72 MTS EN LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS RÍGIDOS EN PVC CON ESPESOR 18 MM, ESTRUCTURA CON APLIQUES CROMADO, TUBERÍA CIRCULAR CON PINTURA ELECTROESTÁTIC A CROMADO, CON RODACHINA DOBLE NYLON DE 75 MM DE DIÁMETRO.	UN	2	2	$1.594.761,54	$3.189.523,08	Aula No. 2 Grupo de Talento Humano	Ubicación en servicios generales

GS-2023-215953-MEBOG

528	ARCHIVO RODANTE MANUAL, INCLUYE PUERTA Y UNILATERAL: COMPUESTO POR 2 CUERPOS FIJOS Y 1 RODANTE PARA UN AREA EXTERNA DE 2,90 MT FRENTE X 2,15 MT ALTURA X 1,10 MT FONDO, CONSTA DE ESTANTERIA DE 94 X 42 CM EN LAMINA CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN OMEGAS CALIBRE 18, PARAL EN UÑA TROQUELADO CALIBRE 14	UN	1	1	$8.406.986,10	$8.406.986,10	Cuarto técnico Piso 4 Archivo	Derechos Humanos
536	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DEL, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18, INCLUYE RETORNO CON CREDENZA MIXTA COMPUESTA POR CAJONERA 2Ø EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTES ENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTEÚNCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO, INCLUYE SILLA OPERATIVO	UN	1	1	$3.927.000,00	$3.927.000,00	CIEPS -PISO 4	Por capacidad espacial se ubica en la oficina del comando

590	PUESTO DE TRABAJO DE 1,50 X 1,65 MTS, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2x1 EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 ENCHAPADAS EN FORMICA F8, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,80 H EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 22 PARTE FRONTAL EN AGLOMERADO ENCHAPADAS EN FORMICA F8, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 18MM EN FORMICA F8, SILLA EJECUTIVA, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS. (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables, taldón en formica).	UN	2	2	$6.274.443,44	$12.548.886,88	Secretario Privado-Suboficial de Comando y Protocolo	Por capacidad especial la credenza se ubicará en la oficina de jefatura de CEEPS
616	ARCHIVO RODANTE MANUAL, INCLUYE PUERTA Y UNILATERAL: COMPUESTO POR 2 CUERPOS FIJOS Y 1 RODANTE PARA UN AREA EXTERNA DE 2,90 MT FRENTE X 2,15 MT ALTURA X 1,10 MT FONDO. CONSTA DE ESTANTERIA DE 94 X 42 CM EN LAMINA CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN OMEGAS CALIBRE 18, PARAL EN UÑA TROQUELADO CALIBRE 14	UN	2	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20	Obras sociales	Se ubicará 1 en los ejes 25-26,C cuarto técnico junto a derechos humanos y otro en la oficina de obras sociales ejes 23-24,C

GS-2023-215953-MEBOG

636	SILLA TANDEM PARA TRES PUESTOS, ESPALDAR Y ASIENTO MONOCONCHA METALICA EN ACERO, ESTRUCTURA METALICA EN ACERO CON LAMINA MICRO PERFORADA DE ALTA CALIDAD, PATAS EN ACERO CON TERMINACION EN CROMO CON SISTEMA DE NIVELADORES CROMADOS.	UN	2	2	$1.075.042,99	$2.150.085,98	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA - COCOR	El que no cabe se ubica en los ejes D-E,20-21, ajustar cantidad de puntos eléctricos
643	SILLA TIPO UNIVERSITARIA, ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA REDONDA DE ACERO COLD ROLLED Ø7/8" CALIBRE 16 PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXY-POLYESTER, TAPIZADO ASIENTO: INSERTO PLÁSTICO INYECTADO RECUBIERTO CON ESPUMA DE POLIURETANO. SUPERFICIE DE ESCRITURA DERECHA O IZQUIERDA EN AGLOMERADO DE 15 MM, CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 Y BALANCE INFERIOR CANTOS DE PVC 1 MM, ABATIBLE A 90° ANTIPÁTICO, TAPONES EN POLIPROPILENO.	UN	294	294	$293.839,32	$86.388.760,08	AUDITORIO	Ubicación en servicios generales
648	ARCHIVO RODANTE MANUAL, INCLUYE PUERTA Y UNILATERAL: COMPUESTO POR 2 CUERPOS FIJOS Y 1 RODANTE PARA UN AREA EXTERNA DE 2,90 MT FRENTE X 2,15 MT ALTURA X 1,10 MT FONDO. CONSTA DE ESTANTERIA DE 94 X 42 CM EN LAMINA CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN OMEGAS CALIBRE 18, PARAL EN UÑA	UN	3	2	$8.406.986,10	$16.813.972,20	GRUPO DE TALENTO HUMANO MEBOG	Por circulación se ubicará 1 elemento en el cuarto técnico junto a responsables historias laborales GUTAH

	TROQUELADO CALIBRE 14							
651	ARCHIVO RODANTE MANUAL, INCLUYE PUERTA Y UNILATERAL: COMPUESTO POR 2 CUERPOS FIJOS Y 1 RODANTE PARA UN AREA EXTERNA DE 2,90 MT FRENTE X 2,15 MT ALTURA X 1,10 MT FONDO. CONSTA DE ESTANTERIA DE 94 X 42 CM EN LAMINA CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN OMEGAS CALIBRE 18, PARAL EN UÑA TROQUELADO CALIBRE 14	UN	24	25	$3.406.986,10	$210.174.852,50	Ubicados en cuartos técnicos junto a Responsables historias laborales GUTAH y cuarto técnico eje 29-30,F	Se adiciona el item 648 para 25 ubicados. Los 25 se distribuirán de la siguiente manera 9 en los ejes 15-17,F, 7 en los ejes 22-24,F y 9 en los ejes 29-30,F
715	ARCHIVO RODANTE MANUAL, INCLUYE PUERTA Y UNILATERAL: COMPUESTO POR 2 CUERPOS FIJOS Y 1 RODANTE PARA UN AREA EXTERNA DE 2,90 MT FRENTE X 2,15 MT ALTURA X 1,10 MT FONDO. CONSTA DE ESTANTERIA DE 94 X 42 CM EN LAMINA CALIBRE 20 CON REFUERZOS EN OMEGAS CALIBRE 18, PARAL EN UÑA TROQUELADO CALIBRE 14	UN	18	18	$3.406.986,10	$151.325.749,80	Cuarto técnico junto a SIPOL	Por capacidad espacial, se ubica en los ejes 12-D seccional de inteligencia policial
383	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DEL, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5,	UN	13	12	$3.927.000,00	$47.124.000,00	GRUPO FINANCIERO	Por capacidad espacial, se reubica el puesto en la ubicación del item 494 Eje 24-C

GS-2023-215953-MEBOG

	CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLO ROLLED CAL. 18, INCLUYE RETORNO CON CREDENZA MIXTA COMPUESTA POR CAJONERA 2X! EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTES ENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTESENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO. INCLUYE SILLA OPERATIVO							
74	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 3.00 X 0.70 MTS, INCLUYE LAVAPLATOS DE 0.46 X 0.46 MTS	UN	1	1	$2.875.998,00	$2.875.998,00	SIJIN - Cocineta	Se ubica en el área de la cocina del piso 6
97	MESON DE 3.40 X 0,70 CON LAVAMANOS	UN	1	1	$2.915.397,96	$2.915.397,96	SIJIN - Laboratorio de macroscopio	Se ubica en el área de la cocina del piso 6
711	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DEL, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLO ROLLED CAL. 18, INCLUYE RETORNO CON CREDENZA MIXTA COMPUESTA POR CAJONERA 2X! EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTES ENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H EN LÁMINA DE ACERO COLO	UN	32	32	$3.927.000,00	$125.664.000,00	Área de operaciones de inteligencia	Por capacidad espacial se ubica 1 unidad en el piso 5 Sala de monitoreo CCTV

	ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTEÚNCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO. INCLUYE SILLA OPERATIVO							
714	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DEL, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLO ROLLED CAL. 18, INCLUYE RETORNO CON CREDENZA MIXTA COMPUESTA POR CAJONERA 2XI EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTES ENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTEÚNCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO. INCLUYE SILLA OPERATIVO	UN	15	15	$3.927.000,00	$58.905.000,00	Área de operaciones	Por capacidad espacial se instalan 12 elementos los 3 elementos se ubican en EJES 19-C piso 4 comunicaciones estratégicas, 25-C piso 4 telemática y 29-D piso 4 asuntos jurídicos

GS-2023-215953-MEBOG

804	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO DE 1,50 X 1,50 MTS EN FORMA DEL, EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN FB, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLO ROLLED CAL 18, INCLUYE RETORNO CON CREDENZA MIXTA COMPUESTA POR CAJONERA 2Q EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTES ENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO, CREDENZA DE 1,00 X 0,50 X 0,68 H EN LÁMINA DE ACERO COLO ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTEÚNCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO. INCLUYE SILLA OPERATIVO	UN	37	37	$3.927.000,00	$145.299.000,00	SIPOL-Contrainteligencia	Por capacidad espacial, se ubican 2 elementos en sótano Ejes 27-28, G Unidad Investigativa delitos contra la vida, DH y DIH y 1elemento en piso 5 CRI ejes 19-C
949	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN GRANITO, SALPICADERO EN GRANITO DE 0,10 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 15MM EN SÚPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, BORDES EN CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS, DIMENSIONES LARGO: SEGÚN ESPACIO, FONDO: 60 CM, ALTURA: 90 CM	UN	2	2	$7.492.071,30	$14.984.142,60	Cocineta externa piso 7	Por capacidad espacial se ubica 1 elemento en piso 5

960	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN GRANITO, SALPICADERO EN GRANITO DE 0,10 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 15MM EN SUPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, BORDES EN CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS. DIMENSIONES LARGO: SEGÚN ESPACIO, FONDO: 60 CM, ALTURA: 90 CM	UN	1	1	$9.332.517,00	$9.332.517,00	Sótano	No se evidencio lugar de instalación en sótano, se reubica en piso 5 por distribución arquitectónica
961	COCINETA O COFFE PONIT, SUPERFICIE EN GRANITO, SALPICADERO EN GRANITO DE 0,10 MTS POCETA EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE ALTO Y MUEBLE BAJO EN AGLOMERADO DE 15MM EN SUPER MUFF RESISTENTE A LA HUMEDAD, BORDES EN CANTO RIGIDO TERMOFUNDIDO, ACCESORIOS DE APERTURA Y CIERRE EN ACERO, INCLUYE PUERTAS, CAJONES Y ENTREPAÑOS.DIMENSIONES LARGO: SEGÚN ESPACIO, FONDO: 60 CM, ALTURA: 90 CM	UN	1	1	$25.719.915,00	$25.719.915,00	Cocina sótano	No se evidencio lugar de instalación en sótano, se reubica en piso 1 por distribución arquitectónica

Para ser viable el modificatorio, la supervisión sugiere muy respetuosamente, que se realice la reducción en las cantidades de los siguientes ítems, que permitan justificar la compensación económica con el contratista descrita en la presente comunicación oficial y que se requiere para cumplir y continuar con la ejecución contractual establecida en el contrato No. 10-2-10045-22, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT CONTRATADAS
45, 330, 411, 418	ARMERILLO DE SEGURIDAD ALTA: DIMENSIONES DEL GABINETE 0,92 X 0,40 X 2,40 MTS DE ALTURA INCLUIDA LA BASE. ESTRUCTURA LATERAL, ESPALDAR EXTERNO, PISO, TECHO Y PUERTAS FABRICADAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, ESPALDAR ENTAMBORADO PARTE INTERNA EN LAMINA CAL 16, LATERALES Y PUERTAS PUNZONADO REDONDO DISEÑO DE ACUERDO AL SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD, ESPALDAR INTERNO PUNZONADO PARA GRADUACIÓN DE SOPORTES Y ENTREPAÑOS, BASE EN ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1-1/2 X 3/16", TERMINADOS EN PINTURA ÉPOXI POLIÉSTER APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, PUERTAS SOPORTADAS CON BISAGRA DE PIANO, CON PASADORES A PISO Y TECHO CON DOBLE PORTA CANDADO. EL ARMERILLO ESTÁ EQUIPADO CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES ESPACIO	UND	DE 208 A 104

GS-2023-215953-MEBOG

	INFERIOR PARA 11 FUSILES – 3 SOPORTES PARA 15 PISTOLAS CU – 10 CAJILLAS PARA MUNICIONES Y UN ENTREPAÑO		
79, 80, 82, 88, 131, 192	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO SUPERFICIE RECTA 1,50 X 0,60 MTS EN AGLOMERADO DE MADERA de 30 mm, RECUBRIMIENTO PARTE SUPERIOR LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BALANCE INFERIOR, RECUBRIMIENTO PERIMETRAL CANTOS EN PVC TERMOFUNDIDO, SOPORTE EN ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063/T5, SISTEMA AUTOSOPORTADO CON CONDUCCIÓN BAJO SUPERFICIE DE CABLEADO CON CANALETA Y TUBULAR BAJANTE COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE CAJONERA 2X1 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON FRENTES ENCHAPADOS EN MADERA, MANIJAS EN ACERO Y SILLA OPERATIVA (Incluye herrajes, platinas, soportes, pasacables).	UND	DE 126 A 116
908	TABLERO ACRÍLICO MEDIDAD 1.94 X 1.17 X 0,66 MTS, ESPESOR TABLERO 2 CM BASE EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR SUPERCOR, SUPERFICIE RAYABLE Y PORTA-BORRADOR, FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO DE 18 MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8, BASE CON 4 RODACHINAS EN PVC BLANCO TIPO PLATAFORMA, CADA UNA CON SISTEMA DE FRENO PARA BLOQUEO DE TODO EL TABLERO.	UND	DE 11 A 1

Con la reducción de las cantidades enunciadas en el cuadro anterior, la entidad tendría la opción de hacer efectivo la compensación económica con el contratista y la viabilidad para realizar el modificatorio No. 4 y no generar sobrecostos por la presente solicitud, y así cumplir con el cronograma de ejecución contractual, por consiguiente, se describe en el siguiente balance de cantidades y precios, así:

COMPENSACIÓN ECONÓMICA					
	ÍTEM – DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	
ÍTEMS AUMENTADOS	10 (PANTALLAS)	0.42		$	130.983,99
	128 (SUPERFICIES)	14		$	40.997.839,40
ÍTEMS DISMINUIDOS	908 (TABLEROS)	10	$ 15.296.835,00		
	(PUESTOS DE TRABAJO)	10	$ 32.001.000,00		
ÍTEMS COMPENSADOS MOD. 4	45, 330, 411 Y 418 (ARMERILLOS)	104		$	350.337.667,68
	874 (BANCAS DE CAFETERÍA)	48		$	14.611.659,36
	641 (SILLAS DEL AUDITORIO)	70		$	120.126.596,80
	A CREAR 962 (SUMINISTRO DE CANALETA)	40		$	23.324.000,00
	MEJORAMIENTO PUESTOS DE TRABAJO 474 (1), 498 (1), 67 (1), 1 (101), 7 (251), 9 (22), 11 (6), 15 (11), 17 (143), 22 (6), 36 (2), 47 (3), 76 (3), 79 (5), 80(12), 82(4), 85(2), 88(4), 93(2), 95(1), 99(1), 104(8), 105(2), 107(10), 108(10), 114(2), 116(2), 121(8), 124(15), 131(20), 167(2), 169(3), 173(9), 181(3), 187(66), 190(10), 192(81), 331(4), 333(12), 352(2), 409(3), 421(4), 427(3), 433(2), 673(16), 709(6), 800(2), 14(1), 372(2), 383(13), 385(10), 394(7), 399(8), 407(5), 444(3), 457(4), 462(4), 475(18), 476(20), 424(4), 514(8), 515(9), 529(18), 534(2), 537(11), 555(6), 561(15), 594(10), 611(16), 614(2), 621(1), 622(26), 635(20), 644(55), 650(19), 658(24), 633(1), 671(4), 676(8), 683(2), 686(17), 706(2), 711(32), 713(15), 714(15), 794(28), 804(37), 373(2), 450(2), 477(2), 538(1), 563(1), 587(1), 590(1), 596(3), 609(1), 613(1), 474(1), 498(1).	1437		$	546.020.383,81
ÍTEMS COMPENSADOS MOD. 2	591 (1), 696 (2) RECEPCIONES ELIMINADAS	3	$ 21.045.935,70		
	378 (7), 443 (1), 490 (3) y 536 (1) RECEPCIONES MODIFICADAS A PUESTO DE TRABAJO	12	$ 30.326.155,76		
	474 (1), 498 (1) RECEPCIONES DISMINUIDAS	de 4 a 2	$ 11.776.987,60		
ÍTEMS CANT. 0	5,30,31,32,37,38,42,43,44,46,54,55,56,59,60,61,62,63,64,72,73,75,77,78,87,91,100,101,106,110,115,117,127,133,143,150,151,158,182,196,201,202,203,204,205,206,222,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,238,239,240,241,242,248,251,254,255,257,258,260,272,274,283,284,285,286,287,288,289,290,291,294,295,296,297,306,324,325,327,338,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,356,357,358,359,376,422,423,424,425,482,591,602,605,647,6		$ 385.152.216,88		

	54,681,682,672,675,685,687,695,791,796,798,849,852,858,876,880,881,883,884,885,886,887,888,889,890,897,903,904,905,906,907,910,911,912,913,914,915,918,919,920,921,922,923,924,925,926,930,931,932,933,934,935,936,937,938,940,941,943,944,945.			
TOTAL			$1.095.599.131,04	$1.095.599.131,04

Conforme a lo anterior argumentado, la supervisión ve viable modificar el contrato No. 10-2-10045-22, después de haber realizado detalladamente un análisis de cada ítem que permitirá priorizar la funcionalidad operativa del proyecto conforme al valor asignado del presente contrato.

Por último mi Coronel, la solicitud allegada por parte del contratista fue evaluada y avalada por la supervisión del contrato para el desarrollo del modificatorio No. 4, de acuerdo al seguimiento y acompañamiento permanente a la ejecución establecida en las etapas de replanteo, fabricación e instalación; siendo importante señalar que la etapa de instalación, es la de mayor complejidad en el presente proceso, por los diversos inconvenientes y/o imprevistos generados en la ejecución del contrato de obra e interventoría a cargo de la SDSCJ y del contrato de Dotación del nuevo comando a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá, respecto a las viabilidades de ingreso a las instalaciones y áreas a dotar que tienen como consecuencia retrasos representativos en el cronograma, además de la subsanación de inconsistencias arquitectónicas evidenciadas en la etapa de replanteo y que en su momento se informaron ante la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia mediante comunicados oficiales No. GS-2022-551503-MEBOG - GS-2022-551633-MEBOG, por todo lo anterior, impiden la correcta instalación de los elementos contratados, sumado a ello, se evidencia la demora para el inicio de la instalación en el nivel del sótano derivada por la intervención de la barrera de vapor por parte del contratista de obra de la SDSCJ, quien tiene el deber de subsanar el alto grado de humedad que presenta la placa de contrapiso y la finalización de los acabados en este nivel, para continuar con la instalación mobiliario.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
4/05/2023 5:18:48 p. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

4ª Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO BIENES RAICES

GEA 3.0-07
16-ECD-003

AREAD-GUBIR - 29.25

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2023

Señor (a) coronel
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana de Bogota
Avenida Caracas 6-05
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta comunicado oficial GS-2022-500292-MEBOG informe Nuevo Comando

En cumplimiento a la orden emitida sobre el seguimiento al proyecto de nuevo comando, de la Policía Metropolitana de Bogotá; respetuosamente me permito informar a mi coronel los aspectos relevantes a los contratos correspondientes de los componentes de obra y dotación de mobiliario del proyecto en mención:

Componente de Obra:

- El proyecto inicia en el año 2008, con la donación del predio a la Policía Nacional 1 por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.
- En el año 2010, se ejecutan los primeros contratos de obra por $43.794.257.360 e interventoria por $2.500 millones a cargo de Fondo de vigilancia y seguridad por un valor de $46.294 millones, sobre el cual existe un cuestionamiento fiscal por parte de la Contraloría General de la Republica.
- La Policía Nacional invierte $2.120 millones por concepto de ajuste a diseños de paisajismo y urbanismo $417millones, impuesto de delineación $1.612 millones y licencia de construcción $90 millones.

En el año 2013, se suscribe CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 01120, fecha de inicio: 16/octubre/2013 y fecha de terminación: 31/diciembre/ 2022, convenio que a la fecha tiene 7 prórrogas, en la cláusula 4 OBLIGACIONES DE LA PONAL se plasmó:

"*Gestionar la consecución y apropiación de los recursos que requiera el cumplimiento de los compromisos relacionados con las adecuaciones, dotación técnica y actividades complementarias para el debido funcionamiento de la nueva sede del COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (...)* "

En el 2018 se retoma el proyecto mediante contrato No. 1132 de fecha 19/12/2018 Consorcio de Seguridad Distrito Capital, cuyo objeto es la "*CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ*", realizado por la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia- SDSCJ por valor de $132.280.285.760 millones, y contrato de interventoria N°1129 de fecha 19/12/2018 CONSORCIO CONNECTA, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO 1132/2018" por valor de $7.293.980.259 millones, con fecha de inicio 05/01/2019 y terminación 17/06/2023 (según prorrogas contractuales).

Por lo anterior, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi General que, teniendo en cuenta el comité de obra número 221 efectuado el día 11 de abril 2023 en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia (SDSCJ) piso 13, se trataron los siguientes temas relacionados con la ejecución del proyecto, así.

1) Estado de avance


GS-2023-218710-MEBOG

- PROGRAMADO: 99,21 %
- EJECUTADO: 99.20%

En la primera semana de seguimiento al nuevo programa se observa se identifica la necesidad de aumentar el rendimiento en la ejecución del plan establecido para ejecutar las actividades de la ruta crítica de acabados en sótanos. En la semana pasada se trabajó en instalación de piso en linóleo del sótano desde el día miércoles y se constató un rendimiento promedio de 45 M2 por día. En respuesta enviada por el consorcio se indica que se estará terminado la instalación el 20 de mayo del 2023, teniendo en cuenta que el 50% de los insumos importados para la barrera de vapor llega el 10 de mayo. El promedio de ejecución para poder llegar a esta meta es de 245 M2 día.


Se presentan desviaciones en la ejecución de actividades relacionadas con la construcción de redes de alcantarillado pluvial, la construcción de sumideros, acometidas de alumbrado, fibra óptica del acceso por la carrera 56 y la instalación de la torre de comunicaciones.

A la fecha no se presenta ninguna desviación en el consolidado general y se conserva la fecha de terminación en junio 17 de 2023, debido a que la desviación de las redes de alcantarillado y la instalación de la torre de comunicaciones es mitigable. El plazo para evitar desviaciones es de dos semanas.

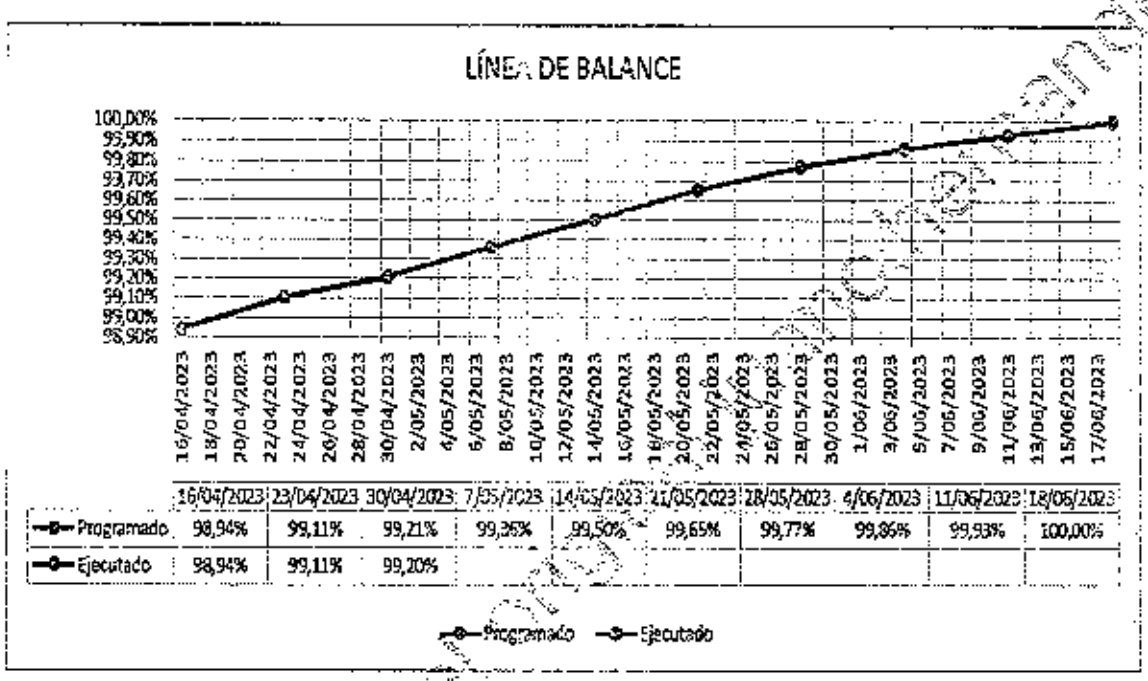

	16/04/2023	23/04/2023	30/04/2023	7/05/2023	14/05/2023	21/05/2023	28/05/2023	4/06/2023	11/06/2023	18/06/2023
Programado	98,94%	99,11%	99,21%	99,36%	99,50%	99,65%	99,77%	99,86%	99,93%	100,00%
Ejecutado	98,94%	99,11%	99,20%							

Esta copia es de uso exclusivo del proceso

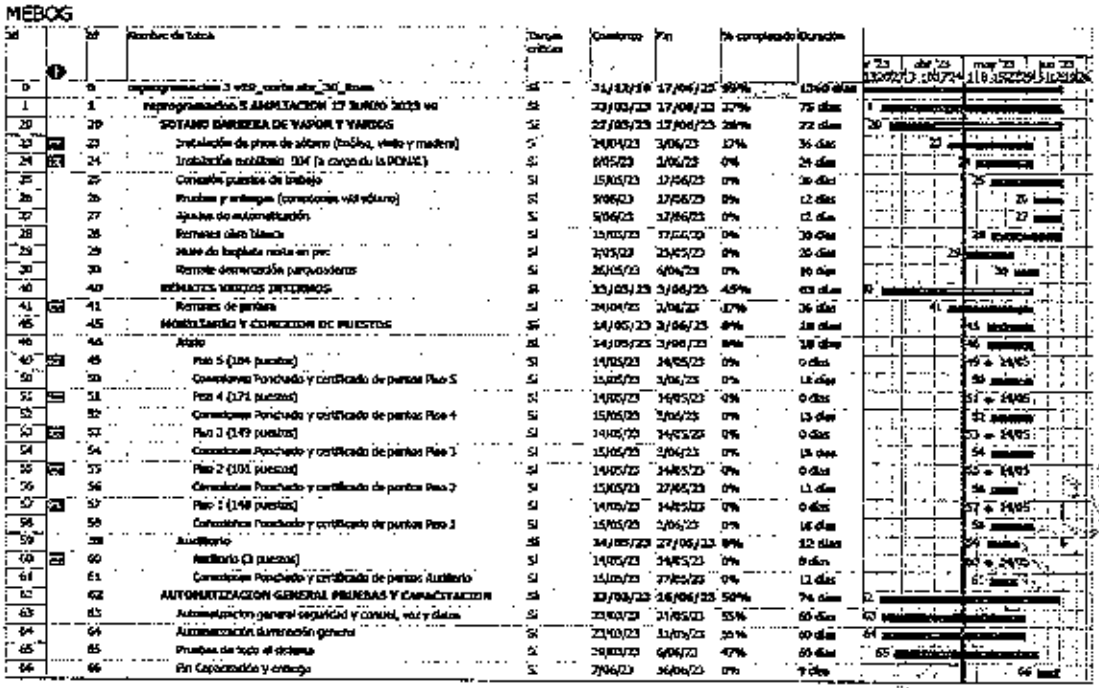
MEBOG

Id		EDT	Nombre de tarea	Tarea crítica	Comienzo	Fin	% completado	Duración
0		0	reprogramacion 3 vf10_corte abr_30_fines	SÍ	31/12/19	17/06/25	99%	1960 días
1		1	reprogramacion 5 AMPLIACION 17 JUNIO 2023 vc	SÍ	23/03/23	17/08/23	37%	75 días
20		20	SOTANO BARRERA DE VAPOR Y YARDAS	SÍ	27/03/23	17/06/23	26%	72 días
22		22	Instalación de pisos de alfombra (baños, vinilo y madera)	SÍ	24/04/23	3/06/23	17%	36 días
24		24	Instalación mobiliario 104 (a cargo de la PONAL)	SÍ	8/05/23	2/06/23	0%	24 días
25		25	Conexión puestos de trabajo	SÍ	15/05/23	17/06/23	0%	30 días
26		26	Pruebas y entregas (computoras vdi sótano)	SÍ	5/06/23	17/06/23	0%	12 días
27		27	Ajustes de automatización	SÍ	5/06/23	17/06/23	0%	12 días
28		28	Remates obra blanca	SÍ	15/05/23	27/06/23	0%	30 días
29		29	Retie de baqueta resto en pvc	SÍ	3/05/23	25/05/23	0%	20 días
30		30	Remate demarcación parqueaderos	SÍ	26/05/23	6/06/23	0%	10 días
40		40	REMATES VARIOS PISOS PRIMEROS	SÍ	23/03/23	3/06/23	45%	53 días
41		41	Remates de pintura	SÍ	24/04/23	3/06/23	17%	36 días
45		45	MOBILIARIO Y CONEXION DE PUESTOS	SÍ	14/05/23	3/06/23	8%	18 días
46		46	Aseo	SÍ	14/05/23	3/06/23	8%	18 días
47		47	Piso 5 (104 puestos)	SÍ	14/05/23	14/05/23	0%	0 días
50		50	Consolidado Ponchado y certificado de puntos Piso 5	SÍ	15/05/23	3/06/23	0%	14 días
51		51	Piso 4 (171 puestos)	SÍ	14/05/23	14/05/23	0%	0 días
52		52	Consolidado Ponchado y certificado de puntos Piso 4	SÍ	15/05/23	3/06/23	0%	13 días
53		53	Piso 3 (149 puestos)	SÍ	14/05/23	14/05/23	0%	0 días
54		54	Consolidado Ponchado y certificado de puntos Piso 3	SÍ	15/05/23	3/06/23	0%	13 días
55		55	Piso 2 (101 puestos)	SÍ	14/05/23	14/05/23	0%	0 días
56		56	Consolidado Ponchado y certificado de puntos Piso 2	SÍ	15/05/23	27/05/23	0%	11 días
57		57	Piso 1 (148 puestos)	SÍ	14/05/23	14/05/23	0%	0 días
58		58	Consolidado Ponchado y certificado de puntos Piso 1	SÍ	15/05/23	3/06/23	0%	14 días
59		59	Auditorio	SÍ	24/05/23	27/06/23	0%	22 días
60		60	Auditorio (3 puestos)	SÍ	14/05/23	14/05/23	0%	0 días
61		61	Consolidado Ponchado y certificado de puntos Auditorio	SÍ	15/05/23	27/05/23	0%	11 días
62		62	AUTOMATIZACION GENERAL PRUEBAS Y CAPACITACION	SÍ	23/03/23	26/06/23	50%	74 días
63		63	Automatizacion general seguridad y control, voz y datos	SÍ	23/03/23	31/05/23	55%	60 días
64		64	Automatización domotica general	SÍ	23/03/23	31/05/23	30%	60 días
65		65	Pruebas de todo el sistema	SÍ	29/03/23	6/06/23	47%	69 días
66		66	Fin Capacitación y entrega	SÍ	7/06/23	26/06/23	0%	9 días

1) Por parte del contratista constructor está pendiente entregar el dia 04 de mayo 2023 los APUs faltantes según matriz consolidada por interventoria, adicional a los APUs queda para ajuste aquellos que sean necesarios para la corrida de puntos del mobiliario y de los de asfalto mal cotizados tiempo limite 08 de mayo 2023.

2) El constructor debe realizar las coordinaciones pertinentes para que el plano de topografía donde están las áreas de sesión se encuentre firmado.

3) La SDSCJ realizara las aclaraciones a las observaciones realizadas a los diseños del IDU recibidos por parte de la Entidad vía mail: entrega de plano con niveles transversales actualizados, adicional la scj debe definir los ajustes al proyecto serie 6. Nueva factibilidad para la zona de la carrera 60. Programar reunión con CODENSA.

4) Por parte de la Universidad Nacional está pendiente la respuesta a las observaciones del constructor con relación a los planos de diseño definitivos para las áreas de sección: acceso vehicular y plazoleta de la carrera 60, realizar nueva solicitud de factibilidad y ajustes para el proyecto serie 6 costado w.

Componente mobiliario:

De acuerdo al contrato 1.0-2-10045-22, cuyo objeto es la "Dotación del proyecto del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá", a la fecha se tiene un porcentaje de avance del 42%, el proyecto cuenta la finalización de instalación en los pisos del 1 al 6 de elementos como puestos de trabajo operativos en el piso 1, salas de estar, elementos correspondientes a los alojamientos como camas y mesas de noche, y elementos de la cocina general, así mismo se cuenta con áreas operativas (puestos de trabajo) completas desde el piso 5 al 2, áreas de archivos, áreas de bienestar piso 6 como gimnasio, comedores, salas de estar en los diferentes niveles, salas de capacitación, capilla y auditorio.


En el desarrollo de las actividades articuladas entre el componente obra y el contratista de mobiliario, se estableció mediante actas condicionadas la disposición de los espacios del edificio al contratista de mobiliario para la ejecución de las actividades de instalación de lo diferentes elementos contratados, de los cuales se encuentran a disposición del contratista de mobiliario los pisos 1,2,4,5 y 8 áreas del nivel del sótano, las cuales


GS-2023-218710-MEBOG

fueron áreas entregadas al contratista de mobiliario por no requerir la instalación de la barrera de vapor; es importante establecer que se ha solicitado en repetidas ocasiones la disposición de asistencia al personal del componente de obra (constructor – interventoría) y SDSCJ, para la respectiva entrega de los pisos 5,4 y las 8 áreas del nivel del sótano, con el fin de no generar retrasos en el cronograma proyectado por el consorcio constructor.

En las actividades que se desarrollan en conjunto con la SDSCJ, el personal de obra (constructor – interventoría), se están realizando los recorridos de verificación de replanteo de los puntos eléctricos en el nivel del sótano, con el fin de verificar los puntos que presentan inconveniente para la correcta instalación de los puestos de trabajo y la conexión del cableado estructurado para el optimo funcionamiento de las áreas operativas.

Así mismo, es preciso señalar que, por parte del contratista de la SDSCJ, no se ha emitido respuesta a los comunicados oficiales No. No. GS-2023-119280-MEBOG, GS-2023-070379-MEBOG, GS-2023-118476-MEBOG, en los que se solicita la fecha de entrega del nivel del sótano al contratista de mobiliario, que permita iniciar en este nivel la instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo, las cuales se encuentra almacenadas en la circulación del primer piso del proyecto, lo que genera retrasos en la ejecución del presente contrato de acuerdo a la proyección estimada en la prorroga No. 3.

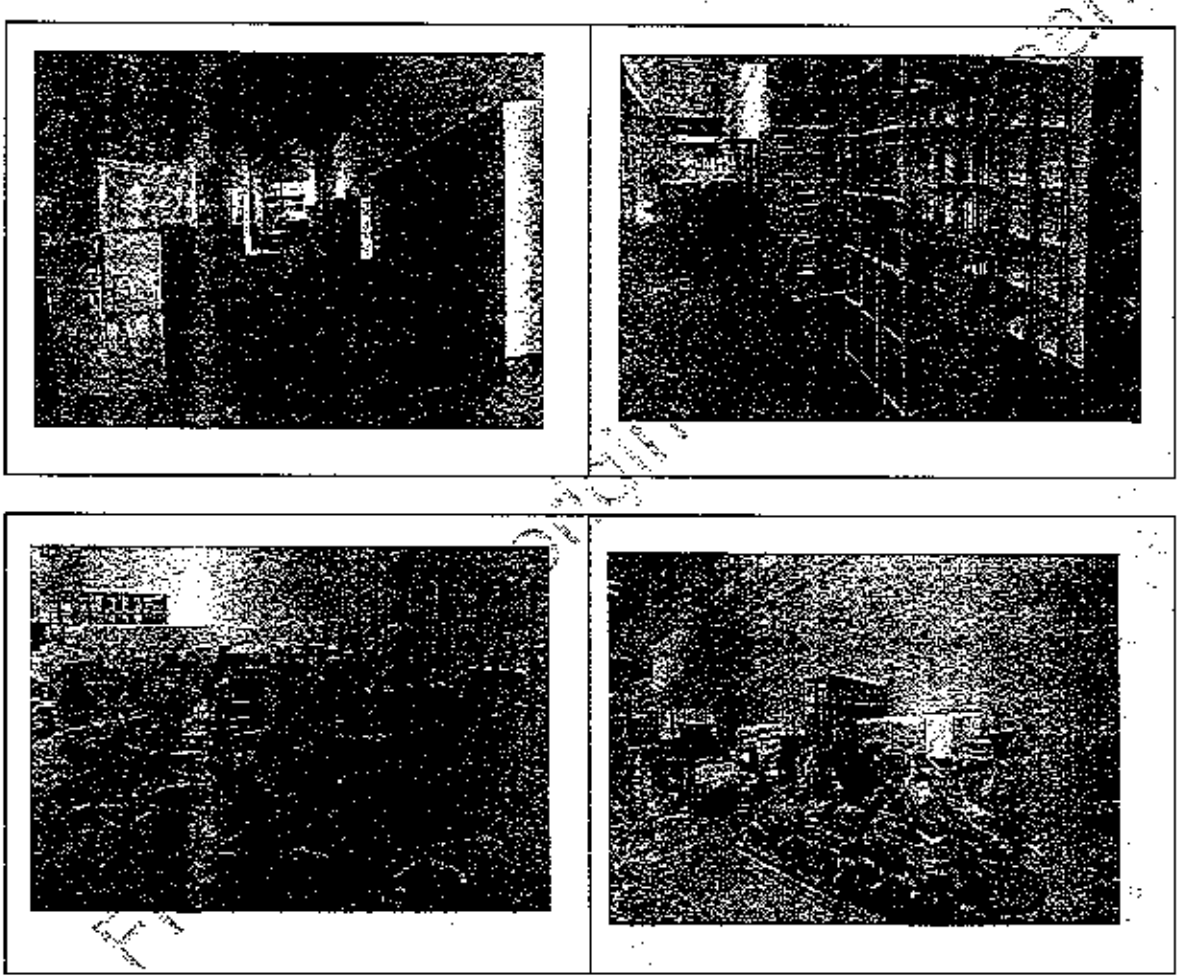

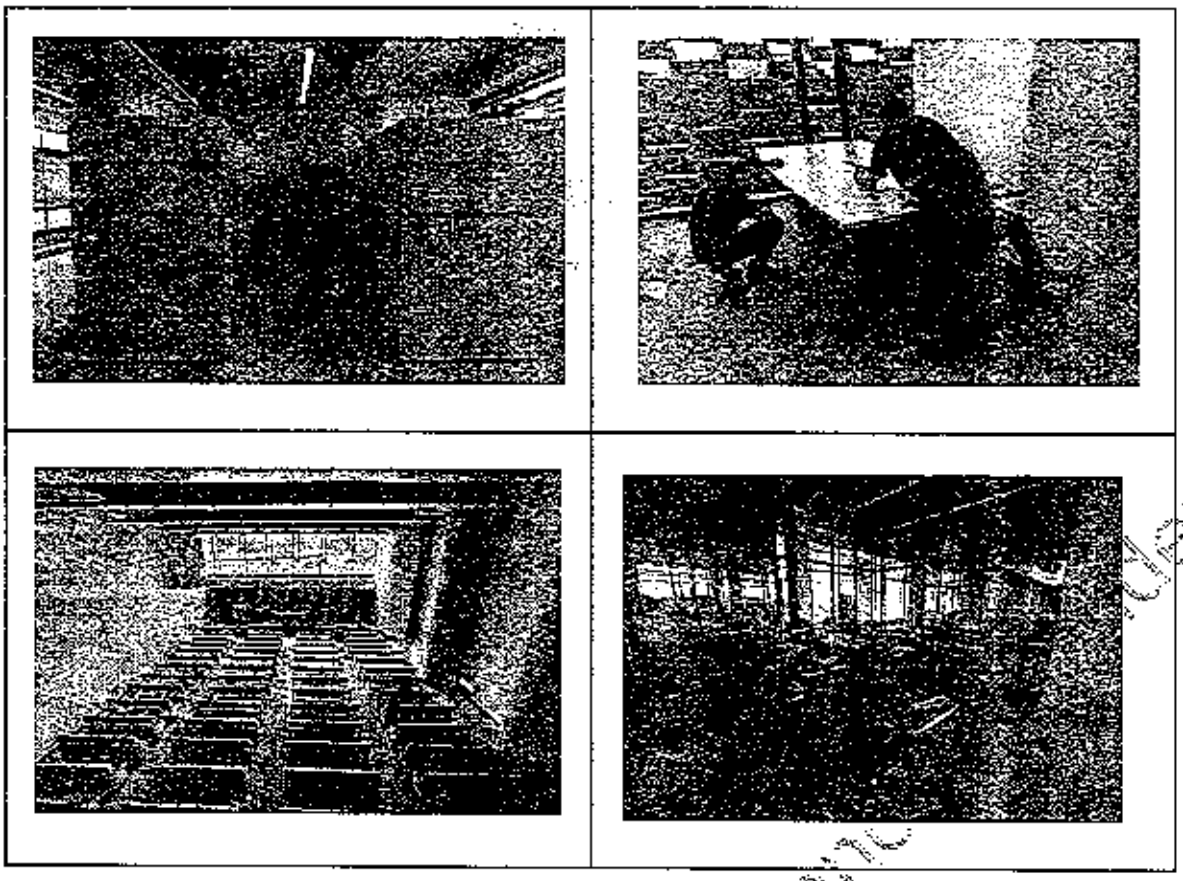

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Domingo Alfredo Lopez Dales
Grado: Coronel
Cargo: Jefe Area Administrativa
Cédula: 78745490
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Area Administrativa Mebog
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: domingo.lopez@correo.policia.gov.co
5/05/2023 5:15:00 p. m.

Anexo: no

Avenida Caracas, 6-05 Pl 5
Teléfono: 031 5521110
mebog.grueo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

CI-A.3.0-07
16-ECD-003

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2023

Señor coronel
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Jefe Area Administrativa
Avenida Caracas 6-05 Pl 5
Bogotá D.C.

Asunto: Informe actividades contrato No. 10-2-10045-22 semana comprendida 26/04/2023 a 02/05/2023.

De acuerdo al contrato No. 10-2-10045-22, que tiene por objeto "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel las actividades que se han realizado en el proyecto nuevo comando MEBOG por parte del componente mobiliario del contrato en mención. En relación a las diferentes actividades que se han realizado con la empresa contratista, me permito informar el avance realizado en la semana comprendida del día 26/04/2023 al día 02/05/2023 en el proceso de fabricación e instalación de la dotación del mobiliario del proyecto del Nuevo Comando.

- Miércoles 26 de abril de 2023, ingresan (15) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Ingreso de material para armado e instalación de archivadores.
  2. Distribución de elementos en pisos requeridos.
  3. Armado de archivo rodantes.
  4. Ingreso de material para armado de muebles aglomerados destinados a piso 2°.
  5. Distribución de elementos a sótano.

- Jueves 27 de abril de 2023, ingresan (18) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Distribución de material a sótano.
  2. Instalación de archivos rodantes en sótano.
  3. Armado de puestos de trabajo en espacios recibidos en sótano.
  4. Armado de muebles aglomerados destinados a piso 2.
  5. Ingreso de (98) sillas operativas.

- Viernes 28 de abril de 2023, ingresan (19) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Ingreso de material para armado e instalación de archivadores.
  2. Armado de archivos rodantes en sótano.
  3. Armado de puestos de trabajo en espacios recibidos en sótano.
  4. Ingreso de (03) Sofás 2 puestos, (01) Sofá de tres puestos, (07) poltronas en prana.
  5. De acuerdo a los puntos críticos de instalación de cableado estructurado a los puestos de trabajo se realiza recorrido por los diferentes niveles con el fin de realizar la demarcación del

GS-2023-218076-MEBOG

punto correcto de salida para la funcionalidad de los mismos. Para que el contratista constructor realice las intervenciones a las que haya lugar.

- Sábado 29 de abril de 2023, ingresan (15) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Armado de archivos rodantes en sótano.
  2. Distribución de elementos y material a sótano.
  3. Ingreso de material de archivos rodantes de sótano.

- Domingo 30 de abril de 2023, ingresan (05) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Armado de puesto de trabajo tipo gerencial en piso 1°.

- Lunes 01 de mayo de 2023, ingresan (05) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Armado de mesa de juntas en piso 1°.

- Martes 02 de mayo de 2023, ingresan () funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Distribución de elementos a sótano.
  2. Ingreso de material para armado e instalación de mesas de juntas.
  3. Armado de mesas de juntas en piso 1°.

En el desarrollo de las actividades articuladas entre el componente obra y el contratista de mobiliario, se estableció mediante actas condicionadas la disposición de los espacios del edificio al contratista de mobiliario para la ejecución de las actividades de instalación de lo diferentes elementos contratados, de los cuales se encuentran a disposición del contratista de mobiliario los pisos 1,2,4,5 y 8 áreas del nivel del sótano, las cuales fueron áreas entregadas al contratista de mobiliario por no requerir la instalación de la barrera de vapor; es importante establecer que se ha solicitado en repetidas ocasiones la disposición de asistencia al personal del componente de obra (constructor – interventoría) y SDSCJ, para la respectiva entrega de los pisos 5,4 y las 8 áreas del nivel del sótano, con el fin de no generar retrasos en el cronograma proyectado por el consorcio constructor.


En las actividades que se desarrollan en conjunto con la SDSCJ, el personal de obra (constructor – interventoría), se están realizando los recorridos de verificación de replanteo de los puntos eléctricos en el nivel del sótano, con el fin de verificar los puntos que presentan inconveniente para la correcta instalación de los puestos de trabajo y la conexión del cableado estructurado para el optimo funcionamiento de las áreas operativas.


Así mismo, es preciso señalar que, por parte del contratista de la SDSCJ, no se ha emitido respuesta a los comunicados oficiales No. No. GS-2023-119280-MEBOG, GS-2023-070379-MEBOG, GS-2023-118476-MEBOG, en los que se solicita la fecha de entrega del nivel del sótano al contratista de mobiliario, que permita iniciar en este nivel la instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo, las cuales se encuentra almacenadas en la circulación del primer piso del proyecto, lo que genera retrasos en la ejecución del presente contrato de acuerdo a la proyección estimada en la prorroga No. 3.

REGISTRO FOTOGRAFICO



GS-2023-218076-MEBOG

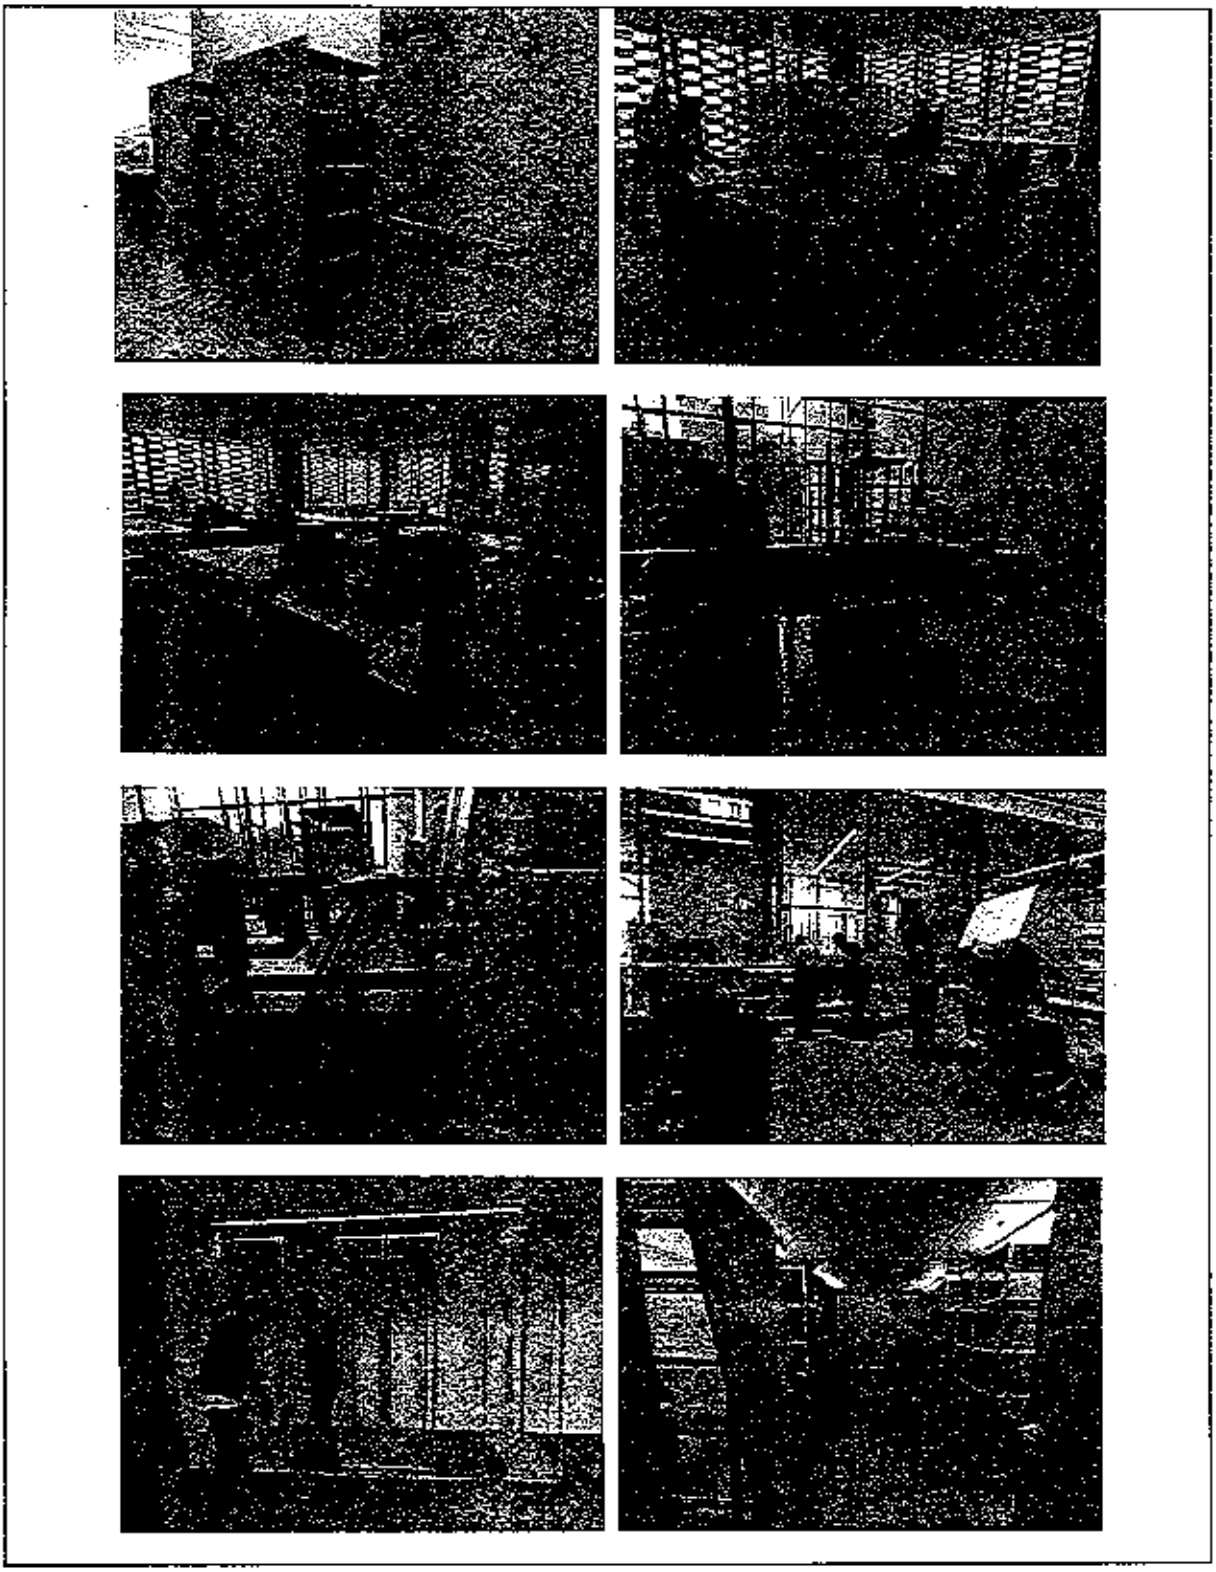

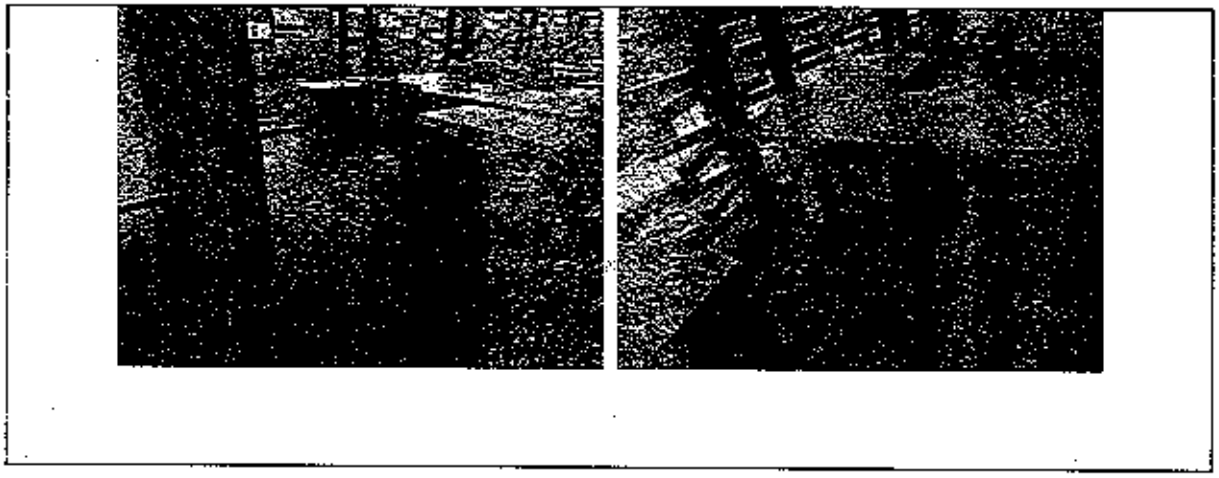

Sobre el avance del proyecto Nuevo Comando MEBOG.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
5/05/2023 3:04:47 p. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

AREAD-GRULO - 2.1

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2023

Señor Coronel (R)
Leonardo Mejía Martínez
Director de Bienes
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Avenida calle 26 57 – 83 piso 13
Bogotá.

Asunto: solicitud ingreso pisos 6 y 3

De acuerdo a la etapa de instalación del contrato No. 10-2-10045-22, cuyo objeto es la "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, la viabilidad de ingreso al piso 6 del 11 al 12 de mayo y al piso 3 en del 15 al 17 de mayo, con el fin de instalar los elementos faltantes de los pisos en mención.

Elevo esta solicitud a su despacho, toda vez que no se logró concretar estos ingresos (permiso de uso) a dichos pisos, debido a que por parte del personal del constructor se manifestó que, era interventoría quien debía autorizar y esta a su vez que era la SDSCJ porque ya se habían entregado a su recaudo.

Agradezco su gestión y acostumbrada colaboración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
10/05/2023 9:53:24 a. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2023-225551-MEBOG

La comunicación oficial de su despacho, se requiere de manera prioritaria para establecer la ruta a seguir con el contrato de mobiliario, toda vez que éste tiene como fecha final el 31 de mayo de 2023 y según lo manifestado en el comité dichas áreas serán entregadas con posterioridad, lo que nos obligaría a tomar algunas determinaciones frente a dicho negocio jurídico.

Agradezco a mi coronel su oportuna respuesta y colaboración ante esta solicitud, la comunicación oficial puede ser enviada a los correos juan.hernandez@correo.policia.gov.co y mebog.arlog@correo.policia.gov.co.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
9/05/2023 3:28:16 p. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

CEA 3.0-07
15-ECD-003

AREAD-GRULO - 2.1

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2023

Señor Coronel (R)
Leonardo Mejía Martínez
Director de Bienes
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Avenida calle 26 57 – 83 piso 13
Bogotá.

Asunto: solicitud entrega nivel del sótano

De acuerdo a los comunicados oficiales No. GS-2023-185995-MEBOG y el No. GS-2023-176908-MEBOG, en el que se solicita la entrega del nivel del sótano y áreas del primer piso faltantes, conforme a la ejecución articulada entre el contrato No. 10-2-10045-22 cuyo objeto es la "DOTACIÓN DEL NUEVO COMANDO DE LA POLICÍA METROPLITANA DE BOGOTÁ" a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el contrato de obra No. 1132 del 19/12/2018 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ", y con base a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo desarrollada con el Señor General (R) Óscar Gómez Heredia, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la que se estableció la entrega de 1.500 m2 del nivel del sótano para el 23 de abril de 2023, de los cuales solo fueron entregados 8 áreas equivalentes a 101 m2 y consecuente al comité de obra del día den hoy 9 de mayo de 2023, se acordó la entrega el área del cuarto técnico ubicado en el sótano, en los ejes 8 – 12, F – I, para almacenamiento de los elementos acopiados en la circulación del primer piso, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar la fecha de inicio de entrega de las áreas restantes del nivel sótano, con el fin proyectar un cronograma de instalación de los elementos correspondientes a ese nivel.

Así mismo, es importante que se informe por escrito lo socializado en el comité 225 del día de hoy, donde el personal de obra e interventoria manifestaron no entregar las áreas del primer piso en las que funcionan sus respectivas oficinas por el seguimiento que realizan al proyecto y que de acuerdo a lo allí manifestado serán áreas que entregaran hasta el 17 de junio de 2023.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

ONAC ACREDITADO
CEA 3.6-07
15-ECI-003

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2023

Señor brigadier general
TITO YESID CASTELLANOS TUAY
Jefe Nacional del Servicio de Policía
Carrera 59 26-21 / CAN
Bogotá, D.C

Asunto: solicitud reprogramación tableros de control

De acuerdo a la ejecución del contrato PN-MEBOG-10-2-10045-22, cuyo objeto está dirigido a la adquisición del mobiliario y dotación para el nuevo comando de la Metropolitana de Bogotá, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi general estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda se autorice la reprogramación de los tableros de control para el seguimiento de la ejecución de la reserva presupuestal, el cual tiene pendiente por obligar un valor de $7.872.181.174.39 millones, conforme a la finalización de instalación de los elementos contratados en los diferentes niveles del proyecto de los pisos 2 al 6 y el retraso en la instalación del mobiliario en el nivel del sótano por la intervención a cargo del constructor sobre la finalización de acabados e instalación de la barrera de vapor que permita subsanar la humedad que presenta la placa de contrapiso en este nivel, situación esta, que ha impedido que el contratista del mobiliario pueda cumplir con el objeto contractual de este negocio jurídico.

En este sentido, la ejecución de esta actividad constituida en reserva presupuestal, se reprogramará para el 30/06/2023, con el fin de garantizar la subsanación de las novedades presentadas en la infraestructura, que permita instalar la dotación pendiente, de acuerdo al siguiente plazo de ejecución:

- El contrato de obra - prorrogado hasta el 17/06/2023
- El contrato de dotación - hasta el 31/05/2023

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
Grado: Coronel
Cargo: Subcomandante Policia Metropolitana
Cédula: 80512723
Título: Especialista En Servicio De Policía
Dependencia: Subcomando Mebog
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: herbert.benavidez@correo.policia.gov.co
12/05/2023 9:36:15 a. m.

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana
INFORMACION PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGISTICO

No. GS-2023- 237762 **/ AREAD-GRULO- 29.25**

Bogotá D.C., 12-05-23

Señor General (R.A.)
ÓSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Avenida Calle 26 No. 57-83 piso 13
Bogotá.

Asunto: informe de novedades frente a los compromisos adquiridos nuevo comando


De manera atenta solicito a ese despacho, la viabilidad de verificar los compromisos adquiridos en la reunión estratégica llevada a cabo el pasado 13 de abril de los corrientes, en él se establecieron compromisos a cumplir por las partes y que al momento no se han llevado a cabo.

Por lo anterior, es imperioso adoptar las acciones necesarias que permitan la adecuada ejecución de los contratos de obra e interventoría, así como la ejecución del contrato de mobiliario, a este último, se le debía permitir el ingreso en las áreas a dotar conforme a los compromisos aceptados y hasta el momento no ha sido posible el ingreso a los pisos seis (6), tres (3), las áreas del primer (1) piso (cuarto técnico, sala de escoltas, bodega general, depósito de armamento y munición, bodega de armerillo, atención al ciudadano, radicación, secretaria CRAET, responsable de planeación) las cuales aún están en custodia del contratista de obra e interventoría, adicionalmente mil cuatrocientos (1.400 metros cuadrados) aproximadamente del nivel del sótano, tampoco han sido entregados para la dotación de mobiliario.

La supervisión del contrato de mobiliario tiene para entregar al componente de obra (constructor e interventoría) y a la SDSCJ las áreas en custodia de uso a saber: sótano (8) espacios, pisos 2 y 4, para que puedan continuar con las actividades de remates de obra y acabados de obra blanca. Es necesario tener presente, que el contrato de mobiliario se prorrogó por dos meses hasta el próximo 31 de mayo de 2023 y de este tiempo ya se han perdido 39 días en trámites de actas para el reingreso a los espacios faltantes por dotar. La prohibición de ingreso a estas áreas y pisos genera un retraso significativo en el desarrollo del contrato de mobiliario, lo que nos podría ocasionar sanciones contractuales de acuerdo a los tiempos estipulados en este negocio jurídico.

Agradezco su gestión para que los compromisos se socialicen en las diferentes escalas de los intervinientes de este importante proyecto y se cumpla en sitio, lo que redundará en la correcta y oportuna entrega del nuevo comando.

Atentamente,

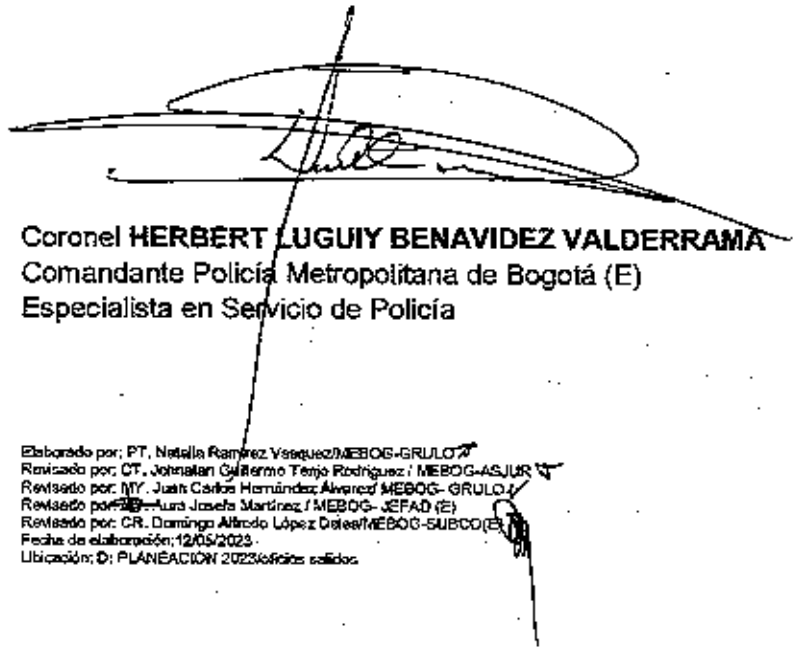

Coronel **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá (E)
Especialista en Servicio de Policía

Elaborado por: PT. Natalia Ramírez Vasquez/MEBOG-GRULO
Revisado por: CT. Johnatan Guillermo Tenjo Rodriguez / MEBOG-ASJUR
Revisado por: MY. Juan Carlos Hernández Alvarez/ MEBOG- GRULO
Revisado por: Laura Josefa Martínez / MEBOG- JEFAD (E)
Revisado por: CR. Domingo Alfredo López Daleo/MEBOG-SUBCO(E)
Fecha de elaboración:12/05/2023
Ubicación: D: PLANEACION 2023/oficios salidos

Transversal 21 N.° 3B-70
Teléfono: 2016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

Radicado N°. 20235410269651
15 - 05 - 2023 05:56:18 pm Folios: N/A (WEB) Anexos: 1
Destino: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Remitente: POLICIA NACIONAL
Consulte el estado de su trámite en nuestra página web https://scj.gov.co
Código de verificación: 2e02a

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Ciudad

Asunto : INFORME DE NOVEDADES FRENTE A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS NUEVO COMANDO

Informe de novedades frente a los compromisos adquiridos en el nuevo comando.

Atentamente,

POLICIA NACIONAL
NIT 9000457285
TRANSVERSAL 21 # 3 B - 70 BOGOTA, D.C.
COLOMBIA
Tel. 0312018910
mebog.sitog@policia.gov.co
Archivos Anexos: 1
novedades nuevo comando.pdf

MEBOG ARLOG

De: UT MEPOL <utmepol2022@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2023 11:34 p. m.
Para: INGRID VANESSA VERGARA BONILLA; MEBOG ARLOG
Asunto: Solicitud de Prorroga Contrato de Mobiliario.
Datos adjuntos: SOLICITUD DE PRORROGA C-UTM2022-0018.pdf

Buenas noches se adjunta de manera formal, documento de solicitud de prórroga.

—
Cordialmente,

Departamento Jurídico
UNIÓN TEMPORAL METROPLITANA 2022
Dirección: transversal 60c número 93a 45
Tel: 8051056 - 3244585312

UNION TEMPORAL
METROPOLITANA 2022

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2023

C-UTM2022-0018

Coronel:
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Ciudad

Mayor:
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Supervisor Contrato de Compraventa No.10-2-10045-22
Policía Metropolitana de Bogotá
Ciudad

REF: Contrato de compraventa no. 10-2-10045-22 cuyo objeto es la "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA No. 4 AL CONTRATO No. 10-2-10045-22.

Respetados señores;

De manera formal nos permitimos manifestar los siguientes antecedentes los cuales nos conllevan a solicitar la prórroga No 4 del contrato en referencia

Antecedentes:

- El día catorce (14) de diciembre de 2022, se entrega por parte del constructor y la interventoría de manera formal el piso numero seis (06) del nuevo comando.
- Los días dieciséis (16) y diecisiete (17) de diciembre de 2022, se entrega por parte del constructor y la interventoría de manera formal el piso número cinco (05) del edificio del nuevo comando.
- El día 17 de diciembre de 2022 la policía metropolitana de Bogotá emite la Aceptación de la modificación de los aspectos técnicos para generar el otrosí No 2 al contrato.
- El día diecinueve (19) de diciembre de 2022, se realizó EL MODIFICATORIO No 1 al contrato en mención el cual presento los siguientes cambios:

CLÁUSULA PRIMERA – PLAZO DE EJECUCIÓN cláusula sexta: prorróguese el plazo de ejecución del contrato de compraventa No. 10-2-10045-22, por un periodo de dos (02) meses. Es decir hasta el 20 febrero de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGO: modifíquese en el inciso primero de la CLÁUSULA CUARTA del contrato de compraventa No. 10-2-10045-22, la cual quedara de la siguiente manera "...La Policía Metropolitana de Sogotá se obliga a pagar el valor del contrato, EN PAGOS PARCIALES, contra entrega e instalación de los elementos dotados dentro de las instalaciones del nuevo comando MEBOG, en pesos colombianos, en la ciudad de Bogotá, los cuales serán cancelados de conformidad a la aprobación del PAC correspondiente que efectué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes al cumplimiento de los siguientes requisitos..."

CLÁUSULA TERCERA- AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio y la publicación del mismo por el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II de Colombia Compra Eficiente, el CONTRATISTA se compromete a notificar a la aseguradora los términos de la presente modificación y deberá ampliar los mecanismos de cobertura a favor de la POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ con NIT. 800.140.603-3, con dirección Avenida Caracas No. 6-05, cada uno de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, el cual deberá ser presentada en la plataforma del SECOP II.

CLÁUSULA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento del presente modificatorio No. 1 al contrato No. 10-2-10045-22, se requiere de las firmas de las partes y la aprobación en EL Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II de Colombia Compra

MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 10-2-10045-22 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y LA UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022, IDENTIFICADA CON NIT. 901.629.691-9, CUYO OBJETO ES LA "COTACIÓN DEL NUEVO COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ".

Eficiente, y para su ejecución de la aprobación de la modificación de las correspondientes garantías y expedición del registro presupuestal.

CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA SEXTA - DOCUMENTOS: forman parte integral del presente Modificatorio No. 1, los siguientes documentos: oficios mencionados en la parte considerativa.

CLÁUSULA SÉPTIMA – PUBLICACIÓN: en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación vigente, la entidad procederá a la publicación del presente documento en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II de Colombia Compra Eficiente, www.colombiacompra.gov.co.

Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2022.

- El día diecinueve (19) de diciembre de 2022, se inaugura de manera protocolaria el edificio por la alcaldesa de Bogotá, y no se pudieron realizar actividades de mobiliario en el edificio.
- El día veinte (20) de diciembre de 2022, se ingresa a la obra con el fin de empezar a estructurar la forma correcta de subir el mobiliario al piso numero seis (06) que fue entregado el día catorce (14) de diciembre de 2022.
- El día veintiuno (21) de diciembre de 2022 se instala el malacate (mecanismo que permite subir los elementos de manera horizontal y vertical para trasladar los elementos a los pisos que corresponda); esto con el fin de dar cumplimiento a la cláusula número veintidós (22) del contrato que reza:

técnico y ambiental. **22).** El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución del contrato. El costo de los consumos correrá por cuenta del contratista. **23).** El contratista deberá diligenciar junto con contratista de obra: Consorcio

- El día veintidós (22) de diciembre de 2022, se verifica con la profesional de seguridad y salud en el trabajo que todos los colaboradores y operadores del malacate cumplan con lo que se requiere para la seguridad de todos, de acuerdo a lo establecido entre las partes. (cursos de alturas, capacitación de los operadores del malacate, elementos de seguridad tales como, líneas de vida, arnés, etc.)
- El día veintitrés (23) de diciembre de 2022, se empieza con la distribución desde el sótano, al piso 2 y la entrega de elementos del piso sexto (06).
- El día veintiséis (26) de diciembre de 2022, se entrega por parte del constructor y la interventoría de manera formal el piso número dos (02) del nuevo comando; y se distribuyen elementos a los pisos cinco y seis.
- El día veintisiete (27) de diciembre de 2022, la profesional de seguridad y salud en el trabajo, manifiesta mediante comunicado los inconvenientes técnicos que se presentan con el uso del malacate. (documento presentado al contratante)
- El día veintiocho (28) de diciembre de 2022, se entrega por parte del constructor y la interventoría de manera formal el piso número cuatro (04) del nuevo comando y se distribuyen del sótano al piso numero uno (01) los elementos que deben ser entregados e instalados en los pisos 4,5 y 6
- El día veintinueve (29) de diciembre de 2022, se envía comunicado con numero de radicado 115136, informando la situación presentada por la SST, donde suspende actividades hasta que se le de respuesta de manera formal a su requerimiento para mitigar el riesgo en obra de los trabajadores de la UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022.
- El día treinta (30) de diciembre de 2022, se entrega por parte del constructor y la interventoría de manera formal el piso número tres (03) del nuevo comando.
- El día diecinueve (19) de febrero se realiza el modificatorio No.2 al contrato en mención, incluyendo el cambio de las especificaciones técnicas y se amplia el plazo de ejecución de treinta y nueve (39) días más, es decir hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023.
- El día veintinueve (29) de marzo de 2023 se realizó la modificación No. 3 al contrato en mención, respecto al plazo de ejecución prorrogándose por sesenta y un (61) días desde el 01 de abril de 2023, sin superar el 31 de mayo de la presente vigencia.
- El día diecisiete (17) de abril de 2023, la UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022, comunica de manera oficial a la entidad la posibilidad de hacer una modificación al contrato, con el fin de adecuar distintas situaciones que se han presentado durante la ejecución del mismo.
- El día doce (12) de mayo de 2023, se realiza el Modificatorio No. 4 al contrato de Compraventa No. 10-210045-22.

CONCEPTO JURIDICO

CONCEPTO JURIDICO DEL CONTRATISTA

Dentro del marco del régimen de la contratación estatal en Colombia, encontramos que las entidades públicas cuando celebran contratos con los particulares buscan el cumplimiento de los fines esenciales del estado (art. 2 CN), la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, actividad que debe enmarcarse en el respeto de los principios emanados de la constitución.

Dentro del marco normativo también podemos referenciar lo que se encuentra en la constitución política de Colombia, principalmente en su artículo segundo, debido a que son los fines del Estado los que soportan constitucionalmente la actividad contractual del Estado, la cual se encuentra legalmente desarrollada a través del Estatuto de la contratación pública (Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Conpes 3714 de 2011, decreto-ley 019 de 2012 y el decreto 1510 de 2013).
En efectos dichas normas deben estar articuladas con los principios y valores emanados de la norma superior, en especial con las relaciones jurídicas que contrae la administración con particulares a efectos de garantizar los servicios públicos y de esta forma cumplir con los fines esenciales del Estado.
En las actuales condiciones reales de la ejecución contractual, el contratista UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022, con fundamento en el principio de autonomía de voluntad de las partes regulado por el artículo 13 de la Ley 80 de 1.993, Solicita la viabilidad de realizar la presente solicitud de prorroga con el cual se busca el cumplimiento de los fines misionales de la entidad y de los fines estatales que se nos ha encargado por virtud del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.
Aunado a lo anterior vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta Civil y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto de 13 de agosto de 2009: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."

la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 25 de abril de 2012, respecto de las posibles modificaciones que se le pueden hacer a un contrato estatal, tuvo ocasión de anotar.
La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y en cuanto al concepto que se emite, se resalta que, la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende en derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del

contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.
La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo pueden surgir exigencias sociales, tecnológicas culturales etc. Sobre como el Estado debe cumplir sus fines sobre y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio para que las que tampoco era posible en dicho momento proveer remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.

CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta que la clausula decima segunda cita:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: 1). Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

Se ha evidecnciado por parte de la UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022, en los diferentes comites que es invitado, con el CONTRATANTE – POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA; comites que se generan por parte del Constructor, la Interventoria y la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, han manifestado que no es posible entregar el SOTANO del Nuevo Comando de la Policia, en los tiempos que ellos mismos establecieron para que, nosotros como Contratistas de Mobiliario podamos realizar la respectiva distribucion a los espacios del Sotano y posterior la correcta instalacion de los elementos a dotar y eso conlleva un tiempo prudencial, puesto que; el mobiliario a dotar en el sotano equivale al 48,67% del contrato, tanto en elementos como en dinero y esto hace que la gestion por nuestra no tenga los resultados esperados.

Es importante que El CONTRATANTE, tenga en cuenta que es importante para nosotros la pronta instalacion de los elementos, que ya se encuentran en el Nuevo Comando debido a que esa materia prima transformada, procesada y fabricada y para nosotros representa un valor monetario importante para poder tener equilibiro economico de nuestrto contrato.

Es importante tener en cuenta que el Constructor en los distintos comites que se realizan en la Secretaria ha manifestado que entregara el Sotano por etapas, por motivos de intimsicos a su labor como lo son (barrera de vapor y piso en linoleo); si bien es cierto que ellos tambien deben ejecutar su contrato satisfactoria y es lo que se establece en sus obligaciones, para nosotros como MOBILIARIO, se atrasa el proceso de instalacion de los elementos de ese espacio.

El dia martes diecesies (16) de mayo de 2023 en el comité realizado en la Secretaria, el Constructor manifesto las fechas de entrega por etapas del sotano, las cuales se establecieron en el mismo y afirmo las siguientes fechas:

Primera etapa: 19 de mayo de 2023
Segunda etapa: 24 de mayo de 2023
Tercera etapa: 31 de mayo de 2023

De acuerdo a estas en entregas por parte del consructor nuestro cronograma de distribucion e instalacion se ve afectado y es necesario para nosotros correr los tiempos de ejecucion de nuestro contrato.

Cabe resaltar que la POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, ha realizado todas las gestiones pertinentes para que sean los espacios entregados y las razones por las cuales no pueden entregar dichos espacios han sido temas en los comites de obra que se realizan los dias martes en la Secretaria.


Nosotros para dar al cumpliento a nuestro alcance contractual a fecha establecida contamos con el mobiliario del Sotano, en las instalaciones del Nuevo Comando, y se encuentra en Piso 1 listo para realizar su instalacion.










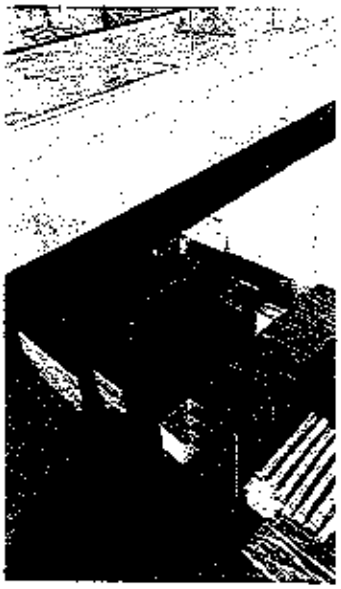

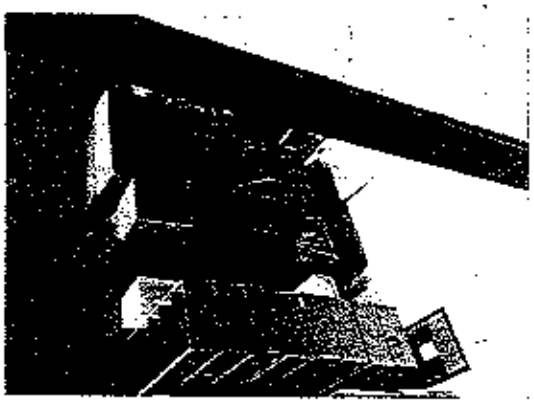

Por ende es importante para nosotros requerir a nuestro CONTRATANTE, para que tengamos una extension de tiempo en el contrato para poder realizar las activiades de ejecucion de mobiliario de manera correcta, con los espacios en optimas condiciones y que el Constructor pueda realizar las adecuaciones pertinentes y poder cumplir tanto LA POLICIA METRPOLITANA DE BOGOTA y LA UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022, con lo pactado en nuestro contrato para llevarlo a feliz termino.

ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que la presente solicitud de modificación no extingue ni deja de producir sus efectos esenciales entre las partes, el alcance de la misma es cumplir con el desarrollo del objeto contratado por el CONTRATISTA el cual se obliga a entregar los bienes según las especificaciones propuestas.

CONCEPTO Y PETICIÓN DEL CONTRATISTA

Que en virtud de dicho contrato quiero hacer las siguientes solicitudes de modificación las cuales justifico a continuación:

PRIMERO. En la Cláusula Sexta de dicho contrato se estableció que el plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. se suscribió acta de inicio con fecha siete (07) de octubre de 2022

SEGUNDO. Que, dentro de las obligaciones de la Policía Nacional, establecidas en la cláusula decima segunda del Contrato de Compraventa N° 10-2-10045-22, está la de Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

TERCERO. De acuerdo al concepto jurídico y técnico del contratista donde se demuestra la necesidad de prorrogar el contrato para la correcta ejecución del mismo; debido a un caso fortuito, ocasionado por un tercero que no le es posible entregar a Nuestro Contratante, el Sótano del Nuevo Comando de la Policía, requerimos un tiempo pertinente para entregar.

CUARTO: debido a los conceptos expuestos en el presente documento, nos permitimos solicitar cordialmente a la entidad modificar la cláusula primera PLAZO DE EJECUCION - cláusula sexta del contrato No CO1.PCCNTR.4123503, hasta el día quince (15) de julio de 2023, donde los demás efectos del mismo, continúan sin cambios en el contrato mencionado

Sin otro particular, lo suscribo;

Cordialmente,

ELIZABETH OSORIO
UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022
REPRESENTANTE LEGAL

BOGOTÁ

CONTRATO 1132 DE 2018 - CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

Entre los suscritos a saber:

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, representada en este acto por el doctor **ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 79.731.272 de Bogotá en su calidad Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, (en adelante "La Entidad" o la "Secretaría" o la "SDSCJ" indistintamente), quien actúa como parte contratante del Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital, según contrato de Obra pública No. 1132 de 2018.

El Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital, representado legalmente por **GERMÁN PRADILLA MÉNDEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 3.228.403 en su calidad de constructor responsable del contrato de Obra pública No. 1132 de 2018 con la SDSCJ, (en adelante "El Constructor" o el "Consorcio Seguridad Urbana" indistintamente).

El Consorcio Connecta, representado legalmente por **ALFREDO DIAZ GRANADOS GUIDA** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 79.150.681 en su calidad de Interventor del contrato de obra pública referenciado, según el contrato de interventoría No. 1129 de 2018 celebrado con la SDSCJ, (en adelante "El Interventor", "La Interventoría" o "Connecta" indistintamente), de una parte.

De otra, la Policía Nacional de Colombia, representada en este por el señor General **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 79.612.268 en su calidad de Director General de la Policía Nacional, representante legal de la Policía Nacional y parte del convenio interadministrativo 1120 de 2013 celebrado con la SDSCJ, (en adelante la "FONAL").

En adelante las partes, hemos acordado suscribir el presente acuerdo para efectos de llevar a cabo la instalación de dotación de mobiliario, en el nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá; ello, en razón al porcentaje de avance en que se encuentra la obra, el cual se referencia más adelante, así como en los espacios detallados en las actas individualizadas que hacen parte integral de esta, por lo tanto, se celebra el presente documento previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que la Policía Nacional de Colombia y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., hoy liquidado, suscribieron el convenio interadministrativo No. 1120 de 2013, cuyo objeto corresponde a *"EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, AUNARÁN ESFUERZOS PARA CONTINUAR HASTA SU CULMINACIÓN, EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO LA INTERVENTORÍA Y DOTACIÓN TÉCNICA, DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, DENTRO DEL CUAL FUNCIONARÁ LA SECCIONAL DE*

BOGOTÁ

CONTRATO 1132 DE 2018 – CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

INVESTIGACIÓN CRIMINAL", el cual fue subrogado a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Distrital 409 de 2016.

SEGUNDO: Que dicho negocio jurídico dispone el alcance de las obligaciones y aportes de cada Entidad, encontrándose que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Quinta - Obligaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, numeral 1, corresponde a la SDSCJ continuar con la ejecución y terminación de la construcción de la Nueva Sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, y por su parte, de acuerdo con lo señalado en la cláusula cuarta – Obligaciones de la Policía Nacional, numeral 1 y 2, se le atañe la responsabilidad a la Policía Nacional de dotar el mobiliario y señalética de la edificación, así como realizar los trabajos pendientes, adecuaciones y actividades complementarias para el debido funcionamiento de la edificación.

TERCERO: Que en ese sentido, la SDSCJ en cumplimiento de lo pactado en el referido convenio, suscribió el contrato de obra pública No. 1132 de 2018 con el Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital, cuyo objeto consiste en la construcción y reforzamiento de la Nueva Sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C; y el contrato de interventoría No. 1129 de 2018 con el Consorcio Connecta, encontrándose dichos contratos actualmente en ejecución.

CUARTO: Que para la fecha de firma del presente acuerdo y de conformidad con el reporte entregado por el Consorcio Connecta a corte 15 de enero de 2023, el Proyecto cuenta con un avance físico de obra del noventa y ocho puntos doce por ciento (98,12%) y un avance de ejecución presupuestal del noventa y tres punto setenta y por ciento (93,73%) que equivale a un acumulado económico de $166.931.328.899 pesos, con corte al 31 de diciembre de 2022.

QUINTO: Que el Consorcio de Seguridad Urbana y la SDSCJ suscribieron el día 17 del mes de diciembre de 2022, el Modificatorio No.17 al Contrato de Obra, dentro del cual se adicionó el Contrato de Obra en valor y en plazo, de manera que la nueva fecha de terminación contractualmente pactada para la terminación del Contrato de Obra es actualmente el día 17 del mes de abril del año 2023.

SEXTO: Que por su parte, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá, celebró el 23 de septiembre de 2022, contrato de compraventa Nro.10-2-10045-22 con la UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022, cuyo objeto corresponde a la "DOTACIÓN DEL NUEVO COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ", el cual se encuentra actualmente en ejecución.

SEPTIMO: Que es oportuno precisar con respecto al contrato 10-2-10045-22, para la dotación del nuevo comando de Policía y referenciado en el considerando séptimo, que éste no tiene relación alguna con el contrato de obra No. 1132 de 2018, así como tampoco del contrato de interventoría No. 1129 de 2018 celebrado por la SDSCJ, señalados en el considerando Tercero de presente acuerdo; sin embargo, dichos contratos hacen parte de las obligaciones contraídas entre la Policía Nacional y la Secretaría

BOGOTÁ

CONTRATO 1132 DE 2018 – CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el marco del convenio interadministrativo 1120 de 2013.

OCTAVO: Que actualmente no existe relación jurídica contractual o de cualquier otro tipo entre la Policía Nacional de Colombia, por un lado y el Constructor y la Interventoría del Proyecto por el otro, así como tampoco por parte SDSCJ, existe relación con la UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022.

NOVENO:: Que las actividades relacionadas con la dotación de mobiliario, tal y como se aclaró, no forman parte del Contrato de Obra vigente, pero tienen una incidencia directa en el cronograma de ejecución de los trabajos a cargo del Constructor, en la medida en que se requiere la instalación de dicho mobiliario para ubicar adecuadamente y de manera definitiva en cada uno de los muebles ubicados en la obra, los puntos de voz y datos y eléctricos, y realizar las pruebas, balanceos eléctricos y certificación final de los respectivos puntos como parte del proceso que debe surtirse para el acta de entrega final a que hace referencia el Contrato de Obra No. 1132 de 2018.

DECIMO: Que con lo anterior, es preciso indicar que el Contrato de Obra No. 1132 de 2018, establece en el Anexo No. 2, en su punto 6, lo siguiente: *"Siempre que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de la SDSCJ requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por la SDSCJ de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de la SDSCJ a ninguno de sus derechos."*.

DECIMO PRIMERO Que en sujeción a lo previsto en el anexo 2 y dada la necesidad de ingreso al inmueble por parte de la Policía Nacional para efectos de la instalación del mobiliario y señalética de la edificación, se adelantó por parte del Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital y el Consorcio Connecta, el proceso de inventario de los diferentes espacios que podían técnicamente ser puestos a disposición de la Policía Nacional, con el fin que la UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022, pueda realizar la instalación en mención y una vez desarrollada esta actividad se dispondrá al Constructor para realizar la instalación definitiva de los puntos de voz y datos y eléctricos sobre los muebles instalados, y realizar las pruebas, balanceos eléctricos y certificación final definitiva.

DECIMO SEGUNDO: Que a la fecha existe un inventario formal que hace parte integral de la presente Acta como Anexo 1. Dentro de dicho inventario, se registra el estado real de todos los elementos que conforman cada uno de los espacios descritos en el Anexo 1, donde consta: **i)** La descripción detallada del estado real verificado en campo en cada uno de tales espacios. **ii)** La comparación entre los planos de diseño vigentes y el estado real de lo evidenciado en los recorridos en dichos espacios. **iii)** Los detalles menores identificados en cada uno de los espacios, los cuales deberán ser atendidos por el Constructor una vez se informe por parte de la Secretaría el cese de las instalaciones por parte de la Policía Nacional

CONTRATO 1132 DE 2018 - CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

– Policía Metropolitana de Bogotá y su contratista de mobiliario para el equipamiento. **iv)** Registro fotográfico correspondiente.

DECIMO TERCERO: Que ~~Ahora bien~~, de acuerdo con las instrucciones, aprobación y visto bueno de la Secretaría en los diferentes Comités de Obra, los documentos anteriormente descritos relacionados con cada uno de los espacios de la obra, se disponen a la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá por medio de este acuerdo, para efectos que el contratista UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022, pueda ingresar a realizar los trabajos asociados a la instalación del mobiliario cuyo proceso de contratación, adquisición e instalación es de entera competencia y responsabilidad de la Policía Nacional a través de su respectivo Contratista, debiendo asegurar que al momento de finalizada la ejecución de los trabajos mencionados, los mismos se encuentren en idénticas condiciones en que fueron entregados mediante las actas de inventario individualizadas que hacen parte integral del presente documento.

DECIMO CUARTO: Que sin perjuicio de lo anterior, y debido a la necesidad en el inicio de los trabajos por parte de la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá, este proceso de autorización para ingreso de las instalaciones, inició de manera provisional desde el 14 de diciembre de 2022, a través de Actas individuales de inventario por pisos, entregando inicialmente el piso 6 del edificio de atrio y realizando la última entrega el 17 de diciembre de 2022, las cuales han sido suscritas por el Constructor, la Interventoría, la Policía Metropolitana de Bogotá y el contratista de mobiliario; las cuales hacen parte del presente acuerdo, así como las actas provisionales e individuales en el Anexo 2.

DECIMO QUINTO: Que una vez la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá, concluya el proceso de instalación del mobiliario pondrá a disposición del Constructor por conducto de la Secretaría y con presencia del Interventor, de tales espacios, para que se pueda verificar que las mismas se encuentran en las condiciones como fueron dispuestas, previo a la instalación del mobiliario; para que posteriormente el Constructor ingrese a los mismos, para realizar la instalación de las salidas de las redes eléctricas y de voz y datos en cada uno de los muebles instalados por la PONAL, adelante los balanceos, pruebas y certificaciones finales de los puntos, e igualmente culmine las observaciones finales sobre los espacios registradas en los formatos, de manera que con ello se pueda proceder con el proceso de verificación final y la correspondiente firma del Acta de Recibo Final y la liquidación del Proyecto, en los términos y condiciones del Contrato de Obra vigente con la SDSCJ, junto con sus modificatorios.

DECIMO SEXTO: Que hacen parte integral de la presente Acta, 136 folios correspondientes al anexo 1 y 2269 folios correspondientes al anexo 2 ,los cuales contienen el registro los espacios que se dispondrán y que se hace referencia en las Consideraciones anteriores.

BOGOTÁ

CONTRATO 1132 DE 2018 - CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

DECIMO SEPTIMO: Que en todos los espacios que se disponen para la instalación de la dotación de mobiliario, la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bogotá asume la obligación de custodiar, cuidar y salvaguardar los bienes que actualmente se encuentran instalados, dentro de los cuales se encuentran ejecutados entre otros puntos las redes y cableado de los sistemas eléctricos, voz y datos, luminarias, carpintería, enchapes, ventanería, pintura, cielorasos, sistemas contraincendios, entre otros, los cuales se encuentran descritos en las actas individualizadas que hacen parte integral de la presente acta, siendo de su responsabilidad reponer, reintegrar y/o reconstruir y/o realizar las actividades tendientes a la restitución del espacio en las mismas condiciones inicialmente entregadas.

DECIMO OCTAVO: Que ni el Consorcio de Seguridad Urbana ni la Secretaría o Interventoría, son responsables o asumen ningún tipo de riesgo o control respecto de la seguridad humana del personal de la PONAL y/o de su contratista de mobiliario, para el ingreso, trasiego, izada e instalación del mobiliario en los espacios dispuestos por parte de la PONAL.

La PONAL y su contratista deberán implementar todos los mecanismos necesarios para asegurar por su propia cuenta y riesgo, la adecuada administración, gestión y cumplimiento de toda la normatividad laboral, ambiental y técnica aplicable para las actividades que desarrollarán al interior del Proyecto.

DECIMO NOVENO: Que para efectos de lo aquí expresado, las partes convienen suscribir el presente acuerdo, con arreglo a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que entre otras previsiones señala: *"...las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales"*.

Que efectuadas las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dispondrá a favor de la Policía Nacional las instalaciones del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, para efectos que a través del contratista UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022, pueda ingresar a realizar los trabajos asociados a la instalación del mobiliario.

SEGUNDO: El supervisor por parte de la Policía Nacional del Convenio No. 1120 de 2013 celebrado entre la Policía Nacional y la SDSCJ, así como el respectivo supervisor del contrato de compraventa Nro.10-2-10045-22 suscrito entre la Policía Metropolitana de Bogotá y UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANA 2022, además de sus funciones establecidas cada uno de los contratos señalados, deberán realizar seguimiento, verificación y acompañamiento a los trabajos de instalación del mobiliario para efectos de asegurar que no se genere ningún tipo de improviso.

BOGOTÁ

CONTRATO 1132 DE 2018 - CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ACTA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO

TERCERO: Una vez la Policía Metropolitana de Bogotá, concluya la instalación real y definitiva del mobiliario en cada uno de los espacios, las personas que suscriben el presente acuerdo se reunirán nuevamente para suscribir el acta de verificación de espacios, que permita a la SDSCJ poner a disposición del contratista de obra, cada uno de los espacios para concluir las actividades pendientes descritas en el presente documento, las actas de inventario individualizadas y en el Contrato de Obra, No. 1132 de 2018.

CUARTO: La firma del presente acuerdo no exime ni libera al Constructor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en particular aquellas asociadas a la atención de las observaciones evidenciadas en cada espacio, culminar la ejecución de las actividades a su cargo con la calidad debida y cumpliendo en un todo con las especificaciones, tiempos, planos y demás aspectos regulados por el Contrato de Obra.

En constancia de lo anterior, se suscribe por las partes que intervienen en la presente Acta a los 27 días del mes de enero del 2023.

GERMAN PRADILLA MÉNDEZ
Representante Legal
Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital

General. HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director General
Policía Nacional de Colombia

ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

ALFREDO DIAZ GRANADOS GUIDA
Representante Legal
Consorcio Connecta

MEBOG ARLOG

De: UT MEPOL <utmepol2022@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 17 de mayo de 2023 9:28 a. m.
Para: INGRID VANESSA VERGARA BONILLA; MEBOG ARLOG
Asunto: Reiteración Solicitud Ficha Técnica Puerta Piso 5
Datos adjuntos: FICHA TECNICA PUERTA VIDRIO.pdf

Muy buenos días

De manera formal reiteramos la solicitud de la ficha técnica, de la puerta del piso Número 5, que debemos subsanar.

Adjuntamos documento y pantallazo de la primera solicitud.


FICHA TÉCNICA PUERTA VIDRIO

UT MEPOL

BUENAS TARDES DE MANERA ATENTA NOS PERMITIMOS ENVIAR ADJUNTO SOLICITUD DE PUERTA DE VIDRIO

Cordialmente,

Departamento Jurídico
UNION TEMPORAL METROPLITANA 2022
Dirección: transversal 60c numero 93a 45
Tel: 8051056 - 3244585312

UNION TEMPORAL
METROPOLITANA 2022

BOGOTA 08 DE MAYO DE 2023 **C-UTM2022-0017**

SEÑOR

Mayor:

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Supervisor Contrato de Compraventa N° 10-2-10045-22

Policía Metropolitana de Bogotá

Ciudad

REF: Contrato de compraventa no. 10-2-10045-22 cuyo objeto es la "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de

Bogotá"

ASUNTO: SOLICITUD FICHA TECNICA PUERTA EN VIDRIO

Por medio de la presente me permito solicitar la especificación técnica de la puerta en vidrio, la cual esta pendiente por subsanar en los arreglos y/o daños causados por el personal de la unión temporal metropolitana 2022 en el edificio del nuevo comando, lo anterior se solicita de acuerdo al incidente ocurrido en días pasados.

Cordialmente,

GLORIA ELIZABETH OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL METROPOLITANA 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

ONAC ACREDITADO
CEA 3.0-07
15-ECD-003

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 18 de mayo de 2023

Mayor
AURA JOSEFA MARTÍNEZ BERMÚDEZ
Jefe Área Administrativa (E)
Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida Caracas N 6 05
Bogotá

Asunto: Informe actividades contrato No. 10-2-10045-22 semana comprendida 10/05/2023 a 16/05/2023.

De acuerdo al contrato No. 10-2-10045-22, que tiene por objeto "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel las actividades que se han realizado en el proyecto nuevo comando MEBOG por parte del componente mobiliario del contrato en mención. En relación a las diferentes actividades que se han realizado con la empresa contratista, me permito informar el avance realizado en la semana comprendida del día 10/05/2023 al día 16/05/2023 en el proceso de fabricación e instalación de la dotación del mobiliario del proyecto del Nuevo Comando.

- Miércoles 10 de mayo de 2023, ingresan (18) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Ingreso de material para armado e instalación de mesas de juntas.
  2. Ingreso de material de puestos de trabajo.
  3. Distribución de elementos en pisos requeridos.
  4. Armado de mesas de juntas.
  5. Armado e instalación de puestos de trabajo Sala CIEPS.
  6. Ingreso de 16 camarotes.
  7. Instalación de pantallas de vidrio en puestos de trabajo en piso 2°

- Jueves 11 de mayo de 2023, ingresan (19) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Armado e instalación de camarotes en alojamientos piso 1°.
  2. Ingreso de material de estantería pesada.
  3. Ingreso de material de puestos de trabajo.
  4. Instalación de pantallas de vidrio en puestos de trabajo en piso 2°.
  5. Instalación de puestos de trabajo en piso 1°.
  6. Ingreso de 02 sillas de peluquería.

- Viernes 12 de mayo de 2023, ingresan (21) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Instalación de puestos de trabajo en piso 1°
  2. Armado de sala de juntas en piso 2°.
  3. Instalación de sala de juntas en piso 1°.

4. Ingreso de (02) sofá de 3 puestos, (09) sofás de 2 puestos.

- Sábado 13 de mayo de 2023, ingresan (13) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

    1. Distribución de elementos.
    2. Armado e instalación de recepción en piso 2°.
    3. Instalación de puestos de trabajo en piso 2°
    4. Instalación de puestos de trabajo en piso 1°

- Domingo 14 de mayo de 2023, ingresan (12) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

    1. No se realizan actividades por parte del contratista mobiliario, no asiste ningún funcionario del contratista mobiliario al proyecto.

- Lunes 15 de mayo de 2023, ingresan (18) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

    1. Distribución de elementos a espacios requeridos.
    2. Armado de mesas de juntas en piso 1°.
    3. Terminación de puestos de trabajo en piso 1° y 2° en temas de frentes de cajoneras, gavetas, puertas los cuales a la fecha no se han completado en su totalidad.
    4. Armado e instalación de recepción en piso 4.

- Martes 16 de mayo de 2023, ingresan (17) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

    1. Distribución de elementos.
    2. Armado e instalación de recepción en piso 4°.
    3. Terminación de puestos de trabajo en piso 1° y 2° en temas de frentes de cajoneras, gavetas, puertas los cuales a la fecha no se han completado en su totalidad.

En la etapa de instalación se están realizando actividades en conjunto con el persona del componente de obra (interventoría – constructor), para la instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo, y la ejecución de actividades del constructor como la adecuación de los puntos eléctricos, detalles de acabados y revisión de redes, en las que se han presentado diferentes inconvenientes, debido a que desde la firma del acta de uso se dispuso la entrega condicionada mediante actas de inventario de los pisos al contratista del mobiliario para la instalación de los elementos, en donde por parte del componente de obra no se ha respetado lo establecido en acuerdo entre las partes del proyecto (constructor, interventoría, SCJ, PONAL y mobiliario), en donde cualquier actividad a ejecutar en los espacios debía ser informada para realizar el respectivo acompañamiento por la parte correspondiente, con el fin de evitar algún daño en los acabados.

De acuerdo a la custodia para la instalación de los elementos a la fecha el piso 6 y 5, se encuentra a cargo del constructor y dotado con el mobiliario, el piso 4 se encuentra dotado y listo para entregar al componente de obra por parte del personal del mobiliario, el tercer piso se encuentra a cargo del constructor, el segundo piso se encuentra dotado y listo para la entrega al componente de obra, el piso 1 se encuentra finalizando la instalación de las áreas entregadas para la respectiva entrega y a la espera de la entrega de las áreas faltantes las cuales se encuentran en uso administrativo del consorcio constructor y el consorcio de la interventoría, en el nivel del sótano se entregaron 8 espacios los cuales están listos para la entrega al componente de obra y a la espera de la finalización de la intervención de la barrera de vapor y finalización de acabados de pisos en linóleo y concreto, pintura en muros y detalles de mamparas para la respectiva entrega al contratista del mobiliario.

De acuerdo a la entrega del nivel del sótano la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana - SDSCJ No. 20234300390802 en respuesta a los diferentes comunicados emitidos a la SDSCJ, en los que se solicita la entrega del nivel del sótano al contratista del mobiliario, se manifiesta en la descripción del cronograma de entrega de espacios numeral 3 " *Actualmente en ejecución de actividades relacionadas con*


barrera de vapor y acabado de pisos, pendiente de entrega a la PONAL contratista de Mobiliario para dotación mobiliaria" y en el numeral 6 *"Piso Sótano. parcial Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital con la tenencia del inventario de llaves del piso, en ejecución de las actividades de barrera de vapor e instalación de acabados de pisos", "Piso Sótano. parcial POLICIA NACIONAL, ocho (8) espacios con la tenencia del inventario de llaves".*

Así mismo en el numeral 9 se especifica que *" En lo relacionado con la entrega de los espacios administrativos del sótano (oficinas) por parte del CSUDC a la POLICIA NACIONAL para dotación mobiliaria y conforme a los avances de la actividad de barrera de vapor e instalación de piso en linóleo, en el comité de obra del pasado 09 de mayo de 2023 se establecieron las siguientes fechas de entrega: La Zona correspondiente a la Etapa 1, 12 de mayor de 2023, la zona correspondiente a la etapa 2, 19 de mayo de 2023, la zona correspondiente a la Etapa 3, 26 de mayo de 2023".*

Conforme a las fechas de entrega de los espacios manifestadas por la SDSCJ, es importante establecer que no se dio cumplimiento a la primera entrega al contratista de mobiliario establecida para el 12 de mayo 2023, debido a que el consorcio constructor no ha terminado la intervención de la barrera de vapor e instalación del piso en acabado de linóleo de la placa de contrapiso y remates de acabados de muros del nivel del sótano, generando más retrasos en el cronograma de instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo de este nivel.

Acorde a lo anterior y en relación a la asistencia semanal a los comités de obra en seguimiento al proyecto del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá en las instalaciones de la SDSCJ, en lo informado en el comité del 16 de mayo de 2023, por parte del consorcio constructor se manifestó que no se ha culminado la instalación de la barrera de vapor y piso en linóleo, al igual que los remates de acabados de muros, por lo que proyectaron nuevas fechas de entrega de las áreas así, intervención de la etapa 1 – 17 de mayo, etapa 2 – 24 de mayo y etapa 3 – 31 de mayo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

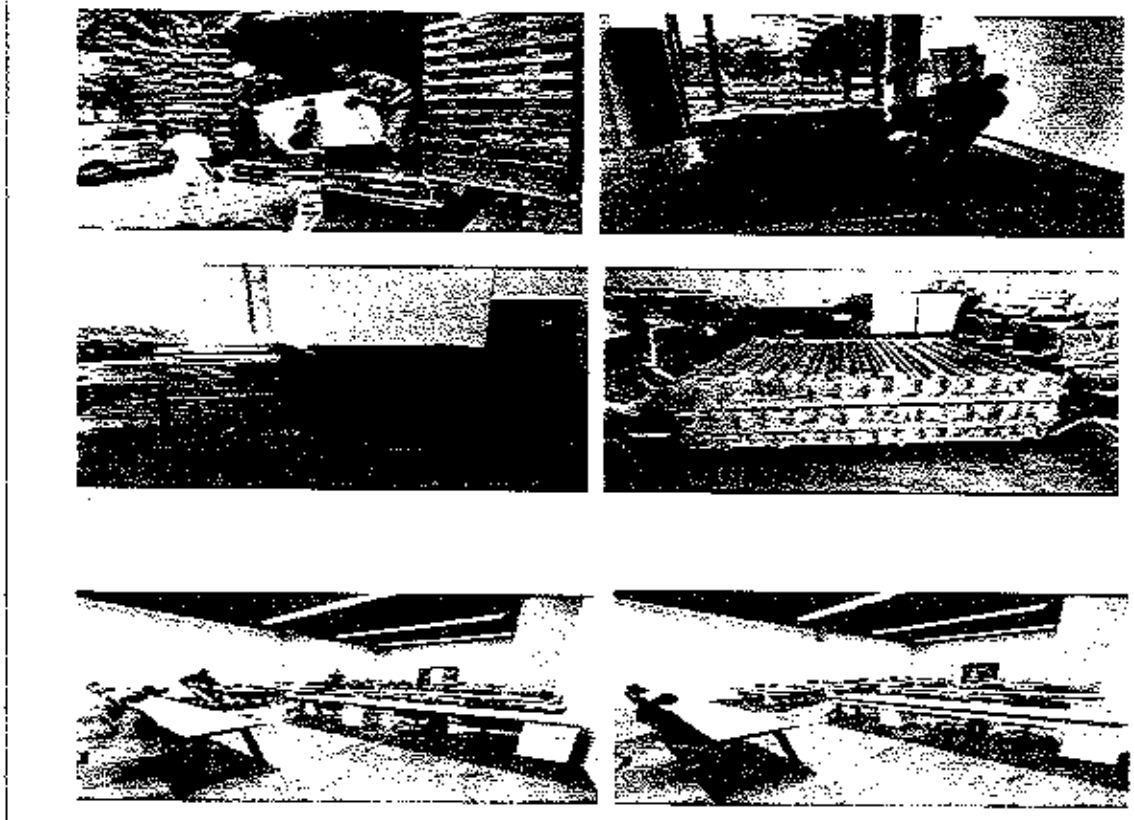



Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogotá
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
18/05/2023 5:25:43 p. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

ONAC ACREDITADO
CEA 3.0-07
10-ECD-365

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

Mayor
Aura Josefa Martinez Bermudez
Jefe Área Administrativa (E)
Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida Caracas N 6 05
Bogotá

Asunto: Informe actividades contrato No. 10-2-10045-22 semana comprendida 17/05/2023 a 23/05/2023.

De acuerdo al contrato No. 10-2-10045-22, que tiene por objeto "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi mayor las actividades que se han realizado en el proyecto nuevo comando MEBOG por parte del componente mobiliario del contrato en mención. En relación a las diferentes actividades que se han realizado con la empresa contratista, me permito informar el avance realizado en la semana comprendida del día 17/05/2023 al día 23/05/2023 en el proceso de fabricación e instalación de la dotación del mobiliario del proyecto del Nuevo Comando.

- Miércoles 17 de mayo de 2023, ingresan (14) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Ingreso de material para armado e instalación de mesas de juntas.
  2. Ingreso de material de puestos de trabajo.
  3. Distribución de elementos en pisos requeridos.
  4. Ingreso de (02) recepciones
  5. Armado de recepciones.
  6. Ingreso de (05) armerillos.

- Jueves 18 de mayo de 2023, ingresan (15) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Armado e instalación de camarotes en alojamientos piso 1°.
  2. Ingreso de (06) armerillos, (60) porta munición.
  3. Ingreso de (08) credenzas.
  4. Ingreso de (07) camarotes.
  5. Instalación de puestos de trabajo en piso 1°.
  6. Distribución de elementos en pisos requeridos.
  7. Instalación de estantería pesada y liviana.

- Viernes 19 de mayo de 2023, ingresan (17) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Armado e instalación de camarotes en alojamientos piso 1°.
  2. Instalación de puestos de trabajo en piso 1°
  3. Distribución de elementos.

4. Ingreso de (05) sillas operativas tipo presidencial.
5. Ingreso de (04) recepciones.
6. Ingreso de (20) credenzas.
7. Ingreso de (02) cajoneras 2x1.
8. Instalación de estantería pesada y liviana.

- Sábado 20 de mayo de 2023, ingresan (12) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

1. Distribución de elementos.
2. Terminación de puestos de trabajo en piso 1° y 2° en temas de frentes de cajoneras, gavetas, puertas los cuales a la fecha no se han completado en su totalidad.
3. Ingreso de (04) armerillos, (40) porta munición.
4. Ingreso (04) credenzas, (38) superficies, (40) puertas, (60) frentes.
5. Adecuación de espacios recibidos en sótano para posteriormente realizar la instalación de puestos de trabajo.

- Domingo 21 de mayo de 2023, ingresan (0) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

1. **No se realizan actividades por parte del contratista mobiliario, no asiste ningún funcionario del contratista mobiliario al proyecto.**

- Lunes 22 de mayo de 2023, ingresan (08) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

1. Distribución de elementos a espacios requeridos.
2. Adecuación de espacios recibidos en sótano para posteriormente realizar la instalación de puestos de trabajo.

- Martes 23 de mayo de 2023, ingresan (15) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

1. Distribución de elementos a espacios en sótano.
2. Terminación de puestos de trabajo en piso 1° en temas de frentes de cajoneras, gavetas, puertas los cuales a la fecha no se han completado en su totalidad.
3. Ingreso de (02) mesas de juntas, (01) mesa lineal de 1.25 x 0.60, (02) mesas lineales de 4.64 x 0.60.

A la fecha se tiene un porcentaje de avance de avance del 55%, los pisos del 6 al 2 dotados completos, se está finalizando la instalación del piso 1 en las áreas que el componente de obra ha entregado mediante actas de entrega al contratista de mobiliario, debido a que las áreas correspondientes al armerillo, cuarto técnico y sala de escoltas de este nivel están ocupadas por las áreas administrativas del personal del constructor e interventoría.

Conforme al nivel del sótano, no se ha podido iniciar la instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo en el área entregada al contratista de mobiliario correspondiente a la primera etapa de instalación de la barrera de vapor y el cavado del piso en linóleo, debido a que por la temporada de lluvias que se ha presentado en la ciudad, se evidencio una filtración que impide la correcta instalación del mobiliario, por lo que se acordó en con el componente de obra que se iba acordonar la zona de afectación para realizar la intervención de mantenimiento y se pudieran instalar los puestos de trabajo.

Se continua con la verificación de los puntos eléctricos, esta semana se dará inicio a la revisión del primer piso con Policía, SCJ, constructor, interventoría y Mobiliario, con el fin de definir los puntos que se deben trasladar de acuerdo a las circulaciones de las diferentes áreas operativas, igualmente se van a verificar la ubicación de los

puestos de trabajo en las áreas ocupadas por el constructor e interventoria, con el fin de decidir si se puede acordonar la zona para instalación de los puestos por ser áreas de almacenamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sobre el avance del proyecto Nuevo Comando MEBOG.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
30/05/2023 10:45:13 a. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2023-264158-MEBOG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

ONAC ACREDITADO
CEA-3.6-07
16-ECD-003

AREAD-GRULO - 3.1

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2023-30450
Fecha: 2023-05-30 10:46:22
Anexos:NO TIENE **Folios:** 1
Destino:430-DB
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: POLICIA METROPOLITANA DE

Señor Coronel (R)
LEONARDO MEJIA JIMENEZ
Director de Bienes
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Avenida calle 26 57 – 83 piso 13
Bogotá.

Asunto: solicitud entrega II etapa nivel del sótano

En relación al contrato 10-2-10045-22, que tiene por objeto la Dotación del Nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel, que de acuerdo a lo informado mediante correo electrónico por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, acerca de las fechas de entrega de las áreas del nivel del sótano así, "*...en comité de obra 226 realizado el pasado 16 de mayo del presente año se establecieron unas nuevas fechas las cuales son el 17, 24 y 31 de mayo...*", no se realizó la entrega de la zona de la etapa 2 del nivel del sótano, la cual estaba proyectada para el día 24 de mayo de 2023, generando retrasos considerables en el avance de instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo y demás elementos correspondientes de este nivel.

Respetuosamente, se solicita mi Coronel se emita un cronograma real de entregas de las áreas faltantes del nivel del sótano acorde a los tiempos de finalización de acabados por parte del constructor, que permita establecer una programación ajustada para la finalización de la instalación de los elementos contratados.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
30/05/2023 9:13:30 a. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

ONAC ACREDITADO
CEA-3.0-07
15-ECD-003

AREAD-GRULO - 2.1

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2023-30454
Fecha: 2023-05-30 10:49:34
Anexos:NO TIENE **Folios:** 1
Destino:430-DB
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: POLICIA METROPOLITANA DE

Señor Coronel (R)
Leonardo Mejía Martínez
Director de Bienes
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Avenida calle 26 57 – 83 piso 13
Bogotá.

Asunto: solicitud ingreso a pisos

De acuerdo a la etapa de instalación del contrato No. 10-2-10045-22, cuyo objeto es la "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, la viabilidad de ingreso al piso 5 el día 29 de mayo por parte del personal del contratista de mobiliario, con el fin de reponer la puerta de vidrio del acceso a los alojamientos.

Así mismo, se solicita respetuosamente mi Coronel la autorización de ingreso a los pisos 6 y 3 con el fin de instalar unos elementos faltantes.

Agradezco su gestión y acostumbrada colaboración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Titulo: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
30/05/2023 8:33:21 a. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2023-264017-MEBOG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2023-30455
Fecha: 2023-05-30 10:52:43
Anexos:NO TIENE **Folios:** 1
Destino:100-DESPACHO
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: POLICIA METROPOLITANA DE

Señor General (R)
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Avenida calle 26 57 – 83 piso 13
Bogotá.

Asunto: solicitud entrega nivel del sótano y áreas del primer piso

En relación al contrato 10-2-10045-22, que tiene por objeto la Dotación del Nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi General que no se realizó la entrega de las áreas del nivel del sótano en las fechas informadas mediante comunicado oficial del 15 de mayo de 2023 por la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana - SDSCJ de radicado No. 20234300390802, en el que se manifiesta en el numeral 9 que "*En lo relacionado con la entrega de los espacios administrativos del sótano (oficinas) por parte del CSUDC a la POLICIA NACIONAL para dotación mobiliaria y conforme a los avances de la actividad de barrera de vapor e instalación de piso en linóleo, en el comité de obra del pasado 09 de mayo de 2023 se establecieron las siguientes fechas de entrega: La Zona correspondiente a la Etapa 1, 12 de mayo de 2023, la zona correspondiente a la etapa 2, 19 de mayo de 2023, la zona correspondiente a la Etapa 3, 26 de mayo de 2023*".

Conforme a lo anterior, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, informó mediante correo electrónico que, "*en comité de obra 226 realizado el pasado 16 de mayo del presente año se establecieron unas nuevas fechas las cuales son el 17, 24 y 31 de mayo, para esta primera entrega que se debió realizar el miércoles 17 de mayo, se realizó el día 19 de mayo*", se solicita respetuosamente se emita un cronograma real de entregas de acuerdo a la intervención por parte del constructor que se viene realizando en el nivel del sótano y primer piso, con el fin de estructurar un cronograma de instalación de los diferentes elementos ajustado al avance y/o entrega de las tres etapas de intervención de la instalación de la barrera de vapor y el acabado del piso en linóleo por parte del componente de obra del proyecto.

Es importante establecer, que en las áreas del nivel del sótano entregadas el 19 de mayo de 2023 correspondientes al área operativa de la Unidad Investigativa delitos contra el patrimonio (Eje 26 -29, L), se presentó una filtración con la temporada de lluvias, generando retrasos considerables en el inicio de instalación de los puestos de trabajo, debido a que instalar los elementos en estas condiciones puede ocasionar daños de los cuales no se tiene garantía por perjuicios de agentes climáticos.

En relación a la entrega del proyecto del nuevo comando a la Policía Nacional y acorde a la devolución de los pisos dotados al componente de obra mediante las actas en conformidad a lo establecido en el *"ACTA DE ACUERDO PARA INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO"*, se requiere se emita un cronograma de entrega de los pisos a la institución, para el respectivo traslado de las dependencias que harán parte de las nuevas instalaciones.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
30/05/2023 8:25:56 a. m.

Anexo: no

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
GRUPO LOGISTICO

CEA-3.0-07
IG-ECD-003

AREAD-GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2023

Señor coronel
DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Jefe Area Administrativa
Avenida Caracas 6-05 Pl 5
Bogotá D.C.

Asunto: Informe actividades contrato No. 10-2-10045-22 semana comprendida 03/05/2023 a 09/05/2023.

De acuerdo al contrato No. 10-2-10045-22, que tiene por objeto "Dotación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel las actividades que se han realizado en el proyecto nuevo comando MEBOG por parte del componente mobiliario del contrato en mención. En relación a las diferentes actividades que se han realizado con la empresa contratista, me permito informar el avance realizado en la semana comprendida del dia 03/05/2023 al día 09/05/2023 en el proceso de fabricación e instalación de la dotación del mobiliario del proyecto del Nuevo Comando.

- Miércoles 03 de mayo de 2023, ingresan (17) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Ingreso de material para armado e instalación de mesas de juntas.
  2. Distribución de elementos en pisos requeridos.
  3. Armado de mesas de juntas.

- Jueves 04 de mayo de 2023, ingresan (19) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Ingreso de 171 pantallas de vidrio divisorias de puestos de trabajo.
  2. Ingreso de material para armado e instalación de puestos de trabajo en sótano.
  3. Ingreso de sillas operativas de puestos de trabajo de sótano.
  4. Distribución de materiales a pisos requeridos.
  5. Cambio de superficies de puestos de trabajo en piso 5 por calidad.
  6. Armado de mesa de juntas sala de crisis

GS-2023-227130-MEBOG

- Viernes 05 de mayo de 2023, ingresan (21) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Cambio de superficies de puestos de trabajo en piso 5, así como la adecuación y limpieza de los espacios para ser devueltos a contratista constructor.
  2. Distribución de elementos a pisos requeridos.
  3. Ingreso de 155 sillas interlocutoras para los diferentes pisos.
  4. Ingreso de 28 cajoneras para puestos de trabajo en sótano.
  5. Armado de mesa de juntas sala de crisis.

- Sábado 06 de mayo de 2023, ingresan (13) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Cambio de superficies defectos de calidad en piso 5.
  2. Distribución de elementos a espacios requeridos.
  3. Ingreso de material para armado e instalación de archivos rodantes.
  4. Ingreso de superficies y cajoneras para puestos de trabajo de sótano.

- Domingo 07 de mayo de 2023, ingresan (12) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Distribución de elementos a espacios requeridos.
  2. Cambio de superficies defectuosas en piso 5.
  3. Organización y adecuación de auditorio para realizar entrega a contratista constructor.

- Lunes 08 de mayo de 2023, ingresan (05) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Distribución de elementos a espacios requeridos.
  2. Armado de mesas de juntas en piso 1°.
  3. Terminación de puestos de trabajo en piso 2° en temas de frentes de cajoneras, gavetas, puertas los cuales a la fecha no se han completado en su totalidad.
  4. Ingreso de (12) credenza de los puestos de trabajo tipo jefatura.
  5. Ingreso de material para armado e instalación de archivos rodantes
  6. Armado de muebles en piso 2°.

- Martes 09 de mayo de 2023, ingresan (17) funcionarios de componente mobiliario al proyecto, actividades realizadas:

  1. Distribución de elementos a espacios requeridos.
  2. Ingreso de (28) credenza de los puestos de trabajo tipo jefatura.

3. Terminación de puestos de trabajo en piso 2° en temas de frentes de cajoneras, gavetas, puertas los cuales a la fecha no se han completado en su totalidad.
4. Recorrido de verificación de elementos incluidos en la factura así como la rotulación de los mismos.

En el desarrollo de las actividades articuladas entre el componente de obra y el contratista de mobiliario, el día viernes 05 de mayo se realizó el recorrido de verificación de subsanación de las novedades evidenciadas en el piso 5 para la respectiva entrega por parte del contratista de mobiliario al componente de obra, en la que se evidencio mala disposición por parte del personal de obra e interventoría estableciendo que no se recibía el piso por manchas en los muros y fisuras a la altura del cielo raso que debían ser subsanadas por mobiliario, en lo que se manifestó que el recibo de los espacios debía ser consecuente a la entrega de los espacios al mobiliario, debido a que habían novedades evidenciadas en el recorrido de entrega las cuales no fueron estipuladas en las actas por el componente de obra, al igual que no se estaba respetando el acuerdo entre las partes en el que se estableció que el procedimiento de entrega de los pisos se iba a realizar con el recorrido, verificación y firma de las actas iniciales, con el fin de dar celeridad a los tramites respectivos.



En las actividades que se desarrollan en conjunto con la SDSCJ, el personal de obra (constructor – interventoría), se están realizando los recorridos de verificación de replanteo de los puntos eléctricos en el nivel del sótano, con el fin de verificar los puntos que presentan inconveniente para la correcta instalación de los puestos de trabajo y la conexión del cableado estructurado para el óptimo funcionamiento de las áreas operativas.



En los trámites de inicio de la instalación de los elementos del nivel del sótano, por parte de la SDSCJ, no se ha emitido respuesta a los comunicados oficiales No. No. GS-2023-119280-MEBOG, GS-2023-070379-MEBOG, GS-2023-118476-MEBOG, en los que se solicita la fecha de entrega del nivel del sótano al contratista de mobiliario, que permita iniciar en este nivel la instalación de las diferentes tipologías de los puestos de trabajo, las cuales se encuentra almacenadas en la circulación del primer piso del proyecto, lo que genera retrasos en la ejecución del presente contrato de acuerdo a la proyección estimada en la prorroga No. 3.

Conforme al comité de obra desarrollado el 9 de mayo en las instalaciones de la SDSCJ, se estableció la entrega del cuarto técnico ubicado en los ejes 8-12, F-I en el nivel del sótano, que permita almacenar los elementos correspondientes del nivel del sótano, la respectiva coordinación de entrega del piso 5, el auditorio y las 8 áreas dotadas del nivel del sótano al componente de obra (constructor e interventoría), con el fin de que se realicen las actividades pendientes de obra.

GS-2023-227130-MEBOG


REGISTRO FOTOGRAFICO

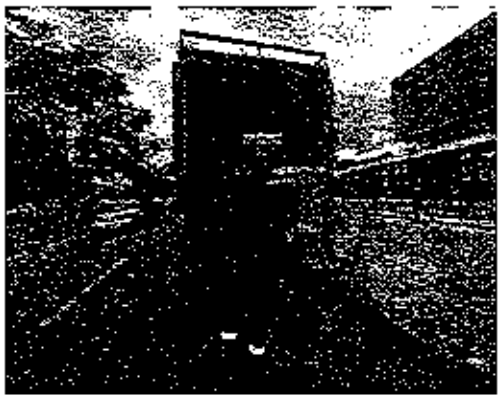

https://ge



Sobre el avance del proyecto Nuevo Comando MEBOG.

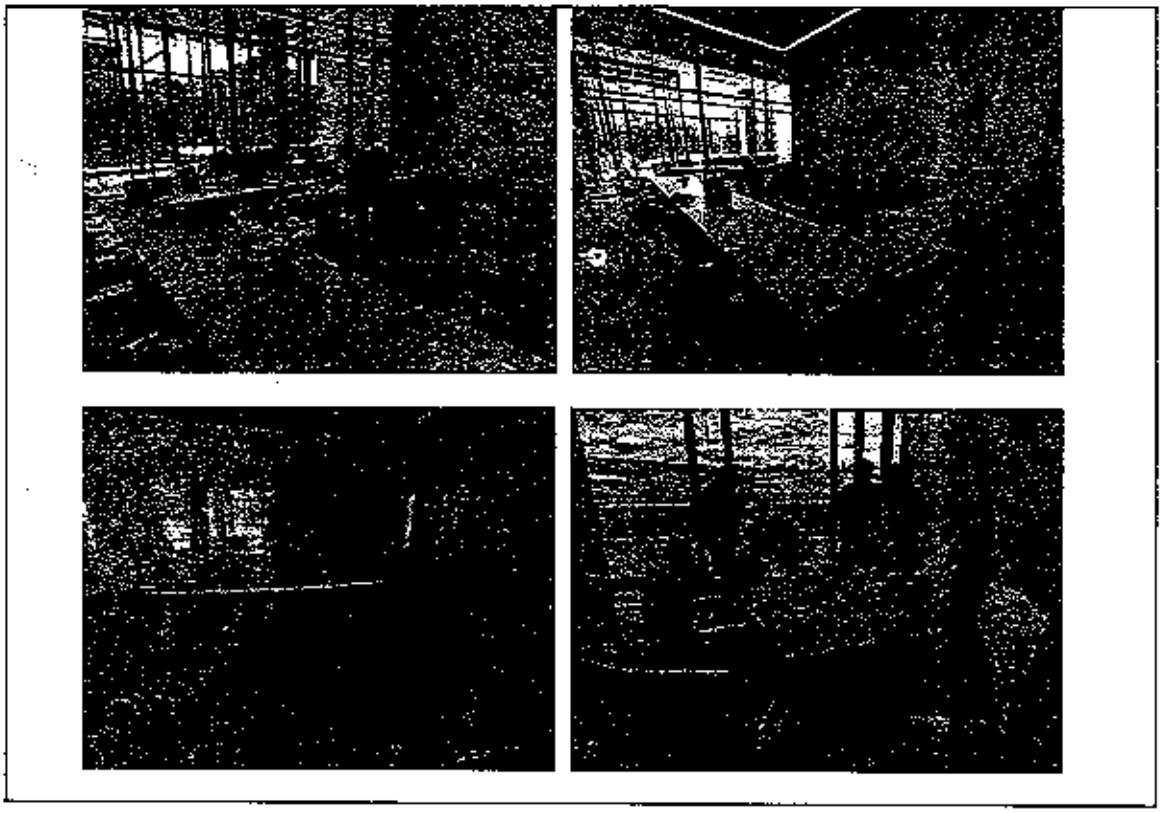Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Carlos Hernandez Alvarez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 80755435
Título: Administrador Policial T.P 1526
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: juan.hernandez5435@correo.policia.gov.co
10/05/2023 9:24:03 a. m.

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA
