- Transporte


- **OBRAS TOTAL VIA**
  - No se han realizado actividades.


18. IMPLEMENTACION PMT

Se realizó la implementación del PMT de las dos primeras cuadras con poli sombra verde, y se colocan las señales móviles de cierre de vía y obra a 100 metros.

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Señalización inicio de Obra</td><td>Señalización Vía cerrada.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Cerramiento en tela verde.</td></tr>
</table>

20. ACTIVIDADES TRAMO 1 ABSCISAS K0+432 A K0+280





Proteccion sumideros.





Limpieza y protección de sumideros existentes.





Excavacion tramo 1, profundidad 0,90 m.

21. ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS





Replanteo tramo 1

Nivelación de la caja de la vía, nivelación del mejoramiento y verificación de niveles de rasante de la vía a construir de acuerdo al diseño y sus cambios en obra.

22. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN OBRA

Se han presentado inconvenientes con la tubería de agua potable ya que los planos suministrados por Emserfusa no indica la ubicación real de estas redes. Con Alcanos empresa prestadora del servicio de gas natural se realiza una visita técnica, en la cual nos indican la ubicación aproximada de las redes, ya que al revisar los planos guía no se ajustan a la ubicación real de estas redes.

23. ACTIVIDADES SOCIALES

Se realizan las actas de vecindad del tramo 1 a intervenir durante este periodo y acercamiento a la comunidad con el fin de comunicarles acerca del proyecto a ejecutarse y sus posibles repercusiones.

24. COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMEINTO

Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero de 2023, se llevaron a cabo tres comités de seguimiento de manera presencial, con una programación que se muestra a continuación, contando con la participación de los profesionales del contratista, interventoría y supervisión. **Ver Anexo No.2**

Tabla 2 Comités de Obra

FECHA	HORA INICIO	ACTIVIDAD	MEDIO
07 de febrero de 2023	10:00 am	Comité de Obra 4	Presencial
14 de febrero de 2023	10:00 am	Comité de Obra 5	Presencial
21 de febrero de 2023	10:00 am	Comité de Obra 6	Presencial
28 de febrero de 2023	10:00 am	Comité de Obra 7	Presencial

26. RELACION DE CORRESPONDECIA

Para el desarrollo de las actividades programadas durante la revisión de los documentos del proyecto y el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2023, se tiene la siguiente relación de correspondencia enviada tanto por el contratista como por la interventoria.

Tabla 5 Relación de Correspondencia Enviada por CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

RELACION DE COMUNICACIONES EMITIDAS POR CAIPRO CONSTRUCTORES SAS CTO 2022-0794				
FECHA DE COMUNICACIÓN	CONSECUTIVO INTERNO	RADICADO A:	ASUNTO	Estado Actual
09-02-23	OFCAI-FU-036	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	ENTREGA FLUJO DE CAJA Y CRONOGRAMA CORREGIDOS	CERRADO
15-02-23	OFCAI-FU-037	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE INICIO DEL TRAMO 1.	CERRADO
15-02-23	OFCAI-FU-038	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	ENTREGA DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	CERRADO
21-02-23	OFCAI-FU-039	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	TRÁMITE TRASLADO DE REDES Y RETIRO POSTES MOVISTAR.	CERRADO
21-02-23	OFCAI-FU-040	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL	CERRADO
24-02-23	OFCAI-FU-042	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	CIERRE DE LA CARRERA 1T DESDE CALLE 178 HASTA AVENIDA LAS PALMAS POR EJECUCIÓN DE OBRA.	CERRADO
27-02-23	OFCAI-FU-043	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	QUEJA DE AFECTACIÓN POR POLVO GENERADO EN LA OBRA Q-14-02-2023-CAL	CERRADO
27-02-23	OFCAI-FU-044	MRS LATINOAMERICANA S.A.S.	QUEJA DE AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA Q-16-02-2023-CAL	CERRADO

27-02-23	MIRS-FUSA-026	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	ESTADO Y AVANCE DE OBRA A LA FECHA	
24-02-23	MIRS-FUSA-026	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.	APROBACIÓN INFORME SOCIAL 1 CONTRATISTA	

Fuente: Propia

CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S

Código	PME-FR-31
Versión	1
Fecha	22-NOV-22

CONTROL DE EQUIPO

FECHA	03 Febrero 2023	EQUIPO	Mini cargador	PROPIETARIO	
PROYECTO	Villa Fundación	C.C. EQUIPO		OPERADOR	Santiago Rodriguez

Marque con una X en la casilla correspondiente lo siguiente no novedad los siguientes parámetros,
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) NA (NO APLICA)

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	NA
ASPECTO A PREPONDERAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de las correas	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar filtro separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidráulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Bases, transmisión, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
	Verificar estado de baterías y cables	X		
	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la barra antivuelco			X
	Realizar engrase del equipo	X		
	Verificar estado de vidrios y espejos	X		
	Inspeccionar item de rodaje (Cuchillas, Zapatas, sapos, cadenas)			X
	Verificar estado general del balde o cucharon (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	X		
	Verificar estado del rodillo y acoples	X		
	Verificar estado tubo de escape	X		
	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X		
AUTOHIDROGRÚA	Canal			X
	Rampa sacos			X
	Hidrolavadora			X
	Bomba subi-baja canal			X
	Tanque de agua			X
	Pala de carga			X
	Tambor			X
	Tablero de mando			X
HSE	Cabina de mando	X		
	Botiquín primeros auxilios	X		
	Conos de seguridad	X		

CONSUMOS

COMBUSTIBLE	¿Cuál?	Cantidad	gl
ACEITE MOTOR	¿Cuál?	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	¿Cuál?	Cantidad	gl
OTRO	¿Cuál?	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

Revisar alarma de reversa.
Revisar espejo retrovisor.
Pintura en estado regular.
Falta tapa sapo izquierdo.

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HORÓMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	H. INICIAL	H. FINAL
			2017.0	2022.6

HALLAZGOS ENCONTRADOS

Revisar alarma de reversa.
Revisar espejo retrovisor.
Pintura en estado regular
Falta tapa sapo izquierdo.

ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA
arreglo de alarma	Ronald Rodriguez	03-02-23
Cambio retrovisor	Santiago R.	03-02-23
Cambio tapa de sapo	Santiago R.	03-02-23

SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE | FECHA

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CIVIL	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA	Santiago Rodriguez		
NOMBRE	Ronald Santiago Rodriguez		Ulia Velasquez
CEDULA	1005...		1035...

Powered by CamScanner

CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S

CONTROL DE EQUIPO

Código	PME-FR-01
Versión	1
Fecha	22-mar-22

FECHA	10 febrero 2023	EQUIPO	Vibrocompactador	PROPIETARIO	Juan Guillermo Valencia
PROYECTO	Vía Bucaramanga	C.C. EQUIPO		OPERADOR	Edgar Cadena Salcedo

Marque con una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	N/A
ASPECTO A INSPECCIONAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de las correas	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar filtro separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (tirajes, tornamesa, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
	Verificar estado de baterias y luces	X		
	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la barra antivuelco	X		
	Realizar engrase del equipo	X		
	Verificar estado de vidrios y espejos	X		
	Inspeccionar tren de rodaje (Carrilles, Sprockets, tensoras, cadenas)			
	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineros, soldaduras, etc)			X
	Verificar estado del radio y acoples	X		
	Verificar estado foto de ensaje	X		
	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)	X		
AUTOHORMIGUERA	Canal			
	Rompe coco			
	Hidrolavadora			
	Bombo sube-baja canal			
	Tanque de agua			
	Pala de carga			
	Tambor			
	Tablero de mezcla			
HSE	Extintor de incendio	X		
	Botiquin primeros auxilios	X		
	Cinturon de seguridad	X		

CONSUMOS			
COMBUSTIBLE	¿Cual?	Cantidad	gl
ACEITE MOTOR	¿Cual?	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	¿Cual?	Cantidad	gl
OTRO	¿Cual?	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

Se recibe el dia de hoy Vibrocompactador en buenas condiciones.

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HOROMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA

SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE | FECHA

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CIVIL	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA			
NOMBRE	Luis Valbuena	Andrés Felipe Páez	Lina Sofia Sanabria V.
CEDULA		1032961896	1032382395

Powered by CamScanner

CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S	Código	PME-FR-01
	Versión	1
CONTROL DE EQUIPO	Fecha	22-mar-22

FECHA	Febrero 6 2023.	EQUIPO	Retroexcavadora	PROPIETARIO	Hidrosierra Colombia S.A
PROYECTO	Vía Tuluá Sevilla	C.C. EQUIPO	79698	OPERADOR	Santiago Rodriguez

Marque con una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parámetros,
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) NA (NO APLICA)

ASPECTO A INSPECCIONAR	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	NA
	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de los cauchos	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar filtro separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidráulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado de los cilindros hidráulicos	X		
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (tornillos, tuercas, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
	Verificar estado de bombillos y luces	X		
	Verificar presión de aire y estado general de los llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la barra antivuelco			X
	Realizar engrase del equipo	X		
	Verificar estado de vidrios y espejos	X		
	Inspeccionar tren de rodaje (Cadenas, Sprockets, tensores, carrieles)			X
	Verificar estado general del balde o cucharón (Dientes, esquineros, soldaduras, etc)	X		
	Verificar estado del cucharón y accesorios	X		
	Verificar estado bloc de seguro	X		
	Verificar estado físico del equipo (Latonería y pintura)	X		
AUTOINSPECCIÓN	Canal			X
	Pompo escoc			X
	Hidrolavadora			X
	Bombo subo-bajo canal			X
	Tanque de agua			X
	Pala de carga			X
	Tanker			X
	Tablero de mando			X
HSE	Extintor de incendio	X		
	Botiquín primeros auxilios	X		
	Cinturón de seguridad	X		

CONSUMOS			
COMBUSTIBLE	¿Cuál?	Cantidad	gl
ACEITE MOTOR	¿Cuál?	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	¿Cuál?	Cantidad	gl
OTRO	¿Cuál?	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

La Retro se encuentra en estado regular.

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HOROMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	I. INICIAL	I. FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

falla alarma reversa
falta espejo retrovisor.
Falta tapa stop roto

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA
retirar y arreglar.	Santiago R.	06-02-2023
instalar.	Santiago R.	06-02-2023
instalar	Santiago R.	06-02-2023


SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE | FECHA

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CIVIL	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA	David Santiago Rodriguez		
NOMBRE	David Santiago Rodriguez		Yoha Velasquez
CEDULA	1006548115		1075237378

Powered by CamScanner

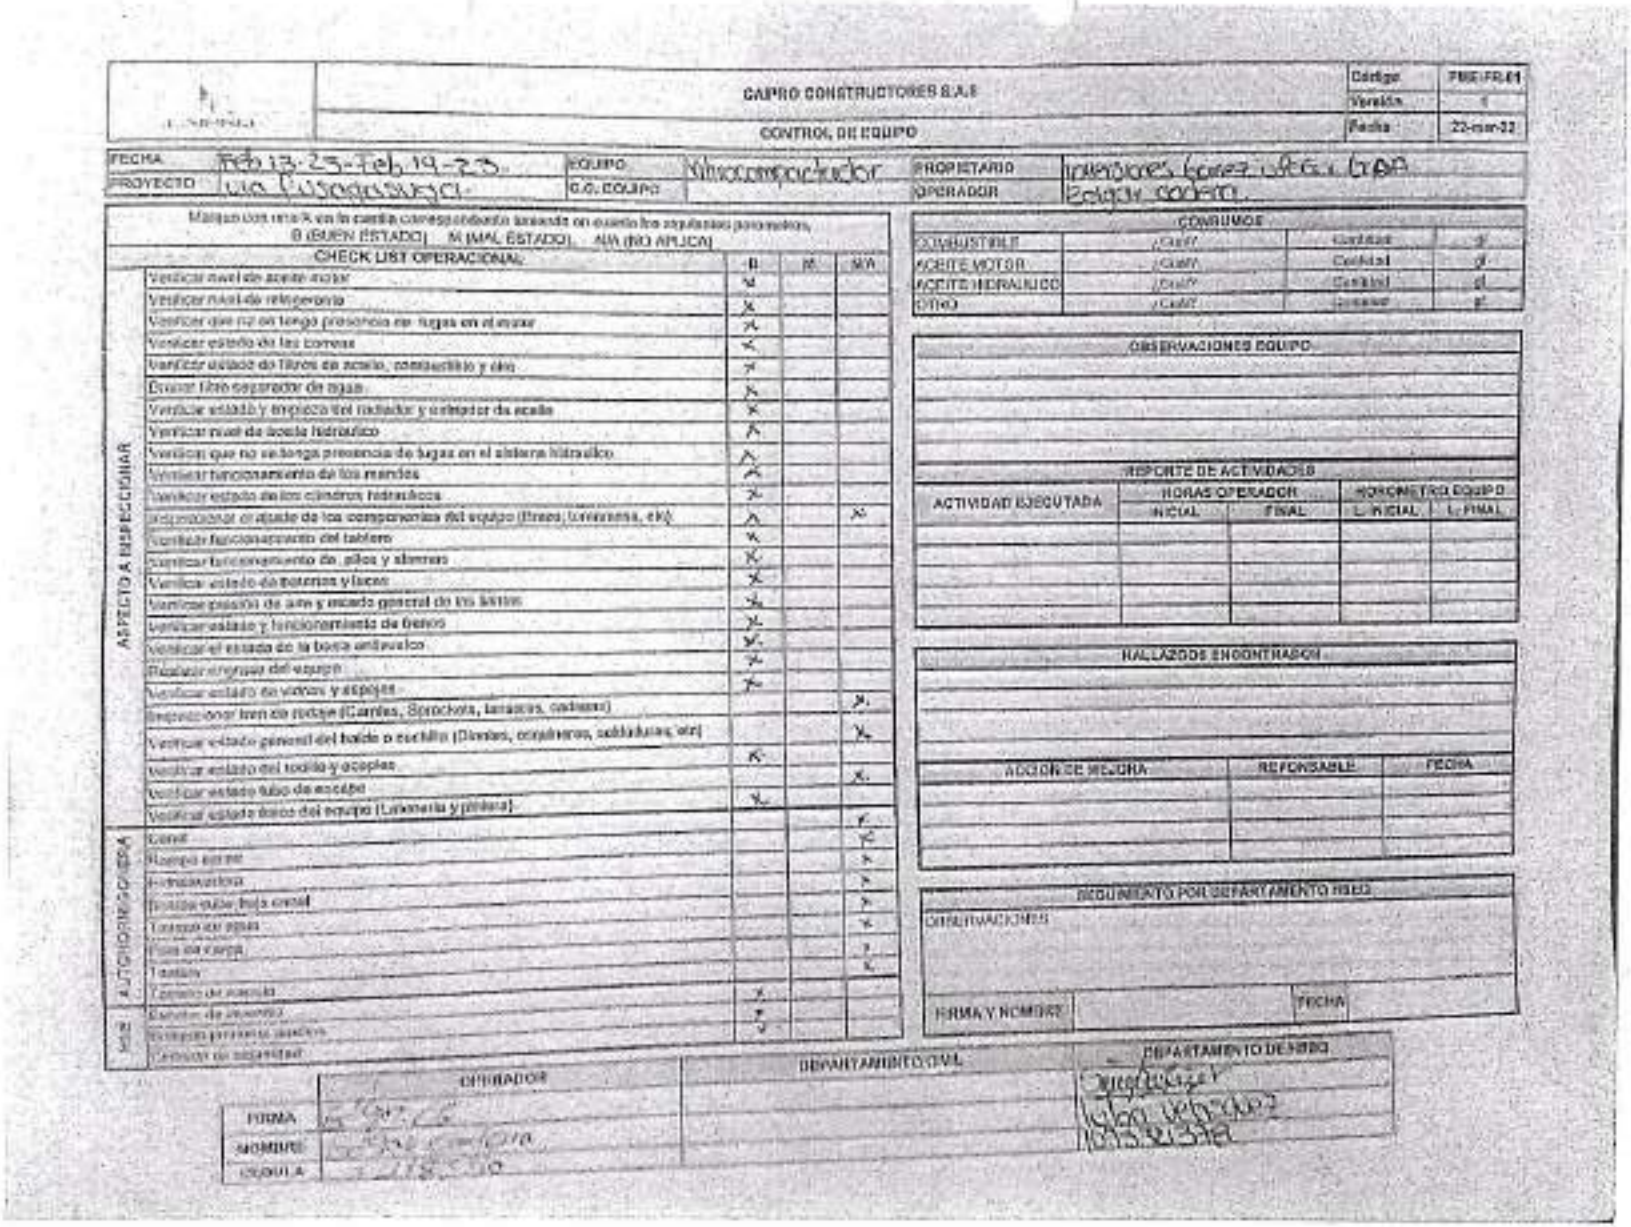

CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S

Código: PRE-FR-01
Versión: 1
Fecha: 22-mar-22

CONTROL DE EQUIPO

FECHA	13-23-Feb-19-23	EQUIPO	Vibrocompactador	PROPIETARIO	Inversiones Lopez Ltda. Capro
PROYECTO	Via Villavicencio	C.C. EQUIPO		OPERADOR	Edgar Cadena

Marque con una X en la casilla correspondiente basado en cuatro los siguientes parámetros:
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) N/A (NO APLICA)

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	N/A
ASPECTO A INSPECCIONAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de las correas	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar filtro separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
	Adicionalmente el ajuste de los componentes del equipo (Pines, tuercarena, etc)	X		X
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
	Verificar estado de bornes y luces	X		
	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la barra antivuelco	X		
	Realizar limpieza del equipo	X		
	Verificar estado de vidrios y espejos	X		
	Inspeccionar item de rodaje (Cuentas, Sprockets, tensores, cadenas)			X
	Verificar estado general del balde o cucharon (Dientes, cinceleros, soldaduras, etc)			X
	Verificar estado del rodillo y acoples	X		
	Verificar estado tubo de escape			X
	Verificar estado basico del equipo (Luberia y pintura)	X		
AUTORIDAD OBRA	Cabina			X
	Rampa carrier			X
	Instrumentos			X
	Botella tubo fuga central			X
	Tornillos ejes			X
	Luces de carga			X
	Bandas			X
	Tornillo de rueda	X		
HSE	Cambio de aceite	X		
	Extintor presente vigente			
	Cinturon de seguridad			

CONSUMOS			
COMBUSTIBLE	¿Cuál?	Cantidad	gl
ACEITE MOTOR	¿Cuál?	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	¿Cuál?	Cantidad	gl
OTRO	¿Cuál?	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HORÓMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	I. INICIAL	I. FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA

REQUERIDO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE | FECHA

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CIVIL	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA			
NOMBRE			
CEDULA			

Powered by CamScanner

	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S	Código	PME-FR-01
	CONTROL DE EQUIPO	Versión	1
		Fecha	22-nov-22

FECHA	Feb 26-23 Feb 26 2023	EQUIPO	Motoniveladora	PROPIETARIO	Inversiones Gabriel Vásquez Toro
PROYECTO	Vía Aeropuerto	C.C. EQUIPO		OPERADOR	Edgar Cadena

Marque con una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parámetros,
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO), NA (NO APLICA)

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	NA
ASPECTO A INSPECCIONAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de las correas	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar todo separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
	Inspeccionar el juego de los componentes del equipo (Brazo, cuchillas, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de pitos y plumas	X		
	Verificar estado de baterias y bornes	X		
	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la barra antivuelco	X		
	Realizar engrase del equipo	X		
	Verificar estado de vidrios y espejos			X
	Inspeccionar kit de rastreo (Carretes, Sprockets, tensores, cadenas)			X
	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, empalmes, soldaduras, etc)	X		
	Verificar estado del radio y parlantes			X
	Verificar estado tubo de escape	X		
	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)			
AUTOMOVILIDAD	Cornal			
	Bombas sacos			
	Hidrolavadora			
	Bomba sube-baja cornal			
	Tanque de agua			
	Pala de carga			
	Timbres			
	Tablero de reversa			
HSE	Extintor de incendio			
	Botiquin primeros auxilios			
	Cinturon de seguridad			

CONSUMOS			
COMBUSTIBLE	Cant.	Unidad	gl
ACEITE MOTOR	Cant.	Unidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	Cant.	Unidad	gl
OTRO	Cant.	Unidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HORÓMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA

SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE | FECHA

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CIVIL	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA			
NOMBRE	Edgar Cadena		Diana Vanessa Vasquez
CEDULA	1.418.230		1033823678

Powered by CamScanner

	CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S	Codigo	PRE-FR-01
		Version	1
	CONTROL DE EQUIPO	Fecha	22-ene-22

FECHA	Feb 20-23 / Feb 26-28	EQUIPO	Retroexcavadora	PROPIETARIO	Hernan Chiva
PROYECTO	Vía Tuquerres	C.C. EQUIPO		OPERADOR	Miguel Insuasty

Marque con una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parámetros.
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) NA (NO APLICA)

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	NA
ASPECTO A INSPECCIONAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de los correas	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar tubo separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los martillo	X		
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Bujes, tornillería, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del brazo	X		
	Verificar funcionamiento de pins y bujes	X		
	Verificar estado de cadenas y llantas	X		
	Verificar presion de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la barra antivuelco	X		
	Revisión original del equipo	X		
	Verificar estado de vidrios y espejos	X		
	Inspeccionar con de rodaje (Cuñas, Sprockets, bujones, cadenas)	X		
	Verificar estado general del cazo o cuchilla (Dientes, segmentos, cuchillas, etc)	X		
	Verificar estado del cabina y accesos	X		
	Verificar estado luces de seguridad	X		
	Verificar estado Extintor del equipo (Ubicación y cargue)	X		
ACTIVIDADES A REALIZAR	Limpia			X
	Cambio aceite			X
	Mantenimiento			X
	Cambio filtros aire			X
	Cambio de aceite			X
	Filtro de aceite			X
	Lubricar			X
	Cambio de motor			X
	Estado de maquina	X		
	Estado de cadenas	X		
	Estado general cabina	X		

CONSUMOS			
COMBUSTIBLE	Galon	Cantidad	gl
ACEITE MOTOR	Galon	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	Galon	Cantidad	gl
OTRO	Galon	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

REPORTE DE ACTIVIDADES				
ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HOROMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	L. INICIAL	L. FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA

SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ			
OBSERVACIONES			
FIRMA Y NOMBRE		FECHA	

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CHT	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA			
NOMBRE	Miguel Insuasty		Juan Sebastian Lopez
CEDULA	1085323...		Ing. Seguridad y Salud en el Trabajo

Powered by CamScanner

	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S	Código	PMC-FR-01
	CONTROL DE EQUIPO	Versión	1
		Fecha	22-mar-22

FECHA	Valera Tac 23 Feb 24-2023	EQUIPO	retroexcavadora	PROPIETARIO	Armando Cruz
PROYECTO	Via fusagasuga	C.C. EQUIPO		OPERADOR	Hipolito Niño

Marque con una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parametros:
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) NA (NO APLICA)

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	NA
ASPECTO A INSPECCIONAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el radiador	X		
	Verificar estado de las correas	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar filtro separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (tornillos, tornilleria, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de cornetas y alarmas	X		
	Verificar estado de baterias y bocas	X		
	Verificar presion de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la hoja antiruido	X		
	Realizar engrase del equipo	X		
	Verificar estado de espejos y espejos	X		
	Inspeccionar cinturon de seguridad (Correas, Seguridad, tensores, cadenas)	X		
	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esparcidor, soldaduras, etc)	X		
	Verificar estado del acelero y acoples	X		
	Verificar estado tubo de escape	X		
	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	X		
AUTOMOTRIZ	Cargol			X
	Rompe suelo			X
	Retroexcavadora			X
	Bomba suba-baja cargol			X
	Tanque de agua			X
	Pala de carga			X
	Tractor			X
	Tanque de mezcla			X
HSE	Extintor de incendio	X		
	Botiquin primeros auxilios	X		
	Cinturon de seguridad	X		

CONSUMOS			
COMBUSTIBLE	Cantidad	Galones	gl
ACEITE MOTOR	Cantidad	Galones	gl
ACEITE HIDRAULICO	Cantidad	Galones	gl
OTRO	Cantidad	Galones	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HOROMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	L. INICIAL	L. FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA


SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE | FECHA

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CIVIL	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA			
NOMBRE	Hipolito Niño		Julio Velasquez
CEDULA	426333		1033721370

Powered by CamScanner

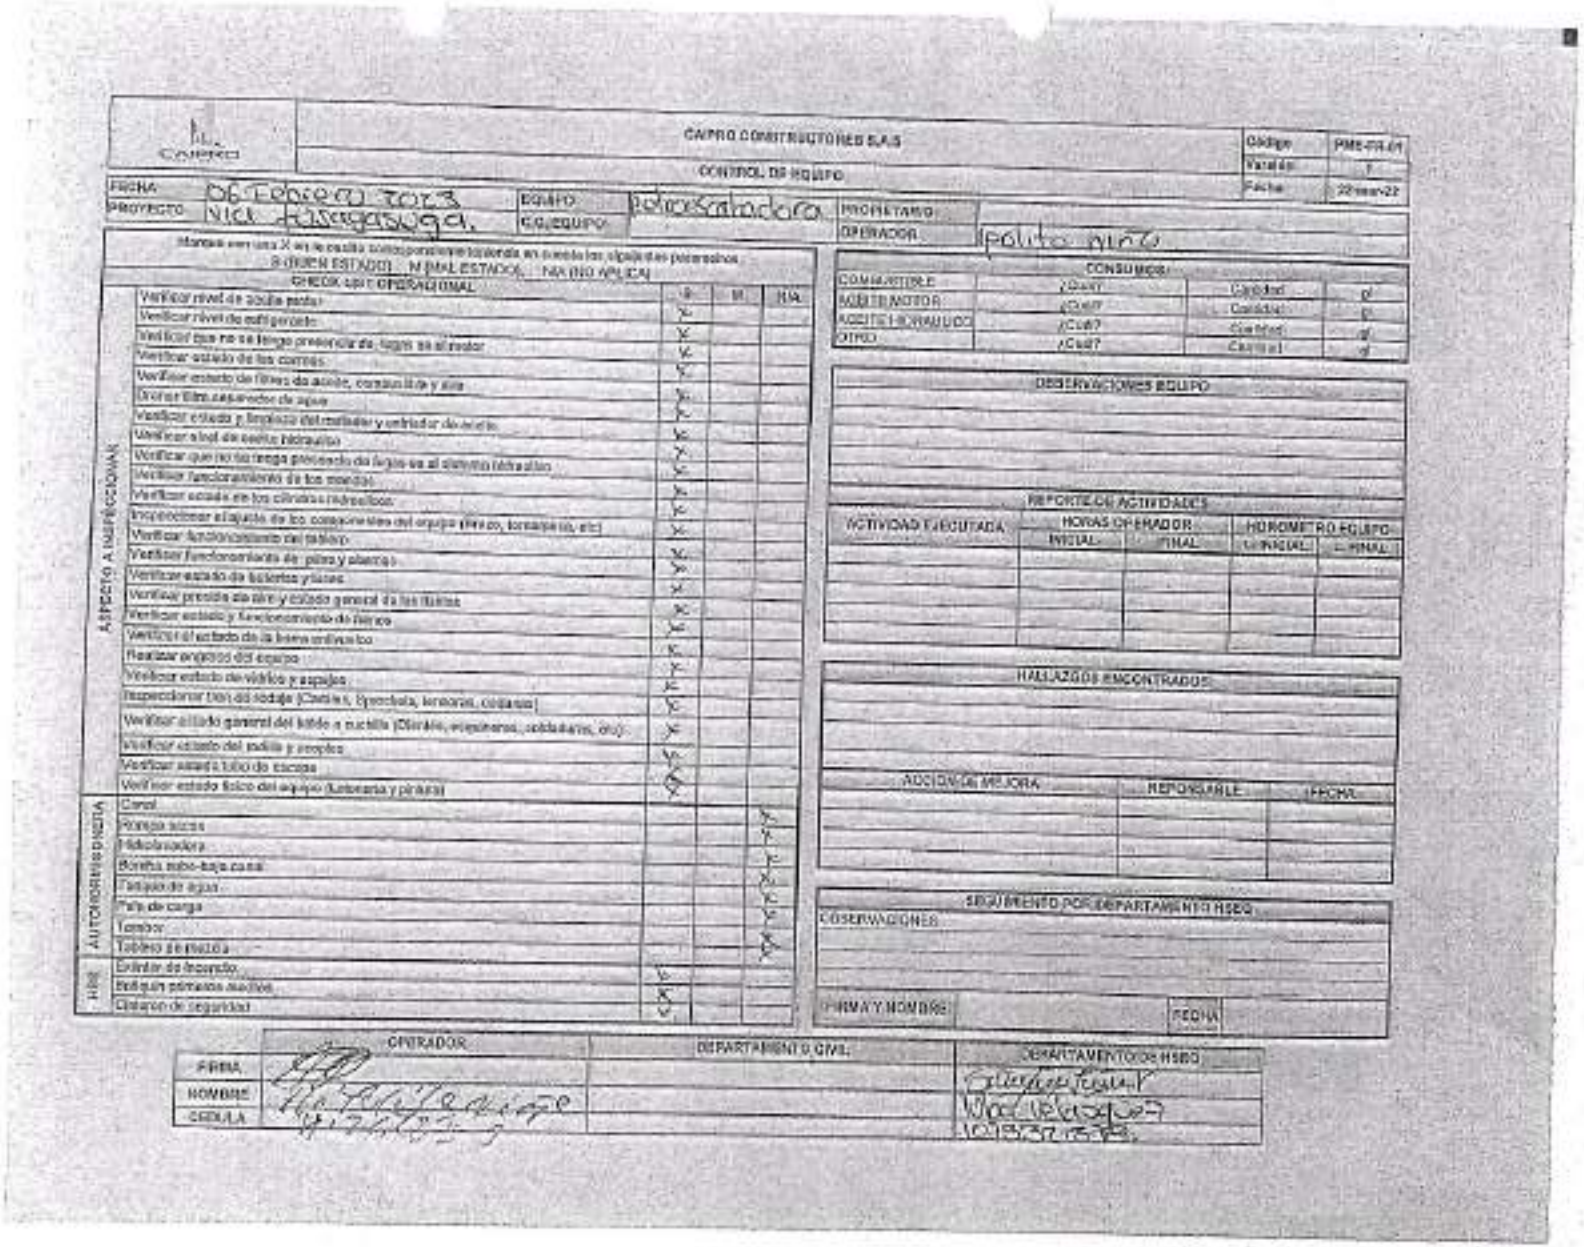

CAMPO CONSTRUCTORES S.A.S

CONTROL DE EQUIPO

Código	PME-FR-01		
Versión	1		
Fecha	22-mar-22		

FECHA: 06 Febrero 2023 | EQUIPO: Retroexcavadora | PROPIETARIO:

PROYECTO: Vía Hatogrande | COD.EQUIPO: | OPERADOR: Pedro Nieto

Marque con una X en la casilla correspondiente la opción en cuanto los siguientes parámetros:
B-BUEN ESTADO M-MAL ESTADO NA-NO APLICA

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	N/A
ASPECTO A INSPECCIONAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de las correas	X		
	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
	Drenar filtro separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado en los cilindros hidraulicos	X		
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (pernos, tornillos, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
	Verificar estado de baterias y bornes	X		
	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de la barra antivuelco	X		
	Realizar engrase del equipo	X		
	Verificar estado de vidrios y espejos	X		
	Inspeccionar bien del equipo (Cuchara, Uñas, Martillo, Cizalla)	X		
	Verificar estado general del brazo o pluma (Cilindro, empalmes, soldaduras, etc)	X		
	Verificar estado del pedal y empales	X		
	Verificar estado todo de escapa	X		
	Verificar estado físico del equipo (Luberania y pintura)	X		
AUTOINVERSIONISTA	Canal			X
	Rompe aceite			X
	Hidrolavadora			X
	Bomba sube-baja cama			X
	Tanque de agua			X
	Pala de carga			X
	Tambor			X
	Tablero de pedal			X
HSE	Extintor de incendio	X		
	Botiquin primeros auxilios	X		
	Cinturon de seguridad	X		

CONSUMOS

COMBUSTIBLE	¿Cual?	Cantidad	gl
ACEITE MOTOR	¿Cual?	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	¿Cual?	Cantidad	gl
OTRO	¿Cual?	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HORÓMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA

SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE: FECHA:

	OPERADOR	DEPARTAMENTO GMS	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA			
NOMBRE	Pedro Nieto		
CEDULA	1.121.[illegible]		

Powered by CamScanner

	CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S	Código	PMEFR-31
	CONTROL DE EQUIPO	Versión	1
		Fecha	22-mar-22

FECHA	Feb 27-28/Feb/28-2023	EQUIPO	Mercadador	PROPIETARIO	Jhon Contreras Colombia Sas
PROYECTO	Niquelera	G.G. EQUIPO	320	OPERADOR	Santiago Rodriguez

Marque con una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parametros,
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) NA (NO APLICA)

	CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	N/A
APECTO A INSPECCIONAR	Verificar nivel de aceite motor	X		
	Verificar nivel de refrigerante	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
	Verificar estado de las correas	X		
	Verificar estado de filtros de aire, combustible y aire	X		
	Drenar filtro separador de agua	X		
	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
	Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
	Verificar funcionamiento de los mandos	X		
	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (tornillos, tuercas, etc)	X		
	Verificar funcionamiento del tablero	X		
	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
	Verificar estado de baterias y luces	X		
	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X		
	Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
	Verificar el estado de cabrero extractico			X
	Revisar engrase del equipo	X		
	Verificar estado de cables y empates			X
	Inspeccionar tren de rodaje (Cuerdas, Sprockets, tensores, rodillos)	X		
	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, empalmes, soldaduras, etc)	X		
	Verificar estado del resorte y cuerdas	X		
	Verificar estado botón de escape	X		
	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	X		
AUTOGERENCIADA	Cabina			X
	Bateria sacos			X
	Extintor polvo			X
	Bomba sumergible canal			X
	Tanque de agua			X
	Pala descarga			X
	Tacometro			X
	Tacometro de rotación			X
HSE	Extintor en diferido	X		
	Botiquin primeros auxilios	X		
	Conos de seguridad	X		

CONSUMOS

COMBUSTIBLE	ACPM	Cantidad	30
ACEITE MOTOR	¿Cual?	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	¿Cual?	Cantidad	gl
OTRO	¿Cual?	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HOROMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	H. INICIAL	H. FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA


DESBLOQUEO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE | FECHA

	OPERADOR	DEPARTAMENTO CIVIL	DEPARTAMENTO DE HSEQ
FIRMA	Santiago Rodriguez		
NOMBRE	Santiago Rodriguez		
CEDULA	1003816152		

Powered by CamScanner

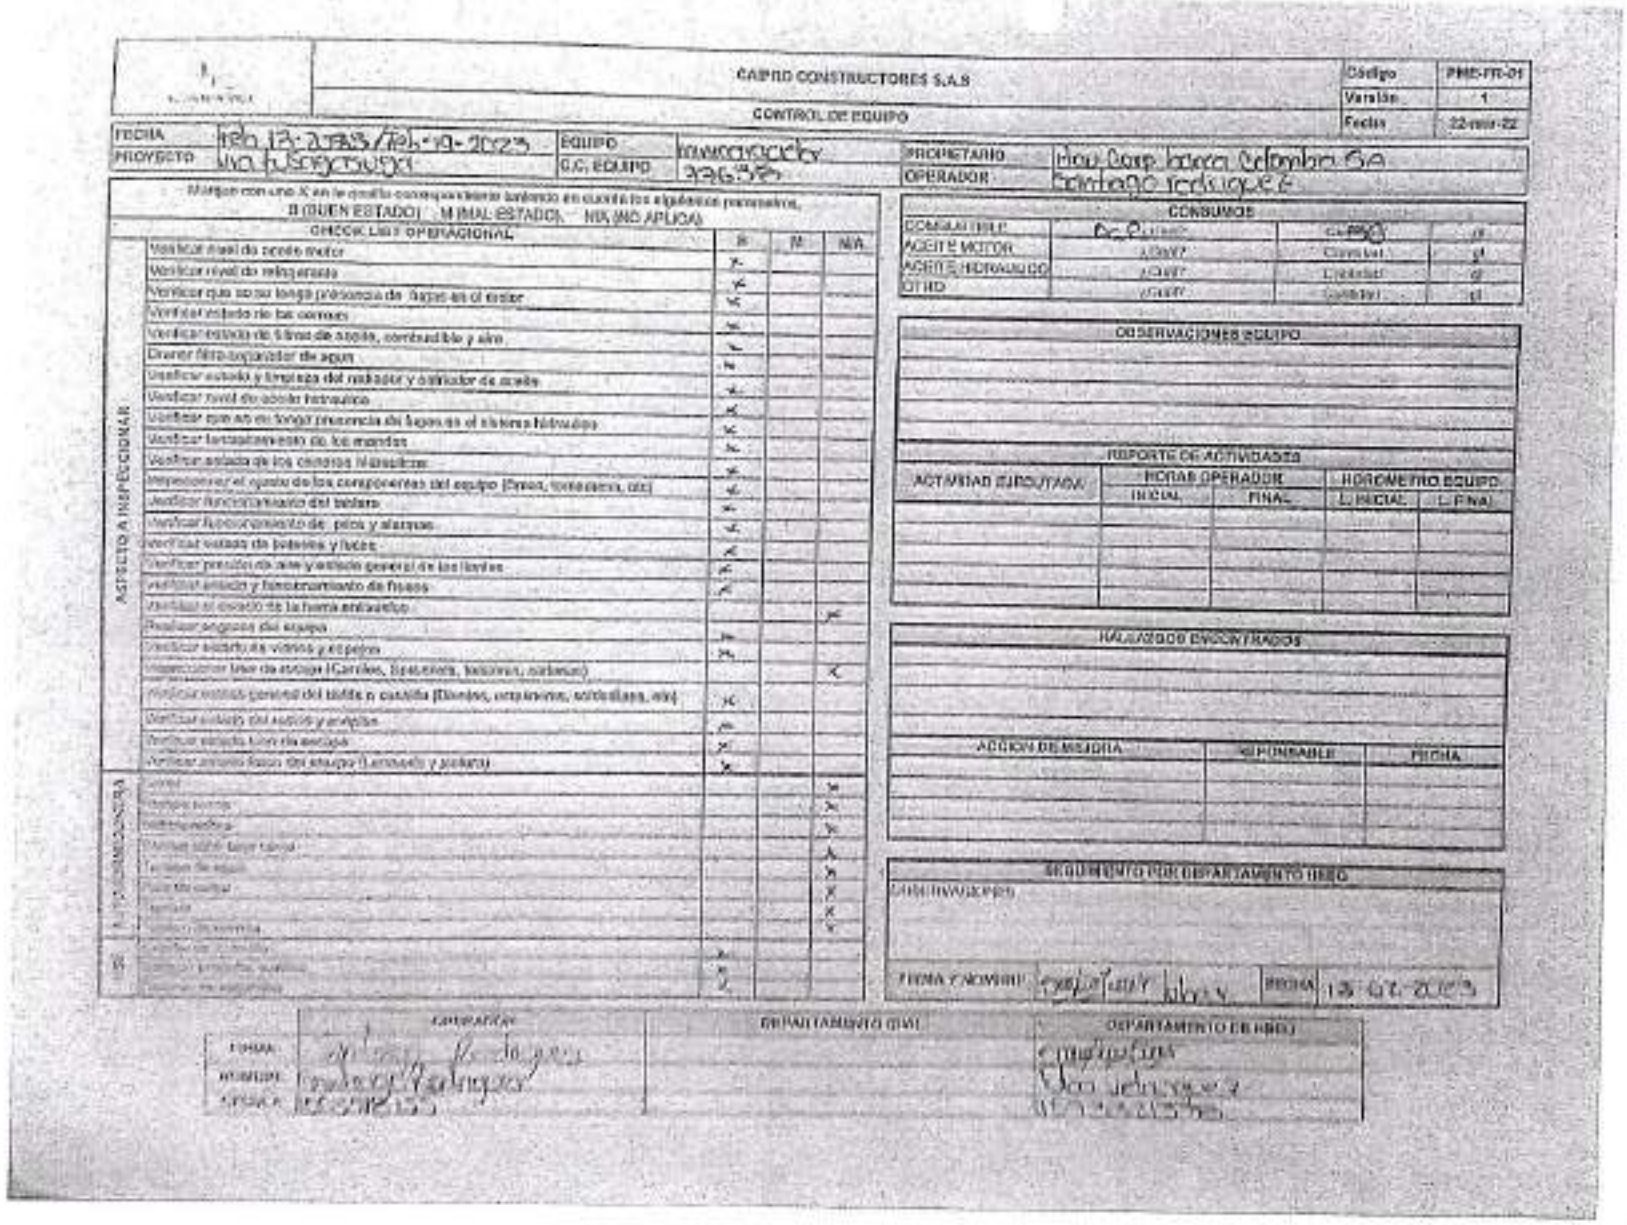

CAPRO CONSTRUCTORES S.A.S

CONTROL DE EQUIPO

Codigo	PMS-FR-01
Versión	1
Fecha	22-nov-22

FECHA: feb 13-2023 / 19-9-2023 | EQUIPO: [illegible] | PROPIETARIO: [illegible]

PROYECTO: [illegible] | C.C. EQUIPO: [illegible] | OPERADOR: [illegible]

Marque con una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parámetros.
B (BUEN ESTADO) M (MAL ESTADO) NA (NO APLICA)

ASPECTO A INSPECCIONAR

CHECK LIST OPERACIONAL	B	M	NA
Verificar nivel de aceite motor	X		
Verificar nivel de refrigerante	X		
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	X		
Verificar estado de las correas	X		
Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	X		
Drenar filtro separador de agua	X		
Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	X		
Verificar nivel de aceite hidraulico	X		
Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	X		
Verificar funcionamiento de los mandos	X		
Verificar estado de los cilindros hidraulicos	X		
Inspeccionar el ajuste de las componentes del equipo (Pines, tornillería, etc)	X		
Verificar funcionamiento del bidireccional	X		
Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	X		
Verificar estado de botellas y luces	X		
Verificar presión de aire y estado general de las llantas	X		
Verificar estado y funcionamiento de frenos	X		
Verificar el estado de la hoja antiderrame			X
Realizar engrase del equipo	X		
Verificar estado de vidrios y espejos	X		
Inspeccionar kits de equipo (Carretes, linternas, botiquín, cuñas)			X
Verificar estado general del vehículo o cabina (Llantas, vidrios, señalizadas, etc)	X		
Verificar estado del extintor y amplitud	X		
Verificar estado kits de derrame	X		
Verificar orden, aseo del equipo (Limpieza y pintura)	X		

ASPECTO AMBIENTAL

[illegible]			X
[illegible]			X
[illegible]			X
[illegible]			X
[illegible]			X
[illegible]			X
[illegible]			X
[illegible]			X

SST

[illegible]	X		
[illegible]	X		

CONSUMOS

COMBUSTIBLE	[illegible]	Cantidad	gl
ACEITE MOTOR	[illegible]	Cantidad	gl
ACEITE HIDRAULICO	[illegible]	Cantidad	gl
OTRO	[illegible]	Cantidad	gl

OBSERVACIONES EQUIPO

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD EJECUTADA	HORAS OPERADOR		HORÓMETRO EQUIPO	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL

HALLAZGOS ENCONTRADOS

ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA

SEGUIMIENTO POR DEPARTAMENTO HSEQ

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE: [illegible] | FECHA: 13-02-2023

	OPERADOR	DEPARTAMENTO HSEQ	DEPARTAMENTO DE OBRA
FIRMA	[illegible]		[illegible]
NOMBRE	[illegible]		[illegible]
CEDULA	[illegible]		[illegible]

Powered by CamScanner

AGRAP SAS

Bogotá, 08 de febrero de 2023

SEÑORES:
AL INTERESADO
La Ciudad

REF. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y ESTADO DEL EQUIPO

Apreciados Señores:

Con la presente certifico que he realizado los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos al equipo Vibrocompactador INGERSOLLRAND Modelo SP 48 DD Seria 6164S año 2004, durante el último mes:

- Cambio de Aceites y Filtros de motor
- Cambio de aceite y filtros hidráulicos
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de Valvulina de Transmisiones
- Revisión y Chequeo General del Sistema Hidráulico
- Corrección de fugas hidráulicas,

Último Horómetro durante el Mantenimiento: 2875 Hrs, a 15 de noviembre de 2022.

Cordialmente,

ALEXANDER GONGORA RIOS
CC 11388495 de Fusagasugá
Ingeniero Civil

DG 2C Norte # 20-23 Casa 17 Cel: 312 4572824
Fusagasugá-Cundinamarca
Colombia

285

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2006

Número de formulario
0620060002103000-6

Fecha de aceptación

21 DIC

4. DV: 8

1) Apellidos y Nombre o Razón Social
INVERSIONES GOMEZ URIBE LTDA

5. Cod. Depto: 13

6. Cod. Admón: 06

7. Cod. Ciudad Municipio: 001

8. Dirección: CL 73 A 46 A 61

Teléfono: 2814103

10. Cod. Clase de Identificación: 1

11. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800037846

12. DV: 1

13. Razón social del declarante autorizado
QUIVECOMEX Y CIA S.I.A. LTDA.

14. Tipo usuario: 26

15. Cod. usuario: 6417

16. Número de identificación del declarante: 73168833

17. Apellidos y nombres
VELEZ VILLALOBOS LUIS GUILLERMO

18. Tipo Identificación: Inicial

19. Clase: 1

20. No. Formulario Anterior: 0000000000000X

21. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX

22. Cod. Admón: XX

23. Declaración de Importación No.: XXXXXXXXXXXXXXX

24. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX

25. Cod. Admón: XX

26. Forma de pago: CR

27. Cod. Declarante: 7201

28. Manifiesto de carga No.: 06200610034920

29. Año - Mes - Día: 2006 - 04 - 02

30. Documento de transporte No.: PEG73017CTGF002

31. Año - Mes - Día: 2006 - 04 - 27

32. Lugar de operación y/o entrega de la mercancía: UCK 2000

33. Cod. Puerto Exportación: 249

34. Lugar de embarque o procedencia de la mercancía: 2700 CARGO LANE CPA LOCKA FL 33054

35. Email: 3056614103

36. Flete (en moneda extranjera): 1450

37. Año - Mes - Día: 2006 - 04 - 27

38. Cod. Puerto de embarque: 249

39. Cod. Modo Transporte: 1

40. Código de Sociedad: 434

41. Cod. Depto Destino: 5

42. Empresa transportadora: AGENCIA MARITIMA GRANCOLOMBIANA S.A.

43. Tasa de cambio $ vs.: 1,957.68

S

44. Documento acompañado: 6420569000

45. Cód. Diligenciamiento: XX

46. Cód. Naturaleza: XX

47. Cód. Modalidad: C100

48. Re-exportación o Reimportación: XX

49. Valor aduana US$: XXXX

50. Posibilidad del pago de tributos: XX

51. Cód. país de origen: 249

52. Cód. Afiliado: XXX

53. Tipo de Cambio: 01

54. Cód. país comprador: 249

55. Peso bruto kilos: 4,305.93

56. Peso neto kilos: 4,305.93

57. Código de embalaje: PX

58. No. Bultos: 1

59. Subpartidas: 2

60. Cód. unidad comercial: U

61. Cantidad unid. comercial: 1.00

62. 806.80

63. Valor Otros Gastos US$: 0.00

64. 0.00

65. 6,837.33

66. Código régimen aduanero: L

67. Numero: 20178471

68. 0

69. Año: 2006

70. Radicación No.: XXXXXXXXXX

71. Consecutivo del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (US$)
Arancel	5.00	11,417,816	570,891	570,891	0
IVA	16.00	11,988,707	1,916,193	1,916,193	0
Otros Impuestos	0.00	0	0	0	0
Cuotas Compensatorias	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	2,486,084		0

VEHICULO NUEVO MARCA VERACRUZ MODELO 2006 CON MOTOR CHINO MARCA CHONGQING JIAT SERIAL 8645 AÑO DE FABRICACION 2006. CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. PRECIO CUANDO NUEVO US $13000. PRECIO SEGUN FACTURA US$5000.

XXXXXXXXXXXXXX

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	T	ro	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419539	4	CAPRO CONSTRUCTORES SAS	D - AIEADS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 73 15A 16	BOGOTA-BOGOTA D.C.	0022591		S1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1974021733	64483402824	E	2023/03/16	2023/03/16	BANCO DE BOGOTA	0	$68,565,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
PRINCIPAL - CRA 27 A (0 Afiliados)						$37,651,100	$4,517,100			$32,651,100	$3,918,100			$30,776,500	$1,476,900			$37,651,100		$1,431,300	$0	$0	$458,800		$11,829,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO 1 (5 Afiliados)						$14,835,000	$1,779,600			$14,835,000	$593,400			$14,835,000	$667,600			$14,835,000		$77,600		$0	$0		$3,691,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$14,835,000	$1,779,600			$14,835,000	$593,400			$14,835,000	$667,600			$14,835,000		$77,600		$0	$0		$3,691,800
1	CC	41887826	CLARA OLGADO SARMIENTO	23010 1	30	$3,178,000	$509,200	0P0101	30	$3,178,000	$126,800	CCF11	30	$3,178,000	$158,800	14-11	30	$3,178,000	0.522%	$16,600	30	$0	$0	N	$710,400
2	CC	1140138153	DIAZ MONICA JUDITH ALEJANDRA	23010 1	30	$2,648,000	$423,400	0P0101	30	$2,648,000	$105,600	CCF11	30	$2,648,000	$132,400	14-11	30	$2,648,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	N	$647,400
3	CC	52461441	JIMENEZ ESTHER	23-14	30	$1,160,000	$185,600	0P0101	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$58,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	N	$296,100
4	CC	1107775824	RODRIGUEZ FLAUTA ADRIAN PATRICIO	23010 1	30	$1,900,000	$303,200	0P0101	30	$1,900,000	$76,000	CCF11	30	$1,900,000	$95,000	14-11	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	N	$474,200
5	CC	7183791	MORALES LARA LEONARDO ALEXANDER	23010 1	30	$4,809,000	$644,800	0P0101	30	$4,809,000	$192,400	CCF11	30	$4,809,000	$240,500	14-11	30	$4,809,000	0.522%	$25,300	30	$0	$0	N	$1,202,900
6	CC	1020804809	SANTOYO GARCIA FREDY ALEJANDRO	23010 1	30	$1,900,000	$303,200	0P0101	30	$1,900,000	$76,000	CCF11	30	$1,900,000	$95,000	14-11	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	N	$474,200
Centro de Trabajo: CENTRAVIVO 3 (11 Afiliados)						$23,326,364	$3,654,180			$23,326,364	$1,809,300			$22,868,400	$893,600			$23,326,364		$1,547,400	$0	$458,800			$8,188,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						$23,326,364	$3,654,180			$23,326,364	$1,809,300			$22,868,400	$893,600			$23,326,364		$1,547,400	$0	$458,800			$8,188,900
7	CC	79774793	CARO BELGADO WILLIAM HERNANDO	23010 1	30	$8,000,000	$1,280,000	0P0101	30	$8,000,000	$320,000	CCF11	30	$8,000,000	$400,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	N	$2,041,800
8	CC	52435713	CAMARGO TERSA MIGUEL KATHERINE	23010 1	30	$1,680,000	$268,800	0P0101	30	$1,680,000	$67,200	CCF11	30	$1,680,000	$84,000	14-11	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	N	$428,800
9	CC	4168540	CERON CERON ALFONSO	23010 1	30	$1,360,000	$217,600	0P0101	30	$1,360,000	$54,400	CCF11	30	$1,360,000	$68,000	14-11	30	$1,360,000	0.522%	$7,100	30	$0	$0	N	$347,100
10	CC	1022367103	CUELLAR CASTELLANOS JUAN DIEGO	23010 1	30	$1,237,000	$197,900	0P0101	30	$1,237,000	$49,500	CCF11	30	$1,237,000	$61,900	14-11	30	$1,237,000	0.522%	$6,500	30	$0	$0	N	$315,800
11	CC	80827447	PEDRAZA VILLA JUAN DAVID	23010 1	1	$39,667	$6,300	0P0101	1	$39,667	$1,600	CCF11	1	$39,667	$1,900	14-11	1	$39,667	0.522%	$200	1	$0	$0	N	$10,100
12	CC	80452170	BARRAGAN SANCHEZ NICOLAS RAMIREZ	23010 1	30	$1,144,000	$183,000	0P0101	30	$1,144,000	$45,700	CCF11	30	$1,144,000	$57,200	14-11	30	$1,144,000	0.522%	$6,000	30	$0	$0	N	$291,900
13	CC	80830439	SANTOS PARRA JUAN DAVID	23010 1	1	$38,667	$6,100	0P0101	1	$38,667	$1,500	CCF11	1	$38,667	$1,900	14-11	1	$38,667	0.522%	$200	1	$0	$0	N	$9,600
14	CC	1030561	SANTAMARIA PARDO FRANCISCO JAVIER	23-14	9	$489,033	$78,200	0P0101	9	$489,033	$19,600	CCF11	9	$489,033	$24,400	14-11	9	$489,033	0.522%	$2,600	9	$0	$0	N	$124,800
15	CC	1018	PARRA MOLINA JOSE ISMAEL	23010 1	30	$1,835,917	$293,800	0P0101	30	$1,835,917	$73,500	CCF11	30	$1,835,917	$91,800	14-11	30	$1,835,917	0.522%	$9,600	30	$0	$0	N	$468,600
16	CC	7221611	PERILLA VACCA MAYER HERNANDO	23010 1	30	$2,640,000	$422,400	0P0101	30	$2,640,000	$105,600	CCF11	30	$2,640,000	$132,000	14-11	30	$2,640,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	N	$673,800
17	CC	1110519575	SOTO VELASCO ALEX SAMUEL	23010 1	30	$2,640,000	$422,400	0P0101	30	$2,640,000	$105,600	CCF11	30	$2,640,000	$132,000	14-11	30	$2,640,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	N	$673,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
PRINCIPAL - TUNJA (3 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,000,000	$40,000			$1,160,000		$10,500	$0	$0	$0		$282,500
Centro de Trabajo: TUNJA (3 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,000,000	$40,000			$1,160,000		$10,500	$0	$0	$0		$282,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,000,000	$40,000			$1,160,000		$10,500	$0	$0	$0		$282,500
18	CC	1057415089	MEDINA MORA ELBA LUCIA	23010 1	30	$1,160,000	$185,600	0P0101	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.750%	$10,500	30	$0	$0	N	$282,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Reconocido SENA e ICBF	Total Aportes
EMPLEADOR: [illegible] (30 Afiliados)						$16,049,190	$2,567,870			$16,049,190	$659,300			$16,049,190	$644,000			$16,049,190		$1,091,450		$0	$0		$4,962,620
Centro de Trabajo: **PUENTE ARANDA (30 Afiliados)**						$16,049,190	$2,567,870			$16,049,190	$659,300			$16,049,190	$644,000			$16,049,190		$1,091,450		$0	$0		$4,962,620
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (30 Afiliados)						$16,049,190	$2,567,870			$16,049,190	$659,300			$16,049,190	$644,000			$16,049,190		$1,091,450		$0	$0		$4,962,620
19	CC	1023326414	ALVARADO RAMIRA ANGELES CALANDRA	23000 1	30	$1,356,354	$217,020	EPS018	30	$1,356,354	$54,300	CCF33	30	$1,356,354	$54,300	14-11	30	$1,356,354	0.5000	$81,500	30	$0	$0	N	$408,200
20	CC	1031...	APONTE BERNAL DIDIER CALANDRO	23000 1	30	$1,008,600	$161,360	EPS018	30	$1,008,600	$40,400	CCF33	30	$1,008,600	$40,300	14-11	30	$1,008,600	0.5000	$50,500	30	$0	$0	N	$301,500
21	CC	1026...	ROMERO DIAZ DRAYAN ESTIVEN	23000 1	2	$67,224	$10,750	EPS018	2	$67,224	$2,690	CCF33	2	$67,224	$2,690	14-11	2	$67,224	0.5000	$336	2	$0	$0	N	$16,500
22	CC	1026...	ROMERO DIAZ DRAYAN ESTIVEN	23000 1	5	$168,000	$26,880	EPS018	5	$168,000	$6,720	CCF33	5	$168,000	$6,720	14-11	5	$168,000	0.5000	$840	5	$0	$0	N	$41,000
23	CC	1026...	ROMERO DIAZ DRAYAN ESTIVEN	23000 1	16	$1,344,960	$215,190	EPS018	16	$1,344,960	$53,800	CCF33	16	$1,344,960	$53,800	14-11	16	$1,344,960	0.5000	$6,720	16	$0	$0	N	$329,500
24	CC	1023...	PUPO [illegible]	23000 1	30	$1,356,354	$217,020	EPS018	30	$1,356,354	$54,300	CCF33	30	$1,356,354	$54,300	14-11	30	$1,356,354	0.5000	$81,500	30	$0	$0	N	$408,200
25	CC	1031...	PEREZ CARON CHARLES FELIPE	23000 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS018	30	$2,100,000	$84,000	CCF33	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.5000	$10,500	30	$0	$0	N	$514,500
26	CC	1026...	PEÑA IBARRA CARLOS IBARRA	23000 1	2	$67,224	$10,750	EPS018	2	$67,224	$2,690	CCF33	2	$67,224	$2,690	14-11	2	$67,224	0.5000	$336	2	$0	$0	N	$16,500
27	CC	1026...	PEÑA IBARRA CARLOS IBARRA	23000 1	28	$1,230,750	$196,920	EPS018	28	$1,230,750	$49,230	CCF33	28	$1,230,750	$49,230	14-11	28	$1,230,750	0.5000	$6,150	28	$0	$0	N	$301,500
28	CC	1023...	RODRIGUEZ CUERVO DANIEL SANTIAGO	23000 1	30	$1,717,890	$274,860	EPS018	30	$1,717,890	$68,700	CCF33	30	$1,717,890	$68,700	14-11	30	$1,717,890	0.5000	$8,590	30	$0	$0	N	$420,100
29	CC	1026...	RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE LUIS	23000 1	30	$1,926,234	$308,200	EPS018	30	$1,926,234	$77,100	CCF33	30	$1,926,234	$77,100	14-11	30	$1,926,234	0.5000	$9,630	30	$0	$0	N	$471,400
30	CC	1026...	TOLLE GOMEZ YUDI ENID	23000 1	30	$1,458,960	$233,500	EPS018	30	$1,458,960	$58,300	CCF33	30	$1,458,960	$58,300	14-11	30	$1,458,960	0.5000	$7,290	30	$0	$0	N	$357,100
31	CC	1072...	VILLAMIZAR VARGAS LUBA JULIA	23000 1	30	$2,099,790	$335,960	EPS018	30	$2,099,790	$83,990	CCF33	30	$2,099,790	$83,990	14-11	30	$2,099,790	0.5000	$10,490	30	$0	$0	N	$514,430

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Reconocido SENA e ICBF	Total Aportes
EMPLEADOR: [illegible] (5 Afiliados)						$3,969,334	$607,300			$3,969,334	$159,000			$3,969,334	$159,000			$3,969,334		$275,100		$0	$0		$1,201,400
Centro de Trabajo: **CUAYATÁ VÍA (5 Afiliados)**						$3,969,334	$607,300			$3,969,334	$159,000			$3,969,334	$159,000			$3,969,334		$275,100		$0	$0		$1,201,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$3,969,334	$607,300			$3,969,334	$159,000			$3,969,334	$159,000			$3,969,334		$275,100		$0	$0		$1,201,400
32	CC	1051...	MARTIN VACA OMAR GIOVANNI	23000 1	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,800	CCF33	7	$270,667	$10,800	14-11	7	$270,667	0.5000	$1,350	7	$0	$0	N	$66,400
33	CC	1015...	MOYANO MORALES SANDRA MILENA	25-14	30	$2,520,000	$403,200	EPS037	30	$2,520,000	$100,800	CCF33	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	0.5000	$12,600	30	$0	$0	N	$617,200
34	CC	1051...	PEREZ TOLLE MILLER ALEXANDER	23000 1	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,800	CCF33	7	$270,667	$10,800	14-11	7	$270,667	0.5000	$1,350	7	$0	$0	N	$66,400
35	CC	1026...	TORRES JIMENEZ MIGUEL	23000 1	8	$309,334	$49,600	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF33	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	0.5000	$1,550	8	$0	$0	N	$75,900
36	CC	1033...	VERA CARDON JESSICA PAOLA	23000 1	7	$269,334	$43,200	EPS037	7	$269,334	$10,800	CCF33	7	$269,334	$10,800	14-11	7	$269,334	0.5000	$1,350	7	$0	$0	N	$66,150
Total		Afiliados(30)				$18,139,888	$3,463,000			$18,139,888	$1,019,400			$20,109,222	$1,315,000			$20,109,222		$2,366,550		$0	$0		$7,163,950

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901159570	4	CAMPO CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 73 10A 44	BOGOTA-BOGOTA D.C.	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1974421723	1948540834	E	2023/03/16	2023/03/16	BANCO DE BOGOTA	0	$18,065,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$9,662,000	$0	$0	$9,662,000
COLFONDOS	23-03	800,227,940	6	5	$1,429,500	$0	$0	$1,429,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$919,500	$0	$0	$919,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$5,132,000	$0	$0	$5,132,000
PROTECCION	230301	800,229,739	0	3	$2,181,400	$0	$0	$2,181,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,052,000	$0	$0	$3,052,000
ARL SURA	14-11	830,903,790	5	33	$3,052,000	$0	$0	$3,052,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				33	$2,313,000	$0	$0	$2,313,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	27	$2,114,000	$0	$0	$2,114,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	5	$159,000	$0	$0	$159,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				33	$3,088,400	$0	$0	$3,088,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMENICA)	EPS001	830,113,831	8	1	$1,251,800	$0	$0	$1,251,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$73,500	$0	$0	$73,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$201,600	$0	$0	$201,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,700	$0	$0	$46,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$337,000	$0	$0	$337,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,300	$0	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$347,500	$0	$0	$347,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$48,000	$0	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$281,900	$0	$0	$281,900
SANITAS	EPS005	830,251,449	6	5	$443,100	$0	$0	$443,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$270,000	$0	$0	$270,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTALES				33	$18,065,400	$0	$0	$18,065,400

2023/04/18 11:31 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS DAVID PEÑA IBARRA identificado(a) con CC 1069712578

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30									X										$1,407,708	4%	$56,400
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X										$1,407,708	16%	$225,300
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30									X										$1,407,708		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30									X										$1,407,708		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30									X										$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30									X										$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X										$1,407,708	0.96%	$56,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X										$1,407,708	4%	$56,400
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28									X										$1,239,750	4%	$49,600
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X									$77,334	0%	$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28									X										$1,239,750	16%	$198,400
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2										X									$77,334	12%	$9,300
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	28									X										$1,239,750		$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	2										X									$77,334		$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	28									X										$1,239,750		$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	2										X									$77,334		$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	28									X										$0	0%	$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	2										X									$0	0%	$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	28									X										$0	0%	$0
9448348524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	2										X									$0	0%	$0

b32

aportes en línea

Certificado de Aporte

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip				
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	28									X										$1,239,750	6.96%	$86,300
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2										X									$77,334	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	28									X										$1,239,750	4%	$49,600
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2										X									$77,334	0%	$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	EPS	EPS090	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	15	X																		$580,000	4%	$23,200
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	15	X																		$580,000	16%	$92,800
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	15	X																		$580,000		$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	15	X																		$580,000		$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	15	X																		$0	0%	$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2023-01	15	X																		$0	0%	$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	15	X																		$580,000	6.96%	$40,400
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	15	X																		$580,000	4%	$23,200

Este certificado se expide el día 2023-04-27 a las 04:15.

240

aportes en línea

Certificado de Aporte

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES ORLANDO ALVARADO IBARRA identificado(a) con CC 1007596414

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										irg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	13	X								X									$1,491,083	4%	$59,700
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	13	X								X									$1,491,083	16%	$238,800
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	13	X								X									$1,491,083		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	13	X								X									$1,491,083		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	13	X								X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	13	X								X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	13	X								X									$1,491,083	6.96%	$103,800
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	13	X								X									$1,491,083	4%	$59,700
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X									$1,356,354	4%	$54,300
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,356,354	16%	$217,100
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30									X									$1,356,354		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30									X									$1,356,354		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30									X									$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,356,354	6.96%	$94,400
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30									X									$1,356,354	4%	$54,300
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	15	X																	$580,000	4%	$23,200
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	15	X																	$580,000	16%	$92,800
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	15	X																	$580,000		$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	15	X																	$580,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																			IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdc	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip				
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230901	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	15	X																			$0	0%	$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230901	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2023-01	15	X																			$0	0%	$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	15	X																			$580,000	6.960%	$40,400
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	15	X																			$580,000	4%	$23,200

Este certificado se expide el día 2023-04-27 a las 04:15.

2912

aportes en línea

Certificado de Aport

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE PAEZ CAÑON identificado(a) con CC 1032461396

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		$2,100,000	16%	$336,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30																		$2,100,000		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30																		$2,100,000		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30																		$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30																		$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		$2,100,000	6.96%	$146,200
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$2,100,000	16%	$336,000
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30																		$2,100,000		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30																		$2,100,000		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30																		$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30																		$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$2,100,000	6.96%	$146,200
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																		$2,100,000	16%	$336,000
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30																		$2,100,000		$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30																		$2,100,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30																		$0	0%	$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30																		$0	0%	$0
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																		$2,100,000	6.96%	$146,200
9446884753	1917430719	E	2023-02-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30																		$2,100,000	16%	$336,000
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-12	30																		$2,100,000		$0
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-12	30																		$2,100,000		$0
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-12	30																		$0	0%	$0
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-12	30																		$0	0%	$0
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30																		$2,100,000	6.96%	$146,200
9445581375	1871758029	E	2023-01-19	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-12	9	X																	$630,000	4%	$25,200
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	9	X																	$630,000	16%	$100,800
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-11	9	X																	$630,000		$0
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-11	9	X																	$630,000		$0
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-11	9	X																	$0	0%	$0
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-11	9	X																	$0	0%	$0
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	9	X																	$630,000	6.96%	$43,800
9444368530	1822058428	E	2022-12-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	9	X																	$630,000	4%	$25,200

Este certificado se expide el día 2023-04-27 a las 04:14.

aportes en línea

Certificado de Aporte

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YON GERARDO URREA GARAVITO identificado(a) con CC 1069751406

Cíclo Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vip	cor	vst	sln	ige	mat	vac	avp	vct	irl	vlp			
9449761672	2035539302	E	2023-04-10	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	17	X								X									$1,008,958	4%	$40,400
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	17	X								X									$1,008,958	16%	$161,500
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	17	X								X									$1,008,958		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	17	X								X									$1,008,958		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	17	X								X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	17	X								X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	17	X								X									$1,008,958	0.696%	$70,300
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF32	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	17	X								X									$1,008,958	4%	$40,400

Este certificado se expide el día 2023-04-27 a las 04:22.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE EDWIN CASTAÑO OSPINA identificado(a) con CC 1114812316

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlr			
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	17	X								X									$924,375	4%	$37,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	17	X								X									$924,375	16%	$147,900
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	17	X								X									$924,375		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	17	X								X									$924,375		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	17	X								X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2023-03	17	X								X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	17	X								X									$924,375	6.96%	$64,400
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	17	X								X									$924,375	4%	$37,000

Este certificado se expide el día 2023-04-27 a las 04:22.

262

aportes en línea

Certificado de Apor

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FLOR ENID TELLEZ GOMEZ identificado(a) con CC 52535312

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										irg	ret	tde	tae	tdc	cap	vsp	cor	est	sln	ige	lma	vac	avp	ect	irl	vip				
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	MN001	FOSYGA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30									X										$1,380,130	4%	$55,500
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X										$1,380,130	16%	$220,800
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30									X										$1,380,130		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30									X										$1,380,130		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30									X										$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30									X										$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X										$1,380,130	6.96%	$96,100
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X										$1,380,130	4%	$55,300
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	MN001	FOSYGA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30	X								X										$1,430,060	4%	$57,300
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X								X										$1,430,060	16%	$229,000
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30	X								X										$1,430,060		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30	X								X										$1,430,060		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30	X								X										$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30	X								X										$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X								X										$1,430,060	6.96%	$99,600
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X								X										$1,430,060	4%	$57,300

Este certificado se expide el día 2023-04-27 a las 04:21.

297

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BRAYAN ESTIVEN MORENO DIAZ identificado(a) con CC 1069753235

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	28																			$1,400,000	4%	$56,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	2										X									$100,000	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28																			$1,400,000	16%	$224,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X									$100,000	16%	$16,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	28																			$1,400,000		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	2										X									$100,000		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	28																			$1,400,000		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	2										X									$100,000		$0
9449761673	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	28																			$0	0%	$0
9449761673	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	2										X									$0	0%	$0
9449761673	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	28																			$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	2										X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28																			$1,400,000	6.96%	$97,000
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X									$100,000	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28																			$1,878,136	4%	$75,200
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X									$100,000	0%	$0
9449340524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	28									X										$1,559,102	4%	$62,000
9449340524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2											X								$77,334	4%	$3,100
9449340524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	2										X									$100,000	0%	$0
9449340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	28									X										$1,559,102	16%	$261,100
9449340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2											X								$77,334	16%	$12,400

aportes en línea

Certificado de Aporte

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										irp	ret	ige	lae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ign	ltm	vac	avp	vct	int	via			
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2										X									$100,000	12%	$12,000
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	28									X										$1,555,162		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	2											X								$77,334		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	2										X									$100,000		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	28									X										$1,555,162		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	2											X								$77,334		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	2										X									$100,000		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	28									X										$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	2											X								$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	2										X									$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	28									X										$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	2											X								$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	2										X									$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	28									X										$1,555,162	0.96%	$103,300
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2											X								$77,334	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2										X									$100,000	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	28									X										$1,555,162	4%	$62,809
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2											X								$72,919	4%	$3,009
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2										X									$100,000	0%	$0
9448884753	1917430719	E	2023-02-14	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	15	X								X										$1,023,333	4%	$41,000
9448884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	15	X								X										$1,023,333	16%	$163,800
9448884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	15	X								X										$1,023,333		$0
9448884753	1917430719	E	2023-02-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	15	X								X										$1,023,333		$0

aportes en línea

Certificado de Aport

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotizacion
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsa	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vyp	vct	irl	vip				
9446884753	19174300719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	16	X								X									$0	0%	$0
9446884753	19174300719	E	2023-02-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	16	X								X									$0	0%	$0
9446884753	19174300719	E	2023-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	16	X								X									$1,023,333	6.96%	$71,300
9446884753	19174300719	E	2023-02-14	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	16	X								X									$1,023,333	4%	$41,000

Este certificado se expide el día 2023-04-27 a las 04:20.

306

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CAIPRO CONSTRUCTORES SAS identificado(a) con NI 900119570 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUBA SUSAN VELASQUEZ VARGAS identificado(a) con CC 1073321378

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-04	30									X									$2,417,519	4%	$96,800
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X									$2,417,519	16%	$386,900
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-03	30									X									$2,417,519		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-03	30									X									$2,417,519		$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-03	30									X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-03	30									X									$0	0%	$0
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X									$2,417,519	0.96%	$168,300
9449761672	2035539302	E	2023-04-20	CCF	CCF32	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30									X									$2,417,519	4%	$96,800
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30	X								X									$2,099,718	4%	$83,600
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X								X									$2,099,718	16%	$334,400
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30	X								X									$2,099,718		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30	X								X									$2,099,718		$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30	X								X									$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30	X								X									$0	0%	$0
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X								X									$2,099,718	6.96%	$145,600
9448340524	1974421723	E	2023-03-16	CCF	CCF32	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X								X									$2,099,718	4%	$83,600

Este certificado se expide el dia 2023-04-27 a las 04:21.

301

compensar | miplanilla.com

PLANIL. . INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION D. APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79782689	ALVARO ESPINOSA	Calle 6 136 vereda puente de piedra	3134741465	sembrandoycontando@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID	S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	1	26/04/2023	67045126	$330.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS308	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.000	0	0	0	0	0	0		185.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, SFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.000	185.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.000	330.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-07	**Página**	1 de 1
Versión No.	3		

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ELIZABETH CAINA DELGADO identificado con CC. 40.037.628 de Tunja, en mi condición de representante legal de **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** identificada con NIT 900.119.570-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

WILSON PAUL AGUILAR NOVOA identificado con CC. 79.688.685 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 76679 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia en calidad del representante legal de la sociedad **WP ACCOUNTANT S.A.S**. identificada con el NIT. 901.327.268-1, en nuestra condición de revisor fiscal de **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** identificada con NIT 900.119.570-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTA D.C., los 30 días del mes de Abril 2023.

ELIZABETH CAINA DELGADO
CC.40.037.628 DE Tunja.
REPRESENTANTE LEGAL.
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

WILSON PAUL AGUILAR NOVOA
CC. 79.688.685
REPRESENTANTE LEGAL
WP ACCOUNTANT S.AS.
REVISOR FISCAL
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

31/Enero/2023 Tiempo Seco.
Personal en obra: 1 maestro, 2 Oficiales, 3 ayudantes
1 operador de retroexcavadora, 1 topografo

Se realiza excavacion a 50cm de profundidad, se rompe una tubería de gas de ½", la cual alcaños atiende la emergencia y realiza la reparacion.
Llega un viaje de 15m³ de rajón.

Anuar Mtro Obra

Ing. Residente de Fiscalización

01/febrero/2023 Tiempo Seco
Personal en obra: 1 maestro de obra, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 operador de retroexcavadora, 1 topografo 1 piso, 1 trabajadora Social.

Se realiza nuevamente visita a las casas que no atendieron en el tramo inicial, y se les realiza las respectivas actas de vecindad a las que atendieron, se continua con la excavacion a 50cm de profundidad, se mejora el camellon para el acceso de las volquetas.

Se realiza comité con interventoria y supervisión, en el cual se trabajan temas de avance de obra.

Anuar Mtro Obra

Ing. Residente de Fiscalización

Powered by CamScanner

02/Febrero/2023. Tiempo Seco.

Personal en obra; 1 maestro de Obra, 2 oficiales, 3 Ayudantes, 1 topografo, 1 operador de retroexcavador.

Se realiza la instalacion de la valla informativa del proyecto, se realiza nivelacion de la via y se instalan niveletas para excavación.
Llega minicargador Bobcat sane: AZNB 12924
Llegan 3 viajes de 15m³ de Rajón.

Andrés Felipe Peer

Ing Residente de Interventoría

03/Febrero/2023. Tiempo Seco.

Personal en obra: 1 maestro de obra, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 operador de retro, 1 SISO, 1 profesional social.

Se realiza recorrido en el sitio de obra y sobre las vías internas del barrio con el fin de hacer el levantamiento del ancho de entrega.
Participa.
Ing Andrés Felipe Peer Carrión Residente de obra
Profesional Social de obra Alex Tellez
Veedor Ciudadano Edwin Martinez
Ing. Jhon S. Pulido Residente de Interventoría.
Se propone reunir para el martes 7 de febrero en compañía de los actores antes citados y el acompañamiento del personal de la junta de acción comunal para realizar la socialización del PMT el contratista aportara el plano del PMT impreso como guía y soporte para que la

Powered by CamScanner

comunidad maneje mas facilmente la información.

Ing. Residente de Fiscalización

04/Feb/2023	Tiempo Seco.

Personal en Obra: 1 maestro de Obra; 1 operador retroexcavadora, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 SISO, 1 operador minicargador, 1 operador Volqueta.

Llega minicargador bobcat serie: AZNB12924, se continua con el carreteable para el ingreso y salida de volquetas, llega volqueta 10 para retiro de placas, se realiza movimiento de tierras interno.

Andrés Pico.

Ing. Residente de Fiscalización

06/Feb/2023	Tiempo Seco.

Personal en Obra: 1 maestro de Obra, 1 operador retro excavadora, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 SISO, 1 operador minicargador, 1 operador volqueta.

Se realiza movimiento de material demolido a botadero, el cual se mueven 48m³, se realizan movimientos de tierra internos.

MKB

Powered by CamScanner

Andrés Pavón

Ing. Residente 2. Infraestructura

07/feb/2023 Tiempo Seco.

Personal en Obra: 1 maestro, 2 Oficiales, operador retro, 3 ayudantes, 1 conductor volqueta, 1500, 1 operador minicargador.

Se solicita al contratista realizar la entrega de la documentación que soporte los seguros y demás (soportes) documentos que regulen la actividad y trabajo de los equipos. ya que a la fecha no han sido remitidos.

- Excavadora Oruga Kobeta SK80-3
- Volqueta doble troque WFL 457.
- Minicargador Bocat. 5570.

Ing. Yeiby Sanchez Residente de Interventoría

Se debe realizar la revisión preoperacional diaria de cada equipo antes de iniciar las labores de obra diaria.

Esta solicitud queda estipulada y aclarada en el comité de obra realizado el día de hoy el cual se verá reflejado en el acta correspondiente.

Continua la excavación de la caja de la vía, revisión topográfica de niveles.

Andrés Pavón

Powered by CamScanner

08/Feb/2023 Tiempo Seco.

Personal en Obra: Maestro de obra, operador retro, operador minicargador, 2 oficiales, 3 ayudantes, conductor Volqueta, siso, topo.

Continua excavación de caja de la vía se realiza trasiego de material a botadero existente.
llegada de 5 volquetas seralles para movimiento de tierras.

Andrés Paez.

Ing. Residente e Interventoría.

A la fecha no se ha realizado la entrega de la relación de los equipos y maquinaria puesta en obra de acuerdo

09/Feb/2023 Tiempo Seco.

Personal en obra: Maestro obra, operador retro excavadora, Operador minicargador, conductor Volqueta, 2 oficiales, 3 ayudantes Siso, topografo.

Continua excavacion de caja de la via, se identifican las domiciliarias que se encuentran superficiales y la red de agua potable, red de agua potable se encuentra superficial.

Andrés Paez.

Ing. Residente e Interventoría.

Powered by CamScanner

10/Feb/2023 Tiempo seco

Personal en Obra: Maestro de Obra, SISO Topografo, operador retro, operador mini, volqueteros, 2 oficiales, 3 ayudantes.

Se realiza implantacion diseño existente se encuentra en bocacalle donivel respecto al empalme en 25 cm, lo cual se consulta con la interventoria y se propone ajustar el diseno con la cota existente de la bocacalle.

Andres Paez

Ing. Residente e Interventoria

Llegada vibrocompactador ingersoll Rand SP-48DD, se realiza compactacion de sobrazante, continua excavacion de la caja de la via.

Andres Paez

Ing. Residente e Interventoria

11/Feb/2023 Tiempo seco

Personal en Obra: Topografo, SISO, operador retro, operador mini, 2 oficiales, 3 ayudantes conductor volqueta

Continua caja de la via, revision niveles de implantacion de la via, inicio instalacion de cajón

Andres Paez

MCB

Powered by CamScanner

12/feb/2023 Tiempo Seco.
Personal en Obra Maestro de Obra, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, Operador Retro excavadora, Operador cargador, operador volqueta, operador vibro compactador, SISO, topografo.

Instalacion de rejon en caja de via, revision y nivelacion topograficamente, continua excavacion.
Se realiza humectacion del terreno para evitar polvadera.

Andy Paez

Ing. Residente Supervisor

13/feb/2023 Tiempo Seco
Personal en Obra Maestro de Obra, 2 Oficiales, 3 ayudantes, operador retroexcavadora, operador cargador, operador volqueta, topografo, SISO.

Continua instalacion de rejon en cuerpo de via, se revisan niveles.
continua hidratacion del terreno para evitar polvadera.
En la excavacion se encuentran rocas de gran tamaño.

Andy Paez

Ing. Residente Supervisor

Powered by CamScanner

14/feb/2023	Tiempo seco Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 oficiales 3 Ayudantes, operador retro, operador mini operador Volqueta, operador vibro, siso, topografo. Continua la instalacion del rayón e inicio instalacion de B-200 para sello del mismo Se realiza comité de Obra N°4. Se realiza recorrido con supervision, ensafusa y contratista para ver la solucion al movimiento de las tuberia de 3" de agua potable que cruza por el lote nuevo a intervenir, en este recorrido supervision sugirieron que se realice la excavación por donde puede pasar el nuevo tubo de agua potable, para que Ensafusa proceda a instalarlo Residente Ing. Residente 2 Interventoría
15/feb/2023	Tiempo lluvioso. Hum. hoy 310 psi - 500 psi. Personal en obra: Maestro de Obra, 2 oficiales 3 Ayudantes, operador retro, operador mini, operador Volqueta, operador vibro, siso, topografo. Continua sellado de rayón con B-200, se presentan lluvias en la tarde. Se encuentran fallos en el terreno de la abscisa K0+305 a la abscisa K0+335 lo cual se le informa a la interventoria el cual indica que se debe informar NKB

Powered by CamScanner

mediante oficio.
Se reciben los nuevos diseños de la vía, el cual se implanta en el terreno y no concuerda con lo ya realizado siguiendo el diseño inicial.

Maestro de Obra

Ing. Residente e Interventoría

16/feb/2023. Tiempo Humedo
Personal en Obra: Maestro de Obra, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, Operador Retro, Operador mini, Topografo, SISO, Operador vibrocompactador, Operador Volqueta.

Continuan excavaciones tramo 2, no se puede continuar sellando debido a lluvias presentadas en la noche.
Se implanta el ultimo diseño enviado por supervision y este no concuerda con el diseño inicial usado para la excavación y rellenos, se informa a la interventoria.

Maestro de Obra

Ing. Residente e Interventoría

16/feb/2023 Se realiza retiro de la capa superior del pedraplen con el material seleccionado de excavación recibido por el contratista y acopiado en el costado derecho vertical del paso de peatones, el contratista manifiesta a través del Director de obra y el residente de no utilizar de este material, sin embargo este fue usado

NICE

como sello entre los abscisas Km 410 hasta la Km 350, se solicita al contratista presentar los ensayos de este material ya que a la fecha no se ha realizado la entrega del mismo.

Si realiza adenda de traspaso con el traspasante y cedente de la intervención se trabaja en conjunto con el traspaso del contrato se revisan niveles de excavación y reposición de pavimento, niveles de terraplen do. de (era el dr) de acuerdo con el diseño entregado por el contratante.

Se realiza recorrido de obra con el supervisor de almeda en el fin de tomar fotos de niveles y accesos a las viviendas para valoración.

Ingeniero Residente 2 Intervención.

Los vehículos voluntarios que se encuentran retirando el material sobrante de excavación no realizan el recorrido que se encuentra aprobado en el PMT, realizan el desplazamiento por las vías externas del barrio se solicita al contratista realizar la debida adenda en el cumplimiento del PMT.

Ingeniero Residente 2 Intervención.

Powered by CamScanner

17 feb. 2023 Estado del tiempo. Tiempo seco
Lluvia aproximada 02:30 pm hasta 5:00 pm.
Personal en obra. Maestro de Obra, 2 Oficiales, Ayud. Operador mini, Operador Retro, operador vibro, Operador Volqueta, Topografo, Soso

Actividades

17-feb 2023 - Se realizó recorrido Obra Social y revisión de actas de vecindad en las que se solicitó al contratista recolectar datos, adjuntar la descripción técnica de las actas de fachada e interna y el registro fotografico de las mismas
- Se solicita al contratista radicación mediante oficio de las acta de vecidad.
- se solita al Contratista radicacion mediante oficio de Plande gestion Social, informe Social Contratista
- Se reanuda para recaida por parte de la comunidad para respuesta del contratista obra

Residnt Social
interventoria

17-fe-2023 Se evidencia Falta de cerramientos y Senderos demarcados y definidos.

Fabio Mesa
RS ambiental

Se realiza aclaración a lo andado el 16 de Febrero por el interventor, se realiza el sello del rajon con el B-200 nuevo, el proveniente de la excavación se usó como corretcable para el acceso del minicargador y las volquetas para el sellado del material. En wanto a la volqueta que pudo transitar por el barrio, se aclara toma se le informó

Powered by CamScanner

verbalmente al interventor que la volqueta por caso fortuito tomo estas vias para iba descargada ya que podia enterrarse al salir cargada por el lote debido a las lluvias presentadas.

Andrés Pacer

Ing. Residente de Interventoría.

17-Feb-2023 Durante recorrido Social se acerca hijo de residente de 3 edad, ubicada en la carrera 17-34, solicitando arreglo de cables camara que la maquinaria rompio el dia Sabado 11-Feb-2023, se Solicita al Contratista formato epis para dar pronto solución ala solicitud

R Social

6/Feb/2023 Tiempo lluvioso: llueve de 8am a 10am. Personal en Obra: 2 Oficiales, operador retro operador mini, operador volqueta, 3 Ayudantes, Topografia, Jefe.

se presentan lluvias en la mañana lo que impide el desarrollo de las excavaciones, se inunda la caja ya realizada, se esta drenando y se espera que drene para continuar labores.

Ing. Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

30 feb. 2023. Estado del tiempo. Tiempo seco todo el día.

Personal en Obra. Maestro de Obra, Oficiales, Ayudantes, Topografo, Sisco, operador mini, operador retro, operador Volqueta.

Se realizo excavación mecánica con excavadora de oruga Kubota KX080-3 entre las abscisas Km0+320 hasta la Km0+280 debido a las fuertes lluvias acumuladas en la noche anterior de sobremanera se encuentra estancada.

En cuanto material de excavación: con volqueta doble troque para disposición en sitio autorizado.

A la fecha el contratista no ha presentado:

- Los ensayos del material almacenado de la excavación realizada como sello del rapido instalado desde la abscisa Km0+410 hasta la Km0+550.
- Se solicita al contratista realizar la entrega de la relación de los materiales llegados a obra junto con su respectivo soporte o remisión.
- Los trabajadores no cuentan con botas de caucho para trabajo en material mojado o durante la lluvia no cuentan con impermeables.
- El personal no cuenta con cascos de seguridad para la ejecución de las labores.
- No se ha realizado la reparación de la tubería de vida de la propietaria que instalo la PRR.

Powered by CamScanner

316

-Se solicita al contratista retirar el material sobrante y de excavación acopiado en el área de predio del vecino del lote. contiguo a las obras, de igual manera se solicita acopiar el material en la zona del lote donde se vienen depositando los materiales llegados a obra.

Ing. Felix Saul Prado Ma.
Residente de Supervisión

El material proveniente de excavación solo se ha usado como carreteable.
la camara esta en tramite los materiales para su arreglo.

24/Feb/2023. Tiempo lluvioso. Nota. el registro de lluvias. hace relación al periodo de actividades de obra.
Personal en obra. Maestro de Obra, Oficiales, Ayudantes, Operador mini, Operador retro, Operador Volqueta, SISO, Topografo.

Se realiza retiro de material excavado, instalación de rayón y sello, no se avanza en obra más debido a las lluvias presentada a partir de las 2 pm.

Ing. Felix Saul Prado
Residente Supervisión

Powered by CamScanner

22/feb/2023 Tiempo seco en la mañana, lluvia ocasional en la tarde

Personal en obra: Maestro de Obra, Oficiales, Ayudantes, Operador retro, operador mini, operador volqueta 3100, Topografo.

Actividades.

Se realizan actividades en conjunto con la comisión de topografía del contratista e ing. Residente de obra e Ing. Residente de Fiscalización, se chequean los cotas de nivel de terminado de vía según diseño con relación a las cunetas a garajes de viviendas entre las abscisas K0+280 a la K0+200

A la fecha se ha realizado la excavación mecánica con excavador de oruga KX060-3 desde la abscisa K0+410 hasta la K0+280, con un ancho de 7m y una profundidad aproximada o promedio de 0,90 m.

A la fecha se presenta un atraso de obra superior al 3%, por lo tanto la interventoría solicita al contratista tomar las medidas, acciones y programar las actividades de contingencia necesarias para dar cumplimiento a la programación de obra establecida y aprobada.

Se solicita al contratista realizar las actividades de excavación de manera continua con una profundidad programada entre los 0,50 y 0,60 m. que permita el control de los niveles de excavación y prevenir así el caso la saturación del estrato o capas de tal manera que permita retirar la capa de tierra afectada por las lluvias que generalmente estén excediendo durante la noche.

Powered by CamScanner

Se solicita al (los) contratista realizar la entrega de bolos de concreto puntuales para que el personal realice de manera adecuada sus labores en el terreno señalado, de igual manera la entrega del pavimento del cual no se ha realizado.

Jordy Pabón

23/Feb/2023 Tiempo Seco en la mañana

Personal en Obra: Maestro de Obra, 1 Oficial, 3 Ayudantes, operador mini, operador retro, operador Volqueta, SISA, Topografía

Se realiza excavación en tramo 2, se instala cajón y se sella con B-200.

Se realiza excavación mecánica con excavadora de oruga Kubota KX080-3 entre los abscisas Km 340 y Km 320, se retira el material de sello que está conformado por una parte de B200 y el material sobrante de excavación seleccionado, el tramo se encuentra saturado, se presentan fallas en la subrasante, no se han reparado los deterioros lo cual genera una considerable acumulación de agua en la excavación, como factor agregado la excavación a estado abierta por un periodo mayor a 15 días no se sella la capa de subrasante, las lluvias de la noche de los días anteriores han contribuido también con esta situación. El personal de obra se cuenta con los elementos de protección personal adecuado por el cargo del

NICE

Powered by CamScanner

rajón (guantes idoneidad)

Para el caso del tramo 2 el cual tiene como fecha de inicio 10 de febrero y punto de abscisado inicial la K0+280, a la fecha no se han iniciado labores en este punto.

Ing. Fredy Samuel Rubio Mesa
Residente de Interventoría

El personal de Obra si cuenta con su respectiva dotación para la manipulación del rajón.
El tramo 2 ya se inicio pues se excavo hasta la abscisa K0+270.

Se realiza la estabilización del fallo mencionado anteriormente, se retira el material en mal estado y se reemplaza por material nuevo.

24/Feb/2023 Tiempo Seco en la mañana

Personal en Obra: 1 Oficial, 3 Ayudantes, operador mini, operador retro, operador volqueta, Siso.

Se realiza retiro de fallo en la abscisa K0+280 a la K0+290 y se mejora con rajón nuevo y se sella.

Powered by CamScanner

320

Por rotura de tubería de agua potable no se pudo continuar excavando para evitar que dañe la subrasante, emergencias realizan reparación.

Andres Pozo

Se realiza la actividad descrita por el contratista, sin embargo se observa que el relleno no se instala sobre la capa subrasante expuesta. Durante el daño ocasionado a la red de acueducto la faja restante sobre el tramo de la abscisa Kot 315 hasta Kot 290.

Se realiza la reparación por parte del personal de Emaseo Ema.

Se solicita al contratista realizar la actividad preventiva de protección de la red de telecomunicaciones de movistar - Telefónica, ya que los postes se encuentran expuestos en su base y podrían ocurrir volcamiento a causa de las lluvias u otro factor.

Se presento daño en una de las fajas de los pozos en la abscisa Kot 130.

No se ha realizado la reparación de las domiciliarias, se presentan filtraciones y malos olores que afectan a la comunidad y provocan contaminación del asfalto y material instalado.

Se solicita al contratista tomar las medidas de contingencia con el fin de recuperar el atraso en la ejecución de obra, ya que a la fecha supera el 5%.

Residente de obra

Powered by CamScanner

25 febrero 2023. Estado del tiempo, fresco se dio el día
Personal de obra. Oficiales, Ayudantes, Topografo, Operador
mini, Operador Retro, Operador Vibro, Operador Volqueta, sin
Novedades.
• Se realiza la recolección de rayo entre las abscisas
Km 285 hasta Km 270 - 265, se solicita al
contratista realizar el sello del mismo y
avanzar en el tramo corto de la abscisa Km 270
para evitar empozamientos en caso de ocurrir
lluvias el fin de semana
Se solicita al contratista entregar guantes de
cuero para la manipulación del rajón y la
entrega de notas de pagados por el trabajo en
el patio y en caso de fugas o daños en las
redes de acueducto a subcontratos.
Se solicita al contratista hacer los excelsos
de protección en los postes de fo'ed de
comunicaciones Telefonica - Movistar que presenta
el posible volcamiento de los mismos.

• Se solicita al contratista tomar las medidas de
contingencia que permitan mejorar el rendimiento
de obra, ya que a la fecha se presenta un
atraso superior al 5%.

Ing. Residente de Interventoría.

Se aclara nuevamente que los trabajadores
cuentan con sus guantes de carnaza para la
manipulación de rayón.
Se han tomado las medidas preventivas para
los cables de red de comunicación, los cual

NKB

Powered by CamScanner

se clavaron un poco y a que se encontraban muy bajos.

Andrés Power

7/feb/23 Tiempo Seco todo el día.

Personal en Obra Oficiales, Ayudantes, operador mini, operador retro, operador Volqueta, SISO.

Se realiza retiro de falla en la abscisa K0+040 a la abscisa K0+315, se realiza el mejoramiento, se encuentra presencia de agua en la subrasante, lo cual se le consulta al interventor y este indica que toca retirarlo completamente lo que genera una sobreexcavacion de 50 cm, y esto se estabiliza con rajón.

Andrés Power.

8/feb/2023 Tiempo seco todo el día.

Personal en Obra: Oficiales, Ayudantes, Operador retro, operador mini, Operador volqueta, SISO.

Se realiza estabilización del terreno en la abscisa K0+280 a la abscisa K0+270, se deja con rajón y su sello en B-200 completado, se realizo comite de Obra.

Powered by CamScanner

J. PACHON S.A.S
NIT: 900.298.031-2

Certificado No. 019-23
Fecha de emisión Febrero 28 de 2023

CERTIFICADO DE GESTION DE RESIDUOS

J PACHON S.A.S

NIT 900.298.031-2
Gestor final de RCD

DATOS BASICOS DEL GESTOR RCD			
No. Registro car	006	Gestor	Disposición final
Nombre o razón social	J PACHON SAS	Nit	900.298.031-2
Nombre establecimiento	Sitio de Disposición Final RCD – Campoalegre bajo		
Representante legal	Sarah Marcela Pachón Melo		
Dirección	Calle 16 No. 12 – 07	Ciudad	Fusagasugá
Teléfono	3156864422	Email	ambiental@jpachon.net

CERTIFICA

Realizo la disposición final de residuos de construcción y demolición RCD presentados por:

DATOS BASICOS DEL GENERADOR				
Número único asignado por parte de la autoridad ambiental				
Nombre o razón social	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS		Nit	900.119.570-4
Representante legal	WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO			
Dirección de domicilio	CL 73 20 A 66		Ciudad	Bogotá
Teléfono	8052595	Email	Ingresidente1@caipro.com.co	
Nombre del proyecto	Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida de las palmas y la calle 17b			
Dirección	Carrera 17 entre avenida de las palmas y la calle 17B		Ciudad	Fusagasugá

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	m^3	t
Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno	329	306
Productos de cimentaciones y pilotajes		
Pétreos		
Total	329	306
Fecha de recepción de los RCD	Del 16 al 28 de febrero de 2023	

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2023.

En constancia firma

CERTIFICADO
J PACHON S.A.S.
NIT 900.298.031-2

SARAH MARCELA PACHON MELO
Representante Legal Suplente
J PACHON S.A.S.
NIT 900.298.031-2

QR verificación autenticidad

Powered by CamScanner

J. PACHON S.A.S
NIT: 900.298.031-2

Certificado No. 013-23
Fecha de emisión Febrero 15 de 2023

CERTIFICADO DE GESTION DE RESIDUOS

J PACHON S.A.S

NIT 900.298.031-2
Gestor final de RCD

DATOS BASICOS DEL GESTOR RCD			
No. Registro car	006	**Gestor**	Disposición final
Nombre o razón social	J PACHON SAS	**Nit**	900.298.031-2
Nombre establecimiento	Sitio de Disposición Final RCD – Campoalegre bajo		
Representante legal	Sarah Marcela Pachón Melo		
Dirección	Calle 16 No. 12 – 07	**Ciudad**	Fusagasugá
Teléfono	3156864422	**Email**	ambiental@jpachon.net

CERTIFICA

Realizo la disposición final de residuos de construcción y demolición RCD presentados por:

DATOS BASICOS DEL GENERADOR				
Número único asignado por parte de la autoridad ambiental				
Nombre o razón social	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS		**Nit**	900.119.570-4
Representante legal	WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO			
Dirección de domicilio	CL 73 20 A 66		**Ciudad**	Bogotá
Teléfono	8052595	**Email**	Ingresidente1@caipro.com.co	
Nombre del proyecto	Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida de las palmas y la calle 17b			
Dirección	Carrera 17 entre avenida de las palmas y la calle 17B		**Ciudad**	Fusagasugá

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	m^3	t
Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno	455	419,7
Productos de cimentaciones y pilotajes		
Pétreos		
Total	**455**	**419,7**
Fecha de recepción de los RCD	Del 1 al 15 de febrero de 2023	

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de febrero del año 2023.

En constancia firma,

CERTIFICADO J PACHON S.A.S. NIT 900.298.031-2

SARAH MARCELA PACHON MELO
Representante Legal Suplente
J PACHON S.A.S.
NIT 900.298.031-2

QR verificación autenticidad

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44254

FECHA: 10 | feb | 23 PLACA: SAT 992

HORA: VALOR: 343.000

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44255

FECHA: 10 | feb | 23 PLACA: SMB 483

HORA: VALOR: 343.000

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44253

FECHA: 10 | feb | 23 PLACA: SMB 483

HORA: VALOR: 343.000

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44252

FECHA: 10 | feb | 23 PLACA: WJC 070

HORA: VALOR: 343.000

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44251

FECHA: 10 | feb | 23 PLACA: [illegible]

HORA: VALOR: 345.000

TIPO: SENCILLA X DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44301

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: EMM182

HORA: VALOR: 43.200

TIPO: SENCILLA DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44273

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: [illegible]

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA X DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900[illegible]

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44272

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: [illegible]

HORA: VALOR: 45.200

TIPO: SENCILLA X DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900[illegible]

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44271

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: FBC 285

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Capro

NIT: 900119570

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE:

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44270

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: FBC 285

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Capro

NIT: 900119570

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE:

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44269

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: FBC 285

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Capro

NIT: 900119570

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE:

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44268

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: FBC 285

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Capro

NIT: 900119570

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE:

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

VERIFICADO

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44287

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: TEA180B3

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipio

NIT 900119370

TEL. ONO

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44289

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: WAA042

HORA: VALOR: $43.200 4%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipio

NIT 900119370

TELÉFONO

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44290

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: WAA042

HORA: VALOR: $43.200 4%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipio

NIT 900119370

TELÉFONO

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44291

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: WAA043

HORA: VALOR: $43.200 4%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipio

NIT 900

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44294

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: AFA 813

HORA: VALOR: $43.200 -40%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t) [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipro

NIT: 900119370

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE:

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44292

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: AFA 813

HORA: VALOR: $43.200 -40%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t) [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipro

NIT: 900119370

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE: RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44293

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: AFA 813

HORA: VALOR: $43.200 -40%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t) [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipro

NIT: 900119370

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE: RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44279

FECHA: 11 | Feb | 23 PLACA: SM 182

HORA: VALOR: $43.200 -40%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t) [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipro

NIT: 900119370

TELÉFONO:

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE: RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD:

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44278

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: ZIM 182

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipro

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44277

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA:

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipro

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44276

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: ZIM 182

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipra

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44275

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: ZIM 182

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipro

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44267

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA:

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t):

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119390

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44298

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: 020

HORA: VALOR: $43.200 -4%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t):

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119390

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44297

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: 020

HORA: VALOR: $43.200 -4%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t):

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119390

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44296

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA:

HORA: VALOR: $43.200 -4%

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t):

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119390

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44295

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: 020

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO RIFCAB

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44266

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: WXJ 020

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44265

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA:

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44264

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: WXJ 020

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44284

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SHB 483

HORA: VALOR: 43.200 -4%

TIPO: SENCILLA X DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipo

NIT SHB 483

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44283

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SHB 483

HORA: VALOR: 43.200 -4%

TIPO: SENCILLA X DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipo

NIT 900

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44282

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SHB 483

HORA: VALOR: 43.200 -4%

TIPO: SENCILLA X DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipo

NIT 900119376

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44281

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SHB 483

HORA: VALOR: 43.200 -4%

TIPO: SENCILLA X DOBLE TROQUE PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipo

NIT 900119376

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44280

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SMB483

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Cairo

NIT: 900 RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44274

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA:

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Cairo

NIT: 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44299

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: TDA 792

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Cairo

NIT: 900119 RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44300

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: TDA 792

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

NIT: 900119570

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

Powered by CamScanner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44286

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SQA 992

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44288

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SQA 992

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44285

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SQA 992

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44263

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SQA 992

HORA: VALOR: 343.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Carpio

NIT

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

Powered by Cam5canner

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44261

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SQA 992

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipio

NIT: 900[illegible]

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44262

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SQA 992

HORA: VALOR: $43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caipio

NIT: 900[illegible]

TELÉFONO

FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CAMPOALEGRE BAJO



COMPROBANTE DE DESCARGUE: 44260

FECHA: 11 | feb | 23 PLACA: SQA 992

H : VALOR: 43.200

TIPO: SENCILLA [X] DOBLE TROQUE [ ] PESO (t)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAIPIO

NIT: 900[illegible]

TELÉFONO


FECHA INGRESO CAMPOALEGRE

DIRECCIÓN DE GENERACIÓN RCD

RCD CAMPOALEGRE BAJO VERIFICADO

Powered by CamScanner

Id	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	Co.	Costo real
1	**mar 10/01/2**	**mié 10/05/2**		**13%**	**$ 1.066.057.301,00**	**$ 44.249.897,59**
2	**mar 10/01/2**	**jue 23/03/23**		**47%**	**$ 299.177.668,43**	**$ 38.929.656,83**
3	mar 10/01/23	lun 30/01/23		100%	$ 0,00	$ 0,00
4	mar 31/01/2	jue 9/02/23	3	90%	$ 14.341.745,59	$ 12.907.571,03
5	mar 31/01/2	jue 9/02/23	4FF	90%	$ 11.230.016,00	$ 10.107.014,40
6	jue 2/02/23	vie 10/02/23	4CC+2 días	60%	$ 25.851.033,00	$ 15.510.619,80
7	vie 17/02/23	mar 21/02/2	14	0%	$ 9.236.057,00	$ 0,00
8	mié 22/02/2	jue 2/03/23	7	0%	$ 45.091.292,00	$ 0,00
9	vie 3/03/23	lun 13/03/23	8	0%	$ 44.124.960,60	$ 0,00
10	mar 14/03/2	mié 15/03/23	9;15;16	0%	$ 4.112.125,50	$ 0,00
11	jue 16/03/23	vie 17/03/23	10	0%	$ 66.126.511,00	$ 0,00
12	lun 20/03/23	mar 21/03/2	11	0%	$ 2.054.566,50	$ 0,00
13	mié 22/03/2	jue 23/03/23	12	0%	$ 58.821.464,00	$ 0,00
14	lun 13/02/23	jue 16/02/23	6	60%	$ 674.086,00	$ 404.451,60
15	vie 24/02/23	jue 2/03/23	8CC+2 días	0%	$ 635.437,36	$ 0,00
16	jue 23/02/23	mié 1/03/23	8CC+1 día	0%	$ 16.878.373,88	$ 0,00
17	**vie 10/02/23**	**mar 4/04/23**		**3%**	**$ 299.177.668,43**	**$ 2.557.176,16**
18	vie 10/02/23	mar 21/02/2	4	10%	$ 14.341.745,59	$ 1.434.174,56
19	vie 10/02/23	mar 21/02/2	18CC	10%	$ 11.230.016,00	$ 1.123.001,60
20	mar 14/02/2	mié 22/02/2	18CC+2 días	0%	$ 25.851.033,00	$ 0,00
21	mié 1/03/23	vie 3/03/23	28	0%	$ 9.236.057,00	$ 0,00
22	lun 6/03/23	mar 14/03/2	21	0%	$ 45.091.292,00	$ 0,00
23	mié 15/03/2	jue 23/03/23	22	0%	$ 44.124.960,60	$ 0,00
24	vie 24/03/23	lun 27/03/23	23;29;30	0%	$ 4.112.125,50	$ 0,00
25	mar 28/03/2	mié 29/03/2	24	0%	$ 66.126.511,00	$ 0,00
26	jue 30/03/23	vie 31/03/23	25	0%	$ 2.054.566,50	$ 0,00
27	lun 3/04/23	mar 4/04/23	26	0%	$ 58.821.464,00	$ 0,00
28	jue 23/02/23	mar 28/02/2	20	0%	$ 674.086,00	$ 0,00
29	jue 9/03/23	mié 15/03/2	22CC+3 días	0%	$ 635.437,36	$ 0,00
30	lun 6/03/23	vie 10/03/23	22CC	0%	$ 16.878.373,88	$ 0,00
31	**mié 22/02/2**	**jue 20/04/23**		**3%**	**$ 325.854.521,14**	**$ 2.763.064,60**
32	mié 22/02/2	vie 24/02/23	18	90%	$ 2.446.182,00	$ 2.201.563,80
33	lun 27/02/23	jue 9/03/23	32	0%	$ 14.341.745,59	$ 0,00
34	lun 27/02/23	jue 9/03/23	33CC	5%	$ 11.230.016,00	$ 561.500,80
35	jue 2/03/23	vie 10/03/23	33CC+3 días	0%	$ 25.851.033,00	$ 0,00
36	vie 17/03/23	mar 21/03/2	45	0%	$ 9.236.057,00	$ 0,00
37	mié 22/03/2	jue 30/03/23	36	0%	$ 45.091.292,00	$ 0,00
38	vie 31/03/23	lun 10/04/23	37	0%	$ 53.538.285,53	$ 0,00
39	mar 11/04/2	mié 12/04/2	38;54	0%	$ 4.112.125,50	$ 0,00
40	jue 13/04/23	vie 14/04/23	39	0%	$ 66.126.511,00	$ 0,00

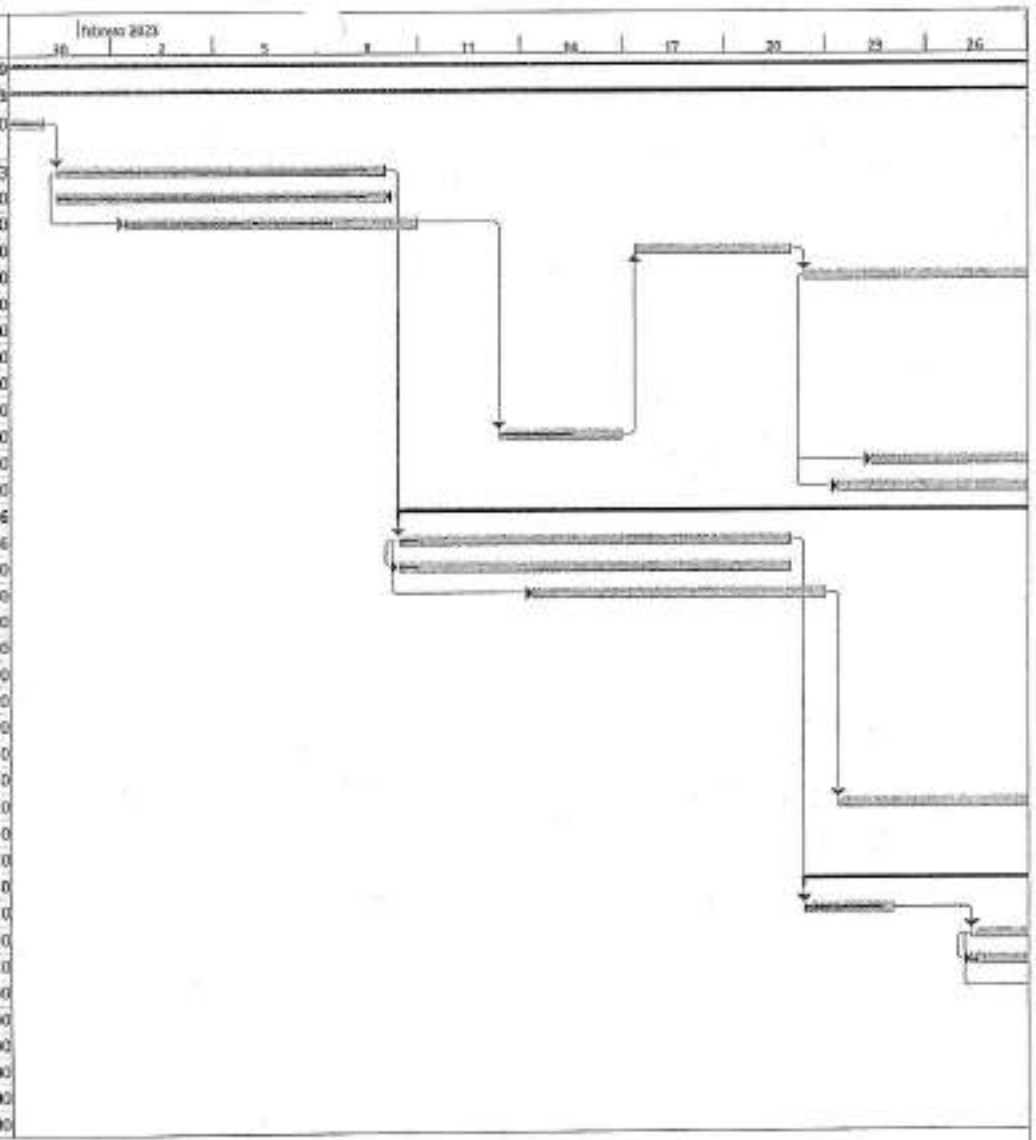

Proyecto: CRONOGRAMA POR
Fecha: dom 2/04/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	C.	Costo real
41	lun 17/04/23	mar 18/04/23	40	0%	$ 2.054.566,50	$ 0,00
42	mié 19/04/23	jue 20/04/23	41	0%	$ 58.821.464,00	$ 0,00
43	jue 2/03/23	vie 3/03/23	35CC	0%	$ 1.869.819,00	$ 0,00
44	lun 6/03/23	mar 7/03/23	43	0%	$ 1.292.403,00	$ 0,00
45	lun 13/03/23	jue 16/03/23	35;44	0%	$ 674.086,00	$ 0,00
46	vie 31/03/23	mié 5/04/23	37	0%	$ 5.262.416,00	$ 0,00
47	vie 31/03/23	mié 5/04/23	37	0%	$ 16.938.840,00	$ 0,00
48	vie 17/03/23	mar 28/03/23	45	0%	$ 263.845,00	$ 0,00
49	mié 22/03/23	mié 29/03/23	48CC+3 días	0%	$ 2.533.725,00	$ 0,00
50	mié 22/03/23	vie 24/03/23	48CC+3 días	0%	$ 641.906,00	$ 0,00
51	mié 22/03/23	vie 24/03/23	48CC+3 días	0%	$ 638.687,00	$ 0,00
52	mié 22/03/23	vie 24/03/23	48CC+3 días	0%	$ 104.450,00	$ 0,00
53	lun 27/03/23	mié 29/03/23	48CC+6 días	0%	$ 2.309.088,00	$ 0,00
54	vie 24/03/23	jue 30/03/23	37CC+2 días	0%	$ 476.578,02	$ 0,00
55	**mié 29/03/23**	**mié 10/05/23**		**0%**	**$ 141.847.443,00**	**$ 0,00**
56	vie 21/04/23	mar 25/04/23	42;27;13	0%	$ 60.763,00	$ 0,00
57	vie 21/04/23	mié 26/04/23	42;27;13	0%	$ 1.845.377,00	$ 0,00
58	vie 21/04/23	mié 26/04/23	42;27;13	0%	$ 3.752.750,00	$ 0,00
59	vie 21/04/23	mié 26/04/23	42;27;13	0%	$ 29.941.507,00	$ 0,00
60	jue 27/04/23	mié 3/05/23	59	0%	$ 40.111.908,00	$ 0,00
61	vie 21/04/23	mié 26/04/23	42;27;13	0%	$ 4.063.750,00	$ 0,00
62	mié 29/03/23	lun 3/04/23	48	0%	$ 2.677.493,00	$ 0,00
63	mié 29/03/23	lun 3/04/23	48	0%	$ 3.557.689,00	$ 0,00
64	jue 27/04/23	mié 3/05/23	61	0%	$ 21.205.163,00	$ 0,00
65	mié 29/03/23	lun 10/04/23	48	0%	$ 6.978.913,00	$ 0,00
66	vie 21/04/23	jue 27/04/23	42;27;13	0%	$ 17.961.919,00	$ 0,00
67	vie 28/04/23	jue 4/05/23	66	0%	$ 6.701.085,00	$ 0,00
68	vie 21/04/23	jue 27/04/23	42;27;13	0%	$ 1.478.145,00	$ 0,00
69	vie 5/05/23	mié 10/05/23	67	0%	$ 1.510.981,00	$ 0,00

Febrero 2023: 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26

Proyecto: CRONOGRAMA POR
Fecha: dom 2/04/23

Tarea | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Progreso | Progreso manual

Resumen del proyecto | Hito

ANEXOS No. 1

- *Comités de seguimiento de obra.*

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0758 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 178 COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra — Fecha: 07/02/2023 Página 1 de 3 COMITÉ DE OBRA No 4	FUSAGASUGÁ — gente

Asistentes	Empresa	Firma
Andrea Alba	Alcaldía Municipal de Fusagasugá – Secretaria de Infraestructura - Dirección de Valorización	
Hugo Leonardo Molano Bolívar	Alcaldía Municipal de Fusagasugá – Secretaria de Infraestructura - Dirección de Valorización	
Javier Hernando Perilla Vacca	CAIPO Constructores S.A.S – director de Obra	
Fredy Samuel Rondón Mora	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente de Interventoría	
Andrés Felipe Páez Cañón	CAIPO Constructores S.A.S – Residente de Obra	
Álvaro Espinosa	CAIPO Constructores S.A.S – Profesional PGIO	
Francisco Marrugo	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente de Interventoría 1	
Fabio Merck Ramírez Poveda	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente Ambiental y SST Profesional PGIO	
William Francisco Lizarazo Mendivelso	MIRS Latinoamérica S.A.S – Profesional Social	
Jesús Ramón Jácome Ordoñez	MIRS Latinoamérica S.A.S – Director de Interventoría	

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra | Fecha: 07/02/2023 Página 2 de 3 COMITÉ DE OBRA No 4	FUSAGASUGÁ

N°	ASUNTO A TRATAR	Fecha de Compromiso
	Siendo las 10:00 am se inicia el recorrido de obra con el personal arriba firmante	
1	La interventoría solicita al contrista realizar la entrega de las actas de vecindad levantadas a la fecha del tramo 1, de igual manera perfeccionar el acta de entorno de acuerdo con la información recolectada durante el recorrido del día 01/02/2023 y su debida entrega.	1 Actas de entorno y vecindad 14/02/2023
2	El contratista realizó la instalación del respectivo cerramiento de obra y la instalación e implementación de la señalización de obra de acuerdo con el Plan de manejo de tránsito PMT para el tramo 1, sin embargo, con el fin de proteger las zonas verdes y de jardín peatonal se recomienda al contratista instalar lona azul de malla que permita la protección de las plantas propiedad de los residentes.	2
3	Se recomienda al contratista realizar la instalación de señalización informativa de cerramiento de la calle 17, la cual es usada por los habitantes de la zona norte y por todos aquellos que se desplazan por la avenida las palmas para conectar con la entrada a la universidad de Cundinamarca y evitar el congestionamiento de transito por la vía transversal 12, el contratista manifiesta que realizara la revisión de esta actividad para su ejecución.	3 compromiso de entrega 06/02/2023
4	El contratista realizo la entrega a la interventoría de la programación actualizada en MS PROJECT la cual contiene la nueva forma de ejecutar las actividades mediante el desarrollo de 3 frentes de obra, esta fue remitida solicita mediante el oficio **OFCAI-FU-033** de fecha 30 de enero de 2023, una vez terminada las actividades preliminares de topografía se debe realizar la entrega del balance de obra y el flujo de inversión semanal y mensual que permita el seguimiento continuo y eficaz del avance de cada frente de manera independiente, esta actividad tenia como fecha de compromiso de entrega el día 27/01/2023, se solicita realizar la entrega actualizada del flujo de caja.	4 compromiso de entrega 07/02/2023
5	Realizar el acercamiento con el personal administrativo de la Universidad de Cundinamarca y el CAD que permita proveer y tomar las medidas relacionadas con el ingreso del estudiantado y demás personal a cada una de las instalaciones a causa del cierre vial, esta actividad tenía fecha de compromiso el día 31 de enero de 2023 y a la fecha no se ha realizado.	5 compromiso de entrega 07/02/2023
6	La supervisión manifiesta que se debe proceder a realizar la respectiva alerta en caso de presentarse un atraso de ejecución de obra superior al 3%, y segundo requerimiento al 5%.	6
7	Se encuentra a la espera la ejecución de las actividades de retiro de los postes de concreto que hacen parte de la red de comunicaciones de la empresa Movistar.	7
		8

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0778 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 178 COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra | Fecha: 07/02/2023 Página 3 de 3 COMITÉ DE OBRA No 4	ALCALDÍA FUSAGASUGÁ ONIC

8	La interventoría y supervisión solicita realizar el ingreso de los equipos tipo volqueta que garanticen el rendimiento de obra ya que ha la fecha solo se encuentra en campo (1) uno, a la fecha no se ha realizado la entrega de los documentos técnicos de los equipos y sus documentos legales.	
9	La supervisión manifiesta informar a la fecha el estado del avance físico del proyecto con relación a la programación vigente: A la Fecha, de acuerdo con la programación remitida por el contratista de fecha 30/01/2023 mediante el oficio OFCAI-FU-028 "programación Ver4" se encuentra un avance físico de obra aproximado del 0,32%, con un porcentaje programado del 0.44% y una diferencia de atraso del -0,12%, el contratista remitió la programación actualizada mediante el oficio OFCAI-FU-033 del 30 de enero, en la cual manifiesta realizar las obras en tres (3) frentes de obra.	9

Para Constancia de lo Anterior se Firma a los _7_ días del mes de febrero de 2023 en la Ciudad De Fusagasugá siendo las 12:14 pm se da por terminado el comité.

Firmas de todos los asistentes con nombre y número de identificación

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra | Fecha: 14/02/2023 Página 1 de 3 COMITÉ DE OBRA No 6	ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ Centro Poblado Gente Fusagasugá

Asistentes	Empresa	Firma
Andrea Alba	Alcaldía Municipal de Fusagasugá – Secretaría de Infraestructura - Dirección de Valorización	
Hugo Leonardo Molano Bolívar	Alcaldía Municipal de Fusagasugá – Secretaría de Infraestructura - Dirección de Valorización	
Javier Hernando Perilla Vacca	CAIPRO Constructores S.A.S – Director de Obra	
Álvaro Espinosa	CAIPRO Constructores S.A.S – Profesional PGIO	
Andrés Felipe Páez Cañón	CAIPRO Constructores S.A.S – Residente de Obra	
Jesús Ramón Jácome Ordoñez	MIRS Latinoamérica S.A.S – Director de Interventoría	
Francisco Marrugo	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente de Interventoría 1	
Fredy Samuel Rondón Mora	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente de Interventoría 2	
Fabio Merck Ramírez Poveda	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente Ambiental y SST Profesional PGIO	
William Francisco Lizarazo Mendivelso	MIRS Latinoamérica S.A.S – Profesional Social	
Por Fredy Feliz	Caipro - Profesional Social	

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0793 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 176 COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra | Fecha: 14/02/2023 Página 2 de 3 COMITÉ DE OBRA No 6	ALCALDÍA FUSAGASUGÁ Gente FUSAGASUGÁ

N°	ASUNTO A TRATAR	Fecha de Compromiso
	Siendo las 9:00 am se inicia el comité de obra con la participación de los arriba firmantes;	
1	La interventoría solicita al contratista realizar la entrega de las actas de vecindad del tramo 1 levantadas a la fecha, de igual manera ajustar y entregar el acta de entorno de acuerdo con la información recolectada durante el recorrido realizado el día 01/02/2023 y su debida entrega.	1 Actas de vecindad y de entorno 14/02/2023.
2	El contratista realizó la instalación del respectivo cerramiento de obra y la instalación e implementación de la señalización de obra de acuerdo con el plan de manejo de tránsito PMT para el tramo 1, sin embargo, con el fin de proteger las zonas verdes y de jardín peatonal se recomienda al contratista instalar malla azul para protección de las plantas propiedad de los residentes. No se está implementando el control de pare y siga con el paletero para la salida de vehículos en la vía las palmas, el contratista manifiesta que realizará la disposición del personal.	2
3	Se recomienda al contratista nuevamente realizar la instalación de señalización informativa de cerramiento de la calle 17, la cual es usada por los habitantes de la zona norte y por todos aquellos que se desplazan por la avenida Las Palmas para conactar con la entrada a la universidad de Cundinamarca y evitar el congestionamiento de tránsito por la vía transversal 12, el contratista manifiesta que realizará la revisión de esta actividad para su ejecución.	3 compromiso de entrega 06/02/2023
4	El contratista realizó la entrega a la interventoría de la programación actualizada en MS PROJECT mediante el oficio OFCAI-FU-033 de fecha 30 de enero de 2023 la cual propone un nuevo método constructivo de las actividades, adicionalmente, se hizo entrega del flujo de caja del proyecto el día 9 de febrero.	4 compromiso de entrega 09/02/2023
5	Realizar el acercamiento con el personal administrativo de la Universidad de Cundinamarca y el CAD que permita tomar las medidas relacionadas con el ingreso del estudiantado y demás personal a cada una de las instalaciones a causa del cierre vial, esta actividad tenía fecha de compromiso el día 31 de enero de 2023 y a la fecha no se ha realizado, el contratista manifiesta que realizara dicha actividad el día de hoy 14 de febrero de 2023.	5 compromiso de entrega 14/02/2023
6	La supervisión manifiesta que se debe proceder a realizar la respectiva alerta en caso de presentarse un atraso de ejecución de obra superior al 3%, y un segundo requerimiento con un atraso del 5%.	6
7	Se encuentra pendiente por parte de Movistar el retiro de su infraestructura pues interfieren con el desarrollo y seguridad del proyecto, el contratista manifiesta que	7

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
EMIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0758 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra | Fecha: 14/02/2023 Página 3 de 3 COMITÉ DE OBRA No 5	Alcaldía de Fusagasugá Con la fuerza de la gente Fusagasugá

	realizará y tomará las medidas pertinentes y preventivas con el fin de evitar algún tipo de afectación.	
8	La supervisión manifiesta informar a la fecha el estado del avance físico del proyecto con relación a la programación vigente: A la Fecha, de acuerdo con la programación remitida por el contratista se encuentra un avance físico de obra aproximado del 3,19 %, con un porcentaje programado del 3,75% y una diferencia de atraso del -0,57%. Se presenta atraso en el inicio de actividades del frente 2 el cual, según la programación, tenía fecha de inicio de actividades de excavación el día 10 de febrero de 2023 sobre la abscisa K0+280, se solicita al contratista realizar la contingencia que permita el avance de las obras y se prevenga posibles atrasos en la ejecución de las mismas.	8 Informar a la Supervisión.
9	Se realiza recorrido en acompañamiento del profesional de acueducto de la empresa EMSERFUSA ESP, para identificar las actividades requeridas para realizar el traslado de la tubería de acueducto 4" en PVC, encontrada en la zona del trazado vial. En este sentido, se acuerda entre las partes que CAIPRO realizará la excavación requerida para el traslado durante esta semana.	9 21/02/2023
10	Se realiza un apique sobre el andén de la avenida Las Palmas para verificar la profundidad de la red de acueducto principal, encontrándola a -15cm respecto al nivel de la avenida, por lo cual, se requerirá profundización de la tubería en ese punto.	10
11	EMSERFUSA ESP manifiesta tener la disponibilidad de material para realizar el traslado de la tubería de 4" en coordinación con CAIPRO, para lo que se solicita que el contratista realice la implantación de la vía con andenes, niveles de rasante, y excavado la zanja requerida.	11
12	Una vez remitido el ajuste al diseño geométrico se solicita al contratista realizar el replanteo con el fin de determinar las afectaciones a las redes de acueductos presentes en el corredor nuevo.	12
13	Ante los daños que ha realizado el contratista CAIPRO a las acometidas de alcantarillado, la supervisión solicita tomar las medidas preventivas y correctivas correspondientes, el residente de obra manifiesta haber realizado el llamado de atención al operador de maquinaria.	13

Para Constancia de lo Anterior se Firma a los _14_ días del mes de febrero de 2023 en la Ciudad de Fusagasugá siendo las 10:45 am, se da por terminado el comité.

Firmas de todos los asistentes con nombre y número de identificación

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS LATINOAMERICA S.A.S	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 178 COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra | Fecha: 21/02/2023 Página 1 de 3 COMITÉ DE OBRA No 6	

Asistentes	Empresa	Firma
Andrea Alba	Alcaldía Municipal de Fusagasugá – Secretaria de Infraestructura - Dirección de Valorización	
Hugo Leonardo Molano Bolivar	Alcaldía Municipal de Fusagasugá – Secretaria de Infraestructura - Dirección de Valorización	
Javier Hernando Perilla Vacca	CAIPO Constructores S.A.S – Director de Oba	
Andrés Felipe Páez Cañón	CAIPO Constructores S.A.S – Residente de Obra	
Jesús Ramón Jácome Ordoñez	MIRS Latinoamérica S.A.S – Director de Interventoria	
Fredy Samuel Rondón Mora	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente de Interventoria 2	
Fabio Merck Ramírez Poveda	MIRS Latinoamérica S.A.S – Residente Ambiental y SST Profesional PGIO	
Ing. Edgar Tellez	CAIPO Constructores SAS – Social	

N°	ASUNTO A TRATAR	Fecha de Compromiso

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0758 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.	ALCALDÍA FUSAGASUGÁ gesta FUSAGASUGÁ
	Lugar: Sitio de la obra — Fecha: 21/02/2023 Página 2 de 3	
	COMITÉ DE OBRA No 5	

	Siendo las 10:00 am se inicia el comité de obra con la participación de los arriba firmante y recorrido previo.	
1	La Interventoría solicita al contrista realizar la entrega de las actas de vecindad levantadas a la fecha del tramo 1, de igual manera perfeccionar el acta de entorno de acuerdo con la información recolectada durante el recorrido del día 01/02/2023 y su debida entrega, se realizan observaciones por el profesional social de interventoría el día 17 de febrero, el contratista manifiesta que realizara la entrega de las mismas el día 22 de febrero, se solicita agilizar el levantamiento de las actas de vecindad del tramo 2.	1 Actas de entorno y vecindad 22/02/2023
2	El contratista realizó la instalación del respectivo cerramiento de obra y la instalación e implementación de la señalización de obra de acuerdo con el Plan de manejo de tránsito PMT para el tramo 1, con el fin de proteger las zonas verdes y de jardín peatonal se recomienda al contratista instalar lona azul de malla que permita la protección de las plantas propiedad de los residentes y sus viviendas,	2
3	Se solicita al contratista realizar la entrega de los APU aprobados en medio físico y magnético debidamente firmado, junto con lo ítems no previstos NP con su respectiva justificación, una vez esta debe realizarse el balance actualizado.	3 compromiso de entrega 22/02/2023
4	Realizar el acercamiento con el personal administrativo de la Universidad de Cundinamarca y el CAD mediante oficio radicado que permita a la institución universitaria tomar las medidas y acciones que faciliten el ingreso del estudiantado y demás personal, esta actividad tenía fecha de compromiso el día 31 de enero de 2023 y del 7 de febrero de 2023 y a la fecha no se ha realizado, el contratista manifiesta que realizara dicha actividad el día de hoy 14 de febrero de 2023, esta actividad no se ha realizado	4 compromiso de entrega 24/02/2023
5	Se solicita al contratista realizar la revisión y aplicación de la resolución 1257 de 2021 que hace relación al manejo de RCD (residuos de construcción y demolición)	5
6	Se solicita al contratista realizar la debida reparación de las domiciliarias que han sido dañadas durante el proceso de excavación, se debe presentar la respectiva relación y una vez realizada su reparación realizar la entrega del debido informe que contenga como soporte el registro fotográfico de la actividad ejecutada.	6
7	Se solicita al contratista realizar la entrega de un informe de localización topográfica con su respectivo abscisado de los postes de la red de comunicaciones propiedad de Telefónica Movistar, con el fin de avanzar en el procedimiento de solicitud de traslado de redes por parte de esta empresa prestadora de servicio público, se solicita al contratista nuevamente tomar las medidas de prevención y contingencia durante el proceso de excavación que evite el posible volcamiento de los postes y la red instalada en el proyecto.	7

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A.S LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de la obra. Fecha: 21/02/2023 Página 3 de 3 COMITÉ DE OBRA No 6	ALCALDÍA FUSAGASUGÁ Concejo Distrital de Gente FUSAGASUGÁ

8	La interventoría informa a la fecha el estado del avance físico del proyecto con relación a la programación vigente: A la Fecha, de acuerdo con la programación remitida por el contratista de fecha 30/01/2023 mediante el oficio OFCAI-FU-033, se encuentra un avance físico de obra aproximado del 5,63 %, con un porcentaje programado del 8,62% y una diferencia de atraso del 2,99%. Se presenta atraso en el inicio de actividades del frente 2 el cual tenia según la programación fecha de inicio de actividades de excavación el día 10 de febrero de 2023 en la abscisa K0+280, se solicita al contratista realizar la contingencia que permita el avance de las obras y se prevenga posibles atrasos en la ejecución de las mismas.	8
9	La interventoría solicita la implementación del PIGO durante la ejecución del proyecto junto con el debido archivo en físico de los documentos que hacen parte del mismo.	9
10	El contratista manifiesta que se a presentado atraso en la ejecución de las labores de obra debido a la implementación de los diseños con relación a los niveles de terminado de vía, el director expresa que a partir del día 17 de febrero se ha visto afectada las actividades de excavación por fuertes lluvias presentadas durante la noche de los días 17, 18, 19, 20 de febrero.}, además debido a estas lluvias la recepción de material de excavación no esta siendo recibido en la escombrera aprobada.	10

Para Constancia de lo Anterior se Firma a los _21_ días del mes de febrero de 2023 en la Ciudad De Fusagasugá siendo las 12:30 pm se da por terminado el comité.

Firmas de todos los asistentes con nombre y número de identificación

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A. LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio obra | Fecha: 28/Feb/23 Página de COMITÉ DE OBRA No. 7	ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ gente FUSAGASUGÁ

Asistentes	Empresa	Firma
Jesus Ricardo Ortiz	Director Interventoría – MIRS –	
Fredy Samuel Rodón Lira	Residente de Interventoría.	
Oscar Mauricio Vargas L.	Supervisor Apoyo. Alcaldía.	
Andrea J. Alba Torres	Sec. Infraestructura	
Victor Giovanny Herrera R.	Secr. Infraestructura	
Hugo Leonardo Molano Soliz	Sec. Infraestructura	
Liz Mark Ramos	Interventoría. SST MA-9160	
Andrés Felipe Pérez	Residente de Obra	
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA	DIRECTOR DE OBRA	
Flor Enid Fetlet.	P. Social	

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
MIRS S.A. LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio obra Fecha: 28-02-23 Página de COMITÉ DE OBRA No. 7	ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ Con la fuerza de la gente FUSAGASUGA

N°	ASUNTO A TRATAR	Fecha de Compromiso
①	Entrega actas de vecindad Tramo 1 y 4 de entorno, fecha de entrega 22/02/2023.	cumplido
②	Entrega de APU contractuales firmados por parte del contratista y presentación de los APU NP - Entrega 22/02/2023	No se ha cumplido Entrega 01-03-23
③	Entrega de la programación vigente por parte de la interventoría a la supervisión del proyecto en medio físico.	03-03-2023
④	Entrega en medio físico de la programación anterior y vigente en original y copia del contratista a la interventoría	01-03-2023
⑤	Entrega de Informe de Infraestructura de red matriz con abscisado y cantidad para tramite interno de la alcaldía	No se ha cumplido 01-03-2023
⑥	Reparación de las domiciliarias por parte del contratista dañadas durante el proceso de excavación; desde hoy se inicia con excavación manual para evitar daños futuros, esto afecta los rendimientos del proyecto. Se deben tomar las medidas ambientales de manejo pertinentes.	No se ha cumplido 07-03-2023
⑦	Dar respuesta al oficio de Emserfusa 140-0-078 de 2023 y de interventoría MIRS-FUSA-2023 - de 2023.	08-03-2023

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
EMIRSA LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 173 COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio de Obra | Fecha: 28-02-23 | Página de COMITÉ DE OBRA No. 7	Con la gente Fusagasugá

(8)	% avance programado % % avance ejecutado Físico: 11.21 %. | 5.63 %. Financiero: $161.339.484,00 | 81.109.791,00	
	Semana 7 del proyecto, se presenta un atraso del 5.57 %, se solicita al contratista presentar un plan de contingencia para desarrollarse en la programación, sin interrumpir o demorar las actividades programadas por frente.	06-03-2023
(9)	Mano de obra a través del conducto regular entre los residentes de obra e interventoría, las observaciones o requerimientos se harán o dejaran en la bitacora.	continuo.
(10)	La señalización de la obra (PMT) se deben revisar y deben cumplir con la normatividad vigente. revisar distancias de instalación respecto al inicio de los trabajos, estos deben avisar con tiempo el inicio de las actividades, ver manual de señalización - IPIRAS -.	continuo
(11)	Entrega frente 4 a nivel determinado Abscisa 0+430 a 0+280.	4-03-2023

Para Constancia de lo Anterior se Firma a los _____ dias del mes de _____ de 2023
en la Ciudad de Fusagasugá siendo las _____, se da por terminado el comité.

Firmas de todos los asistentes con nombre y número de identificación

Powered by CamScanner

EMPRESA	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CLIENTE
EMIRS S.A. LATINOAMERICA	CONTRATO No 2022-0798 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 178 COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. Lugar: Sitio Obra Fecha: 28-2-2023 Página de COMITÉ DE OBRA No. 7	ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ Comité Auxiliar de la gente Fusagasugá

N°	ASUNTO A TRATAR	Fecha de Compromiso
	Administrativo:	
(1)	Entrega de informe mensual de obra de Enero 10 a 31 de 2023 y de Febrero 01 a 28 de 2023; compromiso contratista 03-03-2023 Entrega interventoria a la Supervision 10-03-2023	03-03-2023 y 10-03-2023
(2)	Entrega APU firmado y AIU.	01-03-2023
(3)	Entrega programación en Físico.	03-03-2023
(4)	Informes PGIO y PGS se radica via email por parte de la interventoria a la supervisión. Se solicita la radicación en físico de toda la documentación inicial del proyecto a la supervisión.	01-03-2023 y 07-03-2023.
(5)	Presentar el balance del proyecto con corte a 28 de febrero de 2023, incluyendo los APU AIU que se han identificado	07-03-2023
(6)	Se eleva consulta a la supervisión x la modificación de la forma de pago de la interventoria.	

Powered by CamScanner

ANEXOS No. 2

- *Correspondencia enviada por CAIPRO.*

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 09 de febrero de 2023

OFCAI-FU-036

MIRS LATINOAMERICANA S.A.S.
ING. JESÚS RAMÓN JÁCOME
Director de interventoria

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Entrega flujo de caja y cronograma corregidos.

Cordial saludo.

Hacemos entrega de la corrección del cronograma y flujo de caja correspondientes al contrato de la referencia, de acuerdo con los lineamientos solicitados en el oficio MIRS-FUSA-017-2022.

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Ing. Andrés Páez- Residente de Obra
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 15 de febrero de 2023

OFCAI-FU-037

MIRS LATINOAMERICANA S.A.S.
ING. JESÚS RAMÓN JÁCOME
Director de interventoría

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Entrega Actas de Vecindad de inicio del tramo 1.

Cordial saludo.

Hacemos entrega de 24 actas de vecindad de inicio que corresponden al tramo 1 y a las bocacalles de la obra, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Flor Enid Téllez- Profesional social
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 15 de febrero de 2023

OFCAI-FU-038

MIRS LATINOAMERICANA S.A.S.
ING. JESÚS RAMÓN JÁCOME
Director de interventoría

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Entrega del Plan de Gestión Social.

Cordial saludo.

Hacemos entrega del Plan de Gestión Social, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Flor Enid Téllez- Profesional social
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052593 Móvil: 300 7978855 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 21 de febrero de 2023

OFCAI-FU-039

MIRS LATINOAMERICANA S.A.S.
ING. JESÚS RAMÓN JÁCOME
Director de interventoría

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Trámite traslado de redes y retiro postes Movistar.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta los requerimientos de avance del contrato de la referencia, solicitamos se realice el trámite por parte de MOVISTAR o de quien corresponda, para el retiro de los postes y traslado de las redes que se encuentran en el costado norte de la vía en mención ya que se puede presentar inconvenientes de estabilidad de los mismos por los trabajos de excavación y conformación que debemos ejecutar en sus alrededores.

En reunión sostenida con el analista STC de Movistar Didier García el día 17 de enero de 2023, se nos informo que en la semana posterior a esta reunión se iniciaba el traslado de redes y el retiro de los postes, actividades que a hoy no se han realizado.

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Ing. Andrés Páez- Residente de Obra
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 21 de febrero de 2023

OFCAI-FU-040

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL
Calle 6 N° 6 – 24 Centro Administrativo Municipal
Fusagasugá - Cundinamarca

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Cambio Representante Legal

Cordial saludo,

Adjuntamos nota y documentos soportes del cambio de Representante Legal de CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. con NIT 900.119.570-4 para los trámites correspondientes.

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Copia: MIRS LATINOAMERICA S.A.S. – Interventor

Realizó: Ing. Andrés Páez- Residente de Obra
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES

Bogotá D.C, 07 de febrero de 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
Calle 6 No 6-24 Centro Administrativo Municipal
Fusagasugá Cundinamarca

Asunto: Comunicación de novedad administrativa.
Ref. Contrato de Obra No LP 2022-0631- Objeto: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

Cordial saludo, a través de la presente y de forma respetuosa nos permitimos informar que mediante documento allegado a la cámara de comercio se procedió a la modificación del representante legal de la empresa **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S** identificada con NIT. 900.119.570-4, siendo designada como nueva gerente la señora **ELIZABETH CAINA DELGADO** identificada con C.C. 40.037.628, adicional a esta situación administrativa fue designado como subgerente el señor **WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO** identificado con C.C 79.794.193, por lo anterior y únicamente en caso de requerirlo la entidad, se informa la anterior situación administrativa para todos los efectos legales y administrativos del contrato que se encuentra vigente, así mismo se indica que de conformidad con los estatutos internos el representante legal suplente cuenta con la totalidad de las facultades del representante principal. Teniendo en cuenta lo anterior se designa al representante legal suplente para efectos legales del contrato en referencia.

Se adjunta copia del certificado de existencia y representación legal y copia de la cedula del representante legal.

Agradecemos su atención,

Atentamente,

ELIZABETH CAINA DELGADO
C.C. 40.037.628
Representante principal
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

WILLIAM HERNANDO CAINA DELGADO
C.C 79.794.193
Representante suplente
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23224558OC259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Nit:	900119570 4 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal:	Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	01653766
Fecha de matrícula:	21 de noviembre de 2006
Último año renovado:	2022
Fecha de renovación:	16 de marzo de 2022
Grupo NIIF:	GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 73 No. 20 A 66
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	william.caina@caipro.com.co
Teléfono comercial 1:	8052595
Teléfono comercial 2:	3007978856
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 73 No. 20 A 66
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	william.caina@caipro.com.co
Teléfono para notificación 1:	8052595
Teléfono para notificación 2:	3007978856
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

Constanza del Pilar Pulido Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23224558CC259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0004952 del 4 de agosto de 2006 de Notaria 6 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2006, con el No. 01091187 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CAIPRO CONSTRUCTORES LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 de la Junta de Socios, del 6 de junio de 2013, inscrita el 13 de junio de 2013 bajo el número 01738808 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada, bajo el nombre de: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

Por Acta No. 2 del 6 de junio de 2013 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2013, con el No. 01738808 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CAIPRO CONSTRUCTORES LTDA a CAIPRO CONSTRUCTORES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: el objeto principal de la sociedad sera: promover y desarrollar la actividad de la construccion de inmuebles en general, asi como la comercializacion de este objeto principal, en desarrollo de su objeto social podra realizar las siguientes actividades: 1)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224958
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23224558CC259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

realizar toda clase de actividades relacionadas con la ingenieria civil y actividades conexas de asesoramiento tecnico. 2) realizar cualquie tipo de operaciones relacionadas con el mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo para toda clase de uso agropecuario, industrial, la mineria, la construccion y la explotacion mercantil de las fuerzas y recursos de la naturaleza. 3) realizar actividades relacionadas con la consultoria profesional y/o el ejercicio de profesiones liberales. 4) alquiles de equipos para la construccion, demolicion, dotado o no de operarios. 5) vender y comprar directa y/o mediante intermediacion, productos relacionados con las actividades de diseño, construccion y/o decoracion. 6) diseñar y/o construir proyectos arquitectonicos. 7) elaborar estudios tecnicos e investigativos. 8) prestar servicios de ingenieria forestal y ambiental. 9) diseñar muebles y o accesorios. 10) comprar, vender y comercializar toda clase de muebles y accesorios. 11) adquirir, enagenar, diseñar, fabricar, transformar, instalar, importar, distribuir, exportar y comercializar toda clase de bienes relacionados con su objeto. 12) adquirir, transformar, adecuar bienes e inmuebles asi como organizar los establecimientos de comercio necesarios para el desarrollo objeto de la empresa, dentro y fuera del territorio nacional. 13) celebrar contratos de sociedad, agencia, proposicion, concesion, suministros, cuenta en participacion, administracion y consignacion, joint venture, consorcios y en general cualquier asociativo o de colaboracion licito dentro y fuera del territorio nacional. 14) ejecutar toda clase actos con titulos valores u otros titulos representativos del derecho, dentro y fuera del territorio nacional. 15) invertir sus disponibilidades en bonos, cedulas u otros titulos que emitan entidades privadas o publicas dentro o fuera del territorio nacional. 16) celebrar contratos con entidades financiera, aseguradoras, capitalizadoras, fondos de inversion y demas instituciones prestatarias, de servicios financieros, especialmente para la apertura de cuentas corrientes bancarias, asi como tambien la obtencion de creditos cualquiera que fueren su modalidad dentro y fuera del territorio nacional. 17) celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing dentro y fuera del terrritorio nacional. 18) adicionalmente y en procura del cabal desarrollo del objeto social la sociedad podra licitar y celebrar contratos con entidades publicas de economia mixta o empresas industriales y comerciales del estado, tanto nacionales como internacionales dentro y fuera del territorio nacional. 19) ejecutar o celebrar todos los actos, contratos, operaciones civiles, comerciales, industriales, administrativas o financieras que sean

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A232245580C259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

convenientes para los fines que la sociedad persigue de conformidad con el objeto social que ha sido descrito en este articulo dentro o fuera del terrotorio nacional. 20) efectuar operaciones de prestamo, cambio, descuento, cuenta corriente, dando o recibiendo garantias, reales, personales o hipotecarias, y girar, endosar, descontar toda clase de titutos valores. 21)en general la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato licito que considere conveniente para el logro del objeto social dentro o fuera del territorio nacional. La sociedad podra llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas, o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $1.000.000.000,00
No. de acciones	: 1.000.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $750.000.000,00
No. de acciones	: 750.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $750.000.000,00
No. de acciones	: 750.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal: la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural, accionista o no que se denominara gerente general, quien tendrá un (1) suplente del representante legal en calidad de subgerente,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A232245580C259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quienes serán nombrado por la junta directiva. El subgerente, asumira respectivamente la representacion legal de la sociedad con todas las facultades inherentes al representante legal principal, en caso de ausencia temporal o definitiva del representante legal principal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: como administrador y representante legal de la sociedad el gerente cumplira las siguientes funciones: 1. Liderar la gestion estrategica de la empresa bajo su responsabilidad diseñando, administrando, evaluando y controlando planes de accion anuales encaminados especificamente a cumplir gradualmente el mencionado plan estrategico. 2. Diseñar y presentar en la primera semana de diciembre de cada año a la junta directiva el plan de accion que va a ejecutar a partir del mes de enero del siguiente año, con el objetivo fundamental de contribuir al logro del plan estrategico en la proporcion señalada. 3. Presentar cada tres (3) meses a la presidencia de la junta directiva o cuando esta lo exija los logros alcanzados en la ejecucion del plan de accion, asi como los proyectos que estime necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. 4. Ser el representante legal de la empresa. 5. Liderar la formulacion y aplicacion del plan de negocios. 6. Alinear a las distintas gerencias de area en funcion de los objetivos de la empresa caipro sas, las que se generen o creen y que se consoliden en grupo empresarial. 7. Dirigir y controlar el desempeño de las areas. 8. Presentar a la junta directiva estados financieros e informacion de la marcha de la empresa. 9. Desarrollar y mantener buenas relaciones con autoridades, organismos reguladores, gremios. 10. Velar por el respeto de las normas, politicas y reglamentos de la sociedad 11. Autorizar como gerente de la empresa para realizar negocios operacionales y/o celebrar los contratos de obra cuyos valores no excedan los 2.500 salarios minimos vigentes a partir de estos valores deben ser autorizados por la junta directiva. 12. Autorizar como gerente de la empresa a realizar negocios o celebrar contratos de activos fijos, maquinaria y equipo, vehiculos que no excedan los 100 salarios minimos legales vigentes. Hasta los 100 smmlv es responsabilidad del gerente. Igualmente para terreno e inmuebles autorizar negocios o celebracion de contratos cuando no excedan los 150 salarios minimos vigentes. 13. Presentar ante la asamblea de accionistas proyectos de inversion e incubacion de nuevos negocios, hasta por 150 salarios minimos vigentes en conjunto con la

junta directiva. Deben presentar por lo menos un (1) proyecto de inversion al año. 14. Actuar en coherencia con los valores organizacionales. 15. Representar y usar la firma social como persona juridica a la sociedad judicial o extrajudicialmente. 16. Convocar a la asamblea general ya la junta directiva cuando se requiera. 17. Presentar a la junta directiva en cada una de las secciones ordinarias los balances de prueba mensual, las cuentas e informes de la sociedad, debidamente sustentadas y avaladas con su firma la del revisor fiscal y el contador. 18. Informar permanentemente a la junta directiva sobre el estado real de los negocios sociales y suministrar los datos que ella requiera. 19. Segun autorizacion de la junta directiva, contratar y delegar las funciones o facultades requeridas cuando sea estrictamente necesario a mandatarios que representen a la sociedad en negocios judiciales o extrajudiciales. 20. Previa autorizacion de la junta directiva o asamblea general segun el caso, celebrar o ejecutar los contratos de adquisicion o enajenacion de bienes raices cualquiera que sea la cuantia. 21. Previa autorizacion de la asamblea general de accionistas y bajo la supervision directa de la junta directiva, enajenar o gravar la totalidad o parte de los bienes sociales de la compañia. 22. Arbitrar, conciliar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros, previa autorizacion de la junta directiva. 23. Nombrar o remover libremente el personal subalterno que sea necesario para el buen funcionamiento de la empresa. 24. En ejercicio de las facultades otorgadas por la junta directiva, podra comprar, adquirir, vender o enajenar a cualquier titulo los bienes muebles de la sociedad, darlos en prenda, gravarlos o hipotecarlos, alterar la forma de los bienes raices por naturaleza o destino y dar o recibir en mutuas cantidades de dinero, hacer depositos bancarios, firmar toda clase de titulos valores y negociarlos, girarlos, aceptarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos, comparecer a los juicios donde se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la empresa, interponer los recursos de cualquier genero en todos los negocios o asuntos de cualquier indole que tenga pendiente la sociedad, representarla ante cualquier instancia juridica o natural. Todo lo anterior obteniendo previamente la autorizacion respectiva y de acuerdo a los presentes estatutos y de las cuantias en ellos autorizado. 25. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva. 26. Gestionar y desarrollar las diligencias pertinentes para el aseguramiento de la capacidad financiera que se requiera en los procesos licitatorios. 27. Las demas que por razon de su cargo le correspondan, le confieran

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23224558CC259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

las leyes y los estatutos. Paragrafo : el representante legal de la sociedad en ejercicio de sus funciones, o el subgerente en ejercicio estaran obligados a comunicar a la junta directiva, sobre sus faltas temporales o permanentes, deberan igualmente, en cumplimiento de esta disposicion y siempre que las motivaciones no esten sustentadas en causas de fuerza mayor o caso fortuito; solicitar a la junta directiva, los permisos o licencias que requieran a efectos de atender asuntos de índole personal, familiar o de la misma sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0112022 del 22 de diciembre de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2023 con el No. 02924442 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Elizabeth Caina Delgado	C.C. No. 40037628

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	William Hernando Caina Delgado	C.C. No. 79794193

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 01 del 23 de junio de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 2020 con el No. 02649640 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Jaime Alfredo Morales Russi	C.C. No. 19461854

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A232245580C259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Segundo Renglon	Hernando Caina Umba	C.C. No. 6756508
Tercer Renglon	Andres Roberto Gomez Zuluaga	C.C. No. 19340799
Cuarto Renglon	Yaneth Esperanza Caina Delgado	C.C. No. 40043679
Quinto Renglon	Javier Andres Caina Delgado	C.C. No. 80095257

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 1-2021 del 29 de enero de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2021 con el No. 02673326 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	WP ACCOUNTANT SAS	N.I.T. No. 901327268 1

Por Documento Privado del 1 de febrero de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2021 con el No. 02673327 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Wilson Paul Aguilar Novoa	C.C. No. 79688685 T.P. No. 76679-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 2 del 6 de junio de 2013 de la Junta de Socios	01738808 del 13 de junio de 2013 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A232245580C259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 0006 del 16 de octubre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02034521 del 9 de noviembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 001 del 30 de marzo de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02235951 del 21 de junio de 2017 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7111
Actividad secundaria Código CIIU:	4112
Otras actividades Código CIIU:	4111, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 5.032.141.445

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:25
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23224558CC259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7111

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de octubre de 2006. Fecha de envío de información a Planeación : 23 de enero de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 24 de enero de 2023 Hora: 12:15:28
Recibo No. AA23224558
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23224558CC259

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO





Powered by CamScanner





FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1975

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-FEB-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00592821-M-0079794193-20140604 0038914025A 2 6362907470

...L DEL ESTADO CIVIL

CAIPRO
CONSTRUCTORA

Bogotá, 24 de febrero de 2023

OFCAI-FU-042

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera sede Fusagasugá

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Cierre de la Carrera 17 desde calle 17B hasta Avenida Las Palmas por ejecución de obra.

Cordial saludo,

Actualmente se desarrolla el contrato 2022-0798, cuyo objeto es **"Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."**, razón por la cual queremos informar que el cierre de la Carrera 17 en el tramo ubicado entre la Avenida Las Palmas y la Calle 17B durante la ejecución del contrato, que está proyectado inicialmente por cuatro meses.

Sabemos que este cierre vial, afecta la movilidad hacia el Auditorio de la Universidad y hacia el CERCUN, por lo que le solicitamos informar a la comunidad educativa de este cierre y así tomar medidas alternas en su desplazamiento. Adjuntamos el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Alcaldía Municipal de Fusagasugá para su conocimiento y fines pertinentes.

Para mayores inquietudes pueden contactarse mediante los siguientes canales de atención al ciudadano:

- → Correo electrónico: obraviasfusa@gmail.com
- → Correo electrónico: residentesocial@caipro.com.co
- → Atención presencial: martes 2-5 p.m. PAC CRA 17 NO. 16A- 38 PISO 2

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Flor Enid Téllez- Profesional social
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto, nuestro compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 27 de febrero de 2023 **OFCAI-FU-043**

STELLA OCHOA
Residente Barrio Santa Anita Cra 17 # 16C - 12
stellaochoa51@gmail.com

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Queja de afectación por polvo generado en la obra Q-14-02-2023-CAI.

Cordial saludo,

Hemos recibido su queja por la cantidad de polvo que se ha generado en el desarrollo de la obra, radicada con el consecutivo de la referencia el 14-02-2023, al respecto ofrecemos nuestras disculpas por los inconvenientes presentados y queremos informarle que por el proceso constructivo se presentan inconvenientes con el polvo producto de la excavación y cargue del material, sin embargo se está realizando el trámite correspondiente para la compra de la polisombra, la cual será instalada como medida de protección para las viviendas en donde se desarrolla la intervención vial.

Para mayores inquietudes puede contactarse mediante los siguientes canales de atención al ciudadano:

- → Correo electrónico: residentesocial@calpro.com.co
- → Atención presencial: martes 2-5 p.m. PAC CRA 17 NO. 16A- 38 PISO 2

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Ing. Andrés Peláz
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá, 27 de febrero de 2023 **OFCAI-FU-044**

ALEXANDRA PABON VILLALBA
Residente Barrio Santa Anita Cra 17 # 17-20
Tel: 3115446552

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Queja de afectaciones generadas por la obra Q-16-02-2023-CAI .

Cordial saludo,

Hemos recibido su queja por las afectaciones que se han generado en el desarrollo de la obra, radicada con el consecutivo de la referencia el 16-02-2023, al respecto ofrecemos nuestras disculpas por los inconvenientes presentados y queremos informarle:

1. Se realizó llamado de atención al operador de la retroexcavadora por los daños ocasionados en las redes de alcantarillado, de internet y de circuito cerrado de televisión con el objeto de evitar nuevos inconvenientes y daños en propiedades ajenas. Es de aclarar que las redes de alcantarillado están superficiales y no se encuentran debidamente señalizadas por lo que causaron estos daños. De igual manera la poca altura de los cables de la empresa de internet (Movistar) y los de los cables de las cámaras de seguridad, incidió en que la retroexcavadora los dañara, sin embargo se hicieron contactos con la empresa del internet y a través de la Veeduría Ciudadana con la Junta de Acción Comunal para solicitar el traslado de estos cables, gestiones que han requerido de tiempo y que ya tuvieron respuesta por parte la empresa Movistar y se continúa el proceso por parte de la JAC con la empresa que presta la vigilancia para su restauración.

2. Por el proceso constructivo se presentan inconvenientes con el polvo producto de la excavación y cargue del material, sin embargo se está realizando el trámite correspondiente para la compra de la polisombra, la cual será instalada como medida de protección para las viviendas en donde se desarrolla la intervención vial.

Su proyecto,
nuestro
compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

3. A través de la profesional SST del contrato se realizaron las charlas correspondientes con los trabajadores, para el uso adecuado del lenguaje en el desarrollo de sus actividades y en el trato hacia los residentes de la zona.

4. Como ya se mencionó la empresa Movistar se hizo presente en la obra y mejoraron la altura de los cables para que la maquinaria pueda trabajar de mejor manera, también restablecieron el internet a las viviendas afectadas.

5. Respecto al material que se encontraba ubicado en la vía frente a la vivienda de la señora Leidy Ortegón, ya se dispuso en la escombrera autorizada y se tomarán correctivos para evitar nuevos inconvenientes en las viviendas aledañas al proyecto.

Finalmente queremos informarle que se tienen disponibles los siguientes canales de atención a la comunidad:

- Correo electrónico: residentesocial@caipro.com.co
- Atención presencial: martes 2-5 p.m. PAC CRA 17 NO. 16A- 38 PISO 2

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Ing. Andrés Peñz
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

ANEXOS No. 3

- *Correspondencia enviada por MIRS*

MIRS – FUSA – 017– 2022

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2023

Señor
WILSON CAINA LOPEZ
Representante Legal
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: **Observaciones aplicables a la programación de obra ver4 y solicitud entrega flujo de caja e inversión según la programación a actualizar.**

Cordial saludo.

Una vez realizado el trabajo de campo y de oficina en reunión realizada entre los residentes de obra e interventoría teniendo como tema tratado la programación **ver4**, esta interventoría se permite solicitar realizar los ajustes correspondientes a la programación de obra ver4 remitida mediante el oficio **OFCAI-FU-033** así:

1- Realizar el ajuste e inclusión de los valores correspondientes a la **IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PMT** con un valor de **$ 13.480.775,00 y el plan de gestión integral en obra PGIO** con un valor de **$ 18.995.183,00** de tal manera que se distribuyan equitativamente durante las semanas de ejecución física de obra programada.

2- Presentar con base en la actualización de la programación ver4 el flujo de caja e inversión de recursos, documento que hace parte de los requisitos necesarios para realizar el seguimiento de la ejecución de obra y plasmar así los valores de las obras elaboradas cada semana.

3- Remitir los documentos de acuerdo con el archivo anexo utilizado en el trabajo de campo del día 3 de enero de 2023.

Se anexa archivo en Excel cantidad (1) uno

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – valorizacion@fusagasugacundinamarca.gov.co – hlopez@fusagasugacundinamarca.gov.co
Anexos: Siete (1) archivo digital excel
Proyectó: Ing. Freddy Samuel Rondón Mora– Residente de interventoría.
Aprobó: Ing. Jesús Ramón – director de interventoría.

MIRS – FUSA – 018 – 2022

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2023

Señores:
WILSON CAINA LOPEZ
Representante Legal
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: Estado actual del proyecto – comité de seguimiento semanal de obra realizado el día 8 de febrero de 2023.

Respetado Sr. Caina,

Como es de su conocimiento el contrato de la referencia dio inicio el día 10 de enero de 2023, a la fecha de hoy y después de sostener reiteradas reuniones y comités de seguimiento en obra con el equipo de trabajo dispuesto por CAIPRO Constructores SAS para llevar a cabo el proyecto, vemos con preocupación que muchos de los compromisos agendados por su equipo de trabajo no se han podido cumplir en las fechas establecidas y no se ha logrado mantener una continuidad en las actividades contratadas por parte de la Alcaldía de Fusagasugá.

Si bien es cierto, que por parte de CAIPRO se ha dispuesto de equipos y maquinaria que se encuentra apostada en le sitio de las obras, al igual que algunos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, hoy en día, tal como se puede evidenciar en la bitácora y las actas de comité de seguimiento de obra que se lleva por las partes, que pasado casi un mes desde el inicio del proyecto el avance es casi nulo y se pudo establecer en un 2% del total del proyecto.

Es preciso indicarle, que el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es de tan solo cuatro (4) meses y finiquita el próximo nueve (09) de mayo de 2023 por lo que se evidencia que hay muy poca holgura para su desarrollo, a la fecha se encuentra en revisión y se ha

observado por parte de esta interventoria el ajuste a la programación presentado, en ese orden, el cronograma vigente es el aprobado inicialmente, por lo que a la fecha CAIPRO se encuentra atrasado respecto a sus obligaciones y avance físico de obra, se recuerda lo definido en la Clausula Décimo Sexto del Contrato:

> *"...EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios, proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente a su riesgo las obligaciones derivadas de este Contrato. El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas..."*

Por lo anterior, no hay causas o motivos imputables a terceros que hayan dificultado el desarrollo de los trabajos, por lo que esta interventoria le otorga hasta el próximo martes 14 de febrero de 2023 para que se ponga al día en sus obligaciones contractuales, so pena de dar inicio de manera inmediata a las acciones legales a que haya lugar, tal como se define en la cláusula décima octava del contrato.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto: valorizacion@fusagasugacundinamarca.gov.co – nlmolano@fusagasugacundinamarca.gov.co

Anexos: Cero (0) Folios

MIRS – FUSA – 019 – 2023

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2023

Señor:
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de obra
CAIPRO CONSTRUCTORES S.AS
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA: No. 2022-0798 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: **APROBACION DEL PLAN INTEGRAL DE OBRA (PIGO)**

Respetado Ing

Revisado el PGIO en su versión final entregado por el contratista, esta interventoría indica que se atendieron las observaciones realizadas, por lo tanto, el mismo se aprueba.

Se indica al contratista que debe dar cumplimiento e implementación a todo lo definido en el documento.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – valorizacion@fusagasugacundinamarca.gov.co – hlmolano@fusagasugacundinamarca.gov.co
Anexos: Cero (0) folios
Proyectó: Ing. Fabio Merck – Residente Ambiental y SST de Interventoría.
Aprobó: Ing. Jesús Ramon – Director de Interventoría.

MIRS – FUSA – 020 – 2023

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2023

Señor:
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de obra
CAIPRO CONSTRUCTORES S.AS
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA: No. 2022-0798 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: **APROBACION DE APU DE OBRA**

Respetado Ing:

Una vez revisado la información remitida mediante el oficio OFCAI-FU-035 de fecha 31 de enero de 2023 y su archivo adjunto el cual contiene los APU actualizados y ajustados, procedemos a realizar la aprobación de los mismos.

Se solicita realizar la entrega de los mismos en físico debidamente firmada por el director y representante legal junto con el medio digital en excel.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – valorizacion@fusagasugacundinamarca.gov.co – bmolano@fusagasugacundinamarca.gov.co
Anexos: Cero (0) folios
Proyectó: Ing. Fredy Samuel Rondón Mora – Residente de Interventoría.
Aprobó: Ing. Jesús Ramon Jacome – Director de Interventoría.

MIRS – FUSA – 022 – 2023

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2023

Señor:
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de obra
CAIPRO CONSTRUCTORES S.AS
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA: No. 2022-0798 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: **SOLICITUD MAQUINARIA MINIMA**

Respetado Ing. Páez,

Se solicita de carácter obligatorio la entrega de la documentación y ficha técnica completa de la maquinaria mínima contractual, como se relaciona a continuación:

1. Martillo Demoledor 60LB
2. Vibro Compactador (RANA)
3. Retroexcavadora 75 HP (1 unds)
4. Motoniveladora 120 HP
5. Vibro compactador capacidad mínima 8 toneladas (1 unds)
6. Carro tanque de Agua 10.000 Litros (1 unds)
7. Trompo 2 sacos
8. Vibrador para concreto (1 unds)
9. Volqueta capacidad mayor a 14 m3

Plazo máximo de entrega de la documentación solicitada por la interventoría el 15 de Febrero de 2023.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoria
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – valorizacion@fusagasugacundinamarca.gov.co – hinolenc@fusagasugacundinamarca.gov.co
Anexos: Cero (0) folios
Proyectó: Ing. Pablo Merck – Residente Ambiental y SST de Interventoría.
Aprobó: Ing. Jesús Ramon – Director de Interventoría.

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

MIRS – FUSA – 024 – 2023

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

Ingeniero:
OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE
Secretario de Infraestructura
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA: No. 2022-0798 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: Oficio OFCAI – FU – 039 – Trámite traslado de redes y retiro postes Movistar.

Respetado Ingeniero:

Con el presente damos traslado de la comunicación del asunto, para que se busque un acercamiento a traves de la Alcaldia con la compañía Movistar para el traslado de la infraestructura dispuesta en el proyecto, toda vez que la misma interfiere con la ejecución de las obras, pues en los diseños entregados se prevé el retiro definitivo de los postes que se encuentran apostados en el costado norte del proyecto y de sus respectivas redes.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – valorizacion@fusagasugacundinamarca.gov.co, hlmolano@fusagasugacundinamarca.gov.co

Anexos: Un (1) folios – Oficio del asunto.
Proyectó: Ing. Jesús Ramón Jácome Ordóñez – Director de Interventoría.
Aprobó: Ing. Jesús Ramón Jácome Ordóñez – Director de Interventoría.

MIRS – FUSA – 025 – 2023

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

Ingeniero:
JAVIER PERILLA
Director de Obra
CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA: No. 2022-0798 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: Oficio EMSERFUSA 140-O-078-2023 – Respuesta a radicado No. 125 del 17 de enero de 2023.

Respetado Ingeniero:

Con el presente damos traslado de la comunicación del asunto, mediante la cual EMSERFUSA da respuesta a su radicado de 17 de enero de 2022, de igual manera mediante la misiva del asunto la ESP indica que el área operativa de la División de Acueducto tiene programado el traslado y reubicación de la red de 4" de PVC y solicita al contratista: *"...la implantación de la vía a construir tanto en ancho (incluyendo el andén) como en el nivel de sus rasantes según se indique en el diseño geométrico, así mismo, se solicita apoyo en la excavación de la zanja donde se instalará la tubería con el fin de realizar un trabajo rápido y eficaz..."*

Por lo anterior, en atención a que el cronograma de obra se encuentra bastante ajustado, se requiere de sus buenos oficios para que se realicen las actividades solicitadas por ESP a la mayor brevedad posible y de esta manera se genere el traslado técnico y definitivo de la red.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – valorizacion@fusagasuacundinamarca.gov.co, hmolano@fusagasuacundinamarca.gov.co

Anexos: Un (1) folio – Oficio del asunto.

emserfusa E.S.P.

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

140-O-078-2023

Fusagasugá, 22 de febrero del 2023

Señor
OSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE
Secretario de Infraestructura
Dirección: Calle 6 No. 6 -24
Email: secretariadeobras@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Fusagasugá

emserfusa E.S.P.
VII CORRESPONDENCIA
22 FEB 2023
HORA 3:38 PM
RADICADO N°: 859
FIRMA: [illegible]

Asunto: Respuesta a Radicado No. 125 del 17 de enero de 2023.

Respetado señor:

Reciban un cordial saludo de la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, EMSERFUSA E.S.P, *Con La Fuerza De La Gente*, a través de la División de Acueducto.

Por medio de la presente, la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., se permite informar que el área operativa de la División de Acueducto tiene programado el traslado y reubicación de la red de 4" en PVC que pasa a través de la zona a intervenir, para lo cual es necesario contar previamente con la siguiente ejecución por parte del contratista encargado del desarrollo del contrato de obra pública No. 2022-0798:
La implantación de la vía a construir tanto en ancho (incluyendo el andén) como en el nivel de sus rasantes según se indique en el diseño geométrico, así mismo, se solicita apoyo en la excavación de la zanja en donde se instalará la tubería con el fin de realizar un trabajo rápido y eficaz.

Cordialmente,

JONATHAN CORDOBA FONTECHA
Ing. Jefe División de Acueducto

Elaboró: Diego Beltrán – Contratista Acueducto
Revisó: Oscar Moreno – Profesional Universitario División Acueducto

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUR 1 – 25298682

MIRS – FUSA – 026 – 2023

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2023

Señor:
JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
Director de obra
CAIPRO CONSTRUCTORES S.AS
E.S.D.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA: No. 2022-0796 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: **ESTADO Y AVANCE DE OBRA A LA FECHA**

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con el cronograma vigente en el cual se especifican las actividades a realizar junto con los tiempos de inicio y terminación dividida en tres (3) frentes de obra, esta interventoría procede a realizar una descripción detallada del estado y avance físico de las obras a la fecha 24 de febrero de 2023:

1- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO VIAL

A la fecha el contratista ha realizado las actividades de localización y replanteo utilizando equipo de precisión estación total y nivel de precisión Topcon ATB-4.

Se encuentra debidamente marcadas las abscisas a cada costado con pintura roja y cimbrado los niveles de cota de rasante de vía para el tramo de vía localizado entre las abscisas K0+415 a K0+130 la cual comprende el **tramo 1 Y 2.**

La comisión de topografía ha dejado puntos de control de nivelación y localización BM.

De acuerdo con los compromisos del comité de obra se viene trabajando en conjunto entre contratista e interventoría en campo con el apoyo técnico de la supervisión con el fin de avanzar en la implementación de los niveles de terminado en las entradas de garajes de las viviendas de la carrera 17 con el fin de dinamizar las actividades de excavación.

MIRS – FUSA – 026 – 2023



TRAMO 1
fecha inicio 10 de enero de 2023 - fecha de terminación 23 de marzo de 2023
Localización K0+430 al K0+280

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
◢ PROYECTO	87 días	mar 10/01/23	mié 10/05/23
◢ TRAMO 1 K0+430 A K0+280	53 días	mar 10/01/23	jue 23/03/23
IMPLEMENTACION PMT Y CERRAMIENTO	15 días	mar 10/01/23	lun 30/01/23
2,01- EXCAVACIONES	6 días	mar 31/01/23	jue 9/02/23
2,02- TRANSPORTE	8 días	mar 31/01/23	jue 9/02/23
3,01- RAJON	7 días	jue 2/02/23	vie 10/02/23
3,02- GEOTEXTIL NT 2500	3 días	vie 17/02/23	mar 21/02/23
3,03- SUB BASE	7 días	mié 22/02/23	jue 2/03/23
3,04- BASE	7 días	vie 3/03/23	lun 13/03/23
3,05- IMPRIMACION	2 días	mar 14/03/23	mié 15/03/23
3,06- MDC-25	2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23
3,07- RIEGO DE LIGA	2 días	lun 20/03/23	mar 21/03/23
3,08- MDC-19	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
4,03- B-200	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23
7,02- NIVELACION POZOS	5 días	vie 24/02/23	jue 2/03/23
7,05- SUMIDEROS	5 días	jue 23/02/23	mié 1/03/23

1,01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

Se realizo la demolición del sumidero longitudinal localizado en la intersección de vía de la carrera 17 con calle 16D.



2,01 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



El contratista a la fecha ha realizado las actividades de excavación mecánica con equipo excavadora de oruga marca Kubota KX080-3 y Volqueta tipo doble troque International y

volqueta sencilla International junto con la actividad de disposición final de material sobrante de excavación y demolición al punto aprobado Sitio de Disposición Final RCD – Campoalegre.

Las actividades realizadas se encuentran ejecutadas entre la abscisa K0+415 a K0+280 con un ancho promedio de 7.00 m y una profundidad promedio entre los 0.70 a 0.90 m.





La longitud del tramo intervenido a la fecha es aproximada a los 135 m.

Se realizo la excavación mecánica de tal manera que la capa de pavimento asfaltico y la estructura de la vía existente se seleccionaran y acopiaran con el fin de una posible reutilización.

Durante el proceso de ejecución de esta actividad se han presentado los siguientes daños a las redes de servicios públicos.

a- Red de gas natural, uno (1) daño a domiciliaria, estado reparado
b- Red de acueducto, uno (1) daño a red principal de 3", estado reparado
c- Red de alcantarillado, ocho (8) daños de domiciliaria, pendiente por reparación
    1. Carrera 17 No. 17-10
    2. Carrera 17 No. 17-38
    3. Carrera 17 No. 16B-32 esquina
    4. Carrera 17 No. 16B-34
    5. Carrera 17 No. 16B-36
    6. Carrera 17 No. 16B-22
    7. Carrera 17 No. 16B-16
    8. Carrera 17 No. 16D esquina
d- Red de alcantarillado, uno (1) tramo red principal entre pozos, pendiente por reparación

2,02 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

A la fecha se ha realizado las actividades de transporte de materiales y sobrantes de excavación al sitio de disposición final de RCD aprobado.





3,01 RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

Se encuentra instalado entre las abscisas K0+410 hasta la K0+310, por lo tanto, presenta un atraso de terminación de 14 días.

TRAMO 2

fecha inicio 10 de febrero de 2023 - fecha de terminación 4 de abril de 2023
Localización K0+280 al K0+130

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
▲ TRAMO 2 K0+280 A K0+130	35 días	vie 10/02/23	mar 4/04/23
2,01-EXCAVACIONES	8 días	vie 10/02/23	mar 21/02/23
2,03-TRANSPORTE	8 días	vie 10/02/23	mar 21/02/23
3,01- RAJON	7 días	mar 14/02/23	mié 22/02/23
3,02- GEOTEXTIL NT 2500	3 días	mié 1/03/23	vie 3/03/23
3,03- SUB BASE	7 días	lun 6/03/23	mar 14/03/23
3,04- BASE	7 días	mié 15/03/23	jue 23/03/23
3,05- IMPRIMACION	2 días	vie 24/03/23	lun 27/03/23
3,06- MDC-25	2 días	mar 28/03/23	mié 29/03/23
3,07- RIEGO DE LIGA	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
3,08- MDC-19	2 días	lun 3/04/23	mar 4/04/23
4,01- B-200	4 días	jue 23/02/23	mar 28/02/23
7,01- NIVELACION POZOS	5 días	jue 9/03/23	mié 15/03/23
7,06- SUMIDERO	5 días	lun 6/03/23	vie 10/03/23

1,01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)

No se han realizado actividades en este tramo.

2,01 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

Se han iniciado a la fecha solo la excavación mecánica de 10 m comprendidos entre las abscisas K0+280 hasta la K0+270

Se presenta un atraso de 3 días en la terminación de esta actividad.

3,01 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES.

Se presenta un atraso de 3 días en la terminación de esta actividad.

TRAMO 3
fecha inicio 29 de marzo de 2023 - fecha de terminación 10 de mayo de 2023
Localización K0+130 al K0+000

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
TRAMO 3 K0+130 A K0+000	42 días	mié 22/02/23	jue 20/04/23
1,01- DEMOLICIONES	3 días	mié 22/02/23	vie 24/02/23
2,01- EXCAVACIONES	9 días	lun 27/02/23	jue 9/03/23
2,02- TRANSPORTE	9 días	lun 27/02/23	jue 9/03/23
3,01- RAJON	7 días	jue 2/03/23	vie 10/04/23
3,02- GEOTEXTIL NT 2500	3 días	vie 17/03/23	mar 21/03/23
3,03- SUB BASE	7 días	mié 22/03/23	jue 30/03/23
3,04- BASE	7 días	vie 31/03/23	lun 10/04/23
3,05- IMPRIMACION	2 días	mar 11/04/23	mié 12/04/23
3,06- MDC-25	1 días	jue 13/04/23	vie 14/04/23
3,07- RIEGO DE LIGA	2 días	lun 17/04/23	mar 18/04/23
3,09- MDC-19	2 días	mié 19/04/23	jue 20/04/23
4,01- RAJON URBANISMO	2 días	jue 2/03/23	vie 3/03/23
4,02- GEOTEXTIL NT 1200	2 días	lun 6/03/23	mar 7/03/23
4,03- B-250	4 días	lun 13/03/23	jue 16/03/23
4,05- BORDILLO A80	4 días	vie 31/03/23	mié 5/04/23
4,06- SARDINEL A-30	4 días	vie 31/03/23	mié 5/04/23
4,07- ADOQUIN EN ARCILLA	8 días	vie 17/03/23	mar 28/03/23
4,08- FRANJA FUNDIDA EN SITIO	6 días	mié 22/03/23	mié 29/03/23
4,09-CONTENEDOR DE RAICES A-70	3 días	mié 22/03/23	vie 24/03/23
4,11- PIEZA REMATE A-105	3 días	mié 22/03/23	vie 24/03/23
4,12- BAJO BAMPA A-100	3 días	mié 22/03/23	vie 24/03/23
7,09- POSTE EN CONCRETO	3 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23
7,01- NIVELACION POZOS	3 días	vie 24/03/23	jue 30/03/23

Se realizo la demolición de la vivienda existente la cual se encuentra ubicada sobre la línea de calzada del proyecto.





No se ha realizado otro tipo de actividades de ejecución física de obra.

2- EQUIPOS EN OBRA

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	CAPACIDAD
Excavadora de oruga	KUBOTA	KX080-3	Dos (2) valdes
Volqueta doble troque	INTERNATIONAL		14 m3
Volqueta sencilla	INTERNATIONAL		6 m3
Vibro compactador	INGERSOLL RAND	SP-480D	
Minicargador	BOCAT	S570	

3- PROGRAMACIÓN

CUADRO DE INVERSION

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 2021-0875
CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 178 COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.
VALOR:	$ 1.439.671.595,00

FECHA INICIO	10/01/2023	FECHA DE TERMINACION	9/05/2023
FECHA DEL CORTE	29/01/2023	PLAZO	CUATRO (4) MESES

FECHA	ACTA	Vr. INVERSION				INVERSION EN %	
		PROGRAMADA		EJECUTADA			
		SEMANAL	ACUMULADA	SEMANAL	ACUMULADA	PROGRAMADA	EJECUTADA
15/01/2023	Semana 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
22/01/2023	Semana 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
29/01/2023	Semana 3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5/02/2023	Semana 4	$ 6.364.404,55	$ 6.364.405	$ 4.630.730	$ 4.630.730	0,44%	0,32%
12/02/2023	Semana 5	$ 47.835.598,30	$ 54.020.003	$ 41.228.184	$ 45.858.914	3,75%	3,19%
19/02/2023	Semana 6	$ 70.122.045,11	$ 124.142.048	$ 35.250.677	$ 81.109.591	8,62%	5,63%
26/02/2023	Semana 7	$ 37.397.386,48	$ 161.339.434	$ 0,00	$ 81.109.591	11,21%	5,63%
5/03/2023	Semana 8	$ 68.036.016,80	$ 229.375.451			15,93%	
12/03/2023	Semana 9	$ 211.919.392,32	$ 441.294.843			30,65%	
19/03/2023	Semana 10	$ 157.257.485,66	$ 598.552.329			41,58%	
26/03/2023	Semana 11	$ 155.997.684,07	$ 754.550.305			52,41%	
2/04/2023	Semana 12	$ 160.866.153,69	$ 915.416.457			63,59%	
9/04/2023	Semana 13	$ 159.443.074,31	$ 1.074.859.531			74,66%	
16/04/2023	Semana 14	$ 105.000.429,54	$ 1.180.859.960			82,02%	
23/04/2023	Semana 15	$ 100.749.453,46	$ 1.281.609.414			89,02%	
30/04/2023	Semana 16	$ 96.099.090,09	$ 1.377.707.507			95,70%	
7/05/2023	Semana 17	$ 58.303.153,89	$ 1.436.010.660			99,75%	
9/05/2023	Semana 18	$ 3.660.906,05	$ 1.439.671.595			100,00%	
DESFASE INVERSION PROGRAMADA CONTRA EJECUTADA (%)					11,21%	5,63%	-5,57%
DESFASE INVERSION PROGRAMADA CONTRA EJECUTADA ($)					$ 161.339.434	$ 81.109.591	$ 80.229.843

MIRS – FUSA – 026 – 2023

A la fecha el estado del avance físico del proyecto con relación a la programación vigente remitida por el contratista de fecha 30/01/2023 mediante el oficio OFCAI-FU-028 cuenta con un avance físico de obra aproximado del 5,63%, con un porcentaje programado del 11.21% y una diferencia de atraso del 5,57%.

La interventoría solicita al contratista mejorar el procedimiento y ejecución de las actividades de obra que reflejen el avance y rendimiento de las mismas, por lo tanto se debe proceder a realizar la debida contingencia que evite el aumento y acumulación del atraso físico de las obras programadas.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisón del proyecto – valoracion@fusagas.gacundinamarca.gov.co – himolano@fi.cogestugacundinamarca.gov.co
Anexos: Cero (0) folios
Proyectó: Ing. Fredy Samuel Rondón Mora – Residente de Interventoría
Aprobó: Ing. Jesús Ramon Jacome – Director de Interventoría

MIRS – FUSA – 028 – 2023

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2023

Señores:
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

Asunto : Aprobación Informe Social 1 Contratista

Una vez considerado el documento, en donde se evidencia que fueron subsanadas las observaciones realizadas por la interventoria y el área de gestión Social, por medio del presente, esta interventoría se permite informar la aprobación del informe social del contratista V1, radicado mediante correo electrónico el día 27/02/23.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – valoracion@fusagasugacundinamarca.gov.co – hlmolano@fusagasugacundinamarca.gov.co

Anexos: Cero (0) folios Proyectó: william linarico – Residente social de interventoria.

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA."

Elaboró: CAIPRO CONSTRUCTORES

FUSAGASUGA, 07 DE DICIEMBRE DE 2022

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Contenido

1.	ENTIDADES RESPONSABLES	3
2.	CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO	3
2.1.	LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA	3
2.2.	USOS DEL SUELO	5
2.3.	SITIOS ESPECIALES	5
2.4.	SEÑALIZACIÓN EXISTENTE	5
3.	CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO	5
3.1.	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	5
3.2.	CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO DE LAS VÍAS A INTERVENIR	6
4.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA	6
4.1.	DURACIÓN Y HORARIO DE LA OBRA	9
5.	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	9
5.1.	MANEJO DE TRANSITO PARTICULAR	9
5.2.	MANEJO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS DE CARGA	10
5.3.	MANEJO DE TRANSPORTE PUBLICO	10
5.4.	MANEJO DE PEATONES Y CICLOUSUARIOS	10
5.5.	ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES	10
5.6.	ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA	11
5.7.	MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO Y AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO	11
5.8.	SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DEL CONTROL DEL TRANSITO	11
5.8.1.	SEÑALES PREVENTIVAS	12
5.8.2.	SEÑALES REGLAMENTARIAS	12
5.8.3.	SEÑALES INFORMATIVAS	13
5.8.4.	DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSITO	13
6.	DIVULGACIÓN	14
7.	PROCESO PARA LA PUESTA EN MARCHA	14
8.	APOYO DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO	14

Su proyecto, nuestro compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA."

1. ENTIDADES RESPONSABLES

Las Entidades y empresas responsables del contrato son:

- Entidad Contratante:

ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ.

- Contratista:

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT: 900.119.570-4
Dirección: Calle 73 No. 20a-66 Bogotá
Tel. 6018052595

2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Las zonas de obras se encuentran ubicadas en el Municipio de Fusagasugá en el sector conocido como barrio Santa Anita sobre carrera 17, entre avenida las palmas y la calle 17B, Comuna Occidental.

Las vias a intervenir hacen parte de la carrera 17 y sus zonas aledañas. En la ilustración 1 se puede observar la ubicación del municipio de Fusagasugá.

Ilustración 1 Ubicación del Municipio de Fusagasugá

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S



En la ilustración 2, se muestra la ubicación de la vía a intervenir para el barrio Santa Anita sobre carrera 17 entre avenida las palmas y la calle 17B, Comuna Occidental.

Ilustración 2 Detalle vía a intervenir



Calle 73 No 20A - 66 PBX:
Info@calpro.com.co

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

2.2. USOS DEL SUELO

El área de influencia directa de las vías a intervenir, presentan uso del suelo netamente residencial.

2.3. SITIOS ESPECIALES

Sobre el barrio Santa Anita sobre carrera 17 entre avenida las palmas y la calle 17B - Comuna Occidental, no se encuentran sitios especiales de ningún tipo.

2.4. SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

El barrio Santa Anita sobre carrera 17 entre avenida las palmas y la calle 17B - Comuna Occidental, no cuenta con señalización de tránsito ni cuenta con demarcación vial.

3. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO EN EL ÁREA DEL PROYECTO

3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Manual de Señalización Vial-Dispositivos para la regulación de Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia (Decreto 1050 de 2004), la zona de influencia para obras de interferencia moderada, comprende un área alrededor de las obras en distancia de "300 metros".

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 6052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Teniendo en cuenta lo anterior el área de influencia para la carrera 17 entre la calle 17 y La avenida las palmas se muestra a continuación:

Ilustración 4 Zona de influencia del proyecto



3.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO DE LAS VÍAS A INTERVENIR

Las vías a intervenir presentan bajos volúmenes vehiculares, pues son vías de carácter local, por donde transitan en su mayoría los residentes del sector.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

Cada proyecto, nuestro compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

En términos generales se puede decir que en las vías a intervenir se llevarán a cabo actividades relacionadas con excavación, instalación de materiales granulares y mezcla asfáltica. Entre las actividades a ejecutar se encuentran:

- Señalización y confinamiento de zona de obra
- Localización y Replanteo Topográfico
- Socialización del Proyecto
- Señalización y delimitación del área a intervenir
- Excavación mecánica y manual
- Retiro de escombros a escombreras autorizadas
- Construcción de vía
- Retiro de señalización
- Apertura al tránsito.

Se realizará una excavación de 90 cm en promedio en donde se realizará el siguiente perfil:

Materiales y perfil utilizado en la recuperación de la carrera 17


MATERIALES PARA RECUPERACION	ESPESOR
MDC 19	07 CM
MDC 25	08 CM
BASE GRANULAR	20 CM
SUBBASE GRANULAR	25 CM
GEOTEXTIL 2500	0,3 CM
RAJON	30 CM

ETAPAS DE EJECUCIÓN

Con el fin de minimizar el grado de impacto sobre los habitantes del sector y usuarios de las vias, la intervención para estas se realizará en 2 etapas las cuales serán la rehabilitación de la vía desde la calle 17B hasta la calle 16 como etapa 1 y la etapa 2 será desde la calle 16 hasta la av. las palmas.

Su proyecto,
nuestro
compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

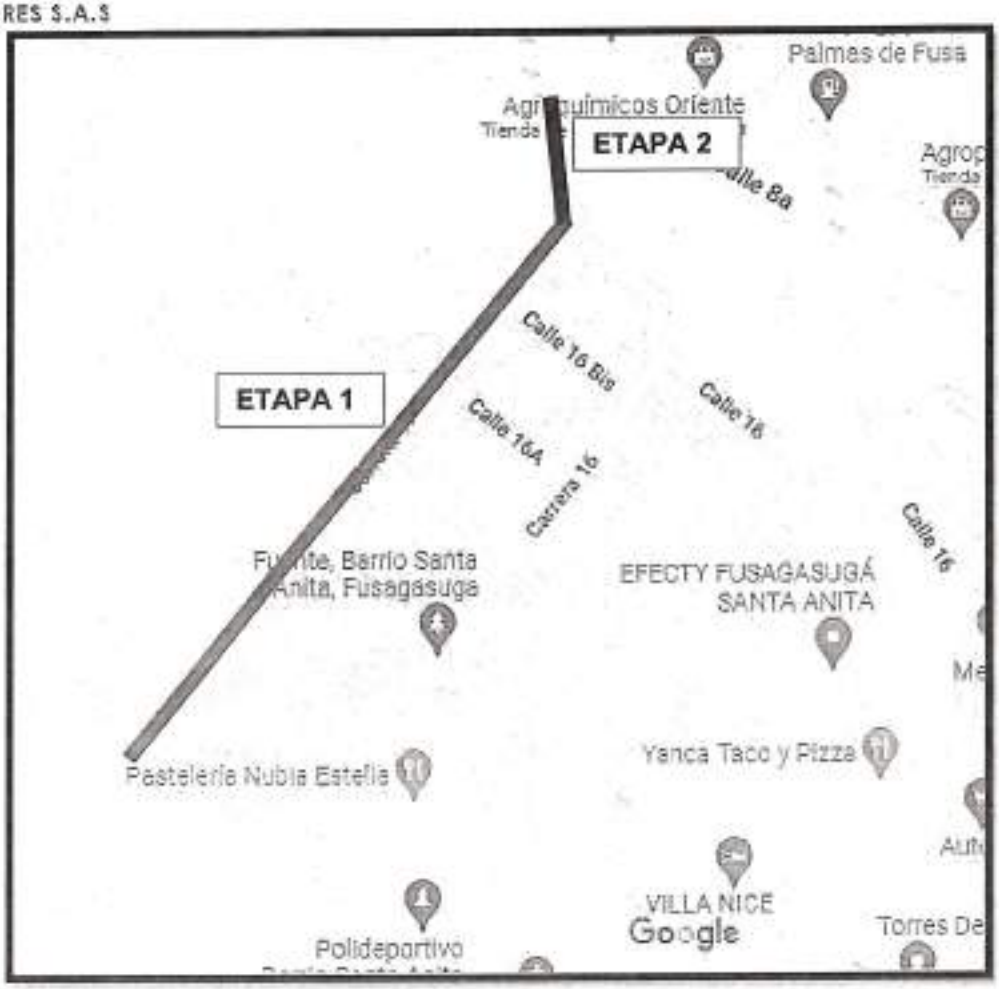

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR

La maquinaría y el equipo que se va a utilizar durante las actividades constructivas sobre estas vías es la siguiente:

- Retroexcavadora
- Volquetas
- Vibro compactador
- Finisher
- Compactador de llantas
- Equipo para señalización
- Herramienta menor: picas, palas, carretillas

4.1. DURACIÓN Y HORARIO DE LA OBRA

El plazo de ejecución del contrato es de 4 meses

Se aclara que la jornada laboral será entre las 7:00 y las 17:00 horas de lunes a viernes y sábados de 7:00 a 12:00 horas, sin embargo, los cierres permanecerán las 24 horas.

5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El presente Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, tiene como fin establecer las condiciones generales para el control del tránsito peatonal y vehicular durante el desarrollo de las obras de construcción, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Contrato.

5.1. MANEJO DE TRANSITO PARTICULAR

- El barrio Santa Anita sobre la carrera 17 entre la calle 17 y a calle 16.

Para los vehículos que transiten de sur a norte por las calles 17 y 16 deberán tomar desvíos en sentido oriente occidente hasta la calle 15 tomándola en sentido sur - Norte hasta llegar a su destino.

Estas vías poseen un flujo vehicular bajo, sin embargo, para realizar el cierre total el manejo que se dará a los pocos usuarios de estas vías se refleja en los **planos 1 – 5 del anexo 1.**

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

5.2. MANEJO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS DE CARGA

Para los vehículos de carga; ingresarán por las vías adyacentes a la zona de obra, sin embargo, se aclara que sobre estas vías no transitan vehículos de carga toda vez que sirven para el ingreso de los residentes del sector y no hay presencia de establecimientos comerciales en las vías a intervenir.

Las volquetas que transportan material de desecho hacia las escombreras y las mismas que traigan el material para la obra cumplirán con lo establecido en el decreto 112/94

5.3. MANEJO DE TRANSPORTE PUBLICO

Sobre las vías a intervenir no hay presencia de transporte público, por lo tanto, este numeral no aplica.

5.4. MANEJO DE PEATONES Y CICLOUSUARIOS

Durante la intervención de la vía, se afectará el espacio público, por lo cual los peatones podrán continuar con su recorrido habitual una vez se halla culminado la intervención del espacio público de acuerdo a la etapa de la obra. Los peatones deben utilizar los andenes existentes que no se encuentren en intervención, y cumplir con la normatividad establecida en el Código de Tránsito vigente, en la cual se les solicita:

- Cruzar la Calle por las esquinas, cebras y bocacalles.
- Transitar solo por las aceras o andenes, nunca por las calzadas que están destinadas exclusivamente para los vehículos.
- Nunca colocarse delante o detrás de un vehículo con el motor encendido.
- Tratar de no llevar cosas que obstaculicen el tránsito.
- No invadir zonas de tránsito de vehículos con patines, patinetas o monopatines.
- No subirse ni bajarse de un vehículo en movimiento y tomar el transporte público en los paraderos demarcados.
- No transitar en estado de embriaguez.

Sin embargo, se implementarán señales de sendero peatonal sobre los andenes adyacentes a la obra. Estas medidas de tránsito se presentan en los **planos 1 – 5 del anexo 1.**

5.5. ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES

El cargue y descargue de material se realiza dentro del cerramiento de obra de la vía que

Su proyecto, nuestro compromiso

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

se va a intervenir; en el horario comprendido entre las 7:00 y las 17:00 horas. La maquinaría a utilizar llegará al frente de obra en cama bajas y debidamente escoltada en su parte delantera y trasera por vehículos, los cuales llevarán señales informativas de Peligro carga larga o Peligro carga ancha, de 1.0 metro de largo por 0,5 metro de ancho, en fondo amarillo, letras negras en papel grado ingeniería, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Resolución 004959 de noviembre 8 de 2006.

5.6. ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA

El ingreso y salida de volquetas se realizará por las vías alternas a la zona de obra en el horario comprendido entre las 7:00 y las 17:00 horas.

La maquinaría y el equipo utilizado durante las actividades constructivas, se ubicarán dentro del cerramiento de obra y se mantendrán debidamente señalizados y acordonados con colombinas y cinta o tabiques, evitando inconvenientes a los usuarios habituales de la vía a intervenir y de las vías adyacentes. Estos deben cumplir con lo establecido en el Decreto 034/2009.

Las volquetas que transportan material de desecho hacia las escombreras y las mismas que traigan material para la obra, cumplirán con lo establecido en el Decreto 112/94 y la norma vigente de pico y placa.

5.7. MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO Y AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO

Durante la ejecución de trabajos de Intervención de las vías urbanas, no se realizará ningún tipo de modificación en intersecciones semaforizadas por lo que este numeral no aplica.

5.8. SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DEL CONTROL DEL TRANSITO

La función de la señalización durante la intervención de la vía es la de guiar en forma segura al tránsito vehicular y peatonal, el cual será orientado para prevención de riesgos, tanto para los usuarios de esta vía como para el personal que ejecuta esta actividad.

La señalización temporal se instalará con anterioridad a la iniciación del proceso de Intervenciones Integrales de las vías urbanas y de espacio público, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se retirará cuando se finalicen las actividades de rehabilitación.

Las señales para el cierre total se clasifican en:

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

- Señales preventivas
- Señales reglamentarias
- Señales informativas

La señalización a utilizar cumplirá con lo establecido en el Manual de Señalización para Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante la Resolución 1050 del 5 de mayo de 2004 del Ministerio de Transporte.

5.8.1. SEÑALES PREVENTIVAS

Tienen por objeto advertir a los usuarios de las vías objeto del contrato, sobre la existencia de una situación de obra. Estas señales se identifican por el código SPO. Se utilizarán señales de 0.75 m de tamaño, con fondo naranja, orla negra, símbolo y letras en color negro. Dentro de las señales a utilizar se encuentra SPO- 01 (Trabajos en la vía), la cual se presenta en la siguiente figura.

Ilustración 5 Señal preventiva SPO-01 (Trabajos en la vía)



Fuente: Adaptado del Manual de Señalización Vial, 2004

5.8.2. SEÑALES REGLAMENTARIAS

Las señales reglamentarias tienen por objeto advertir a los usuarios de las vías objeto del contrato, sobre las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Estas señales se identifican por el código SRO. Se utilizarán señales de 0.75 m de tamaño, con fondo blanco, orla roja, símbolo y letras en color negro. Dentro de las señales a utilizar se encuentran las siguientes: SRO-01 (VÍA CERRADA), SRO-02 (DESVÍO) y SRO-30 (VELOCIDAD MÁXIMA), la cual se presenta en la siguiente figura.

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Ilustración 7 Señal reglamentaria SR-30 (Velocidad máxima 30 KPH)



Fuente: Adaptado del Manual de Señalización Vial, 2004.

5.8.3. SEÑALES INFORMATIVAS

Las señales informativas, tienen por objeto informar a los usuarios de las vías objeto del contrato, sobre una situación atípica. Dentro de las señales se encuentran las siguientes: SIO-01 (aproximación a obra en la vía), la cual se presenta en la siguiente figura.

Ilustración 8 Señal Informativa SIO-01 (Obra en la vía a 100 m)



Fuente: Adaptado del Manual de Señalización Vial, 2004.

5.8.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSITO

Barricadas:

Las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizontales con un ancho de 0.20 m separadas por espacios iguales a sus anchos, su longitud estará entre 2.0 m y 2.4 m, la altura total será de 1.5 m. Las bandas horizontales se pintarán con franjas

alternadas blancas y naranjas reflectivas que formen un ángulo de 45 grados con la vertical. A continuación, se presenta una figura que muestra dicho dispositivo.

Ilustración 9 Barricada con Señal Reglamentaria de vía cerrada



Fuente: Adaptado del Manual de Señalización Vial, 2004.

6. DIVULGACIÓN

Se realizará la divulgación de la información mediante perifoneo, además se dispondrá de un punto de oficina en el cual se atenderá a la ciudadanía los días lunes de 10am a 11am.

7. PROCESO PARA LA PUESTA EN MARCHA

Una vez se hayan aprobado los Planes de Manejo de Tránsito por parte de la SDM se procederá a señalizar de acuerdo a lo indicado en los planos, es decir se instalarán todas las señales informativas, preventivas y reglamentarias que requiera su adecuado funcionamiento, se cerrará los tramos de obra a intervenir, se realizará el confinamiento de la zona de obra con ayuda de cinta de seguridad y colombinas o conos y se empezarán las labores de construcción que se requiere en las vías.

8. APOYO DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO

El seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, no requiere colaboración permanente de la Policía Metropolitana de Tránsito ya que se trata de unas vías locales con bajos volúmenes vehiculares.

nuestro
compromiso

Control de versiones:

Versión	Fecha	Descripción	No. de folios
0.00	7 de febrero de 2023	Original	

MIRS Latinoamérica SAS		
Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Ing. Francisco Marrugo – Residente de Interventoría	Ing. Jesús Ramón Jácome Ordóñez – Director de Interventoría	Ing. Jesús Ramón Jácome Ordóñez – Director de Interventoría

Alcaldía Municipal de Fusagasugá **Secretaria de Infraestructura Dirección de Valorización**
Aprobado por:
Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique Supervisor del contrato /Secretaria de Infraestructura

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.".

Contrato de interventoria No. 2022 – 0774

Informe de interventoría

Periodo:
Del 10 al 31 de enero de 2023

Firma de interventoría: **MIRS LATINOAMERICA SAS**

Fecha: 7 de febrero de 2023

1. TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. TABLA DE CONTENIDO 3
INTRODUCCIÓN 4

INTRODUCCIÓN

Con base en el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas: "CON LA FUERZA DE LA GENTE" Fusagasugá 2020 - 2024; la Dirección de Planificación del Desarrollo y Finanzas Públicas de la Secretaria de Planeación, mediante un proceso participativo, pluralista, trasversal e incluyente, y con el interés de acercar la comunidad con la municipalidad; llevo a cabo un trabajo mancomunado de la administración municipal con la ciudadanía, logrando la consolidación del Plan de Desarrollo Participativo de las Comunas y Corregimientos cuyo contenido obedece a las necesidades y problemáticas de la comunidad en general, orientado al progreso sistémico de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

La mesa de Gestión del Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Movilidad conformada por la Secretaria Planeación, Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Movilidad, identificó a través de los aportes de la comunidad problemáticas concernientes a los temas de desarrollo urbano y rural, movilidad, infraestructura, prestación de servicios públicos de uso racional y sostenible del territorio, entre otros, a su vez nos manifestaban alternativas de solución a los problemas, las que se encuentran instauradas dentro del diagnóstico general del Plan de Desarrollo.

NOMBRE:	CON LA FUERZA DE LA GENTE 2020-2024
LINEA ESTRATÉGICA:	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
SECTOR:	TRANSPORTE, VIAS Y MOVILIDAD
PROGRAMA:	VIAS AL SERVICIO DE LA GENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mantener la infraestructura adecuada para una movilidad eficiente logrando un efectivo transporte de personas y de carga.

META RESULTADO:	914 - Construir y/o ampliar 8.000 metros cuadrados de vías urbanas
	915 - Mantener 80. 000 metros cuadrados de vías urbanas
	920 - Construir 3.000 metros cuadrados de andenes
	923 - Realizar dos destaponamientos rurales y/o urbanos
INDICADOR	Metros cuadrados de vías urbanas construidas y/o ampliadas
	Metros cuadrados de vías urbanas con mantenimiento
	Metros cuadrados de andenes construidos
	Número de destaponamientos viales rurales y urbanos realizados
META PRODUCTO:	1.5 Vía urbana construida.
	1.6 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario.
	1.11 Espacio público construido.
	1.13 Destaponamientos viales rurales y urbanos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a las obras deconstrucción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental en el municipio de Fusagasugá – Cundinamarca.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del contrato de interventoría no. 2022-0774 de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación de Concurso de Méritos Abierto N° CM 2022-702, los cuales hacen parte integral de este.

- Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a la Secretaria de Infraestructura las aclaraciones del caso.

- Observar y dar cumplimiento a las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

1. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la reconstrucción y construcción de la estructura de pavimento flexible, mediante actividades de excavación, mejoramiento de subrasante, instalación de base, subbase y carpeta de rodadura de acuerdo con los estudios y diseños entregados; cumpliendo entre otros con: las cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto, y dando cumplimiento a las especificaciones técnicos de construcción definidas en el presupuesto oficial, que en este caso corresponden a las establecidas por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- en su versión vigente para el Proyecto de Vías.

El municipio de Fusagasugá a través de los profesionales contratistas de la Secretaría de Infraestructura realizó el análisis técnico y económico que soportará el valor estimado del contrato de obra, todo por tratarse de una contratación por el sistema de precios unitarios. La Secretaría de Infraestructura realizó los cálculos de presupuesto así: para los ítems cuya descripción se encuentra en la cartilla ICCU 2022, IDU 2021-1-Mano de Obra 2022; los cuales se tomaron en cuenta dichos precios unitarios de acuerdo con la resolución No.195 - 2022 del 22 de abril de 2022, donde contemplan todas las variables involucradas para el tipo de proyecto a realizar; con relación a los ítems o actividades que no se encuentran dentro de dicho listado se adjuntan análisis de precios unitarios realizados por la Secretaría de Infraestructura, los cuales fueron elaborados teniendo en cuenta el valor de los insumos de los análisis de precios unitarios de la cartilla del ICCU 2022. El valor estimado de la obra que se va a ejecutar, asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.439.671.595,00)

El plazo de ejecución del contrato será de Cuatro (4) meses, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista, el interventor y el supervisor. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar y la expedición del registro presupuestal. La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinarán a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato.

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.:	2022 – 0798
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN:	CL 73 No. 20 A 66 BOGOTA D.C
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON CAINA LOPEZ. INICIAL ELIZABETH CAINA DELGADO. ACTUALIZADO
NIT:	900.119.570-4
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 DE MAYO DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO (incluido prorrogas):	CUATRO (4) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	VEINTIDOS (22) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 1.439.671.595,00
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (Incluido adiciones):	N/A
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VÍAS URBANAS CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA".

NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE OBRA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS	**DURACIÓN**	***Desde***	***Hasta***	***Fecha de aprobación***
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	CERO (0) MESES Y CERO (0) DÍAS			
PRÓRROGAS	**DURACIÓN**	***Desde***	***Hasta***	***Fecha de aprobación***
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	CERO (0) MESES Y CERO (0) DÍAS			
ADICIONES	**N/A**	**N/A**		**N/A**
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	**N/A**			

1.1.2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.:	2022 – 0774
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	2 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA".
CONTRATISTA:	MIRS LATINOAMERICA SAS -EN REORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN:	CL 23 E No. 85 A 31 MODELIA BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL:	NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
NIT:	900.241.875-6
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 DE MAYO DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO (Incluido prorrogas):	CUATRO (4) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	VEINTIDOS (22) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 105.747.169,00
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (Incluido adiciones):	N/A
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VÍAS URBANAS CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA".

NOVEDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS	**DURACIÓN**	***Desde***	***Hasta***	***Fecha de aprobación***
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	CERO (0) MESES Y CERO (0) DÍAS			
PRÓRROGAS	**DURACIÓN**	***Desde***	***Hasta***	***Fecha de aprobación***
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	CERO (0) MESES Y CERO (0) DÍAS			
ADICIONES	***N/A***	***N/A***		***N/A***
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	**N/A**			
