Gmail **PROES INGENIERÍA <puentes.sumapaz2023@gmail.com>**

Radicación cronograma contrato de consultoría CCS-302-2022 ajustado de acuerdo al comité de seguimiento del 12 de mayo de 2023.

CDI Sumapaz <cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co> 17 de mayo de 2023, 16:43
Para: PROES INGENIERÍA <puentes.sumapaz2023@gmail.com>

Buen día, cordial saludo.

La comunicación a la referencia ingreso al FDR SUMAPAZ con Rdo. No.**20237010008602**

Cordialmente.

CDI SUMAPAZ
Brayan Torres

De: PROES INGENIERÍA <puentes.sumapaz2023@gmail.com>
Enviado: miércoles, 17 de mayo de 2023 16:16
Para: CDI Sumapaz <cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>; Harold Hernandez <hchernandezb@gmail.com>
Cc: Nelson Ferney Estrada Gonzalez <nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co>; Nicolás Ortega Restrepo <nicolas.ortega@proescolombia.com>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

CDI Sumapaz

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Gmail **PROES INGENIERÍA <puentes.sumapaz2023@gmail.com>**

Radicación cronograma contrato de consultoría CCS-302-2022 ajustado de acuerdo al comité de seguimiento del 12 de mayo de 2023.

PROES INGENIERÍA <puentes.sumapaz2023@gmail.com> 17 de mayo de 2023, 16:16
Para: cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, Harold Hernandez <hchernandezb@gmail.com>
Cc: nelson.estrada@gobiernobogota.gov.co, Nicolás Ortega Restrepo <nicolas.ortega@proescolombia.com>

OF-ALCSMPZ-PTE-027-2023

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2023

Señores
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
Ing. Harold Hernández
Supervisor del contrato.
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Calle 19 Sur No. 69C -17, Sector 2,
Bogotá D.C

Referencia: **CONTRATO No. CCS-302-2022 "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA".**

Asunto: Radicación cronograma contrato de consultoría CCS-302-2022 ajustado de acuerdo al comité de seguimiento del 12 de mayo de 2023.

Respetado Ingeniero.

Cordial saludo.

Una vez realizada las inspecciones de campo el pasado 2 y 3 de marzo de 2023, labores desarrolladas por el equipo de topografía el 7 y 8 de marzo de 2023 e identificada la información disponible de la zona de estudio y la aprobación de las metodologías para el desarrollo de los estudios y diseños el 16 de mayo de 2023, se remite cronograma de trabajo ajustado de acuerdo con el acta de inicio suscrita el 1 de febrero de 2023, y teniendo en cuenta las consideraciones de los especialistas y profesionales para cada una de las estructuras según lo manifestado en el comité de seguimiento del 12 de mayo de 2023, donde se requiere la aprobación de los componentes RAI. Lo anterior para su revisión y aprobación.

Sin otro particular

Atentamente,

NICOLAS ORTEGA RESTREPO
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
PROES INGENIERIA SAS

Elaboró: HONA
Revisó: NOR

Anexos: Anexo 3 - Cronograma de actividades_V3_17052023
Anexo 3 - Cronograma de actividades_V3_17052023.pdf

Cordialmente,

PROES INGENIERÍA S.A.S

Calle 106 No. 57-23

Celular 3217661275

OF-ALCSMPZ-PTE-027-2023 Radicación ajuste a cronograma.pdf
757K

OF-ALCSMPZ-PTE-027-2023

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2023

Señores
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
Ing. Harold Hernández
Supervisor del contrato.
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Calle 19 Sur No. 69C -17, Sector 2,
Bogotá D.C

Referencia: **CONTRATO No. CCS-302-2022 "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA".**

Asunto: Radicación cronograma contrato de consultoría CCS-302-2022 ajustado de acuerdo al comité de seguimiento del 12 de mayo de 2023.

Respetado Ingeniero.

Cordial Saludo.

Una vez realizada las inspecciones de campo el pasado 2 y 3 de marzo de 2023, labores desarrolladas por el equipo de topografía el 7 y 8 de marzo de 2023 e identificada la información disponible de la zona de estudio y la aprobación de las metodologías para el desarrollo de los estudios y diseños el 16 de mayo de 2023, se remite cronograma de trabajo ajustado de acuerdo con el acta de inicio suscrita el 1 de febrero de 2023, y teniendo en cuenta las consideraciones de los especialistas y profesionales para cada una de las estructuras según lo manifestado en el comité de seguimiento del 12 de mayo de 2023, donde se requiere la aprobación de los componentes RAI. Lo anterior para su revisión y aprobación.

Sin otro particular

Atentamente,


NICOLAS ORTEGA RESTREPO
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
PROES INGENIERIA SAS

Elaboró: HONA
Revisó: NOR
Anexos: Anexo 3 - Cronograma de actividades_V3_17052023
Anexo 3 - Cronograma de actividades_V3_17052023.pdf

PROES INGENIERÍA S.A.S.


Calle 106 No. 57-23 Oficina 603
Tel: +57-1 253 40 80
Cel: +57 314 2977895
Bogotá, Colombia
www.proes.es - www.grupoamper.com

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO GOBAL**	**210 días**	**mié 1/03/23**	**mié 4/10/23**	
2		**Etapa previa - Analisis y recopilación de información - HITO 1**	**74,13 días**	**mié 1/03/23**	**mar 16/05/23**	
3		P.V Nazareth	74 días	mié 1/03/23	mar 16/05/23	
4		P.P Las Palmas	74 días	mié 1/03/23	mar 16/05/23	3CC
5		P.V La Playa	59 días	jue 16/03/23	mar 16/05/23	
6		P.V San Jose	59 días	jue 16/03/23	mar 16/05/23	
7		P.P Betania - Peñalisa	59 días	jue 16/03/23	mar 16/05/23	
8		P.P Peñalisa	59 días	jue 16/03/23	mar 16/05/23	
9		Socializacion	4 días	lun 27/03/23	jue 30/03/23	
10		**Etapa de estudios y diseños**	**181,25 día**	**jue 30/03/23**	**mié 4/10/23**	
11		**Etapa de estudios y diseños - HITO 2**	**117,25 día**	**jue 30/03/23**	**sáb 29/07/23**	
12		**Topografía**	**52,13 días**	**jue 30/03/23**	**mar 23/05/23**	
13		P.V Nazareth	5 días	**jue 30/03/23**	mié 5/04/23	9
14		P.P Las Palmas	5 días	mié 5/04/23	lun 10/04/23	13
15		P.V La Playa	5 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23	14
16		P.V San Jose	5 días	sáb 15/04/23	jue 20/04/23	15
17		P.P Betania - Peñalisa	5 días	jue 20/04/23	mar 25/04/23	16
18		P.P Peñalisa	5 días	mar 25/04/23	lun 1/05/23	17
19		Entrega de productos	20 días	mié 3/05/23	mar 23/05/23	18
20		**Estudio geologico**	**55,88 días**	**mar 16/05/23**	**mié 12/07/23**	
21		P.V Nazareth	10 días	mar 16/05/23	jue 25/05/23	13CC+1 día
22		P.P Las Palmas	10 días	mar 23/05/23	jue 1/06/23	14CC+1 día
23		P.V La Playa	10 días	vie 26/05/23	lun 5/06/23	15CC+1 día
24		P.V San Jose	10 días	jue 1/06/23	sáb 10/06/23	16CC+1 día
25		P.P Betania - Peñalisa	10 días	mar 6/06/23	jue 15/06/23	17CC+1 día
26		P.P Peñalisa	10 días	lun 12/06/23	mié 21/06/23	18CC+1 día
27		Entrega de productos	20 días	jue 22/06/23	mié 12/07/23	26
28		**Estudio de suelos y geotecnia**	**72,88 días**	**mar 16/05/23**	**sáb 29/07/23**	
29		P.V Nazareth	30 días	mar 16/05/23	jue 15/06/23	21CC
30		P.P Las Palmas	30 días	mar 23/05/23	jue 22/06/23	22CC
31		P.V La Playa	30 días	vie 26/05/23	lun 26/06/23	23CC
32		P.V San Jose	30 días	jue 1/06/23	sáb 1/07/23	24CC
33		P.P Betania - Peñalisa	30 días	mar 6/06/23	jue 6/07/23	25CC
34		P.P Peñalisa	30 días	lun 12/06/23	mié 12/07/23	26CC

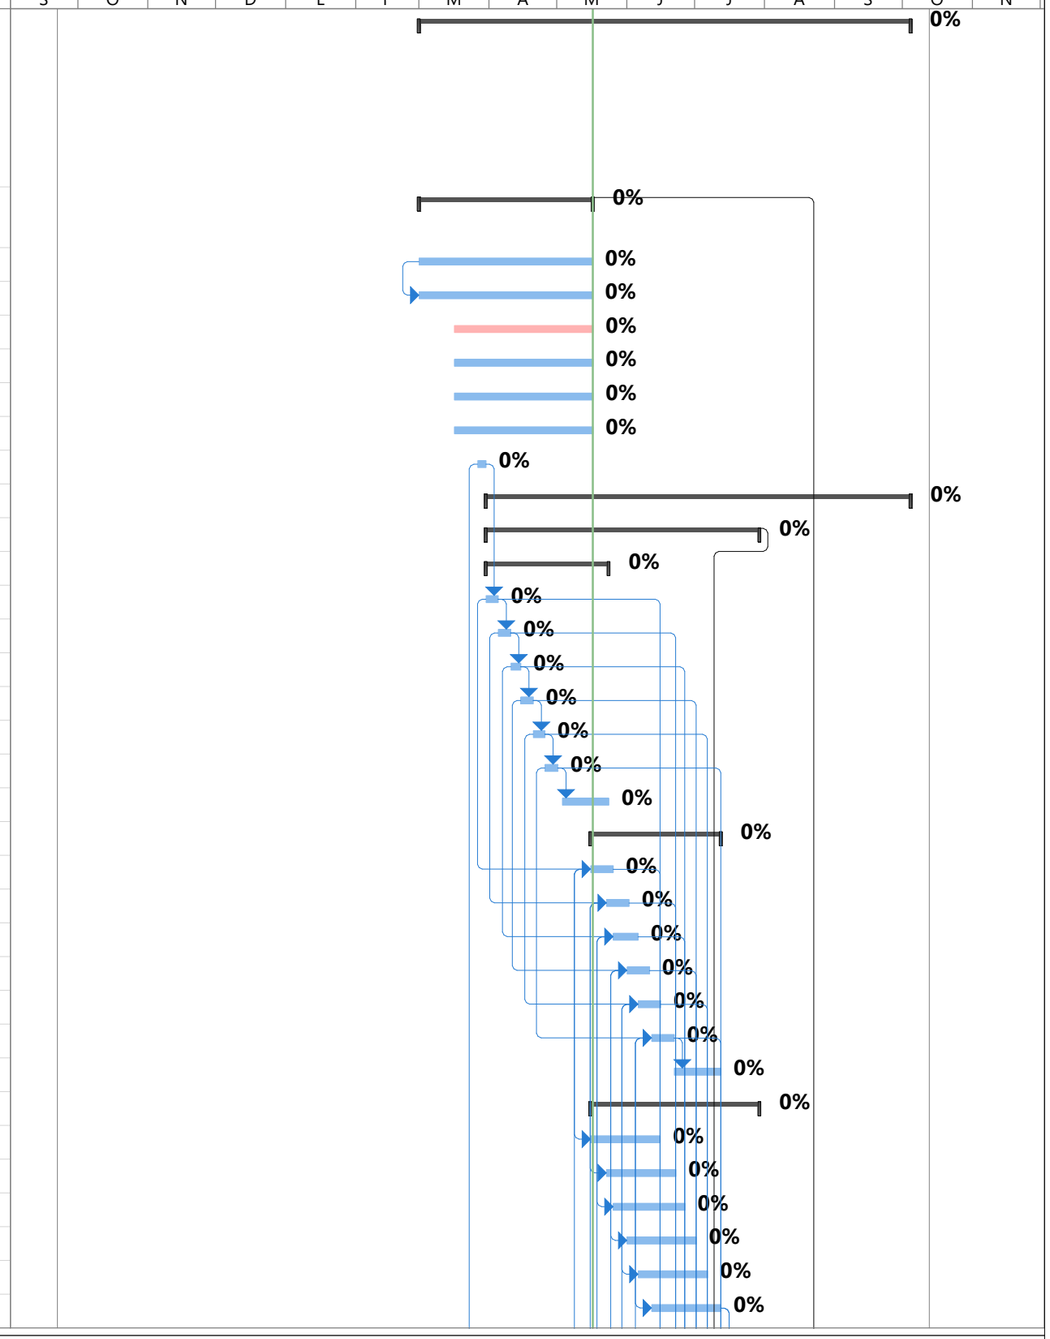


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		Entrega de productos	17 días	mié 12/07/23	sáb 29/07/23	34
36		**Estudio hidraulico, hidrologico y socavación**	**72,88 días**	**mar 16/05/23**	**sáb 29/07/23**	
37		P.V Nazareth	30 días	mar 16/05/23	jue 15/06/23	21CC
38		P.P Las Palmas	30 días	mar 23/05/23	jue 22/06/23	22CC
39		P.V La Playa	30 días	vie 26/05/23	lun 26/06/23	23CC
40		P.V San Jose	30 días	jue 1/06/23	sáb 1/07/23	24CC
41		P.P Betania - Peñalisa	30 días	mar 6/06/23	jue 6/07/23	25CC
42		P.P Peñalisa	30 días	lun 12/06/23	mié 12/07/23	26CC
43		Entrega de productos	17 días	mié 12/07/23	sáb 29/07/23	34
44		**Etapa de estudios y diseños - HITO 3**	**150,5 días**	**lun 3/04/23**	**mar 5/09/23**	
45		**Analisis estructural**	**72,88 días**	**jue 15/06/23**	**mié 30/08/23**	
46		P.V Nazareth	30 días	jue 15/06/23	lun 17/07/23	13;21;37
47		P.P Las Palmas	30 días	jue 22/06/23	lun 24/07/23	14;22;38
48		P.V La Playa	30 días	lun 26/06/23	jue 27/07/23	15;23;39
49		P.V San Jose	30 días	sáb 1/07/23	mié 2/08/23	16;24;40
50		P.P Betania - Peñalisa	30 días	jue 6/07/23	lun 7/08/23	17;25;41
51		P.P Peñalisa	30 días	mié 12/07/23	sáb 12/08/23	18;26;42
52		Entrega de productos	14 días	mié 16/08/23	mié 30/08/23	51FC+3 días
53		**Ambiental y forestal**	**47,88 días**	**mar 18/07/23**	**mar 5/09/23**	**11FC-15 días**
54		P.V Nazareth	20 días	mar 18/07/23	mar 8/08/23	46FC+1 día
55		P.P Las Palmas	20 días	mar 25/07/23	mar 15/08/23	47FC+1 día
56		P.V La Playa	20 días	vie 28/07/23	vie 18/08/23	48FC+1 día
57		P.V San Jose	20 días	jue 3/08/23	jue 24/08/23	49FC+1 día
58		P.P Betania - Peñalisa	20 días	mar 8/08/23	mar 29/08/23	50FC+1 día
59		P.P Peñalisa	20 días	lun 14/08/23	lun 4/09/23	51FC+1 día
60		Entrega de productos	1 día	mar 5/09/23	mar 5/09/23	59FC+1 día
61		**Social**	**142,25 días**	**lun 3/04/23**	**lun 28/08/23**	**9CC+3 días**
62		P.V Nazareth	20 días	**lun 3/04/23**	sáb 22/04/23	
63		P.P Las Palmas	20 días	**lun 24/04/23**	lun 15/05/23	62FC+1 día
64		P.V La Playa	20 días	mar 16/05/23	mar 6/06/23	63FC+1 día
65		P.V San Jose	20 días	mié 7/06/23	mar 27/06/23	64FC+1 día
66		P.P Betania - Peñalisa	20 días	mié 28/06/23	mié 19/07/23	65FC+1 día
67		P.P Peñalisa	20 días	jue 20/07/23	jue 10/08/23	66FC+1 día
68		Segunda socialización-grupo 1 y 2	1 día	lun 14/08/23	lun 14/08/23	67FC+3 días
69		Segunda socialización-grupo 3	1 día	mié 16/08/23	jue 17/08/23	68FC+2 días
70		Entrega de productos	10 días	jue 17/08/23	lun 28/08/23	67;69
71		**Etapa de estudios y diseños - HITO 4**	**76,88 días**	**lun 17/07/23**	**mié 4/10/23**	
72		**Presupuesto, APU y cantidades**	**61 días**	**lun 17/07/23**	**lun 18/09/23**	

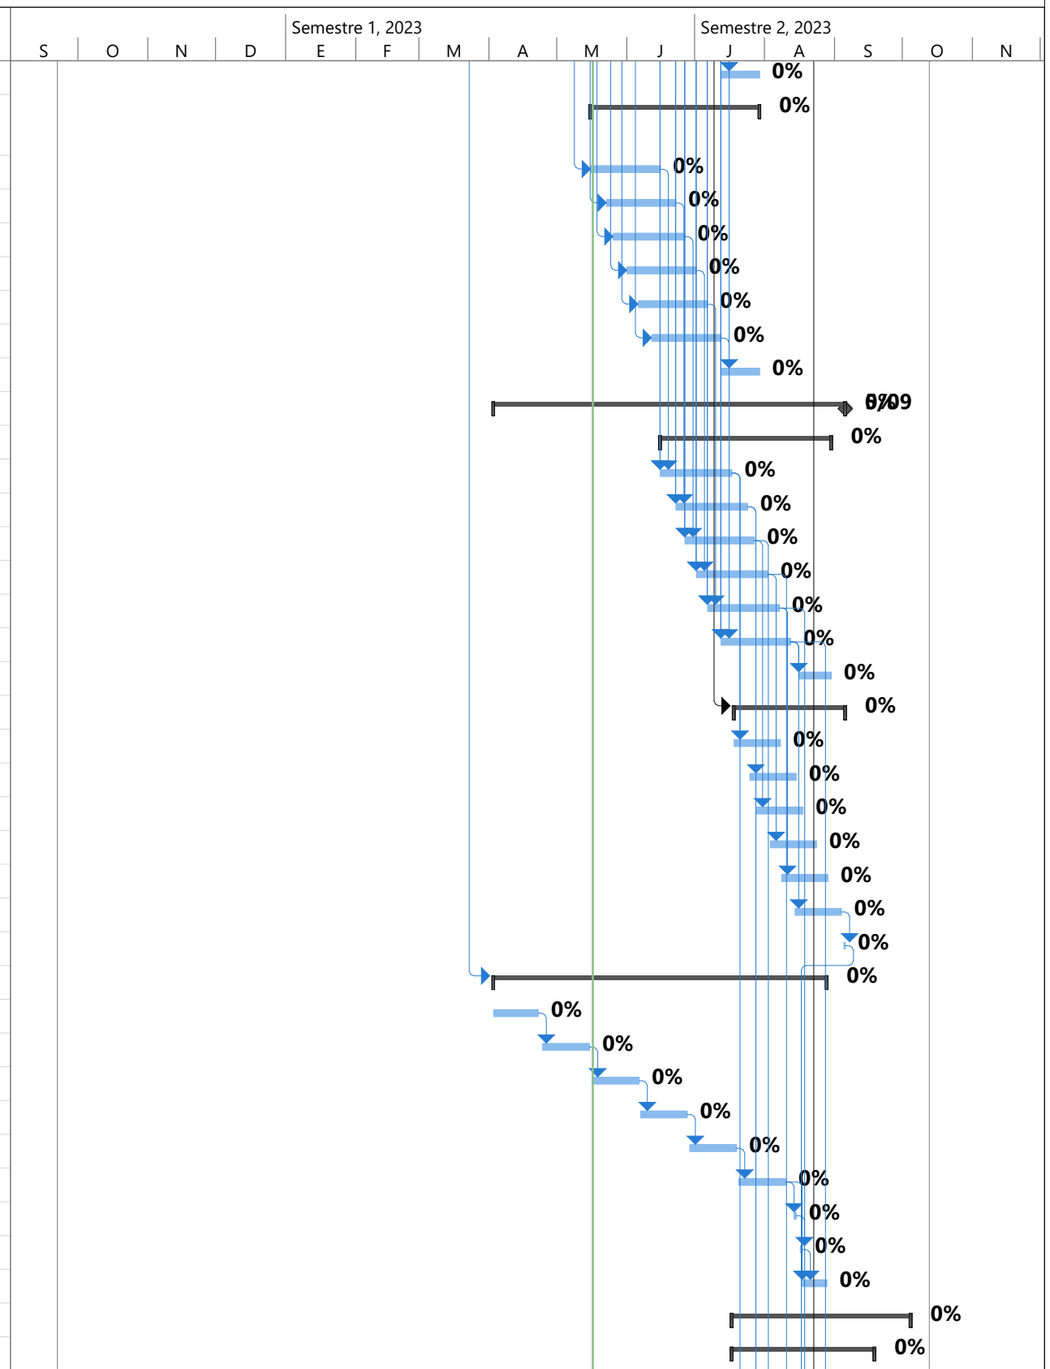

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
73		P.V Nazareth	8 días	lun 17/07/23	mar 25/07/23	46
74		P.P Las Palmas	8 días	mar 25/07/23	mié 2/08/23	73;47
75		P.V La Playa	8 días	mié 2/08/23	jue 10/08/23	74;48
76		P.V San Jose	8 días	jue 10/08/23	vie 18/08/23	75;49
77		P.P Betania - Peñalisa	8 días	vie 18/08/23	sáb 26/08/23	76;50
78		P.P Peñalisa	8 días	lun 28/08/23	mar 5/09/23	77;51
79		Entrega de productos	13 días	mar 5/09/23	lun 18/09/23	78
80		**Especificaciones técnicas.**	**15 días**	**sáb 19/08/23**	**mar 5/09/23**	**76FC+1 día**
81		P.V Nazareth	2 días	sáb 19/08/23	mar 22/08/23	
82		P.P Las Palmas	2 días	mar 22/08/23	jue 24/08/23	81
83		P.V La Playa	2 días	jue 24/08/23	sáb 26/08/23	82
84		P.V San Jose	2 días	sáb 26/08/23	lun 28/08/23	83
85		P.P Betania - Peñalisa	2 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23	84
86		P.P Peñalisa	2 días	mié 30/08/23	vie 1/09/23	85
87		Entrega de productos	3 días	vie 1/09/23	mar 5/09/23	86
88		**Tramites de licencias y permisos**	**40 días**	**jue 24/08/23**	**mié 4/10/23**	**2**
89		P.V Nazareth	40 días	**jue 24/08/23**	**mié 4/10/23**	60FC-12 días
90		P.P Las Palmas	40 días	**jue 24/08/23**	**mié 4/10/23**	89CC
91		P.V La Playa	40 días	**jue 24/08/23**	**mié 4/10/23**	90CC
92		P.V San Jose	40 días	**jue 24/08/23**	**mié 4/10/23**	91CC
93		P.P Betania - Peñalisa	40 días	**jue 24/08/23**	**mié 4/10/23**	92CC
94		P.P Peñalisa	40 días	**jue 24/08/23**	**mié 4/10/23**	93CC
95		Socialización de cierre-grupo 1 y 2	2,13 días	lun 11/09/23	mar 12/09/23	
96		Socialización de cierre-grupo 3	2,13 días	mié 13/09/23	jue 14/09/23	
97		**Liquidación-HITO 5**	**26 días**	**vie 15/09/23**	**jue 12/10/23**	
98		**Entrega de productos finales (aprobados) y liquidación del contrato**	**26 días**	**vie 15/09/23**	**jue 12/10/23**	
99		Entrega de productos finales e informe final del contrato de consultoría	15 días	vie 15/09/23	lun 2/10/23	96FC+1 día
100		Liquidación	8 días	mié 4/10/23	jue 12/10/23	99

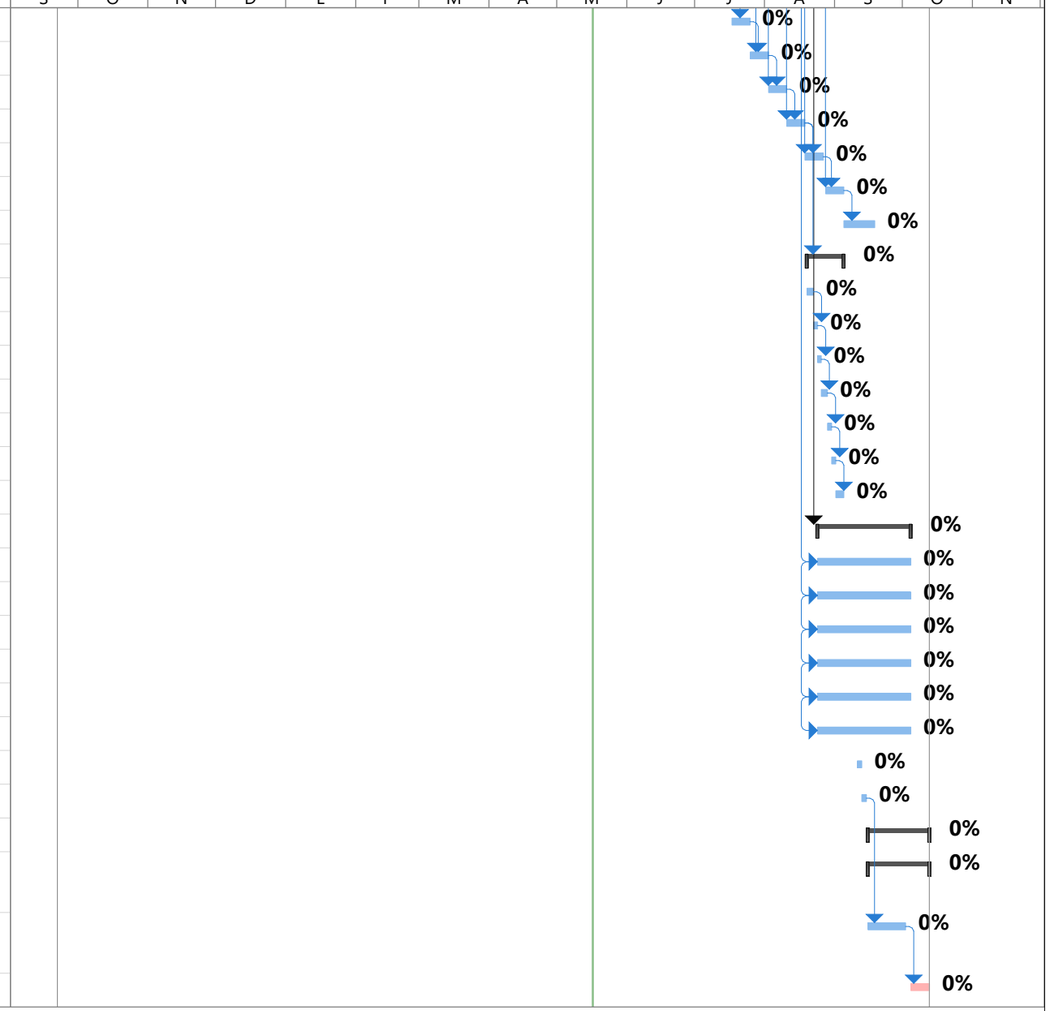

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
