1. FECHA ELABORACIÓN:	25	6	2023	2. No. INFORME	16	3. SEMANA No.	16
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	19/06/2023 AL 25/06/2023			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	11. PLAZO:	12	Meses	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5	3	2024	22. PLAZO:	12	Meses	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	Meses/días		25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ING. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 62.232.747,27	2,37%	100,00%	2,37%	100,00%	2,37%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 94.876.917,49	3,61%	81,00%	2,92%	36,05%	1,30%	-44,95%	-1,62%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 857.130.403,29	32,61%	8,00%	2,61%	9,36%	3,05%	1,36%	0,44%
MANPOSTERIA Y FRISOS	$ 67.044.377,69	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 659.895.591,50	25,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.370.591,48	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 35.349.760,00	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 25.408.509,57	0,97%	0,00%	0,00%	47,07%	0,46%	47,07%	0,46%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 126.700.117,78	4,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 93.153.731,11	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 550.538.021,48	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	$ 2.628.063.922,25	100%	14,54%	7,90%	14,81%	7,18%	0,27%	-0,72%

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	14,81%	14,38%	0,43%
Durante el periodo	0,00%	0,16%	-0,16%
Acumulado Actual	14,81%	14,54%	0,27%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,65%	7,90%
Valor de la Obra Programada	$ 17.118.848,34	$ 207.653.482,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,00%	7,18%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 0,00	$ 188.623.067,23

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

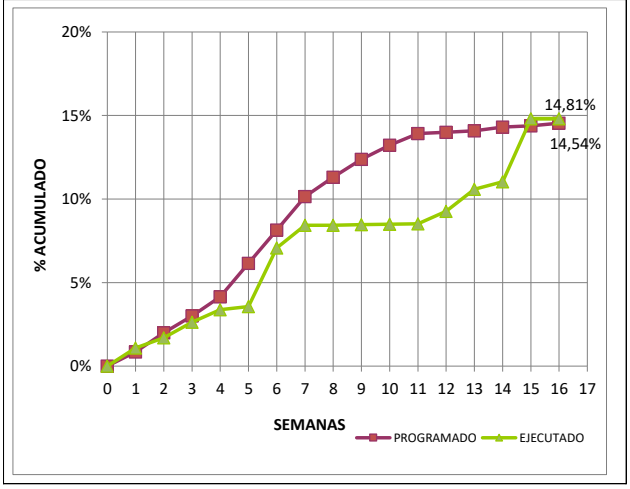

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	13	DEMOLEDOR ELECTRICO	0	LUNES	S
TÉCNICO ELÉCTRICO	0	HERRAMIENTA MENOR	24	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	2	PULIDORA	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1	RETROCARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	S
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	0	VIERNES	S
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	1	SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. TECNICO

1. Inicia el figurado de la parrilla de los pozos y se funde la placa inferior del pozo.
2. Se realiza el armado de formaleta para posteriormente fundir el pozo de inspección.
3. Se continúa con el armado y figurado de acero de refuerzo para los pedestales y contrapesos.
4. Finaliza la instalación de tubería de 12" de alcantarillado con su respectivo relleno con arena y material común compactado.
5. Se realiza acompañamiento diario por parte de interventoría, verificando que las actividades ejecutadas se realicen de manera segura y siguiendo las especificaciones técnicas.
6. Finalizan las excavaciones de la red pluvial a construir.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas en la obra.

F. FINANCIERA

1. Durante este periodo no se realizan modificaciones a las cantidades de obra que afecten o cambien el presupuesto inicial.

G. SOCIAL

1. Atención a la comunidad que se acerca a la obra con dudas y buscando oportunidades laborales.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. El profesional HSE, realiza recambio y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Por parte de interventoría se realiza inspección del estado de los EPP's y herramientas de los trabajadores continuamente.
4. Se realiza jornada de orden y aseo general.

I. AMBIENTAL

1. Durante este periodo no se realizan actividades del componente ambiental.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe no se han registrado pagos por ningún concepto al contratista ni a la interventoría.

K. JURIDICA

1. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0756-23.
2. En el período no se presentan modificaciones al contrato de obra 0757-23.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	25	6	2023	No. INFORME	16	SEMANA No. 16
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					
CONTRATO OBRA No:	0756-23			CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23			INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI	

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 20 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado y figurado de hierro para zapatas y pedestales.



FECHA FOTO: 21 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Relleno y compactación de zanja alcantarillado pluvial.



FECHA FOTO: 22 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de pedestales.



FECHA FOTO: 22 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta y fundida del pozo #1.



FECHA FOTO: 23 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de contrapesos.



FECHA FOTO: 24 de junio de 2023
DESCRIPCIÓN: Armado de formaleta y fundida del pozo #2.
