INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL SUPERVISOR EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME PARCIAL (SEMANAL) __17____ FINAL _____

PERIODO DE: 07 DE JUNIO A 13 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.	: 131 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN	: No. IP 013 de 2022
OBJETO	: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)".
LOCALIZACIÓN	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
VALOR INICIAL	: $59.800.000 (Cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos).
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	: $97.388.574 (Noventa y siete millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro mil pesos).
PLAZO INICIAL	: Hasta 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	: 8 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 31 de diciembre de 2022
SUSPENSIÓN No 1	: 8 de diciembre de 2023
REINICIO No 1	: 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 : 156 días

TERMINACION FINAL DEL CONTRARO :11 de noviembre de 2023

CONSULTOR INTERVENTORÍA : BRV Ingeniería y planeación SAS

CONTRATISTA : CONSORCIO JMS-C, conformado por JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC (70%) Y JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA (30%)

CONTRATO No. : 147 DE 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de méritos

PROCESO DE CONTRATACIÓN : No. 07 de 2022

OBJETO : Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

LOCALIZACIÓN Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

VALOR : $1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos)

PLAZO INICIAL : Hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE INICIO : 8 de septiembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 31 de diciembre de 2022

SUSPENSIÓN No 1 : 8 de diciembre de 2023

REINICIO No 1 : 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 **:** 156 días

TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO **:**11 de noviembre de 2023

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El presente informe semanal, pertenece a la semana número 17, dicha semana está comprendida entre el 07 de junio al 13 de junio de 2023.

A continuación, se relacionan las actividades y oficios enviados por la **consultoría** en el avance de la semana No. 17:

- El 09/06/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-211-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia a la UIF-CSJ, respuesta a observaciones EBA, según DEAJUIFO23-155.SEDE BOLÍVAR.
- El 09/06/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-212-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia a la UIF-CSJ, respuesta a observaciones EBA, según DEAJUIFO23-155. SEDE OROCUÉ.
- El 09/06/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-213-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia a la UIF-CSJ, remisión de pólizas actualizadas.
- El 09/06/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-214-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia a la UIF-CSJ, solicitud de retiro No 3 de anticipo.
- El 09/06/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-215-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia a la UIF-CSJ, solicitud de ingreso a la sede judicial ZIPAQUIRÁ.
- El 09/06/2023, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-216-2023, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia a la UIF-CSJ, Inicio de actividades complementarias del diagnóstico integral. Sede Zipaquirá.

A continuación, se relacionan las actividades contractuales y oficios enviados por la **interventoría,** en el avance de la semana No. 17 del contrato:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-200-2023	09/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-208-2023 - "Observaciones de forma al Plan de Ejecución BIM (PEB)"	Consultoría
BRV-INT-CSJ-201-2023	09/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-209-2023 - "Observaciones al diagnóstico arquitectónico Fase I y II Versión 0 para la Sede de Zipaquirá Cundinamarca."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-202-2023	09/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-215-2023. Solicitud de Ingreso a la Sede Judicial de Zipaquirá.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-203-2023	13/06/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-164 - Solicitud diligenciamiento documento	Consultoría

		"Localización de entregables".	
BRV-INT-CSJ-204-2023	13/06/2023	Alcance a los oficios DEAJUIFO23-154, DEAJUIFO23-155, DEAJUIFO23-156, DEAJUIFO23-158 y DEAJUIFO23-159 - Observaciones a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-205-2023	13/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-210-2023. Aprobación cronogramas de ejecución actualizados contra el reinicio No. 2 y modificatorio del contrato de consultoría No. 147 de 2022.	Consejo Superior de la Judicatura UIF

El día 13/06/2023 se hizo la aprobación de los cronogramas de ejecución actualizados contra el reinicio No. 2 y modificatorio del contrato de consultoría No. 147 de 2022.

1.2. GARANTÍAS

Tabla No. 1 garantías de la interventoría conforme al contrato

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 25/08/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	07/08/2023	$ 8.970.000.00
Calidad del servicio	04/02/2023	04/02/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	04/02/2026	$ 8.970.000.00

La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada en la plataforma SECOP II el 8/08/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se debían hacer a esta. Una vez realizados los ajustes y diferentes verificaciones, se aprobó en el SECOP II el día 25/08/2022.

Tabla No. 2 garantías de la interventoría conforme al acta de inicio

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 04/10/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	07/08/2023	$ 8.970.000.00
Calidad del servicio	04/02/2023	04/02/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	04/02/2026	$ 8.970.000.00

La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexos 1,2 y 3 al acta de inicio, fue cargada a la plataforma SECOP II el 26/09/2022 y aprobada en SECOP II el 04/10/2022.

- La póliza correspondiente al reinicio 1 fue cargada por la interventoría el 22/02/2023 y fue aprobada en SECOP II el 09/03/2023.
- La póliza correspondiente al reinicio 2 está siendo tramitada por la interventoría para su previa aprobación.

Tabla No. 3 garantías de la consultoría conforme al contrato

GARANTÍAS			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS **Aprobación 24/08/2022**			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	17/08/2022	30/06/2023	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/08/2022	30/06/2023	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/08/2022	31/12/2025	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	31/12/2022	31/12/2027	$ 301.191.224.50

- La póliza 14-44-101160700 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada a la plataforma SECOP II el 22/08/2022 y aprobada en SECOP II el 24/08/2022 por parte de la entidad.
- La actualización de póliza se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 05/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-060-2022, nuevamente se carga anexos 1 y 2 de la póliza al SECOP II con las indicaciones dadas por la entidad aún están pendiente de aprobación en la plataforma.

Tabla No. 4 garantías de la consultoría conforme al acta de inicio

GARANTÍAS <u>ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO</u>	
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS y MODIFICACIONES	
No Póliza	14-44-101160700
Aseguradora	Seguros del Estado S. A

Anexo	5		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	11/09/2023	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2022	11/09/2023	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/09/2022	11/03/2026	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	11/03/2023	11/03/2028	$ 301.191.224.50

- La actualización de póliza con relación al reinicio se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 21/02/2023 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-161-2023, con la espera final de la aprobación por parte del CSJ.
- Una vez suplido los requerimientos de la Entidad, la Póliza No. 14-44-101160700 fue aprobada por el CSJ.
- La póliza correspondiente al reinicio 1 fue cargada por la consultoría el 21/02/2023 y fue aprobada en SECOP II el 07/03/2023.
- La póliza correspondiente al reinicio 2 está siendo tramitada por la consultoría para su previa aprobación.

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el siguiente cuadro se presenta el avance del contrato concurrida la semana número 17, en el cuadro se discrimina el avance para cada 1 de las sedes que se piensan diseñar:

Tabla No.5 Avance físico programado y ejecutado

AVANCE FÍSICO ACUMULADO							
SEMANA No 17							
PERIODO DEL 7 A 13 JUNIO 2023							
GENERALIDADES			AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO		AVANCE Y/O ATRASO
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL PROGRAMADO	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL EJECUTADO	
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	13,31%	0,66%	23,42%	1,16%	0,50%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	13,30%	0,66%	23,59%	1,17%	0,51%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	4,96%	13,31%	0,66%	23,29%	1,16%	0,50%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	13,31%	1,89%	23,59%	3,35%	1,46%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	10,16%	1,69%	23,59%	3,92%	2,23%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	18,71%	4,75%	21,05%	5,34%	0,59%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	100,00%	6,29%	100,00%	6,29%	0,00%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	9,89%	2,24%	12,00%	2,71%	0,48%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**	**100,00%**		**18,83%**		**25,11%**	**6,27%**

El avance del contrato de consultoría físico total programado como lo describe la anterior tabla corresponde al 18,83% en la semana número 17 de trabajo, aun así, hasta el corte de la semana 17 se ha ejecutado un avance total de 25,11%, lo que genera un valor de avance positivo de 6,27%.

En el **anexo No. 1** del presente informe se muestra el cronograma actualizado aprobado por la **interventoría** que sirve como base para la elaboración de la **Tabla No. 5 Avance físico programado y ejecutado.**

Avance Físico. Contrato 147/2022:

Se presenta a continuación el análisis resumido efectuado para la determinación del avance físico de cada una de las sedes, así como el avance integral total del contrato.

Criterios para evaluación:

Teniendo en cuenta el número de sedes, así como de los entregables en cada una de las mismas, para la determinación de los avances físicos se definieron los siguientes criterios:

- Para cada sede se asigna un porcentaje (%) en peso de cada componente estableció en el Anexo Técnico de Entregables.

- Con lo anterior y el cronograma de ejecución del contrato, se establecen los avances físicos programados de cada actividad.
- Para la determinación del avance ejecutado de actividad para cada sede se asigna un porcentaje de acuerdo con el avance real estimado por el mismo CONSORCIO JMS-C.
- Para la determinación del avance integral, se estima el peso de cada sede en particular del contrato.

Peso en % de entregables para cada sede:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de las sedes de la Primavera, Concordia, Barrancominas, Orocué y Bolívar; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

PESO (%) POR COMPONENTE						
ÍTEM	ACTIVIDADES	SEDES				
		LA PRIMAVERA	CONCORDIA	BARRANCOMINAS	OROCUÉ	BOLÍVAR
		PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)
1	ASPECTOS GENERALES	1%	1%	1%	1%	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	6%	6%	6%	6%	6%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	8%	8%	8%	8%	8%
4	TOPOGRAFÍA	6%	6%	6%	6%	6%
5	ARQUITECTÓNICO	12%	12%	12%	12%	12%
5,3	Esquema Básico Arquitectónico					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico					
5,5	Diseño Arquitectónico					
5,6	Mobiliario					
5,7	Señalización					
5,8	Paisajismo					
6	ESTRUCTURAL	10%	10%	10%	10%	10%
7	HIDROSANITARIO	5%	5%	5%	5%	5%
8	ELÉCTRICO	6%	6%	6%	6%	6%
9	AÍRE ACONDICIONADO	4%	4%	4%	4%	4%

10	AMBIENTAL	3%	3%	3%	3%	3%
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4%	4%	4%	4%	4%
12	SEGURIDAD Y CONTROL	3%	3%	3%	3%	3%
13	TRANSPORTE VERTICAL	3%	3%	3%	3%	3%
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	10%	10%	10%	10%	10%
15	PRESUPUESTO	4%	4%	4%	4%	4%
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4%	4%	4%	4%	4%
17	LICENCIAS Y PERMISOS					
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO	3%	3%	3%	3%	3%
19	INFORMACIÓN CATASTRAL	5%	5%	5%	5%	5%
20	BIM	3%	3%	3%	3%	3%
		100%	100%	100%	100%	100%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. VULNERABILIDAD:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto a la vulnerabilidad del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

ÍTEM	ACTIVIDADES	PESO (%)
0	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	100%
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)	1,00%
2	VISITAS TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO OBRA EXISTENTE	1,00%
3	ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN	5,00%
3,1	Análisis y diagnóstico de Estudio de Patología de la Sociedad Colombiana de Ingenieros	
3,2	Análisis de estudios de suelos realizados	
3,3	Análisis de la información referente a diseños estructurales realizados	

4	VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL	4,00%
5	PATOLOGÍA ESTRUCTURAL (ADICIONAL)	
5,1	Definición de programa de ensayos	1%
5,2	Metodología de ensayos y programación general de actividades	3%
5,3	Ejecución de ensayos	7%
5,4	Ensayos de laboratorios y resultados	5%
5,5	Análisis de Resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	7%
6	ESTUDIO DE SUELOS	
6,2	Análisis de la información secundaria	2%
6,2	Definición de programada y metodología	3%
6,3	Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)	14%
6,4	Ensayos de laboratorio	8%
6,5	Estudio de suelos y recomendaciones	7%
7	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	7%
7,1	Memorias	
7,2	Planos	
8	ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO	1%
8,1	Alternativa 1	
7,2	Alternativa 2	
7,3	Alternativa 3	
9	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	15%
8,2	Memorias	
8,3	Planos	
10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO	2,50%
11	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	2,50%
12	PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA	2,00%
13	TRÁMITE DE LICENCIA	2,00%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. DIAGNÓSTICO:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto al diagnóstico del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

1	ASPECTOS GENERALES	0,50%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	3,50%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	2,00%
	Exploración e campo	

3,1	Ensayos y Resultados	
3,2	Geofísica	
3,3	Geotecnia	
3,4	Sísmica	
4	TOPOGRAFÍA	2,00%
4,1	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	
4,2	Levantamiento topográfico detallado de franja para las redes de conexión. Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá)	
5	ESTRUCTURAL	1,50%
5,1	Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación	
6	HIDROSANITARIO	
6,1	Definición de alternativas	0,50%
6,2	Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
6,3	Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
7	FIBRA ÓPTICA	1,50%
	Memoria técnica y planimetría para la conexión de fibra óptica	
8	AMBIENTAL	2,00%
8,1	Riesgos ambientales	
8,2	Informe de Arborización existente	
9	PRESUPUESTO	2,50%
	Presupuesto	
10	MANUAL DE ESPECIFICACIONES	2,50%
	Especificaciones de Obra	
11	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	1,50%
	1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial.	

	2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	
	3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).	
	4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.	
	5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	
	6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	
12	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO	
12,1	DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO	1,00%
12,2	DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE REDES ELÉCTRICAS	1,00%
12,3	DIAGNÓSTICO HIDROSANITARIO	1,00%
12,4	DIAGNÓSTICO SISTEMA CONTRAINCENDIOS	1,00%
13	PRUEBAS (ADICIONAL) - PRUEBAS E INFORMES	
13,1	SISTEMA HIDROSANITARIO	
13,1,1	Pruebas red de suministro de agua potable	3,00%
13,1,2	Pruebas de sistema sanitario	3,00%
13,1,3	Pruebas sistema de aguas lluvias	2,00%
13,1,4	Pruebas sistema bombeo	3,00%
13,2	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	
13,2,1	Pruebas redes sistema Contraincendios	8,00%
13,2,2	Pruebas sistema bombeo	7,00%
13,3	SISTEMA ELÉCTRICO	

13,3,1	Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia	15,00%
13,3,2	Pruebas redes eléctricas, voz y datos	25,00%
14	TRABAJOS EN ALTURA	
14,1	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	1,00%
14,2	2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	1,00%
15	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	
15,1	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1,00%
16	INFORMACIÓN CATASTRAL	
16,1	Diagnóstico Catastral	2,00%
16,2	Trámites saneamiento.	2,00%

Los porcentajes de avance físico en el periodo del contrato de **interventoría** son iguales a los del contrato de consultoría ya que los dos contratos van ligados y llevan el mismo avance de la siguiente manera:

Contrato 147 de 2022 Estudios y diseños:

Avance Físico Programado 18,83%

Avance Ejecutado físico 25,11%

Contrato 131 de 2022 Interventoría:

Avance Físico Programado 18,83%

Avance Ejecutado físico 25,11%

Avance sedes de Barrancominas, Bolívar, Concordia, la primavera y Orocué:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte	
Semana 17 del 07 de junio al 13 de junio del año 2023	Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
	Sin aval de interventoría
	Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
	Sin presentar por consultor
	Revisión interventoría

Entregables			Sedes				
N°	Tomos	Capítulos (mínimo:	Barrancominas (Guainía)	Bolívar (Cauca)	Concordia (Magdalena)	La Primavera (Vichada)	Orocué (Casanare).
1	Aspectos generales	Información general del contrato	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.
2	Informe base preliminar		Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-048-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-042-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-043-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-044-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.	Se remitío a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-045-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.
			Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-797 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-798 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-799 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-800 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.	Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-801 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.
			Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-090-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Barrancominas (Guainía) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-091-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Bolívar (Cauca) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-092-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Concordia (Magdalena) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-094-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Primavera (Vichada) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).	Se envío a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-093-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Orocué (Casanare) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).
			Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Barrancominas.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Bolívar.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Concordia.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de la Primavera.	Mediante oficio DEAJUIFO22-963 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Orocué.
			Mediante oficio BRV-INT-CSJ-196-2023 enviado el 31 de mayo de 2023 se dio Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-206-2023. Con asunto entrega del Informe Base Preliminar (IBP) de la sede de Barrancominas Guainía Versión 1 aprobado por la interventoría.				
5	Arquitectónico	Memoria Técnica arquitectónica	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 del 12 de mayo de 2023 se dio la Aprobación a los Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 del 12 de mayo de 2023 se dio la Aprobación a los Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 del 12 de mayo de 2023 se dio la Aprobación a los Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 del 12 de mayo de 2023 se dio la Aprobación a los Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 del 12 de mayo de 2023 se dio la Aprobación a los Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).
		Diseño arquitectónico	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-195-2023 del 19 de mayo de 2023 se dioAlcance al oficio BRV-INT-CSJ-192-2023 - Aprobación Esquemas Básicos Arquitectónicos y Memorias para las sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada).
		Diseño Mobiliario	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 se envío al consultor las observaciones remitidas por la entidad a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.

Avance sede de Zipaquirá Cundinamarca:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 2
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte		Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
Semana 17 del 07 de junio al 13 de junio del año 2023		Sin aval de interventoría
		Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
		Sin presentar por consultor
		Revisión interventoría

Entregables		Sedes	
Nº	Tomos	Capítulos (mínimos)	Neiva (Huila)
1	Aspectos generales	Información general del contrato	Se envió el oficio BRV-INT-CSJ-019-2022 donde la interventoría aprobo del plan de inversión del anticipo, plan de inversión general, cronograma y hojas de vida de consultoría.
2	Informe base preliminar		Se remitio a la entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-046-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.
			Se recibio por parte de la entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-789 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.
			Se envio a consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-089-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Neiva (Huila) para que se realicen las correciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).
			Mediante oficio DEAJUIFO22-968 Se dio la Aceptación aval condicionado por parte del CSJ al informe base preliminar de Neiva.
3	Arquitectónico	Memoria Técnica arquitectónica	Se envio el oficio No. BRV-INT-CSJ-201-2023 remitiendo observaciones al consultor al diagnóstico arquitectónico Fase I y II Versión 0 para la Sede de Zipaquirá Cundinamarca."
		Diseño arquitectónico	
		Diseño Mobiliario	
		Señalización	
		Paisajismo	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 3
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VULNERABILIDAD SISMICA

Periodo de corte		Por aprobar UIF (CSJ)
Semana 17 del 07 de junio al 13 de junio del año 2023		Sin aprobar (consultor está haciendo ajustes)
		Aprobado por interventoría y UIF (CSJ)
		Sin presentar por consultor
		Revisión interventoría

Entregables		Sedes		
Nº	Tomos	Capítulos mínimos	Contenido mínimo	Zipaquirá (Cundinamarca)
		1. Relación total de documentos existentes que se utilizaron en la construcción de la estructura original y los cuales fueron utilizados como parte de la evaluación y diseño.	1. Informe de revisión del estudio geotécnico, perfil sísmico y especificaciones de la NSR-10.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-177-2023 del 26 de abril de 2023 se dio Aprobación de recomendaciones para el complemento del Estudio de Patología entregado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para estudio de Vulnerabilidad – Sede Judicial Zipaquirá.
			2. Informe de revisión del Estudio de suelos.	Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-191-2023 del 12 de mayo de 2023 se dio Aprobación del informe de Metodología para el Estudio de Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

En cuanto al contrato de consultoría el avance financiero en la semana número 17 de trabajo se ha mostrado de la siguiente manera:

Tabla No. 6 Avance financiero programado vs ejecutado

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO							
SEMANA No 17							
PERIODO DEL 7 A 13 JUNIO 2023							
GENERALIDADES			FINANCIERO				
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	PROGRAMADO POR SEDE		EJECUTADO POR SEDE		AVANCE Y/O ATRASO
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 5.190.900,00	13,31%	$ 9.133.800,00	23,42%	10,11%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 5.187.000,00	13,30%	$ 9.200.100,00	23,59%	10,29%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 5.190.900,00	13,31%	$ 9.083.100,00	23,29%	9,98%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	$ 14.873.925,00	13,31%	$ 26.361.825,00	23,59%	10,28%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	$ 13.258.800,00	10,16%	$ 30.784.950,00	23,59%	13,43%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	$ 37.306.528,73	18,71%	$ 41.972.337,24	21,05%	2,34%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	$ 49.407.082,45	100,00%	$ 49.407.082,45	100,00%	0,00%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	$ 17.576.195,31	9,89%	$ 21.326.020,60	12,00%	2,11%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**	**100,00%**	**$ 147.991.331,49**	**18,83%**	**$ 197.269.215,29**	**25,11%**	**6,27%**

% de avance financiero semanal programado: 1,41%

% de avance financiero semanal ejecutado: 2,03%

% de avance financiero programado acumulado: 18,83%

% de avance financiero ejecutado acumulado: 25,11%

Se aclara que los porcentajes de avance ejecutado en la **tabla No. 6** no es en su totalidad de dinero que se ha cobrado o ha sido suministrado el Consejo Superior de la Judicatura, parte de este porcentaje se adquiere debido al dinero que ha invertido el consultor en este caso el consorcio JMS-C de sus propias arcas. Por lo cual, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 50%, que correspondiente al valor del anticipo.

El avance financiero de la **interventoría** no se calcula debido a que la empresa en este caso BRV Ingeniería y planeación SAS rechazo el anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos. Como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad:



BRV SAS INGENIERÍA Y PLANEACIÓN NIT 900.664.302-3

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS
GEOTECNIA – TRANSITO Y TRANSPORTE

BRV – 016 – 2022

Bogotá D. C., 27 de Julio de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección ejecutiva de administración judicial
Ciudad.

Asunto: **Rechazo al anticipo estipulado en la invitación pública del proceso IP-013-2022.**

Referencia: **Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barranco minas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**

Cordial saludo,

De acuerdo con el mensaje recibido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II el día 26 de julio de 2022, con objeto "ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL ANTICIPO", Yo Gabriel Andrés Velandia García, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. con NIT. 900.664.302-3, por medio de la presente **RECHAZO** el anticipo estipulado en la invitación pública del proceso en mención, para de este modo poder continuar con el trámite de inicio de dicho proceso.

Quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de la entidad.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Gabriel Andrés Velandia García
C.C. 80.074.228 de Bogotá D.C.
Representante legal BRV Ingeniería y Planeación SAS.

Ingenieros
Consultores – Estudios Geotécnicos y Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte
Carrera 76 No. 138 – 52, Oficina 405 en Bogotá D. C. – Colombia / *Tele fax:* 694 28 58
Cel: 301 545 44 55 / 310 780 27 53 *E-mail:* brvingenieria@gmail.com, contacto@brvingenieria.com

De igual manera se aclara que el pago de la interventoría se efectuara mediante LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL de cada proyecto, se solicitó la adición del contrato 131 de 2022 por el tiempo a extender el mismo (4 meses), adicional a los cinco (5) meses estipulados para ejecutar dicho contrato en un inicio, después se sumaron los valores de todas las sedes descontando la sede de Neiva Huila debido al retiro de dicha sede del proyecto, por ende se organizaron y pactaron los pagos de la siguiente manera:

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022			
Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Vr. Establecido contrato (7 sedes)	$ 11.960.000,00	5	$ 59.800.000,00
Vr. Ejecutado con 7 sedes	$ 11.960.000,00	3	$ 35.880.000,00
Vr. Ejecutado con 6 sedes	$ 10.251.429,00	2	$ 20.502.858,00
Saldo contrato a favor de la Entidad			$ 3.417.142,00

Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Adición requerida	$ 10.251.429,00	4	$ 41.005.716,00
Saldo condiciones iniciales contrato			$ 3.417.142,00
Valor adición del contrato			**$ 37.588.574,00**
Valor total del contrato			**$ 97.388.574,00**

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL (FACTURADO)

Dentro del presente informe no se reporta avance en gasto presupuestal, teniendo en cuenta que no se ha facturado a la fecha, debido a que se han generado gastos en el contrato No. 147 de 2022 pero que han sido asumidos por el **consultor**. De igual manera se aclara que ya se ha desembolsado el anticipo pactado por parte de la entidad el Consejo Superior de la Judicatura el día 23 de noviembre de 2022. En cuanto al contrato de **interventoría** no se reporta avances en gasto presupuestal ya que se han generado gastos, pero son asumidos por la interventoría debido a que se rechazó el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

Los recursos provenientes del pago del anticipo se invertirán conforme al documento del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-125-2022 del 7 de diciembre y CEGG-CON-147-52-126-2022 del 8 de diciembre de 2022 se remite a la interventoría la solicitud de retiro No 1 y retiro No 2. para su respectiva aprobación.

Retiro No 1	$34.072.714.00
Retiro No 2	$52.424.038.00
Total	$86.496.752.00

La interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS renuncio al pago del anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos, como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad.

Tabla No.7 Plan de inversión del anticipo consultoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICPO							
VALOR CONTRATO		$ 1.204.764.898,00					
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 602.382.449,00					
ÍTEM	CONCEPTO DE VALOR			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	VALOR 1. COSTO DIRECTO						
1,1	SALARIOS PERSONAL PROFESIONALES			$ 49.500.000,00	$ 53.500.000,00	$ 54.500.000,00	$ 56.500.000,00
1,2	SALARIOS PERSONAL ADMINSITRATIVO (Adminsitrador, secretaria, contador)			$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00
1,3	IMPUESTOS -POLIZAS			$ 7.013.178,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 4.000.000,00
1,4	GASTOS DE OFICINA (ARRIENDO/SERVICIOS)			$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA			$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD/DOTACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,7	ELABORACIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, IMPRESIONES/COMPRA DE INFORMACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,8	TRASLADOS/TRANSPORTE			$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 1.039.534,00
	TOTAL VALOR 1. COSTO DIRECTOS/MES			$ 78.190.625,00	$ 78.177.447,00	$ 78.177.447,00	$ 78.216.981,00
	TOTAL GASTOA DIRECTOS ACUMULADOS			$ 78.190.625,00	$ 156.368.072,00	$ 234.545.519,00	**$ 312.762.500,00**
2	VALOR 2. COSTOS POR PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARISO Y/O ADICIONALES						
	PROVISIÓN/MES			$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.990,00
	PROVISIÓN ACUMULADO			$ 4.562.988,00	$ 9.125.976,00	$ 13.688.964,00	**$ 18.251.954,00**
	SUB TOTAL . SUMA VALOR 1 + VALOR 2			$ 82.753.613,00	$ 82.740.435,00	$ 82.740.435,00	$ 82.779.971,00
	ACUMULADO SUB TOTAL (1+2)			$ 82.753.613,00	$ 165.494.048,00	$ 248.234.483,00	**$ 331.014.454,00**
3	VALOR 3. IVA (19% DE 1+2)						
	IVA/MES			$ 15.723.186,47	$ 15.720.682,65	$ 15.720.682,65	$ 15.728.194,49
	IVA ACUMULADO			$ 15.723.186,47	$ 31.443.869,12	$ 47.164.551,77	**$ 62.892.746,26**
	VALOR 4. PROVISIÓN PARA TRÁMITES, LICENCIAS, ETC						
4	"PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD"			$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00
	ACUMULADO PROVISIÓN			$ 52.118.812,00	$ 104.237.624,00	$ 156.356.436,00	**$ 208.475.248,00**
							$ 602.382.448,26

NOTAS:

1. Por ser integral el contrato de consultoría el rubro correspondiente a VALOR 2 "PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES", se estimó tentativo por mes, para ser utilizado según necesidades en cada una de las sedes. Este rubro tendrá una contabilidad de uso según requerimientos aprobados

2, La distribución de este rubro "VALOR 3 "PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD" , se distribuyó por sede tentativamente, ya que inicialmente se desconoce los requerimientos de pago para cada sede en particular. Los gastos de este rubro tendrá la contabilidad correspondiente

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el contrato de **consultoría** se efectuó el desembolso del anticipo por parte de la entidad contratante el 23 de noviembre de 2022.

Los rendimientos financieros generados por el desembolso del anticipo se desglosan a continuación. El reporte aquí consignado es a corte del presente informe (mayo de 2023), extraído

del extracto y de lo cual será consignado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al finalizar el retiro total del anticipo:

Periodo	Intereses del Periodo
1 Noviembre a 30 de Noviembre de 2022	$3.873.97
1 Diciembre a 31 de Diciembre de 2022	$16.718.94
1 de Enero a 31 de Enero de 2023	$14.470.51
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2023	$13.070.53
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2023	$14.471.34
1 de Abril a 30 de Abril de 2023	$14.004.99
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023	Sin reporte al corte del presente informe
Total a la fecha (Abril de 2023)	**$76.610.28**

En el contrato de **interventoría** no hay excedentes o rendimientos financieros debido a que la interventoría rechazo el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

En el contrato de **consultoría** se presenta a David Ricardo Araque Castiblanco, como personal con discapacidad y actualmente se encuentra adscrito a la empresa JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC. como parte del Consorcio JMS-C, y así se mantendrá a lo largo de la ejecución del contrato.

Personal en condición de discapacidad del consultor:

Nombre personal	EPS	ARL	Pensión
David Ricardo Araque Castiblanco.	Sanitas EPS	Positiva	Pensionado por invalidez

En el contrato de **interventoría** de acuerdo con el decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad" la interventoría declara que en su personal de trabajo no se encuentran personas en condición de discapacidad y cumple con la norma antes mencionada debido al bajo número total de trabajadores de la planta de personal del proponente.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Hasta la fecha de elaboración del presente informe semanal no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago tanto en el contrato de **consultoría** e **interventoría.**

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 17:

- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-200-2023 del 9 de junio de 2023 las observaciones de forma al Plan de Ejecución BIM (PEB).
- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-201-2023 del 9 de junio de 2023 las observaciones al diagnóstico arquitectónico Fase I y II Versión 0 para la Sede de Zipaquirá Cundinamarca.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-202-2023 del 9 de junio de 2023 la solicitud de Ingreso a la Sede Judicial de Zipaquirá de los profesionales de interventoría y consultoría.
- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-203-2023 del 13 de junio de 2023 la solicitud de diligenciamiento del documento “Localización de entregables”.
- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-204-2023 del 13 de junio de 2023 las observaciones a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.
- Se remitió a la entidad el consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-205-2023 del 13 de junio de 2023 la aprobación de los cronogramas de ejecución actualizados contra el reinicio No. 2 y modificatorio del contrato de consultoría No. 147 de 2022.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

- Demoras en respuestas por parte de las entidades involucradas en el proceso, para la obtención de permisos, licencias, factibilidad de servicios.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

La **consultoría** manifiesta el cumplimiento en los aspectos ambientales y sociales, estos serán presentados durante la ejecución del contrato en cumplimiento a los planes presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PGA-001-V0 y según tabla 3 del documento “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA” el cual fue revisado por la interventoría y aprobado mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-006-2022.

PROGRAMA 1. COMPRAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LOS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA 2. CONTROL AL CONSUMO DE PAPEL
PROGRAMA 3. GESTIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
PROGRAMA 4. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA 5. AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
PROGRAMA 6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 7. CAPACITACIÓN PERMANENTE

El PGAS para cada sede se hará entrega de éste de acuerdo en el cronograma de actividades aprobado por la interventoría siguiendo las etapas conforme se presenta en el cronograma aprobado por la interventoría.

La **interventoría** acoge dicho componente ambiental que será implementado al contrato No. 131 de 2022.

7.1 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cronograma estipulado por la consultoría en el plan de gestión de sistema de seguridad y salud en el trabajo, las reuniones de sana convivencia en el ambiente laboral y discriminación laboral; para la fecha final del presente informe ya se realizaron con el equipo de trabajo, como se muestra:

Tabla No.8 Cronograma de actividades del PSST

Fecha	Tema
Septiembre 30 de 2022	Sana Convivencia en el Ambiente Laboral. Buenas Prácticas Laborales
Noviembre 25 de 2022	Discriminación Laboral

La **interventoría** acogió dicho calendario para realizar y compartir con su equipo de trabajo las respectivas reuniones que ya fueron realizadas en las fechas estipuladas.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- La interventoría, cuenta con los protocolos y controles internos en la metodología de trabajo para el óptimo desarrollo de las actividades técnicas contractuales, para todas las sedes.
- La consultoría e interventoría en los diferentes documentos generados genera los mecanismos de control de calidad requeridos por la entidad.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SEGUIMIENTO SECOP II)

Los documentos mostrados a continuación son los cargados por parte de la interventoría en la plataforma del SECOP II:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado po
Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 1.pdf	Informe supervisor semana 1.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 2.pdf	Informe supervisor semana 2.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 3.pdf	Informe supervisor semana 3.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 4.pdf	Informe supervisor semana 4.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 5.pdf	Informe supervisor semana 5.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 6.pdf	Informe supervisor semana 6.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 7.pdf	Informe supervisor semana 7.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 8.pdf	Informe supervisor semana 8.pdf	Comprador
Informe supervisor semana 9.pdf	Informe supervisor semana 9.pdf	Comprador
Informe de supervision semana 10.pdf	Informe de supervision semana 10.pdf	Comprador
1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	Comprador
1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador
1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	Comprador
Informe supervisor mes 1.pdf	Informe supervisor mes 1.pdf	Comprador
Informe supervisor mes 2.pdf	Informe supervisor mes 2.pdf	Comprador
Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Comprador
14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	Comprador
15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	Comprador
Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Comprador
RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
R.P. 107823 U2.pdf	R.P. 107823 U2.pdf	Comprador
Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Comprador
INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Proveedor
Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Proveedor
Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Proveedor
Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Proveedor
BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	Proveedor
INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Proveedor
ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Proveedor
Plan de inversión General.pdf	Plan de inversión General.pdf	Proveedor
Plan Inversión de Anticipo.pdf	Plan Inversión de Anticipo.pdf	Proveedor

☐	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	Proveedor
☐	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	Proveedor
☐	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	Proveedor
☐	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	Proveedor
☐	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	Proveedor
☐	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Proveedor
☐	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Proveedor
☐	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Proveedor
☐	Acta Reinicio 1 Consultoriìa CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Consultoriìa CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor
☐	Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor

Hasta la fecha final del presente informe el contrato de interventoría y consultoría han cargado los correspondientes documentos en el sistema SECOP II encontrándose al día en el cargue de documentos.

10. OBSERVACIONES

- El contrato con el ajuste de la prórroga se encuentra en un avance adecuado de trabajo.
- El comité correspondiente a la presente semana se realizará el día 13 de junio de 2023.
- Se reiniciaron los contratos de interventoría y consultoría el día 31 de mayo de 2023.
- La Aprobación por la interventoría del plan ambiental, plan de calidad y plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) fue remitida a la entidad el Consejo Superior de la Judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-006-2022 enviado el 23 de septiembre de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 14 días, del mes de junio de 2023.



FABIAN MONTAÑEZ
Supervisor

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A LA INTERVENTORÍA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
CEGG-CON-147-52-215-2023	09/06/2023	Solicitud de Ingreso a Sede Judicial Zipaquirá	Interventoría
CEGG-CON-147-52-216-2023	09/06/2023	Inicio de actividades complementarias para diagnóstico integral SEDE ZIPAQUIRÁ	Interventoría
DEAJUIFO23-154	02/06/2023	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-195-2023. Observaciones Esquema Básico Arquitectónico Sede Barrancominas (Guainía).	Interventoría
DEAJUIFO23-155	02/06/2023	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-195-2023. Observaciones Esquema Básico Arquitectónico Sede Bolívar (Cauca).	Interventoría
DEAJUIFO23-156	02/06/2023	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-195-2023. Observaciones Esquema Básico Arquitectónico Sede Concordia (Magdalena).	Interventoría
DEAJUIFO23-158	02/06/2023	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-195-2023. Observaciones Esquema Básico Arquitectónico Sede La Primavera (Vichada).	Interventoría
DEAJUIFO23-159	02/06/2023	Respuesta comunicado BRV-INT-CSJ-195-2023. Observaciones Esquema Básico Arquitectónico Sede Orocué (Casanare).	Interventoría

CEGG-CON-147-52-210-2023	05/06/2023	Remisión del Cronograma Actualizado Atención a Comunicado BRV-INT-CSJ-198-2023 de 02/06/2023	Interventoría
DEAJUIFO23-165	06/06/2023	Entrega documentación: Especificaciones y certificaciones RETIE equipos de bombeo Sede Judicial Zipaquirá - Cundinamarca. Contrato de Consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-213-2023	06/06/2023	Remisión de Pólizas actualizadas Contrato 147-2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-214-2022	08/06/2023	Solicitud de Retiro No 3 Anticipo Contrato 147-2022.	Interventoría
DEAJUIFO23-171	09/06/2023	Atención comunicado BRV-INT-CSJ-196-2023: No aceptación de aprobación de interventoría y llamado de atención por la baja calidad en la revisión de documentos. Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO23-170	09/06/2023	Entrega de información catastral de Zipaquirá (Cundinamarca). Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO23-172	09/06/2023	Respuesta comunicado Aval Rotulo. Contrato de consultoría 147 de 2022 y contrato de interventoría 131 de 2022.	Interventoría

CEGG-CON-147-52-211-2023	09/06/2023	Respuesta a Observaciones indicadas en su comunicado DEAJUIFO23-155. Esquema Básico Arquitectónico V1. Sede Bolívar.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-212-2023	13/06/2023	Respuesta a Observaciones indicadas en su comunicado DEAJUIFO23-159. Esquema Básico Arquitectónico V1. Sede Orocué.	Interventoría

CORRESPONDENCIA DIRIGIDA AL CONSULTOR Y LA ENTIDAD:


Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-200-2023	09/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-208-2023 - "Observaciones de forma al Plan de Ejecución BIM (PEB)"	Consultoría
BRV-INT-CSJ-201-2023	09/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-209-2023 - "Observaciones al diagnóstico arquitectónico Fase I y II Versión 0 para la Sede de Zipaquirá Cundinamarca."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-202-2023	09/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-215-2023. Solicitud	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		de Ingreso a la Sede Judicial de Zipaquirá.	
BRV-INT-CSJ-203-2023	13/06/2023	Alcance al oficio DEAJUIFO23-164 - Solicitud diligenciamiento documento “Localización de entregables”.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-204-2023	13/06/2023	Alcance a los oficios DEAJUIFO23-154, DEAJUIFO23-155, DEAJUIFO23-156, DEAJUIFO23-158 y DEAJUIFO23-159 - Observaciones a los Esquemas Básicos Arquitectónicos (EBA) para las cinco sedes nuevas a diseñar.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-205-2023	13/06/2023	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-210-2023. Aprobación cronogramas de ejecución actualizados contra el reinicio No. 2 y	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		modificatorio del contrato de consultoría No. 147 de 2022.	

ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES SEDES APROBADO POR LA INTERVENTORÍA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE BARRANCOMINAS GUAINÍA**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
5		**GEOFISICA Y SUELOS**	jue 8/12/22	vie 27/01/23
6		**TOPOGRAFÍA**	jue 8/12/22	vie 27/01/23
7		**ARQUITECTÓNICO**	jue 16/02/23	lun 5/06/23
8		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
9		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/23**
10		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
11		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 7/06/23	mié 7/06/23
12		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
14		Anteproyecto Arquitectónico	jue 8/06/23	sáb 15/07/23
15		Diseño Arquitectónico	lun 17/07/23	mié 16/08/23
16		Mobiliario	mar 1/08/23	mié 16/08/23
17		Señalización	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Paisajismo	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		**ESTRUCTURAL**	dom 16/07/23	mié 30/08/23
20		**HIDROSANITARIO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
21		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
22		**AIRE ACONDICIONADO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
23		**AMBIENTAL**	vie 15/09/23	lun 30/10/23
24		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
25		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mar 15/08/23	vie 15/09/23
26		**TRANSPORTE VERTICAL**	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
27		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	mar 1/08/23	lun 16/10/23
28		**PRESUPUESTO**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
29		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**LICENCIAS Y PERMISOS**	vie 1/09/23	lun 16/10/23
31		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
32		**INFORMACION CATASTRAL**	vie 1/09/23	lun 30/10/23
33		**BIM**	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
34		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23
35				

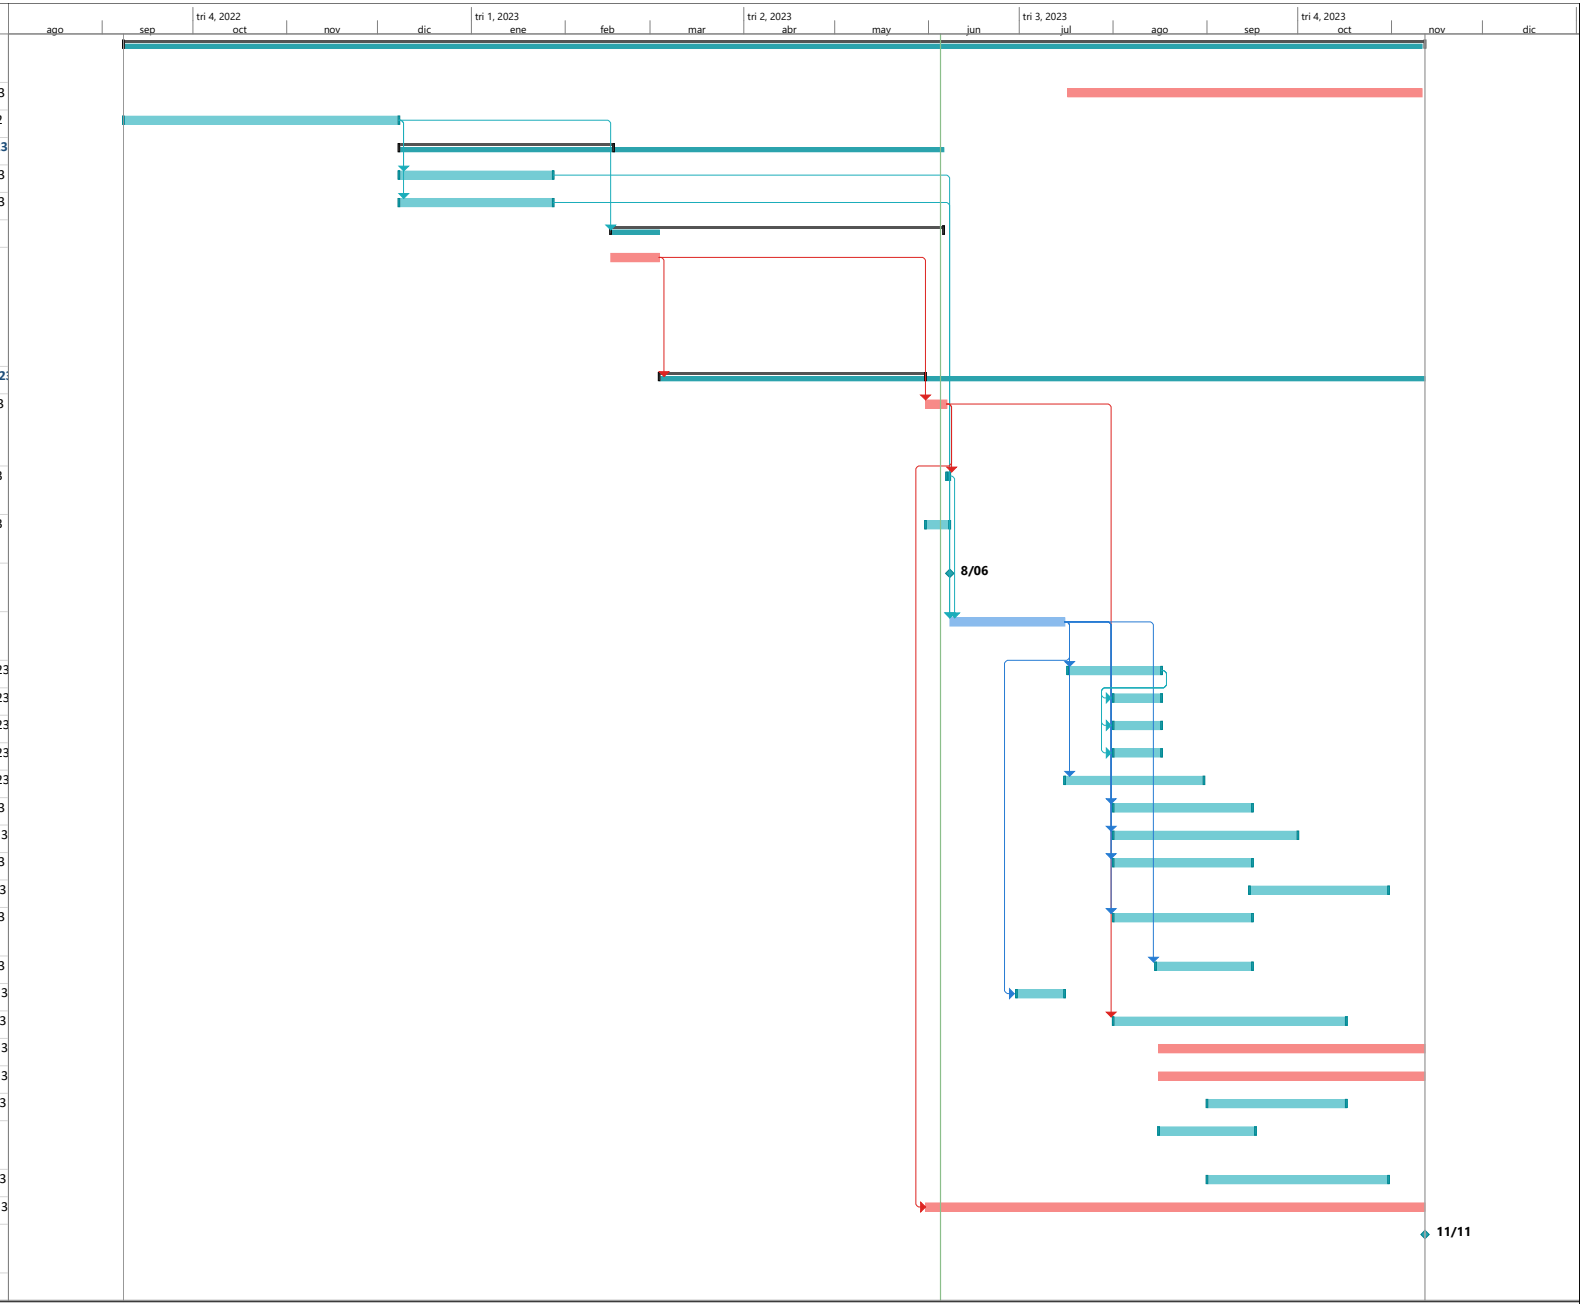


Proyecto: Sede Barrancominas Guainía
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE BOLÍVAR CAUCA**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	lun 17/07/23	lun 13/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
5		**GEOFISICA Y SUELOS**	jue 8/12/22	vie 27/01/23
6		**TOPOGRAFÍA**	jue 8/12/22	vie 27/01/23
7		**ARQUITECTÓNICO**	jue 16/02/23	lun 5/06/23
8		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	jue 16/02/23	vie 3/03/23
9		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/23**
10		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	mié 31/05/23	mar 6/06/23
11		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	mié 7/06/23	mié 7/06/23
12		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	jue 8/06/23	jue 8/06/23
14		Anteproyecto Arquitectónico	jue 8/06/23	sáb 15/07/23
15		Diseño Arquitectónico	lun 17/07/23	mié 16/08/23
16		Mobiliario	mar 1/08/23	mié 16/08/23
17		Señalización	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Paisajismo	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		**ESTRUCTURAL**	dom 16/07/23	mié 30/08/23
20		**HIDROSANITARIO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
21		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
22		**AIRE ACONDICIONADO**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
23		**AMBIENTAL**	vie 15/09/23	lun 30/10/23
24		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	mar 1/08/23	vie 15/09/23
25		**SEGURIDAD Y CONTROL**	mar 15/08/23	vie 15/09/23
26		**TRANSPORTE VERTICAL**	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
27		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	mar 1/08/23	lun 16/10/23
28		**PRESUPUESTO**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
29		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**LICENCIAS Y PERMISOS**	vie 1/09/23	lun 16/10/23
31		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
32		**INFORMACION CATASTRAL**	vie 1/09/23	lun 30/10/23
33		**BIM**	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
34		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23
35				

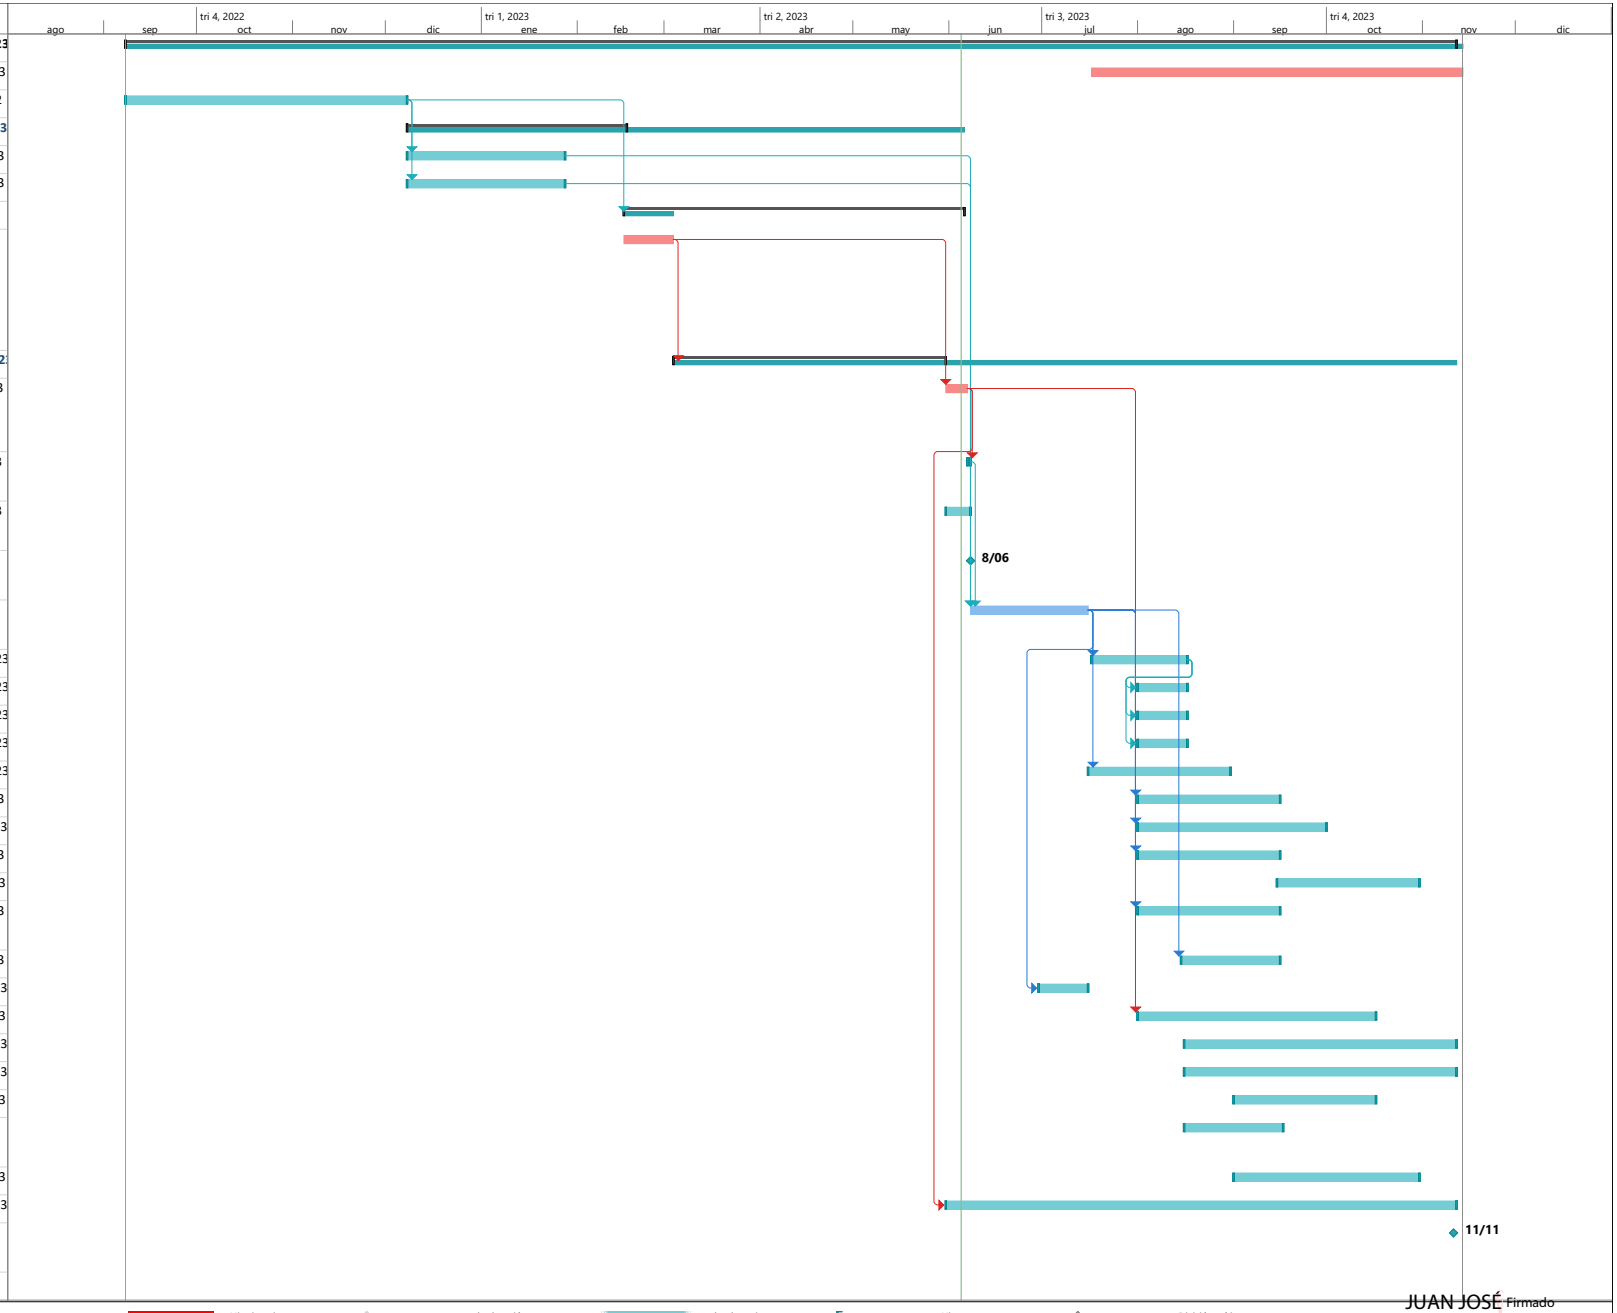


Proyecto: Sede Bolívar Cauca
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Dura	Comienzo	Fin
1		**SEDE CONCORDIA MAGDALENA**	**309 d**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	85 d	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	65 d	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**52 d**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
5		**GEOFISICA Y SUELOS**	38 d	jue 8/12/22	vie 27/01/23
6		**TOPOGRAFÍA**	38 d	jue 8/12/22	vie 27/01/23
7		**ARQUITECTÓNICO**	**78 d**	jue 16/02/23	lun 5/06/23
8		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	12 días	jue 16/02/23	vie 3/03/23
9		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 d**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**
10		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	5 días	mié 31/05/23	mar 6/06/23
11		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	1 día	mié 7/06/23	mié 7/06/23
12		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23
14		Anteproyecto Arquitectónico	27 días	jue 8/06/23	sáb 15/07/23
15		Diseño Arquitectónico	23 d	lun 17/07/23	mié 16/08/23
16		Mobiliario	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
17		Señalización	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Paisajismo	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		**ESTRUCTURAL**	34 d	dom 16/07/2	mié 30/08/23
20		**HIDROSANITARIO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
21		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	45 d	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
22		**AIRE ACONDICIONADO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
23		**AMBIENTAL**	32 d	vie 15/09/23	lun 30/10/23
24		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	34 días	mar 1/08/23	vie 15/09/23
25		**SEGURIDAD Y CONTROL**	24 d	mar 15/08/2	vie 15/09/23
26		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 d	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
27		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	55 d	mar 1/08/23	lun 16/10/23
28		**PRESUPUESTO**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
29		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**LICENCIAS Y PERMISOS**	32 d	vie 1/09/23	lun 16/10/23
31		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	24 días	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
32		**INFORMACION CATASTRAL**	42 d	vie 1/09/23	lun 30/10/23
33		**BIM**	119	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
34		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	0 días	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23
35					

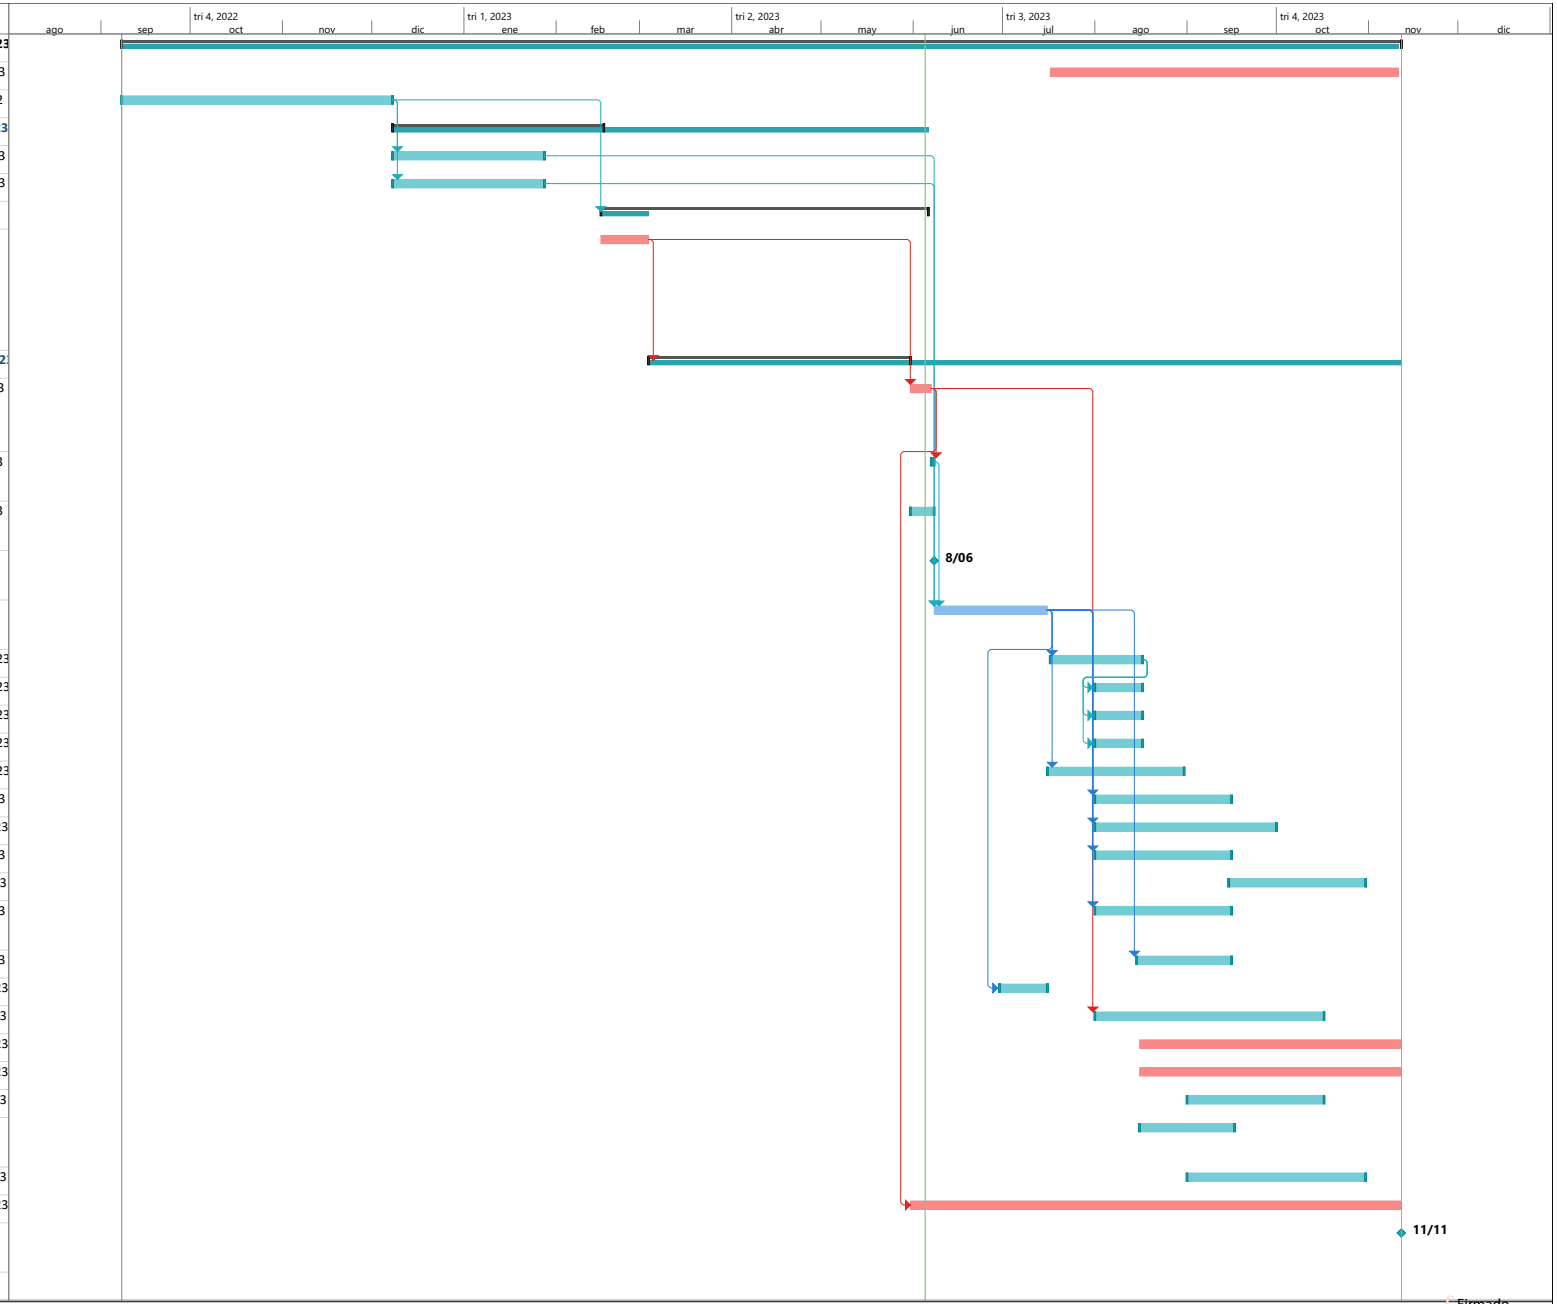


Proyecto: Sede Concordia Magdalena
Fecha: 31-03-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE LA PRIMAVERA VICHADA**	**309 d**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	85 d	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	65 d	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**52 d**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
5		**GEOFISICA Y SUELOS**	38 d	jue 8/12/22	vie 27/01/23
6		**TOPOGRAFÍA**	38 d	jue 8/12/22	vie 27/01/23
7		**ARQUITECTÓNICO**	**78 d**	jue 16/02/23	lun 5/06/23
8		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	12 días	jue 16/02/23	vie 3/03/23
9		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 d**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**
10		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	5 días	mié 31/05/23	mar 6/06/23
11		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	1 día	mié 7/06/23	mié 7/06/23
12		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23
14		Anteproyecto Arquitectónico	27 días	jue 8/06/23	sáb 15/07/23
15		Diseño Arquitectónico	23 d	lun 17/07/23	mié 16/08/23
16		Mobiliario	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
17		Señalización	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Paisajismo	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		**ESTRUCTURAL**	34 d	dom 16/07/2	mié 30/08/23
20		**HIDROSANITARIO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
21		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	45 d	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
22		**AIRE ACONDICIONADO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
23		**AMBIENTAL**	32 d	vie 15/09/23	lun 30/10/23
24		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	34 días	mar 1/08/23	vie 15/09/23
25		**SEGURIDAD Y CONTROL**	24 d	mar 15/08/2	vie 15/09/23
26		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 d	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
27		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	55 d	mar 1/08/23	lun 16/10/23
28		**PRESUPUESTO**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
29		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**LICENCIAS Y PERMISOS**	32 d	vie 1/09/23	lun 16/10/23
31		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	24 días	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
32		**INFORMACION CATASTRAL**	42 d	vie 1/09/23	lun 30/10/23
33		**BIM**	119	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
34		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	0 días	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23
35					

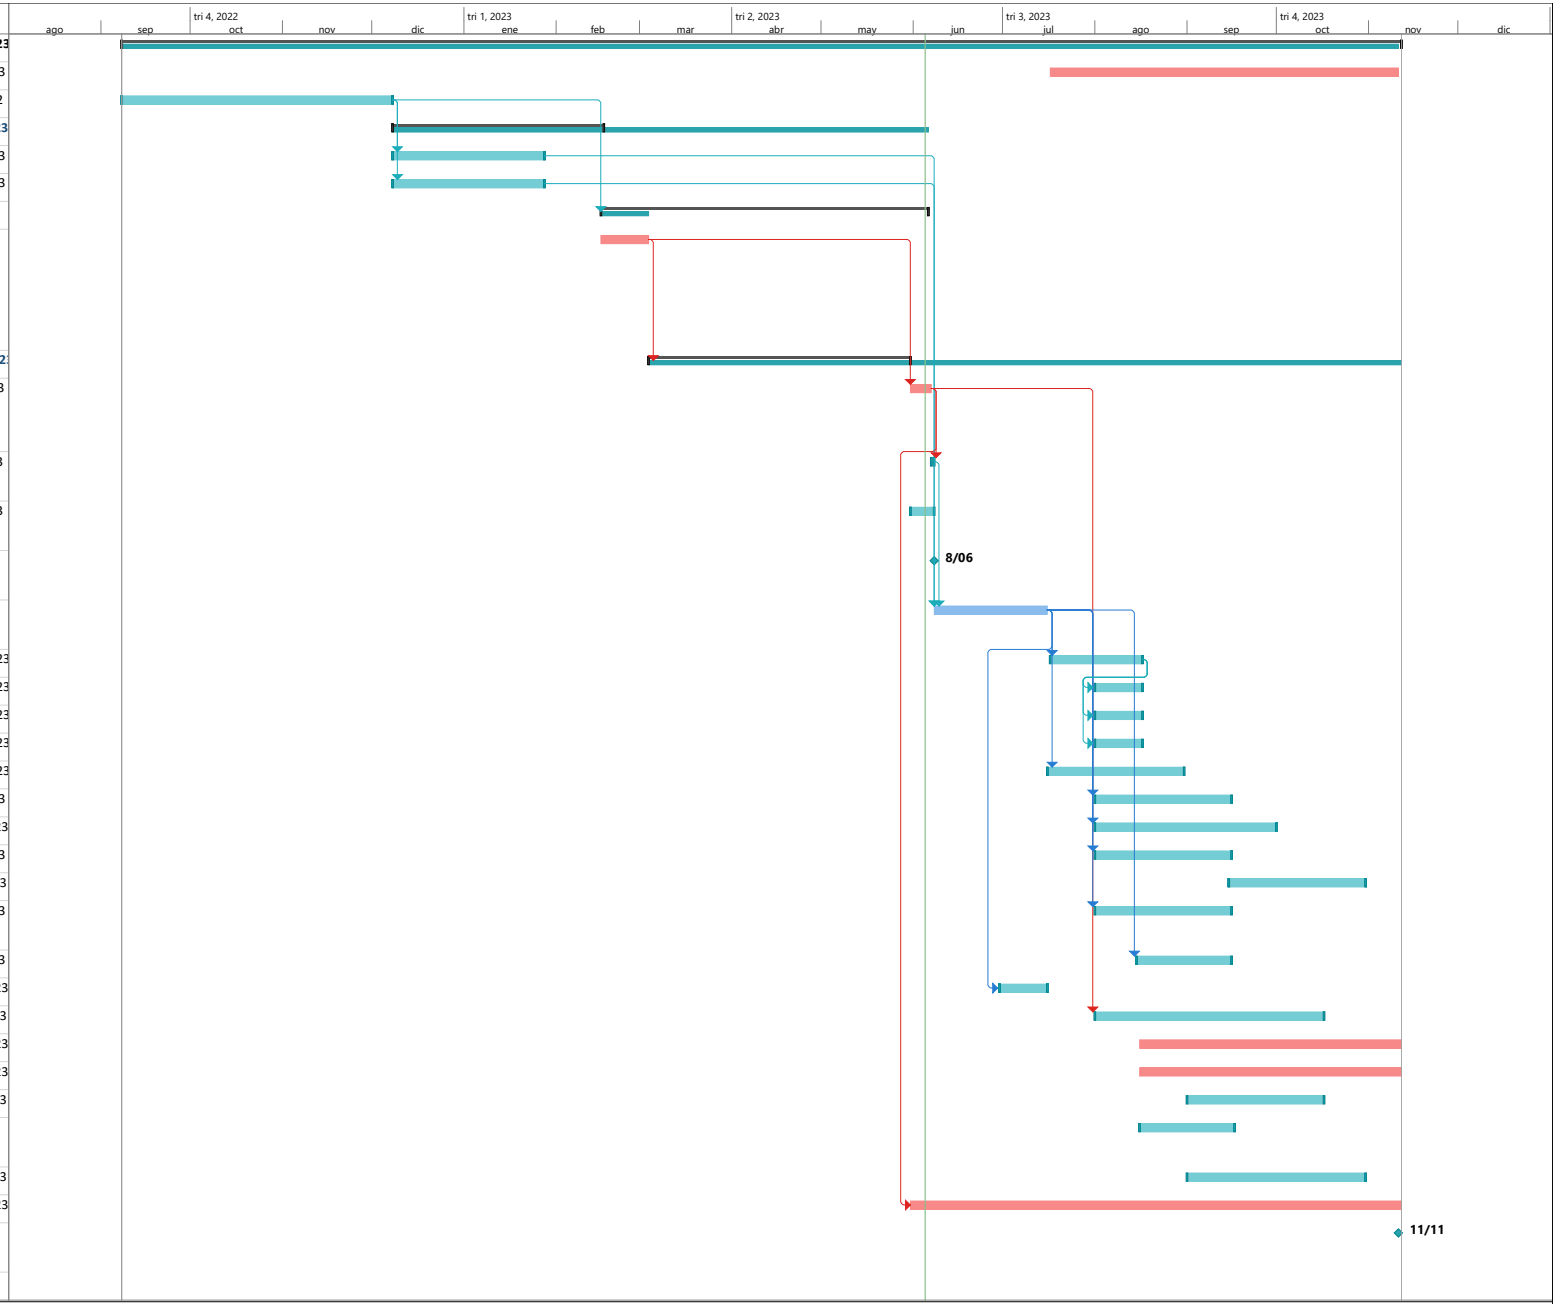


Proyecto: Sede La Primavera Vichada
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE OROCUE CASANARE**	**309 d**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ASPECTOS GENERALES**	85 d	lun 17/07/23	vie 10/11/23
3		**INFORME BASE PRELIMINAR**	65 d	jue 8/09/22	mié 7/12/22
4		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**52 d**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
5		**GEOFISICA Y SUELOS**	38 d	jue 8/12/22	vie 27/01/23
6		**TOPOGRAFÍA**	38 d	jue 8/12/22	vie 27/01/23
7		**ARQUITECTÓNICO**	**78 d**	jue 16/02/23	lun 5/06/23
8		Esquema Básico Arquitectónico (Elaboración, socialización entidad y municipios y entrega a la interventoría)	12 días	jue 16/02/23	vie 3/03/23
9		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 d**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**
10		Esquema Básico Arquitectónico (ajustes de observaciones)	5 días	mié 31/05/23	mar 6/06/23
11		Aprobación Esquema Básico Arquitectónico	1 día	mié 7/06/23	mié 7/06/23
12		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23
14		Anteproyecto Arquitectónico	27 días	jue 8/06/23	sáb 15/07/23
15		Diseño Arquitectónico	23 d	lun 17/07/23	mié 16/08/23
16		Mobiliario	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
17		Señalización	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
18		Paisajismo	12 d	mar 1/08/23	mié 16/08/23
19		**ESTRUCTURAL**	34 d	dom 16/07/2	mié 30/08/23
20		**HIDROSANITARIO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
21		**ELÉCTRICO Y COMPONENTES**	45 d	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
22		**AIRE ACONDICIONADO**	34 d	mar 1/08/23	vie 15/09/23
23		**AMBIENTAL**	32 d	vie 15/09/23	lun 30/10/23
24		**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INDENDIOS**	34 días	mar 1/08/23	vie 15/09/23
25		**SEGURIDAD Y CONTROL**	24 d	mar 15/08/2	vie 15/09/23
26		**TRANSPORTE VERTICAL**	12 d	vie 30/06/23	sáb 15/07/23
27		**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	55 d	mar 1/08/23	lun 16/10/23
28		**PRESUPUESTO**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
29		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	64 d	mié 16/08/23	sáb 11/11/23
30		**LICENCIAS Y PERMISOS**	32 d	vie 1/09/23	lun 16/10/23
31		**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	24 días	mié 16/08/23	sáb 16/09/23
32		**INFORMACION CATASTRAL**	42 d	vie 1/09/23	lun 30/10/23
33		**BIM**	119	mié 31/05/23	sáb 11/11/23
34		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	0 días	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23
35					

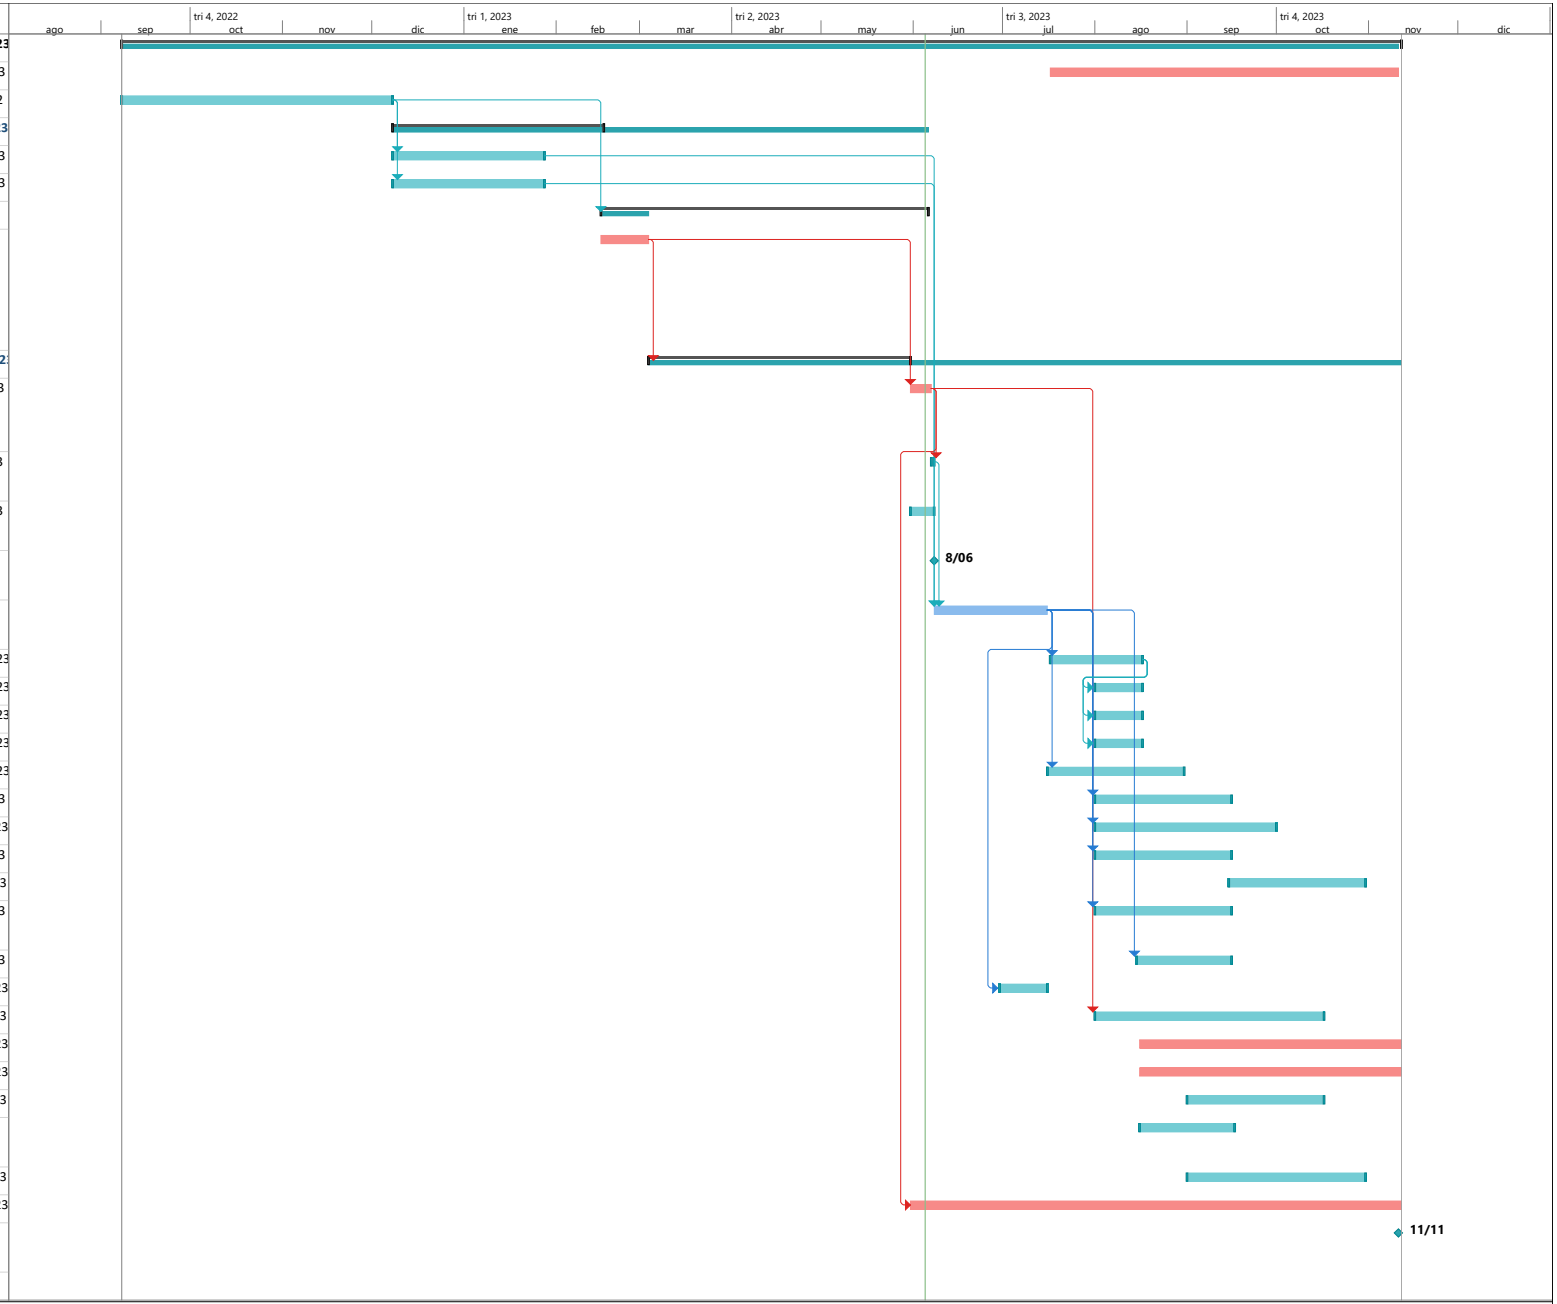


Proyecto: Sede Orocué Casanare
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA DIAGNÓSTICO**	**309 días**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**ACTIVIDADES PREVIAS**	**231 días**	**jue 8/09/22**	**mié 26/07/23**
3		RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA ENTREGADA POR ENTIDAD	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4		VISITA TECNICA DETALLADA	7 días	jue 8/09/22	vie 16/09/22
5		SOLICTUD DE INFORMACIÓN BÁSICA A TERCEROS (Planeación municipal , servicios públicos, bomberos, ambiental y/o otros	12 días	jue 8/09/22	vie 23/09/22
6		ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE	12 días	lun 26/09/22	mar 11/10/22
7		**ASPECTOS GENERALES**	18 días	lun 3/07/23	mié 26/07/23
8		**INFORME BASE PRELIMINAR**	23 días	jue 8/09/22	sáb 8/10/22
9		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**52 días**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
10		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**63 días**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/23**
11		**DEFINICIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EPZ**	6 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
12		Terminación del Contrato (Sin prór	0 días	jue 8/06/23	jue 8/06/23
13		**GEOFÍSICA Y SUELOS**	**51 días**	**lun 12/06/23**	**lun 21/08/23**
14		Exploración de campo	16 días	lun 12/06/23	lun 3/07/23
15		Ensayos y Resultados	13 días	mar 4/07/23	jue 20/07/23
16		Geofísica	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23
17		Geotécnia	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23
18		Sísmica	22 días	vie 21/07/23	lun 21/08/23
19		**TOPOGRAFÍA**	23 días	lun 12/06/23	mié 12/07/23
20		**ESTRUCTURAL (Anclajes casetón)**	22 días	**jue 27/07/23**	**vie 25/08/23**
21		**HIDROSANITARIO**	24 días	**mar 22/08/23**	**vie 22/09/23**
22		**FIBRA ÓPTICA**	34 días	**mar 22/08/23**	**vie 6/10/23**
23		**AMBIENTAL**	34 días	**mar 1/08/23**	**vie 15/09/23**
24		**PRUEBAS (ADICIONALES) - PRUEBAS E INFORMES**	**55 días**	**lun 12/06/23**	**dom 27/08/23**
25		**SISTEMA HIDROSANITARIO**	**46 días**	**lun 12/06/23**	**sáb 12/08/23**
26		Pruebas red de suministro de agua potable	12 días	lun 12/06/23	mar 27/06/23
27		Pruebas de sistema sanitario	11 días	mié 28/06/23	mié 12/07/23
28		Pruebas sitema deaguas lluvia	12 días	jue 13/07/23	vie 28/07/23
29		Pruebas sistema bombeo	12 días	vie 28/07/23	sáb 12/08/23
30		**SISTEMA CONTRAINCENDIOS**	**10 días**	**sáb 12/08/23**	**dom 27/08/23**
31		Pruebas redes sistema contraincendio	12 días	sáb 12/08/23	dom 27/08/23
32		Pruebas sistema bombeo	4 días	vie 18/08/23	mié 23/08/23
33		**SISTEMA ELÉCTRICO**	**36 días**	**lun 12/06/23**	**lun 31/07/23**
34		Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia	7 días	lun 12/06/23	mar 20/06/23
35		Pruebas redes electricas,voz y datos	30 días	mar 20/06/23	lun 31/07/23
36		**INFORME DE TRABAJO DE ALTURAS**	22 días	jue 31/08/23	vie 29/09/23
37		**PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	23 días	jue 8/06/23	lun 10/07/23
38		**INFORMACION CATASTRAL**	45 días	mié 12/07/23	mar 12/09/23
39		**PRESUPUESTO**	32 días	lun 9/10/23	mar 21/11/23
40		**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	32 días	vie 29/09/23	sáb 11/11/23
41		**LICENCIAS Y PERMISOS**	67 días	sáb 12/08/23	sáb 11/11/23
42		1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial.	34 días	sáb 12/08/23	mié 27/09/23
43		2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	23 días	sáb 12/08/23	mar 12/09/23
44		3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).	67 días	sáb 12/08/23	sáb 11/11/23
45		4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.	45 días	mar 12/09/23	sáb 11/11/23
46		5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	45 días	mar 12/09/23	sáb 11/11/23
47		6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	45 días	mar 12/09/23	sáb 11/11/23
48		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	0 días	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23

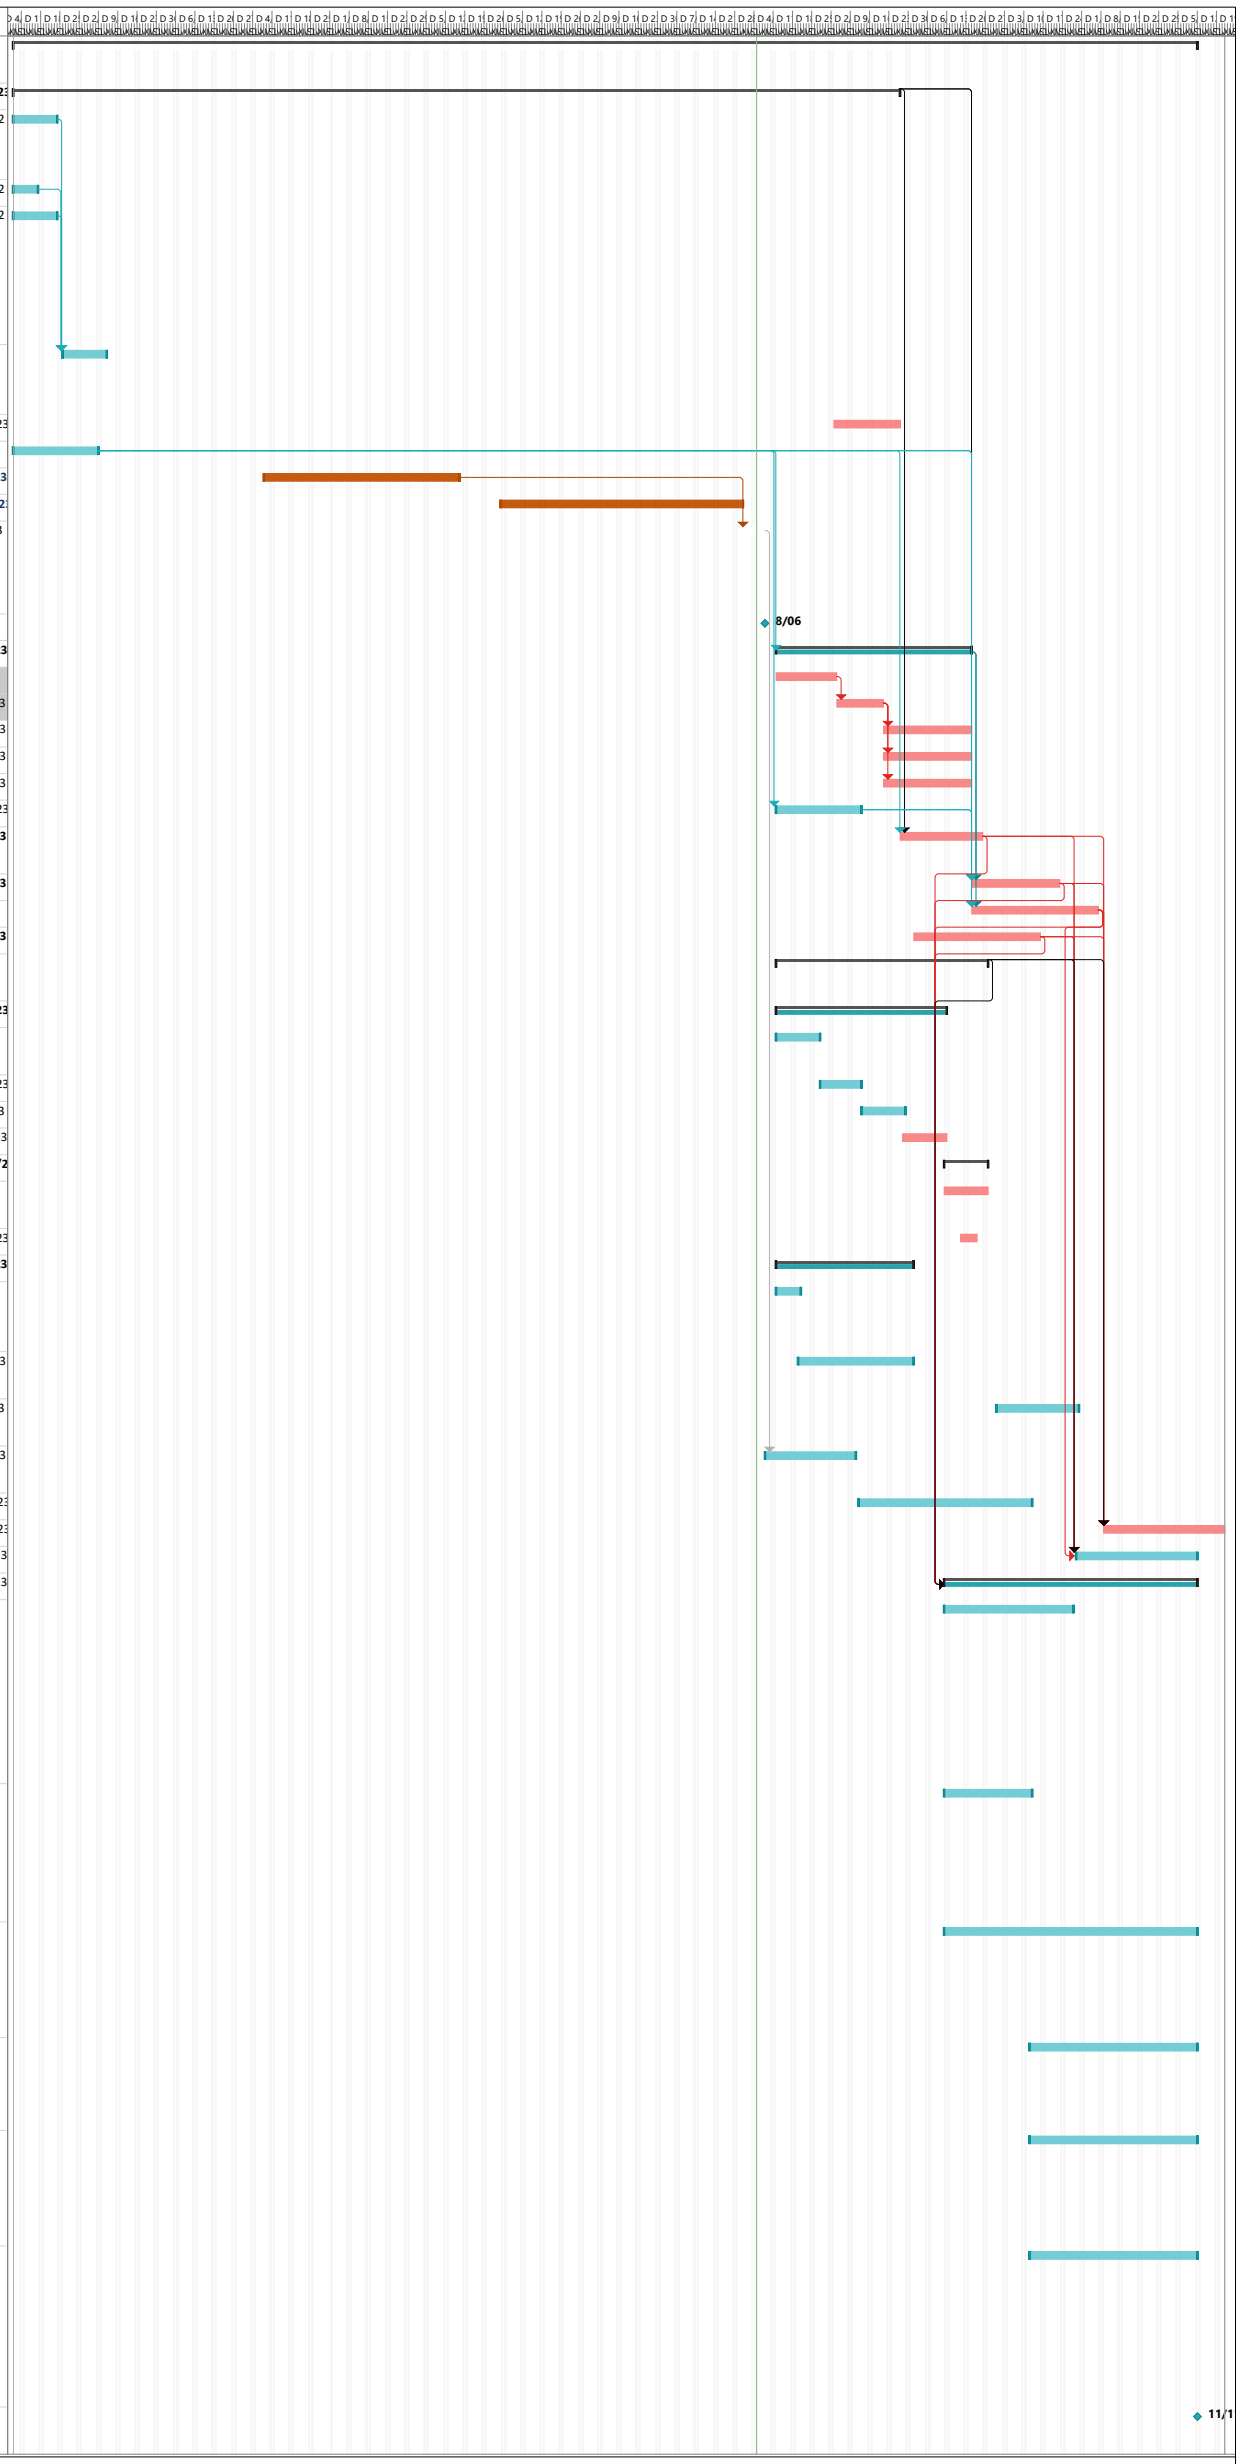


Proyecto: Zipaquirá Diagnóstic Cundinamarca
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1		**SEDE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA VULNERABILIDAD**	**jue 8/09/22**	**sáb 11/11/23**
2		**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)**	jue 8/09/22	vie 23/09/22
3		**VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMEINTO OBRA EXISTENTE**	jue 8/09/22	vie 23/09/22
4		**ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN**	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
5		**VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL**	vie 23/09/22	sáb 8/10/22
6		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 1**	**jue 8/12/22**	**jue 16/02/23**
7		**PERIODO DE SUSPENSIÓN 2**	**sáb 4/03/23**	**mar 30/05/2**
8		Trámite de Solicitud de Prórroga del Contrato	mié 31/05/23	mié 7/06/23
9		Terminación del Contrato (Sin prórroga)	vie 9/06/23	vie 9/06/23
10		**PATOLOGÍA ESTRUCTURAL**	**mié 31/05/2**	**lun 24/07/23**
11		Definición de programa de ensayos	mié 31/05/23	mié 7/06/23
12		Metodologia de ensayos	mié 31/05/23	mié 7/06/23
13		Ejecución de ensayos	lun 12/06/23	mar 27/06/23
14		Ensayos de laboratorios y resultados	mié 28/06/23	lun 17/07/23
15		Análisis de resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	mar 18/07/23	lun 24/07/23
16		**ESTUDIOS DE SUELOS**	**mié 31/05/2**	**mar 29/08/2**
17		Análisis de la información secundaria	mié 31/05/23	mié 7/06/23
18		Definición de programana y metodología	jue 8/06/23	jue 15/06/23
19		Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)	vie 16/06/23	vie 7/07/23
20		Ensayos de laboratorio	lun 10/07/23	mié 26/07/23
21		Estudio de suelos y recomendaciones	jue 27/07/23	mar 29/08/23
22		**ESTUDIO DE VULNERABILIDAD**	lun 24/07/23	mié 23/08/23
23		**ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO**	jue 24/08/23	jue 31/08/23
24		**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**	vie 1/09/23	lun 2/10/23
25		**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFORZAMIENTO**	sáb 30/09/23	vie 20/10/23
26		**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	sáb 30/09/23	vie 20/10/23
27		**PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA**	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
28		**TRAMITE DE LICENCIA**	mar 3/10/23	sáb 11/11/23
29		TERMINACIÓN DEL CONTRATO	sáb 11/11/23	sáb 11/11/23
30				

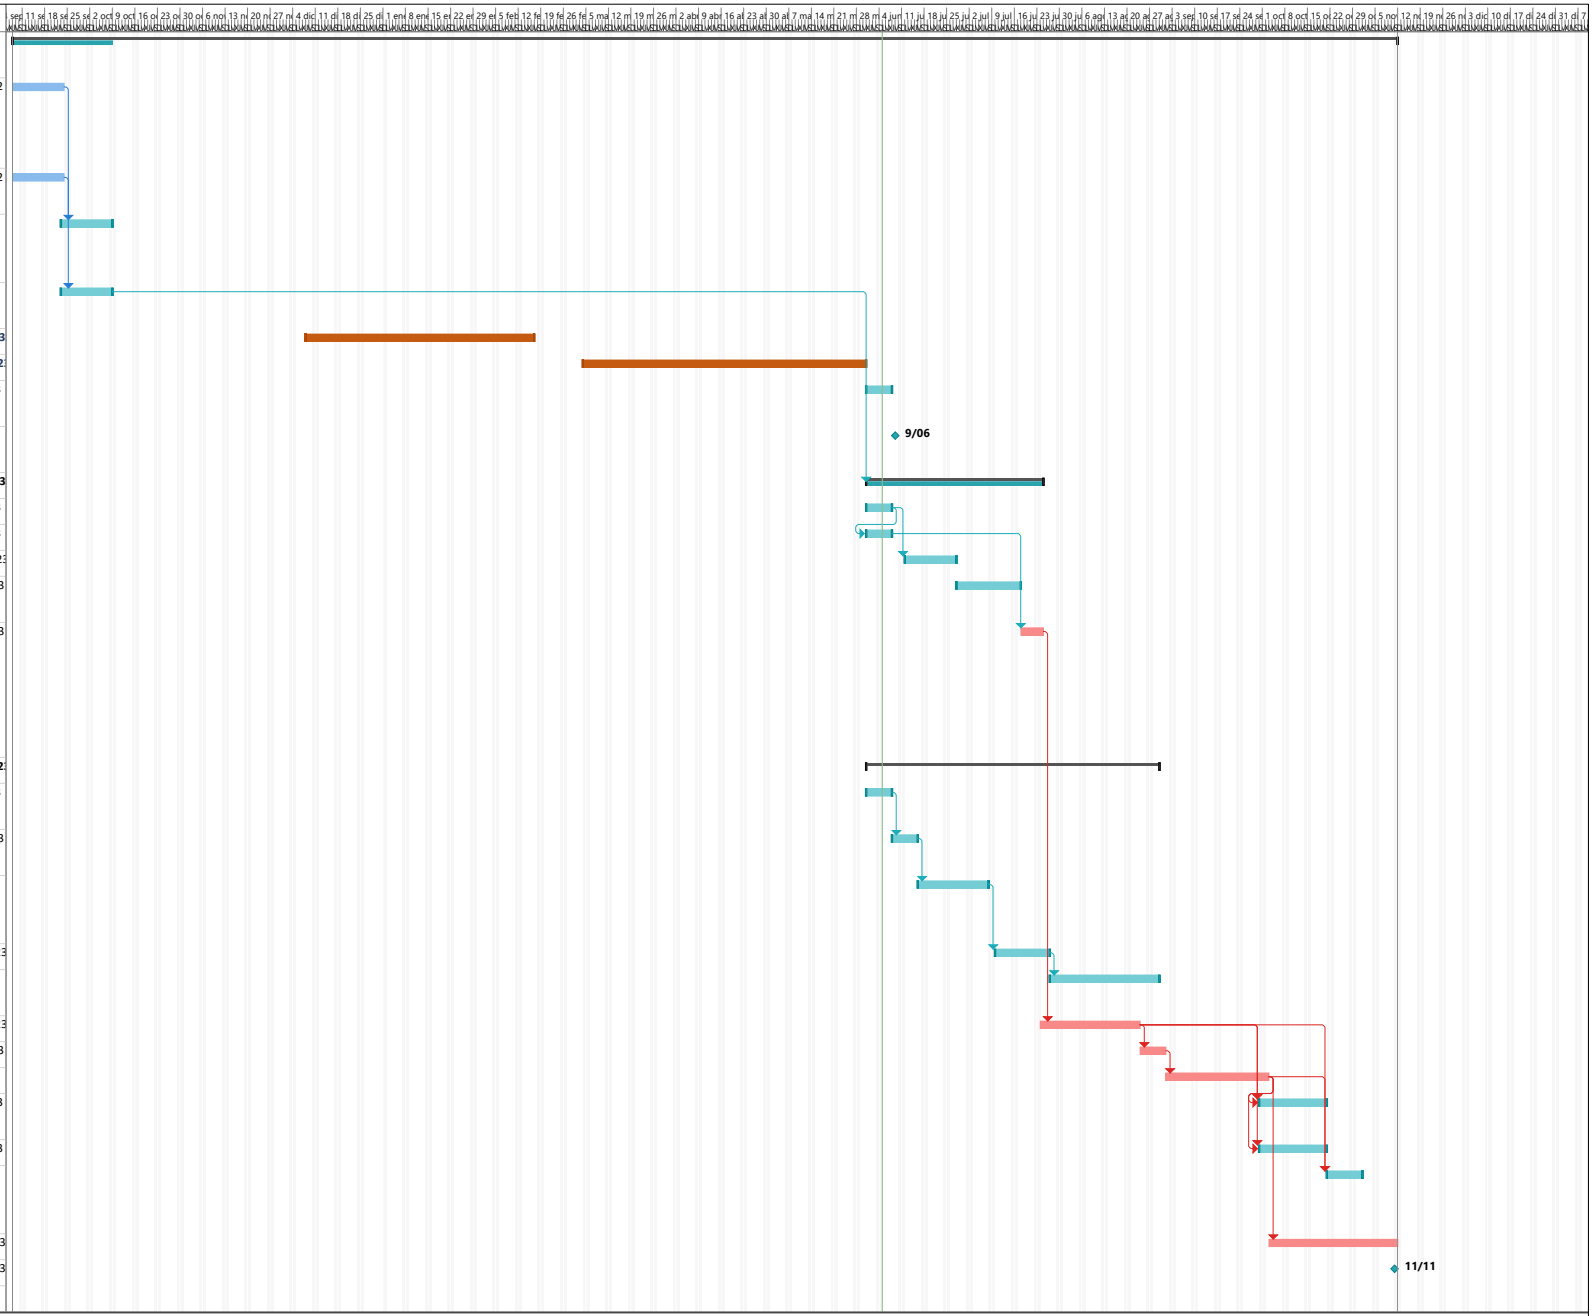

Proyecto: Sede Zipaquira Vulnerabilidad
Fecha: 31-05-2023

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
Firmado digitalmente por JUAN JOSÉ SIERRA HERRERA
