
Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	**1**		**PROGRAMACION GENERAL CONTRATO 314 DE 2023**	**213 días**	**jue 17/11/22**	**mar 31/10/23**		
2	1.1		INICIO	0 días	jue 17/11/22	jue 17/11/22		
3	**1.2**		**CPMSC CHIQUINQUIRA**	**161 días**	**jue 17/11/22**	**lun 7/08/23**		
4	1.2.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	41 días	jue 17/11/22	lun 23/01/23	2	
5	1.2.2		**ETAPA DE OBRA**	120 días	lun 23/01/23	lun 7/08/23	4	
6	**1.3**		**CPMSC PAZ DE ARIPORO**	**157 días**	**jue 17/11/22**	**mar 1/08/23**		
7	1.3.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	37 días	jue 17/11/22	mar 17/01/23	2	
8	1.3.2		**ETAPA DE OBRA**	120 días	mar 17/01/23	mar 1/08/23	7	
9	**1.4**		**EPMSC YOPAL**	**138 días**	**jue 17/11/22**	**jue 29/06/23**		
10	1.4.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	41 días	jue 17/11/22	lun 23/01/23	2	
11	1.4.2		**ETAPA DE OBRA**	97 días	lun 23/01/23	jue 29/06/23	10	
12	**1.5**		**CPAMS EL BARNE**	**212 días**	**jue 17/11/22**	**lun 30/10/23**		
13	1.5.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	41 días	jue 17/11/22	lun 23/01/23	2	
14	1.5.2		ENTREGA ESPACIOS USPEC	61 días	lun 23/01/23	mar 2/05/23	13	
15	1.5.3		**ETAPA DE OBRA**	110 días	mié 3/05/23	lun 30/10/23	14	
16	**1.6**		**CPMSC - RM VILLAVICENCIO**	**172 días**	**jue 17/11/22**	**jue 24/08/23**		
17	1.6.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	37 días	jue 17/11/22	mar 17/01/23	2	
18	1.6.2		**ETAPA DE OBRA**	135 días	mar 17/01/23	jue 24/08/23	17	
19	**1.7**		**CPMS ACACIAS**	**213 días**	**jue 17/11/22**	**mar 31/10/23**		
20	1.7.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	40 días	jue 17/11/22	vie 20/01/23	2	
21	1.7.2		ENTREGA ESPACIOS USPEC	98 días	vie 20/01/23	jue 29/06/23	20	
22	1.7.3		**ETAPA DE OBRA**	75 días	vie 30/06/23	mar 31/10/23	21	
23	**1.8**		**CPMSC NEIVA**	**213 días**	**jue 17/11/22**	**mar 31/10/23**		
24	1.8.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	40 días	jue 17/11/22	vie 20/01/23	2	
25	1.8.2		ENTREGA ESPACIOS USPEC	98 días	vie 20/01/23	jue 29/06/23	24	
26	1.8.3		**ETAPA DE OBRA**	75 días	vie 30/06/23	mar 31/10/23	25	
27	**1.9**		**PMS GUADUAS**	**213 días**	**jue 17/11/22**	**mar 31/10/23**		
28	1.9.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	40 días	jue 17/11/22	vie 20/01/23	2	
29	1.9.2		ENTREGA ESPACIOS USPEC	98 días	vie 20/01/23	jue 29/06/23	28	
30	1.9.3		**ETAPA DE OBRA**	75 días	vie 30/06/23	mar 31/10/23	29	
31	**1.10**		**CPMSC GIRARDOT**	**137 días**	**jue 17/11/22**	**mié 28/06/23**		
32	1.10.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	53 días	jue 17/11/22	vie 10/02/23	2	
33	1.10.2		**ETAPA DE OBRA**	84 días	vie 10/02/23	mié 28/06/23	32	
34	**1.11**		**CPMS ESPINAL**	**182 días**	**jue 17/11/22**	**lun 11/09/23**		
35	1.11.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	62 días	jue 17/11/22	lun 27/02/23	2	
36	1.11.2		**ETAPA DE OBRA**	120 días	lun 27/02/23	lun 11/09/23	35	
37	**1.12**		**EP HELICONIAS**	**194 días**	**jue 17/11/22**	**vie 29/09/23**		
38	1.12.1		ELABORACION DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	44 días	jue 17/11/22	vie 27/01/23	2	
39	1.12.2		**ETAPA DE OBRA**	150 días	vie 27/01/23	vie 29/09/23	38	
40	2		**FIN DE PROYECTO**	0 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	5FF;8FF;11FF;15F	

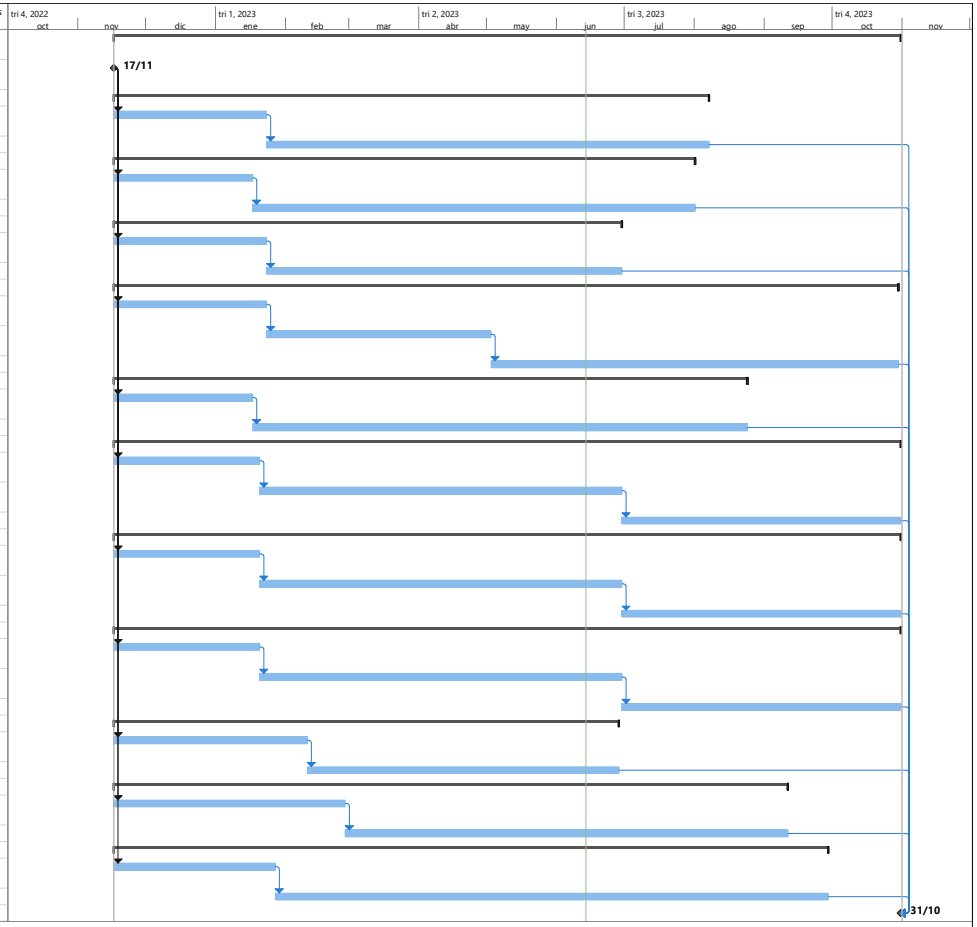

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
