Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.

CONTRATO No.: 1632-22

INFORME DE SUPERVISION No.: 8

PERIODO: 01/03/2023 A 27/03/2023

San Juan de Pasto, mayo 2023

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2018

FECHA DE PRESETACION:	10/04/2023	CON CORTE :	27/03/2023

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	N/A		
CONVENIO MACRO No:	N/A		
CONTRATO No.:	GN1632 de 28 de enero de 2022		
CDP No.:	2022010144	FECHA:	17/01/2022
REGISTRO No:	2022011926	FECHA:	28/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.		
MODIFICACION No.:	01 del 28 de septiembre de 2023	Prórroga de un mes	
MODIFICACION No.:	02 del 28 de diciembre 2023	Adición de recursos y prorroga hasta el 30 junio de 2023	
CONTRATISTA DE OBRA:	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	C.C. 98.384.058 de Pasto (N).	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	JOSE LUIS NATES DULCECC 12.749.315		
SUPERVISOR	ING SONIA ALEJANDRA VELASCO		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. SONIA Y. LASSO MEDINA		
META FISICA	1 PUNTO CRITICO ATENDIDO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.564.849.791,00		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1	$ 781.533.717,00		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.346.383.508,00		
FECHA DE INICIACION:	31/01/2022		
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/05/2022		
SUSPENSION	20/05/2022		
REINICIO	22/09/2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 de octubre de 2022		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	1 MES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	01 de noviembre de 2022		
SUSPENSION :	28/10/2022		
REINICIO	27/12/2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2022		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	6 MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 de junio de 2023		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

TOTAL ANTICIPO	$ 625.939.916,40			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 625.939.916,40			
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO SA			
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	42,16%	% EJECUTADO:	19,55% INFORME SEMANAL 31
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	42,16%	% EJECUTADO	40%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	digo.: SIVEYC.F Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS : Con corte a 27 de marzo de 2023, el contrato se encuentra en ejecución , el contratista está realizando las obras de construcción del boxcoulverth, de lo cual presenta atraso.
La Interventoría contratada para el seguimiento y control mediante contrato GN1431-22, suscrito con el Ing. José Luis Nates, presentó el informe mensual No 6 correspondiente al mes de enero de 2023 en el que se detalla los temas técnicos del contrato hasta el 31 de enero de 2023, el informe No. 08 y 09 con corte a febrero y marzo de 2023 respectivamente, no ha sido presentado hasta lá fecha del corte del presente informe.

Se ha requerido al contratista para que presente un plan de contingencia con el fin de que se se iguale en las obras programadas y que presente la información referente a la construcción de los anclajes, para lo cual se le solicitó plan de trabajo y proceso constructivo. Se realiza comite de seguimiento de obra el dia 08 de marzo de 2023 a fin de tratar la preocupacion que existe desde la secretaria por el bajo rendimiento en la ejecucion de obra.

Se destaca que en el comite de obra el Contratista manifiesta que su bajo rendimiento se debe a que persiste la inconformidad por parte del propietario del predio Pedro Nel Ortega referente al pago total del contrato de compraventa, el cual a impedido que se realicen los trabajos de perfilacion del talud superior. Se reitera que el propietario del predio no puede impedir la normal ejecucion del proyecto, toda vez que el contrato de compraventa es independiente y tiene caracter vinculante de los firmantes.

ASPECTOS FINANCIEROS : A la fecha de corte del presente informe se ha entregado al contratista el pago del anticipo del 40 %, estipulado en el contrato. No se han presentado actas parciales a pesar de haber solicitado su presentación .-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Se firma acta de inicio el 31 de enero de 2022, en la actualidad esta en ejecución y su fecha de terminación es el 20 de junio de 2023

ASPECTOS LEGALES: Las pólizas se encuentran vigentes.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Solicitó a Interventoria verificar las condiciones para la posibilidad de adelantar un proceso de presunto incumplimiento

Proyecto: Ing. Sonia Y Lasso Medina
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. Sonia Alejandra Velasco Rodríguez
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Departamento de Nariño

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto1: Trabajos de relleno Box



Foto 2: Trabajos de relleno Box



Foto 3: Limpieza y perfilacion de Talud.

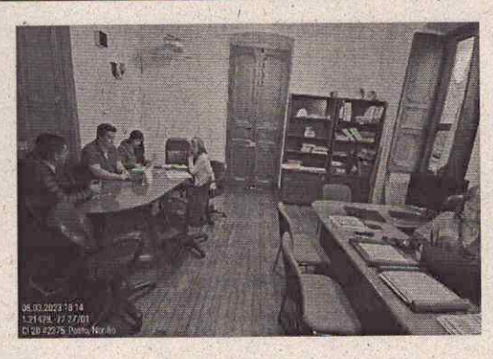


Foto 4: Comité de Seguimiento de Obra 08/03/2023

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN1632-2022	$ 1.564.850.572,00

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	EGRESOS No.	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/03/2022	$ 625.939.916,40	$ 625.939.916,40		$ 625.939.916,40	625.939.916,40	$ 0,00	2022001023	9/03/2022
					$ 0,00		$ 0,00		
TOTAL		$ 625.939.916,40	$ 625.939.916,40	$ 0,00	$ 625.939.916,40	$ 625.939.916,40	$ 0,00		

AVANCE FISICO	19,55%
AVANCE FINANCIERO	40%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYO.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No GN1632-22

$ 1.564.850.572,00
$ 781.533.717,00

GARANTIAS:	Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.A.
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901

ANEXO 0			FECHA APROBACION	28/01/2022	FECHA EXPEDICION	28/01/2022

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	13%	28-ene-22	28-nov-22	Condicioens originales	(210)
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	28-may-22	28-may-27	Condicioens originales	1.432
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	28-ene-22	28-may-25	Condicioens originales	702
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	2-may-19	2-nov-22	Condicioens originales	(236)
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	28-ene-22	28-may-22	Condicioens originales	(394)

ANEXO 1			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	1/02/2022

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	(207)
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	31-may-27	Condicioens originales	1.435
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	31-ene-25	Condicioens originales	585
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	(207)
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-may-22	Condicioens originales	(391)

ANEXO 6			FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	23/09/2022

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-abr-23	Reinicio	(85)
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-oct-27	Reinicio	1.559
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-oct-25	Reinicio	829
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-dic-22	Reinicio	(178)
ANEXO 4			FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	23/09/2022
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	2-oct-22	Reinicio	(267)

ANEXO 7			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	3/10/2022

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	(56)
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-nov-27	Modificación No. 02	1.590
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-nov-23	Modificación No. 02	128
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	(56)
ANEXO 5			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	3/10/2022

Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	1-nov-22	Modificación No. 02	(237)

ANEXO 9			FECHA APROBACION	28/12/2022	FECHA EXPEDICION	28/12/2022
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	30-jun-23	Reincio 2	4
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	30-dic-27	Reincio 2	1.648
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	30-dic-25	Reincio 2	918
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-jun-23	Reincio 2	4
ANEXO 5			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	28/12/2022
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-dic-23	Modificación No. 02	188

ANEXO 11			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/01/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 469.276.701,60	20%	31-ene-22	30-dic-23	Modificatorio 3	187
Estabilidad de la obra	$ 703.915.052,40	30%	31-ene-22	30-dic-27	Modificatorio 3	1.648
Salarios y prestaciones	$ 469.276.701,60	20%	31-ene-22	30-dic-25	Modificatorio 3	918
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-jun-23	Modificatorio 3	4
ANEXO 6			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	28/12/2022
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-dic-23	Modificación No. 03	188
