INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.º 2305 MINISTERIO – MUNICIPIO DE EL TARRA- NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN 27 DE MARZO AL 30 ABRIL 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA – NORTE DE SANTANDER		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 9 y 8 entre calles 3 y 4 barrio villa esperanza		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$1.470.717.000
	APORTES MIN – FONSECON		$1.470.717.000
	APORTES MUNICIPIO		$0.00
	OTROS APORTES		$0
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	27 DE JULIO DE 2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO			
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 27/12/2022		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	27 de diciembre de 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/12/2022 póliza inicial		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$ 1.323.645.000		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$ 147.072.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0.0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1.** Firma del convenio **2.** Inicio proceso de contratación **3.** desembolso	NO APLICA	29/12/2022	$588.286.800
SEGUNDO DESEMBOLSO	**4.**	NO APLICA	x	$0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 588.286.800 0,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. POLIZA CONVENIO : 3522436–9

Nombre Aseguradora: suramericana

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$294.143.400	27–DIC–2022	27–ENE–2024
	Calidad de servicio			

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N°**MT-LP-001-2023**	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO1, OPCIÓN 1, EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER		$1.323.645
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	RN INGENIERIA S.A.S.		R/L CAMILO ANDRES RAMIREZ NUMA
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**27/09/2023**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.323.645

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA N°	49-44-101005079 CUMPLIMIENTO 49-40-101002350 RCE
FECHA DE LA POLIZA	18/04/2023 ANEXO 0 05/05/2023 ANEXO 2

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
N°**MT-CM-003-2023**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE (TIPO 1) PARA EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE SANTANDER	$.147.072.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON	Representante legal
Fecha de Acta de inicio del contrato	**27/04/2023**	

Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	27/09/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$.147.072.000

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA N°	56-44-101005145
FECHA DE LA POLIZA	25/04/2023 ANEXO 0 03/05/2023 ANEXO 2

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**31/05/2023**	**29/06/2023**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	31/05/2023	29/06/2023
INFORME FINANCIERO	NO APLICA PARA ESTE CORTE	NO APLICA PARA ESTE CORTE
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$588.286.800	$588.286.800
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	80%	Correspondiente a los estudios de suelos y levantamiento topográfico
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**.0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**.0%**

% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME:
AVANCE: %
ESTADO:
RECURSOS GIRADOS:
Pendiente por recibir:

INFORME DE ACTIVIDADES

NOTA:

- **Se realizó las siguientes actividades**

	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1	El proyecto debe ser entregado en medio físico, los planos deben presentarse firmados por el diseñador, consultor, interventor y el supervisor del Municipio. Anexar copia de los documentos y planos en medio digital.
2	Copia de la Licencia para la Construcción del Sacúdete al Parque, así como permisos ambientales expedida por la autoridad competente.
3	NOTA: Se debe anexar este documento al Anexo No. 7. Formato Acta de Reunión de Seguimiento a la Ejecución Contractual GC-P3-F7.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/05/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

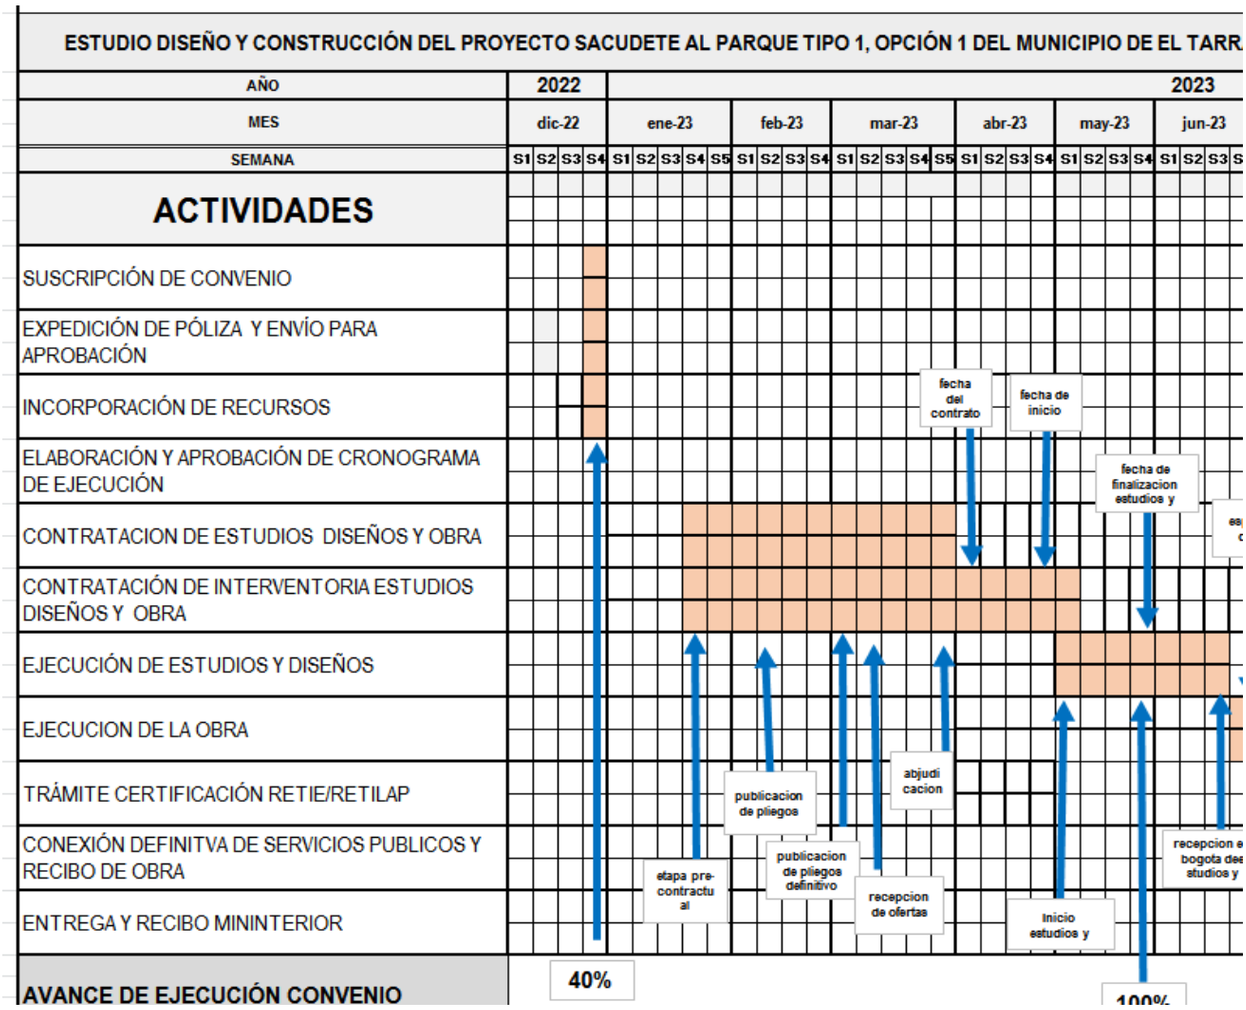
	

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

Original firmado

YERSON SAMID CHINCHILLA MONGUI
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Anexo cronograma de ejecución


ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE EL TARR
AÑO
2022
2023
MES
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
SEMANA
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
ACTIVIDADES
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN
INCORPORACIÓN DE RECURSOS
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CONTRATACION DE ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA
CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIA ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
EJECUCION DE LA OBRA
TRÁMITE CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP
CONEXIÓN DEFINITVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y RECIBO DE OBRA
ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR
AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO
40%
fecha del contrato
fecha de inicio
fecha de finalizacion estudios y
publicacion de pliegos
publicacion de pliegos definitivo
abjudicacion
recepcion de ofertas
etapa pre-contractual
Inicio estudios y
100%
