FORMATO INFORME DE SUPERVISION No. 4 - OBRA PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISION	25/04/2018	PERIODO REPORTADO DEL:	01/03/2018 (dd/mm/yyyy)	AL:	31/03/2018 (dd/mm/yyyy)
CONTRATO Nº	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017	CONTRATISTA:	DINAS INGENIEROS LTDA		
OBJETO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INICIACIÓN:	01/12/2017 (dd/mm/yyyy)	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2018 (dd/mm/yyyy)		
VALOR INICIAL	531.359.083,00	VALOR ADICIONAL	254.000.000,00	VALOR TOTAL	785.359.083,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 27-11-2017 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL NO.GU 127809 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. EL REGISTRO PRESUESTAL ES EL NO. 206117 DEL 27-11-2017

- CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 SE REALIZO VISITA A ALGUNAS OBRAS PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS Y CON ELLO EL ACTA DE INICIO DE OBRA.

- ASI MISMO DE ACUERDO A LO CONTRATADO SE REALIZO CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 EL PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTANDO TODOS LOS TRABAJOS QUE RESULTARON URGENTES EN ESTE MES SIENDO EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA SIN NOVEDAD.

- ASI MISMO SE ENTREGO ACTA DE INICIO EN ORIGINAL Y HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL REQUERIDO CON LOS FRENTES DE TRABAJO LISTO Y SE RADICO AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, TAMBIEN SE APROBARON LOS APUS DE ACUERDO A LA OFERTA DEL PROCESO.

- DE ACUERDO CON LO EXPLICADO EN EL INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE FEBRERO DE 2018, EN EL CUAL LA SUPERVISION MANIFESTO QUE ERA NECESARIO TRAMITAR ANTE EL ORDENADOR DEL GASTO UNA POSIBLE SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS PARA LOS FRENTES DE INSTALACIONES PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC. ADICIONALMENTE TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA QUE NECESITA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ÁREAS DONDE LABORA EL PERSONAL, EN LAS CUALES SE DEBEN ATENDER REQUERIMIENTOS SOPORTADOS CON SIALES TALES COMO MANTENIMIENTO DE MUROS POR FISURAS, HUMEDADES Y FALTA DE PINTURA Y EN ALGUNOS CASOS MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA, TALES COMO PUERTAS, VENTANERÍA Y AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERTENECEN A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ESTAS DEPENDENCIAS.

- POR LO ANTERIOR CON FECHA 23 DE MARZO DE 2018 SE ELABORO EL CONTRATO DE MODIFICACION EN EL CUAL SE REALIZA UNA ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $254.000.000,00 A TRAVES DEL RUBRO 204-5-1-10 MANTENIENDO PRECIOS DE LA VIGENCIA 2017 EN ESTAS ACTIVIDADES Y QUEDANDO EL CONTRATO LEGALIZADO CON EL MISMO NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, ADEMAS DE HABER REALIZADO EL AJUSTE DE LAS POLIZAS A TRAVES DEL SECOP II, LO CUAL PERMITE DAR INICIO A LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA.

- POR ULTIMO, CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2018, CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION REALIZA UNA INSPECCION A LOS SOPORTES DE LOS CORTES GENERADOS A LA FECHA, LO CUAL POR RECOMENDACION DE LOS AUDITORES ES PREFERIBLE REALIZAR UNAS FICHAS ADICIONALES A LOS INFORMES QUE SOPORTEN LOS GASTOS SUMINISTRADOS A CADA UNO DE LOS INMUEBLES Y/O DEPENCIAS. POR LO ANTERIOR ESTE INFORME SE PUBLICA DIAS POSTERIORES AL PLAZO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS CALENDARIOS. DADO QUE ERA NECESARIO PUBLICARLO CON LOS SOPORTES SOLICITADOS POR CONTRALORIA PARA LOS CORTES REALIZADOS A LA FECHA. ASI MISMO SE IMPRIMEN NUEVAMENTE LOS INFORMES DIGITALES, CORTES, MEMORIAS Y SE ANEXAN NUEVAS LAS FICHAS (TODO A COLOR) CON LAS SOLICITUDES RADICADAS DEL SIAL A CADA UNO DE LOS CORTES EJECUTADOS.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
N/A	N/A	PINTURA	5	TALADROS	1	INGENIERO	1
		ESTUCO	2			AUXILIAR RESIDENTE	1
						OFICIALES Y AYUDANTES	4
						TOTAL	6

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MARZO DE 2018)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
Semana 13	0,00%	40,41%	40,41%	0,00%
Semana 14	0,05%			
Semana 15	1,00%			
Semana 16	0,05%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO								40,41%													40,41%
EJECUTADO								40,41%													40,41%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
MANTENIMIENTO PINTURA APTO 402 RICAURTE	P																					100,00%
	E																					100,00%
MANTENIMIENTO PISOS Y GUARDAESCOBAS PUERTO BAHIA 102	P																					100,00%
	E																					100,00%

ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL

NO APLICA	P																					0,00%
	E																					0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*243*	*121*	*122*
Proyección	*243*	*121*	*122*

6- REGISTRO FOTOGRAFICO

VER ANEXO INFORME CONTRATISTA

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Dias (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
121	*0*	*31/07/2018*	*49,79%*

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO					
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista?				
• APARTAMENTO 402 RICUARTE: Se realizan actividades de pintura de muros, techos por entrega del inmueble del anterior usuario y llegada del nuevo usuario. • APARTAMENTO 102 PUERTO BAHIA: Se realizan actividades de pintura de muros, techos por entrega del inmueble del anterior usuario y llegada del nuevo usuario. Asi mismo se realiza el cambio de pisos en alcoba principal y secundaria.	NO APLICA		SI		NO	X

JUSTIFICACIÓN :
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA ATRASO VA AL DIA EN LA EJECUCION DE ACUERDO A EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LA EJECUCION DE NUESTRO CONTRATO.

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

SE EJECUTAN LABORES DE LA VIGENCIA 2018 EN ZONAS DE ALOJAMIENTO MILITAR, IGUALMENTE A FIN DE MES SE INICIAN ALGUNAS LABORES BASICAS PARA PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, ES DECIR SE REALIZA EL RECORRIDO DE LAS MISMAS, LAS ZONAS QUE SE VAN A INTERVENIR EN CATAM Y EN ICARO Y EN COFAC CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y MATERIALES QUE REQUIERAN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

}

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	531.359.083,00	531.359.083,00	317.359.083,00	40,41%	214.000.000,00	27,25%
Obras Adicionales		254.000.000,00	-	0,00%	254.000.000,00	32,34%
TOTAL	531.359.083,00	785.359.083,00	317.359.083,00	40,41%	468.000.000,00	59,59%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 531.359.083,00	
VALOR ADICIONAL	$ -	
VALOR FINAL	$ 531.359.083,00	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$ 160.359.083,00	CANCELADO EN EL MES DE ENERO DE 2018
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 160.359.083,00	

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA	N/A	N/A	N/A	NO APLICA POR SER IMPREVISTOS
PRESENTACION FLUJO DE CAJA	N/A	N/A	N/A	NO APLICA POR SER IMPREVISTOS
PRESENTACION POLIZAS	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION ACTA DE INICIO OBRA	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION DE APUS	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION HOJA DE VIDA	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
INFORME DE SUPERVISION DEL MES	SI	SI	SI	SE ANEXO CON EL PRESENTE INFORME
ANEXO SOPORTES ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 1	SI	SI	SI	SE ANEXO CON EL PRESENTE INFORME E IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.
ANEXO MEMORIAS TRAMITE DE PAGO CORTE 2	SI	SI	SI	SE ANEXO CON EL PRESENTE INFORME PENDIENTE ELABORACION DE FICHAS Y ORDENES DE SERVICIO

14- SEGUIMIENTO A RIESGOS (En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI _____ NO _____X_____
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

A LA FECHA NO EXISTE NINGUN RIESGO

15- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE SIGA CONTROLANDO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL COMO HASTA AHORA LO HA HECHO, SIN PRESENTAR NINGUN TIPO DE NOVEDAD. SE RECOMENDO AL CONTRATISTA DOTAR NUEVAMENTE DE CHALECOS O CAMISETAS QUE IDENTIFIQUEN A LA FIRMA CONTRATISTA EN TODOS LOS FRENTES PARA EVITAR PROBLEMAS DE ACCESO A LOS INMUEBLES.

16- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
Supervisor Suplente Contrato
Firma y post firma

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No:	*058-00-B-COFAC-GRUACO-2017*	*Fecha*	25-abr-18
Nombre del Supervisor:	*CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ*		

	SI	*NO*
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	*X*	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	*X*	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	**Realizar acta de inicio del contrato de obra**	**Se realizo el acta de incio con fecha 01 de Diciembre de 2017**
2	**Revision y aprobacion de cronograma de obra**	**No aplica ya que es un contrato de actividades con urgencia**
3	**Revision informes de supervision**	**Se radico con fecha 25-04-2018**
4	**Revision y aprobacion flujo de caja**	**No aplica ya que es un contrato de actividades con urgencia**
5	**Aperturas libro de bitacora en cada frente de tranbajo**	**No aplica ya que es un contrato de actividades con urgencia sin embargo se anexaran las actividades en un solo libro para los proximos informes**

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	*NO*
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.		*X*
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	*X*	
Se ha cumplido parcialmente el objeto y alcance del contrato.	*X*	
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	*X*	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		*X*

ELABORÓ _____

Supervisor de Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
GADCO-GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Al contestar cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No **20176240998893** del 28-12-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- FACAG-GADCO-ESMAV - 29-23

Señor Brigadier General
HENRY QUINTERO BARRIOS
Jefe Apoyo Logistico
Bogotá - D.C.

Asunto: Solicitud Prorroga Procedimientos

En atención al Oficio 20176190980793 de fecha 20 de diciembre de 2017 mediante el cual se requiere el diligenciamiento de los formatos "Plan de mantenimiento preliminar de las instalaciones y/o equipos de apoyo logístico no aeronautico LS-FR-38 e informe diagnostico del estado físico de las instalaciones y equipos de apoyo logistico no aeronautico LS-FR-100", respetuosamente, me permito solicitar al señor Brigadier General Jefe de Apoyo Logistico, tenga a bien autorizar un plazo hasta el mes de agosto de 2018 teniendo en cuenta lo siguiente:

1. A partir del mes de febrero de 2018, se legalizará de acuerdo al proceso de transformación la creación de la Base Aérea del Cuartel General COFAC, en donde se recibirán nuevas instalaciones, presupuesto y personal.

2. En la actualidad el Escuadrón tiene a cargo las siguientes instalaciones:

-371 unidades de vivienda fiscal distribuidos en 21 edificios de Oficiales y 12 edificios de Suboficiales pertenecientes a la Guarnición de Bogotá.

-1769 puestos de trabajo distribuidos en 09 frentes de trabajo (COFAC, ICARO, SOLEDAD, CATAM, MUSEO AEROESPACIAL, BODEGA PUENTE ARANDA, INCORPORACION AMERICAS, GIMFA y CEMAE-DISPENSARIO).

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Coronel CARLOS EDUARDO MENDEZ D'LUYZ
Ayudante General COFAC

Elaboró: AS. [illegible] | CT. DAZA, [illegible] ESMAV | MY AGUILERA, [illegible] GADCO-ES

	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	03
		Implementación:	27-Enero-2016
		Código:	DE-FR-004
		Tipo de Documento:	Formato

Acta Consecutivo No.	Anexo Informe 03	**Lugar y Fecha**	Recorrido aptos mes marzo 2018
Oficina Productora	Escuadrón de instalaciones del GRUAL - BACOF		
Asunto	Certificar el uso de la pintura viniltex 1501 en ítem pintura de muros.		
Hora Inicio	08:00 horas	**Hora Finalización**	12:00 horas
Participantes	CT. Victor Julio Caita Gonzalez Supervisor contrato		
Ausentes	N/A		


Orden del día:


Recorrido de instalaciones verificando el uso de una específica pintura.

Desarrollo:

Una vez visitado el apartamento Ricaurte 202 se verifica el uso de pintura tipo viniltex 1501, tal como lo indica el contrato.


Anexo imágenes así:

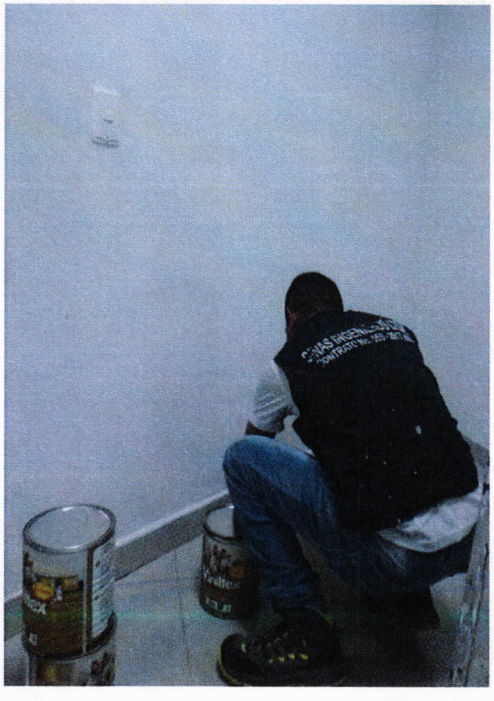


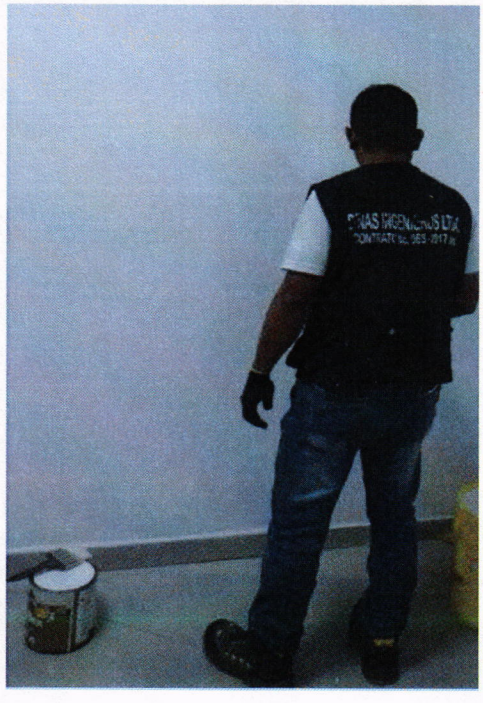

	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	03
		Implementación:	27-Enero-2016
		Código:	DE-FR-004
		Tipo de Documento:	Formato

Una vez visitado el apartamento Esmeralda 202 se verifica el uso de pintura tipo viniltex 1501, tal como lo indica el contrato.

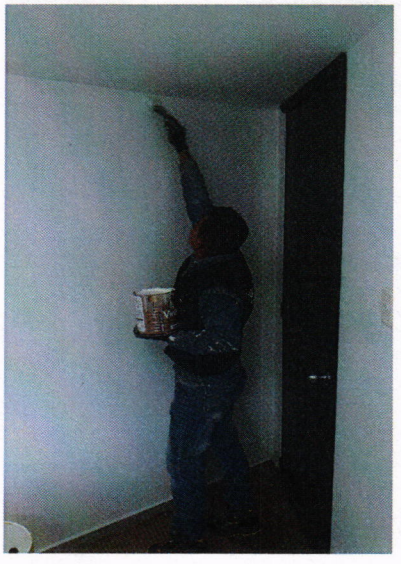

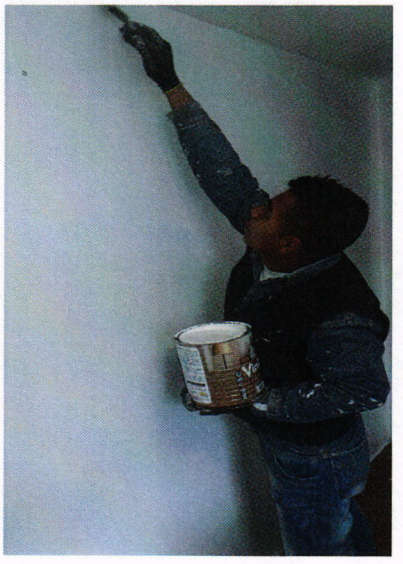

Actividades a Realizar:		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión: No aplica para próximo mes se reprograma dependiendo donde se labore el ítem.

FIRMAS,

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
Supervisor Contrato de obra 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

MES MARZO

FORMATO CONTROL ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

CONTRATO N° 058-00-8-COFAC-GRUACO-2017 - OBJETO DEL CONTRATO
"LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICION DE BOGOTA D.C

AÑO 2018

PERSONAL	JUEVES 01			VIERNES 02			SABADO 03			DOMINGO 04		
	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	Revista	6,7	FLY	Revista	7,8	FLY	Revista	7,8,9	FLY		N.L	FLY
PERSONAL	LUNES 05			MARTES 06			MIERCOLES 07			JUEVES 08		
	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	Corte	5,10	FLY	Corte	5,10	FLY	Corte	5,10	FLY	memoria	4,5	FLY
PERSONAL	LUNES 12			MARTES 13			MIERCOLES 14			JUEVES 15		
	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	memoria	4,5	FLY	memoria	4,5	FLY	memoria	4,5	FLY	Piso	8	FLY
PERSONAL	LUNES 19			MARTES 20			MIERCOLES 21			JUEVES 22		
	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	Verifica	11	FLY	Verifica	11	FLY	Verifica	11	FLY	Verifica	11	FLY
PERSONAL	LUNES 26			MARTES 27			MIERCOLES 28			JUEVES 29		
	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	Poliza	5,10	FLY	Adicion	5,10	FLY	Adicion	5,10	FLY	Inicio lab.	5	FLY

PROFESIONALES RESIDENTE DE OBRA	PORCENTAJE	TOTAL DIA DE	CUMPLIO
	100 %	30	5 ✓

OBSERVACIONES

CT. VICTOR CAITA
VB. SUPERVISOR CONTRATO

1	COFAC - CAN	6	PAULO VI B1
2	CATAM	7	SAUZALITO
3	CARO - CHAPINERO	8	PUERTO BAHIA
4	BODEGA - PUENTE ARANDA	9	ESMERALDA
5	OFICINA ESINS - MEMORIAS	10	OFICINAL GRUAL CAN INFORMES
		11	Ricaurte
