FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 - OBRA PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISION	07/05/2018	PERIODO REPORTADO DEL:	01/04/2018 (dd/mm/yyyy)	AL:	30/04/2018 (dd/mm/yyyy)
CONTRATO Nº	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017	CONTRATISTA:	DINAS INGENIEROS LTDA		
OBJETO:	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INICIACIÓN:	01/12/2017 (dd/mm/yyyy)	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2018 (dd/mm/yyyy)		
VALOR INICIAL	531.359.083,00	VALOR ADICIONAL	254.000.000,00	VALOR TOTAL	785.359.083,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 27-11-2017 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL NO.GU 127809 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. EL REGISTRO PRESUESTAL ES EL NO. 206117 DEL 27-11-2017

- CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2017 SE REALIZO VISITA A ALGUNAS OBRAS PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS Y CON ELLO EL ACTA DE INICIO DE OBRA.

- ASI MISMO DE ACUERDO A LO CONTRATADO SE REALIZO CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 EL PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTANDO TODOS LOS TRABAJOS QUE RESULTARON URGENTES EN ESTE MES SIENDO EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA SIN NOVEDAD.

- ASI MISMO SE ENTREGO ACTA DE INICIO EN ORIGINAL Y HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL REQUERIDO CON LOS FRENTES DE TRABAJO LISTO Y SE RADICO AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, TAMBIEN SE APROBARON LOS APUS DE ACUERDO A LA OFERTA DEL PROCESO.

- DE ACUERDO CON LO EXPLICADO EN EL INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE FEBRERO DE 2018, EN EL CUAL LA SUPERVISION MANIFESTO QUE ERA NECESARIO TRAMITAR ANTE EL ORDENADOR DEL GASTO UNA POSIBLE SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS PARA LOS FRENTES DE INSTALACIONES PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC. ADICIONALMENTE TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA QUE NECESITA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ÁREAS DONDE LABORA EL PERSONAL, EN LAS CUALES SE DEBEN ATENDER REQUERIMIENTOS SOPORTADOS CON SIALES TALES COMO MANTENIMIENTO DE MUROS POR FISURAS, HUMEDADES Y FALTA DE PINTURA Y EN ALGUNOS CASOS MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA, TALES COMO PUERTAS, VENTANERÍA Y AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERTENECEN A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ESTAS DEPENDENCIAS.

- CON FECHA 23 DE MARZO DE 2018 SE ELABORO EL CONTRATO DE MODIFICACION EN EL CUAL SE REALIZA UNA ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE $254.000.000,00 A TRAVES DEL RUBRO 204-5-1-10 MANTENIENDO PRECIOS DE LA VIGENCIA 2017 EN ESTAS ACTIVIDADES Y QUEDANDO EL CONTRATO LEGALIZADO CON EL MISMO NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL, ADEMAS DE HABER REALIZADO EL AJUSTE DE LAS POLIZAS A TRAVES DEL SECOP II, LO CUAL PERMITE DAR INICIO A LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA.

- CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2018, CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION REALIZA UNA INSPECCION A LOS SOPORTES DE LOS CORTES GENERADOS A LA FECHA, LO CUAL POR RECOMENDACION DE LOS AUDITORES ES PREFERIBLE REALIZAR UNAS FICHAS ADICIONALES A LOS INFORMES QUE SOPORTEN LOS GASTOS SUMINISTRADOS A CADA UNO DE LOS INMUEBLES Y/O DEPENCIAS. POR LO ANTERIOR ESTE INFORME SE PUBLICA DIAS POSTERIORES AL PLAZO DE LOS 5 PRIMEROS DIAS CALENDARIOS, DADO QUE ERA NECESARIO PUBLICARLO CON LOS SOPORTES SOLICITADOS POR CONTRALORIA PARA LOS CORTES REALIZADOS A LA FECHA. ASI MISMO SE IMPRIMEN NUEVAMENTE LOS INFORMES DIGITALES, CORTES, MEMORIAS Y SE ANEXAN NUEVAS LAS FICHAS (TODO A COLOR) CON LAS SOLICITUDES RADICADAS DEL SIAL A CADA UNO DE LOS CORTES EJECUTADOS.

-CON FECHA 23 DE ABRIL DE 2018 SE REALIZA EL CORTE DE OBRA No. 3 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADCRITAS A COFAC EN LA GUARNICION DE BOGOTA, TRAMITADO PARA PAGO ESE DIA E INCLUYENDO TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR CONTRALORIA EN CUANTO A RESPECTA TAREAS ADICIONALES Y NO ESTABLECIDAS POR LA FAC DENTRO DE SUS MANUALES, PERO QUE SIRVEN PARA DEJAR AUN MAS CLARO LA EJECUCION DEL CONTRATO.

- A LA FECHA SE ANEXA PENDIENTE FICHAS Y LOS SIALES DEL CORTE No. 2 Y LAS FICHAS Y SIALES CORRESPONDIENTES ALCORTE No. 3 DE ACUERDO A ACLARACIONES NECESARIAS POR CONTRALORIA.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
N/A	N/A	PINTURA	5	TALADROS	1	INGENIERO	1
		ESTUCO	2			AUXILIAR RESIDENTE	1
						OFICIALES Y AYUDANTES	4
						TOTAL	6

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (ABRIL DE 2018)		EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO A LA FECHA	ATRASO (-) ADELANTO
Semana 17	3,00%	53,91%	53,91%	0,00%
Semana 18	3,50%			
Semana 19	3,50%			
Semana 20	3,50%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO											53,91%										53,91%
EJECUTADO											53,91%										53,91%

PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS (ALOJAMIENTO MILITAR)

AVANCE		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
NO APLICA	P																					0,00%
	E																					0,00%

ACTIVIDADES CONTRATO ADICIONAL (INSTALACIONES ADCRITAS A COFAC)

MANTENIMIENTO FICHA 1D INSTALACIONES CAN	P																					100,00%
	E																					100,00%
MANTENIMIENTO FICHA 2D INSTALACIONES CATAM - DICLA	P																					100,00%
	E																					100,00%

MANTENIMIENTO FICHA 3D INSTALACIONES CATAM DICOA I	P																				100,00%
	E																				100,00%
MANTENIMIENTO FICHA 4D INSTALACIONES CATAM DICOA II	P																				100,00%
	E																				100,00%
MANTENIMIENTO FICHA 5D INSTALACIONES COFAC	P																				100,00%
	E																				100,00%
MANTENIMIENTO FICHA 6D INSTALACIONES CATAM - SALMA	P																				100,00%
	E																				100,00%
MANTENIMIENTO FICHA 7D INSTALACIONES CAN - SALON AZUL	P																				100,00%
	E																				100,00%
MANTENIMIENTO FICHA 8D INSTALACIONES CATAM ANTIGUO JEA	P																				100,00%
	E																				100,00%
MANTENIMIENTO FICHA 9D INSTALACIONES COFAC - ICARAO	P																				100,00%
	E																				100,00%

5- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	*243*	*151*	*92*
Proyección	*243*	*151*	*92*

6- REGISTRO FOTOGRAFICO

VER ANEXO INFORME CONTRATISTA

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Dias transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
151	*0*	*31/07/2018*	*62,14%*

8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

• **FICHA N° 1D. COMANDO FUERZA AÉREA (CAN):** Mantenimiento de muros divisorios en drywall, pintura bajo placa, estuco y pintura de muros existentes, demolición de pisos e instalación de pisos.

• **FICHA N° 2D. CATAM – DIRECCION Y CLASIFICACION JES**: Reparaciones y mantenimiento muros en drywall.

• **FICHA N° 3D CATAM – DICAO:** Reparaciones de cielorrasos, mantenimiento de canales y cubiertas.

• **FICHA N° 4D. CATAM – DICOA FASE 2:** Reparaciones de cielorrasos, mantenimiento de canales y cubiertas.

• **FICHA N° 5D. BODEGA:** Reparación en cubiertas y mantenimiento de canales.

• **FICHA N° 6D. CATAM – SALMA:** Mantenimiento de canales, cambio de tejas rotas, adecuación de cielo raso en PVC, reparación de puntos y aparatos de iluminación.

• **FICHA N° 7D. CAN _ PISO DOS SALON AZUL:** Estuco y pintura sobre muros.

• **FICHA N° 8D. CATAM – POTENCIAL JEFATURA HUMANA PISO 1 (ANTIGUO JEA):** Reparación de muros en drywall.

• **FICHA N° 9D. EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN).** Demoliciones en muros y cielo rasos, pañetes, adecuación de puntos eléctricos, instalación de cielo raso en PVC, adecuación de muros en drywall, instalación de lámparas.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
NO APLICA		SI	NO	X

JUSTIFICACIÓN :

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA ATRASO VA AL DIA EN LA EJECUCION DE ACUERDO A EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LA EJECUCION DE NUESTRO CONTRATO.

10- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARTICULARES

SE EJECUTAN LABORES DE LA VIGENCIA 2018 EN ZONAS DE ALOJAMIENTO MILITAR, IGUALMENTE A FIN DE MES SE INICIAN ALGUNAS LABORES BASICAS PARA PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, ES DECIR SE REALIZA EL RECORRIDO DE LAS MISMAS, LAS ZONAS QUE SE VAN A INTERVENIR EN CATAM Y EN ICARO Y EN COFAC CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y MATERIALES QUE REQUIERAN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	531.359.083,00	531.359.083,00	323.359.083,00	41,17%	208.000.000,00	26,48%
Obras Adicionales		254.000.000,00	100.000.000,00	12,73%	154.000.000,00	19,61%
TOTAL	531.359.083,00	785.359.083,00	423.359.083,00	53,91%	362.000.000,00	46,09%

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL	$	531.359.083,00	
VALOR ADICIONAL	$	254.000.000,00	
VALOR FINAL	$	785.359.083,00	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2018	$	160.359.083,00	CANCELADO EN EL MES DE ENERO DE 2018
SEGÚN PAGO PARCIAL CUENTAS PAC ABRIL 2018	$	150.000.000,00	CANCELADO EN EL MES DE ABRIL DE 2018
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$	310.359.083,00	

13- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
PRESENTACION DEL CRONOGRAMA	N/A	N/A	N/A	NO APLICA POR SER IMPREVISTOS
PRESENTACION FLUJO DE CAJA	N/A	N/A	N/A	NO APLICA POR SER IMPREVISTOS
PRESENTACION POLIZAS	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION ACTA DE INICIO OBRA	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION DE APUS	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
PRESENTACION HOJA DE VIDA	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EXPEDIENTE
INFORME DE SUPERVISION DEL MES	SI	SI	SI	SE ANEXO CON EL PRESENTE INFORME
ANEXO SOPORTES ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 1	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DE MARZO E IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.
ANEXO MEMORIAS TRAMITE DE PAGO CORTE 2	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL INFORME DE MARZO INFORME PENDIENTE ELABORACION DE FICHAS Y ORDENES DE SERVICIO
ANEXO FICHAS Y SOPORTES ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 2	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL PRESENTE INFORME E IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.
ANEXO SOPORTES, MEMORIAS, FICHAS ADICIONALES TRAMITE DE PAGO CORTE 3	SI	SI	SI	SE ANEXO EN EL PRESENTE INFORME E IGUALMENTE ESTAS FICHAS SE ANEXAN A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES PARA ASI SOPORTAR EL GASTO REALIZADO. SIN EMBARGO ANEXO OFICIO DONDE SE SOLICITA A LA INSPECCION LA ESTRUCTURACION DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INMUEBLES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2018.

14- SEGUIMIENTO A RIESGOS (En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI _____ NO __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

A LA FECHA NO EXISTE NINGUN RIESGO

15- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITO AL CONTRATISTA QUE SIGA CONTROLANDO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL COMO HASTA AHORA LO HA HECHO, SIN PRESENTAR NINGUN TIPO DE NOVEDAD.
SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DOTACION DE LOS ELEMENTOS Y EL PERSONAL AFILIADO A LA RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL

16- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Elaboró:

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
Supervisor Suplente Contrato
Firma y posfirma

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CONTROL ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

CONTRATO N° 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - OBJETO DEL CONTRATO
"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICION DE BOGOTÁ D.C. "

MES ABRIL

AÑO 2018

PERSONAL	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	DOMINGO 01 FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA																				NL	
	LUNES 02			MARTES 03			MIERCOLES 04			JUEVES 05			VIERNES 06			SABADO 7			DOMINGO 8		
PERSONAL	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	JOZGADO	1,2		JOZGADO	1,2		JEPUH	2		SALMA	2		SALMA	2		VARIO	2			NL	
	LUNES 9			MARTES 10			MIERCOLES 11			JUEVES 12			VIERNES 13			SABADO 14			DOMINGO 15		
PERSONAL	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	SALMA	2		SALMA	2		VARIO	1,2		VARIOS	1,2		VARIOS	1,2		VARIOS	1,2			NL	
	LUNES 16			MARTES 17			MIERCOLES 18			JUEVES 19			VIERNES 20			SABADO 21			DOMINGO 22		
PERSONAL	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	VARIOS	1,2		VARIOS	1,2		VARIOS	1,2		VARIOS	1,2		VARIOS	1,2		VARIOS	1,2			NL	
	LUNES 23			MARTES 24			MIERCOLES 25			JUEVES 26			VIERNES 27			SABADO 28			DOMINGO 29		
PERSONAL	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	VARIOS	1,2		VARIOS	4,5		Memoria	5		memoria	5		memoria	5		memoria	5		memoria	NL	
	LUNES 30																				
PERSONAL	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
RESIDENTE DE OBRA	Memoria	5																			

PROFESIONALES RESIDENTE DE OBRA	PORCENTAJE	TOTAL DIA DE	CUMPLIO
	100%	30	51

OBSERVACIONES

CT. Victor Parra.
Vb. SUPERVISOR CONTRATO

1	COFAC - CAN	6	PAULO VI 81
2	CATAM	7	SAUZALITO
3	ICARO - CHAPINERO	8	PUERTO BAHIA
4	BODEGA - PUENTE ARANDA	9	ESMERALDA
5	OFICINA ESINS - MEMORIAS	10	OFICINAL GRUAL CAN INFORMES

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CONTROL ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

CONTRATO N° 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - OBJETO DEL CONTRATO
"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. "

MES MARZO

AÑO 2018

PERSONAL / RESIDENTE DE OBRA	DESCRIPCION ASISTENCIA	FRENTE	FIRMA
LUNES 05			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Corte	5,10	JCV
LUNES 12			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	memoria	4,5	JCV
LUNES 19			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Verifica	11	JCV
LUNES 26			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	poliza	5,10	JCV
MARTES 06			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Corte	5,10	JCV
MARTES 13			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	memoria	4,5	JCV
MARTES 20			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Verifica	11	JCV
MARTES 27			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Adicion	5,10	JCV
MIERCOLES 07			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Corte	5,10	JCV
MIERCOLES 14			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	memoria	4,5	JCV
MIERCOLES 21			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Verifica	11	JCV
MIERCOLES 28			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Adicion	5,10	JCV
JUEVES 01			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Revista	6,7	JCV
JUEVES 08			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	memoria	4,5	JCV
JUEVES 15			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	PISO	8	JCV
JUEVES 22			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Verifica	11	JCV
JUEVES 29			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Inicio Lab.	5	JCV
VIERNES 02			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Revista	7,8	JCV
VIERNES 09			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	memoria	4,5	JCV
VIERNES 16			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	PISO	8	JCV
VIERNES 23			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Verifica	11	JCV
VIERNES 30			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Inicio Lab	5	JCV
SABADO 03			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Revista	7,8,9	JCV
SABADO 10			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	memoria	4,5	JCV
SABADO 17			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	PISO	8	JCV
SABADO 24			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Verifica	11	JCV
SABADO 31			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA	Inicio	Lab 5	JCV
DOMINGO 04			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA		N.L	JCV
DOMINGO 11			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA		N.L	JCV
DOMINGO 18			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA		N.L	JCV
DOMINGO 25			
PERSONAL			
RESIDENTE DE OBRA		N.L	JCV

PROFESIONALES RESIDENTE DE OBRA	PORCENTAJE	TOTAL DIA DE	CUMPLIO
	100 %	30	31 ✓

OBSERVACIONES

CT. VICTOR CAITA
Vb. SUPERVISOR CONTRATO

1	COFAC - CAN	6	PAULO VI 81
2	CATAM	7	SAUZALITO
3	ICARO - CHAPINERO	8	PUERTO BAHIA
4	BODEGA - PUENTE ARANDA	9	ESMERALDA
5	OFICINA ESINS - MEMORIAS	10	OFICINAL GRUAL CAN INFORMES
		11	Ricaurte

	FORMATO ACTA GENERAL	Versión No:	03
		Implementación:	27-Enero-2016
		Código:	DE-FR-004
		Tipo de Documento:	Formato


Acta Consecutivo No.	Anexo corte No. 03	**Lugar y Fecha**	Recorrido instalaciones mes abril 2018
Oficina Productora	Escuadrón de instalaciones del GRUAL - BACOF		
Asunto	Certificar el uso de la pintura viniltex 1501 en ítem pintura de muros.		
Hora Inicio	09:00 horas	**Hora Finalización**	14:00 horas
Participantes	CT. Victor Julio Caita Gonzalez Supervisor contrato		
Ausentes	N/A		


Orden del día:

Recorrido de instalaciones verificando el uso de una específica pintura.

Desarrollo:

Una vez visitado las instalaciones y dependencias a las cuales se realiza el ítem 9.4, se verifica el uso de pintura tipo viniltex 1501, tal como lo indica el contrato en el CAN – Oficina GRUAL - BACOF. Anexo imágenes así:

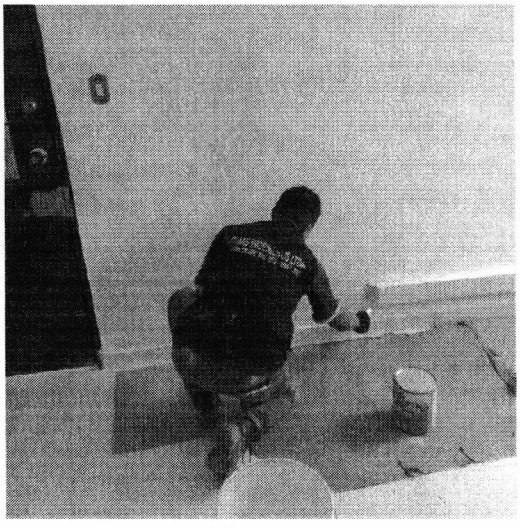

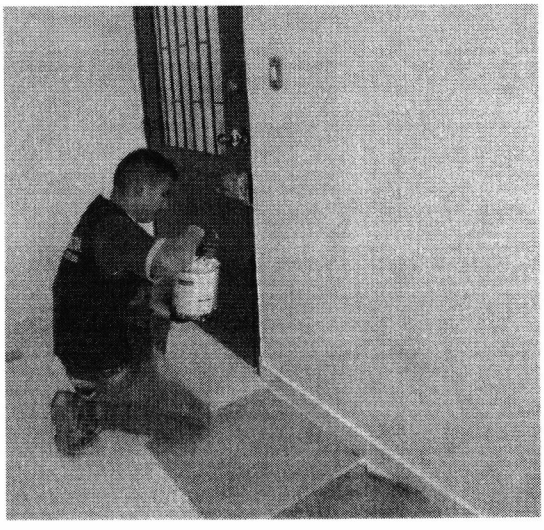

Instalaciones catam:





Actividades a Realizar:		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión: No aplica para próximo mes se reprograma dependiendo donde se labore el ítem.

FIRMAS,

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
Supervisor Contrato de obra 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
