ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Proceso:	Todos los Procesos	Código:	F-DS-21
		Versión:	6
		Fecha Aprobación:	29/11/2016
Documento:	Listado de Asistencia	Fecha de Vigencia: 08/07/2022	Hoja 1 de ___

TIPO DE SESIÓN: [ ] Reunión [ ] Sensibilización [ ] Otro Cual ? _____ HOJA ___ DE ___

TEMA: Comité # 225 proyecto MEBOG | RESPONSABLE: Consorcio Connecta | FECHA 09 05 23 | HORA 10:15 AM.

LUGAR: Sala de Juntas SIFCO

No.	NOMBRE	N° de Identificación	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA	Autorizo el Tratamiento de Datos Personales	
1	MARISOL LOZANO	52.316.252	DM-SDSCJ	3193544044	marisol.lozano@scj.gov.co		SI	NO
2	LEONARDO MESA	79529.062	Dirección Bienes SDSCJ	3134801125	leonardo.mesa@scj.gov.co		SI	NO
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		SI	NO
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		SI	NO
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		SI	NO
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		SI	NO
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		SI	NO
8	Carlos Siniestera	16451816	Connecta		casinisterra@gmail.com		SI	NO
9	Alberto Melo	19483918	C-Connecta	3102194886	[illegible]		SI	NO
10	Claudia Lopez	53046544	Connecta	3112023019	meboc@gmail.com		SI	NO
11	Edgar Gomez	80057260	SDSCJ/Dir. Bienes	3103796570	edgar.gomez@scj.gov.co		SI	NO
12	Angel Giovanni López	79'969.396	PONAL - MEBOG	3173047116	angel.lopez@cconcepolicia.gov.co		SI	NO
13	Ma Angelica Martinez	52.911776	Penal - Apoyo a la Supervisión	3134049186	[illegible]		SI	NO
14	Rodrigo Garcia [illegible]	19498207	MEBOG. I.N	3102376831	[illegible]		SI	NO

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados por el asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Para consultas y reclamos relacionados con el régimen de protección de datos personales y solicitar en cualquier momento, la revocación de esta autorización podrá presentarlas a través de los formatos F-JC-449 (Consultas) y F-JC-448(Reclamos). Así mismo, podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento a través de www.scj.gov.co

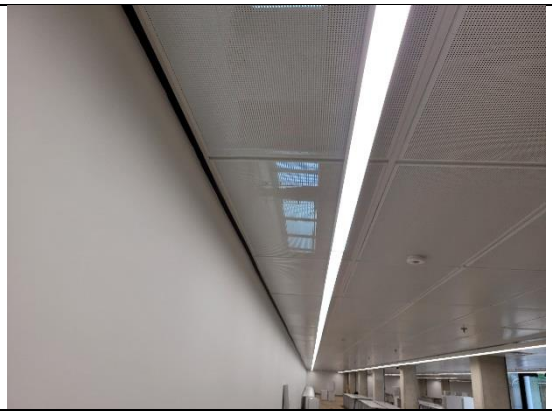
NUEVO COMANDO MEBOG
MAYO 2023
CUARTA SEMANA

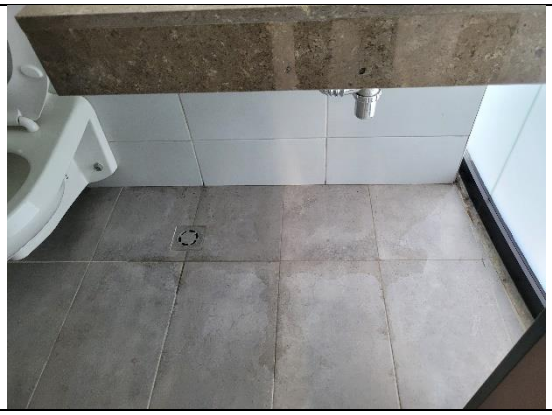
	
ACCESO A NUEVO COMANDO CARRERA 56, OBRAS DE URBANISMO EN EJECUCION, BASE BORDILLOS	OTRA PANORAMICA DE LAS OBRAS, PROGRAMADAS PARA FINALIZAR A MEDIADOS DEL MES DE JUNIO
	
INICIAN TRABAJOS DE COMPACTACION, PARA PROXIMA PAVIMETACION	MOBILIARIO ZONA DE CIRCULACION CENTRAL PUPITRES
	
PANORAMICA DEL ALMACENAJE DE PARTE DEL MOBILIARIO ZONA CENTRAL	PUESTO DE TRABAJO SE DISEÑO CON LOS ESCUDOS EN LA PARTE FRONTAL

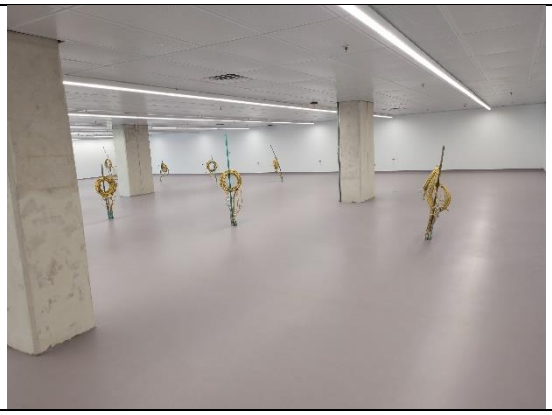
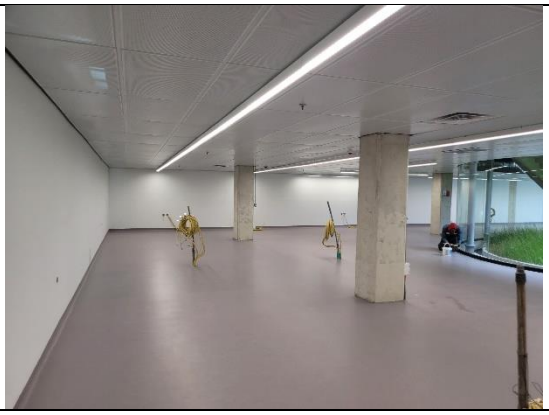
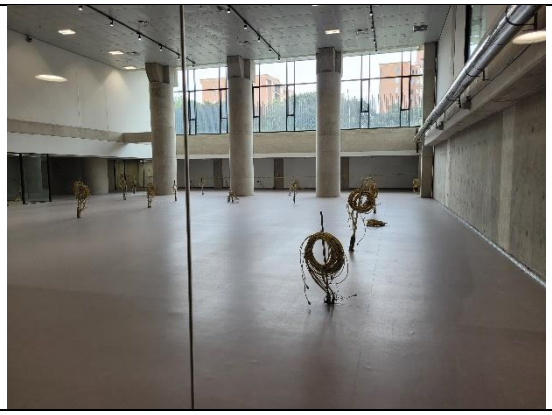
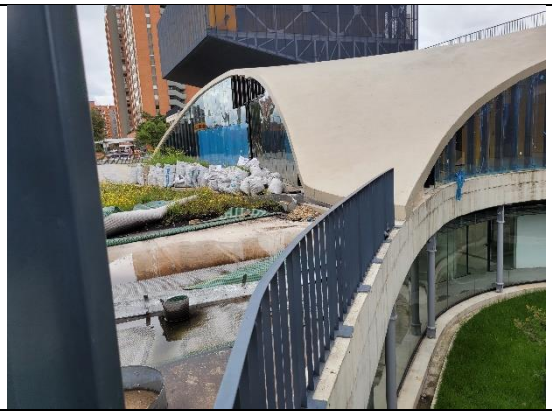
	
ACOPIO DE MUEBLES SILLONES EN ZONA CENTRAL, PARA SUBIRLOS PISO TERCERO Y SEGUNDO.	CAMAROTES, CAMAS YA DISPUESTAS PARA SER INSTALADAS EN ZONA DE HABITACIONES PISO SEXTO
	
CAMAROTES, CAMAS YA DISPUESTAS PARA SER INSTALADAS EN ZONA DE HABITACIONES PISO SEXTO	CAMAROTES, CAMAS YA DISPUESTAS PARA SER INSTALADAS EN ZONA DE HABITACIONES PISO SEXTO
	
INTERVENCION COLOCACION PUESTOS DE TRABAJO EN EL SOTANO, UNA VEZ SE LIBERO EL PISO DE LINOLEO	INTERVENCION COLOCACION PUESTOS DE TRABAJO EN EL SOTANO, UNA VEZ SE LIBERO EL PISO DE LINOLEO

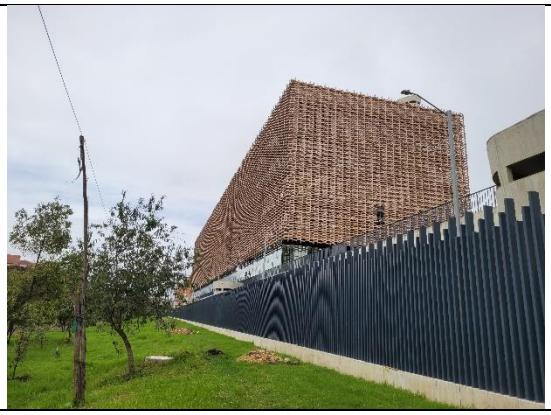
	
VISTA DE LA LA COLOCCION DE PUESTOS DE TRABAJO PRIMERA PARTE, PISO PROTEJIDO	OTRA PANORAMICA DE ESTE PRIMERA FASE DE INSTALACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ZONA DEL SOTANO
	
PANORAMICA DE ESTE PRIMERA FASE DE INSTALACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ZONA DEL SOTANO	PANORAMICA DE ESTE PRIMERA FASE DE INSTALACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ZONA DEL SOTANO
	
PANORAMICA DE ESTE PRIMERA FASE DE INSTALACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ZONA DEL SOTANO	PANORAMICA DE ESTE PRIMERA FASE DE INSTALACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ZONA DEL SOTANO

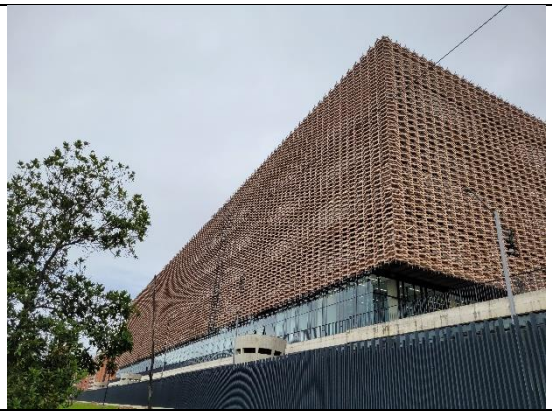
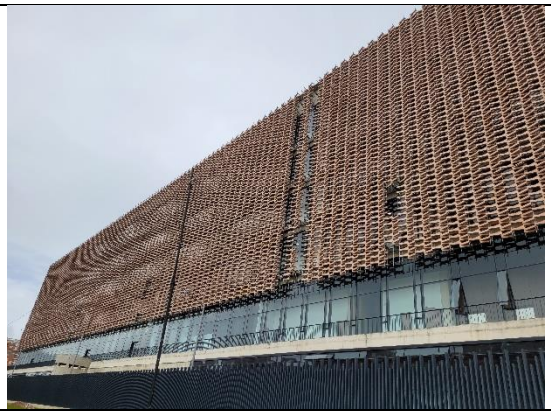
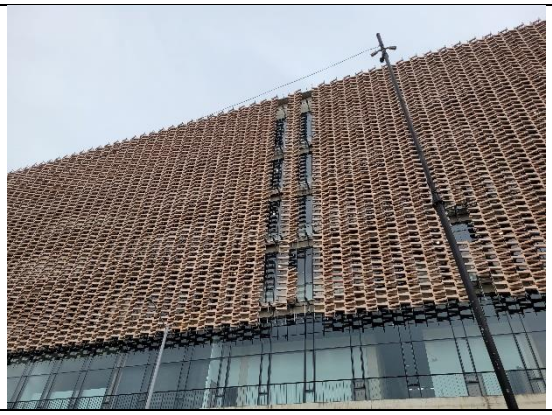
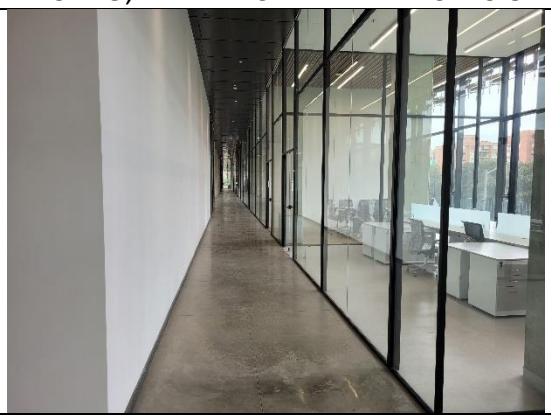
	
SE EVIDENCIAN HUMEDADES EN LOS PISOS, LOCALIZADAS PUNTUALMENTE, PROVENIENTES DE LA ZONA DE LA CUBIERTA	SE EVIDENCIAN HUMEDADES EN LOS PISOS, LOCALIZADAS PUNTUALMENTE, PROVENIENTES DE LA ZONA DE LA CUBIERTA
	
SE PROTEGIO EL PISO CON CARTON, DADA LA HUMEDAD QUE PUEDE INICIAR UN DAÑO PREMATURO SOBRE EL PISO EN LINOLEO	SE PROTEGIO EL PISO CON CARTON, DADA LA HUMEDAD QUE PUEDE INICIAR UN DAÑO PREMATURO SOBRE EL PISO EN LINOLEO
	
ZONA DEL CIELORRASO , CERCA AL MURO DONDE POR DISEÑO ARQUITECTONICO, ENTRA ILUMINACION NATURAL, NO OBSTANTE PUEDEN PRESENTARSEN FILTRACIONES.	ZONA DEL CIELORRASO , CERCA AL MURO DONDE POR DISEÑO ARQUITECTONICO, ENTRA ILUMINACION NATURAL, NO OBSTANTE PUEDEN PRESENTARSEN FILTRACIONES.

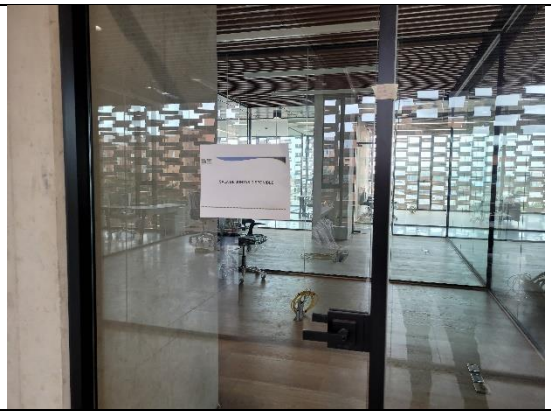
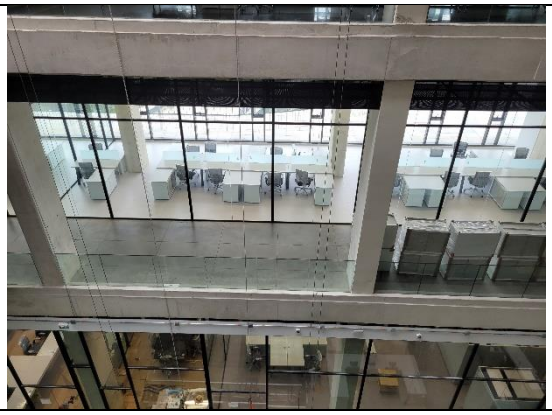
	
OTRA VISTA DEL CIELORRAS ILUMINACION NATURAL, AL PISO INFERIOR,	HUMEDADES LOCALIZADAS.
	
PROTECCION DEL PISO	COLOCACION DE MOBILIARIO,
	
ACOPIO PARA POSTERIOR COLOCACION.	ARCHIVADORES, COLOCADOS EN LA ZONA DEL SOTANO

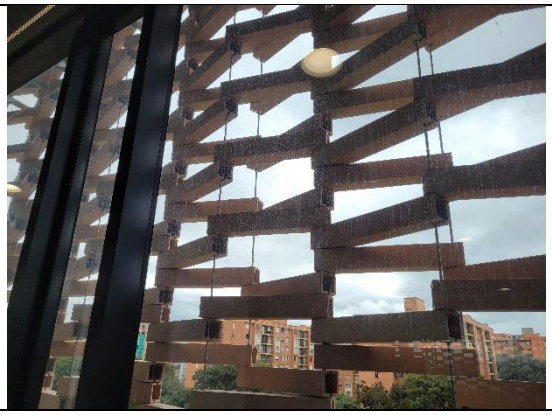
	
ARCHIVADORES, COLOCADOS EN LA ZONA DEL SOTANO	ARCHIVADORES, COLOCADOS EN LA ZONA DEL SOTANO
	
FUGAS DE AGUA PROVENIENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL BAÑO	OTRA VISTA DE LA ZONA DE ARCHIVADORES
	
PISO LINOLEO, DE DIFERENTES TONALIDADES	LOS RECORTES SE VERIFICAN COLORES DEGRADADOS

	
ZONA SIJIN, AREA DE SOTANO, FINALIZADA, LISTA PARA COLOCAR MOBILIARIO.	ZONA SIJIN, AREA DE SOTANO, FINALIZADA, LISTA PARA COLOCAR MOBILIARIO.
	
ESTA ZONA PUEDE INICIARSE, PRESENTA TERMINACION PISO 100 %	ARMERILLOS.
	
TRABAJOS DE REPARACION DE MEBRANA EN LA ZONA SUPERIOR DE PLATAFORMA,	FRENTE DESCUIDADO, SIN CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS, LO CUAL PUEDE OCASIONAR DAÑOS EN LA ZONA INFERIOR POR INFILTRACION DE LLUVIAS.

	
OTRA VISTA DE ESTA REPARACION	SOBRE LA CARRERA 56, ZONA DE ACCESO PEATONAL, SE HACEN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE ACCESO, NORMAS IDU
	
SOBRE LA CARRERA 56, ZONA DE ACCESO PEATONAL, SE HACEN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE ACCESO, NORMAS IDU	SOBRE LA CARRERA 56, ZONA DE ACCESO PEATONAL, SE HACEN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE ACCESO, NORMAS IDU
	
OTRO ASPECTO DE LA CONFORMACION DE ESTA ZONA	FACHADA ZONA NORTE, DONDE SE VERIFICAN ASPECTOS DE CALIDAD DE LA DOBLE PIEL.

	
ESTA FACHADA, ESTA EN MONITOREO, TODA VEZ QUE SE PRESENTO UNA ROTURA DE UN CABLE, SE SOPORTE DE LOS LADRILLOS QUE CONFORMAN LA FACHADA	RETIRO DE ALGUNOS ELEMENTOS PARA REPARACION.
	
LA FIRMA SUMINISTRADORA Y CONTRATISTA DE ESTE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS SE DENOMINA ES METALS, FACHADA FLOTANTE, LA CUAL SOLICTADA PARA EXPLICAR LA NOVEDAD DEL CABLE DE SOPORTE	DENTRO LAS RECOMENDACINES DE REPACIONES SE VAN A CAMBIAR 15 FUSIBLES, ELEMETOS QUE SON DE ALERTA DEL TRABAJO DE TENSION. SE DEBEN COLOCAR ELEMENTOS DE ANCLAJE DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y CALIFICADO, PARA FACILITAR LA INSPECION
	
VISTAS DEL PROCESO DE INSTALACION MOBILIARIO EN CADA UNO DE LOS PISOS	VISTAS DEL PROCESO DE INSTALACION MOBILIARIO EN CADA UNO DE LOS PISOS

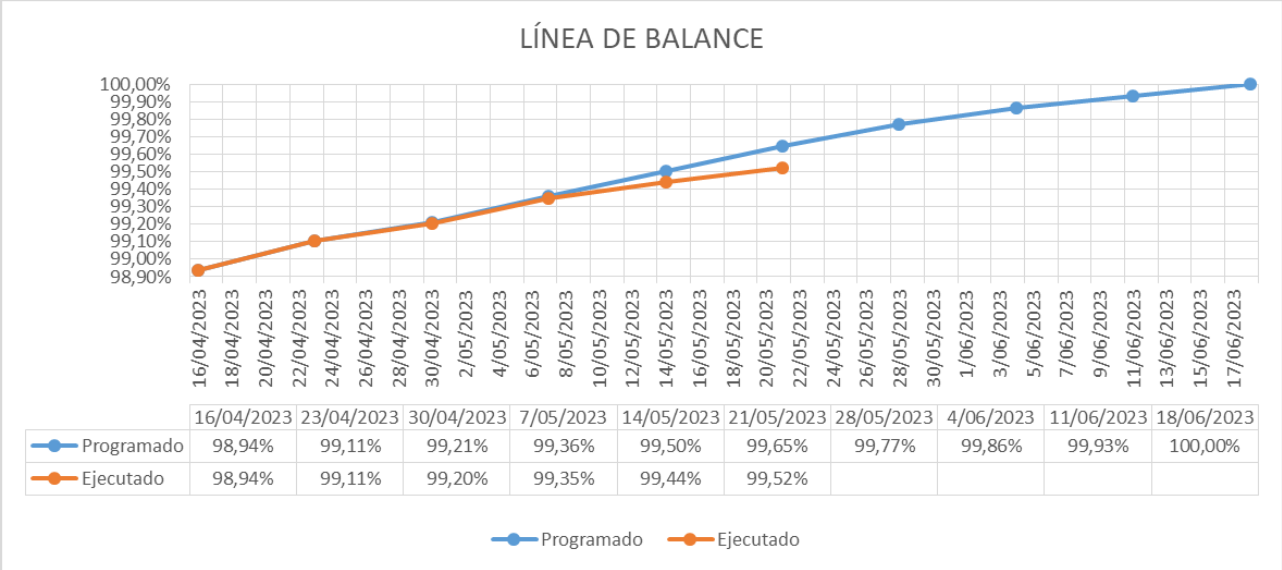
	
VISTAS DEL PROCESO DE INSTALACION MOBILIARIO EN CADA UNO DE LOS PISOS	VISTAS DEL PROCESO DE INSTALACION MOBILIARIO EN CADA UNO DE LOS PISOS OFICINA COMANDO
	
VISTAS DEL PROCESO DE INSTALACION MOBILIARIO EN CADA UNO DE LOS PISOS	VISTAS DEL PROCESO DE INSTALACION MOBILIARIO EN CADA UNO DE LOS PISOS
	
VISTAS DEL PROCESO DE INSTALACION MOBILIARIO EN CADA UNO DE LOS PISOS	SISTEMA DE LA FACHADA FLOTANTE, EN TEJIDO ENTRE LOS ELEMENTO DE MAMPOSTERIA Y CADA UNO DE LOS CABLES DE SOPORTE

	
SISTEMA DE LA FACHADA FLOTANTE, EN TEJIDO ENTRE LOS ELEMENTO DE MAMPOSTERIA Y CADA UNO DE LOS CABLES DE SOPORTE	SISTEMA DE LA FACHADA FLOTANTE, EN TEJIDO ENTRE LOS ELEMENTO DE MAMPOSTERIA Y CADA UNO DE LOS CABLES DE SOPORTE
	
DETALLE DEL SISTEMA DE COLOCACION DEL ELEMENTO DE ARCILLA, EMBEBIDO EN EL CABLE GUIA	DETALLE DEL SISTEMA DE COLOCACION DEL ELEMENTO DE ARCILLA, EMBEBIDO EN EL CABLE GUIA
	
DETALLE DEL SISTEMA DE COLOCACION DEL ELEMENTO DE ARCILLA, EMBEBIDO EN EL CABLE GUIA	

ANALISIS DE PROGRAMACION MAYO 25

El porcentaje programado con la reprogramación presentada es 99,65% ejecutado 99,52%
El plazo para terminar la obra se ve afectado en la presente semana. Las actividades que están presentando la desviación son las siguientes:

1. Instalación Mobiliario en sótano
2. Instalación Torre de Comunicaciones



	16/04/2023	23/04/2023	30/04/2023	7/05/2023	14/05/2023	21/05/2023	28/05/2023	4/06/2023	11/06/2023	18/06/2023
Programado	98,94%	99,11%	99,21%	99,36%	99,50%	99,65%	99,77%	99,86%	99,93%	100,00%
Ejecutado	98,94%	99,11%	99,20%	99,35%	99,44%	99,52%				

OBSERVACIONES

Se continua con actividades de trabajos de sotanto, remates y colocacion de piso en linoleo

Se presentan novedades de humedades localizadas, las cuales de no subsanarsen debidamente pueden generar un deterioro prematuro del piso.

Otras activades referentes a obras exteriores, donde los diseños han sido debidamente conciliados y apobados por el IDU, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CODENSA, estan en su fase final.

Dentro del protocolo de recibo, se han verificado observaciones de calidad, especialmente en los acabado, esto es pintura, carpinteria metalica, las cuales fueron dadas a conocer, tanto a interventoria, como a constructor, con el fin de

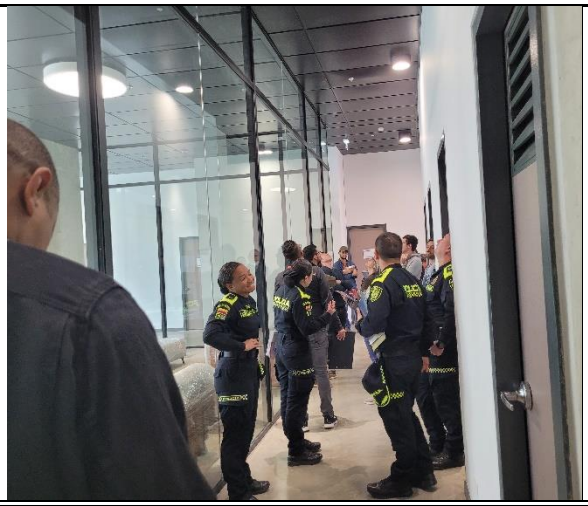
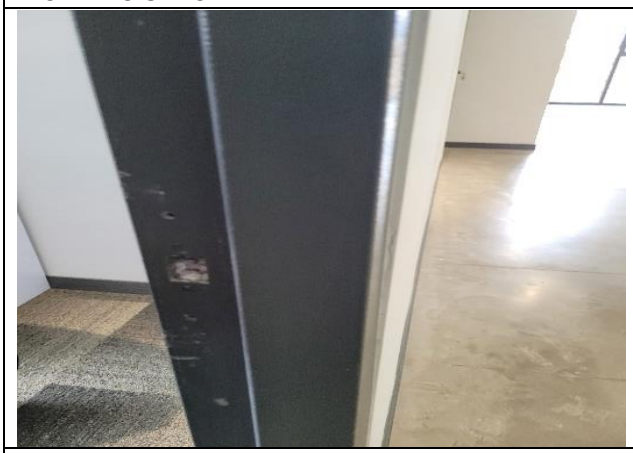
que sean tenidas en cuenta, como criterio de recibo a satisfaccion por parte de la oficina de bienes raices de la Metropolitanta de Bogota.

Se presenta la solicitud de generar un monitoreo a la fachada, doble pie, de cada cuatro meses, con el fin de verificar el correcto funconamiento a nivel estructural, de este elemento.

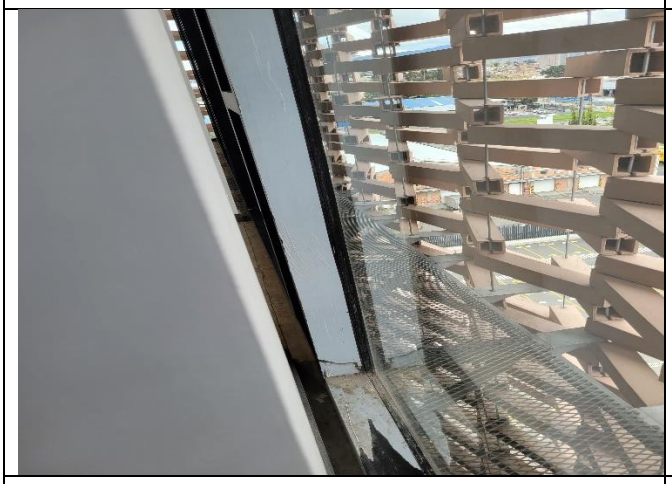
Otros aspectos de servicios, tramites finales ante las entidades prestadoras de servicio, estan en curso, inclusive la antena de comunicación.

Se estima al presente informe tercera semana de mayo, fecha de terminacin 17 de Junio.

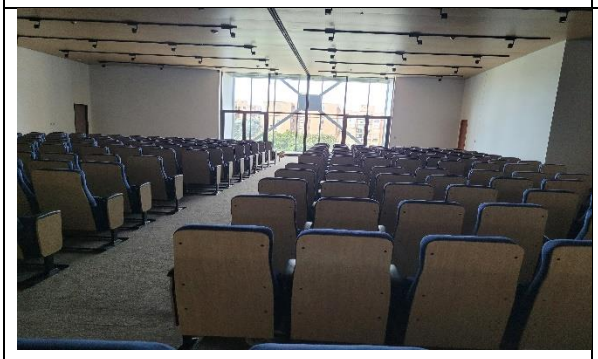
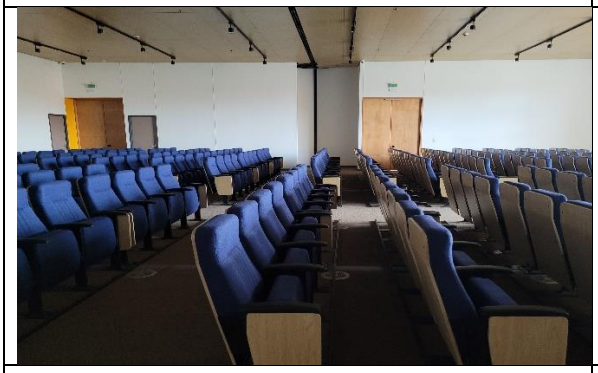
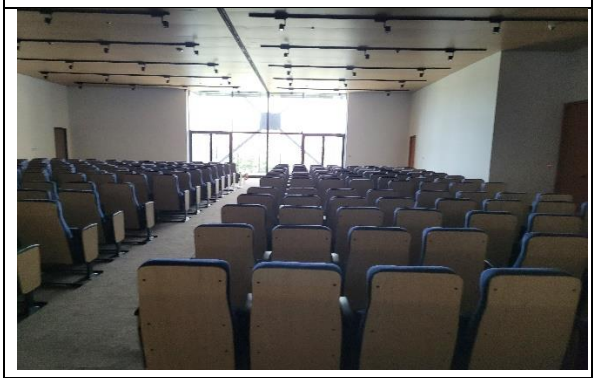
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
PROTOCOLO DE RECIBO REVISION DE INSTALACIONES	PROTOCOLO DE RECIBO REVISION DE INSTALACIONES
	
PROTOCOLO DE RECIBO REVISION DE INSTALACIONES	FISURAS PISO EN CONCRETEO ZONAS DE CIRCULACION.
	
0BSERVACION DE LA CANTONERA. PUERTA DE ACCESO A HABITACION, FALTA ELEMENTO DE COMPLEMENTO	CONTINUACION DE RECIBO, OBSERVACIONES PISO SEXTO, INICIO DE PROTOCOLO DE RECIBO

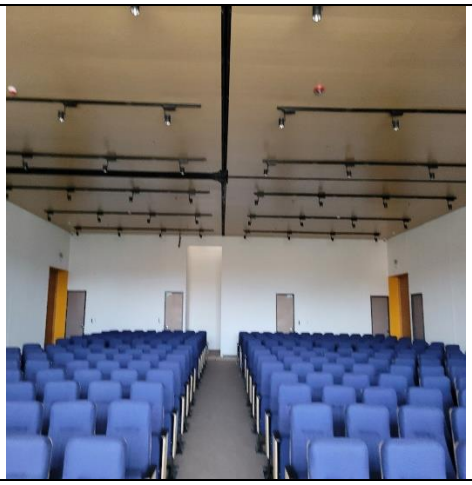
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
AUDTORIO TERMINADO	OBSERVACION DILATACION ENTRE HABITACIONES
	
DITACION ENTRE HABITACIONES, DESDE LA FASE DE DISEÑO SE INCORPORO	FISURAS POR CONTRACCION
	
FISURAS POR CONTRACCION	FISURAS POR CONTRACCION

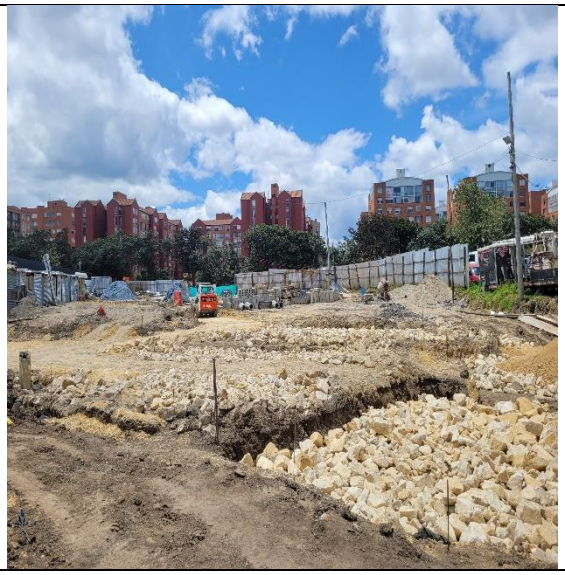
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
PANORAMICA AUDITORIO	PANORAMICA AUDITORIO
	
PANORAMICA AUDITORIO	PANORAMICA AUDITORIO
	
PANORAMICA AUDITORIO	PANORAMICA AUDITORIO

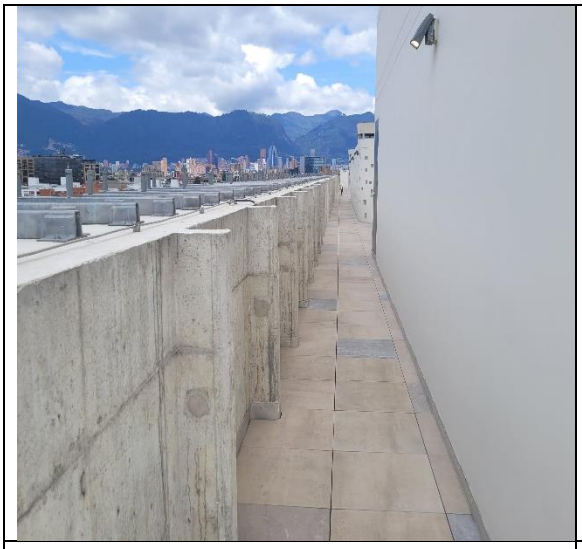
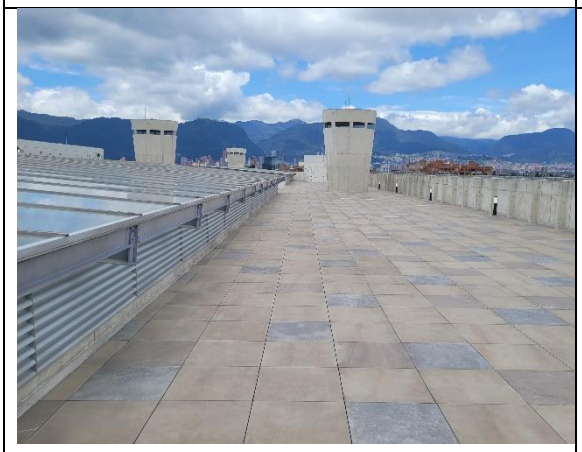
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
PANORAMICA AUDITORIO	PANORAMICA AUDITORIO
	
PANORAMICA AUDITORIO	PANORAMICA AUDITORIO
	
FIJACION DE LOS ARCHUIVADORES, ANALISIS DE ANCLAJE AL PISO EVITAR VOLCAMIENTO EN EL USO	FIJACION DE LOS ARCHUIVADORES, ANALISIS DE ANCLAJE AL PISO EVITAR VOLCAMIENTO EN EL USO

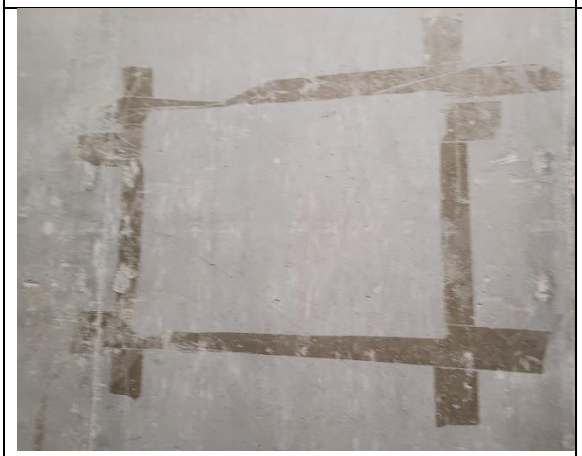
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
OBRAS FINALES DE URBANISMO ACCESO CARRERA 56	OBRAS FINALES DE URBANISMO ACCESO CARRERA 56
	
OBRAS FINALES DE URBANISMO ACCESO CARRERA 56	OBRAS FINALES DE URBANISMO ACCESO CARRERA 56, RELLENOES EN MATERIAL GRANULAR, PIEDRA MEDIA ZONJA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
	
OBRAS FINALES DE URBANISMO ACCESO CARRERA 56, RELLENOES EN MATERIAL GRANULAR, PIEDRA MEDIA ZONJA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	OBRAS FINALES DE URBANISMO ACCESO CARRERA 56, RELLENOES EN MATERIAL GRANULAR, PIEDRA MEDIA ZONJA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

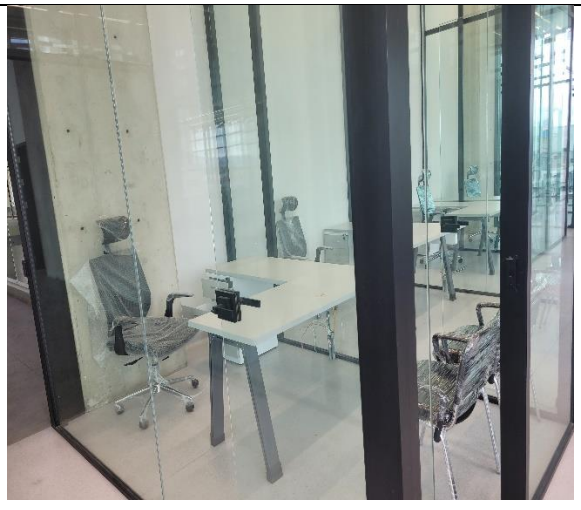
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
CUBIERTA FINALIZADA	CUBIERTA FINALIZADA
	
CUBIERTA FINALIZADA	CUBIERTA FINALIZADA
	
FIJACION ANTENA SOPORTTE, DONDE SE COLOCARÁ LA ANTENA DE COMUNICACIONES	CIRCUALACION ZONA INTERNA DE SERVICIOS COCINA Y COMEDOR

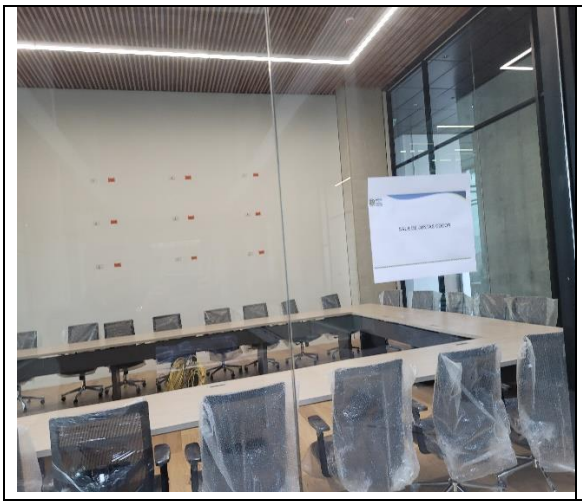
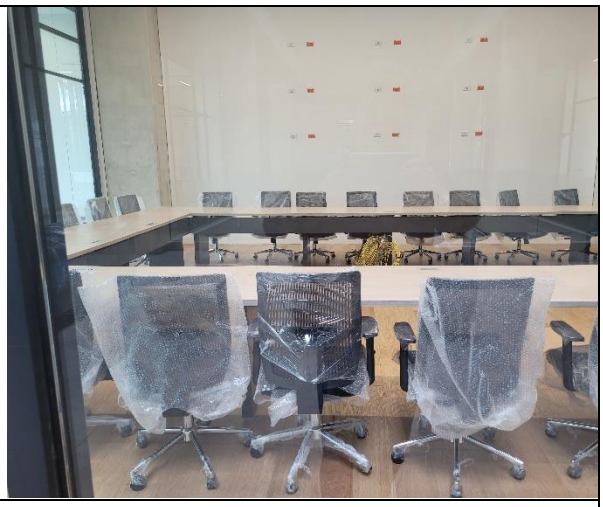
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
DOTACION COCINA NEVERAS	CIRCULACIONES PISO SEXTO
	
MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS	MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS
	
PATOLOGIA EN ZONA DE CIRCULACION ESCALERAS DE EVACUACION, FALTA LIMPIEZA	MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS

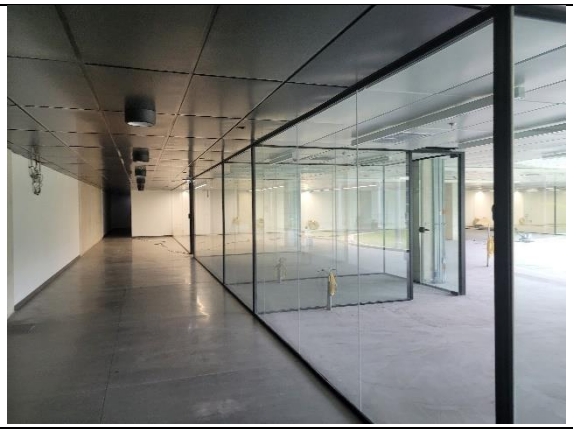
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
PATOLOGIA EN ZONA DE CIRCULACION ESCALERAS DE EVACUACION, FALTA LIMPIEZA	MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS
	
MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS	MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS
	
MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS	MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS

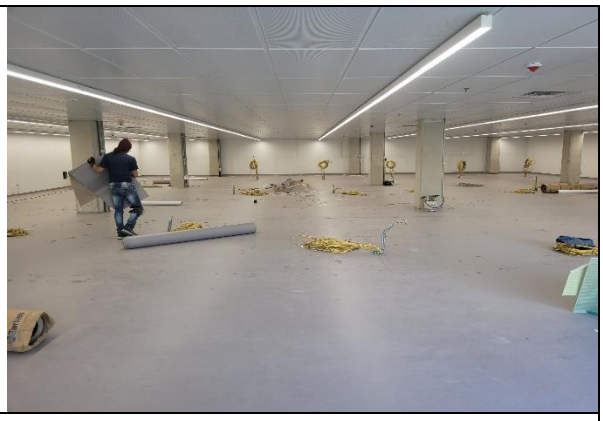
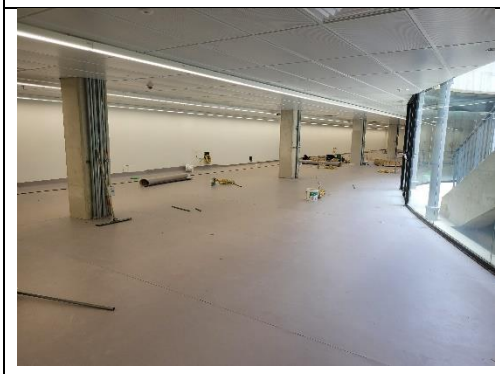
DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS	MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS
	
MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS	MOBILIARIO DISPUESTO EN CADA UNO DE LOS PISOS
	
PRUEBA DE MANIOBRA DE ARCHIVADORES RODANTES, ANALIISIS DE OPERACION	PRUEBA DE MANIOBRA DE ARCHIVADORES RODANTES, ANALIISIS DE OPERACION

DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
OBRAS DE URBANISMO CARRERA 56 ACCESO PEATOTAL	OBRAS DE URBANISMO CARRERA 56 ACCESO PEATOTAL
	
REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO	REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO
	
REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO	REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO

DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO	REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO
	
REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO	REMATE FINALIZACION BARRERA DE VAPOR Y PISO LINOLERO ZONA DE SOTANO
	
COONTROL DE ACCESO CARRERA 56	OBRA COLOCACION DE TABLON ACCESO CARRERA 56

DESARROLLO OBRAS FINALES MES DE MAYO 2023 NUEVO COMANDO

	
OBRA COLOCACION DE TABLON ACCESO CARRERA 56	OBRA COLOCACION DE TABLON ACCESO CARRERA 56
