Número de contrato: 891 de 13/03/2023

Objeto:

NUMERO Y PERIODO DEL INFORME	**INFORME No. 1 del 21 de marzo al 20 de Junio de 2023**
CONTRATISTA	**SOFYA S.A.S.NIT. 900.769.080-5 Rte. Legal. TATIANA JULIETH BRIÑEZ SANTAMARIA C.C. 1.022.372.034**
VALOR DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($415.895.037), valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.**
PRORROGA	N/A
ADICION	

AVANCE DE EJECUCIÓN	**VALOR DEL PRESENTE INFORME: 207.947.519**
	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN: (58.8%)

COMENTARIOS – REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

En contrato se establecen las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Realizar establecimiento de las especies en las áreas priorizadas para rehabilitación	Ha	20	$ 5,475,690.00	$ 109,513,800
2	Establecer viveros con especies vegetales identificadas	UND	1	$ 12,275,040.00	$ 12,275,040
3	Realizar el aislamiento de plantaciones para la rehabilitación ecológica	Km	6	*$ 11,261,463.83*	$ 67,568,783
4	Realizar primer mantenimiento a plantaciones establecidas	Ha	20	$ 2,559,025.40	$ 51,180,508
5	Continuar mantenimiento a plantaciones de proyectos ejecutados en el municipio de Tunja	Ha	21	$ 2,559,025.38	$ 53,739,533
6	Instalar parcelas de monitoreo	UND	3	$ 3,432,366.00	$ 10,297,098
7	Realizar talleres de sensibilización ambiental y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).	UND	2	$ 1,919,748.00	$ 3,839,496
8	Realizar talleres de socialización de los resultados del proyecto ante las comunidades.	UND	10	$ 1,919,748.0	$ 19,197,480
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 327,611,738**
	ADMINISTRACION	22%			**$ 64,741,086**
	IMPREVISTOS	3%			**$ 8,828,330**
	UTILIDAD	5%			**$ 14,713,883**
	TOTAL AIU	30%			**$ 88,283,299**
	VALOR DEL PROYECTO				**$ 415,895,037.00**

De acuerdo con el cornograma, con corte a 20 de junio, se dio cumplimiento a cada una de las actividades proyectadas, el seguimiento además de la supervisión conto con un profesional que verifica cada una de las actividades ejecutadas por el contratista, su ejecución fue:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	Realizar establecimiento de las especies en las áreas priorizadas para rehabilitación	Ha	20	$ 109,513,800.00	20	$ 109,513,800.00
2	Establecer viveros con especies vegetales identificadas	UND	1	$ 12,275,040.00	1	$ 12,275,040.00
3	Realizar el aislamiento de plantaciones para la rehabilitación ecológica	Km	5.635	63,458,349.00	5.635	$ 63,458,349.00
4	Realizar primer mantenimiento a plantaciones establecidas	Ha	0	$ -	0	$ -
5	Continuar mantenimiento a plantaciones de proyectos ejecutados en el municipio de Tunja	Ha	0	$ -	0	$ -
6	Instalar parcelas de monitoreo	UND	0	$ -	0	$ -
7	Realizar talleres de sensibilización ambiental y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).	UND	2	$ 3,839,496.00	2	$ 3,839,496.00
8	Realizar talleres de socialización de los resultados del proyecto ante las comunidades.	UND	0	$ -	0	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO		TOTAL COSTO DIRECTO PRESE	$ 189,086,685.00	TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 189,086,685.00
	ADMINISTRACION	22%	ADMINISTRACI	$ 40,754,381.58	ADMINISTRACION 22 %	$ 40,754,382
	IMPREVISTOS	3%	IMPREV	$ 5,557,415.67	IMPREVISTOS 3 %	$ 5,557,416
	UTILIDAD	5%	UTILIDA	$ 9,262,359.45	UTILIDAD 5 %	$ 9,262,359
	TOTAL AIU	30%	TOTAL	$ 55,574,157.00	TOTAL AIU 30%	$ 55,574,157
	VALOR DEL PROYECTO		VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 244,660,842.00	VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 244,660,842.00

Acorde a la forma de pago: Pago 1. Del 50% al 50% de ejeucuion de contrato, efectivamente se ejecuto el 58.8%

Tabal de pago.

	AMORTIZACION
VALOR PRESENTE ACTA	207,947,519
AMORTIZACION ANTICIPO 20%	41,589,504
VALOR A PAGAR	166,358,015

ACTIVIDAD 1: Realizar establecimiento de las especies en las áreas priorizadas para rehabilitaciónDE LAS 20 HA INTEVENIDAS SE EJUCUTO:

VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	LOTES	AREA A REFORESTAR/AREA TOTAL		CANTIDAD DE ARBOLES	TOTAL ARBOLES
RUNTA	LA CABAÑA	Lote La Cabaña	1.6	**1.6**	2.007	**2.007**

PIRGUA	SANTO DOMINGO	La Providencia	1,34		1.720	**1.720**
SORACÁ	SANTO DOMINGO	Lote Santo Domingo 1	2,32	**10,76**	2.977	**12.081**
		Lote Santo Domingo 2	1		1.283	
		Lote Santo Domingo 3	4,3		5.517	
		Lote Santo Domingo 4	0,38		488	
		Lote Santo Domingo 5	1,21		1.552	
		Lote Santo Domingo 6	0,106		136	
		Lote Santo Domingo 7	0,1		128	
LA HOYA	PANTANO VERDE	Lote 1 Pantano verde	4,23	**5,40**	5.427	**6.932**
		Lote 2 Pantano verde	0,21		273	
		Lote 3 Pantano verde	0,96		1.232	
LA HOYA	BUENOS AIRES	Lote Buenos Aires	0,17	**0,17**	220	**220**
TIRAS DEL ALTO	SAN FRANCISCO	Lote San Francisco	0,79	**0,79**	1.019	**1.019**
TIRAS DEL ALTO	LA ESPERANZA	La Esperanza Lote1	0,88	**1,31**	1.131	**1.682**
		La Esperanza Lote2	0,33		423	
		La Esperanza Lote3	0,1		128	
		TOTAL		**20,03**		**25.660**
				HA	CANTIDAD	Árboles

ACTIVIDAD DOS: Establecer viveros con especies vegetales identificadas, Se instaló el vivero, se incio proceos de progagacion de plantas y se entregaron cada de los insumos que se reportan en el APU. Adicional a esto el contratista mejoróa las instalaciones con la instalación de plástico para vivero.

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Columnas en madera de 3 m de altura de 12x12 cm	16,0	Entregado
Alambre galvanizado calibre 12,5 x kg x 400m	15,0	Entregado
Alambre galvanizado calibre 14 x kg x m	5,0	Entregado
Pita nylon x 50 m	2,0	Entregado
Tensor para cerca eléctrica	20,0	Entregado
Polisombra al 50% 4x50 metros x rollo	1,0	Entregado
Grapas para cerca 1 1/4	2,0	Entregado
Plástico negro 4m x 1m calibre 6	72,0	Entregado
Tierra negra abonada (tierra, cascarilla de arroz y abono orgánico)	6,0	Entregada
Rollo manguera minera 3/4" x 100	1,0	Entregado
Regadera plástica de jardín.	4,0	Entregado
Válvula de pie de 1"	1,0	Entregado
Tubo PVC de presión 1"	1,0	Entregado
Adaptador macho presión PVC 1"	4,0	Entregado
Codo presión PVC 1"	2,0	Entregado
Electro bomba centrífuga 1 HP descarga 1"	1,0	Entregado
Buje reducción de 1" a 3/4"	2,0	Entregado
Soldadura para PVC x 1/4"	1,0	Entregado
Tanque plástico para almacenamiento x 500L	1,0	Entregado
Pala redonda # 2	4,0	Entregado

Rastrillo plástico 22 dientes	2,0	Entregado
Bomba de espalda 20 litros	1,0	Entregado
Cubeta plástica de 15 litros	4,0	entregado
Bandeja de germinación x 50 cavidades	50,0	Entregado
Bolsas para vivero 18 cm de alto x 13 cm de ancho x 1000 uni	50,0	Entregado
Semillas de especies nativas paq. x 50 gramos	30,0	Entregado
Materia orgánica bulto x 50 kg	80,0	Entregado
Fertilizante foliar x kg	10,0	Entregado
Fertilizante foliar x litro	5,0	Entregado
Micorrizas bolsa x 10 kg	10,0	Entregado
Cal agrícola bolsa x 50 kg	10,0	Entregado
Fertilizante bulto de 50 kilos	5,0	Entregado

ACTIVIDAD 3: Realizar el aislamiento de plantaciones para la rehabilitación ecológica , Se realizó el aislamientoo a los predios de la siguiente manera:

VEREDA	NOMBRE DEL PREDIO	LOTES	AISLAMIENTO ML	% AVANCE AISLAMIENTO	TOTAL ML EJECUTADO
RUNTA	LA CABAÑA	Lote La Cabaña	134 estacones 10 pie de amigos	0%	335 (proyectado)
SORACÁ	PUENTE HAMACA	La Providencia	240 estacones 20 pie de amigos	100%	600
PIRGUA	SANTO DOMINGO	Lote Santo Domingo	1.373 estacones 114 pie de amigos	100%	3.433
LA HOYA	PANTANO VERDE	Lote Pantano verde	228 estacones 19 pie de amigos	100%	570

LA HOYA	BUENOS AIRES	Lote Buenos Aires	37 estacones 5 pie de amigos	100%	92
TIRAS DEL ALTO	LA ESPERANZA	La Esperanza	388 estacones 32 pie de amigos	100%	970
			TOTAL	**ML EJECUTADOS**	**5.665**
				PENDIENTES	**335**

4. Realizar talleres de sensibilización ambiental y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Corresponde actividad 7.

Se realizaron dos talleres en las veredas La hoya y La esperanza, respectivame

EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS, INFORMES PDF). Se verifico que el informe de entrega del contratista corresponde a lo ejecutado y se dio el visto bueno. Se anexa reporte fotográfico y actas de seguimiento al contrato en

ALAIN CAMARGO GUERRERO
Secretario de Despacho- Secretaria de Medio Ambiente
SUPERVISOR

Nota: este informe no aplica a **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Esteban Guacheta Alain Camargo	Apoyo Supervisión Supervisor	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			


INFORME DE SUPERVISION A CONTRATO 891 DE 2023

- **ACTIVIDAD 1. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓN PROTECTORA DE 20 HA**





-

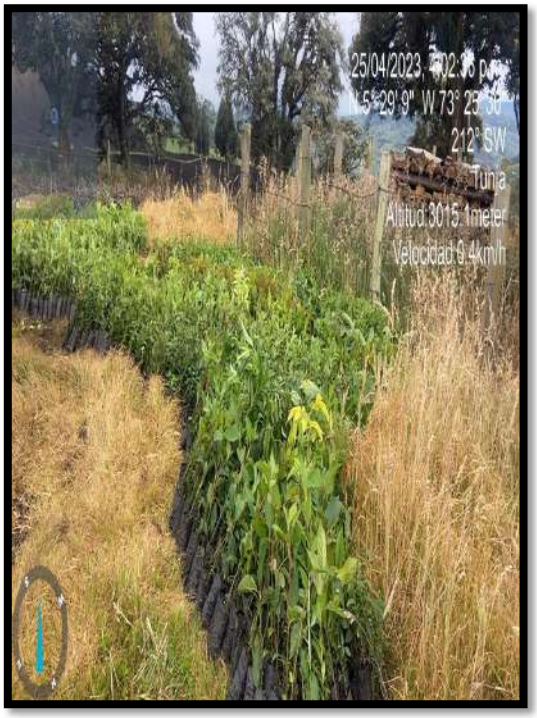



-










Altitud 3163.6metros
Velocidad 3.3kmph















ACTIVIDAD 2. AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN













ACTIVIDAD 3. INSTALACIÓN DE VIVERO
















CRECER 500
fertilizante compuesto mezclado NPK
para aplicación foliar
POLVO SOLUBLE
USO AGRÍCOLA


RoyalCondor
RoyalCondor










NUTRISAM
ABONO ORGÁNICO LIQU
BATIR ANTES DE DESTAPARLO


26/06/2023, 8:24:27 a.m.
N 5° 31' 10", W 73° 21' 23"
21° N
Tunja
Altitud:2750 Meter
Velocidad: 1 km/h




15-15-15+10(S)
15-15-15+10(S)
15-15-15+10(S)


JAFER
MICORRIZAS M.A.




MINEROS DE COLOMBIA
DOLOMITA
PESO NETO: 50 KILOS


Rotoplast
500 L

ACTIVIDAD 4. TALLERES PARTICIPATIVOS














21 DE MARZO DE 2023 REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE LA EMPRESA SOFYA S.A.S CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO 891 DE 2023 Y ORGANIZAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN **ACTA 0223**

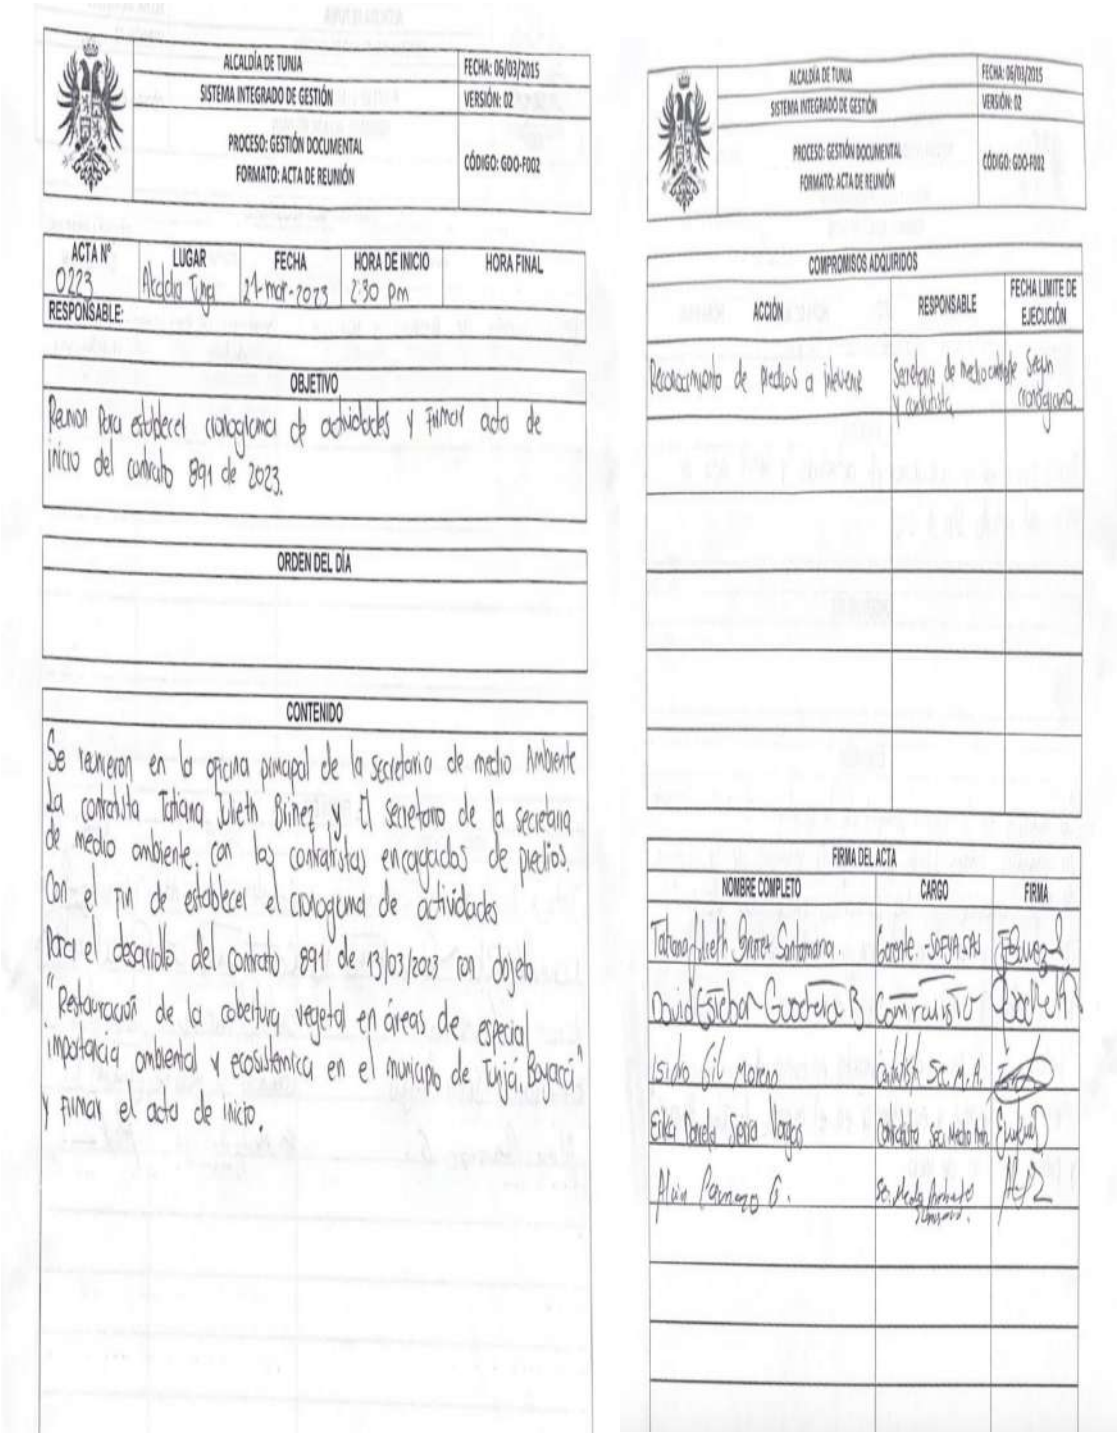

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
0223	Alcaldía Tunja	21-mar-2023	2:30 pm	

RESPONSABLE:

OBJETIVO

Reunión Para establecer cronogramas de actividades y Firmar acta de inicio del contrato 891 de 2023.

ORDEN DEL DÍA

CONTENIDO

Se reunieron en la oficina principal de la secretaria de medio Ambiente la contratista Tatiana Lileth Blinez y El secretario de la secretaria de medio ambiente. con los contratistas encargados de predios. Con el fin de establecer el cronograma de actividades Para el desarrollo del contrato 891 de 13/03/2023 con objeto "Restauración de la cobertura vegetal en áreas de especial importancia ambiental y ecosistemica en el municipio de Tunja, Boyacá" y Firmar el acta de inicio.

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Reconocimiento de predios a intervenir	Secretaria de medio ambiente y contratista	Según cronograma

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Tatiana Lileth Blanco Santamaria.	Contratista - Sofya SAS	
David Esteban Guacheta B.	Contratista	
Isidro Gil Moreno	Contratista Sec. M.A.	
Erika Daniela Soria Vargas	Contratista Sec. Medio Amb.	
Alvaro Parmenio G.	Sec. Medio Ambiente Tunja	

22 DE MARZO DE 2023 VISITA CON CONTRATISTAS DE LA EMPRESA SOFYA S.A.S A PREDIOS PRIVADOS PARA RECONOCIMIENTO DE ÁREAS A REFORESTAR Y CONSTRUCCIÓN DE VIVERO
ACTA 0234

ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES FORMATO: ACTA DE VISITA	CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR: Vereda Runta, Pisgua y Puente Hermoso.	FECHA: 22-03-2023	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FINALIZACIÓN: 5:00 pm
RESPONSABLE: Secretaría de Medio Ambiente Acta 0234			

ASISTENTES

Contratistas del equipo de predios de la secretaria de medio ambiente y equipo técnico de la empresa SOFYA encargada del desarrollo del contrato 891 de 2023.

OBJETIVO

Realizar el reconocimiento de los predios a intervenir en el desarrollo del contrato 891 de 2023

SITUACIÓN PRESENTADA

Se realiza la visita de identificación de los predios privados para el reconocimiento de áreas a reforestar y construcción de vivero. Se visita la reserva la cabaña, Santo Domingo y providencia, se identifican los predios de la cabaña

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES FORMATO: ACTA DE VISITA	CÓDIGO: SUR-F-019

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS


Anexo fotográfico

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD Y CARGO	No. DE CONTACTO	FIRMA
Felipe A. Vélez Suárez	Sofya SAS	3127726961	
José Peña Peña	Contratista Sec. Medio Ambiente	3147677777	
Isidro Gil Moreno	Contratista Sec. Medio Ambiente	3134776776	
Esteban Gualteros	Contratista Sec. Medio Ambiente	3224[illegible]	
Erika Daniela Sierra Vargas	Contratista Sec. Medio Ambiente	3214893360	

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

23 DE MARZO DE 2023 VISITA CON CONTRATISTAS DE LA EMPRESA SOFYA S.A.S A PREDIOS UBICADOS EN LA VDA LA HOYA PARA RECONOCIMIENTO DE ÁREAS A REFORESTAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO **ACTA 0236**

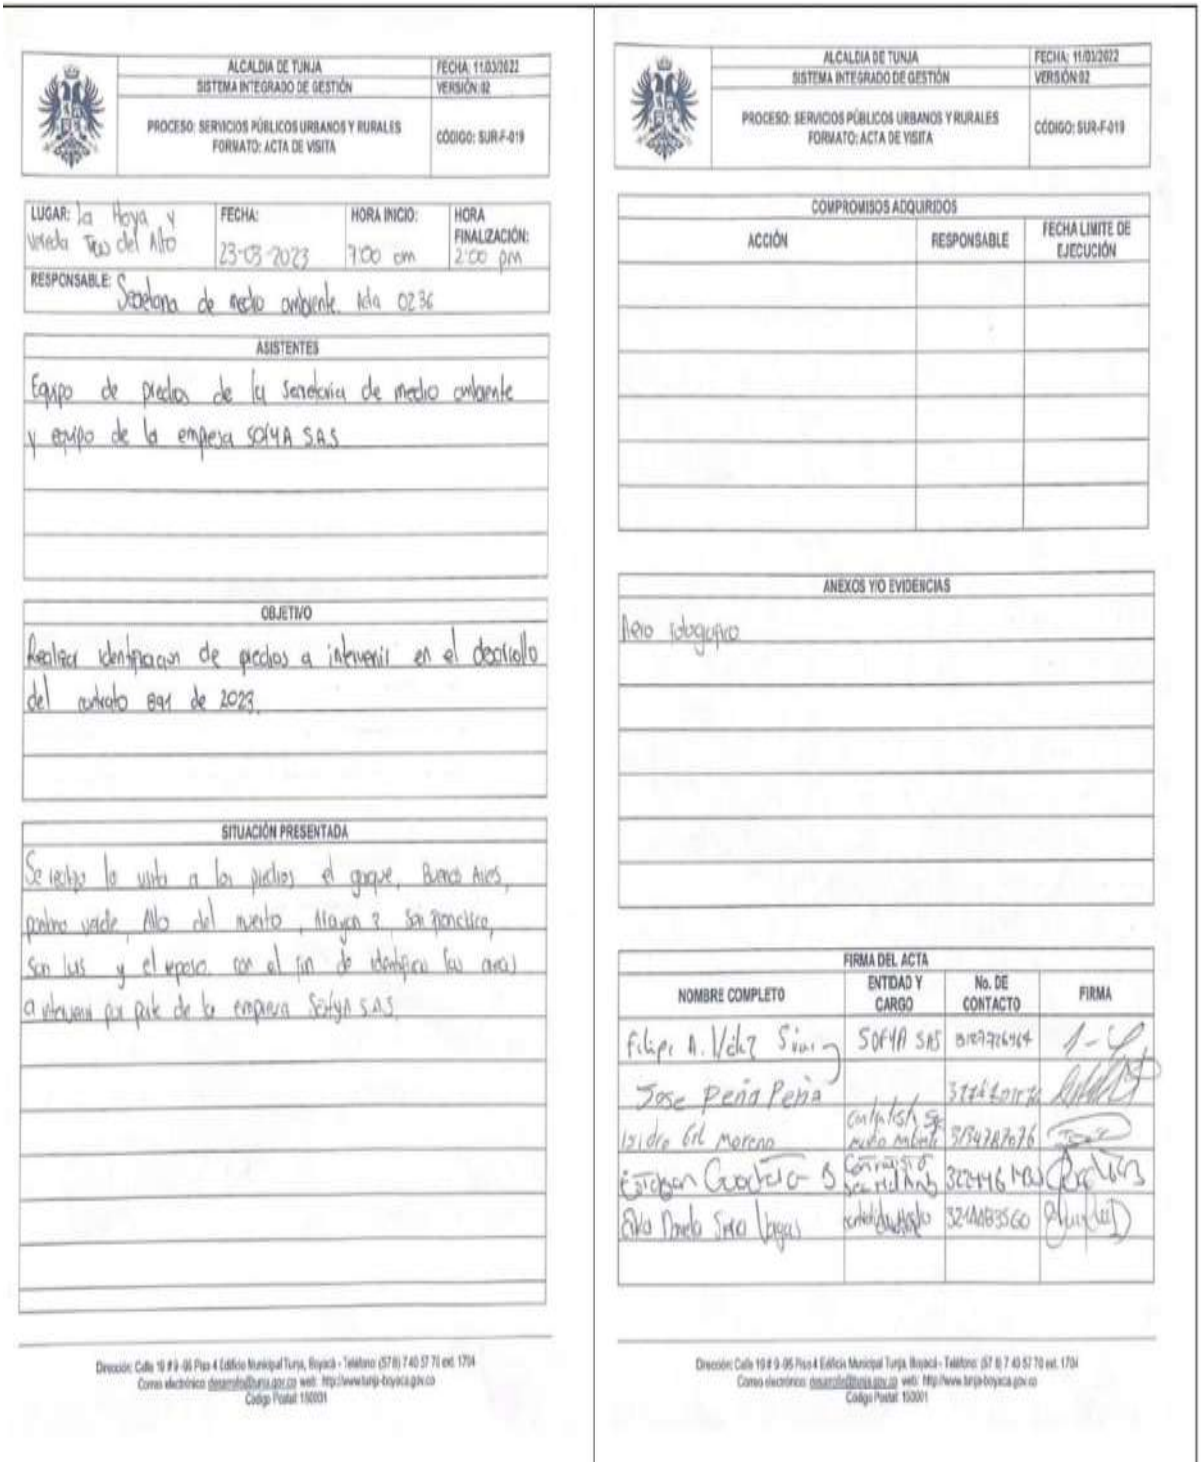

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
La Hoya y Vereda Tras del Alto	23-03-2023	7:00 am	2:00 pm

RESPONSABLE: Secretaria de medio ambiente. Acta 0236

ASISTENTES

Equipo de predios de la Secretaria de medio ambiente y equipo de la empresa SOFYA S.A.S

OBJETIVO

Realizar identificacion de predios a intervenir en el desarrollo del contrato 891 de 2023.

SITUACIÓN PRESENTADA

Se realiza la visita a los predios el grupo, Buena Aires, pradera verde, Alto del viento, Alagua 2, San francisco, San Luis y el espino con el fin de identificar las areas a intervenir por parte de la empresa Sofya S.A.S

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (578) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS


Reno fotografico

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD Y CARGO	No. DE CONTACTO	FIRMA
Felipe A. Vélez Sierra	SOFYA SAS	3167726464	
Jose Peña Peña		3774 [illegible]	
Isidro Gil moreno	contratista Sec medio ambiente	3154787676	
Esteban Cardona S	Contratista Sec medio Amb	3124446 [illegible]	
Erika Daniela Sierra Vargas	[illegible]	3214883560	

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

13 DE ABRIL DE 2023 RECONOCIMIENTO DE AREAS Y LINDEROS PARA LA INTERVENCION MEDIANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 891 DE 2023 **ACTA 0304**

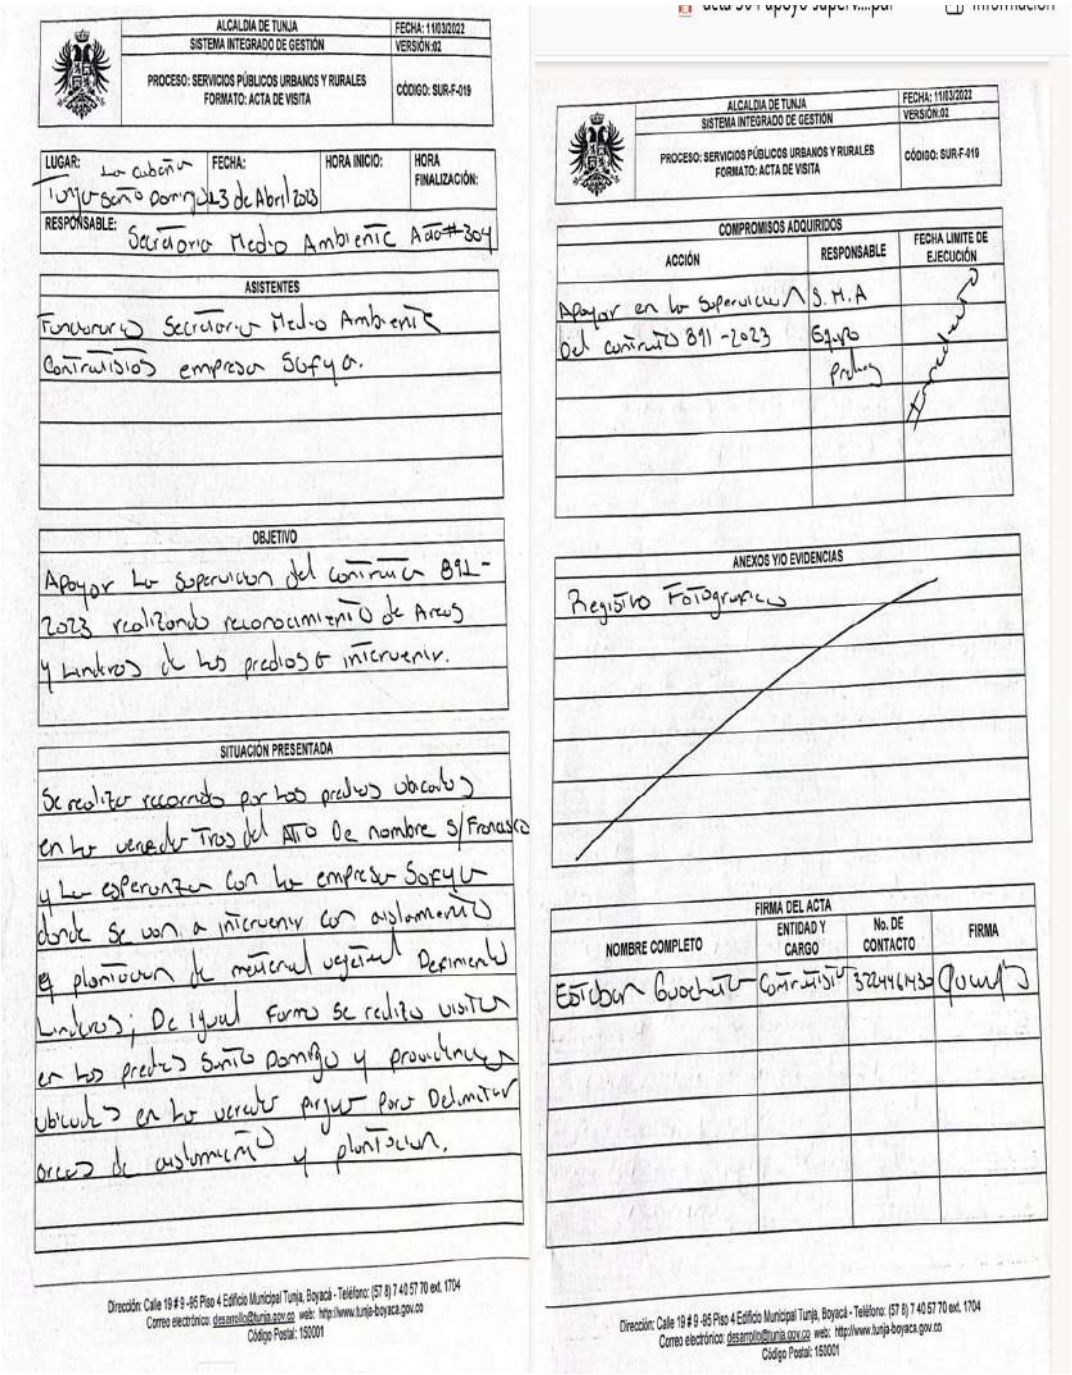

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR: La cubiña | FECHA: | HORA INICIO: | HORA FINALIZACIÓN:
Tunjuelito Domingo 23 de Abril 2023
RESPONSABLE: Secretaria Medio Ambiente Acta #304

ASISTENTES
Funcionario Secretaria Medio Ambiente
Contratistas empresa Sofya.

OBJETIVO
Apoyar la supervision del contrato 891-2023 realizando reconocimiento de Areas y Linderos de los predios a intervenir.

SITUACIÓN PRESENTADA
Se realiza recorrido por los predios ubicados en la vereda Tras del Alto de nombre S/Francisco y la esperanza con la empresa Sofya donde se van a intervenir con aislamiento y plantacion de material vegetal Deslindando Linderos; De igual forma se realiza visita en los predios Santo Domingo y provincia ubicados en la vereda arguz para Delimitar areas de aislamiento y plantacion.

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Apoyar en la Supervicion del contrato 891 -2023	S. M. A Equipo Profesional	


ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
Registro Fotografico

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD Y CARGO	No. DE CONTACTO	FIRMA
Esteban Guachetá	Contratista	3224464432	

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

18 DE ABRIL DE 2023 VISITA CON CONTRATISTAS DE LA EMPRESA SOFYA S.A.S A PREDIOS BUENOS AIRES Y PANTANO VERDE EN LA VEREDA LA HOYA PARA REFORESTAR Y REALIZAR AISLAMIENTO. **ACTA 0335**

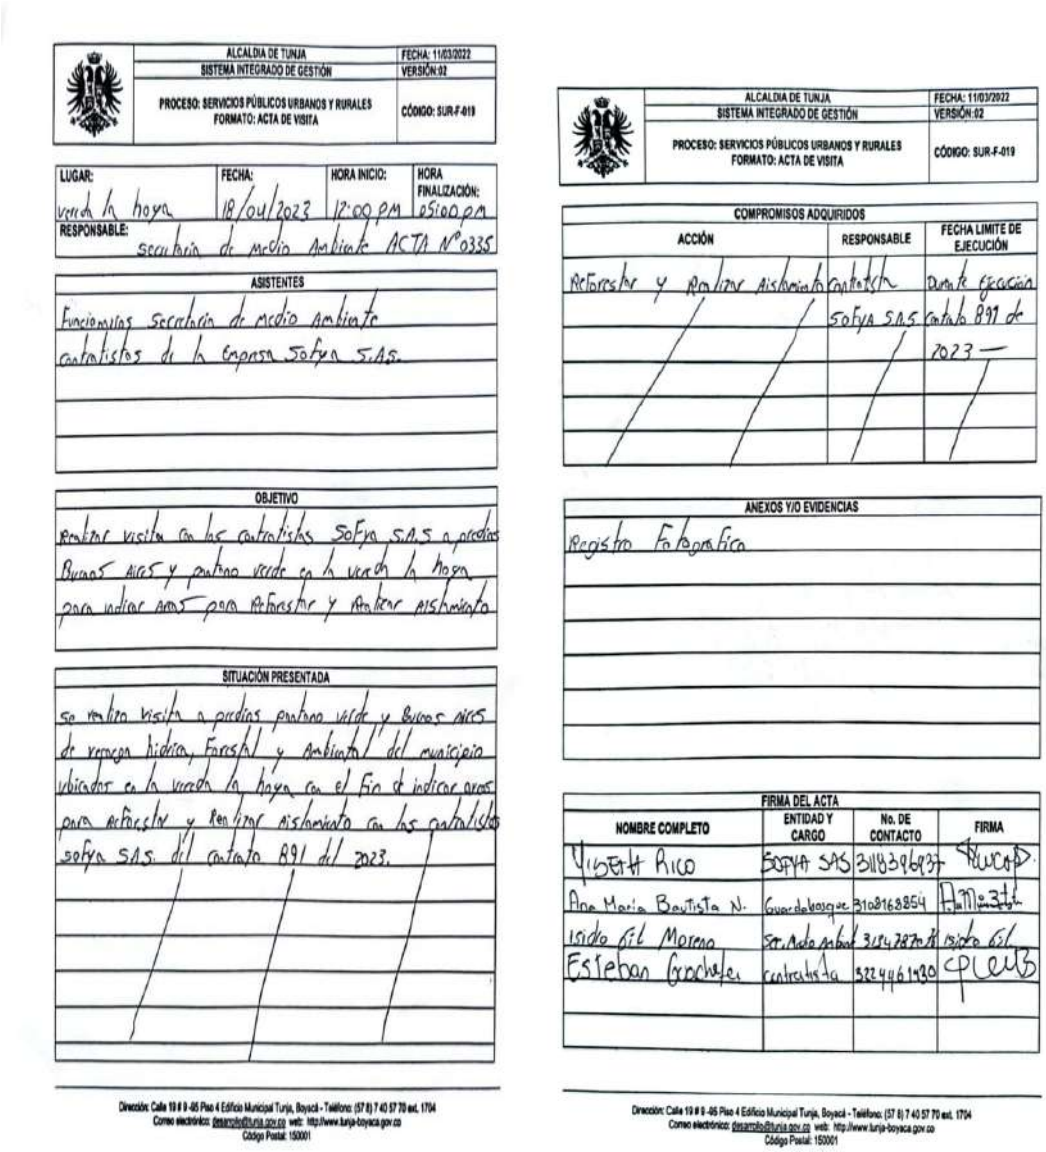

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
vereda la hoya	18/04/2023	12:00 pm	05:00 pm

RESPONSABLE: secretaria de medio Ambiente ACTA N°0335

ASISTENTES
Funcionarios secretaria de medio Ambiente
contratistas de la empresa Sofya S.A.S.

OBJETIVO
Realizar visita con los contratistas SOFYA S.A.S a predios Buenos aires y pantano verde en la vereda la hoya para indicar areas para Reforestar y Realizar aislamiento

SITUACIÓN PRESENTADA
se realiza visita a predios pantano verde y Buenos aires de reserva hidrica, Forestal y Ambiental del municipio ubicados en la vereda la hoya con el fin de indicar areas para Reforestar y Realizar aislamiento con los contratistas sofya S.A.S. del contrato 891 del 2023.

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Reforestar y Realizar Aislamiento	contratista Sofya S.A.S	Durante ejecución contrato 891 de 2023


ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
Registro Fotografico

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD Y CARGO	No. DE CONTACTO	FIRMA
Yuseth Rico	SOFYA SAS	3118396937	
Ana María Bautista N.	Guardabosque	3108168854	
isidro Gil Moreno	Sec. Medio Ambiente	3154787	
Esteban Grachet	contratista	3224461930	

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

25 DE ABRIL DE 2023 APOYO EN LA SUPERVISION DEL CONTRATO 891 DE 2023 REVISION DE MATERIAL VEGETAL A ESTABLECER EN PREDIO PANTANO VERDE Y BUENOS AIRES **ACTA 0376**

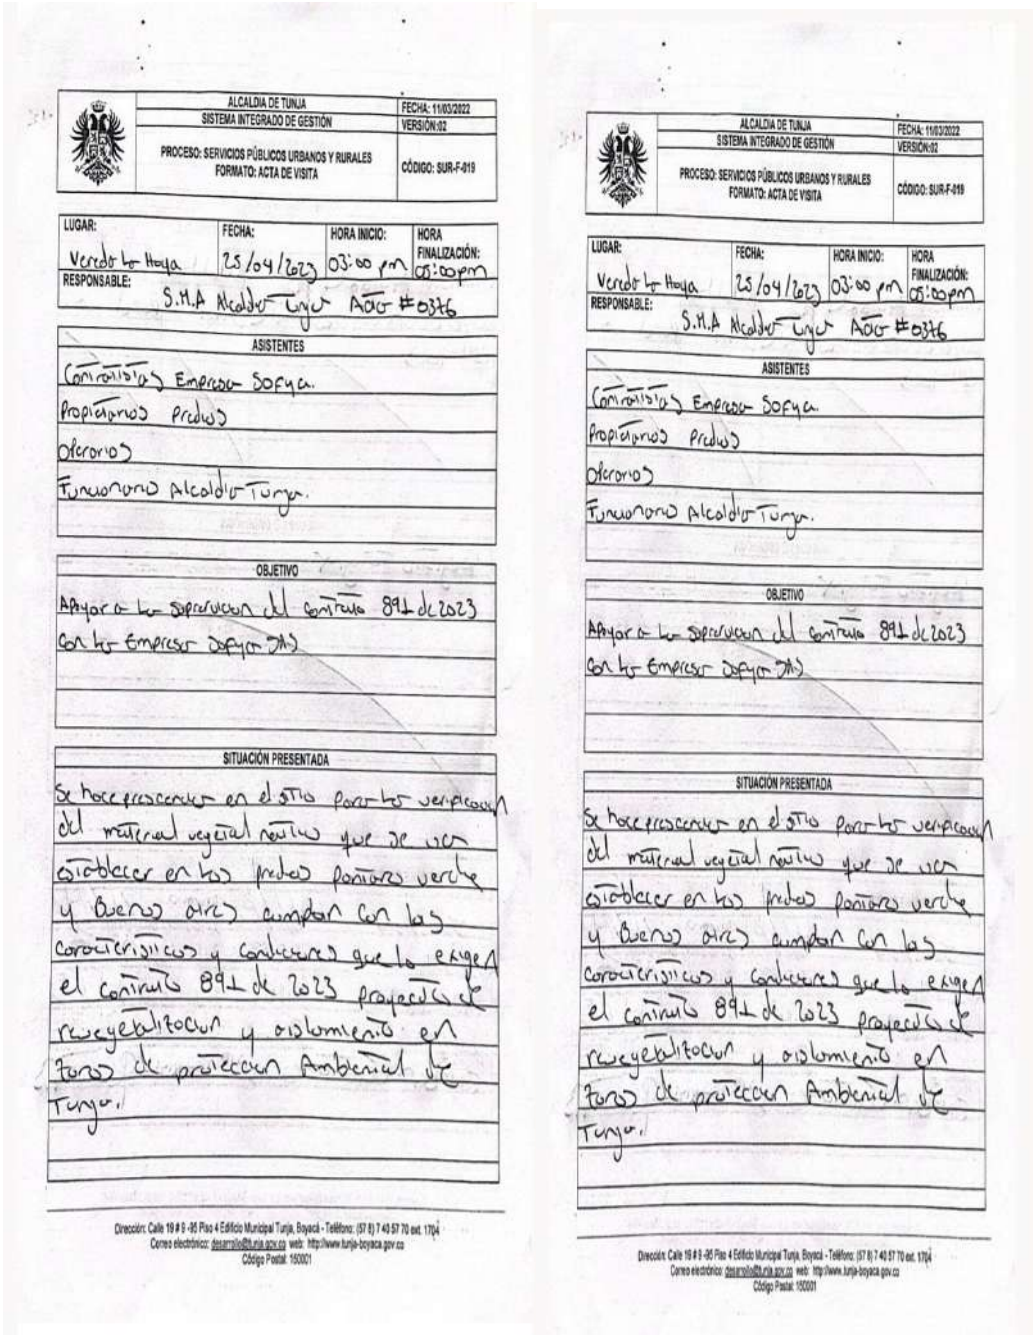

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
Verde la Hoya	25/04/2023	03:00 pm	05:00pm

RESPONSABLE: S.M.A Alcaldía Tunja Acta #0376

ASISTENTES
Contratistas Empresa Sofyca.
Propietarios predios
Operarios
Funcionarios Alcaldía Tunja.

OBJETIVO
Apoyo a la supervision del contrato 891 de 2023 con la Empresa Sofyca SAS

SITUACIÓN PRESENTADA
Se hace presencia en el sitio para la verificación del material vegetal nativo que se va a establecer en los predios pantano verde y Buenos aires cumplan con las caracteristicas y calidades que lo exige el contrato 891 de 2023 proyecto de revegetalizacion y aislamiento en zonas de proteccion Ambiental de Tunja.

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR: Verde la Hoya | FECHA: 25/04/2023 | HORA INICIO: 03:00 pm | HORA FINALIZACIÓN: 05:00pm
RESPONSABLE: S.M.A Alcaldía Tunja Acta #0376


ASISTENTES
Contratistas Empresa Sofyca.
Propietarios predios
Operarios
Funcionarios Alcaldía Tunja.

OBJETIVO
Apoyo a la supervision del contrato 891 de 2023 con la Empresa Sofyca SAS

SITUACIÓN PRESENTADA
Se hace presencia en el sitio para la verificación del material vegetal nativo que se va a establecer en los predios pantano verde y Buenos aires cumplan con las caracteristicas y calidades que lo exige el contrato 891 de 2023 proyecto de revegetalizacion y aislamiento en zonas de proteccion Ambiental de Tunja.

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

26 DE ABRIL DE 2023 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO 891 DE 2023 REVISION DE METODOLOGIA DE SIEMBRA A ESTABLECER EN PREDIO PANTANO VERDE Y BUENOS AIRES **ACTA 0390**

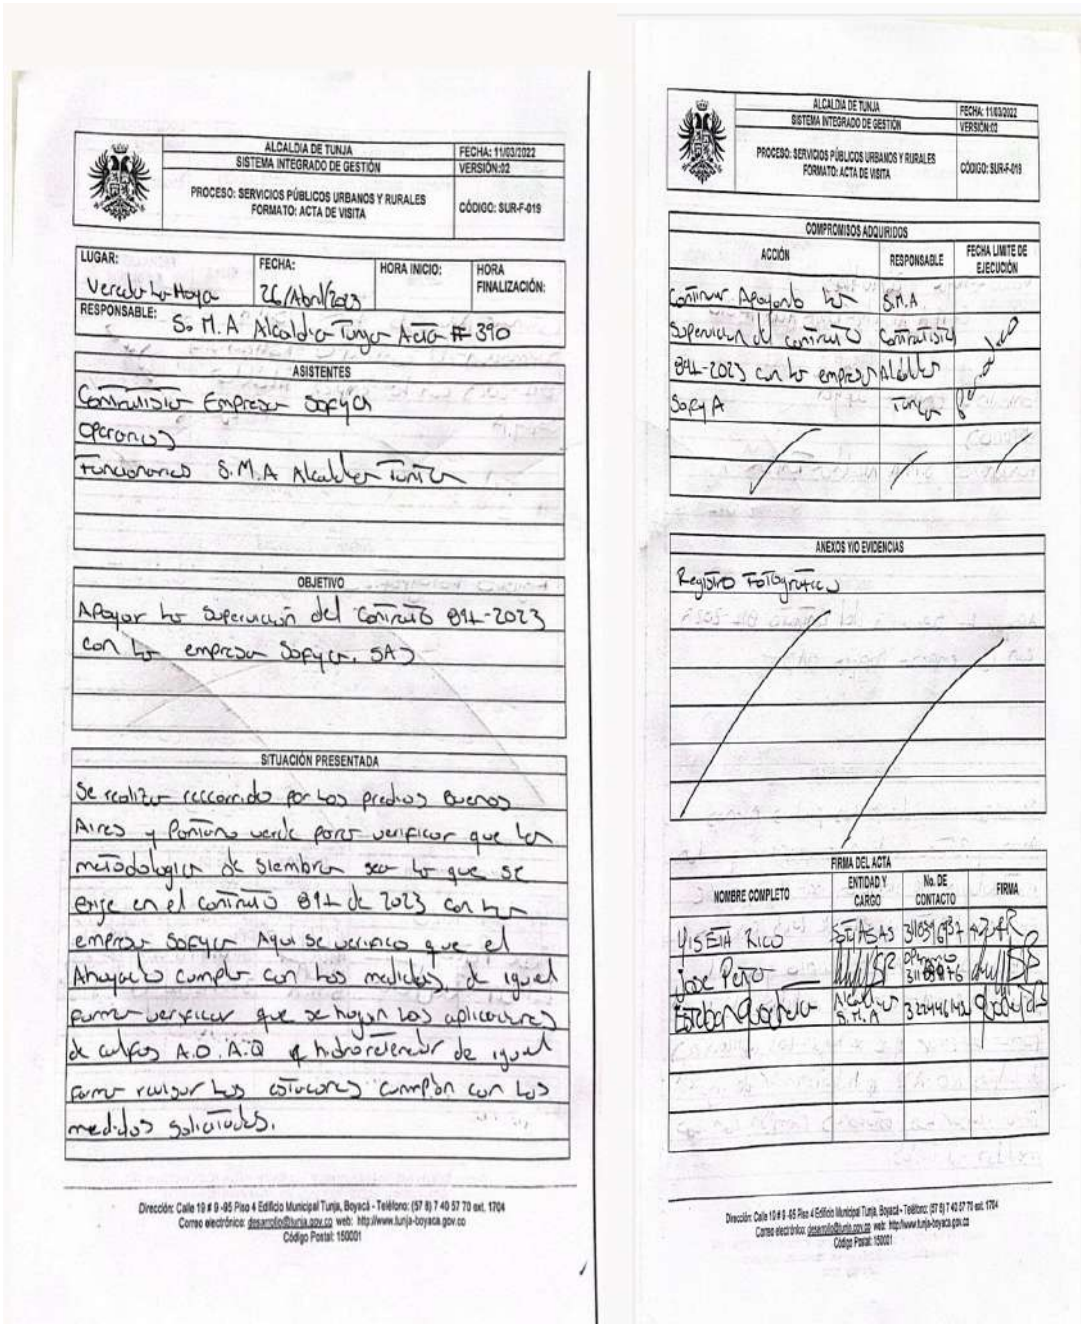

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
Verde La Hoya	26/Abril/2023		

RESPONSABLE: S. M. A Alcaldía Tunja Acta # 390

ASISTENTES
Contratista Empresa Sofya
Operarios
Funcionarios S.M.A Alcaldía Tunja

OBJETIVO
Apoyar la Supervisión del Contrato 891-2023 con la empresa Sofya. SAS

SITUACIÓN PRESENTADA
Se realiza recorrido por los predios Buenos Aires y Pantano verde para verificar que la metodología de siembra sea la que se exige en el contrato 891 de 2023 con la empresa Sofya. Aquí se verifica que el Ahoyado cumple con las medidas, de igual forma verificar que se hayan las aplicaciones de cultivos A.O.A.I.O y hidroretenedor de igual forma revisar los estudios cumplan con los medios solicitados.

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN:02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA | CÓDIGO: SUR-F-019

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Continuar Apoyando la Supervisión del contrato 891-2023 con la empresa Sofya	S.M.A Contratista Alcaldía Tunja	


ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
Registro Fotográfico

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD Y CARGO	No. DE CONTACTO	FIRMA
YISELA RICO	SOFYAS	3116598784	
Jose Pero	Operario	3108976	
Esteban Acosta	Alcaldía S.M.A	3244642	

Dirección: Calle 19 # 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

8 DE MAYO DE 2023 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO 891 DE 2023 VERIFICACION DE AISLAMIENTO Y SIEMBRA DE MATERIAL NATIVO EN PREDIO PANTANO VERDE Y BUENOS AIRES **ACTA 0444**

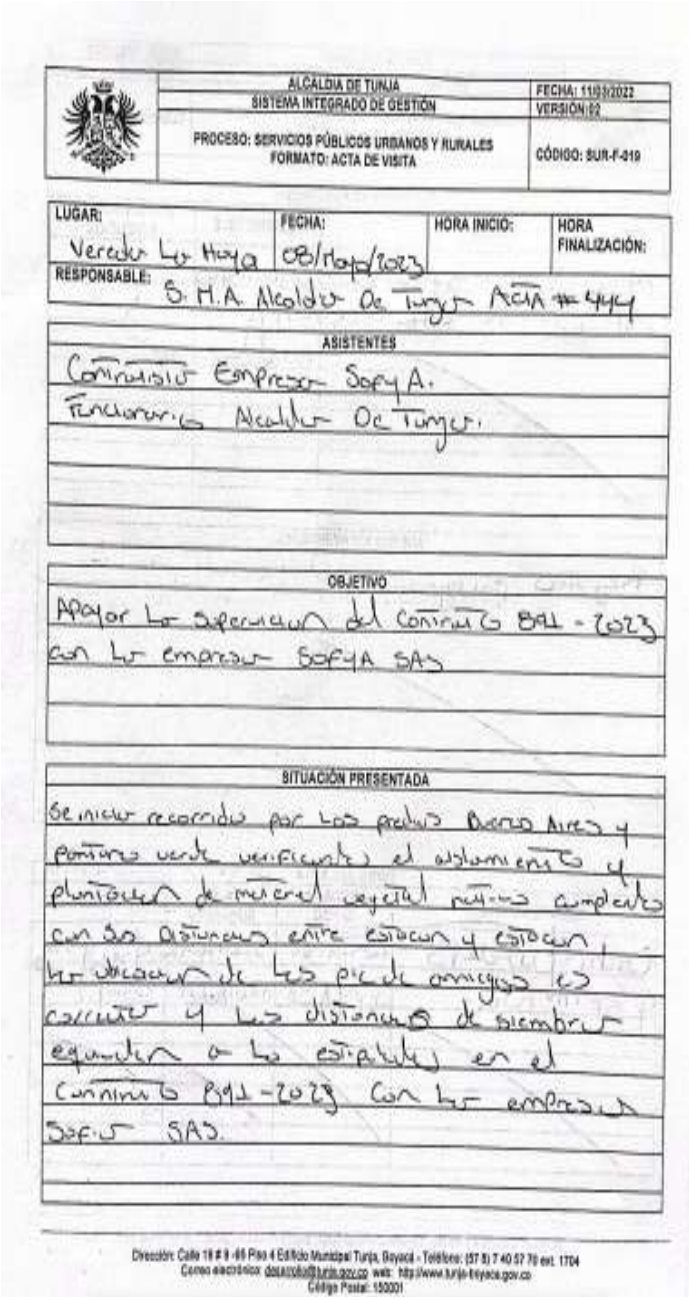

ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FECHA: 11/03/2022
VERSIÓN: 02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA
CÓDIGO: SUR-F-019

LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
Vereda La Hoya	08/May/2023		


RESPONSABLE: S.M.A. Alcaldía de Tunja ACTA # 444

ASISTENTES
Contratista Empresa SOFyA.
Funcionarios Alcaldía De Tunja.

OBJETIVO
Apoyar la Supervisión del Contrato 891 - 2023 con la empresa SOFyA SAS

SITUACIÓN PRESENTADA
Se inicia recorrido por los predios Buenos Aires y Pantano verde verificando el aislamiento y plantación de material vegetal nativo cumpliendo con las distancias entre estación y estación, la ubicación de los pie de amigos en el cercado y las distancias de siembra ajustadas a lo establecido en el Contrato 891-2023 con la empresa SOFyA SAS.

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: [illegible] web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

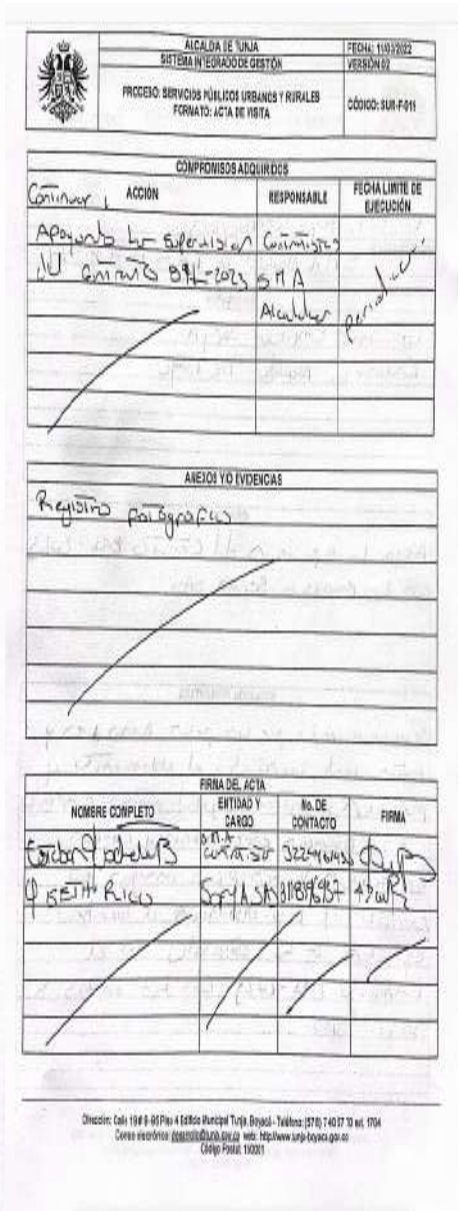

ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FECHA: 11/03/2022
VERSIÓN: 02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES
FORMATO: ACTA DE VISITA
CÓDIGO: SUR-F-019

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Continua	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
	Apoyando la Supervisión del Contrato 891-2023	Contratista SMA Alcaldía	permanente


ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
Registro fotográfico

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD Y CARGO	No. DE CONTACTO	FIRMA
[illegible]	S.M.A. CONTRATISTA	3225461432	
[illegible]	SOFyA SAS	3138796937	

Dirección: Calle 19# 9-95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: [illegible] web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

7 DE JUNIO DE 2023 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO 891 DE 2023 VERIFICACION DE AISLAMIENTO Y SIEMBRA DE MATERIAL NATIVO EN PREDIOS PROVIDENCIA Y SANTO DOMINGO, VERIFICACION DE AVANCE VIVERO **ACTA 0600**

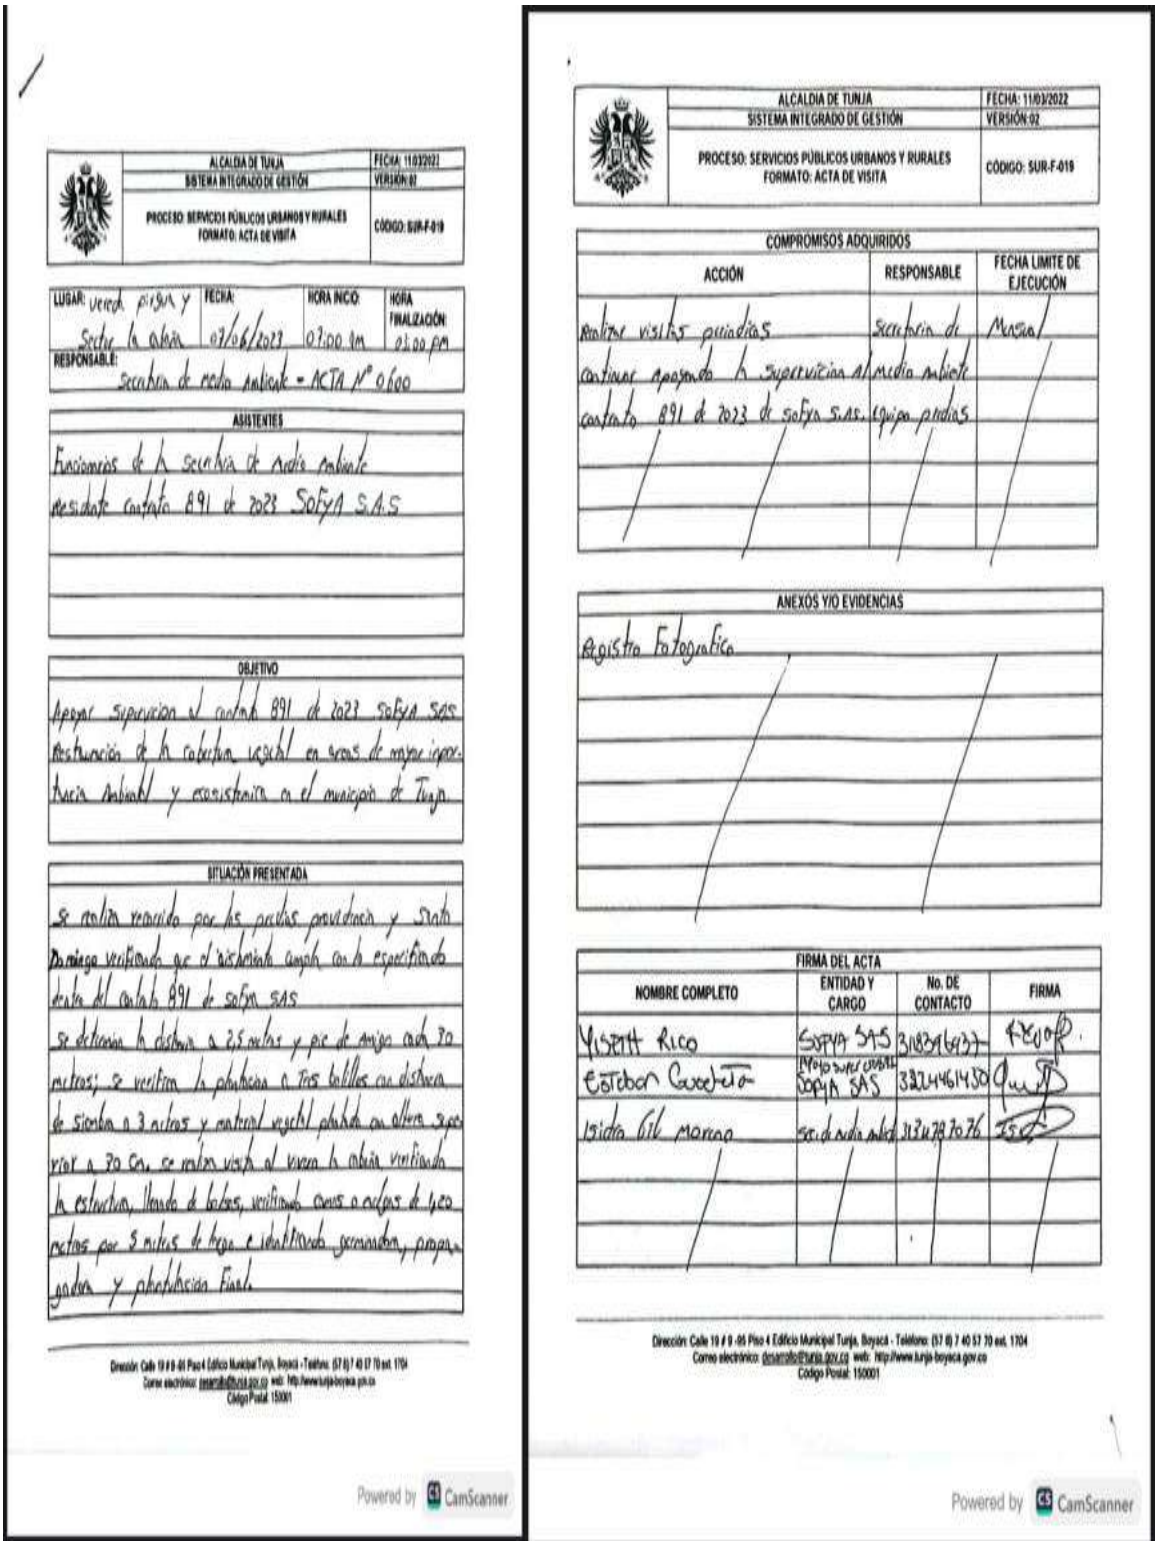

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | CÓDIGO: SUR-F-019
FORMATO: ACTA DE VISITA

LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINALIZACIÓN:
vereda pirgua y Sector la Calera	07/06/2023	07:00 am	01:00 pm

RESPONSABLE: Secretaria de medio ambiente - ACTA N° 0600

ASISTENTES
Funcionarios de la secretaria de medio ambiente
residente contrato 891 de 2023 SOFYA S.A.S

OBJETIVO
Apoyar supervision al contrato 891 de 2023 sofya sas Restauracion de la cobertura vegetal en areas de especial importancia ambiental y ecosistemica en el municipio de Tunja

SITUACIÓN PRESENTADA
Se realiza recorrido por los predios providencia y Santo Domingo verificando que el aislamiento cumpla con lo especificado dentro del contrato 891 de sofya SAS
se determina la distancia a 2,5 metros y pie de amigo cada 30 metros; se verifica la plantacion en los tolillos en distancia de siembra a 3 metros y material vegetal plantado en altura superior a 30 Cm. se realiza visita al vivero la calera verificando la estructura, llenado de bolsas, verificando cuna o cajas de los retoños por 5 niveles de tapa e identificado germinador, pregerminador y plantulacion Final

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE TUNJA | FECHA: 11/03/2022
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN: 02
PROCESO: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES | CÓDIGO: SUR-F-019
FORMATO: ACTA DE VISITA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Realizar visitas periodicas	Secretaria de	Mensual
continuar apoyando la supervicion al	medio ambiente	
contrato 891 de 2023 de sofya S.A.S. equipo predios		

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
Registro Fotografico


FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD Y CARGO	No. DE CONTACTO	FIRMA
Yisbeth Rico	SOFYA SAS	3183916937	
Esteban Cancelado	Profesional apoyo SOFYA SAS	3224461430	
Isidro Gil Monroy	Sec. de medio ambiente	3134787076	

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 4 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 1704
Correo electrónico: desarrollo@tunja.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código Postal: 150001

Powered by CamScanner

20 DE JUNIO DE 2023 VERIFICACIÓN AVANCE CONTRATO 891/23 EMPRESA SOFYA SAS **ACTA 662**

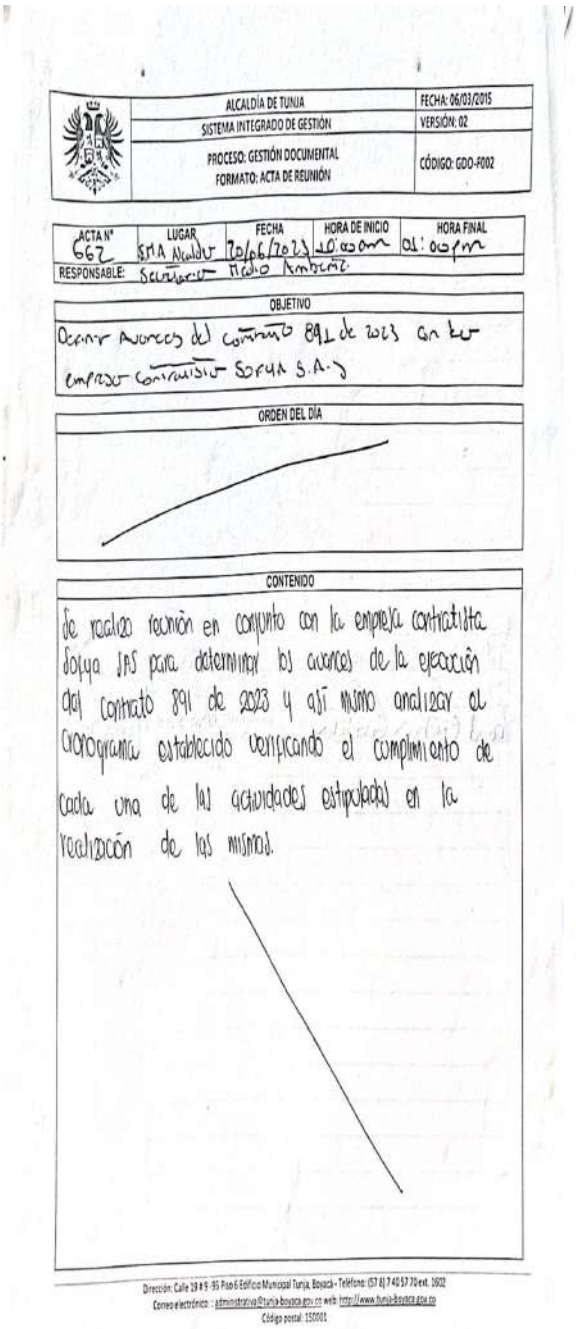

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
662	SMA Alcaldía	20/06/2023	10:00am	01:00pm

RESPONSABLE: Secretaría Medio Ambiente

OBJETIVO

Definir Avances del contrato 891 de 2023 con la empresa contratista SOFYA S.A.S


ORDEN DEL DÍA

CONTENIDO

Se realizo reunión en conjunto con la empresa contratista Sofya SAS para determinar los avances de la ejecución del contrato 891 de 2023 y así mismo analizar el cronograma establecido verificando el cumplimiento de cada una de las actividades estipuladas en la realización de las mismas.

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 6 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 3602
Correo electrónico : administrativa@tunja-boyaca.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código postal: 150001

Escaneado con CamScanner

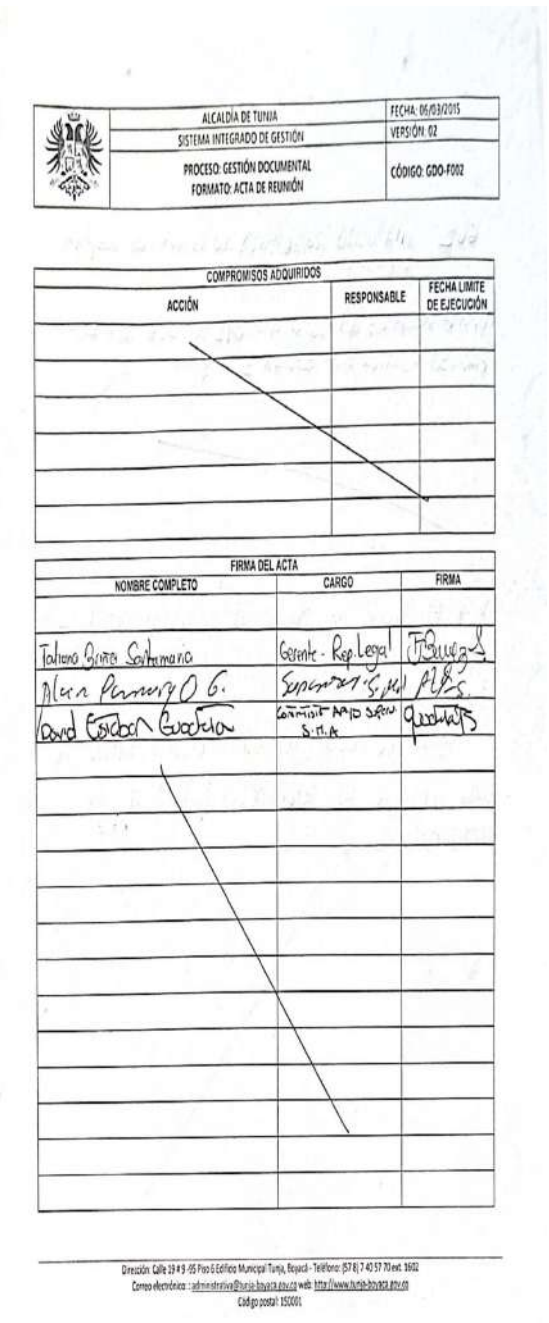

ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN

FIRMA DEL ACTA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Tatiana Bibiana Santamaría	Gerente - Rep. Legal	
Alexa Perry O G.	Supervisora S.M.A	
David Esteban Guatibonza	Contratista apoyo Sofya S.M.A	

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Piso 6 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Teléfono: (57 8) 7 40 57 70 ext. 3602
Correo electrónico : administrativa@tunja-boyaca.gov.co web: http://www.tunja-boyaca.gov.co
Código postal: 150001

Escaneado con CamScanner
