INFORME SEMANAL DE OBRA N° 11

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 11 de marzo de 2023

- Se continuó con la perforación del pozo para instalación del piezómetro
- Se continuó demolición de placa piso en área de parqueadero
- Se continuó con instalación de muros en superboard para campamento
- Se continuó acopio de escombros

Domingo 12 de marzo de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Lunes 13 de marzo de 2023

- Se continuó con la perforación del pozo para instalación del piezómetro
- Se continuó demolición de placa contra piso en área de parqueadero
- Se continuó con instalación de muros en superboard para campamento
- Se continuó acopio y desalojo de escombros
- Se envía informe semanal interno
- Se envió por correo electrónico la Entrega de Procedimiento constructivo de sistema estructura

Martes 14 de marzo de 2023

- Se envió por correo electrónico la Entrega de documentación requerida del personal que ingresò por el subcontratista designado para la construcción del pozo de observación
- Se continuó con instalación de muros en superboard para campamento
- Se continuó con la perforación del pozo para instalación del piezómetro
- Se continuó demolición de placa contra piso en área de parqueadero
- Se continuó acopio y desalojo de escombros

Miércoles 15 de marzo de 2023

- Se continuó con la perforación del pozo para instalación del piezómetro donde evidencia floración de aguas subterráneas
- Se continuó demolición de placa contra piso en área de parqueadero
- Se continuó con instalación de muros en superboard para campamento
- Se continuó acopio y desalojo de escombros
- Se reciben observaciones dejados en bitácora de obra, por parte de interventoría del tema hidrosanitario de realizar ajustes y nueva versión de los planos constructivos

Jueves 16 de marzo de 2023

- Se continuó con la perforación del pozo para instalación del piezómetro
- Se continuó demolición de cimientos en placa contra piso en área de parqueadero
- Se continuó con instalación de Instalaciones sanitarias y eléctricas para campamento
- Se continuó acopio y desalojo de escombros
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 9 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- Mediciones Equipo de topografía para ejes estructurales
- Se realizó reunión entre interventoría y consorcio sobre el proceso constructivo de los Caisson, excavaciones y ejecución de sótano y que debe ir validado por el especialista estructural Diego Pardo

Viernes 17 de marzo de 2023

- Se continuó con la perforación del pozo para instalación del piezómetro
- Se continuó con instalación de muros en superboard para campamento
- Se continuó con instalación de Instalaciones sanitarias y eléctricas para campamento
- Mediciones Equipo de topografía para ejes estructurales

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Sandra Luque
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Yeritza Bolaños.

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

SUBCONTRATISTAS

Oficial de obra – Robert Gutiérrez
Oficial de obra – Erasmo Gutiérrez
Ayudante de obra - Esneider Gutiérrez
Ayudante de obra - Rodolfo Diaz
Ayudante de obra – Yordan Ariza

Ayudante Pozo – Augusto Cano
Ayudante Pozo – Carlos Miranda
Ayudante Pozo – Jaime Toscano
SST Pozo – Susana Escobar

Equipo de topografía – Asner Rocha
Equipo de topografía – José Alfredo Ochoa

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	9.0%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

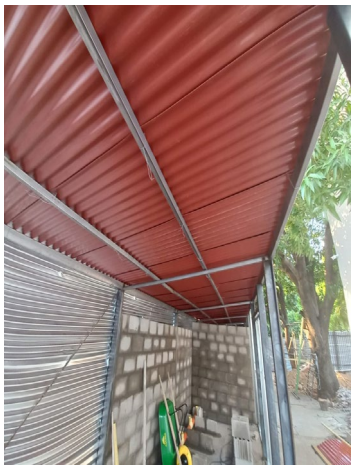
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO											x	x	x	x	x	x	x														
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al desalojo del material de escombros en el área de parqueadero superior se evidencia que bajo de la misma existe otra estructura de placa contra piso con amarres de cimentación con adoquines en concreto que se deben retirar, ya se notificó a interventoría

REGISTRO FOTOGRÀFICO


Instalacion de muros en superboard en campamento, cubierta e instalaciones sanitarias




Excavación para piezómetro



Equipo topográfico levantamiento y trazado de ejes estructurales





Demolición de placa contra piso y retiro de escombros
