UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JETIC – DITAE**

FECHA INFORME: **Día:** 10 **Mes:** JULIO **Año:** 2023

CONTRATO N°. 003-00-A-COFAC-CEGOT-2023

CONTRATISTA: NICSERVICIO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 547.000.000,00 COP

FORMA DE PAGO:

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL										USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	VIG			
02	02	02	008	007	01	5		10	2023	-------	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC	$ 547.000.000,00
											Certificado de disponibilidad No.52023 de fecha 09-02-2023	$ 547.000.000,00

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PRIMER PAGO PARCIAL:
Lo facturado sobre los servicios efectivamente recibidos desde el perfeccionamiento del contrato y hasta el 30 de abril de 2023, se cancelarán con cargo al PAC del mes de junio del 2023 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos parcial del servicio, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado de pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

SEGUNDO PAGO PARCIAL:
Los servicios efectivamente prestados y recibidos desde el 01 de mayo de 2023 hasta el 31 de julio de 2023 se cancelarán con cargo al PAC del mes de septiembre del 2023 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos a satisfacción de los servicios prestados suscrita por las partes, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado del pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

PAGO FINAL:
El saldo del contrato por los servicios efectivamente recibidos, se cancelará con el PAC de diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar, para ser cancelado en el primer trimestre del 2024, previa suscripción del acta de recibo final y a satisfacción del contrato y cumplimiento de los demás documentos y trámites administrativo como: Entrega de la factura(s) y aprobación en el sistema Olimpia, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los

aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.
La Entidad Estatal contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente.

Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

Nota 3: No se realizará ningún tipo de pago o entrega de anticipo, sin presentación de la factura respectiva.

PARÁGRAFO PRIMERO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

PARÁGRAFO TERCERO: El Dirección Financiera FAC verificará, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que éste se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las contribuciones parafiscales y de seguridad social.

FECHA FIRMA: Día 11. Mes abril. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGIAS OPERACIONALES Y AERONAUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO"

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de abril de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 44.61 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 52.71 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DAVID ENRIQUE DE ALBA JIMENEZ	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
JORGE TRUJILLO GUTIERREZ	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
JUAN PABLO ALIRIO CASTELLANOS MONTAÑEZ	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
MAURICIO ULLOA RODRIGUEZ	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
MIGUEL ANTONIO SEHUANES TORRES	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
JOSE DE JESUS VISBAL CORONADO	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
WILLIAM CARDENAS TURIZO	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
PEDRO NEL TORRES RAMIREZ	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
WILLIAM FERNANDO BONILLA NAVIA	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
GERMAN HERNANDO VEGA CELY	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
IVAN PASTOR CARDENAS RODRIGUEZ	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.
RODOLFO GARCES ALCALA	Técnico mantenimiento	Técnico electricista, electrónico, mecánico, electromecánico o afines.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- ✓ RADAR PALANQUERO. Se realiza mantenimiento correctivo al GENERADOR 2 CUMMINS C60 consistente en el cambio de una (01) batería 12V 1200AMP





- ✓ RADAR PALANQUERO. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C60 consistente en programación al controlador para mejorar el funcionamiento ya que tenía una programación que hacía que funcionara muy lento el equipo.



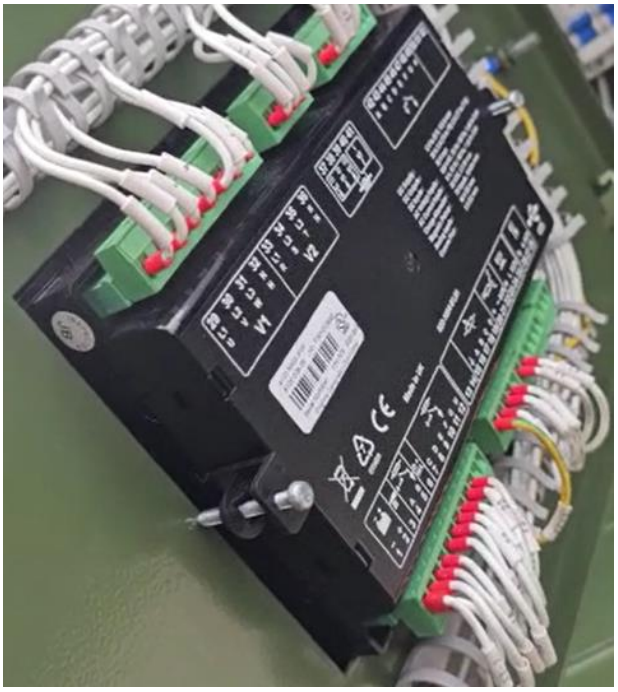

- ✓ RADAR PALANQUERO. Mantenimiento correctivo GENERADOR 3 CUMMINS ROMO CABINADO, consistente en cambio de arnés del sistema de arranque afectadas por el corto e instalación de fusilera de protección al equipo.

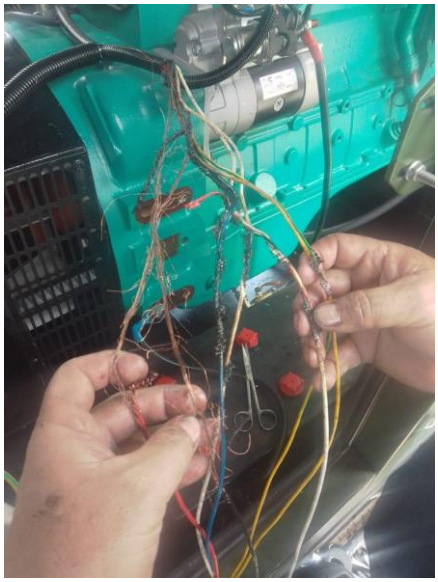

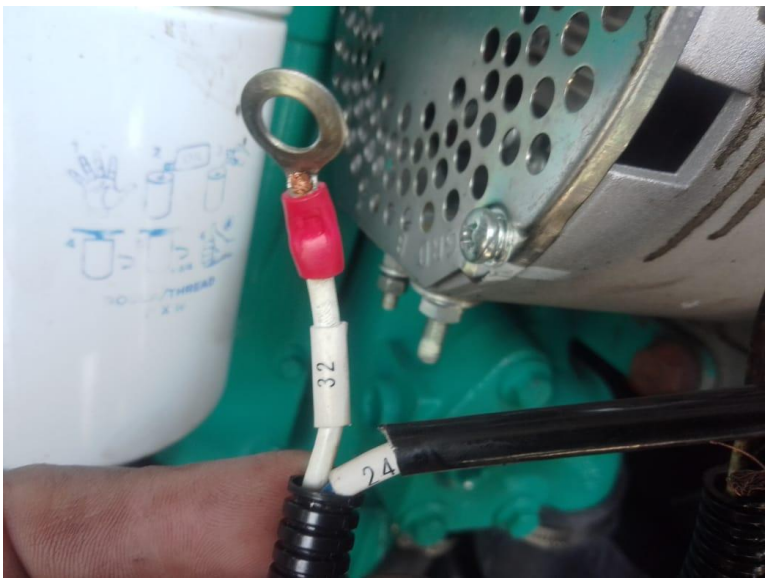

- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS WENZLAW consistente en la calibración de válvulas.





- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS WENZLAW consistente en el cambio un (01) Indicador De Restricción De Combustible.



- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento preventivo de dos mil (2000) horas GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.





- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW, consistente en la remoción e instalación de una (01) bomba eléctrica de transferencia de combustible, pendiente conexión por racores diferentes a las mangueras del GENERADOR 2.





- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW consistente en la remoción y remplazo del retenedor delantero y trasero corrigiendo la fuga de aceite del motor. la falla.





- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW consistente en la remoción y remplazo del silenciador del sistema de escape de gases.





- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW consistente en el cambio un (01) Indicador De Restricción De Combustible.



- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 3 CUMMINS WENZLAW consistente en la remoción y remplazo del retenedor trasero únicamente corrigiendo la fuga de aceite del motor, este trabajo se realiza como parte de garantía de trabajo que estaba pendiente del año anterior.






- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo ECU 1 consistente en el cambio del cableado en las líneas 1002, 1003, 1004, 129, 121.



- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo ECU 1 consistente en el cambio de una (01) válvula SOLENOID DIGITAL SCROLL P/N 510-0346-00 barrido y aplicación de bomba de vacío para eliminar impurezas y humedad en el sistema, aplicación de soldadura de plata, gas butano y carga de gas refrigerante.

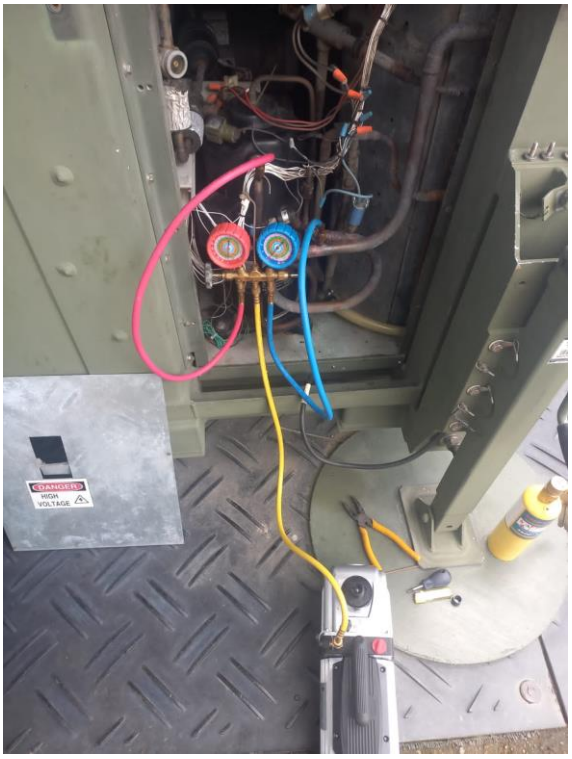



- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento preventivo ECU 1 que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.




- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento correctivo ECU 2 consistente en el cambio del cableado en las líneas 142, 143, 1002, 1003, 1004, 129, 121 y cambio de cableado del motor ventilador.



- ✓ RADAR LA FLOR. Se realiza mantenimiento preventivo ECU 2 que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.



- ✓ RADAR RIOHACHA. Se realiza mantenimiento preventivo ECU Aire Acondicionado LG Capacidad 50.000 BTU, que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.





- ✓ RADAR RIOHACHA. Se realiza mantenimiento preventivo ECU CARRIER 1 Capacidad 50.000 BTU, que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.



- ✓ RADAR RIOHACHA. Mantenimiento correctivo a todo costo ECU CARRIER 1 Capacidad 50.000 BTU, consistente en cambio de compresor, capacitor de arranque y de marcha, filtro secador 3/8, vacío al equipo para eliminar humedad e impurezas, carga de gas refrigerante R410, Tratamiento a todo el equipo con pintura anticorrosiva y pendiente prueba de funcionamiento debido a que los equipos se encuentran en línea.





- ✓ RADAR RIOHACHA. Mantenimiento correctivo ECU CARRIER 1 Capacidad 50.000 BTU, consistente en desinstalación, cambio e instalación de motor ventilador de 1/4.



- ✓ RADAR RIOHACHA. Se realiza mantenimiento correctivo ECU CARRIER 2 Capacidad 50.000, consistente en control corrosión y pintura.



- ✓ RADAR RIOHACHA. Se realiza mantenimiento preventivo ECU CARRIER 2 Capacidad 50.000 BTU. que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.



- ✓ RADAR RIOHACHA. Se realiza mantenimiento correctivo KATO consistente en el cambio de un (01) CIRCUIT BREAKER Legrand DPX3 630. Breaker principal de salida 3 fases 350A 600V 60H



- ✓ RADAR TRES ESQUINAS. Se realiza mantenimiento correctivo, GENERADOR CATERPILLAR C4 consistente en el cambio de tres sets de correas.





- ✓ RADAR GAORI. Se realiza mantenimiento correctivo, GENERADOR CATERPILLAR C4 consistente en el cambio de tres sets de correas.





- ✓ RADAR BAHIA MALAGA. Se realiza mantenimiento correctivo, GENERADOR B CUMMINS ROMO, consistente en el cambio de una (01) tarjeta AVR, tarea que se realiza mediante envío de repuesto al sitio e instalación por parte del personal técnico FAC.





- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento preventivo de 5.000 horas al GENERADOR 1 CUMMINS WENZLAW, rutina de mantenimiento establecida en el anexo técnico y en el manual del fabricante.





- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS WENZLAW, consistente en la desinstalación, cambio e instalación bomba de agua.




- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS WENZLAW, consistente en el mantenimiento al filtro de la bomba eléctrica de transferencia de combustible.




- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS WENZLAW, consistente en el cambio de kit racor PARKER (bomba de purga, filtro separador de agua, restrictor de seguridad).





- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW, consistente en la desinstalación, cambio e instalación bomba de agua.





- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento preventivo de 5.000 horas al GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW, rutina de mantenimiento establecida en el anexo técnico y en el manual del fabricante.





- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAW, consistente en el cambio de dos toma corriente polarizado tipo industrial.







- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento preventivo ECU 1, que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.




- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento preventivo ECU 2, que consta de rutina de mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.

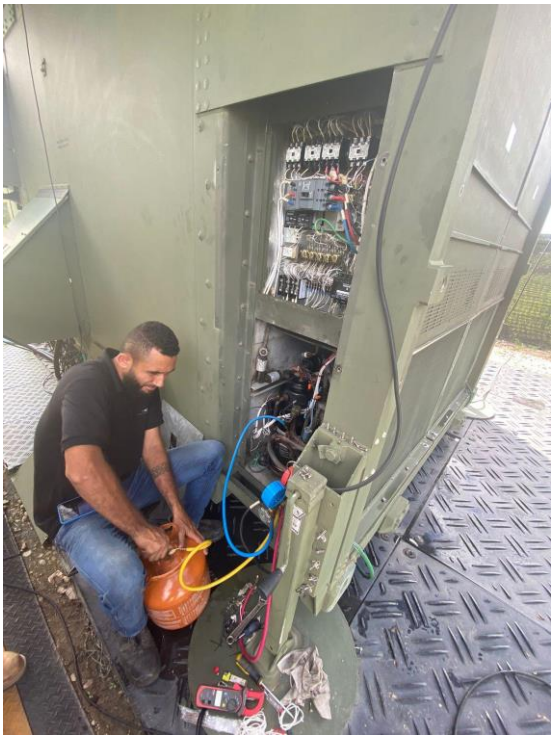


- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento correctivo ECU 2, consistente en corrección de fuga en la línea de baja presión del equipo, cambio de cableado del motor ventilador cambio de válvula de baja, vacío al sistema con bomba para eliminar la humedad e impurezas del sistema y recarga de gas refrigerante.

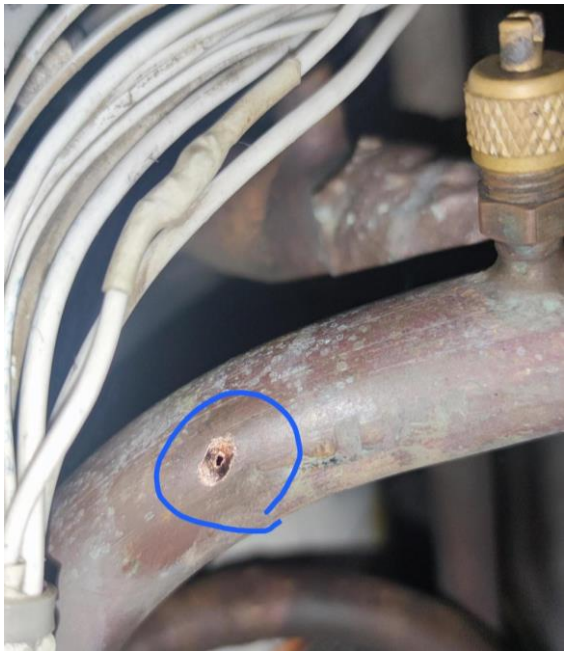



- ✓ RADAR ARAUCA. Se realiza mantenimiento correctivo ECU 2, consistente en cambio de un contactor trifásico con bobina 220V / 30A, un contactor trifásico con bobina 220V / 40A, presostato de baja y alta y recarga de gas refrigerante.






- ✓ RADAR SAN ANDRES. Se realiza visita de evaluación y diagnostico al GENERADOR 2 CUMMINS QSB, consistente en averiguar y solucionar falla de UNDER FREQUENCY, de acuerdo al diagnóstico reportado por el técnico se debe desmontar bomba de inyección y los inyectores. Falla de UNDER FREQUENCY se soluciona después de llegar los elementos que fueron enviados a laboratorio.







- ✓ RADAR SAN ANDRES. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS QSB consistente en la remoción de la bomba de inyección, con el fin de inspeccionar y reparar en un laboratorio en la ciudad de Bogotá, posterior se realiza la instalación en sitio.

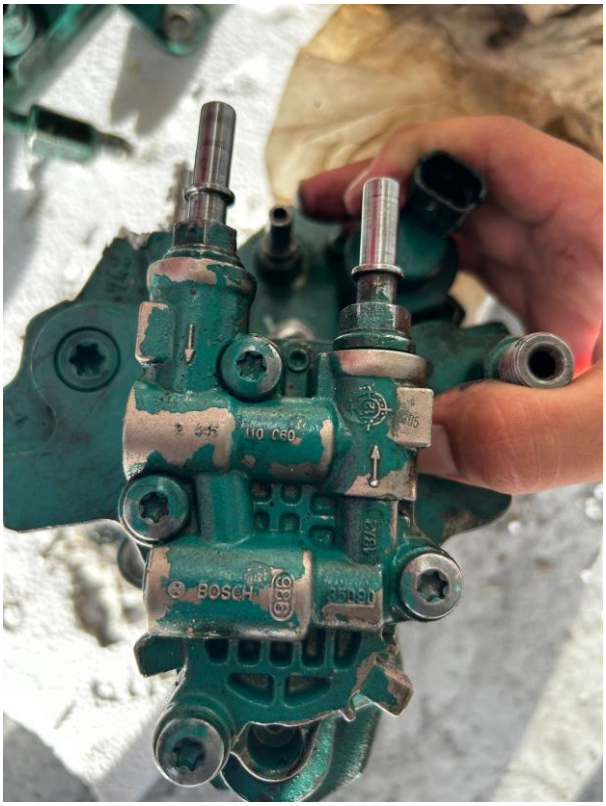




- ✓ RADAR SAN ANDRES. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS QSB consistente en la remoción e instalación de una (01) tarjeta AVR.

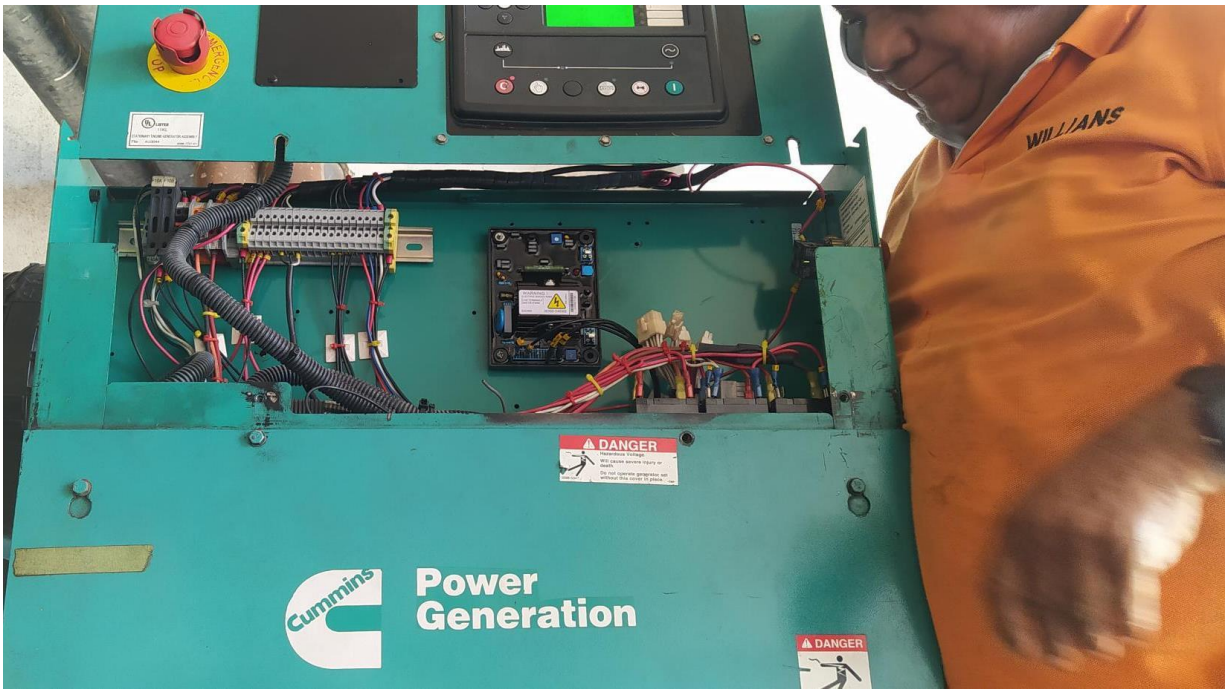


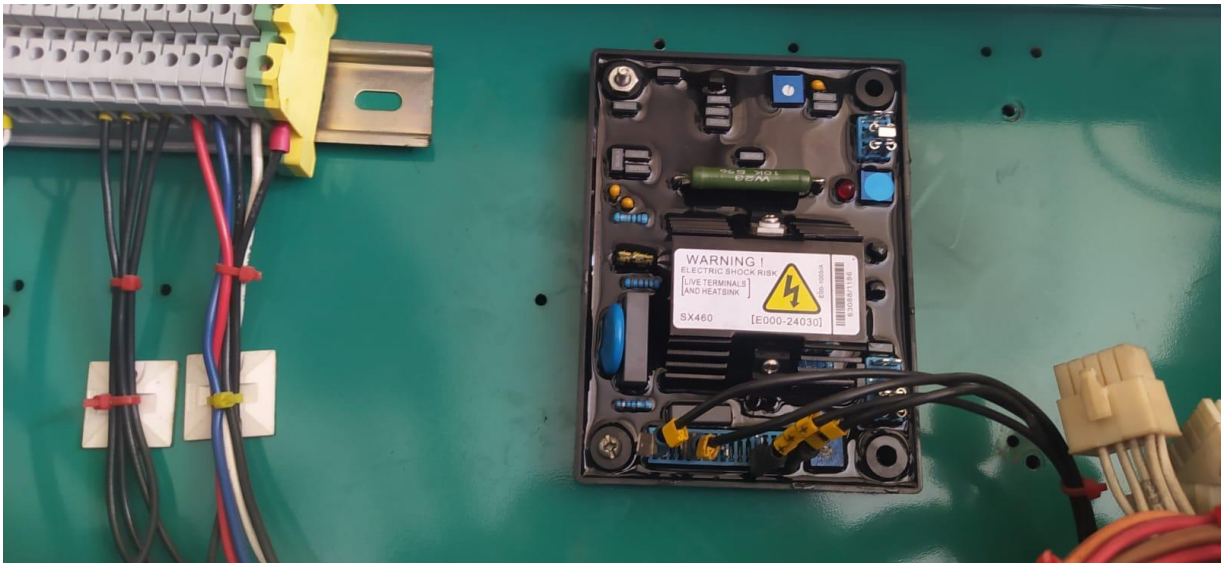

- ✓ RADAR SAN ANDRES. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS QSB consistente en la remoción de seis (06) inyectores, con el fin de inspeccionarlos y repararlos en un laboratorio en la ciudad de Bogotá, posterior se realiza la instalación en sitio.



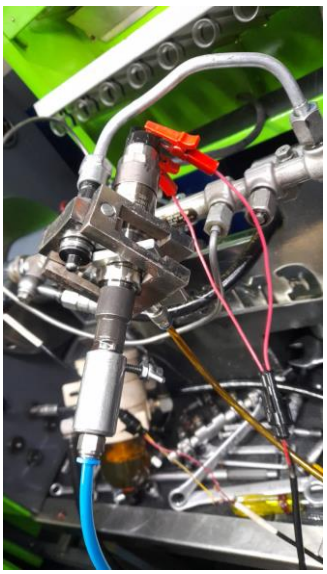

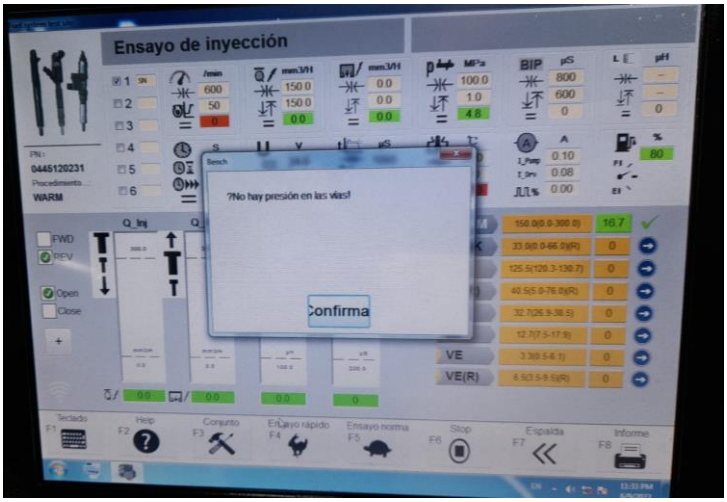



- ✓ RADAR SAN ANDRES. Se realiza mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS QSB consistente en la calibración de válvulas.



RADAR SAN ANDRES PENDIENTES:

GENSET 1 CUMMINS ROMO:

- ✓ El cambio de periféricos ya que cuentan con excesiva tolerancia
- ✓ El cambio del retenedor trasero del cigüeñal ya que evidencia fuga de aceite
- ✓ El cambio de 01 empaque del múltiple de admisión, ya que se encuentra roto

GENSET 2 CUMMINS QSB C100:

- ✓ El cambio de 01 alternador ya que el que se encuentra en el generador no está funcionando
- ✓ El cambio del arnés del motor ya que se encuentra desgastado y en malas condiciones

RADAR RIOHACHA PENDIENTES:

- ✓ Pendiente brindar el suministro original del sensor de presión de aceite con el fin de habilitar la operación del generador CUMMNINS. Este elemento se requiere con prioridad alta en razón que se tiene proyectada la puesta en línea del generador CUMMINS para alternar la operación con la red comercial.
- ✓ Se realizó toma de medidas para adecuación de bases metálicas y contemplar ser suministradas e instaladas en la próxima visita.
- ✓ Se realizó toma de medidas para adecuación y suministro de acoples para los ductos de salida de los aires.

RADAR LA FLOR PENDIENTES:

GENSET 1:

- ✓ Cambio de empaque cabeza de cilindro (CYLINDER HEAD GASKET) P/N: 4932210 El cambio del retenedor trasero. del cigüeñal ya que evidencia fuga de aceite.
- ✓ Cambio de 01 FUEL RESTRICTION INDICATOR P/N: RK32036.
- ✓ Contratista JUAN PABLO ALIRIO CASTELLANOS recomienda mantenimiento a los periféricos del GENSET.

GENSET 2 CUMMINS QSB C100:

- ✓ Conexión bomba eléctrica de transferencia de combustible.
- ✓ Cambio de 01 FUEL RESTRICTION INDICATOR P/N: RK32036.
- ✓ Cambio de 03 Arnés inyectores P/N:3287699. Sitio solicita 03 Arneses adicionales para stock.
- ✓ Contratista JUAN PABLO ALIRIO CASTELLANOS recomienda mantenimiento a los periféricos del GENSET

ECU 1 Y 2:

- ✓ Cambio de 01 TS2 (Sensor, Compressor - P/N 998-0243-00 fabricante Emerson Climate Tech P/N ALT 998-0090-01. Ref Manual Operating, Maintenance & Service Manual For Model ECU 441198 – pag 63).

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- ✓ Asegurar el correcto funcionamiento y operación de los radares, y para ello se requiere un correcto mantenimiento de los equipos asociados a los sitios radar de la Fuerza Aérea Colombiana, tales como los grupos de generación de energía eléctrica diésel, sistemas de refrigeración, motor-generadores a 400HZ incluyendo las acometidas, periféricos, sistemas de transferencia y cuadros de control.

- ✓ Mantener la operatividad de los equipos de alimentación eléctrica a través de los mantenimientos preventivos en toda su vida útil.

- ✓ Recuperar la operatividad de los sistemas de alimentación eléctrica a través de los mantenimientos correctivos cuando las maquinas presenten fallas imprevistas.

- ✓ Mantener la operatividad de los equipos de refrigeración de los sitios radar a través de los mantenimientos preventivos a través de toda su vida útil.


- ✓ Recuperar la operatividad de los sistemas de refrigeración a través de los mantenimientos correctivos cuando las maquinas presenten fallas imprevistas.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**27/09/2022**

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** **X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T1 ARIEL ERNESTO GARCES LOPEZ
FIRMA:	
C.C. No.	80842611
DEPENDENCIA:	Dirección Tecnologías Aeronáuticas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
