Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	3	
FECHA DEL ACTA	07/07/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 - 26/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4
	C.C./NIT	901662105
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
	C.C./NIT	1.098.662.022
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura (E)
	C.C.	79522052
INTERVENTOR	NOMBRE:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
	C.C./NIT:	810002747
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.165.900.979,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 649.770.293,70	
CDP	NÚMERO:	6597, 1518
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	12535, 1126
	FECHA:	27/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023
	Fecha de Finalización	23/08/2023
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	SIETE (7) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL	BUEN MANEJO Y	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 649.770.293,70

	ESTADO	CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$ 649.770.293,70
		RESPONSABILIDAI CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	$ 300.000.000,00
			96-40-101062974-3	24/01/2023	24/08/2023	$ 348.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	$ 216.590.097,90
			96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	$ 216.590.097,90
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	$ 433.180.195,80
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$ 433.180.195,80
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	$ 433.180.195,80
			96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	$ 433.180.195,80
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023, 17/01/2023, 17/02/2023, 17/02/2023					

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/05/2023			
	HASTA: 30/05/2023			
VALOR A COBRAR	$ 119.354.572,58			
ANTICIPO AMORTIZADO	30.00 % Valor a amortizar: $ 35.806.371,77			
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
	Mayo	01/06/2023	9451653641	$ 29.321.338,00
	Mayo	07/06/2023	9451655535	$ 1.160.000,00
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	
	VR PAGADO $ 1.219.900,00	**VR PAGADO $** 4.692.200,00	**VR PAGADO $** 2.048.100,00	

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO ALUMBRADO V4, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 3	$ 119.354.572,58
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 35.806.371,77
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 83.548.200,81

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300336473	$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300336473	$ 390,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 07 de Julio de 2023.

Interventor

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
Interventor

Contratista

LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Elaboró: APOYO. SERGIO PICO RODRIGUEZ
Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACH
Revisó: ARQ. LIBARDO ANDRES MEJIA LEON
Revisó: ING. CARLOS EDUARDO PINO
Revisó: ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA

CERTIFICACION DE EJECUCION PARCIAL 03 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 413 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al periodo de Acta de Ejecución Parcial No. 03 del contrato de obra No. 413 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-SI-LP-011-2022		
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3		
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.165.900.979,00		
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 649.770.293,70		
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:	-		
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):	-		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.165.900.979,00		
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 649.770.293,70		
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES		
PLAZO ADICIONAL No1:	-		
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	SIETE (7) MESES		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO V4 NIT. 901.662.105-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE C.C. 1.098.662.022		
INTEVENTORIA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT. 810.002.747-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA DAVILA MORALES C.C. 42.160.437		
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN - - - -	-	-	- -
ACTA DE REINICIACIÓN - - - -	-	-	- -
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	-		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023 PRINCIPAL	17/02/2023 INICIO	-
N° DE CDP Y FECHA	00006597 - 29/09/2022 INICIAL	00001518 - 22/01/2023 RESERVA	-
VALOR DE CDP	$ 13.883.717.658,77	$ 2.165.900.979,00	-
N° DE RP Y FECHA	00012535 - 27/12/2022 INICIAL	0001126 - 22/01/2023 RESERVA	-

VALOR DE RP	$ 2.165.900.979,00	$ 2.165.900.979,00	-
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	00001126 - 22/01/2023	-	-
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO		

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, del periodo comprendido del primero (01) al treinta (30) de mayo de 2023, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los siete (07) días del mes de julio de 2023.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoría

ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA No. 3

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO		
ACTA No.	3		
FECHA DEL ACTA	07 DE JULIO DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO ALUMBRADO V4	
	C.C/ NIT	901.662.105-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE	
	C.C	1.098.662.022	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)	
	C.C	79.522.052	
INTERVENTOR	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	
	C.C/NIT	810.002.747-0	
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.165.900.979	APORTE MUNICIPIO	NA
		APORTE CONVENIDO	NA
VALOR ADICIONADO	-	APORTE MUNICIPIO	NA
		APORTE CONVENIDO	NA
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	$ 649.770.293,70		
CDP	NÚMERO: 00006597	NÚMERO: 00001518	
	FECHA: 29/09/2022	FECHA: 22/01/2023	
CDP ADICIONAL	-		
	-		
RP	NÚMERO: 00012535	NÚMERO: 00001126	
	FECHA: 27/12/2022	FECHA: 22/01/2023	
RP ADICIONAL	-		
	-		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023	
	Fecha de Finalización:	23/08/2023	
	Nueva fecha de terminación:	-	
	Duración:	7 MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	-	-	-	-
Prórrogas	-	-	-	-

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	-	-	-	-

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	-	-	-

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$433.180.195,80
		96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$433.180.195,80
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/11/2023	$649.770.293,70
		96-44-101178227-2	24/01/2023	25/12/2023	$649.770.293,70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	96-44-101178227-0	26/12/2022	26/07/2026	$216.590.097,90
		96-44-101178227-2	24/01/2023	24/08/2026	$216.590.097,90
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2028	$433.180.195,80
		96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2028	$433.180.195,80
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	96-44-101178227-0	26/07/2023	26/07/2025	$433.180.195,80
		96-44-101178227-2	24/08/2023	24/08/2025	$433.180.195,80
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101062974-0	26/12/2022	26/07/2023	$300.000.000,00
		96-40-101062974-3	24/01/2023	24/08/2023	$348.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		
	Principal	17/01/2023
	Acta de Inicio	17/02/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 01/05/2023
	HASTA: 30/05/2023
VALOR A COBRAR (Contrato)	$119.354.572,58
ANTICIPO AMORTIZADO	$35.806.371.77

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MAYO 2023	01/06/2023 07/06/2023	9451653641 9451655535	$29.321.338 $1.160.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
COOSALUD EPS EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SALUD TOTAL SANITAS	PORVENIR PROTECCIÓN	POSITIVA ARL
VR PAGADO	**VR PAGADO**	**VR PAGADO**
$1.173.500 $46.400	$4.506.600 $185.600	$2.042.000 $6.100

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ANGELA MARIA DAVILA MORALES quien actúa en nombre y representación de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS en calidad de Interventor, y por la otra CRISTIAN MATEUS ACEVEDO quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO ALUMBRADO V4 en calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. CONSORCIO ALUMBRADO V4 acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas relacionadas.

3. CONSORCIO ALUMBRADO V4 ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO 413 DE 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$119.354.572,58
Valor IVA:	N/A
Menos amortización del anticipo	$35.806.371,77
Valor bruto ejecutado a pagar	$83.548.200,81

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300336473	$3.900
ORDENANZA	2502300336473	$390

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el siete (07) de julio de 2023.

Interventor

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
Interventoría

Contratista

LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
RL- CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Elaboro. Ing. Luis Alfredo Bedoya – Director de Interventoría
VoBo. Ing. Carlos Eduardo Pino – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Arq. Libardo Andrés Mejía – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Adm. Emerson Jair Brilla – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Ing. John Fernando Larrotta Peñaloza – Supervisor Alumbrado Publico

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300336473

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL	$3.900
Total	$3.900
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

Fecha de Expedición 2023/06/26 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/04

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 9016621053

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300336473(3900)000000000004290(96)20230704

0008990293

3744207397

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300336473

0008990293

3744207397

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. C.C. Número: 9016621053

Nombre: CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección Teléfono:

PRO HOSPITAL	$3.900
Total	$3.900
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300336473

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar	$4.290

Fecha de Expedición 2023/06/26 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/04

PRO HOSPITAL $3.900

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300336473

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL	$3.900
Total	$3.900
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 9016621053

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300336473(3900)000000000003900(96)20230704

Fecha de Expedición 2023/06/26

Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** 2502300336473

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 9016621053

Nombre CONSORCIO ALUMBRADO V

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 2023/06/26

Total a Pagar	$4.290

(415)8902012356005(8020)02502300336473(3900)000000000003900(96)20230704

(415)8902012356006(8020)02502300336473(3900)000000000000390(96)20230704

PRO HOSPITAL $3.900

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total $3.900
Ordenanza 012 $390

Pago Electronicamente

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901662105	3	CONSORCIO ALUMBRADO V4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL PROFESIONAL	ANILLO VIAL KM 1, 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2112077666	9451653641	E	2023/06/02	2023/06/01	BANCOLOMBIA	0	$8,973,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL PROFESIONAL (7 Afiliados)							$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$597,400			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,900		$0	$0		$4,102,300
Centro de Trabajo: PERSONAL PROFESIONAL (7 Afiliados)							$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$597,400			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,900		$0	$0		$4,102,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)							$13,000,000	$2,080,000			$13,000,000	$597,400			$13,000,000	$520,000			$13,000,000		$904,900		$0	$0		$4,102,300
1	CC	1216971535	FUENTES ALEJANDRO		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1095823625	MATEUS CRISTIAN	X		0	$0	$0	EPS005	30	$0	$77,400		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$77,400
3	CC	91232278	MATEUS CRISTIAN		23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF40	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	6.960%	$257,600	30	$0	$0	Si	$1,145,600
4	CC	37841476	MENDOZA CLAUDIA		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
5	CC	91532849	MORA JAVIER		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1098771455	NITOLA SERGIO		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1098774743	VEGA CARLOS		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL OPERATIVO (10 Afiliados)							$8,584,001	$1,373,600			$9,744,001	$389,900			$9,744,001	$389,900			$9,744,001		$678,800		$0	$0		$2,832,200
Centro de Trabajo: PERSONAL OPERATIVO (10 Afiliados)							$8,584,001	$1,373,600			$9,744,001	$389,900			$9,744,001	$389,900			$9,744,001		$678,800		$0	$0		$2,832,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)							$8,584,001	$1,373,600			$9,744,001	$389,900			$9,744,001	$389,900			$9,744,001		$678,800		$0	$0		$2,832,200
8	CC	13885048	ACEVEDO MARIO			0	$0	$0	EPS042	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
9	PT	6054315	CHIRINO JEAN		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1005150353	CUADROS JAIRO		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1006875622	GELVEZ DANIEL	X X	23030 1	7	$270,667	$43,400	ESSC24	7	$270,667	$10,900	CCF40	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
12	CC	85168927	LAGUNA ALVARO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	91247143	PARRA EDGAR	X	25-14	20	$773,334	$123,800	ESSC24	20	$773,334	$31,000	CCF40	20	$773,334	$31,000	14-23	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
14	CC	85166717	RINCON DULIS		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
15	CC	1007572304	RINCON ESNEIDER	X	25-14	15	$580,000	$92,800	ESSC24	15	$580,000	$23,200	CCF40	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
16	CC	13872074	SANCHEZ EDINSON		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	PT	1992175	SANDOVAL WILMER		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PERSONAL ELECTRICISTA (3 Afiliados)							$2,130,668	$341,000			$2,130,668	$85,300			$2,130,668	$85,300			$2,130,668		$148,400		$0	$0		$660,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901662105	3	CONSORCIO ALUMBRADO V4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL PROFESIONAL	ANILLO VIAL KM 1, 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2112077666	9451653641	E	2023/06/02	2023/06/01	BANCOLOMBIA	0	$8,973,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				25	$4,506,600	$0	$0	$4,506,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$216,600	$0	$0	$216,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,777,600	$0	$0	$3,777,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$512,400	$0	$0	$512,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,042,000	$0	$0	$2,042,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	26	$2,042,000	$0	$0	$2,042,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,173,500	$0	$0	$1,173,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	26	$1,173,500	$0	$0	$1,173,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				27	$1,250,900	$0	$0	$1,250,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$43,400	$0	$0	$43,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$65,100	$0	$0	$65,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$87,500	$0	$0	$87,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$70,900	$0	$0	$70,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$10,900	$0	$0	$10,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$146,400	$0	$0	$146,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$198,100	$0	$0	$198,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$150,400	$0	$0	$150,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$431,800	$0	$0	$431,800
TOTAL				26	$8,973,000	$0	$0	$8,973,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001081	8	VEROCO INGENIERIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PCD CARLOS CARDOZO	ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2125826454	9451655535	E	2023/06/21	2023/06/07	BANCOLOMBIA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1096233770	CARDOZO CARLOS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	Afiliados(1)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$284,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001081	8	VEROCO INGENIERIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PCD CARLOS CARDOZO	ANILLO VIAL KM 1 800 VIA GIRON	BUCARAMANGA-SANTANDER	6185839	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2125826454	9451655535	E	2023/06/21	2023/06/07	BANCOLOMBIA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				**1**	**$284,500**	**$0**	**$0**	**$284,500**

	ANEXO N° 2 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Mayo-20-2019
		Página 1 de 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL 3

OBJETO: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 2.165.900.979,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	5,51%

Fecha presente Acta: 30 de Mayo de 2023

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
CAPITULO 1 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE														
	1,01	Demolición de caja de inspección. Incluye relleno, retiro y disposicion final de escombros.	UND	56,00	$ 63.571,00	$ 3.559.976,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1,02	Retiro de postes metálicos existentes. Incluye demolición de base y cimentacion en concreto, retiro de escombros y transporte a bodega del municipio.	UND	48,00	$ 65.496,00	$ 3.143.808,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1,03	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de acometidas aérea /subterránea en cualquier calibre.	UND	4800,00	$ 1.208,00	$ 5.798.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	1,04	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.	UND	125,00	$ 64.248,00	$ 8.031.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 1						**$ 20.533.184,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
CAPITULO 2 SUBESTACION														
	2,01	Suministro, transporte e instalación de transformador monofásico 200VA, 110-220-440 V.	UND	1,00	$ 3.909.184,00	$ 3.909.184,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 2						**$ 3.909.184,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
CAPITULO 3 CANALIZACION														
	3,01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	103,00	$ 320.368,00	$ 32.997.904,00	18,00	$ 5.766.624,00	0,00	$ 0,00	49,00	$ 15.698.032,00	67,00	$ 21.464.656,00
	3,02	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 x 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	305,00	$ 22.637,00	$ 6.904.285,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	98,80	$ 2.236.535,60	98,80	$ 2.236.535,60
	3,03	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	33,00	$ 60.924,00	$ 2.010.492,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,04	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 3x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	23,00	$ 80.494,00	$ 1.851.362,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,05	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	358,00	$ 594.407,00	$ 212.797.706,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 10.699.326,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 10.699.326,00

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	3,06	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	454,00	$ 100.063,00	$ 45.428.602,00	0,00	$ 0,00	82,40	$ 8.245.191,20	181,20	$ 18.131.415,60	263,60	$ 26.376.606,80
	3,07	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado con canalización con topomisil. Incluye topomisil para cada ducto independiente y retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos según diseño.	ML	430,00	$ 741.283,00	$ 318.751.690,00	59,50	$ 44.106.338,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	59,50	$ 44.106.338,50
	3,08	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	ML	600,00	$ 119.633,00	$ 71.779.800,00	0,00	$ 0,00	221,90	$ 26.546.562,70	61,70	$ 7.381.356,10	283,60	$ 33.927.918,80
TOTAL CAPITULO 3						$ 692.521.841,00		$ 49.872.962,50		$ 45.491.079,90		$ 43.447.339,30		$ 138.811.381,70
CAPITULO 4 ESTRUCTURAS														
	4,01	Suministro, transporte e instalación de caja de inspeccion de 600X600X880 mm AP274 (medidas internas). Inlcuye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metalico soldados, fondo de gravilla, espuma de poliuretano y señalizacion RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND	86,00	$ 1.434.988,00	$ 123.408.968,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4,02	Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG.	UND	620,00	$ 51.193,00	$ 31.739.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	4,03	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra compuesto por un electrodo tipo varilla de 2,4m x 5/8" y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND	13,00	$ 490.741,00	$ 6.379.633,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 4						$ 161.528.261,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
CAPITULO 5 REDES														
	5,01	Suministro,transporte e instalación de red canalizada en 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	1500,00	$ 19.271,00	$ 28.906.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,02	Suministro,transporte e instalación de red canalizada en 3 Al No 4 THHN SERIE 8000 (F) + 1 Al No 4 THHN SERIE 8000 (N) + 1 Al No 6 THHN SERIE 8000 (T). Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	ML	5100,00	$ 26.829,00	$ 136.827.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	5,03	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x12 encauchetado 75°/600V y accesorios de instalación.	ML	3700,00	$ 18.582,00	$ 68.753.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 5						$ 234.487.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
CAPITULO 6 SALIDAS														
	6,01	Suministro, transporte e instalación de luminaria DECO LIRA 60 W - 32 LEDS, 8460 Lm, CCT 4000 K, 373 mA, CRI 70. CL I. Incluye soporte top post en aluminio inyectado, sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Negro Mate RAL 9005	UND	12,00	$ 5.732.623,00	$ 68.791.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	6,02	Suministro, transporte e instalación de Luminaria UNISTREET LED gen2 146 W, 24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL II. FIJACION HORIZONTAL. Incluye sistema antirrobo, marcación AP-B/MANGA y demás accesorios. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Color: Gris Ral 7035	UND	137,00	$ 1.945.229,00	$ 266.496.373,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 6						$ 335.287.849,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
CAPITULO 7 POSTES														

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	7,01	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico certificado de 4.5 m de altura total, niple dispuesto para instalar Luminaria Led Deco Lira. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad . Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica Horneado doble Laca mate y 50cm de pintura epóxica en la base del poste. Dispuesto para instalar Luminarias AP DECO LIRA.Incluye Canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galvanizadas en su totalidad. Color: Negro Mate RAL 9005. Peso: 28,07Kg aprox.	UND	12,00	$ 1.491.880,00	$ 17.902.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,02	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 10.5m de altura total, 4"/3" Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 47,17Kg.	UND	6,00	$ 4.250.873,00	$ 25.505.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 25.505.238,00	6,00	$ 25.505.238,00
	7,03	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 10.5m de altura total, 6"/ 2 1/2" Brazo Doble curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led decorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 202,90 Kg.	UND	39,00	$ 6.637.808,00	$ 258.874.512,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,04	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 8.5m de altura total, Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 93,94Kg.	UND	15,00	$ 3.547.045,00	$ 53.205.675,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 7						$ 355.487.985,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 25.505.238,00		$ 25.505.238,00
CAPITULO 8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS														
	8,01	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	1577,00	$ 2.112,00	$ 3.330.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,02	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	87,00	$ 72.911,00	$ 6.343.257,00	76,67	$ 5.590.086,37	0,00	$ 0,00	8,60	$ 627.034,60	85,27	$ 6.217.120,97
	8,03	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	68,00	$ 180.666,00	$ 12.285.288,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,28	$ 2.037.912,48	11,28	$ 2.037.912,48
	8,04	Suministro, intalación y conformación de piso en adoquin peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	m2	1268,00	$ 156.206,00	$ 198.069.208,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,05	Suministro, intalación y conformación de piso en adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal	m	28,00	$ 43.850,00	$ 1.227.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,06	Construcción Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI Tipo BC.010, con espaldar en madera teka incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	m	33,00	$ 796.799,00	$ 26.294.367,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,07	Construcción de Bordillo recto en concreto 3000 psi mezclado en sitio (12 cm x 20 cm) Tipo BS.002, incluye soldado, formaleta desdencofrante y acero de refuerzo	ML	219,00	$ 122.227,00	$ 26.767.713,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No.2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 3		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESP.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	8,08	Construcción de piso en concreto de 3000 psi mezclado en sitio. Acabado rayado con cepillo metálico texturizador.	M3	6,00	$ 1.193.241,00	$ 7.159.446,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	8,09	Suministro e Instalaciòn de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m. incluye sello de juntas	ML	141,00	$ 102.860,00	$ 14.503.260,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	141,00	$ 14.503.260,00	141,00	$ 14.503.260,00
TOTAL CAPITULO 8						**$ 295.980.963,00**		**$ 5.590.086,37**		**$ 0,00**		**$ 17.168.207,08**		**$ 22.758.293,45**
CAPITULO 9 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO														
	9,01	Implementacion del plan de manejo de trafico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas de regulacion, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras plasticas (maletines tipo new jersey), cinta plastica "peligro no pase", flasher luminoso, señalizacion de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales moviles, derechos DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboracion plan de manejo de transito, derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de transito. (L3)	UND	1,00	$ 55.389.647,00	$ 55.389.647,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,60	$ 33.233.788,20	0,60	$ 33.233.788,20
TOTAL CAPITULO 9						**$ 55.389.647,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 33.233.788,20**		**$ 33.233.788,20**
CAPITULO 10 CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.														
	10,01	Elaboración de planos y memorias de calculo AS Build.	UND	1,00	$ 1.540.565,00	$ 1.540.565,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	10,02	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (L3)	UND	1,00	$ 4.704.422,00	$ 4.704.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	10,03	Certificación plena de conformidad con RETILAP expedida por organismo acreditado ONAC. (L3)	UND	1,00	$ 4.529.278,00	$ 4.529.278,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
TOTAL CAPITULO 10						**$ 10.774.265,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VALOR TOTAL CONTRATO						**$ 2.165.900.979,00**		**$ 55.463.048,87**		**$ 45.491.079,90**		**$ 119.354.572,58**		**$ 220.308.701,35**
SALDO POR EJECUTAR:														**$ 1.945.592.277,65**

	ACTA No 1	ACTA No 2	ACTA No 3
VALOR PRESENTE ACTA	**$55.463.048,87**	**$45.491.079,90**	**$119.354.572,58**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	**$16.638.914,66**	**$13.647.323,97**	**$35.806.371,77**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	**$38.824.134,21**	**$31.843.755,93**	**$83.548.200,81**

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: _____
Nombre: LINA MARCELA GABOGAL MANRIQUE
RL CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Firma: _____
Nombre : ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
Interventor

Revisó. Ing. Luis Bedoya - Director Interventoria

Vo. Bo. Ing. Carlos Pino - Apoyo a la supervision

Vo. Bo. Arq. Libardo Mejia - Apoyo a la supervision

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 1

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
Bulevar Santander con Cra 20										
Caja 11 - Caja 12						15,00				15,00
Bulevar Santander con Cra 18										
Caja 22 - Caja 23						16,00				16,00
Bulevar Santander con Cra 17										
Caja 27 - Caja 29						**18,00**				18,00
TOTAL										**49,00**

CROQUIS



Blvr Stder con Cra 20

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022


SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

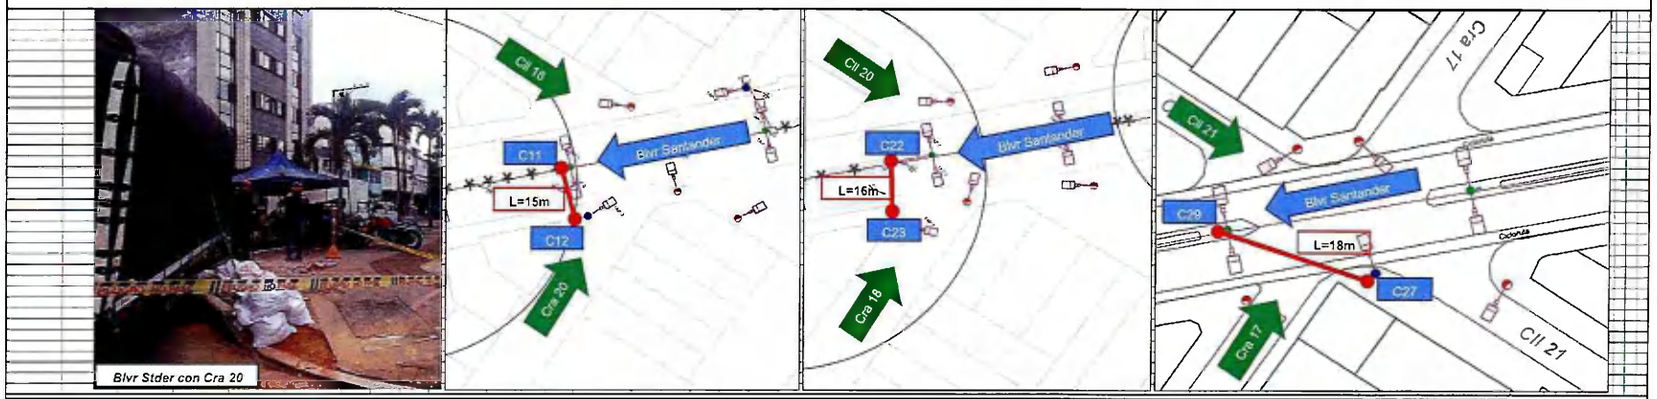

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.01	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 1

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.02	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 x 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT.	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PARCIAL	LARGO	ANCHO	ALTO		
Glorieta Estadio Alfonso Lopez										
Caja 83 - Lum Benito 1	7,00				7,00					7,00
Caja 86 - Lum Benito 2	13,00				13,00					13,00
Caja 86 - Lum Benito 3	4,50				4,50					4,50
Caja 87 - Lum Benito 4	3,30				3,30					3,30
Caja 87 - Lum Benito 5	9,80				9,80					9,80
Caja 88 - Lum Benito 6	14,00				14,00					14,00
Caja 88 - Lum Benito 7	3,00				3,00					3,00
Caja 85 - Lum Benito 8	6,00				6,00					6,00
Caja 88 - Lum Benito 9	14,00				14,00					14,00
Caja 85 - Lum Benito 10	9,20				9,20					9,20
Caja 84 - Lum Benito 11	15,00				15,00					15,00
TOTAL										98,80

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		


LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.02	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 x 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

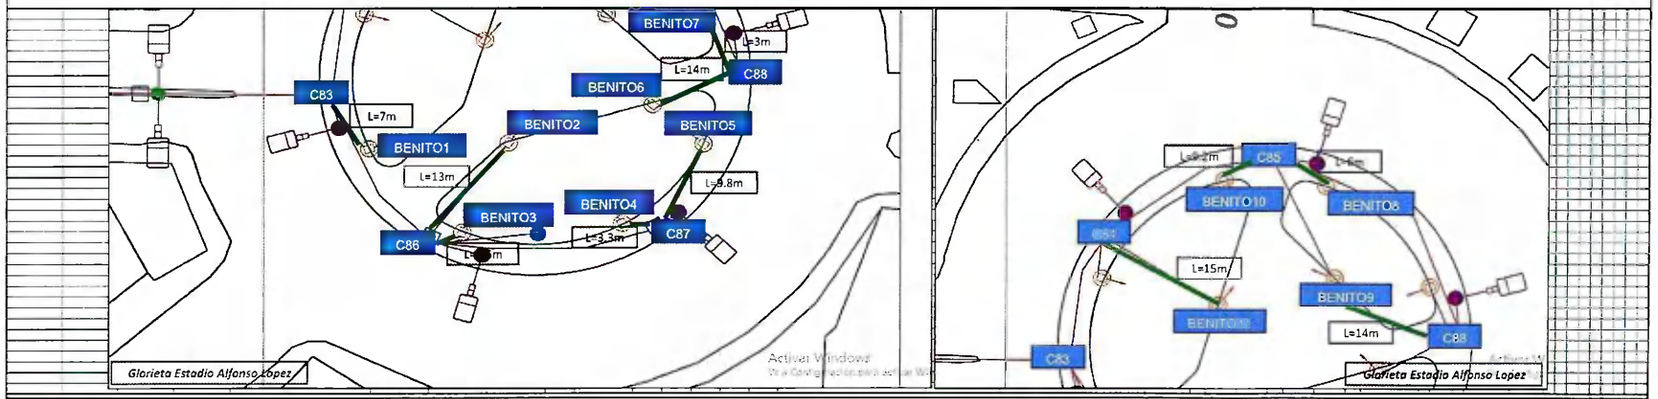

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.02	Suministro, transporte e instalación de ducto 1 x 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.06	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
BLVR STDER ENTRE CRA 20 Y CRA 21										
Caja 6 - Caja 7	37,70									37,70
BLVR STDER ENTRE CRA 19 Y CRA 20										
Caja 11 - Caja AD-2	22,00									22,00
Caja AD-2 - Caja 13	21,00									21,00
Caja 13 - Caja AD-3	21,00									21,00
Caja AD-3 - Caja 14	20,00									20,00
BLVR STDER ENTRE CRA 19 Y CRA 18										
Caja 18 - Caja 19	31,50									31,50
Caja 19 - Caja 20	28,00									28,00
TOTAL										181,20

CROQUIS



Blvr Stder con Cra 20 y Cra 21

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	FECHA	DÍA 30 MES 5 AÑO 2023
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.06	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

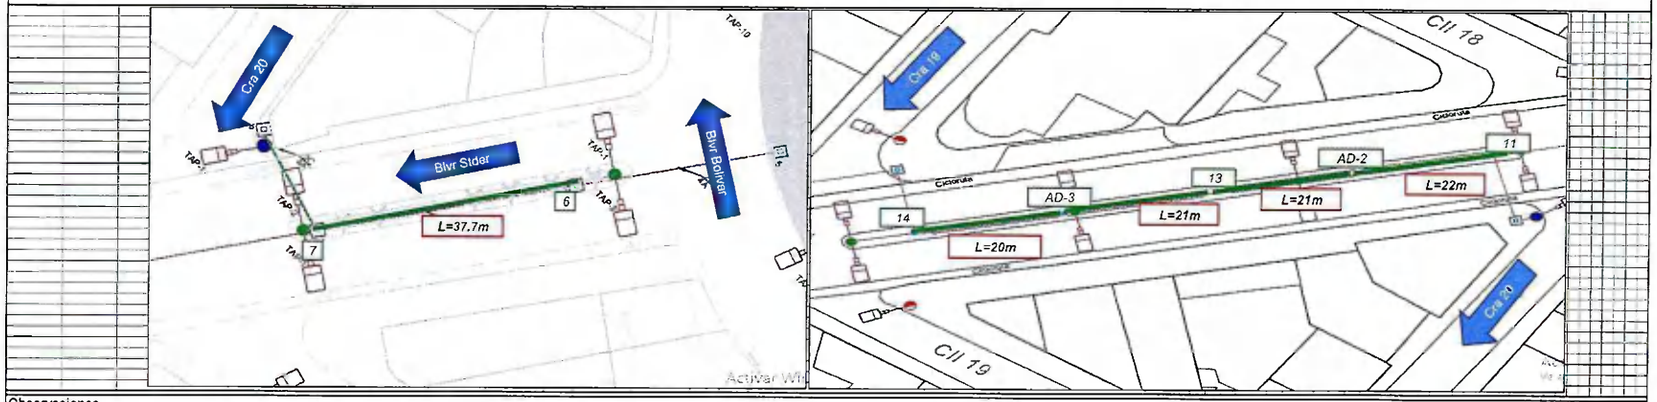

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.06	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 4x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 3

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.08	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 4

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
BULEVAR SANTANDER CON CRA 22										
Caja 42 - Caja 43						32,00				32,00
CALLE 14 CRA 25										
Caja 64 - Caja 63						19,70				19,70
CALLE 14 CRA 25										
Caja 65 - Caja AD-1						10,00				10,00
TOTAL										61,70

CROQUIS



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022


SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.08	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

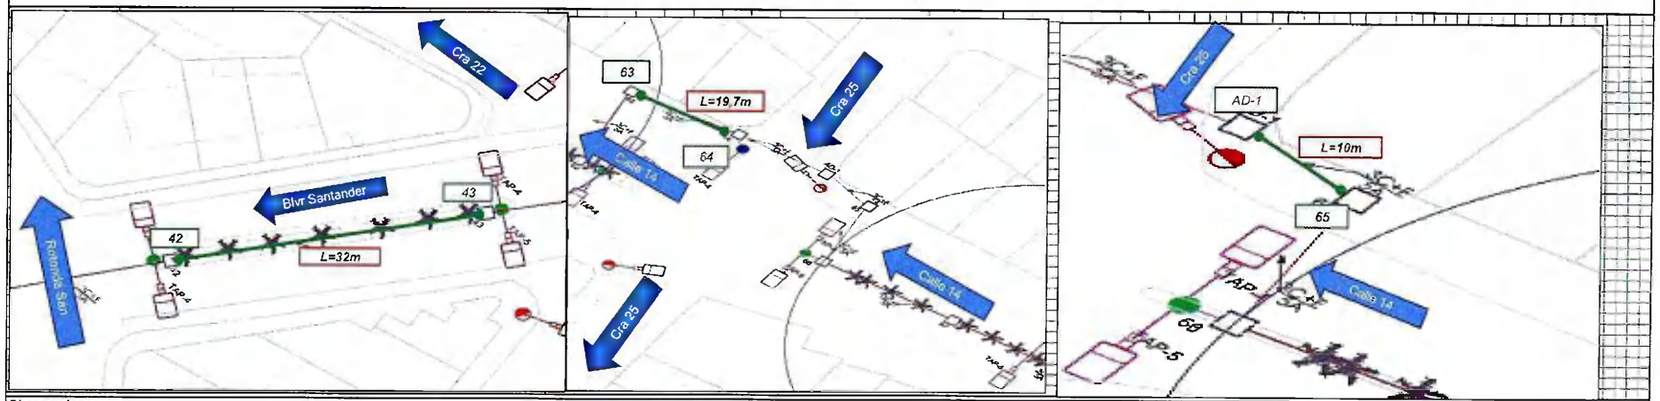

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	3 CANALIZACIONES			REF.	Contractual
ITEM: 3.08	Suministro,transporte e instalación de banco de ductos 5x2" PCV conduit tipo pesado. Incluye excavacion 0,7 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, retiro de escombros y disposicion final. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico.	UND.	ML	REF.	Hoja 4

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD









Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	7 POSTES			REF.	Contractual
ITEM: 7.02	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 10.5m de altura total, 4"/3" Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 47,17Kg.	UND.	UND	REF.	Hoja 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO			
Glorieta Estadio Alfonso Lopez											
Poste 1				1,00						1,00	
Poste 2				1,00						1,00	
Poste 3				1,00						1,00	
Poste 4				1,00						1,00	
Poste 5				1,00						1,00	
Poste 6				1,00						1,00	
TOTAL										6,00	



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	7 POSTES			REF.	Contractual
ITEM: 7.02	Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste metálico cetificado de 10.5m de altura total, 4"/3" Brazo Sencillo curvo avance 2m. Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica, Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar Luminarias AP Unistreet Phillips. Incluye punta led dercorativa Blue, canastilla de anclaje para cimentación con tuercas wasas y arandelas galavanizadas en su totalidad, 50cm de pintura epóxica en la base del poste y demás accesorios de instalación. Color: Gris Ral 7035+L. Peso: 47,17Kg.	UND.	UND	REF.	Hoja 5

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4


CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS			REF.	Contractual
ITEM: 8.02	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquin, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	UND.	M3	REF.	Hoja 6

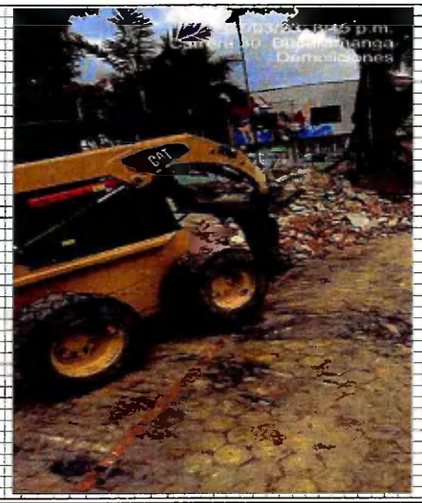AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ESPESOR	ANCHO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO			
ZONA 4	5,88	0,17	8,60	8,60	8,60					8,60	
TOTAL										8,60	

Observaciones: En acta parcial No. 3 se cobra la cantidad de 8,60 m3, esto debido a que no existe la cantidad suficiente para cobrar la cantidad real ejecutada.

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.


FECHA: DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS			REF.	Contractual
ITEM: 8.02	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	UND.	M3	REF.	Hoja 6

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

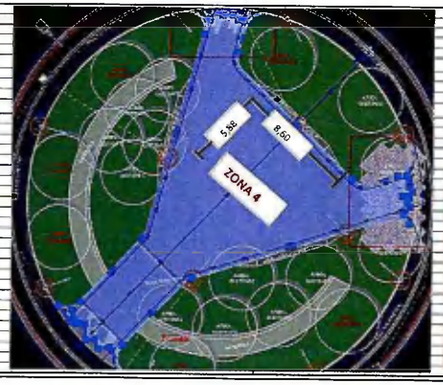





Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORÍA: JOHN FERNANDO LARROTTA


INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS			REF.	Contractual
ITEM: 8.03	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	UND	M3	REF.	Hoja 7

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT.	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	PARCIAL	LARGO	ANCHO	ALTO		
ZONA 5 (SARDINEL)	141,00	0,20	0,40	11,28	11,28					11,28
TOTAL										11,28

CROQUIS

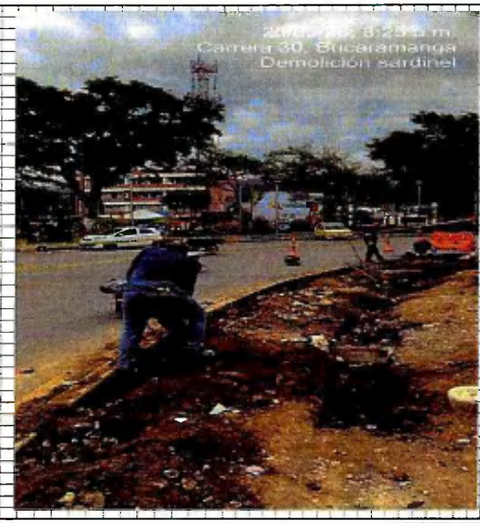

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022

CAPITULO	8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS			REF.	Contractual
ITEM: 8.03	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	UND.	M3	REF.	Hoja 7

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.


CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

CAPITULO	8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS			REF.	Contractual
ITEM: 8,09	Suministro e Instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m. incluye sello de juntas	UND.	ML	REF.	Hoja 8

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT. PARCIAL	VANOS			% Desperd.	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		LARGO	ANCHO	ALTO		
Glorieta Estadio Alfonso Lopez										
Penmetro glorieta	141,00				141,00					141,00
TOTAL										141,00

CROQUIS

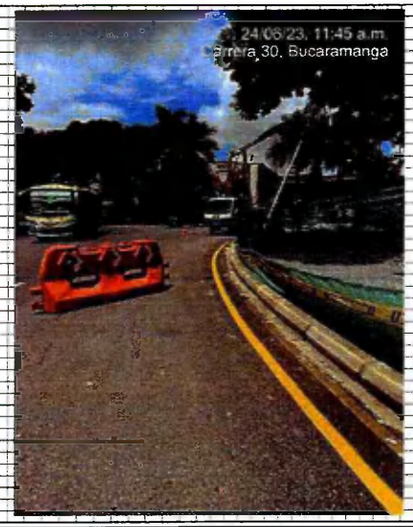

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.


FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

CAPITULO	8 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS			REF.	Contractual
ITEM: 8,09	Suministro e Instalaciòn de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m. incluye sello de juntas	UND.	ML	REF.	Hoja 8

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

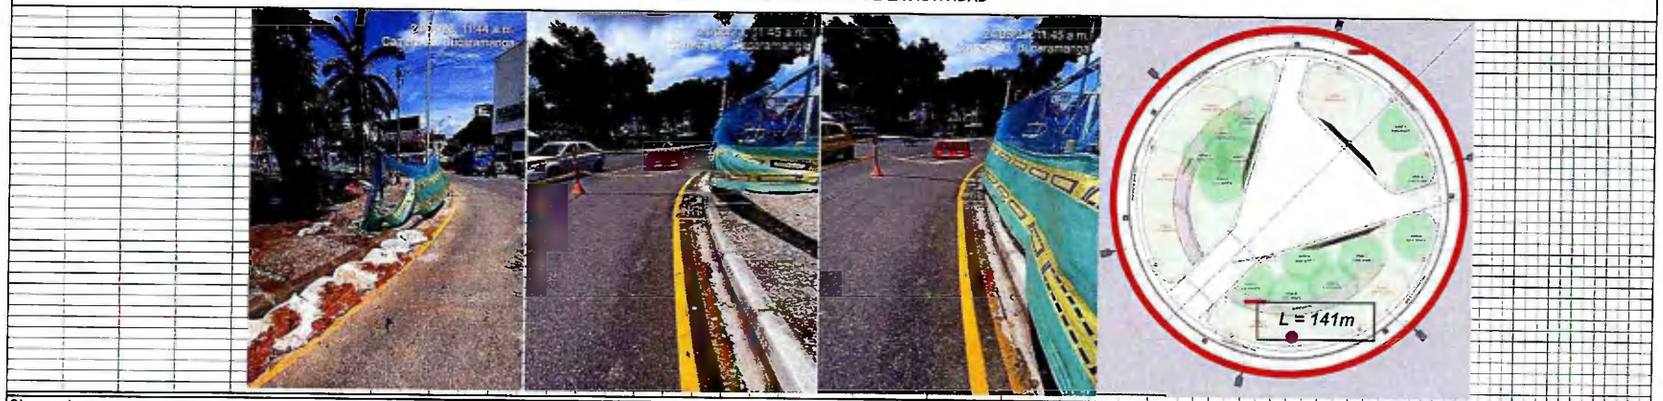

Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		

LOTE 3

CONTRATISTA CONSORCIO ALUMBRADO V4

SUPERVISOR INTERVENTORIA JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATO OBRA No. 413 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

CAPITULO	9 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO			REF.	Contractual
ITEM: 9.01	Implementacion del plan de manejo de trafico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas de regulacion, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras plasticas (maletines tipo new jersey), cinta plastica "peligro no pase", flasher luminoso, señalizacion de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales moviles, derechos DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboracion plan de manejo de transito, derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de transito. (L3)	UND.	UND	REF.	Hoja 9

AREA O LUGAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	TOTAL PERIODO
DIAS	7	30	30	30	30	30	30	23	210	
CANTIDAD	7	30	30	30	30				127	
% PERIODO	0.033333	0.142857	0.142857	0.142857	0.142857					0.60
TOTAL										0.60

CROQUIS



Observaciones

Se adjunta a esta memoria el acta de aprobación del PMT, PMT aprobado (Medio magnetico), acta de comité de seguimiento con DTB, registro fotografico, inventario de insumos y certificación de suministro e implementación.

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

FECHA DÍA 30 MES 5 AÑO 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO V4

CONTRATO OBRA No.: 413 DE 2022

SUPERVISOR INTERVENTORIA: JOHN FERNANDO LARROTTA

INTERVENTORIA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 422 DE 2022

CAPITULO	9 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO			REF.	Contractual
ITEM: 9.01	Implementacion del plan de manejo de trafico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas de regulacion, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras plasticas (maletines tipo new jersey), cinta plastica "peligro no pase", flasher luminoso, señalizacion de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales moviles, derechos DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboracion plan de manejo de transito, derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de transito. (L3)	UND.	UND	REF.	Hoja 9

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

LOTE 3

CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO V4	FECHA	DÍA 30	MES 5	AÑO 2023
SUPERVISOR INTERVENTORIA	JOHN FERNANDO LARROTTA	CONTRATO OBRA No.	413 DE 2022		
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CONTRATO INTERVENTORÍA No.	422 DE 2022		

CAPITULO	9 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO			REF.	Contractual
ITEM: 9.01	Implementacion del plan de manejo de trafico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas de regulacion, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras plasticas (maletines tipo new jersey), cinta plastica "peligro no pase", flasher luminoso, señalizacion de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales moviles, derechos DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboracion plan de manejo de transito, derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de transito. (L3)	UND.	UND	REF.	Hoja 9

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Observaciones

ING. CRISTIAN MATEUS ACEVEDO
CONTRATISTA

ING. LUIS BEDOYA
Vo.Bo. INTERVENTOR
