Pereira, Julio 10 de 2023

Señores:
Señores:
CONSORCIO INTERVENTORIA KIOSKO 2022
Atn: ING.JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO
REP. LEGAL
Ciudad

SMDR-7305-2022-026

Ref. Contrato SMDR-LP-117-2022. **"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSCO PRINCIPAL DEL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

Asunto: Solicitud de prórroga a Julio 31 de 2023.

Cordial saludo,


Con el presente solicitamos su revisión y aval para que se acuerde entre las partes una prórroga que consideramos necesaria hasta el 31 de Julio de 2023 para la terminación del contrato de la referencia en razón a las siguientes consideraciones:


1. Como es de su conocimiento se ha prolongado el invierno de manera inesperada a los pronósticos previstos por el Instituto metereológico que han extendido el tiempo de ejecución de las actividades críticas de la programación de obra que generaron inevitablemente suspensión de las mismas por tratarse de labores de instalación de teja, canales y limahoyas las cuales no pueden acometerse mientras se presenten lluvias donde se debe dar prioridad a la seguridad del personal de obra el cual no puede laborar en dichas condiciones que son siempre en alturas.


2. Hasta que no se terminen las actividades de cubierta en su totalidad no se pueden tampoco terminar las actividad de sobre piso y nivelación con


acabado en pintura de color cuya ejecución está totalmente condicionada a que no se presente ingreso de agua al interior del kiosco.

A continuación presentamos para su revisión las estadísticas pluviales para la ciudad de Pereira descargadas directamente de páginas oficiales del IDEAM en el período comprendido entre el 26 de abril de 2023 hasta la fecha de las cuales se deduce que se han presentado lluvias significativas que han obligado a suspensión de actividades durante 22 días.

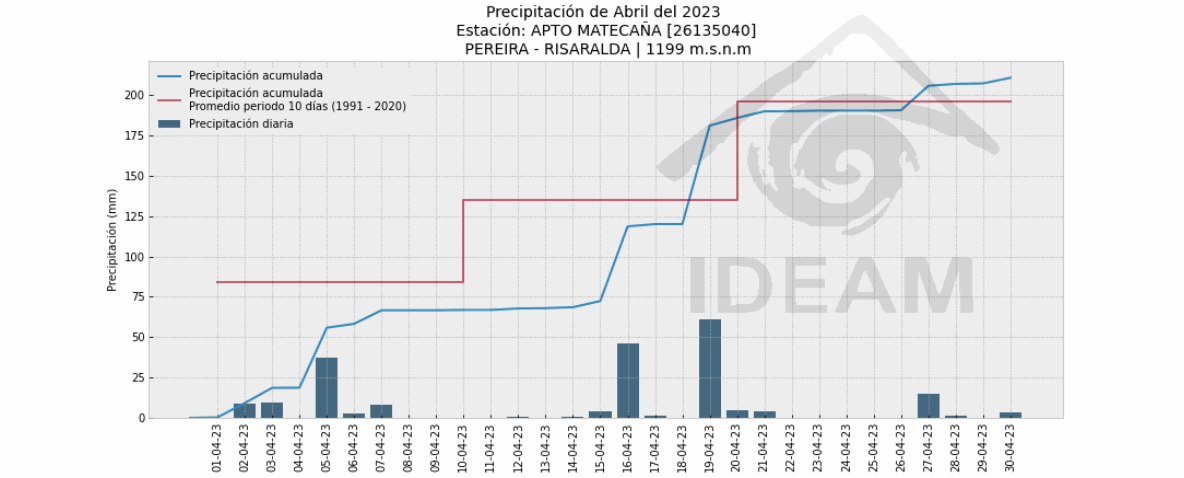

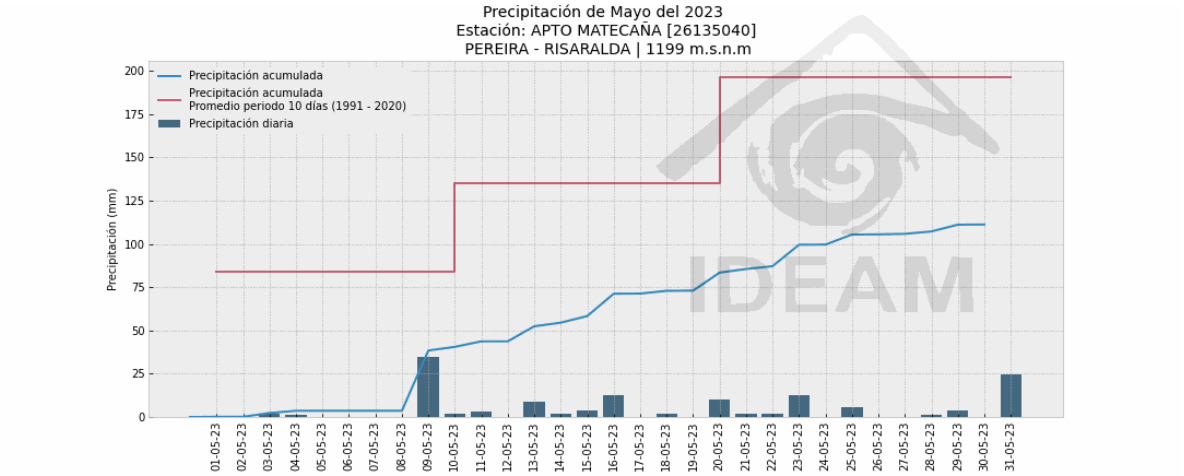

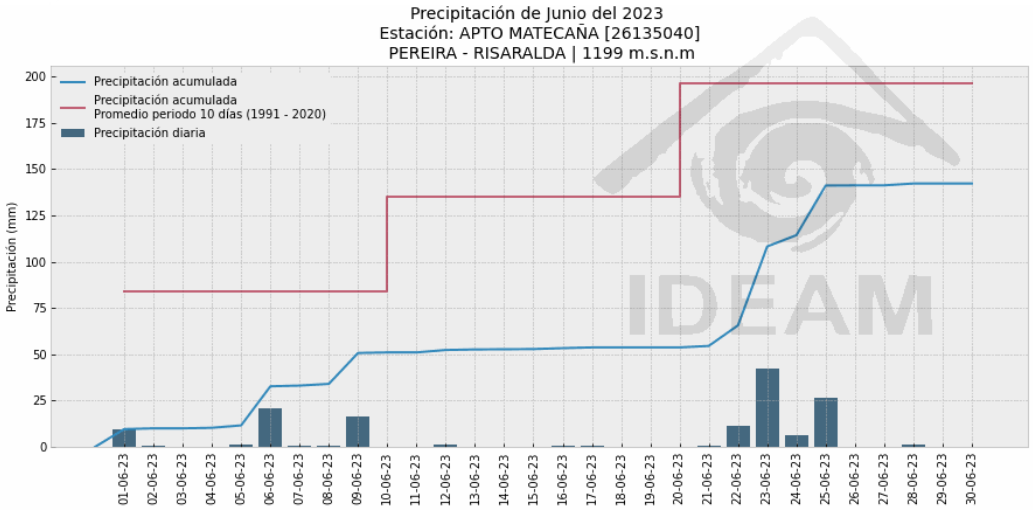

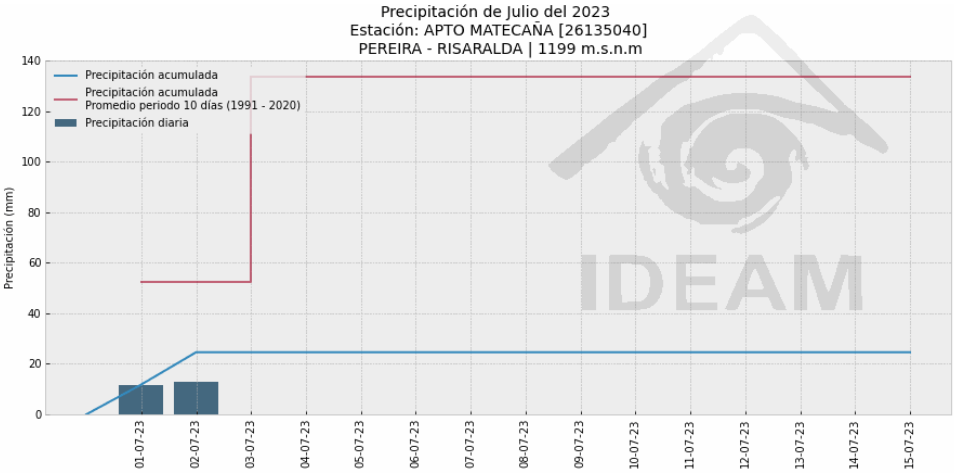

Cordialmente,

NELSON MORENO ALVAREZ
CONSORCIO OBRING KIOSCO
Representante Legal

c.c. SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION – MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE PEREIRA
