ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME: 1

FECHA DE ELABORACION: 6 / 7 / 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	18 de abril de 2023	Y EL	18 de mayo de 2023
OBJETO	"MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA AVENIDA "FRANCISCO EL HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"				
LOCALIZACIÓN	DISTRITO DE RIOHACHA CARRERA 7H AVENIDA FRANCISCO EL HOMBRE				

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	587 DE 2022	CONTRATO No.:	240 DE 2023
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA	CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE
PLAZO INICIAL:		PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
VALOR INICIAL :	$ 14.961.100.754,54	VALOR INICIAL :	$ 1.084.668.634,00
ANTICIPO PACTADO :	N/A	ANTICIPO PACTADO :	N/A
VALOR ADICION(ES):	N/A	VALOR ADICION(ES):	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A	VALOR ACTUALIZADO:	N/A
VALOR PAGADO:	$ 2.244.165.113,18	VALOR PAGADO:	N/A
VALOR POR PAGAR:	$ 12.716.935.641,36	VALOR POR PAGAR:	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO	18/04/2023	16/09/2024	$ 1.496.110.075,45	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/04/2023	18/06/2024	$ 108.466.863,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	18/04/2023	18/05/2024	$ 2.244.165.113,18	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/04/2023	18/02/2027	$ 54.233.431,70
PRESTACIONES SOCIALES	18/04/2023	19/05/2027	$ 748.055.037,73	CALIDAD DE SERVICIO	18/02/2024	18/02/2029	$ 108.466.863,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/05/2024	19/05/2029	$ 1.496.110.075,45				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/04/2023	18/05/2024	$ 1.496.110.075,40				

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo Pactado (15%)		$ 2.244.165.113,18			


AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - OBRA	AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - INTERVENTORIA



ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

4. CURVA "S"

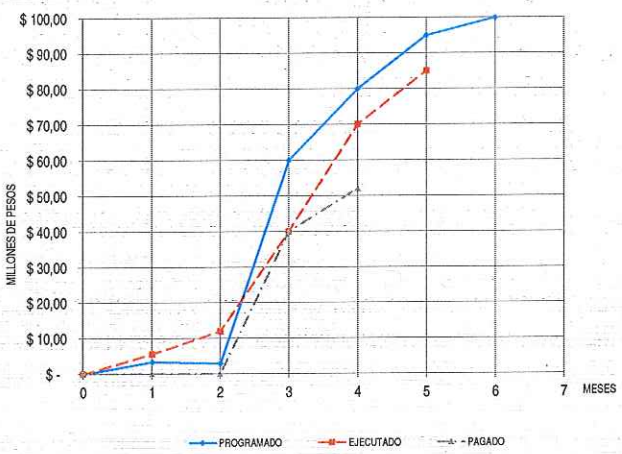


PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. RELACION DE HITOS (AVANCE)

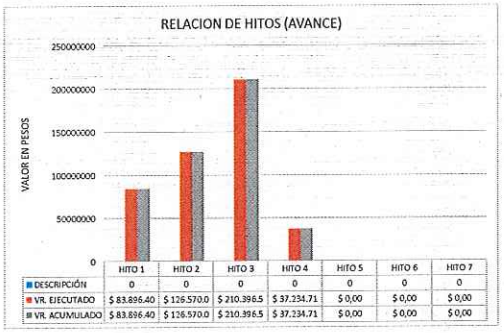

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6	HITO 7
DESCRIPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
VR. EJECUTADO	$ 83.896,40	$ 126.570,0	$ 210.396,5	$ 37.234,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VR. ACUMULADO	$ 83.896,40	$ 126.570,0	$ 210.396,5	$ 37.234,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

4. GESTION AMBIENTAL

FUENTE MATERIALES

UBICACIÓN

SITIO LLAMADO "LAGUNETA"

	SI	NO	N.A
BOTADEROS:		X	
LICENCIA AMBIENTAL:		X	
PERMISO TALA:		X	
ESCOMBRERAS:	X		
VERTIMENTOS:		X	
EMISIONES:		X	

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA MANETER INFORMADO AL SUPERVISOR SOBRE LOS MATERIALES SOBRANTES Y SUS DISPOSICION FINAL Y ENVIAR LA DIRECCION DEL SITIO.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se han realizado actas modificiatorias, no se han identificado mayores o menores cantidades de obras

ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial	Actividades Realizadas
1. Durante semana se realiza seguimiento e inspección en obra evidenciando el lavado de mano cinco veces al día, insumos de desinfección tales como jabones líquidos, gel antibacterial, alcohol al 70%, entre otros, stop de EPP, distanciamiento social. Desinfección de calzados, desinfección de materiales con hipoclorito de sodio con bomba de aspersión en vehículos que ingresan a obra. Desinfección de áreas como: almacén, vestier, oficinas, área de salud y espacios comunes, por parte de la interventoría. Ante el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y cumplimiento a las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Para la prevención, mitigación del Covid - 19. 2. Se realiza aprobación por parte de la interventoría de 45 trabajadores a obra. 3. Contratista realiza envío de formatos de entrega de EPP al personal a la interventoría. 4. Se realiza recorrido en obra en compañía de la interventoría y se evidencia el uso de EPP . 5. A la fecha NO se reportan casos positivos para Covid - 19 en obra. 6. Las temperaturas están en el rango normal entre 37 – 39 C.	**De medida Preventiva** — Las Charlas y otros: 1. Cerramiento como protercción a la comunidad y al trafico vehicular. 2. Se realizaron encuesta de sintomatologia al personal que labora en obra. 3. Se realizaron procesos de induccion al personal. 4. Se envían por parte del Coordinador HSEQ del contratista UT VIAS GEO PAZ RIOHACHA, reporte de las actividades implementadas en obra del PAPSO y reporte de novedades del día. **Actividades de Higiene y Seguridad Industrial** — La limpieza de baños y oficinas se continúa ejecutando al menos dos veces por semana La interventoría se acoge a las medidas establecidas en el PAPSO del contratista en obra, e implementa medidas de bioseguridad propias del consorcio CID, como son; encuesta digital de sintomatología y bitácora de recorridos. Sin novedad hasta la fecha. Se observa lavado de Baños con frecuencia diaria

*Se deberá Anexar los listados de entrada y Salida del Personal

Ingreso Personal 07:00a.m **Salida Personal** 05:00p.m

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
		SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1
		VISITAS- ACTAS DE VECINDAD	153

OBSERVACIONES

- La trabajadora Social del contratista se comunicó 26 de Agosto del 2020 que concertaría con el rector de la institución el Señor Jhon Alex Córdoba una fecha para realizar la socialización del 50% del avance de obra.


- Se verificó el Buzón de Sugerencia y esta semana no se encontraron PQRS por parte de la comunidad ni de los trabajadores.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION Y REPLANTEO





DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA Y MINI CARGADOR CON MARTILLO



RETIRO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA 320 Y LIMPIEZA DE LA SUBRASANTE CON EL EQUIPO MOTONIVELADORA.



EXTENSIÓN DE MATERIAL DE SUB BASE TIPO INVIAS CON EL EQUIPO MOTONIVELADORA.



HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y TOMA DE DENSIDADES EN LA CAPA DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS.



EXTENSIÓN DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO TIPO INVIAS CON EQUIPO MOTONIVELADORA, COMPACTACIÓN Y TOMA DE DENSIDADES..



MEZCLA DE CONCRETO PRE MEZCLADO EN PLANTA PARA COLOCACIÓN EN SITIO CON EQUIPO TIPO MIXER, VIBRADO ALLANADO, TEXTURIZADO Y CURADO CON ANTISOL, PAVIMENTO EN CONCRETO E=0.25 MT Y MR=4.2 MPA.



CORTE Y DILATACIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO Y SELLO DE JUNTAS EN CORDÓN DE POLIURETANO CON SELLO DE SILICONA.





ACERO DE TRANSFERENCIA D=1/2" CORRUGADO, ACERO LISO DE TRANSFERENCIA D=11/8" LISO Y CANASTILLA SOPORTE DOVELAS EN ACERO DE Ø3/18" ALAMBRON.




BORDILLO PERIMETRAL CONFINAMIENTO DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (0.15X0.35).




LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EXCAVACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8" Y DE 6".




INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8", DE 6" Y ACCESORIO TIPO SILLA YEE.




Solado de limpieza para base de pozos 1500psi e=0,05 para pozo de inspección, base en concreto reforzado de 28 mpa barra ø5/8"@15 cm de ø=2 m e= 0.20 m incluye cañuela en concreto de 2000 psi y emboquillado, para pozo de inspección h<3 de ø=1.2 m interno y ø=1.6 m externo, cuerpo en concreto reforzado de 28 mpa barra ø5/8"@15 cm para pozo de inspección h<3 e= 0.20 m ø=1.2m interno y ø=1.6m externo , incluye peldaño barra ø3/4 cada 30 cm. diámetro de la tubería conectada de 200 a 500 mm y corona reforzada en concreto de 28 mpa barra 5/8" @10 cm de ø=1.6 m e=0.2 m para pozo de inspección h<3, incluye tapa y aro.



TAPA POZO

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION

1. SE RECOMENDO MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PMT, PRESENTA DEFICIENCIA EN TEMA DE SEÑALIZACIONES.
2. SE SOLICITO VERIFICAR DIARIAMENTE QUE EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO TENGAS LOS EPP COMPLETOS.
3. SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE OBRA MANTERNER LA PROGRAMACION IMPRESA.
4. IMPLEMENTAR EL PAGA YA QUE SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO AL 100%.
6. SE DEBE INSTALAR VALLAS INFORMATIVA, LA COMUNIDAD NO SABE QUIEN ESTA EJECUTANDO LA OBRA.
7. SE RECOMIENDA ABRIR MAS FRENTES DE TRABAJO.
8. INFORMAR SOBRE LOS PERMISOS AMBEINTALES, EN QUE ESTADO SE ENCUENTRAN.
9. REALIZAR RECORRIDO GENERAL SOBRE EL AREA A INTERVENIR PARA IDENTIFICAR SI EL CONTRATO PRESENTARA MODIFICACIONES EN CANTIDADES MAYORES O MENORES.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS

APOYO A LA SUPERVISION

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

INFORME DE SUPERVISION

NUM. CONSECUTIVO DEL INFORME: 2

FECHA DE ELABORACION: 6 / 7 / 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	18 de mayo de 2023	Y EL	18 de junio de 2023
OBJETO	"MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA AVENIDA "FRANCISCO EL HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"				
LOCALIZACIÓN	DISTRITO DE RIOHACHA ENTRE CALLE 15 Y LA CALLE 33 SOBRE LA CARRERA 7H "AVENIDA FRANCISCO EL HOMBRE"				

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	587 DE 2022	CONTRATO No.:	240 DE 2023
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA	CONTRATISTA:	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE
PLAZO INICIAL:		PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2023
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
VALOR INICIAL :	$ 14.961.100.754,54	VALOR INICIAL :	$ 1.084.668.634,00
ANTICIPO PACTADO :	N/A	ANTICIPO PACTADO :	N/A
VALOR ADICION(ES):	N/A	VALOR ADICION(ES):	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A	VALOR ACTUALIZADO:	N/A
VALOR PAGADO:	$ 2.244.165.113,18	VALOR PAGADO:	N/A
VALOR POR PAGAR:	$ 12.716.935.641,36	VALOR POR PAGAR:	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
CUMPLIMIENTO	18/04/2023	16/09/2024	$ 1.496.110.075,45	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/04/2023	18/06/2024	$ 108.466.863,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	18/04/2023	18/05/2024	$ 2.244.165.113,18	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/04/2023	18/02/2027	$ 54.233.431,70
PRESTACIONES SOCIALES	18/04/2023	19/05/2027	$ 748.055.037,73	CALIDAD DE SERVICIO	18/02/2024	18/02/2029	$ 108.466.863,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/05/2024	19/05/2029	$ 1.496.110.075,45				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/04/2023	18/05/2024	$ 1.496.110.075,40				

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo Pactado (15%)	17/05/2023	$ 2.244.165.113,18			


AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - OBRA	AMORTIZACION DE PAGOS REALIZADOS - INTERVENTORIA



ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

4. CURVA "S"

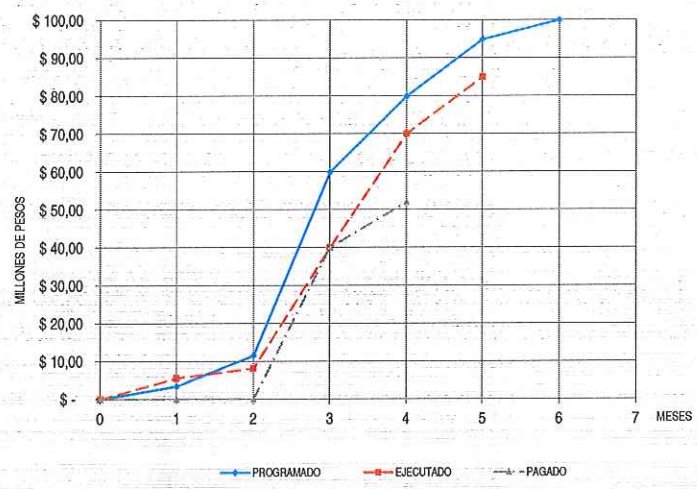


PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. RELACION DE HITOS (AVANCE)

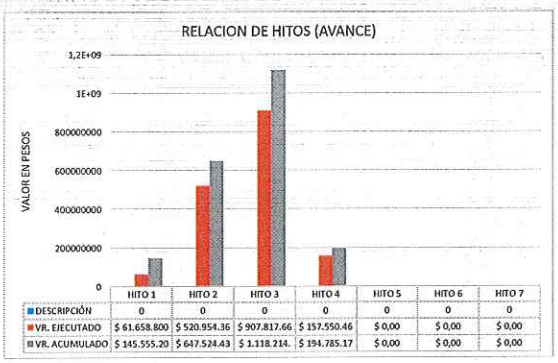

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6	HITO 7
DESCRIPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
VR. EJECUTADO	$ 61.658.800	$ 520.954.36	$ 907.817.66	$ 157.550.46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VR. ACUMULADO	$ 145.555.20	$ 647.524.43	$ 1.118.214.	$ 194.785.17	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

4. GESTION AMBIENTAL

FUENTE MATERIALES

UBICACIÓN

SITIO LLAMADO "LAGUNETA"

BOTADEROS:	SI		NO	X	NA	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	NA	
PERMISO TALA:	SI		NO	X	NA	
ESCOMBRERAS:	SI	X	NO		NA	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	NA	
EMISIONES:	SI		NO	X	NA	

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA MANETER INFORMADO AL SUPERVISOR SOBRE LOS MATERIALES SOBRANTES Y SUS DISPOSICION FINAL Y ENVIAR LA DIRECCION DEL SITIO.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se han realizado actas modificiatorias, no se han identificado mayores o menores cantidades de obras

6. GESTION SEGURIDAD INDUSTRIAL

Control de Seguridad Industrial	Actividades Realizadas	
1. Durante semana se realiza seguimiento e inspección en obra evidenciando el lavado de mano cinco veces al día, insumos de desinfección tales como jabones líquidos, gel antibacterial, alcohol al 70%, entre otros, stop de EPP, distanciamiento social. Desinfección de calzados, desinfección de materiales con hipoclorito de sodio con bomba de aspersión en vehículos que ingresan a obra. Desinfección de áreas como: almacén, vestier, oficinas, área de salud y espacios comunes, por parte de la Interventoría. Ante el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y cumplimiento a las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Para la prevención, mitigación del Covid - 19. 2. Se realiza aprobación por parte de la interventoría de 45 trabajadores a obra. 3. Contratista realiza envío de formatos de entrega de EPP al personal a la interventoría. 4. Se realiza recorrido en obra en compañía de la Interventoría y se evidencia el uso de EPP . 5. A la fecha NO se reportan casos positivos para Covid - 19 en obra. 6. Las temperaturas están en el rango normal entre 37 – 39 C.	**De medida Preventiva**	Las Charlas y otros: 1. Cerramiento como proteccion a la comunidad y al trafico vehicular. 2. Se realizaron encuesta de sintomatología al personal que labora en obra. 4. Se envian por parte del Coordinador HSEQ del contratista UT VIAS GEO PAZ RIOHACHA, reporte de las actividades implementadas en obra del PAPSO y reporte de novedades del día.
	Actividades de Higiene y Seguridad Industrial	La limpieza de baños y oficinas se continúa ejecutando al menos dos veces por semana La interventoría se acoge a las medidas establecidas en el PAPSO del contratista en obra, e implementa medidas de bioseguridad propias del consorcio CID, como son; encuesta digital de sintomatología y bitácora de recorridos. Sin novedad hasta la fecha. Se observa lavado de Baños con frecuencia diaria
*Se deberá Anexar los listados de entrada y Salida del Personal	**Ingreso Personal** 07:00a.m	**Salida Personal** 05:00p.m

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N A (No aplica).

ALCALDÍA DE RIOHACHA | RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

6. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	45	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	6	OBSERVACIONES
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	33	No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:	2	- La trabajadora Social del contratista se comunicó 26 de Agosto del 2020 que concertaría con el rector de la institución el Señor Jhon Alex Córdoba una fecha para realizar la socialización del 50% del avance de obra.
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1	- Se verificó el Buzón de Sugerencia y esta semana no se encontraron PQRS por parte de la comunidad ni de los trabajadores.
		SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
		SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	1	
		VISITAS- ACTAS DE VECINDAD	55	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION Y REPLANTEO



DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS: RETROEXCAVADORA TIPO PAJARITA Y MINI CARGADOR CON MARTILLO





RETIRO DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA 320 Y LIMPIEZA DE LA SUBRASANTE CON EL EQUIPO MOTONIVELADORA.





EXTENSIÓN DE MATERIAL DE SUB BASE TIPO INVIAS CON EL EQUIPO MOTONIVELADORA.






HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y TOMA DE DENSIDADES EN LA CAPA DE SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS.




EXTENSIÓN DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO TIPO INVIAS CON EQUIPO MOTONIVELADORA, COMPACTACIÓN Y TOMA DE DENSIDADES..


ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos



MEZCLA DE CONCRETO PRE MEZCLADO EN PLANTA PARA COLOCACIÓN EN SITIO CON EQUIPO TIPO MIXER, VIBRADO ALLANADO, TEXTURIZADO Y CURADO CON ANTISOL, PAVIMENTO EN CONCRETO E=0.25 MT Y MR=4.2 MPA.





CORTE Y DILATACIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO Y SELLO DE JUNTAS EN CORDÓN DE POLIURETANO CON SELLO DE SILICONA.

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION

1. SE RECOMENDO MEJORAR LA IMPLEMENTACION DEL PMT. PRESENTA DEFICIENCIA EN TEMA DE SEÑALIZACIONES.
2. SE SOLICITO VERIFICAR DIARIAMENTE QUE EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO TENGAS LOS EPP COMPLETOS.
3. SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE OBRA MANTERNER LA PROGRAMACION IMPRESA.
4. IMPLEMENTAR EL PAGA YA QUE SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO AL 100%.
6. SE DEBE INSTALAR VALLAS INFORMATIVA. LA COMUNIDAD NO SABE QUIEN ESTA EJECUTANDO LA OBRA.
7. SE RECOMIENDA ABRIR MAS FRENTES DE TRABAJO.
8. INFORMAR SOBRE LOS PERMISOS AMBEINTALES. EN QUE ESTADO SE ENCUENTRAN.
9. REALIZAR RECORRIDO GENERAL SOBRE EL AREA A INTERVENIR PARA IDENTIFICAR SI EL CONTRATO PRESENTARA MODIFICACIONES EN CANTIDADES MAYORES O MENORES.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS

APOYO A LA SUPERVISION
