AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PE-F02-1-13	
		FECHA 18/05/2022	VERSIÓN 1
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Página 1 de 1	

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Nelly Gómez Llanez			IDENTIFICACIÓN	1093735129
NÚMERO DEL CONTRATO:	064	FECHA DEL CONTRATO:	16/01/2023	DEPENDENCIA	Subdirector de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE LIDERA LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.				
SUPERVISOR:	ING ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO				

FECHA DE INFORME:	14/07/2023	PERIODO DEL INFORME DESDE	16/06/2023	HASTA	15/07/2023

VALOR MES COBRADO	4.000.000,00	PAGO NO.	06	DE	9	% DE AVANCE	55,56%


No DE PLANILLA APORTES	7885086197	PERIODO PAGADO	Junio/2023


RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

ACTIVIDAD: 1. Realizar visitas técnicas a los predios y sitios dispuesto para el desarrollo de los proyectos que adelanta la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

Realizar visitas técnicas del contrato 09/2021, baterías sanitarias.

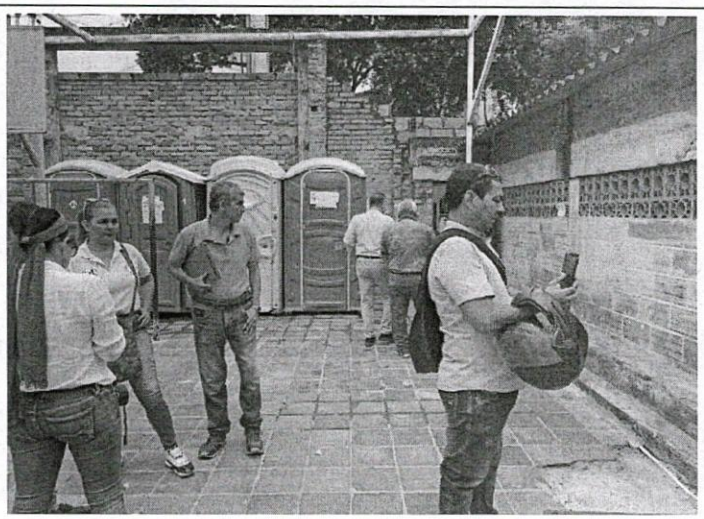

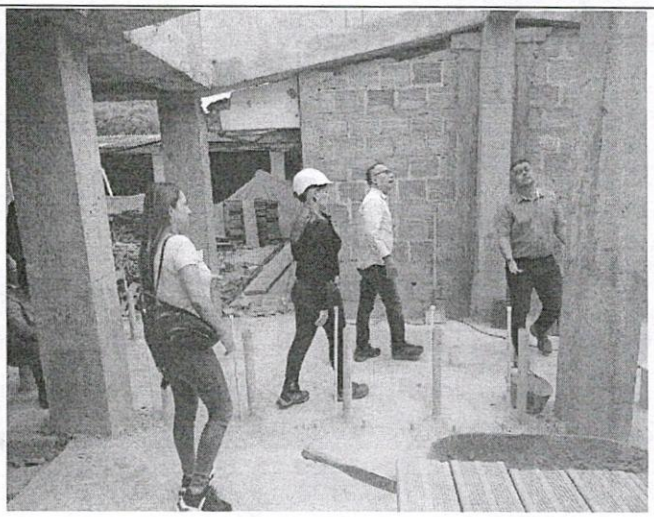

ACTIVIDAD: 2. Realizar acompañamiento a la subdirección de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura en la supervisión de las obras que adelante esta dependencia.

Se realizan oficios e informes de supervisión para proyectos del contrato 09/2021.

- Informe de supervisión parcial 8 del contrato de obra No 09/2021- BATERIA SANITARIAS.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta

CONTRATO DE OBRA N° 009 DE 2021 (8 DE OCTUBRE DE 2021)

INFORME DE SUPERVISION

Fecha del Informe:	desde:	Hasta:	Valor presente acta:	Valor acumulado:	% Ejecución
11/05/2023	27/04/2023	30/05/2023	$ 726.395.808,00	$ 4.115.934.420,00	74,88%

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

Contratista	CONSORCIO EDUSANITARIAS NDS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA

Contrato Obra N°:	09-2021	Fecha de suscripción:	8 DE OCTUBRE DE 2021	N° CDP:	289	Fecha:	28/06/2021
Valor	5.496.744.577	Fecha de iniciación:	10 DICIEMBRE de 2021	N° RP:	478	Fecha:	3/11/2021
Adicional:	0	Fecha de vencimiento:	28 JUNIO DE 2023				
Valor Final:	5.496.744.577	Fecha de Suspensión:	N/A	Rubro Pres.	3510308		
Plazo:	10	Fecha de Reinicio:	N/A		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1486-2021		
Adición en Plazo	8 meses, 20 días	Fecha recibe Parcial No 8:	junio 08 de 2023				
Plazo Final:	18 meses 20 días						

INFORMACIÓN SUPERVISION

Supervisor:	ING. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO	Cargo	Subdirector de planeacion, ordenamiento Territorial e Infraestructura

INFORMACION OBLIGACIONES: PARAFISCALES, SENA, ETC

PLANILLA:	9450891580	FECHA:	15/05/2023	PLANILLA:		FECHA:		SENA - FIC
SALUD:	$ 1.754.800,00	Periodo:	mayo	SALUD:		Periodo:		
PENSION:	$ 6.830.500,00		abril	PENSION:				
ARP:	$ 3.054.000,00			ARP:				
CCF:	$ 1.754.800,00			CCF:				
PLANILLA:		FECHA:		PLANILLA:		FECHA:		

INFORMACION OBLIGACIONES: PARAFISCALES, SENA, ETC

PLANILLA:	9450891580	FECHA:	15/05/2023	PLANILLA:		FECHA:		SENA - FIC
SALUD:	$ 1.754.800,00	Periodo:	mayo	SALUD:		Periodo:		
PENSION:	$ 6.830.500,00		abril	PENSION:				
ARP:	$ 3.054.000,00			ARP:				
CCF:	$ 1.754.800,00			CCF:				
PLANILLA:		FECHA:		PLANILLA:		FECHA:		
SALUD:		Periodo:		SALUD:		Periodo:		
PENSION:				PENSION:				
ARP:				ARP:				
CCF:				CCF:				

Página 1

INFORMACIÓN DE GARANTIAS

INFORMACION GARANTIAS CONTRATO OBRA

Aseguradora	N°		Fecha
HDI SEGUROS S.A	4001007 - 4005348		22/12/2022
Amparo	**DESDE**	**HASTA**	**VR.ASEGURADO**
Cumplimiento	10/12/2021	30/12/2023	549.674.457,70
Pago de salario y prestaciones sociales	10/12/2021	30/06/2026	1.099.348.915,40
estabilidad de la obra	12/11/2021	12/11/2026	1.649.023.373,10
CALIDAD DE ELABORACION, REVISION AJUSTE,ACTUALIZACION,MODIFICACION COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	12/11/2021	12/11/2026	54.000.000,00
buen manejo y correcta inversion del anticipo	10/12/2021	30/06/2023	1.099.348.915,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/11/2021	30/12/2023	464.000.000,00

CERTIFICADO DE ENTREGA

Con el fin de dar constancia del presente documentos , por parte del Contratista y el recibo satisfacción por parte del Área Metropolitana de Cúcuta.

ING. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO, SUPERVISOR

DIRECTOR DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTU

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA

OPS		Pago N°	8	Factura N°	FEV - 10	Persona Natural:	X	común		Simplif.	
CONTRATO	X					Persona Jurídica:				Gran Contribuyente	
RESOLUCIÓN		CDP:	289	Fecha :	11/06/2021	Autoretenedor				Ent. sin animo de lucro	
FACTURA	X					Actividad IICA- Código CIIU:					
CONVENIO		RP:	478	Fecha :	3/11/2021	Tarifa:					

Se ha verificado esta información en el RUT: SI [ ] NO [X]

A Nombre de: CONSORCIO EDUSANITARIAS NDS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA — Identificación: NIT 901525293-6

Dirección: CCBOLIVAR LC 14BRR SAN LUIS — Telefono: 5956578

Anexa certificación: x

Entidad Bancaria: DAVIVIENDA

numero de cuenta: 007700871267

Ahorros [X] Corriente. [ ]

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor Inicial	5.496.744.577	Vr. Pagado	3.389.538.612,0
Vr. Adicional	0	Vr. Apagar:	726.395.808,0
Vr. Total final:	5.496.744.577	Acumulado	4.115.934.420,0
		vr. Contrato no ejecutado	1.380.810.157,00

C.E.: [ ] Fecha [ ]

ANEXOS Y CHEQUEO


	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL	X		FACTURA	X		PORCENTAJE AVANCE	X	
BALANCE DE OBRA			PAGOS PARAFISCALES	X		INFORME IMPREVISTO		X
MEMORIA DE CANTIDADES	X		PAGO FIC			PLANOS		X
INFORME CONTRATISTA	X		CERTIFICACION DE LA CUENTA	X				


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A los (08) dias del mes de junio de 2023 se suscribe el acta de recibo parcial No.8 segun el informe de cumplimiento de interventoria anexas que hacen parte integral de este informe, donde se a realizado seguimiento por parte de la supervision del AMC al avance en la ejecución de obra.


REGISTRO FOTOGRÁFICO


AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

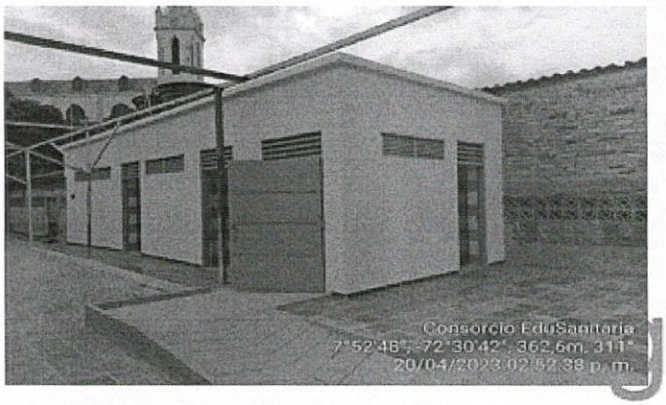


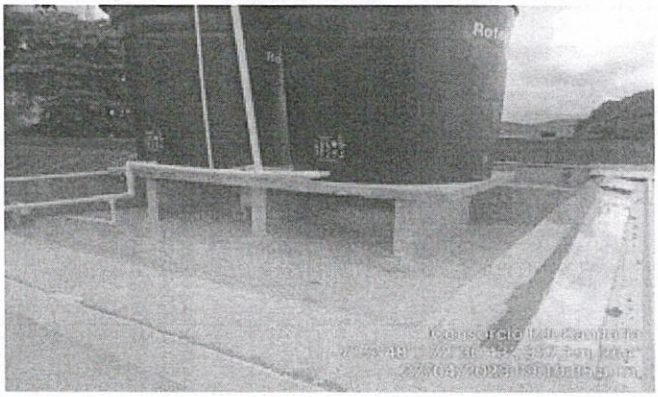





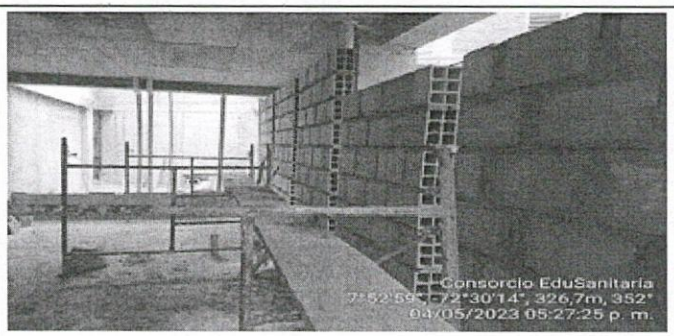


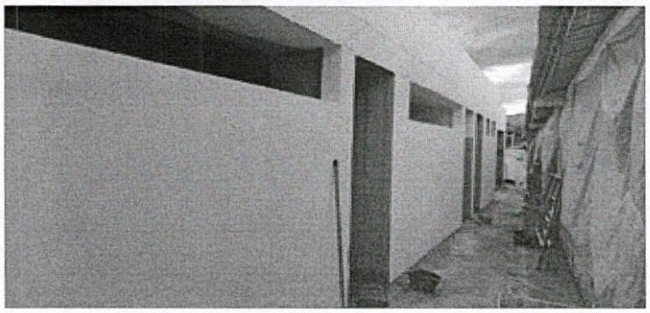


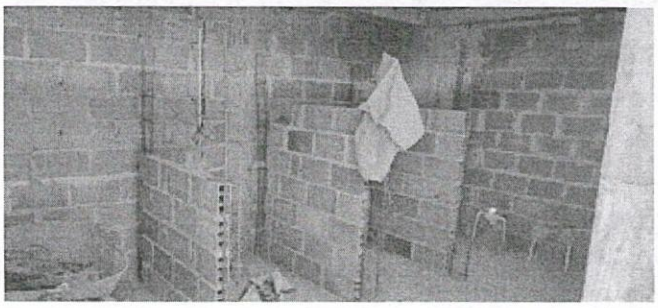


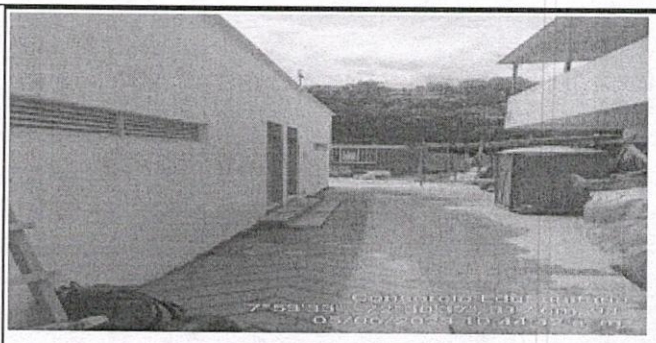


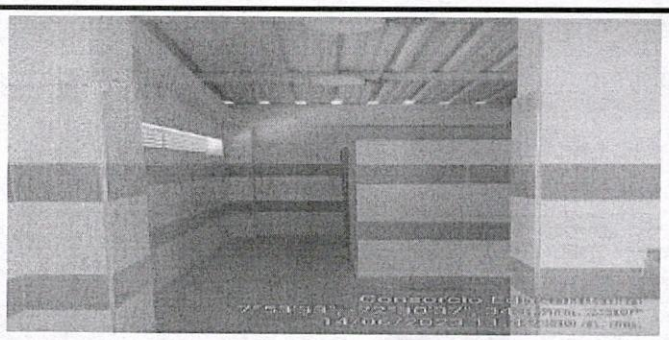


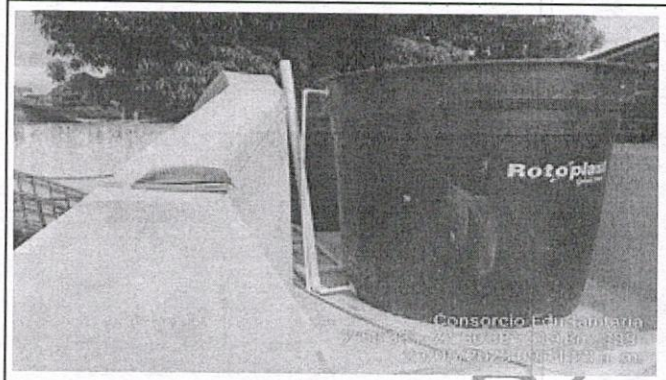

Rotoplas

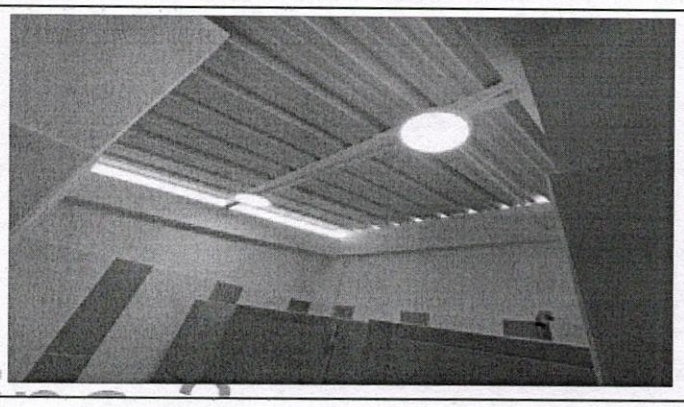

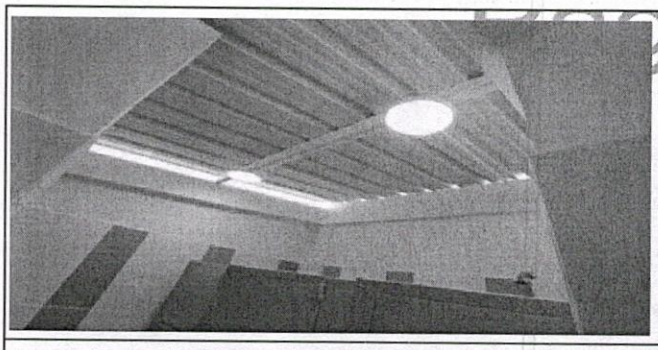

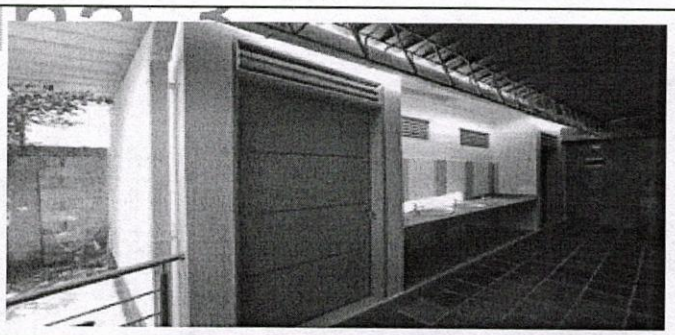

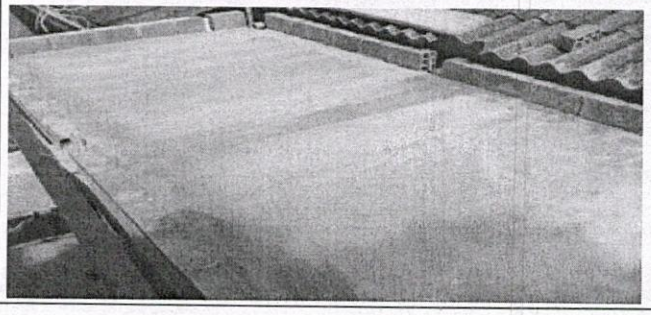

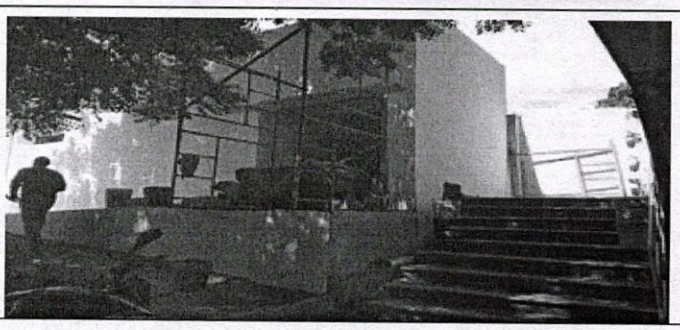

- Informe de la cuenta parcial No 08 de contrato de obra 09/2021 BATERIAS SANITARIAS.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

INFORME DE SUPERVISION ACTA RECIBO PARCIAL No.8 DEL CONTRATO DE OBRA No. 009-2021 (DICIEMBRE 06 DE 2021)

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

OBJETO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	CONSORCIO SOLIDARITARIA NOS 21, ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
IDENTIFICACION	88.226.834
NIT	901.525.293-3
VALOR	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.496.744.577 00).
PLAZO INICIAL	Diez (10) meses contados a partir de suscripcion acta de inicio
PRORROGA No. 1	Dos (02) meses y Veinte (20) dias (Otro si No. 04 de 22 de septiembre de 2022)
PRORROGA No 2	5 meses (otro si No 05 de 6 de diciembre de 2022)
PRORROGA No 3	3 meses (Otro si No 06 de 16 de marzo de 2023)
PLAZO TOTAL	Diesiocho (18) meses y 20 dias.
F. DE PAGO	El contrato se pagara de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU, y todos los costos directos e indirectos necesario para cumplir con el objeto del contrato lo cancelara EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA de la siguiente Forma: a) Anticipo. Se entregara un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato una vez suscrito y legalizado el mismo, previa firma del acta de inicio de obra y aprobación del Plan de Inversión del Anticipo y el otorgamiento y aprobación de la garantía correspondiente por parte del Área Metropolitana de Cúcuta. Para efecto del manejo de los recursos que se reciba a título de anticipo en virtud de lo consagrado en la Ley 1474 de 2.011, artículo 91 y con el fin de garantizar que los mismos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: a) El anticipo se trasmitara previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. b) la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. C) la entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversión del anticipo. D) para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficio sea el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, el cual será vigilado por el interventor. Por consiguiente, ningún caso, o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velara así porque toda desembolso del Anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. E) El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el contratista. El contratista presentara la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previo del interventor. F) Los rendimientos financieros que generen el Anticipo entregado por la Entidad será reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimiento financieros del Anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligación. G) al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presenten excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. H) El contratista presentara una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER BATERIAS NI, LIDA SHIRLEY PARRA GARCIA
SUPERVISOR	Subdirector de Planeacion Ordenamiento Territorial e Infraestructura.
C. P.:	CC 239 981 28 de junio de 2021.
R. P.:	CC 476 040 03 de noviembre de 2021.
RUBRO:	C3510305 convenio interadministrativo 1404-2021 AMC –Municipio de Cúcuta.
FECHA INICIO	Diciembre 10 de 2021.
FECHA TERMINACION	Junio 28 de 2022.

2. DESCRIPCIÓN DEL INFORME

Este documento contiene información correspondiente al informe de supervisión ejercido por la subdirección de planeación, ordenamiento Territorial e Infraestructura del AMC, al contrato de Obra No.09 de 2021 referente al acta de recibo Parcial de Obra N°08

3. LOCALIZACION DE LAS SEDES INTERVENDIDAS SEGÚN ACTA PARCIAL No.8

N	COLEGIO	SEDE	DIRECCION
1	COLEGIO EDUARDO NIVIA MALDONADO	ESC. URB #4 DEPARTAMENTO	AV 14 # 15-15 B. EL CONTENTO
2	COLEGIO PADRE ISRAEL GARCIA HERRERO	PRINCIPAL	CLL 7 NO 14-40 BARRIO LEON DE GIRALDA
3	COLEGIO RAFAEL GARCIA HERRERO	ESC URB 20 DE FEBRERO NO 21	CLL 5 NO 12-10 BARRIO LEON DE GIRALDA
4	COLEGIO GABRIEL ANTONIO SCHMALZLE BOSCH	ESCUELA NUEVE MANZANA No 16	AV 10 No. 2-21 BARRIO CAILLON
5	COLEGIO GABRIEL ANTONIO SCHMALZLE BOSCH	COLEGIO BASICO LOS ALISOS	TRANSVERSAL 17 CALLE 2 Y 3 BARRIO CAMPIN
6	COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA	ESC URBANA ANTONIO BARA CLARET No. 20	MANZANA TOLUTE 11 ETAPA 2 BARRIO CLARET

4. GARANTIAS DE LA CONSULTORIA

4.1 GARANTIAS CONTRATO

IDENTIFICACION DE LA POLIZA					
AMPARO EXIGIDO	VIGENCIA DEL AMPARO		VALOR ASEGURADO	DICTAMEN REVISION	
	DESDE	HASTA		Aprobada	No aprobada
CUMPLIMIENTO	10/12/2021	30/12/2023	$649 674.457,79	[X]	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	10/12/2021	30/05/2026	$1.099.348.91 5,40	[X]	
ESTABILIDAD Y CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/11/2021	12/11/2026	$1.649.023.37 3,10	[X]	
CALIDAD DE ELABORACION, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	12/11/2021	12/11/2026	$54.000.000,0 0	[X]	
MANEJO DEL ANTICIPO	10/12/2021	30/05/2023	$1.099.348.91 5,40	[X]	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
AMPARO EXIGIDO	VIGENCIA DEL AMPARO		VALOR ASEGURADO	DICTAMEN REVISION	
	DESDE	HASTA		Aprobada	No aprobada
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/11/2021	30/12/2023	$464.000.000	[X]	
OBSERVACIONES	La garantía presentada corresponde a la poliza única de cumplimiento N°4205348 Anexo 8 y Póliza de seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 40010007 Anexo 3 expedida por HDI SEGUROS S.A del 23 de marzo 2023 está acorde con lo estipulado en la Cláusula Decima del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 de 2021 y de acuerdo con el OTRO SI No. 06 al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009 de 2021 de fecha 16 de marzo del 2023.				
FECHA EXPEDICION INICIAL POLIZA	Noviembre 30 DE 2021				
FECHA EXPEDICION DE LA MODIFICACION	Marzo 23 DE 2023				
FECHA APROBACION:	Marzo 23 DE 2023				

5 RELACION DE ACTAS SUSCRITAS EN EL CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE ACTA	FECHA	OBJETO DE REUNION
1	10 de diciembre de 2021	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA NO. 9
-	12 de noviembre de 2021	OTRO SI No.01
-	15 de febrero de 2022	OTRO SI No.02
2	8 de junio de 2022	ACTA No 02 DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS NO 01
3	15 de junio de 2022	ACTA No.03 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.01
4	13 de agosto de 2022	RECIBO PARCIAL NO. 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS FASE II
-	15 de junio de 2022	OTRO SI No.04
5	15 de septiembre de 2022	ACTA No.06 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.02
6	16 de septiembre de 2022	ACTA N°05 RECIBO PARCIAL N°1
-	22 de septiembre de 2022	OTRO SI No.04
7	20 de octubre de 2022	ACTA N°07 RECIBO PARCIAL N°2
8	06 de diciembre de 2022	ACTA No 08 DE APROBACION DE ITEMS NO PREVISTO No 02.
-	02 de Diciembre de 2022	OTRO SI No 05
9	06 de diciembre de 2022	ACTA No06 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 03.
10	22 de diciembre de 2022	ACTA No10 DE RECIBO PARCIAL No 03.
11	06 de febrero de 2023	ACTA No 11 DE RECIBO PARCIAL No 04.
-	15 de marzo de 2023	OTRO SI No 06
12	15 de marzo de 2023	ACTA No 12 DE APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS No 3
13	15 de marzo de 2023	ACTA No 13 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 4.
14	23 de marzo de 2023	ACTA No 14 DE RECIBO PARCIAL No 05.
15	30 de marzo de 2023	ACTA No 15 DE RECIBO PARCIAL No 6
16	26 de abril de 2023	ACTA No 16 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 05.
17	03 de mayo de 2023	ACTA No 17 DE RECIBO PARCIAL No 7
18	02 de junio de 2023	ACTA No 18 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 05
19	08 de junio de 2023	ACTA No 19 DE RECIBO PARCIAL No 08.

6 PAGOS REALIZADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

PAGOS REALIZADOS	ORDEN DE PAGO No	VALOR TOTAL DEL ACTA
Anticipo	OP 000004 $ 1.099.348.914,40	
Acta de recibo ajustes		$ 140 508.708

Estudios y diseños	OP 001218 (18/10/2022)	$ 294.434.023
Acta recibo parcial No.1	OP 001405 (23/11/2022)	$ 245.644.447
Acta recibo parcial No.2	OP 000102 (29/12/2022)	$ 334.715.743,00
Acta recibo parcial No 3	OP 00000771 (14/02/2023)	$ 583.587.343,00
Acta recibo parcial No 4	OP 000229 (27/03/23)	$ 869.904.853,00
Acta recibo parcial No 5	OP 000314 (17/04/2023)	$ 508.471.828,00
Acta recibo parcial No 6	OP 000423 (12/05/2023)	$ 611.881.882,00
Acta de recibo parcial No 7	OP 000595-R (04/07/23)	$ 725.385.808,00
Acta de recibo parcial No 08		$ 41.434.812,00
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		$ 4.115.934.420,00

7 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA


VALOR INICIAL	$ 5.496.744.577
VALOR TOTAL DE PAGO	$ 4.115.934.420,00
VALOR A RETENER DESTINO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES POR IDC INFERIOR AL DE LEY (U OTRO CONCEPTO -SI HAY LUGAR A ELLO)	$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1.380.810.157,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00
SUMAS IGUALES	$ ------

Porcentaje de ejecución financiera: 74,88 %


8 REGISTRO FOTOGRAFICO


Mediante el siguiente registro fotográfico se refleja cada una de las actividades ejecutadas en y el avance a la fecha en la etapa de construcción consignada en el acta de recibo parcial No.8.

COLEGIO RAFAEL GARCIA HERREROS – SEDE PRINCIPAL

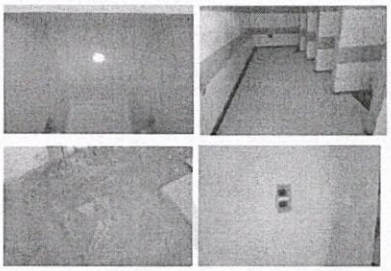



COLEGIO PRESBITERO DANIEL JORDAN






COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA – CLARET # 50

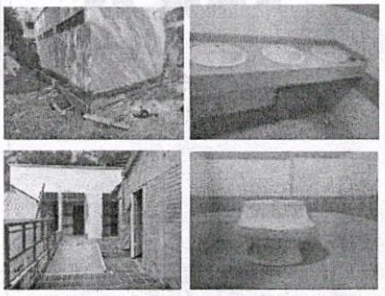




COLEGIO MANUEL FERNANDEZ NOVOA – SEDE 2

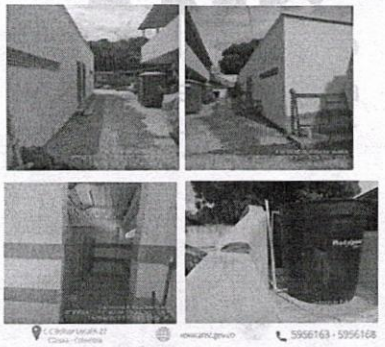


COLEGIO SAN JOSE DE CUCUTA-SEDE LA CABRERA



COLEGIO SAN JOSE DE CUCUTA-SEDE PRINCIPAL

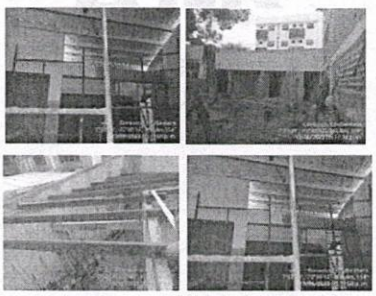

COLEGIO GREMIOS UNIDOS-SEDE 18 DE MAYO

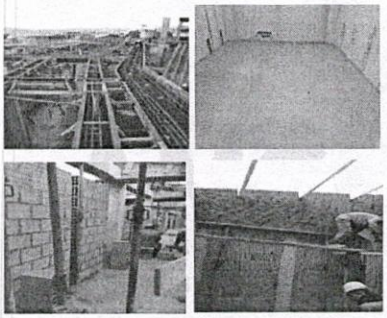

10. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Se anexa los informes semanales de supervision del contrato de Obra No.09 de 2021 desde el 27 de abril de 2023 hasta el 30 de mayo de 2023, los cuales hacen parte integral de este informe.

10. CRONOGRAMA

Código BPIN	Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
2021540010043	Construcción y/o Reparación Baterías Sanitarias Instituciones Educativas en el municipio de Cúcuta		
	Solicitud de disponibilidad (Alcaldía)	28-abr-21	03-may-21
	Estudios Previos Firma de Convenio (Alcaldía-AMC)	10-may-21	26-may-21
	Firma de Convenio (Alcaldía- AMC)	26-may-21	26-may-22
	Firma de Acta de Inicio (Alcaldía- AMC)	16-jun-21	31-dic-22
	Expedición Cuarto Borrador para revisiones Convenio (AMC)	03-jun-21	03-jun-21
	Pago Desarrollos de apoyo Proyectos BAPM (AMC)	04-jun-21	04-jun-21
	Cotizaciones por parte de Alcaldía	28-jun-21	05-ago-21
	Incorporación de Recursos (AMC)	17-jun-21	17-jun-21
	Solicitud y Disponibilidad Presupuestal (AMC)	25-jun-21	28-jun-21
	Publicación de estudios Previos y Pliegos de Contrato de Obra (AMC)	29-jun-21	29-jun-21
	Publicación de estudios Previos y Pliegos de Contrato de Interventoría (AMC)	29-jun-21	29-jun-21
	Publicación de Pliegos Definitivos de Contrato de Obra (AMC)	30-jun-21	30-jun-21
	Publicación de Pliegos Definitivos de Contrato de Interventoría (AMC)	27-jul-21	05-ago-21
	Entrega de Propuestas y Evaluación Contrato de Obra (AMC)	31-ago-21	07-sep-21
	Entrega de Propuestas y Evaluación de Contrato de Interventoría (AMC)	06-sep-21	10-sep-21
	Firma de Contrato, Aprobación de Pólizas y Acta de Inicio de Contrato de Obra e Interventoría (AMC)	15-sep-21	30-sep-21
	Socialización de proyecto ante Comunidad (Alcaldía - AMC)	31-ago-21	31-sep-21
	Plegs Contratual Construcción (AMC)	23-sep-21	31-ene-22
	Ejecución de Obra e Interventoría (AMC)	23-dic-22	22-may-22
	Liquidación de Convenio (Alcaldía - AMC)	01-jun-23	30-jun-23

XI. CONCLUSIONES

- El contrato de obra tiene un avance de ejecución a la fecha de fecha de 58 %
- Un porcentaje de ejecución financiera del 74,86 %

ACTIVIDAD: 3. Apoyar a la subdirección de planeación ordenamiento territorial e infraestructura en la respuesta de correspondencia solicitudes y peticiones radicadas en l subdirección ene l marco del desarrollo de las obras.

- Oficios realizados para el convenio 1404/2021 Contrato 09/2021.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

ACTA No.018 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.6
CONTRATO OBRA PUBLICA No 009-2021 (OCTUBRE 08 DE 2021)

1. **Generalidades del Contrato.**

OBJETO	"CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"
CONTRATISTA	CONSORICO EDUSANITARIA NDS R/L ALVARO RAMIREZ MORA
IDENTIFICACION	88.226.824 DE Cúcuta.
NIT	901.525.293-3
VALOR	($5.496.744.577) CINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
PLAZO	Diez (10) meses contados a partir de suscripción acta inicio
PRORROGA No.1	2 meses y 20 dias (otro si No.04 de 22 de septiembre de 2022)
PRORROGA No.2	3 meses (Otro Si No.05 del 06 de diciembre de 2022)
PRORROGA No.3	3 meses (otro si No.06 de 16 de Marzo de 2023)
PLAZO TOTAL	Dieciocho meses y 20 días
F. DE PAGO	El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la Entidad: El contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU, y todos los costos directos e indirectos necesario para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA de la siguiente Forma: **a) Anticipo**. Se entregará un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato una vez suscrito y legalizado el mismo, previa firma del acta de inicio de obra y aprobación del Plan de Inversión del Anticipo y el otorgamiento y aprobación de la garantía correspondiente por parte del Área Metropolitana de Cúcuta. Para efecto del manejo de los recursos que se reciba a título de anticipo en virtud de lo consagrado en la Ley 1474 de 2.011, articulo 91 y con el fin de garantizar que los mismos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: a) El anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. b) la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

ACTA No.19 DE RECIBO PARCIAL N°08
CONTRATO DE OBRA No.009-2021 (OCTUBRE 08 DE 2021)

1. Generalidades del contrato.

OBJETO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUSANITARIA NDS R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
IDENTIFICACION	88.226.824
NIT	901.525.293-3
VALOR	CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MDA/CTE ($5.496.744.577,00)
PLAZO INICIAL	Diez (10) meses contados a partir de suscripción acta de inicio
PRORROGA No.1	2 meses y 20 dias (otro si No.04 de 22 de septiembre de 2022)
PRORROGA No.2	3 meses (otro si No.05 de 6 de diciembre de 2022)
PRORROGA No.3	3 meses (otro si No.06 de 16 de Marzo de 2023)
PLAZO TOTAL	Dieciocho meses y 20 dias
	El contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU, y todos los costos directos e indirectos necesario para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA de la siguiente Forma: a) Anticipo. Se entregará un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato una vez suscrito y legalizado el mismo, previa firma del acta de inicio de obra y aprobación del Plan de Inversión del Anticipo y el otorgamiento y aprobación de la garantía correspondiente por parte del Área Metropolitana de Cúcuta. Para efecto del manejo de los recursos que se reciba a título de anticipo en virtud de lo consagrado en la Ley 1474 de 2.011, articulo 91 y con el fin de garantizar que los mismos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: a) El anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantias exigidas en el Proceso de Contratación. b) la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

ACTA N° 20 DE APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTO N.04
CONTRATO DE OBRA No.009-2021 (OCTUBRE 08 DE 2021)

1. Generalidades del contrato.

OBJETO	"CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"
CONTRATISTA	CONSORICO EDUSANITARIA NDS R/L ALVARO RAMIREZ MORA
IDENTIFICACION	88.226.824 DE Cúcuta.
NIT	901.525.293-3
VALOR	($5.496.744.577) CINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
PLAZO	Diez (10) meses contados a partir de suscripción acta inicio
PRORROGA No.1	2 meses y 20 dias (otro si No.04 de 22 de septiembre de 2022)
PRORROGA No.2	3 meses (Otro Si No.05 del 06 de diciembre de 2022)
PRORROGA No.3	3 meses (otro si No.06 de 16 de Marzo de 2023)
PLAZO TOTAL	Dieciocho meses y 20 dias
	El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la Entidad: El contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU, y todos los costos directos e indirectos necesario para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA de la siguiente Forma: **a) Anticipo.** Se entregará un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato una vez suscrito y legalizado el mismo, previa firma del acta de inicio de obra y aprobación del Plan de Inversión del Anticipo y el otorgamiento y aprobación de la garantia correspondiente por parte del Área Metropolitana de Cúcuta. Para efecto del manejo de los recursos que se reciba a título de anticipo en virtud de lo consagrado en la Ley 1474 de 2.011, articulo 91 y con el fin de garantizar que los mismos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. La entidad

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

ACTA No.21 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.7
CONTRATO OBRA PUBLICA No 009-2021 (OCTUBRE 08 DE 2021)

1. **Generalidades del Contrato.**

OBJETO	"CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICPIO DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"
CONTRATISTA	CONSORICO EDUSANITARIA NDS R/L ALVARO RAMIREZ MORA
IDENTIFICACION	88.226.824 DE Cúcuta.
NIT	901.525.293-3
VALOR	($5.496.744.577) CINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
PLAZO	Diez (10) meses contados a partir de suscripción acta inicio
PRORROGA No.1	2 meses y 20 días (otro si No.04 de 22 de septiembre de 2022)
PRORROGA No.2	3 meses (Otro Si No.05 del 06 de diciembre de 2022)
PRORROGA No.3	3 meses (otro si No.06 de 16 de Marzo de 2023)
PRORROGA No.4	1 mes y 15 días (otro si No.07 de 27 de junio de 2023)
PLAZO TOTAL	Veinte (20) meses y 05 días
	El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU y todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del contrato lo cancelará la Entidad: El contrato se pagará de la siguiente forma: El valor total de este contrato incluido el IVA, AIU, y todos los costos directos e indirectos necesario para cumplir con el objeto del contrato

ACTIVIDAD: 4. Asistir a las reuniones y comités que se programen para el buen desarrollo del objeto del contrato.

- se realizan reuniones para el desarrollo y socialización de los convenios que se están llevando a cabo en la entidad.

Actas de comité del contrato 09 de 2021- convenio 1404/2021.

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ACTA DE COMITÉ Y REUNIÓN

TEMA: REVISIÓN DE BALANCE DE OBRA PARA ACTA DE MAYORES Y MENORES #6 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

Acta No.:	Fecha:	01 DE JUNIO 2023	Hora: 09:00 AM

SUBDIRECCIÓN A CARGO:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO	SUPERVISOR AMC	
ALVARO RAMIREZ MORA	CONTRATISTA DE OBRA	
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA	INTERVENTORIA	
NELLY GOMEZ	APOYO SUPERVISION	

AMC. Área Metropolitana de Cúcuta.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ACTA DE COMITÉ Y REUNIÓN

TEMAS A TRATAR ORDEN DEL DIA

- **Aprobación de balance de obra para ata de mayores y menores #6**

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

Siendo las 9: 00 am se da inicio al comité técnico.


Toma la palabra el ing Álvaro Ramirez representante legal del consorcio EDUSANITARIA NDS, donde expone la necesidad de realizar un acta de mayores y menores dado a las necesidades reales de la obra; donde en el proceso constructivo de cada batería sanitaria se hace necesario la necesidad de modificar estas cantidades ya que las contractuales estaban por debajo de las cantidades reales.


Dentro de las actividades que disminuyeron se encuentra desmonte de cerchas metálicas, actividades que corresponden al capítulo de preliminares dado que los colegios ya superaron esta etapa y la mayoría que encentra en mampostería y acabados. Otra de las actividades que presenta hasta el momento menor cantidad es COLUMNA EN CONCRETO DE 21 MPA - PINTURA VINILO VINILTEX - SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE Ø 3" Y Ø 4" - SUM. E INSTAL. REGISTRO Ø 3/4" + CAJA PVC - PUNTO DESAGUE PVC 3"-4" - JUEGO DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, DISPENSADOR DE PAPEL - CERCHA CON ACCESORIOS - IMPERMEBEALIZACION DE PLACA - REGATA SOBRE MURO - SUMINISTRO E INSTALACION 3 CABLES NUMERO 12 AGW CU, EMT 3/4", INCLUYE CABLEDADO CONDUCTOR DE FASE, NEUTRO, TIERRA - SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA E ILUMINARIA , INCLUYE CABLEADO 3 NUMERO 12 AGW EMT 3/4" INCLUYE CONDUCTOR DE FASE, NEUTRO, Y TIERRA., LAMPARA CILINDRO 23W - SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO UNA PIEZA BLANCO - SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH -TUBERIA


ACTIVIDAD: 5. Elaboración del informe mensual de avance de acuerdo a las tareas asignadas.


INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 064


- **Informe mensual convenió 1404/junio.**

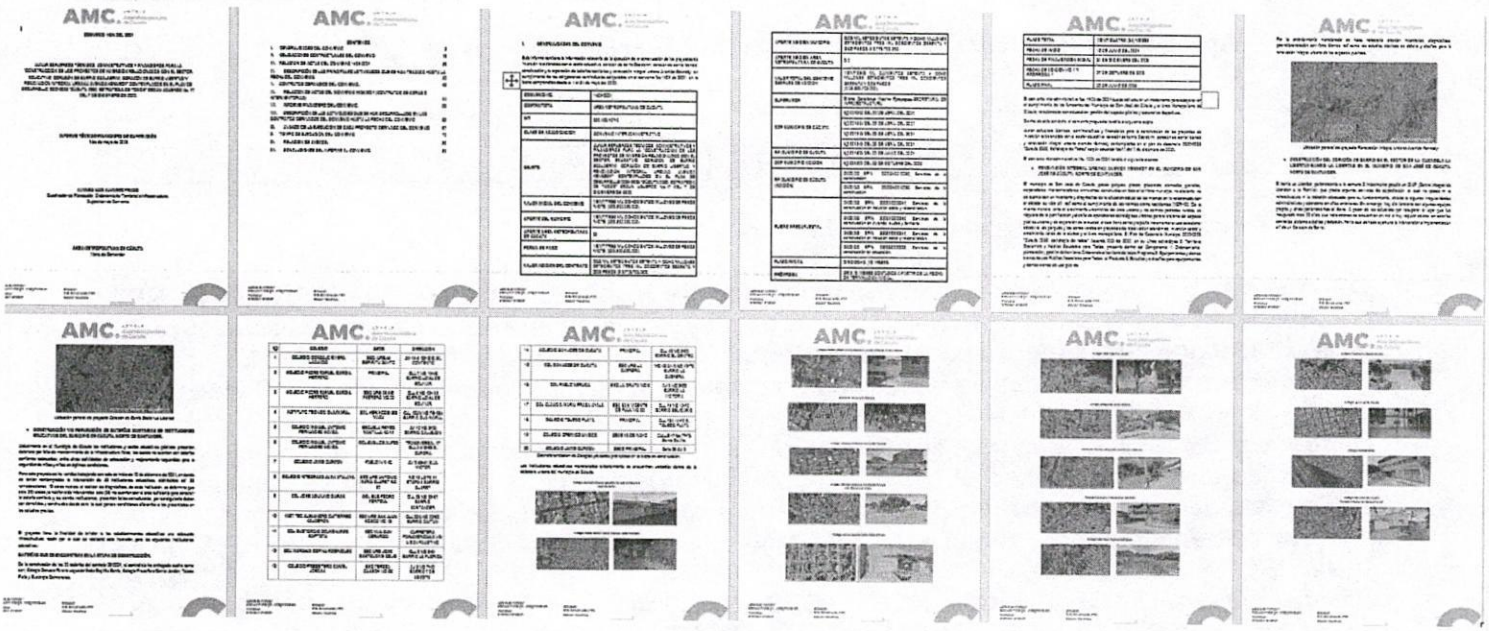


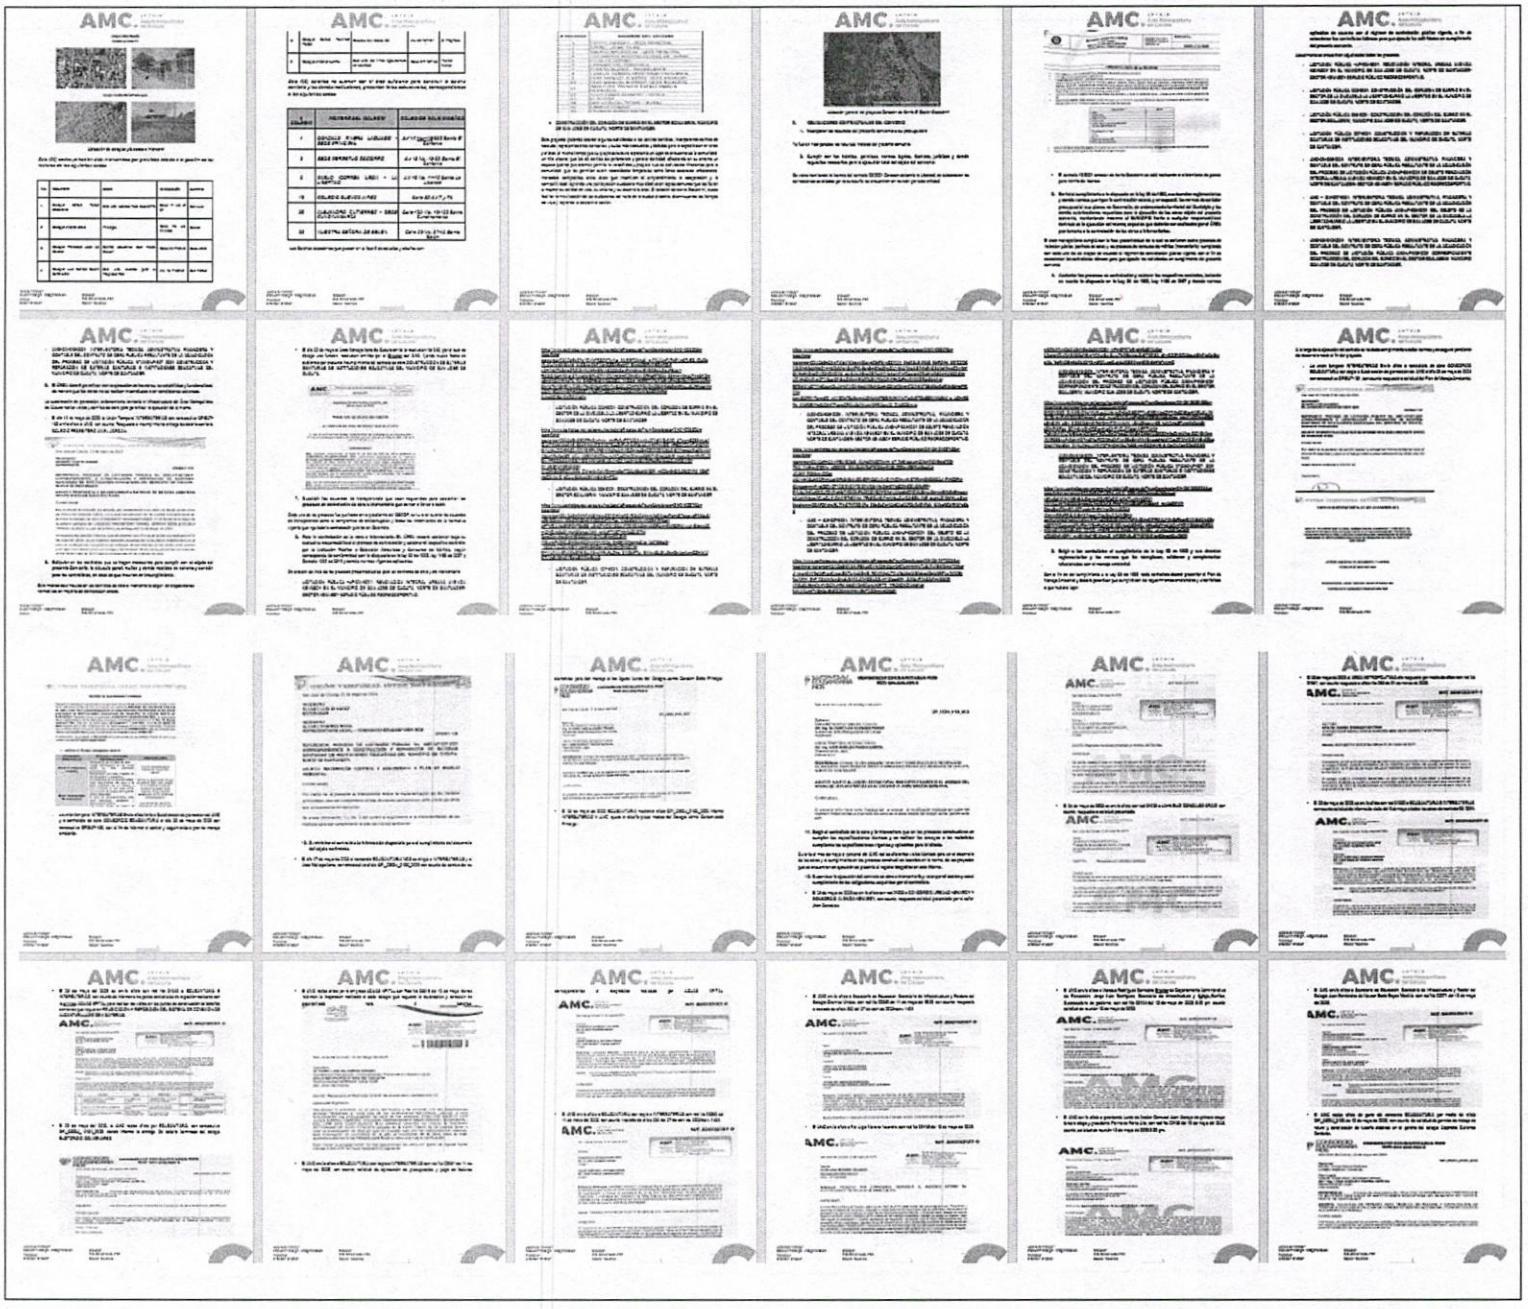


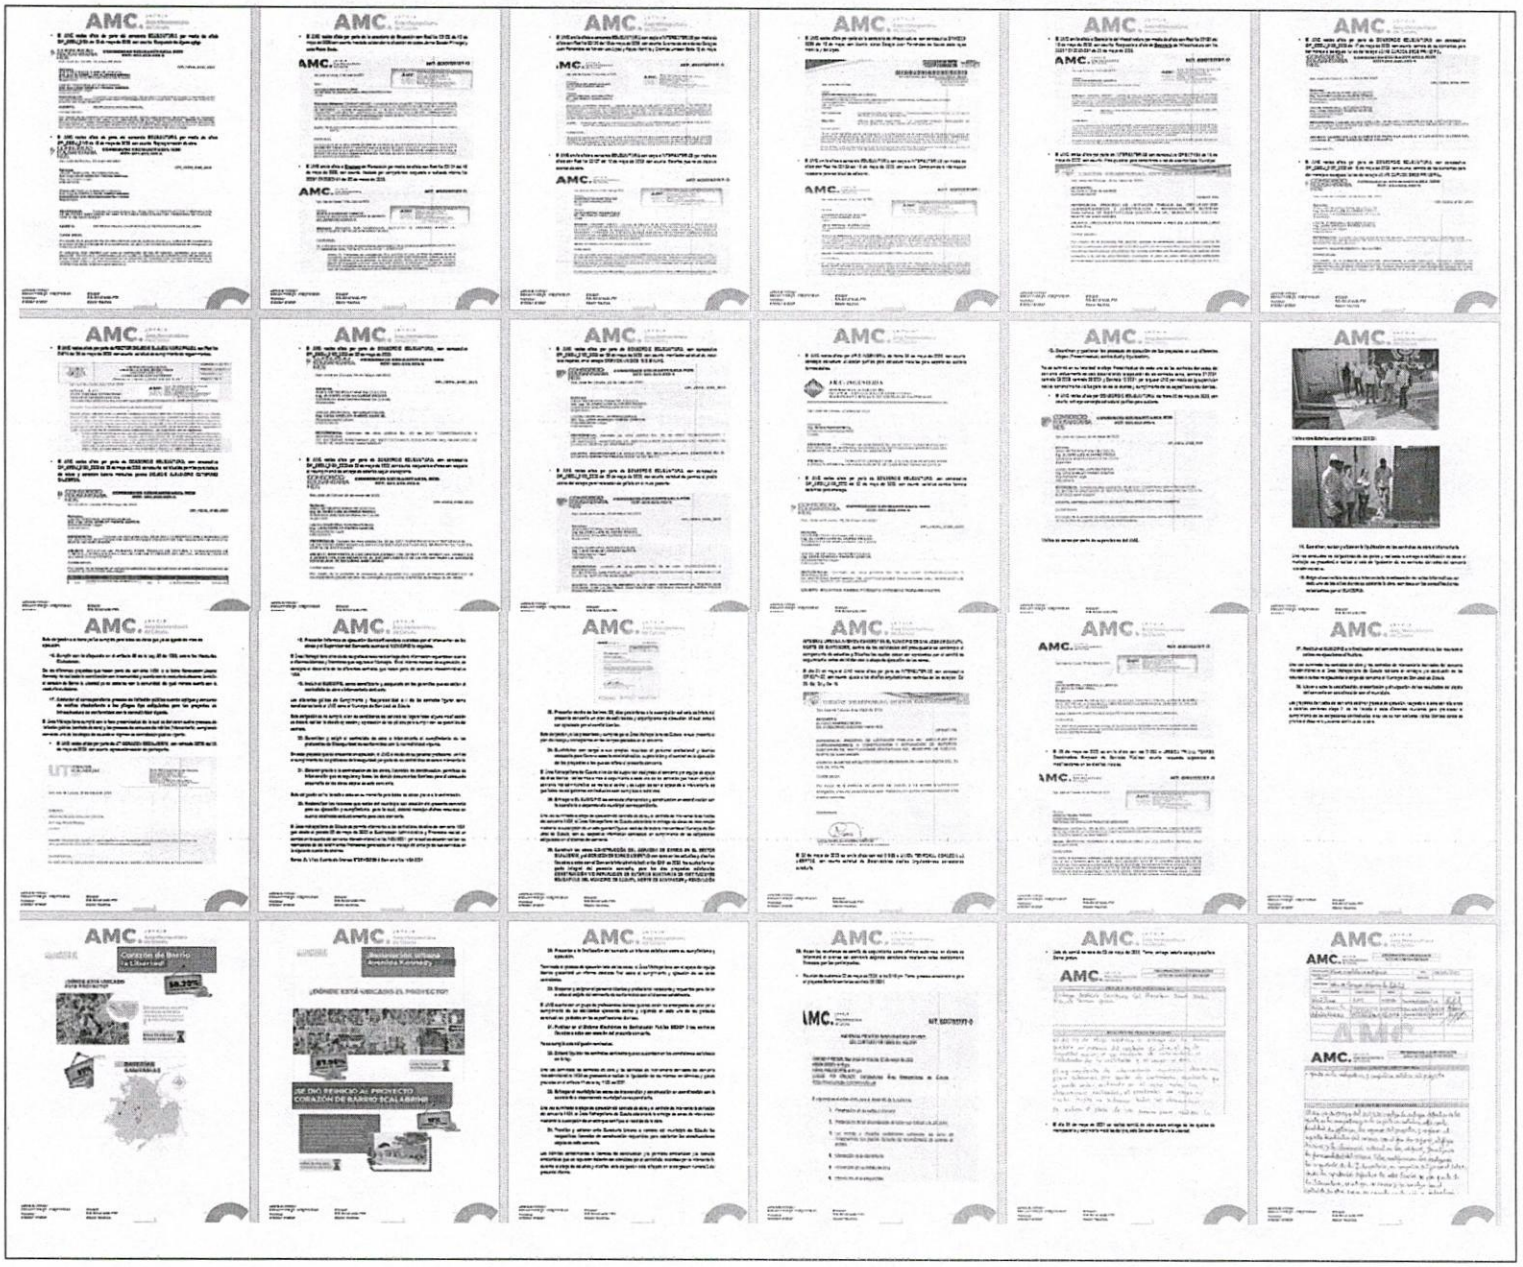

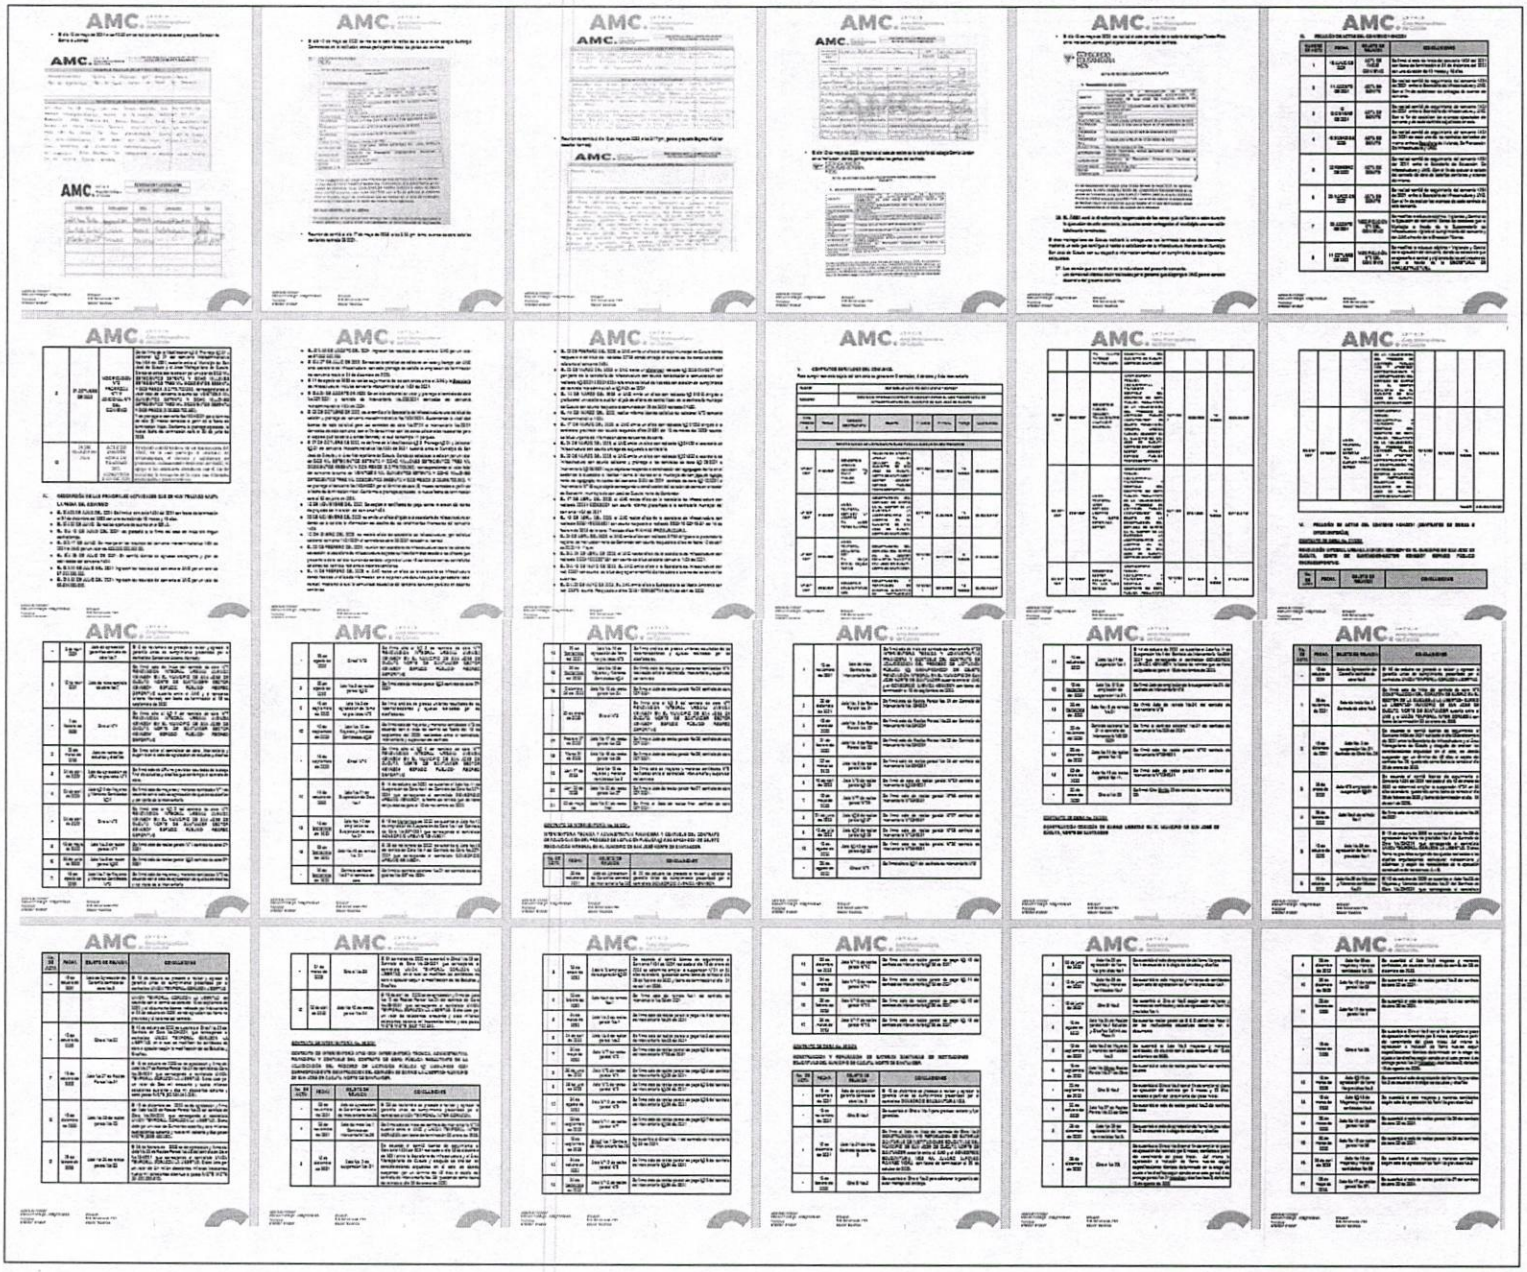


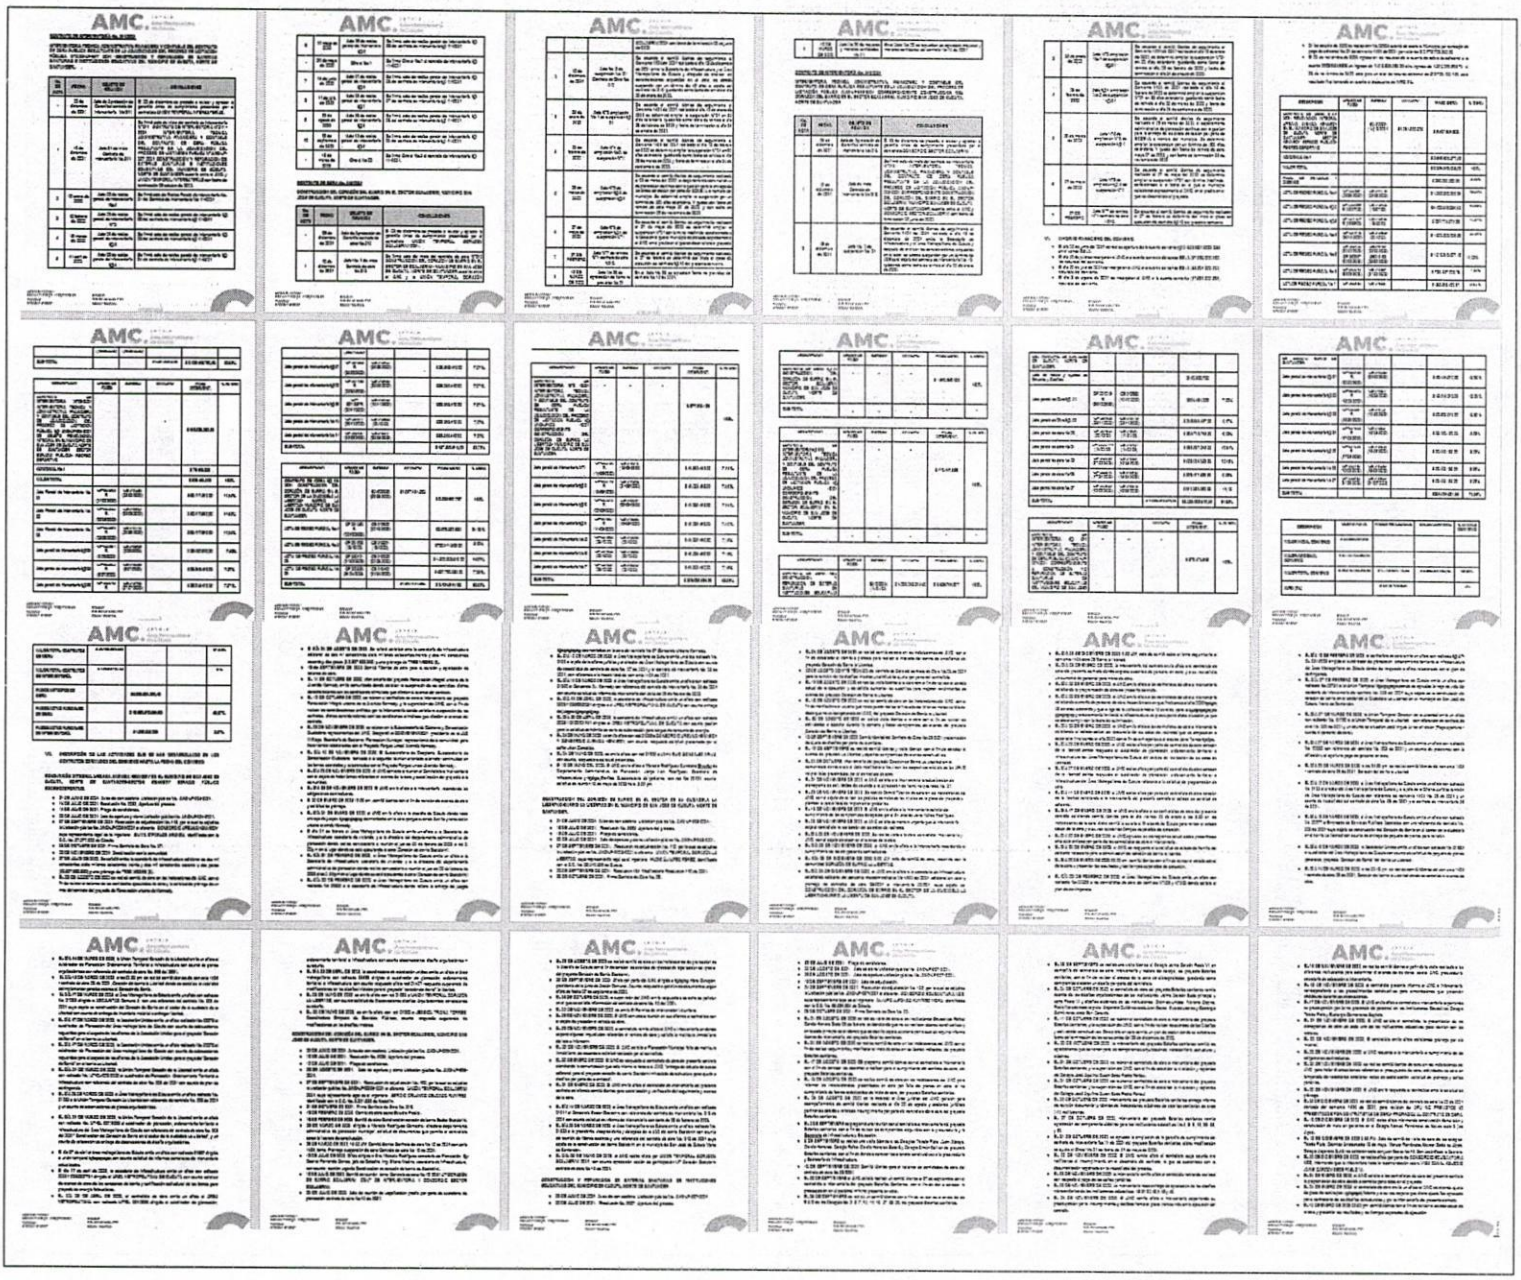


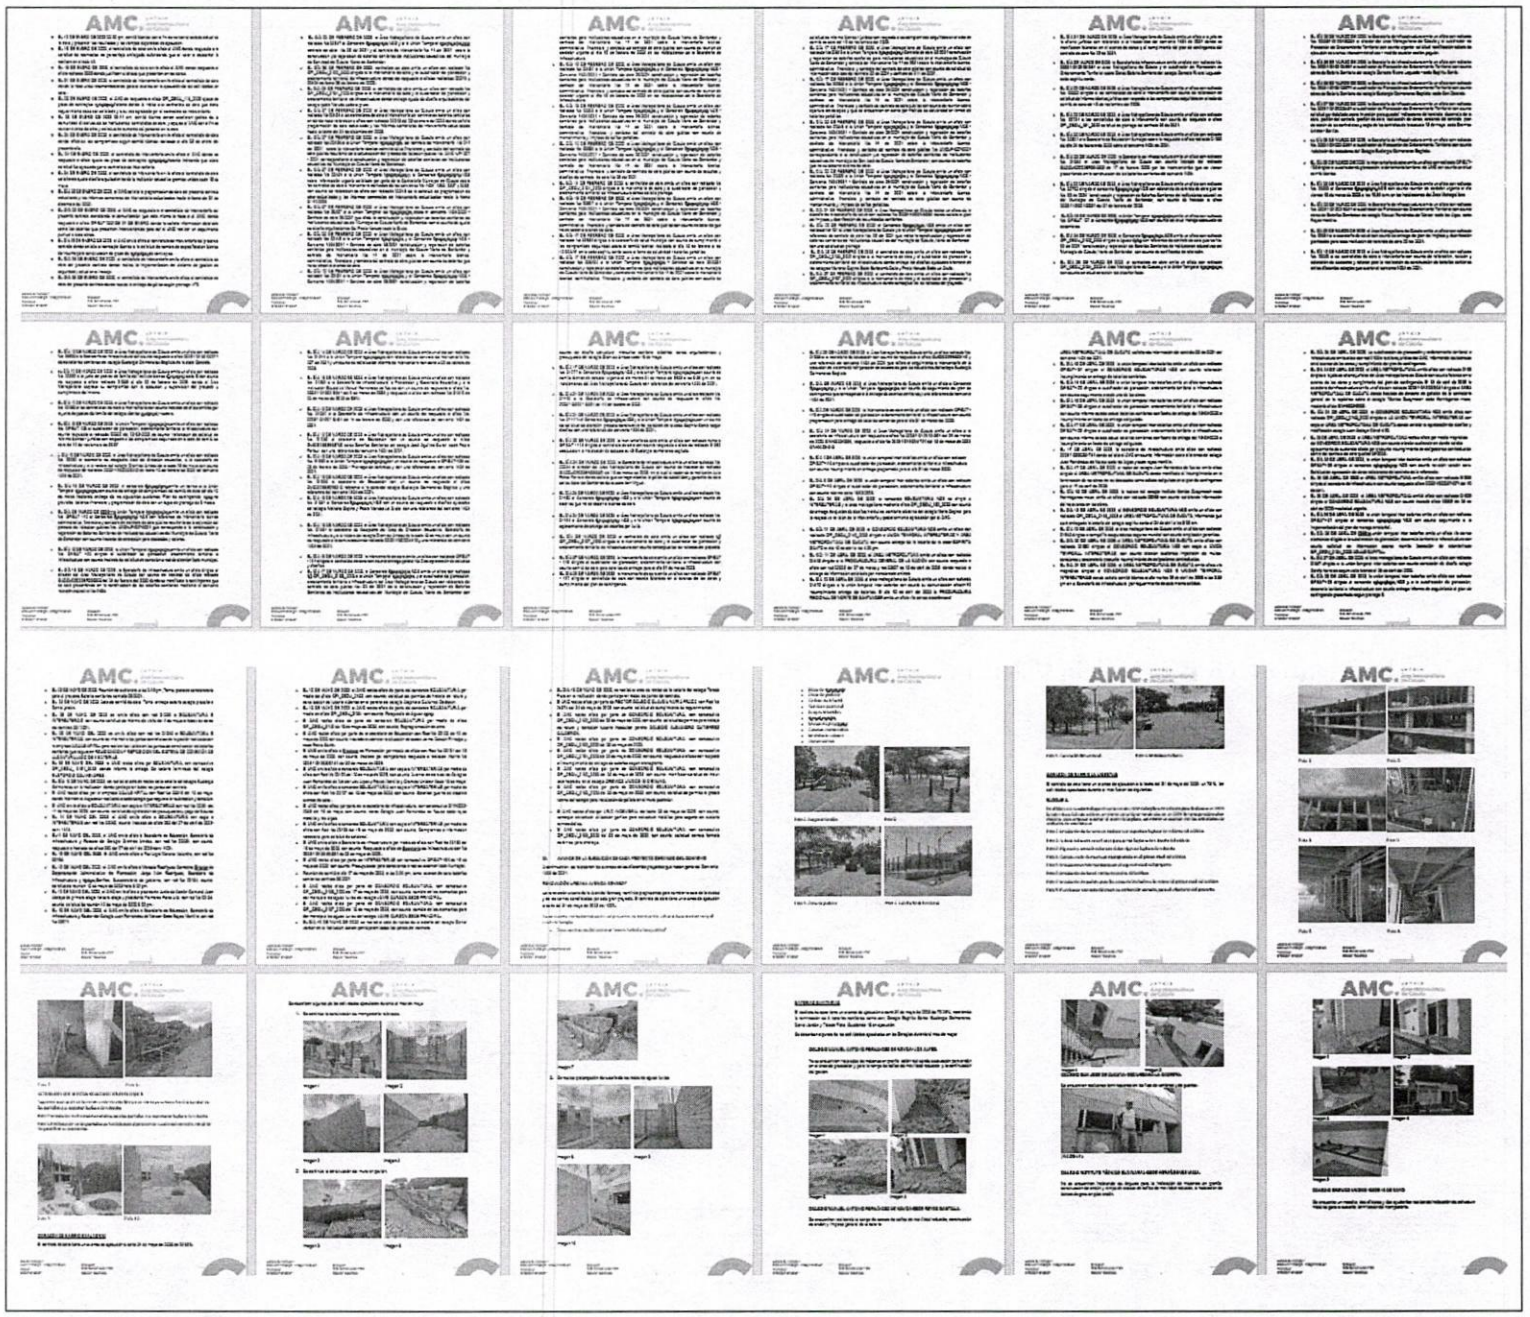


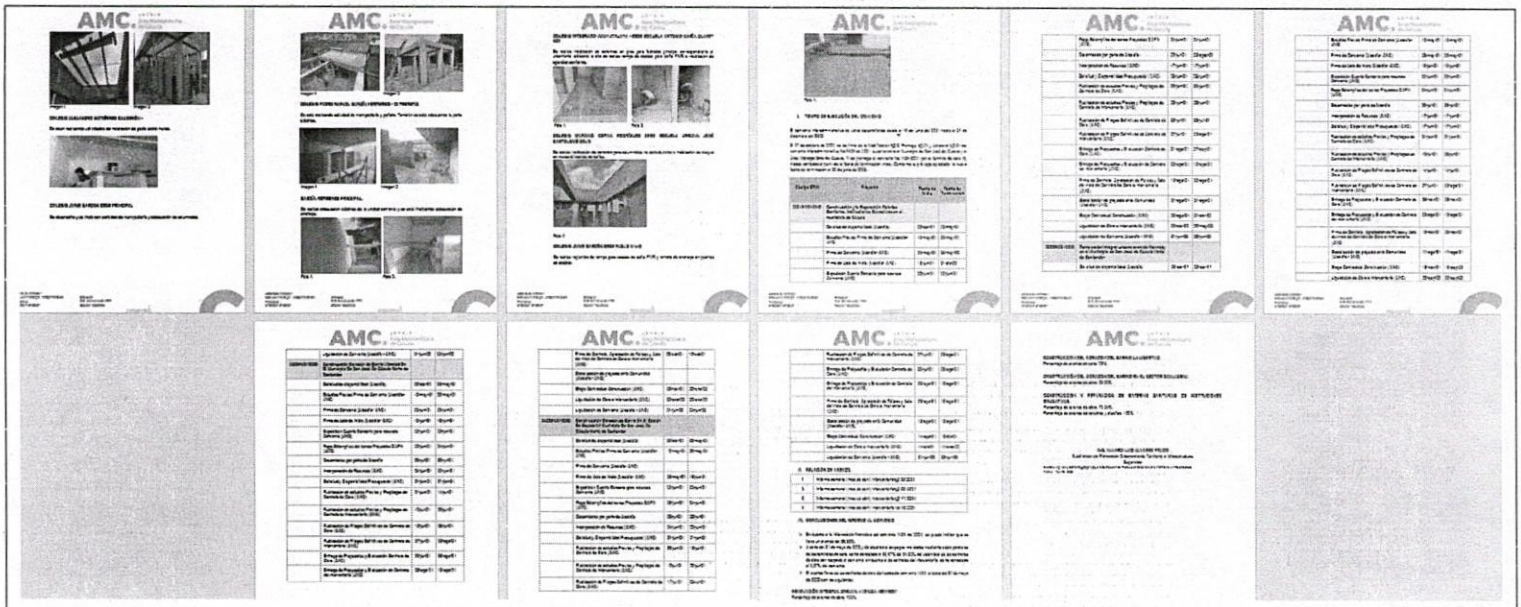

- **Informe de convenio 1563/ Junio.**

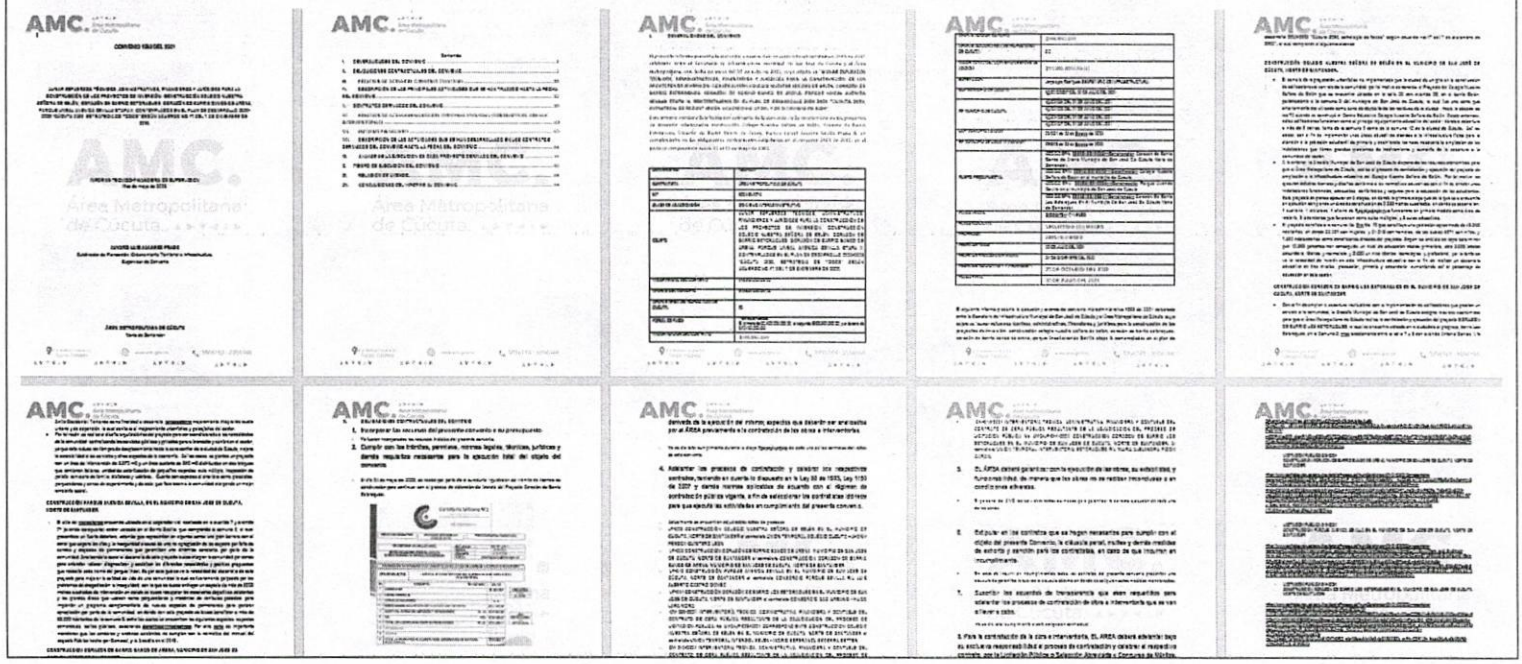

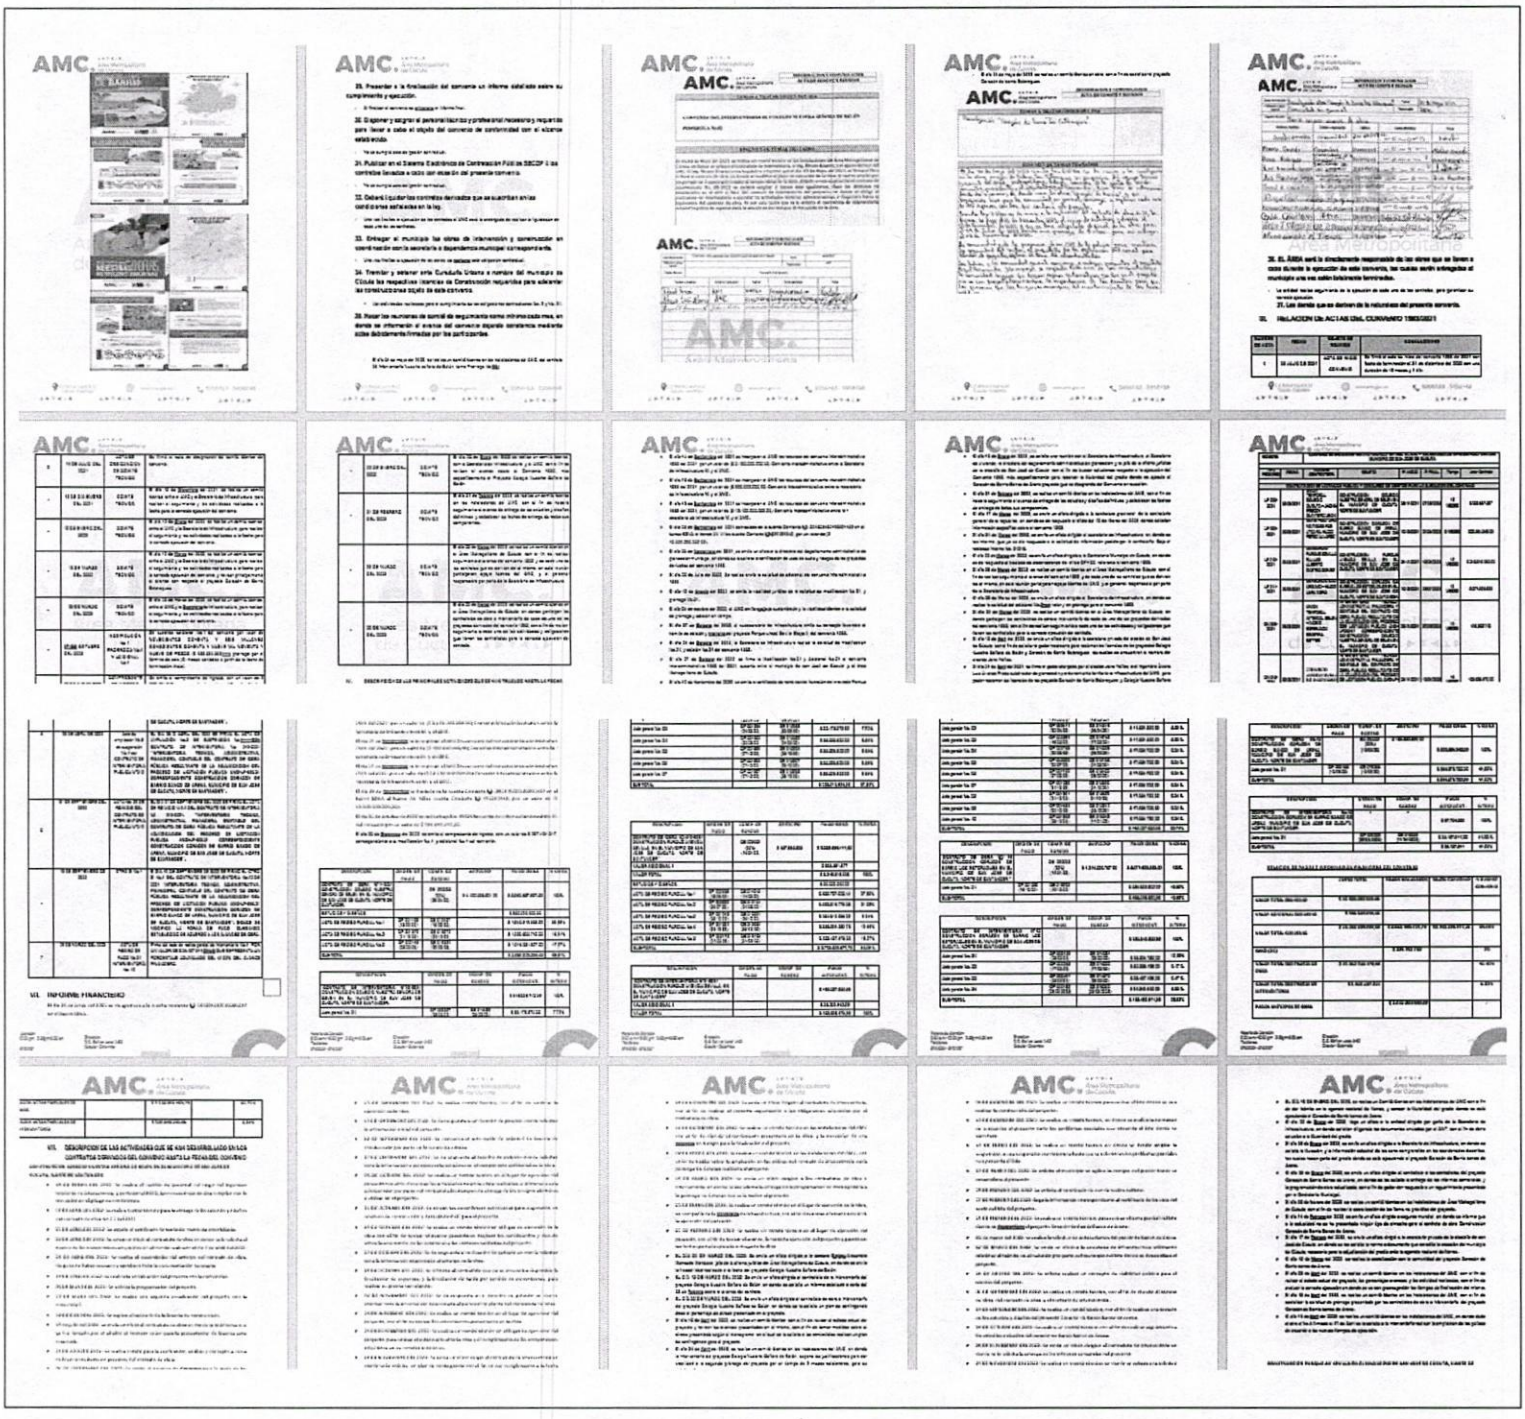

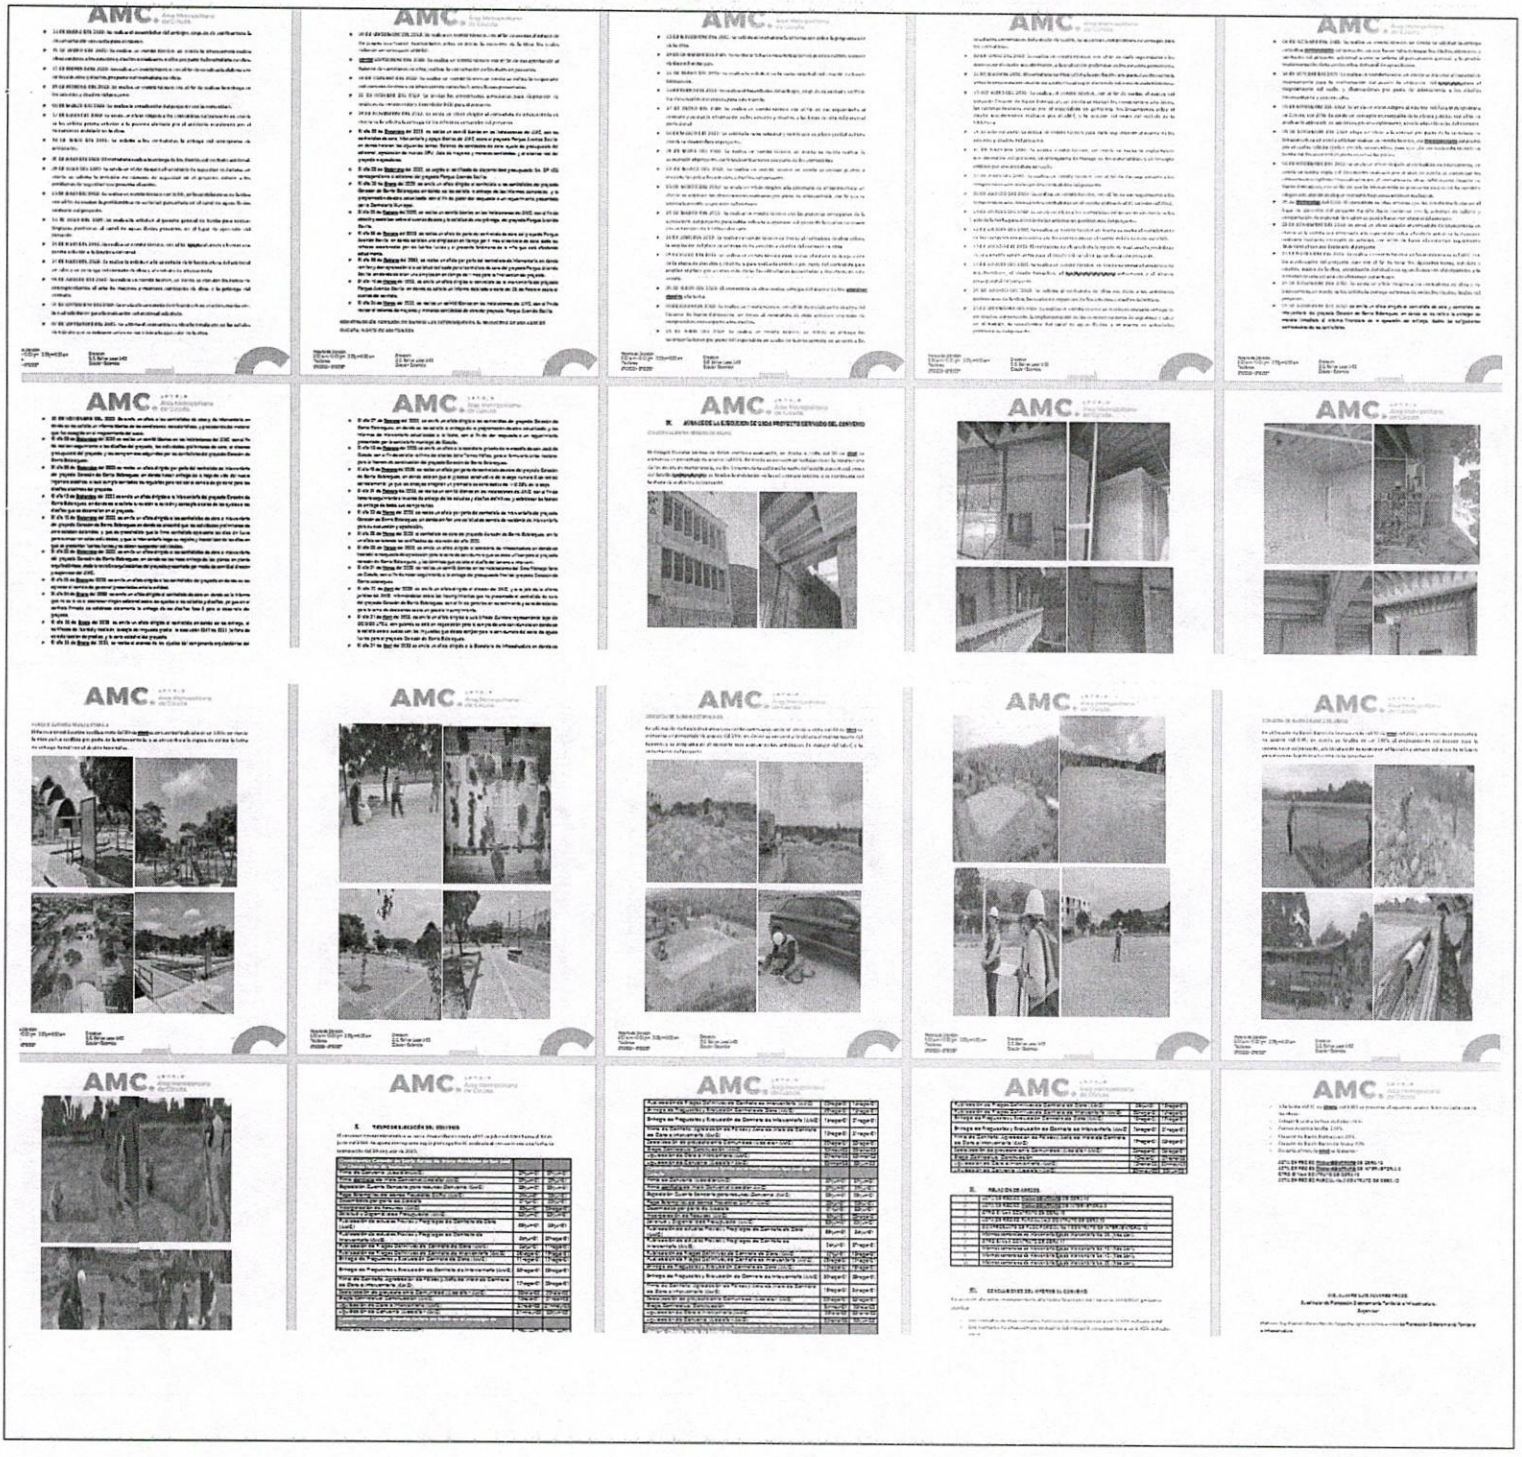

ACTIVIDAD: 6. Otras actividades inherentes al objeto contractual y a su perfil designas por el supervisor.

- Semanalmente informe para la publicación de la revista sobre el contrato 09/2021 BATERIAS SANITARIAS/ CONV 1404/2021, Periodo 16 de junio a 15 de julio de 2023, se presenta semanalmente.

BATERIAS SANITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 70,25%
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA OBRA: 31 DÍAS
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 67,64%
TOTAL SEMANAS DE EJECUCIÓN: 82
SEMANA EN CURSO: 77

Nota importante: de las 20 construcciones de baterías del contrato 09/2021 ya están terminadas 4 baterías como son; Colegio Espíritu Santo, Eustorgio Colmenares, Daniel Jordán y Toledo Plata. Quedando 16 en ejecución.

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA- LOS ALPES.

Ya se encuentran instaladas los mesones en granito, están realizando excavación para andén en el área de preescolar y para la rampa de baños de movilidad reducida, y la continuación del gavión.
(IMAGEN 1, IMAGEN 2, IMAGEN 3, IMAGEN 4).

Para la siguiente semana se tiene programada terminación del gavión, instalación de lavamanos y aparatos sanitarios.

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial y 2 ayudantes.

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA-SEDE REYES MANTILLA.

Se encuentran realizando la rampa de acceso de baños de movilidad reducida, construcción de andén y limpieza general de la batería.
(IMAGEN 5, IMAGEN 6)

Para la siguiente semana se tiene programada la instalación de aparatos sanitarios, limpieza de áreas aledañas a la obra que hayan sido utilizadas por el desarrollo de

BATERIAS SANITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 70,25%
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA OBRA: 25 DÍAS
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 61,65%
TOTAL SEMANAS DE EJECUCIÓN: 82
SEMANA EN CURSO: 78

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA- LOS ALPES.

Se encuentran realizando construcción de andén, rampa de acceso de movilidad reducida y la continuación del gavión.

(IMAGEN 1, IMAGEN 2, IMAGEN 3).

Para la siguiente semana se tiene programada terminación del gavión, instalación de lavamanos, aparatos sanitarios y pintura.

Personal en obra: 1 oficial y 3 ayudantes.

COLEGIO IN STITUTO TECNICO GUAIMARAL-SEDE HERMOGENES MAZA.

Se encuentran instalando posta sobre muros, excavación para la conexión de tubería de presión, ya se encuentran los mesones en granito instalados con apertura para la instalación de los lavamanos.

(IMAGEN 4, IMAGEN 5)

La siguiente semana se tiene programada, la instalación de lavamanos, grifería, pintura, instalación de guardaescoba.

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante.

COLEGIO GREMIOS UNIDOS - SEDE 18 DE MAYO

BATERIAS SANITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 73,65%
DÍAS QUE FALTAN PARA TERMINAR LA OBRA: 19 DÍAS
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 61,65%
TOTAL SEMANAS DE EJECUCIÓN: 82
SEMANA EN CURSO: 79

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO?

COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA- LOS ALPES.

Se encuentran realizando cuneta de aguas lluvias en lado lateral del salón de preescolar, continúan con retoque de pintura y continuación construcción del gavión.

(IMAGEN 1, IMAGEN 2, IMAGEN 3).

Para la siguiente semana se tiene programada la continuación de construcción del gavión.

Personal en obra: 1 oficial y 3 ayudantes.

COLEGIO IN STITUTO TECNICO GUAIMARAL-SEDE HERMOGENES MAZA.

ya se cuenta con la instalación de tableta de gres en el pasillo de la fachada principal, guardaescoba, instalación de bordillo en la rampa e instalación de pintura.
(IMAGEN 4, IMAGEN 5)


La siguiente semana se tiene programada, hacer los bultrones para las bajantes de aguas lluvias y la instalación de lavamanos, aparatos sanitarios y grifería.

Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudante, 1 pintor y 2 plomeros.

COLEGIO GREMIOS UNIDOS - SEDE 18 DE MAYO

Se encuentra un maestro, dos oficiales y dos ayudantes realizando instalación de pañete sobre muro, encofrado para columnetas, regateada de

- Semanalmente revisión de toda la información subida al drive por los apoyos del AMC, la revisión se realiza en conjunto con el Subdirector de planeación e infraestructura territorial AMC. Y así el resultado de la revista pueda llevarse a cabo por el diseñador.

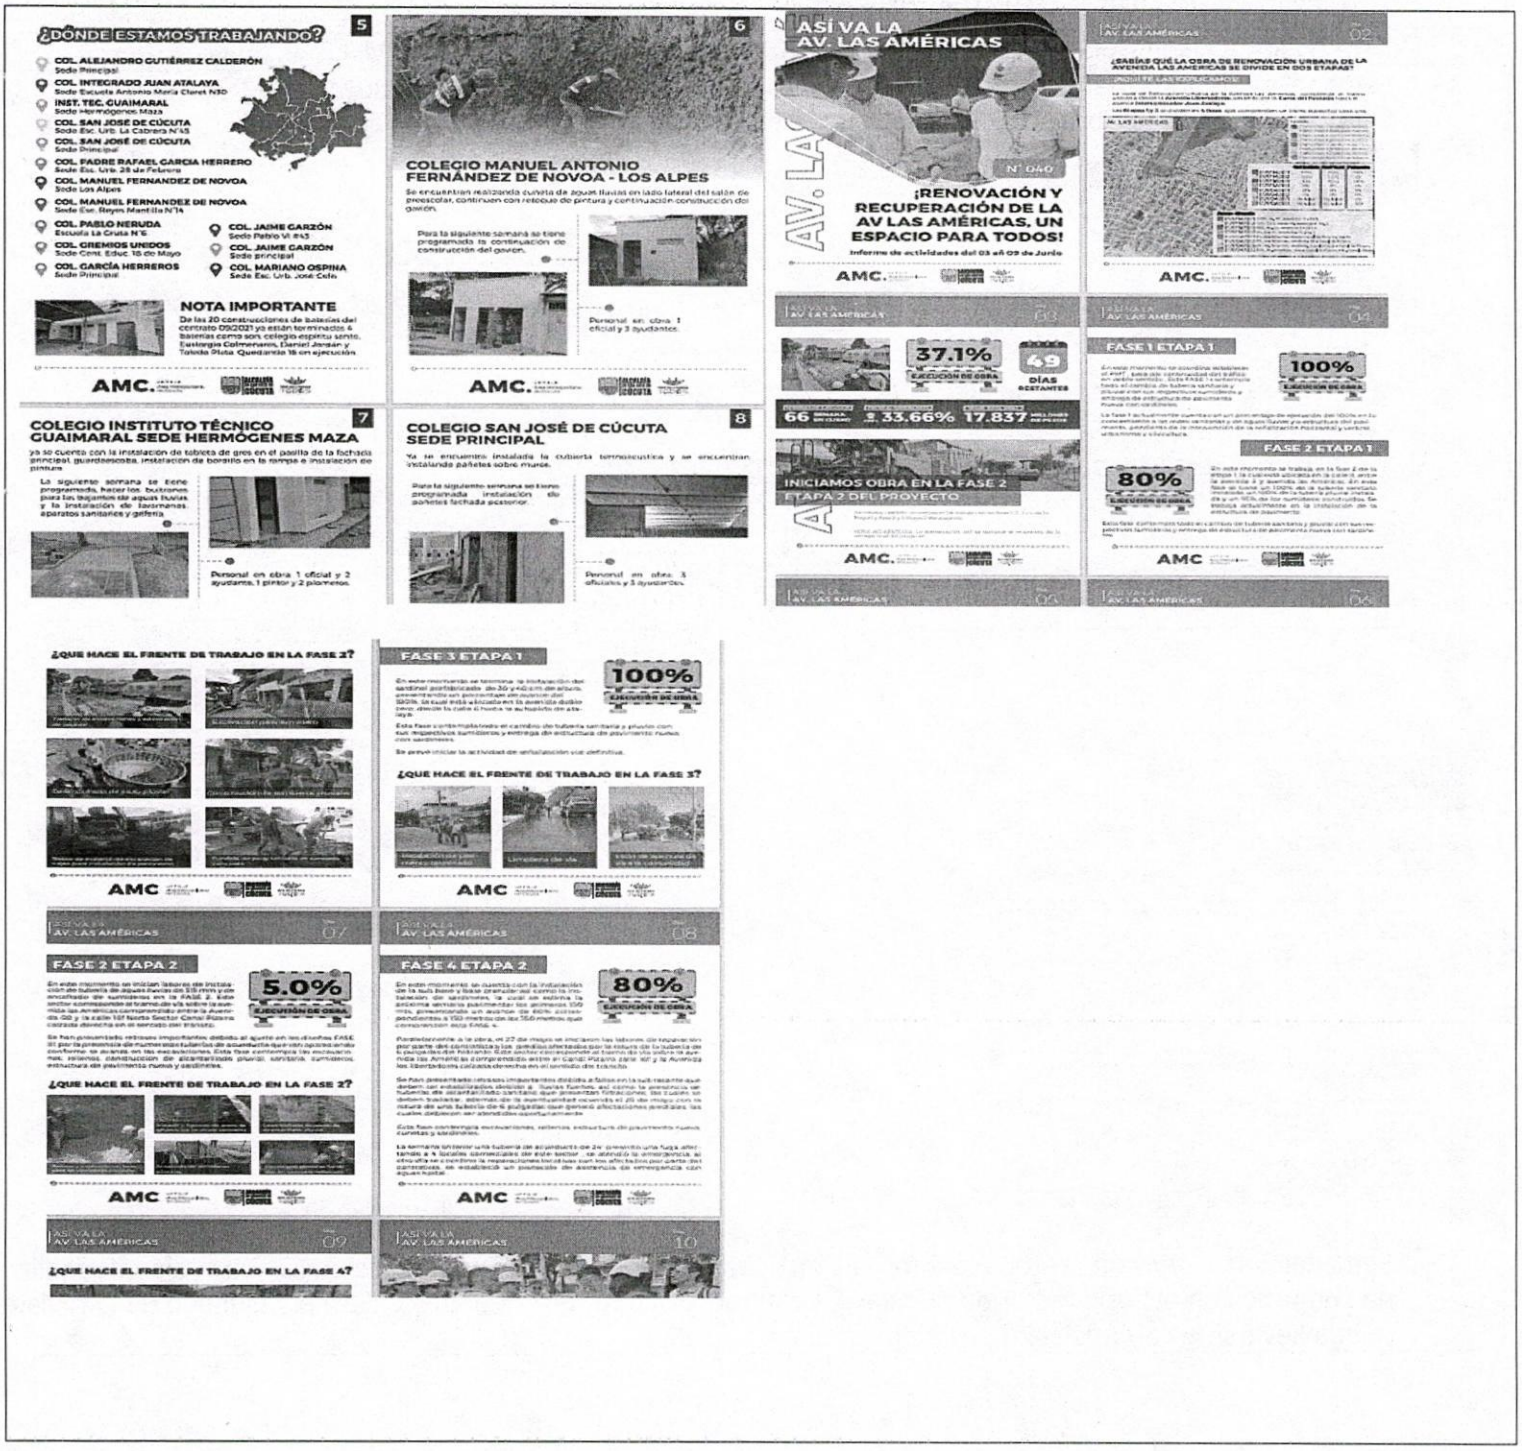
¿DÓNDE ESTAMOS TRABAJANDO?
5
COL. ALEJANDRO GUTIÉRREZ CALDERÓN
Sede Principal
COL. INTEGRADO JUAN ATALAYA
Sede Escuela Antonia María Claret N30
INST. TEC. GUAIMARAL
Sede Hermógenes Maza
COL. SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Sede Esc. Urb. La Cabrera N°45
COL. SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Sede Principal
COL. PADRE RAFAEL GARCIA HERRERO
Sede Esc. Urb. 28 de Febrero
COL. MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
Sede Los Alpes
COL. MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
Sede Esc. Reyes Mantilla N°14
COL. PABLO NERUDA
Escuela La Cruta N°6
COL. CREMOS UNIDOS
Sede Cent. Educ. 15 de Mayo
COL. GARCÍA HERREROS
Sede Principal
COL. JAIME GARZÓN
Sede Pablo VI #43
COL. JAIME GARZÓN
Sede principal
COL. MARIANO OSPINA
Sede Esc. Urb. José Celis
NOTA IMPORTANTE
De las 20 construcciones de baterías del contrato 09/2021 ya están terminados 6 baterías como son: colegio espíritu santo, Eustorgio Colmenares, Daniel Jordan y Toledo Plata. Quedando 14 en ejecución
AMC.
6
COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ DE NOVOA - LOS ALPES
Se encuentran realizando cuneta de aguas lluvias en lado lateral del salón de preescolar, continuan con retoque de pintura y continuación construcción del gavion.
Para la siguiente semana se tiene programado la continuación de construcción del gavion.
Personal en obra: 1 oficial y 3 ayudantes.
AMC.
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS
N° 040
¡RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA AV LAS AMÉRICAS, UN ESPACIO PARA TODOS!
Informe de actividades del 03 al 09 de Junio
AMC.
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 02
¿SABÍAS QUÉ LA OBRA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS SE DIVIDE EN DOS ETAPAS?
AMC.
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 03
37.1%
EJECUCIÓN DE OBRA
49
DÍAS RESTANTES
66
33.66%
17.837
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 04
FASE 1 ETAPA 1
100%
EJECUCIÓN DE OBRA
7
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO GUAIMARAL SEDE HERMÓGENES MAZA
La siguiente semana se tiene programado, hacer los bolsones para los bajantes de aguas lluvias y la instalación de lavamanos, aparatos sanitarios y gafetin
Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudantes, 1 pintor y 2 plomeros.
8
COLEGIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA SEDE PRINCIPAL
Ya se encuentra instalada la cubierta termoacustica y se encuentran instalando paneles sobre muros.
Para la siguiente semana se tiene programada instalación de paneles fachada posterior.
Personal en obra: 3 oficiales y 3 ayudantes.
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 05
INICIAMOS OBRA EN LA FASE 2 ETAPA 2 DEL PROYECTO
AMC.
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 06
FASE 2 ETAPA 1
80%
EJECUCIÓN DE OBRA
AMC
¿QUE HACE EL FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 2?
AMC
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 07
FASE 2 ETAPA 2
5.0%
EJECUCIÓN DE OBRA
¿QUE HACE EL FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 2?
AMC
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 08
FASE 3 ETAPA 1
100%
EJECUCIÓN DE OBRA
¿QUE HACE EL FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 3?
Instalación de tubería sanitaria y pluvial
Limpieza de vía
Retiro de escombros de la vía
AMC
FASE 4 ETAPA 2
80%
EJECUCIÓN DE OBRA
AMC
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 09
¿QUE HACE EL FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 4?
ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS 10

2.COMPROMISOS ADQUIRIDOS/RECOMENDACIONES			
3. EVIDENCIAS	Física	Magnética	**LUGAR DE CONSULTA**

ANEXOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PAGO:

Se anexa al presente informe para hacer efectivo el pago los siguientes documentos:

- ✓ **Formato único de supervisión contratos – convenios y certificación de pagos**
- ✓ **Certificado del supervisor en cumplimiento de las actividades**
- ✓ **Pagos seguridad social**
- ✓ **Pagos pensión**
- ✓ **Pagos riesgos profesionales**
- ✓ **Demás documentos pertinentes**

Firma Contratista
Nombre: Nelly Gómez Llanez
C.C. No. : 1093735129

RADICADO 000516
AMC. Área Metropolitana de Cúcuta
RECIBIDO: Gabielas
FECHA: 17 JUL 2023
HORA: 8:43 am
