INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N.A

CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN No.2000.13.03.007-2022
"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EI PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 24/05/2023 AL 13/06/2023

SUPERVISOR: MIGUEL EDISON ZULUAGA MONTERO

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE: MIGUEL EDISON ZULUAGA MONTERO

CARGO : SUPERVISOR

FIRMA: _____
Supervisor

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023	**PERIODO: 24/05/2023 AL 13/06/2023**
INFORME No. 4	
CONTRATO No. 2000.13.03.007-2022	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S	S		
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S		
3	CONTROL FINANCIERO	S	S		
4	CONTROL DE EJECUCION	S	S		
5	SEGURIDAD SOCIAL	S	S		
6	ANEXOS	S	S		
6.1	ASPECTOS TECNICOS	S	S		
6.2	CONTROL DE CALIDAD	N	N		
6.3	ASPECTOS AMBIENTALES	N	N		
6.4	ASPECTOS SOCIALES	N	N		
6.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	N	N		
6.6	RECURSO HUMANO	S	S		
6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	N	N		
6.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S	S		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015

INFORME No. 4			PERIODO: 24/05/2023 AL 13/06/2023		
PROYECTOS INCLUIDOS:					
ESTUDIOS Y DISENOS		OBRA		OTRO	X

ESPECIFIQUE: SUMINISTRO

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.2 CONTRATO OBJETO DE LA SUPERVISIÓN
CONTRATO No.	CONTRATO No. 2000.13.03.007-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN El PROGRAMA CULTURA DEL AGUA3"
CONTRATISTA:	CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
PLAZO INICIAL:	PLAZO INICIAL: 5 MESES
ACTA DE INICIO:	ACTA DE INICIO: 27 ENERO DE 2023
VALOR INICIAL: $	VALOR INICIAL: $ 983.654.000 COL/MCTE
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION: 27 DE JUNIO 2023
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $ 0
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $ 983.654.000 COL/MCTE
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL: 0 MESES
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION: N/A
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): N/A
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: N/A
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION: N/A
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $ N/A
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: N/A
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: N/A
FECHA DE SUSPENSION:	FECHA DE SUSPENSION: N/A
FECHA DE REINICIO:	FECHA DE REINICIO: N/A

INFORME No. 4

PERIODO: 24/05/2023 AL 13/06/2023

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento					
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo					
Salarios y Prestaciones Sociales					
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Calidad del Servicio					
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual					
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					

2.2 CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compania Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 196,730,800.00	21-44-101401465 Anexo 0	SEGUROS DEL ESTADO	9-Dec-22	9-Nov-23
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Buen Manejo del Anticipo					
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 49,182,700.00	21-44-101401465 Anexo 0	SEGUROS DEL ESTADO	9-Dec-22	9-May-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Calidad del Servicio	$ 196,730,800.00	21-44-101401465 Anexo 0	SEGUROS DEL ESTADO	9-Nov-23	9-May-24
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					
Responsabilidad Civil extracontractual	$ 400,000,000.00	21-40-101202056 Anexo 0	SEGUROS DEL ESTADO	9-Dec-22	9-May-23
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Otro Si 3					

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015
INFORME No. 4	PERIODO: 24/05/2023 AL 13/06/2023	

3. CONTROL FINANCIERO

3.1 CONTRATO DE SUPERVISIÓN


Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (__%)	-	-	-	-	-
Acta No. 1	-	-	-	-	-
Acta No. 2	-	-	-	-	-
Acta No. 3	-	-	-	-	-
Acta No. 4	-	-	-	-	-
Acta No. 5	-	-	-	-	-
Acta No. 6	-	-	-	-	-
	TOTALES	-	-	-	-

3.2 CONTRATO OBJETO DE LA SUPERVISIÓN

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (__%)	-	-	-	-	-
Acta No. 1	13/2/2023	$196,730,800	20.00%	$0	$196,730,800
Acta No. 2	27/4/2023	$245,913,500	25.00%	$0	$245,913,500
Acta No. 3	27-May-23	$245,913,500	25.00%	$0	$245,913,500
Acta No. 4	13-Jun-23	$245,913,500	25.00%	$0	$245,913,500
Acta No. 5					
Acta No. 6	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	**$934,471,300**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015
INFORME No. 4	PERIODO: 24/05/2023 AL 13/06/2023	

4. CONTROL DE EJECUCION

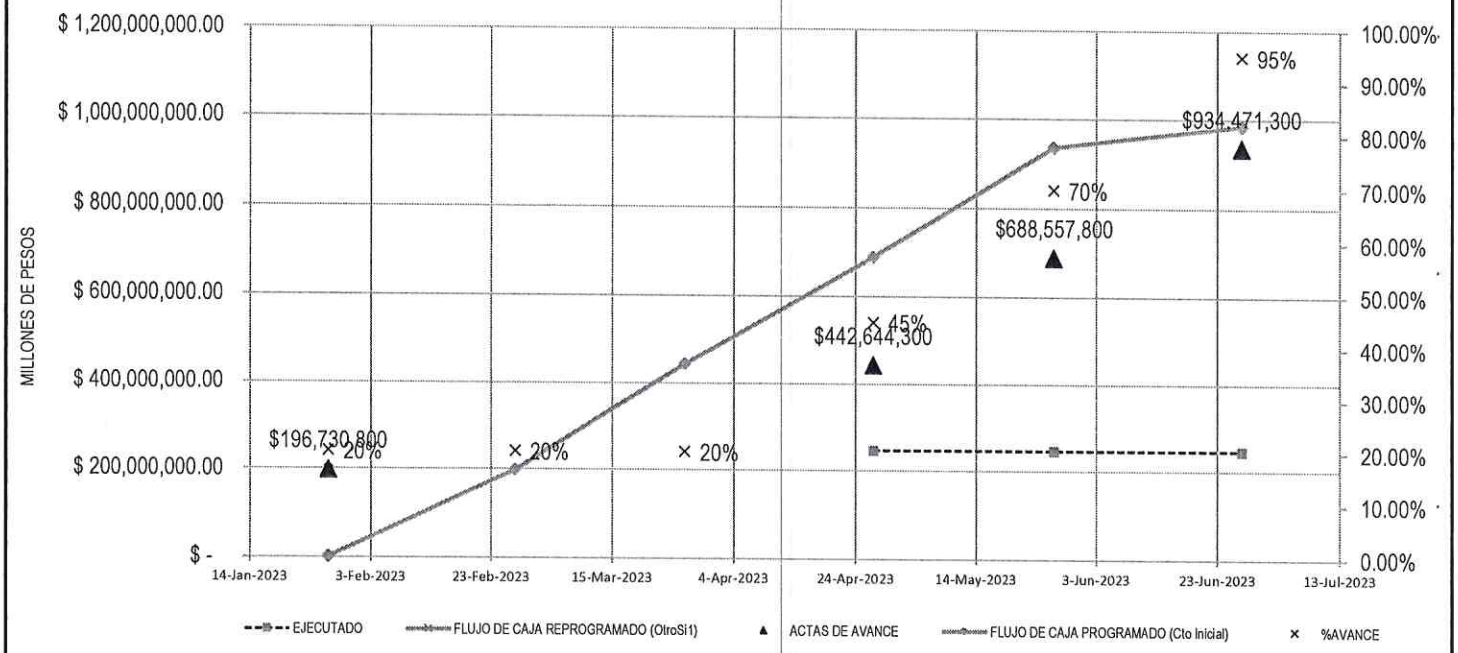

FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
27-Jan-23	$ -		$ 196,730,800.00	$ 196,730,800.00	20.00%
27-Feb-23	$ 196,730,800.00				20.00%
27-Mar-23	$ 442,644,300.00				20.00%
27-Apr-23	$ 688,557,800.00		$ 245,913,500.00	$ 442,644,300.00	45.00%
27-May-23	$ 934,471,300.00		$ 245,913,500.00	$ 688,557,800.00	70.00%
27-Jun-23	$ 983,654,000.00		$ 245,913,500.00	$ 934,471,300.00	95.00%

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015

INFORME No. 4	PERIODO: 24/05/2023 AL 13/06/2023

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Representante Legal FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO, con Cedula de ciudadania 79.947.756, quien certifica que el contratista ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

Firma del Supervisor Contrato No. 2000.13.03.006-2020

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015

INFORME No. 4	PERIODO: 24/05/2023 AL 13/06/2023

6. ANEXOS

5.1 Aspectos Tecnicos: Descripción de actividades realizadas en el periodo (Actas, Bitacora). N/A

5.2 Control de Calidad: N/A

5.3 Aspectos Ambietales: N/A.

5.4 Aspectos Sociales: N/A

5.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervencion:N/A

5.6 Recurso Humano (contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional

5.7 Maquinaria y Equipo (contratista) : N/A

5.8 Regsitro Fotografico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolucion

5.9 Informe del Contratista (si aplica).

6. ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO

Transporte de los elementos a suminstrar por parte del contratista

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1	Entrega el cronograma y la metodología de trabajo	Se hace entrega del cronograma, plan de trabajo y la metodología de trabajo en el cual se establecen los plazos de entrega
2	Diagnóstico integral.	Se reailiza una visita a la instituciones eductivas seleccionadas para el programa de cultura del agua y se entrega un informe de diagnostico de las instituciones educativas beneficiadas por municipio
3	Entrega de productos 1 y 2	El contratista entrega el informe del producto 1 y 2 para el pago del 20% del valor del contrato
4	Ejecución de los productos 3, 4 y 5 en la IE José Asunción Silva Sede Enrique Olaya Herrera de la Vereda Piles del Municipio de Palmira	* Se dictaron las capacitaciones a la comunidad educativa * Se capacito a los alumnos de grado 10 y 11 en la operación de la PTAP * Se entregaron los Kits de tratamiento del agua * Se instaló y se puso en funcionamiento la PTAP * Se entregaron las cartillas del programa de Cultura del Agua * Se entregaron los manuales de operación y mantenimiento del sistema * Se entregó el Filtro de Carbón Activado * Se entrego un equipo de suavización
5	Ejecución de los productos 3, 4 y 5 en la IE La Libertad Sede Principal del Corregimiento de Bitaco del Municipio de La Cumbre	* Se dictaron las capacitaciones a la comunidad educativa * Se capacito a los alumnos de grado 10 y 11 en la operación de la PTAP * Se entregaron los Kits de tratamiento del agua * Se instaló y se puso en funcionamiento la PTAP * Se entregaron las cartillas del programa de Cultura del Agua * Se entregaron los manuales de operación y mantenimiento del sistema
6	Ejecución de los productos 3, 4 y 5 en la IE Diego Rengifo Salazar Sede Mariano Ospina Pérez de la Vereda Paila Arriba del Municipio de Bugalagrande	* Se dictaron las capacitaciones a la comunidad educativa * Se capacito a los alumnos de grado 10 y 11 en la operación de la PTAP * Se entregaron los Kits de tratamiento del agua * Se instaló y se puso en funcionamiento la PTAP * Se entregaron las cartillas del programa de Cultura del Agua * Se entregaron los manuales de operación y mantenimiento del sistema
7	Ejecución de los productos 3, 4 y 5 en la IE Santa Teresita Sede Principal del Corregimiento de San Antonio del Municipio de Sevilla	* Se dictaron las capacitaciones a la comunidad educativa * Se capacito a los alumnos de grado 10 y 11 en la operación de la PTAP * Se entregaron los Kits de tratamiento del agua * Se instaló y se puso en funcionamiento la PTAP * Se entregaron las cartillas del programa de Cultura del Agua * Se entregaron los manuales de operación y mantenimiento del sistema
6	Ejecución de los productos 3, 4 y 5 en la IE Hernando Borrero Cuadros Sede Mercedes Abrego de la Vereda Regaderos del Municipio El Cerrito	* Se dictaron las capacitaciones a la comunidad educativa * Se capacito a los alumnos de grado 10 y 11 en la operación de la PTAP * Se entregaron los Kits de tratamiento del agua * Se instaló y se puso en funcionamiento la PTAP * Se entregaron las cartillas del programa de Cultura del Agua * Se entregaron los manuales de operación y mantenimiento del sistema
7	Ejecución de los productos 3, 4 y 5 en la IE Santa Matilde Sede Principal de la Vereda Unión Cascajeros del Municipio de Andalucía	* Se dictaron las capacitaciones a la comunidad educativa * Se capacito a los alumnos de grado 10 y 11 en la operación de la PTAP * Se entregaron los Kits de tratamiento del agua * Se instaló y se puso en funcionamiento la PTAP * Se entregaron las cartillas del programa de Cultura del Agua * Se entregaron los manuales de operación y mantenimiento del sistema

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 3 Fecha de Vigencia: 26/11/2015

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	
MATERIAL:	
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	
LOCALIZACION:	
LABORATORIO:	
NORMA - ESPECIFICACION:	

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
	PROYECTO - OBRA - ACTIVIDAD:	

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE RECEPTORA:	
3	PTAR:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:	
3	PTAP:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION
1		

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	ACTAS	
2	CORRESPONDENCIA	
3	VARIOS	

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS

I. PREDIOS

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)

II. SERVIDUMBRES

No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)

III. PERMISOS

No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	Maria Margarita Osorio	Ingeniero Civil	Director del Proyecto	Dirigir y coordinar las actividades del proyecto
2	Francisco Felipe Faccini R	Administrador	Administrador Proyecto	Gerencia integral de proyecto
3	Jairo Paez	Ingeniero Quimico	Coordinador Pedagogico	Coordinar y dar capacitaciones, asi como determinar el correcto diseño de las PTAP
4	Sandra Cubillos	Tecnica	Almacenista	Coordinador de logistica y Compras
5	Fanny Amparo Camacho	Tecnica	Coordinadora de SGSST	segumiento y control SGSST
6	Wilker Alexis Camacho	Tecnico Electricista	Tecnico	Coodinacion correcto funcionamiento de suministros
7	Roberto Jimenez	Tecnico Instalador PTAP	Tecnico en PTAP	Instalacion y monatje de sistemas PTAP en las escuelas
8	Mario Jimenez	Tecnico Soldador	Tecnico	Encargado de estructuras metalicas

II. RECURSO HUMANO SUPERVISIÓN

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1				
2				

Nombre:
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre:
REPRESENTANTE SUPERVISOR

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1							
2							
3							
4							
5							

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

ITEM	ACTIVIDAD	EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA					EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR				
		Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID
1											
2											
3											
4											
5											

Nombre:
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Nombre:
REPRESENTANTE SUPERVISOR

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO

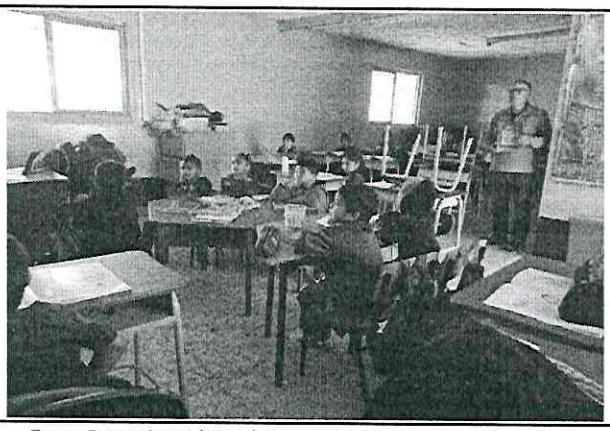


Foto Capacitación IE hernando Borrero Cuadros Sede Mercedes Abrego - Vereda Regaderos - El Cerrito



Foto Capacitación IE hernando Borrero Cuadros Sede Mercedes Abrego - Vereda Regaderos - El Cerrito



Foto PTAP IE hernando Borrero Cuadros Sede Mercedes Abrego - Vereda Regaderos - El Cerrito



Foto PTAP IE hernando Borrero Cuadros Sede Mercedes Abrego - Vereda Regaderos - El Cerrito

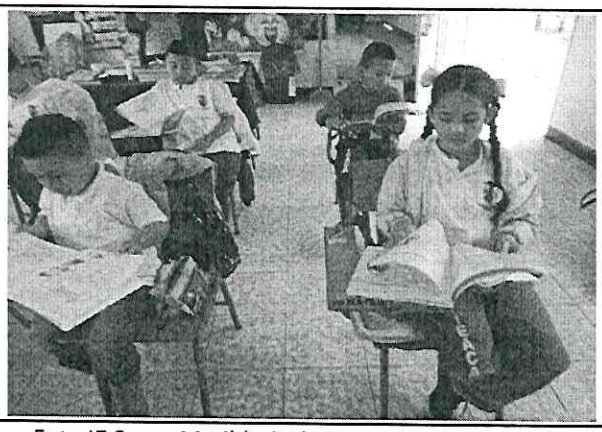


Foto IE Santa Matilde Sede Principal - Vereda Unión Cascajeros - Andalucía - Valle

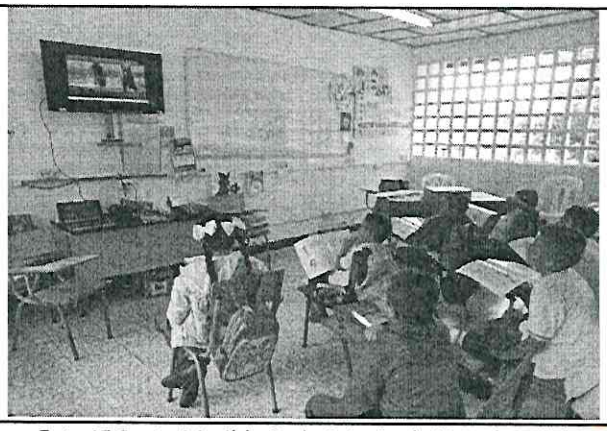


Foto IE Santa Matilde Sede Principal - Vereda Unión Cascajeros - Andalucía - Valle

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto PTAP IE Santa Matilde Sede Principal - Vereda Unión Cascajeros - Andalucía - Valle

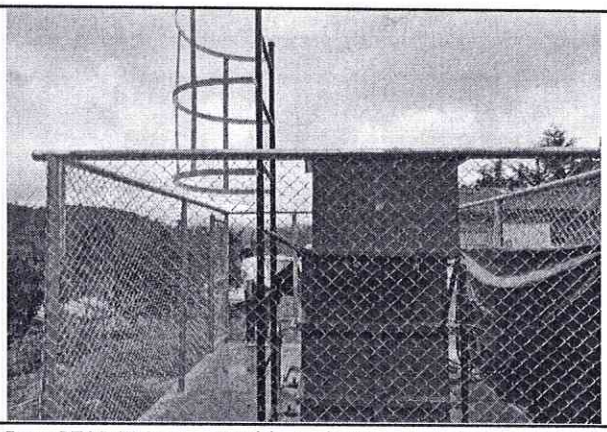


Foto PTAP IE Santa Matilde Sede Principal - Vereda Unión Cascajeros - Andalucía - Valle
