Contrato de interventoría No. SAB 06-002-22
Informe Mensual
Período: 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA

Responsable: Emmanuel Ospina Piedrahita
Director de Interventoría

Sabaneta – Antioquia, 30 de junio de 2023

Información del documento

LISTADO DE VERSIONES			
Versión	**Descripción del cambio**	**Fecha**	**Autor(es)**
0.0	Versión inicial del documento	01/07/2023	Equipo de Interventoría

Contenido

INTRODUCCIÓN 5

1 RESUMEN EJECUTIVO 7

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME 7
1.1.1 Objetivo General 7
1.1.2 Objetivos específicos 7
1.2 AUDIENCIA DEL INFORME 8

2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. SAB 06-002-22 DE 2022 9

2.1 FICHA GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
2.2 FICHA CONTABLE, FINANCIERA Y DE GESTION PRESUPUESTAL 10
2.3 GESTION ADMINISTRATIVA 10
2.3.1 Gestión del recurso humano 11
2.3.2 Gestión de correspondencia 12
2.3.3 Reuniones realizadas 37
2.4 GESTION TECNICA 39
2.5 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 46
2.5.1 Ejecución presupuestal y facturación 46
2.6 GESTION JURIDICA 47
2.6.1 Garantías del Contrato de Interventoría 48
2.7 GESTIÓN AMBIENTAL 48
2.7.1 Gestión SST 49

3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO SAB-05-004-22 DE 2022 51

3.1 FICHA GENERAL DEL CONTRATO SAB-05-004-22 51
3.2 GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO SAB-05-004-22 51
3.3 GESTIÓN JURIDICA DEL CONTRATO SAB05-004-22 53
3.3.1 Garantías del Contrato de Interventoría 53
3.4 GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO SAB-05-004-22 53
3.4.1 Planeación financiera y presupuestal del contrato 53
3.4.2 Ejecución presupuestal y facturación 56
3.5 GESTIÓN AMBIENTAL 57
3.5.1 Gestión SST 57

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59

5 ANEXOS DEL INFORME 60

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Contratos objeto de interventoría 5
Tabla 2. Ficha técnica del contrato de Interventoría 9
Tabla 3. Planeación financiera y presupuestal del contrato 10
Tabla 4. Equipo de Interventoría 11
Tabla 5. Gestión de la correspondencia 12
Tabla 6. Correspondencia enviada 21
Tabla 7. Correspondencia recibida 36
Tabla 8. Reuniones realizadas 38
Tabla 9. Cronograma general del contrato 45
Tabla 10. Balance general contrato de Interventoría 46
Tabla 11. Pagos realizados a la Interventoría 47
Tabla 12. Garantías contrato de Interventoría 48
Tabla 13. Ficha técnica del contrato de Interventoría 51
Tabla 14. Estado del cronograma de prorroga Vs Ejecutado SAB-05-004-2022 52
Tabla 15. Garantías del Contrato SAB-05-004-2022 53
Tabla 16. Condiciones del contrato SAB-05-004-22 54
Tabla 17. Ejecución del anticipo 55
Tabla 18. Ejecución presupuestal del contrato SAB 05-004-22 57

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Sabaneta mediante licitación pública No. **SAB 05-004-22**, publicó el proceso cuyo objeto es *"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA."*, proceso que fue adjudicado a la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SABANETA EG 2022 mediante el contrato No. SAB 05-004-22 de 2022

De igual manera, mediante concurso de méritos abierto, El Municipio de Sabaneta publicó el proceso No. SAB 06-002-22, con el fin de contratar una empresa para ejercer *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA"*, proceso que fue adjudicado al CONSORCIO INTER-CCTV SABANETA mediante el Contrato No. SAB 06-002-22.

En razón de ello, el Consorcio INTER-CCTV SABANETA, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría No. SAB 06-002-22, presenta el informe mensual, correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de junio de 2023, que describe las acciones de seguimiento, vigilancia y control de orden técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental al Contrato que se lista a continuación:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
SAB 05-004-22	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SABANETA EG 2022	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA.	$ 18.968.974.917

Tabla 1. Contratos objeto de interventoría

Para ello, este informe se estructura de la siguiente manera:

1. En la primera parte, se encuentra la introducción, el resumen ejecutivo, los objetivos y audiencia del informe.

2. Luego, en el siguiente capítulo, se describe el estado y avance en cada una de las obligaciones, actividades y asuntos propios del contrato de interventoría, iniciando por la caracterización del mismo mediante fichas resumen de éste y otros aspectos, tales como: la

descripción del equipo de interventoría, la ejecución presupuestal y facturación, la documentación generada durante el período, así:

a. Administrativo,
b. Técnico
c. Financiero y Contable,
d. Jurídico
e. Estado de avance del Contrato No. SAB 05-004-22

3. En la cuarta parte del reporte, con base en el estado y avance y la demás información contenidas en las secciones anteriores, se presentan las recomendaciones y/o sugerencias para optimizar la ejecución del Contrato para garantizar la Fase I Estudios y diseños y Fase II Implementación.

4. Finalmente, se presentan los anexos pertinentes que, atendiendo los requisitos para elaboración de informes. Matriz de seguimiento y control de obligaciones de los contratos objeto de Interventoría, que garantizan el cumplimiento de la Fase I Estudios y diseños y Fase II Implementación.

1 RESUMEN EJECUTIVO

El Consorcio INTER-CCTV SABANETA, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de interventoría suscrito con el Municipio de Sabaneta No. SAB 06-002-22 de 2022, que figuran en la cláusula tercera de éste, además de surtir las actividades de auto gestión y control de este, participó en la realización de actividades de seguimiento al contrato de está, donde concurrieron el equipo de proyecto de la Alcaldía de Sabaneta y del contratista que se lista en la tabla 1 de este informe, para asegurar la generación de los productos, entregables, servicios y/o resultados esperados por la entidad contratante.

Con base en la información obtenida en la ejecución de actividades antes enunciadas se preparó este informe, que describe el estado, avance y resultado de la ejecución del contrato de interventoría y del contratista y enuncia, de manera general, lo correspondiente a los contratos objeto de ésta.

1.1 OBJETIVOS DEL INFORME

1.1.1 Objetivo General

Informar a la supervisión del contrato de Interventoría No. SAB 06-002-22 de 2022, a los directivos y equipo de proyecto de la Alcaldía de Sabaneta y demás interesados, el estado, avance y actividades ejecutadas por El Consorcio INTER-CCTV SABANETA para dar cumplimiento a sus obligaciones como interventor del Contrato que realiza diseño, suministro, instalación, integración, implementación y puesta en servicio del sistema de emergencia y seguridad del municipio de Sabaneta.

1.1.2 Objetivos específicos

- Presentar y documentar las actividades del equipo de interventoría para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en las labores de seguimiento y control a la ejecución del contrato indicado en la Tabla 1 de este informe.

- Presentar y documentar las actividades del contratista objeto de interventoría para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones en las labores de la Fase II implementación.

1.2 AUDIENCIA DEL INFORME

Este informe está dirigido a los interesados tanto de la Alcaldía de Sabaneta como de quienes de manera directa o indirecta participan en el desarrollo del proyecto; quien(es) funge(n) como supervisor(es) del contrato de Interventoría, además de los órganos de control y veedurías ciudadanas para que, de conformidad con el marco legal vigente, participen con recomendaciones escritas y oportunas que contribuyan al éxito del mismo.

2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SAB 06-002-22 de 2022

EL CONSORCIO INTER-CCTV SABANETA, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría No. SAB 06-002-22 de 2022, presenta el informe mensual de conformidad con el objeto establecido en la cláusula tercera de éste y lo dispuesto en el clausulado subsiguiente, donde se establece el alcance y las obligaciones del interventor.

2.1 FICHA GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Entidad contratante	Municipio de Sabaneta
Supervisor(a) de contrato:	Mariano de Jesús Atehortúa Osorio – secretario de Gobierno
Interventor	Consorcio Inter-CCTV Sabaneta
FIRMA CONTRATISTA	
Razón Social	Consorcio INTER-CCTV Sabaneta
Contrato No.	SAB 06-002-22
Objeto contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA
Plazo inicial del contrato	Seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de Inicio	23 de mayo de 2022
Fecha de fin	23 de noviembre de 2022
Otro sí No. 1	Prórroga en Plazo: (1) mes y ocho (8) días Adición en Valor del Contrato: $159.588.917
Fecha de Terminación Otro sí No. 1	31 de diciembre de 2022
Suspensión No. 1	Suspensión del contrato a partir del 30 de diciembre de 2022
Reinicio No. 1	Reinicio del contrato a partir del 05 de mayo de 2023
Fecha de terminación Reinicio No. 1	06 de mayo de 2023
Otro sí No. 3	Prórroga en Plazo: (6) meses Adición en Valor del Contrato: $585.480.000
Fecha de Terminación Otro sí No. 3	05 de noviembre de 2023
Director de Interventoría	Emmanuel Ospina Piedrahita

Tabla 2. Ficha técnica del contrato de Interventoría

2.2 FICHA CONTABLE, FINANCIERA Y DE GESTION PRESUPUESTAL

CONDICIONES DE CONTRATO		
Fecha acta de inicio	23 de mayo de 2022	
Fecha de finalización	05 de noviembre de 2023	
Tiempo en meses de ejecución	13 meses y 8 días	398 días calendario
Valor inicial del contrato	$ 755.947.500	Incluido IVA
Adición al contrato Otrosí No. 1	$159.588.917	Incluida IVA
Adición al contrato Otro sí No. 3	$585.480.000	Incluida IVA
Forma de pago según Otro sí No. 3	El valor total del contrato asciende a la suma de Mil Quinientos Un millones dieciséis mil cuatrocientos diecisiete pesos ($1.501.016.417). Adicionar al valor del contrato establecido en la cláusula decima quinta, la suma de Quinientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos ($585.480.000). Pagaderos en seis (6) cuotas iguales de Noventa y Siete Millones Quinientos Ochenta Mil Pesos ($97.580.000) cada uno. Cada uno de los pagos deben ser aprobados por el superior del contrato, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades requeridos según ejecución, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Sabaneta en pesos colombianos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del PAC.	

Tabla 3. Planeación financiera y presupuestal del contrato

2.3 GESTION ADMINISTRATIVA

De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objeto de la supervisión y de la Interventoría contractual es proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, vigilando permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. Con Fundamento en los preceptos en mención, el Consorcio INTER-CCTV Sabaneta, llevó a cabo los procesos de autogestión y control para asegurar el buen uso de los recursos financieros del contrato

de Interventoría, de acuerdo con las normas y buenas prácticas contables, financieras y administrativas comúnmente aceptadas.

En tal sentido, durante el período a que hace referencia este informe, de conformidad con los requisitos aplicables al contrato de Interventoría, la gestión administrativa estuvo orientada a velar por el cumplimiento de las obligaciones que en tal sentido definen y sin limitarse a ellas, se extraen del contrato para hacer referencia a las obligaciones generales, como de carácter específico que se describe a continuación:

2.3.1 Gestión del recurso humano

Resultado del ejercicio de control administrativo, durante el período objeto de este informe, el Consorcio INTER-CCTV Sabaneta, puso al servicio de la Alcaldía de Sabaneta el equipo de trabajo conformado por los profesionales requeridos para la ejecución del contrato de interventoría, así:

			DEDICACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA INICIO: 06/05/2023 FIN:05/11/2023					
No.	NOMBRE	ROL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1.	Emmanuel Ospina Piedrahita	Director de Interventoría	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2.	Carla Valencia Marín	Interventor Financiero y Contable	15%	15%	15%	15%	15%	15%
3.	Fabio Castillo Gaona	Interventor Jurídico	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4.	Eirayma Arce Betancourt	Interventor tecnológico CCTV	50%	50%	50%	50%	50%	50%
5.	Carlos Morales Bustos	Ingeniero Civil	40%	40%	40%	0%	0%	40%
6.	Jorge Alberto López Ríos	Interventor Aire Acondicionado	30%	30%	0%	0%	0%	30%
7.	Eder Usquiano Peláez	Interventor Eléctrico	40%	40%	40%	40%	40%	40%
8.	Cesar Poveda Diaz	Ingeniero de Apoyo 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Marcela Monsalve García	Interventor Seguridad Industrial y Medio Ambiente	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabla 4. Equipo de Interventoría

El 03 de mayo de 2023, la supervisión del contrato mediante comunicado No. CE2023030290, solicitó a la interventoría para su reanudación y prorroga, se reconsidere el personal adscrito a la interventoría del contrato SAB 05-004-22, dado que, al finiquitarse la etapa de estudios y diseños, la cual demandaba mayor especialidad y control, resulta ahora necesario el acompañamiento de personal para la etapa de

ejecución de planta interna y externa. La interventoría mediante comunicado No. ICCTV-SAB-0049-2022 del mismo 03 de mayo de 2023, evaluó y validó jurídicamente la solicitud de modificación del contrato, tomando en cuenta la necesidad de contar con personal especializado para la Fase II – Implementación del contrato objeto de Interventoría y de esta manera la tabla 4, muestra el personal en la reducción presentado y aprobado.

2.3.2 Gestión de correspondencia

Durante la ejecución del contrato de interventoría las partes involucradas liberan comunicaciones formales escritas que son de interés para los interesados del proyecto. De dichas comunicaciones, cuando son generadas hacia o desde la Interventoría, se surte el registro pertinente dispuesta para tal efecto.

De la Gestión documental en mención, cabe anotar que al cierre del período se ha generado el envío y recepción de comunicados y oficios así:

COMUNICACIONES GENERADAS		COMUNICACIONES RECIBIDAS	
UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022	78	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022	134
SUPERVISIÓN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD	28	SUPERVISIÓN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1
OTROS	5	OTROS	0
TOTAL	111	TOTAL	135

Tabla 5. Gestión de la correspondencia

A continuación, se da a conocer la trazabilidad de la gestión realizada por esta Interventoría:

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
1	OFICIO	2/05/2022	ICCTV-SAB-0001-2022	CITA FORMALIZACIÓN RUT CONSORCIO INTER-CCTV SABANETA	VIA VENTANILLA SECOP	SECOP
2	OFICIO	5/05/2022	ICCTV-SAB-0002-2022	ENVIO RUT CONSORCIO INTER-CCTV SABANETA	VIA VENTANILLA SECOP	SECOP
3	OFICIO	1/06/2022	ICCTV-SAB-0003-2022	CAMBIO HOJA DE VIDA INSPECTOR TECNOLOGICO DE CCTV	20220601170711511034	SUPERVISIÓN
4	OFICIO	7/06/2022	ICCTV-SAB-0004-2022	CAMBIO HOJA DE VIDA INTERVENTOR JURIDICO Y CAMBIO DE ORDEN INGENIEROS DE APOYO	20220607155611317094	SUPERVISIÓN

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
5	OFICIO	9/06/2022	ICCTV-SAB-0005-2022	CAMBIO HOJA DE VIDA INGENIERO ELECTRICISTA E INTERVENTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTAL	2022017308	SUPERVISIÓN
6	OFICIO	10/06/2022	ICCTV-SAB-0006-2022	SOLICITUD DE CUMPLIMEINTO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DEL "PROYECTO DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA."	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
7	OFICIO	16/06/2022	ICCTV-SAB-007-2022	PRIMER INFORME QUINCENAL FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS (23 DE MAYO DE 20200 AL 06 DE JUNIO DE 2022)	2022061709 4611318306	SUPERVISIÓN
8	CORREO ELECTRONICO	16/06/2022	N/A	Solicitud Permisos de ingreso - CCM	Correo electrónico	SUPERVISIÓN
9	CORREO ELECTRONICO	13/06/2022	N/A	RESPUESTA Consideraciones de acceso PMR	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
10	CORREO ELECTRONICO	21/06/2022	N/A	Compromisos reunión de seguimiento 21/06/2022	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
11	CORREO ELECTRONICO	29/06/2022	N/A	RESPUESTA ORDENES DE OPERACION 1 Y 2	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
12	OFICIO	1/07/2022	ICCTV-SAB-007-2022	SOLICITUD ENTREGABLES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
13	CORREO ELECTRONICO	1/07/2022	N/A	RESPUESTA Puntos en vías concesionadas	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
14	CORREO ELECTRONICO	1/07/2022	N/A	OBSERVACIÓN Entrega de Fichas técnicas del proyecto	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
15	CORREO ELECTRONICO	7/07/2022	N/A	RESPUESTA modificación del anticipo	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
16	CORREO ELECTRONICO	5/07/2022	N/A	RESPUESTA Inquietud sobre permiso de autorización obras civiles	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
17	CORREO ELECTRONICO	7/07/2022	N/A	CONCEPTO FAVORABLE al cronograma V2	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
18	OFICIO	8/07/2022	ICCTV-SAB-008-2022	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 1 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
19	OFICIO	11/07/2022	ICCTV-SAB-009-2022	SEGUNDO INFORME QUINCENAL FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS (08 AL 30 DE JUNIO DE 2022)	2022020249	SUPERVISIÓN
20	OFICIO	15/07/2022	ICCTV-SAB-0010-2022	ALERTA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
21	OFICIO	22/07/2022	ICCTV-SAB-0011-20221	OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
22	OFICIO	22/07/2022	ICCTV-SAB-0012-20221	OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO REVISIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
23	CORREO ELECTRONICO	22/07/2022	N/A	OBSERVACIONES Entrega de Fichas técnicas del proyecto.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
24	OFICIO	25/07/2022	ICCTV-SAB-0013-20221	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE USO DE ÁREAS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
25	OFICIO	27/07/2022	ICCTV-SAB-0014-2022	OBSERVACIONES EL DOCUMENTO - INFORME DE CARGABILIDAD FUTURA DE LA SUBESTACIÓN EXISTENTE DE BIBLIOTECA JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
26	OFICIO	26/07/2022	ICCTV-SAB-0015-2022	INFORME PRESUNTO INCUMPLIMEINTO FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	CR2022022344	SUPERVISIÓN
27	OFICIO	26/07/2022	ICCTV-SAB-0016-2022	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A LA SOLCIITUD DE PRÓRROGA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2180 DE 2021	Correo electrónico	SUPERVISIÓN

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
28	CORREO ELECTRONICO	1/08/2022	N/A	RESPUESTA Consideraciones de acceso PMR, Asignación del piso 2.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
29	CORREO ELECTRONICO	4/08/2022	N/A	COPIA INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO SAB-05-004-22 SABANETA	Correo electrónico	SEGUROS DEL ESTADO S.A
30	OFICIO	9/08/2022	ICCTV-SAB-0017-2022	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 2 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
31	CORREO ELECTRONICO	9/08/2022	N/A	RESPUESTA Entrega de ítem G. Informe y diagnóstico de Instalaciones eléctricas existentes Estación de Policía	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
32	CORREO ELECTRONICO	9/08/2022	N/A	OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
33	OFICIO	10/08/2022	ICCTV-SAB-0018-2022	INFORME MENSUAL FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS (DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022)	CR2022023071	SUPERVISIÓN
34	CORREO ELECTRONICO	11/08/2022	N/A	RESPUESTA Entrega de Topologías de Red y Especificaciones técnicas de la solución	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
35	CORREO ELECTRONICO	19/08/2022	N/A	OBSERVACIONES Memoria de Cálculo de consumo eléctrico, puntos de cámara y nodos.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
36	CORREO ELECTRONICO	22/08/2022	N/A	OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 3 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
37	CORREO ELECTRONICO	22/08/2022	N/A	OBSERVACIONES Entrega de informe de Cálculo de Carga Térmica Existente.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
38	CORREO ELECTRONICO	26/08/2022	N/A	Mesa de trabajo componente eléctrico - 26/08/2022	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
39	OFICIO	30/08/2022	ICCTV-SAB-0019-2022	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 3 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
40	OFICIO	7/09/2022	ICCTV-SAB-0020-2022	CONCEPTO DE APROBACIÓN PROPUESTA DE MARCACIÓN EN ACRILICO PARA FIBRA ÓPTICA	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
41	OFICIO	8/09/2022	ICCTV-SAB-0021-2023	CONCEPTO A LA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL DE LA UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022 FRENTE AL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN /CC SEGUROS DEL ESTADO S.A
42	CORREO ELECTRONICO	9/09/2022	N/A	OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 4 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
43	OFICIO	13/09/2022	ICCTV-SAB-0022-2023	OBSERVACIONES AL INFORME DE ANALSIS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISITENTES PISO 6 CAM - ENTREGABLE 1.4 (A)	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
44	OFICIO	14/09/2022	ICCTV-SAB-0023-2023	INFORME MENSUAL FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)	CR2022026140	SUPERVISIÓN
45	OFICIO	14/09/2022	ICCTV-SAB-0024-2023	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 4 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
46	OFICIO	15/09/2022	ICCTV-SAB-0025-2023	OBSERVACIONES EL PLANO - ElE_Subestación_existente_CAM_Sabaneta_V2	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
47	OFICIO	20/09/2022	ICCTV-SAB-0026-2023	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS – PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
48	OFICIO	26/09/2022	ICCTV-SAB-0027-2023	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA DE LOS DOCUMENTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO No. SAB 05-004-22	Entrega Física a la carpeta de E&D	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
49	OFICIO	30/09/2022	ICCTV-SAB-0028-2023	COMITÉS FIDUCIARIOS DE LOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS QUE MANEJEN RECURSOS PÚBLICOS DE ACUERDO CON DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 08 DE 2022	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
50	OFICIO	5/10/2022	ICCTV-SAB-0029-2023	MATRIZ DE SEGUIMIENTO CON PESOS PORCENTUALES PONDERADOS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
51	CORREO ELECTRONICO	18/10/2022	N/A	MESA DE TRABAJO REVISIÓN IMPLEMENTACIÓN TABLEROS ELECTRICOS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
52	OFICIO	19/10/2022	ICCTV-SAB-0030-2023	SOLICITUD DE ENTRGABLES PARA LA FASE II IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO No. SAB 05-004-22	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
53	OFICIO	21/10/2022	ICCTV-SAB-0031-2023	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 8 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
54	OFICIO	21/10/2022	ICCTV-SAB-0032-2023	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE UN PRIMER PAGO – ESTUDIOS Y DISEÑOS	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
55	OFICIO	24/10/2022	ICCTV-SAB-0033-2023	INFORME MENSUAL FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS Y FASE II IMPLEMENTACIÓN (DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	CR2022030226	SUPERVISIÓN
56	OFICIO	26/10/2022	ICCTV-SAB-0034-2023	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DESEMBOLSO No. 5, 6 Y 7 DEL ANTICIPO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
57	OFICIO	2/11/2022	ICCTV-SAB-0035-2023	SOLICITUD CAMBIO HOJA DE VIDA INGENIERO DE APOYO 2	CR2022032073	SUPERVISIÓN
58	CORREO ELECTRONICO	4/11/2022	N/A	REQUERIMIENTO SST-AMBIENTAL EN OBRA	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
59	CORREO ELECTRONICO	9/11/2022	N/A	OBSERVACIONES AL INFORME SST - OCTUBRE 2022	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
60	OFICIO	11/11/2022	ICCTV-SAB-0036-2023	SOLICITUD DESEMBOLSOS PENDIENTES	CR2022033290	SUPERVISIÓN
61	OFICIO	17/11/2022	ICCTV-SAB-0037-2023	ACTA PARCIAL DE AVANCE DEL PROYECTO	CR2022033942	SUPERVISIÓN
62	OFICIO	21/11/2022	ICCTV-SAB-0038-2023	ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA FASE II IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO No. SAB 05-004-22	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022/CC SUPERVISIÓN
63	CORREO ELECTRONICO	21/11/2022	N/A	REQUERIMIENTO SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
64	CORREO ELECTRONICO	22/11/2022	N/A	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL DE PROYECTO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
65	CORREO ELECTRONICO	23/11/2022	N/A	GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO SAB 05-004-22	Correo electrónico	OFICINA JURIDICA MUNICIPIO SABANETA
66	OFICIO	28/11/2022	ICCTV-SAB-0039-2023	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022	CR2022035228	SUPERVISIÓN
67	OFICIO	28/11/2022	ICCTV-SAB-0040-2023	INFORME MENSUAL FASE II IMPLEMENTACIÓN (DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022)	CR2022035229	SUPERVISIÓN
68	OFICIO	29/11/2022	ICCTV-SAB-0041-2023	CONCEPTO A LA SOLICITUD DEL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No SAB 05-004-22	Correo electrónico	SUPERVISIÓN
69	CORREO ELECTRONICO	29/11/2022	N/A	OBSERVACIONES AL INFORME Y CRONOGRAMA ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA FASE II IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO No. SAB 05-004-22	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
70	OFICIO	7/12/2022	ICCTV-SAB-0042-2022	INFORME MENSUAL FASE II IMPLEMENTACIÓN (DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)	CR2022036224	SUPERVISIÓN
71	OFICIO	16/12/2022	ICCTV-SAB-0043-2022	CONCEPTO A LA SOLICITUD DEL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No SAB 05-004-22 A CARGO DEL RECURSO APORTADO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	PQ2022026058	SUPERVISIÓN /cc UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
72	OFICIO	22/12/2022	ICCTV-SAB-00044-2022	OBSERVACIONES EL DOCUMENTO – PLANOS TABLEROS ELECTRICOS CCM.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
73	OFICIO	27/12/2022	ICCTV-SAB-00045-2022	CONCEPTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO No. SAB 05-004-22	PQ2022026658	SUPERVISIÓN
74	OFICIO	29/12/2022	ICCTV-SAB-00046-2022	CONCEPTO A LA SOLICITUD DEL TERCER PAGO DEL CONTRATO No SAB 05-004-22 A CARGO DEL RECURSO APORTADO POR ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	PQ2022026893	SUPERVISIÓN /cc UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
75	OFICIO	5/01/2023	ICCTV-SAB-00047-2022	ACTUALIZACIÓN POLIZA DE SEGURO CONTRATO No. SAB 06-002-22	PQ2023000258	SUPERVISIÓN

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
76	OFICIO	10/03/2023	ICCTV-SAB-00048-2022	ACLARACION DESCUENTOS ESTAMPILLAS Y DEVOLUCIÓN POR MAYOR VALOR DESCONTADO EN RETENCIONES DE ICA	CR2023006368	MUNICIPIO DE SABANETA Departamento Contabilidad Departamento Tesorería
77	OFICIO	3/05/2023	ICCTV-SAB-00049-2022	RESPUESTA A LA SOLICITUD REDUCCIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SAB 06-002-22, COMUNICADO CE2023030290.	PQ2023011940	SUPERVISIÓN
78	OFICIO	8/05/2023	ICCTV-SAB-00050-2023	CONCEPTO A LA SOLICITUD DEL PRIMER PAGO DEL CONTRATO No SAB 05-004-22 A CARGO DEL RECURSO APORTADO POR EL MUNICIPIO DE SABANETA	PQ2023012286	SUPERVISIÓN
79	OFICIO	8/05/2023	ICCTV-SAB-00050-2023	CONCEPTO A LA SOLICITUD DEL PRIMER PAGO DEL CONTRATO No SAB 05-004-22 A CARGO DEL RECURSO APORTADO POR EL MUNICIPIO DE SABANETA	PQ2023012286	SUPERVISIÓN
80	CORREO ELECTRONICO	10/05/2023	N/A	Reanudación Pendientes y obligaciones	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
81	CORREO ELECTRONICO	15/05/2023	N/A	Revisión Solicitud de autorización personal JYG Contratista	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
82	CORREO ELECTRONICO	16/05/2023	N/A	SOLICITUD DESPRENDIBLES DE PAGO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
83	CORREO ELECTRONICO	16/05/2023	N/A	Revisión Documentacion de ingreso E&M	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
84	CORREO ELECTRONICO	17/05/2023	N/A	Actualización pólizas Contrato SAB-05-004-22	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
85	CORREO ELECTRONICO	17/05/2023	N/A	ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
86	OFICIO	17/05/2023	ICCTV-SAB-00051-2023	INFORME MENSUAL FASE II IMPLEMENTACIÓN (DEL 01 AL 30 DE	PQ2023013377	SUPERVISIÓN

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
				DICIEMBRE DE 2022 Y 5 AL 6 DE MAYO DE 2023)		
87	CORREO ELECTRONICO	18/05/2023	N/A	SOLICITUD SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
88	CORREO ELECTRONICO	18/05/2023	N/A	Revisión Documentación de ingreso Yohany alberto higuita	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
89	CORREO ELECTRONICO	18/05/2023	N/A	Revisión Documentación de ingreso personal UT	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
90	CORREO ELECTRONICO	19/05/2023	N/A	REITERACIÓN SOLICITUD SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
91	CORREO ELECTRONICO	19/05/2023	N/A	REITERACIÓN SOLICITUD DESPRENDIBLES DE PAGO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
92	CORREO ELECTRONICO	24/05/2023	N/A	Revisión Documentación de ingreso Juan Diego Henao Rivera	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
93	CORREO ELECTRONICO	25/05/2023	N/A	Documentos pendientes de personal	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
94	OFICIO	25/05/2023	N/A	Resultados Pruebas OTDR a los 11 carretos de fibra.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
95	CORREO ELECTRONICO	26/05/2023	N/A	OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
96	CORREO ELECTRONICO	26/05/2023	N/A	Plan de seguimiento para el tendido de fibra óptica.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
97	OFICIO	28/05/2023	ICCTV-SAB-00052-2023	SOLICITUD PERSONAL FASE DE IMPLEMENTACIÓN	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
98	OFICIO	29/05/2023	N/A	Revisión Documentos grúa STS-749	Correo electrónico	UT SEGURIDAD

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
						SABANETA EG 2022
99		29/05/2023	N/A	OBSERVACIONES DOCUMENTACION DE PERSONAL	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
100	OFICIO	2/06/2023	ICCTV-SAB-0053-2023	ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SSTA	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
101	OFICIO	5/06/2023	ICCTV-SAB-0054-2023	ACTA PARCIAL DE AVANCE DEL PROYECTO CONTRATO No. SAB 05-004-22 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	PQ2023015422	SUPERVISIÓN
102	CORREO ELECTRONICO	7/06/2023	N/A	Reiteración: ICCTV-SAB-0052-2023 - SOLICITU PERSONAL FASE DE IMPLEMENTACIÓN	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
103	CORREO ELECTRONICO	9/06/2023	N/A	REQUERIMIENTO SST	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
104	OFICIO	13/06/2023	ICCTV-SAB-0055-2023	INFORME MENSUAL FASE II IMPLEMENTACIÓN (DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023)	PQ2023016441	SUPERVISIÓN
105	OFICIO	15/06/2023	ICCTV-SAB-0056-2023	ALCANCE INFORME MENSUAL FASE II IMPLEMENTACIÓN (DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023)	PQ2023016702	SUPERVISIÓN
106	OFICIO	16/06/2023	ICCTV-SAB-0057-2023	INFORME VERIFICACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
107	CORREO ELECTRONICO	20/06/2023	N/A	RESPUESTA Proceso de generación y recolección de escombros.	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
108	CORREO ELECTRONICO	20/06/2023	N/A	Puntos de cámara con garantía de anden año 2023	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
109	CORREO ELECTRONICO	22/06/2023	N/A	Re: PERSONAL INGRESO 22/06/2023	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
110	CORREO ELECTRONICO	22/06/2023	N/A	ALERTA INCUMPLIMINETO ACTIVIDAD HINCADO DE POSTES	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

CORRESPONDECIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
111	CORREO ELECTRONICO	27/06/2023	N/A	personal INPRO APROBACIÓN	Correo electrónico	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

Tabla 6. Correspondencia enviada

A continuación, se da a conocer la correspondencia recibida por los diferentes actores del Contrato de Interventoría o del Contratista.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
1	CORREO ELECTRONICO	3/06/2022	N/A	Solicitud de planos del edificio donde se encuentra proyectado la central de monitoreo	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
2	CORREO ELECTRONICO	13/06/2022	N/A	REITERACIÓN Solicitud de planos del edificio donde se encuentra proyectado la central de monitoreo	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
3	CORREO ELECTRONICO	13/06/2022	N/A	Evidencia fotográfica de instalación de Analizador de redes en ML de cuarto técnico y Subestación	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN
4	CORREO ELECTRONICO	13/06/2022	N/A	Evidencia de filtración de agua en ubicación proyectada del centro de monitoreo	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN
5	CORREO ELECTRONICO	13/06/2022	N/A	Consideraciones de acceso PMR	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN
6	CORREO ELECTRONICO	16/06/2022	N/A	Solicitud permisos de ingreso	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
7	CORREO ELECTRONICO	21/06/2022	N/A	Formalización de centro de monitoreo proyectado en segundo piso	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
8	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	21/06/2022	CCTV-0001-2022	Formalización de centro de monitoreo proyectado en segundo piso	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
9	CORREO ELECTRONICO	21/06/2022	N/A	Solicitud de ubicación de Nodos de Concentración, proyecto CCTV Sabaneta	CORREO ELECTRONICO	EAPSA
10	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	23/06/2022	CCTV-0002-2022	solicitud de información fibra a EAPSA	095 50/R	EAPSA
11	CORREO ELECTRONICO	28/06/2022	N/A	Entrega de informes de analizador de redes, en edificio Biblioteca	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
12	CORREO ELECTRONICO	28/06/2022	N/A	KMZ entregado por EAPSA	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
13	CORREO ELECTRONICO	28/06/2022	N/A	Documentación de Perfiles personal del proyecto	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
14	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	28/06/2022	CCTV-0003-2022	Solicitud de formalización de cambio de ítem contractual, Sistema de Energía Solar	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
15	CORREO ELECTRONICO	28/06/2022	N/A	ORDENES DE OPERACION 1 Y 2	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
16	CORREO ELECTRONICO	1/07/2022	N/A	Puntos en vías concesionadas.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
17	CORREO ELECTRONICO	1/07/2022	N/A	Entrega de Fichas técnicas del proyecto.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
18	CORREO ELECTRONICO	2/07/2022	N/A	Avance en entregables. Acta suscrita, KMZ, y Borrador levantamiento información transformadores	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA/POLICÍA/SUPERVISIÓN
19	CORREO ELECTRONICO	5/07/2022	N/A	Plan de compras	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
20	CORREO ELECTRONICO	5/07/2022	N/A	Inquietud sobre permiso de autorización obras civiles.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
21	CORREO ELECTRONICO	5/07/2022	N/A	Ajuste Entrega de Fichas técnicas del proyecto	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
22	CORREO ELECTRONICO	5/07/2022	N/A	cronograma actualizado v2	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
23	CORREO ELECTRONICO	6/07/2022	N/A	MODIFICACIÓN PLAN DE ANTICIPO	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
24	CORREO ELECTRONICO	8/07/2022	N/A	ORDEN DE OPREACIÒN N1	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
25	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	9/07/2022	CCTV-0004-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE INTERVENCIÓN DE NODO NORTE CALLE 60 SUR #44-05	CORREO ELECTRONICO	EAPSA
26	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	9/07/2022	CCTV-0005-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE INTERVENCIÓN DE NODO CENTRO CRA 45 #68 SUR 67	CORREO ELECTRONICO	INFORMATICO MUNICIPIO SABANETA
27	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	9/07/2022	CCTV-0006-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE INTERVENCIÓN DE NODO SUR CRA 46 #75 SUR 36	CORREO ELECTRONICO	INFORMATICO MUNICIPIO SABANETA
28	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	13/07/2022	CCTV-0007-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE PUNTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA PUNTOS DE CÁMARAS	CORREO ELECTRONICO	EAPSA
29	OFICIO	14/07/2022	2022044247	Respuesta comunicaciones con Radicados ICCTV-SAB-0003-2022 Y ICCTV-SAB-0006-2022, Radicados Municipal 2022011034 y 2022017308	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
30	CORREO ELECTRONICO	15/07/2022	N/A	Solicitud de revisión y aprobación de procedimiento para medida de resistencia de puesta a tierra nodos de monitoreo	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
31	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	15/07/2022	CCTV-0009-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE	CORREO ELECTRONICO	CCTV EXISTENTE

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
				MONITOREO EXISTENTE.		
32	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	15/07/2022	CCTV-0010-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SABANETA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL KIT DE SEGURIDAD CAI.	CORREO ELECTRONICO	POLICÍA SABANETA
33	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	15/07/2022	CCTV-0011-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE MONITOREO PROYECTADO.	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
34	CORREO ELECTRONICO	15/07/2022	N/A	Informe de diagnóstico Instalaciones eléctricas segundo piso Biblioteca Carlos Montoya Montoya	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
35	CORREO ELECTRONICO	18/07/2022	N/A	Entrega de informe de seguimiento.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
36	CORREO ELECTRONICO	18/07/2022	CCTV-0012-2022	SOLCIITUD DE PRÓRROGA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
37	CORREO ELECTRONICO	20/07/2022	N/A	Informes Anexos A, C y G de entregable Cargas existentes	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
38	CORREO ELECTRONICO	21/07/2022	N/A	Autorización de labores para medidas de resistencia de puesta a tierra	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
39	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	21/07/2022	CCTV-0017-2022	SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE USO DE ÁREAS EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
40	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	26/07/2022	CCTV-0021-2022	NOTIFICACIÓN DE POSIBLE AFECTACIÓN DEL CUADRO ECONÓMICO DEL	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
				PROYECTO DEBIDO AL ALZA DEL DÓLAR		
41	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	28/07/2022	CCTV-0022-2022	NOTIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE CÁMARA TIPO PTZ + ACCESORIO PANORÁMICO MULTISENSOR, SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS (CÁMARA), CÁMARA FIJA TIPO 1 Y TIPO 2, JOYSTICK DE OPERACIÓN, CONTROL DE ACCESO FACIAL, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDOR DE ARCHIVOS.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
42	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	29/07/2022	CCTV-0023-2022	SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA CENTRAL DE MONITOREO PROYECTADO PARA EL EDIFICIO DEL CAM EN SABANETA.	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA/OBRAS PÚBLICAS
43	CORREO ELECTRONICO	1/08/2022	N/A	Consideraciones de acceso PMR, Asignación del piso 2.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
44	CORREO ELECTRONICO	1/08/2022	N/A	SUBSANACIÓN AL PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN FASE I ESTUDIOS Y DISEÑOS	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
45	CORREO ELECTRONICO	8/08/2022	CCTV-0024-2022	AJUSTADO Viabilidad del espacio propuesto para la Central de Monitoreo Sótano 1 de la Biblioteca municipal Juan Carlos Montoya Montoya.	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
46	CORREO ELECTRONICO	4/08/2022	N/A	ENTREGA DE AVANCE SITESURVEY	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
47	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	4/08/2022	CCTV-0025-2022	ACLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NSR10 EN EDIFICIO PROYECTADO PARA EL CENTRAL DE MONITOREO, CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL JOSE FELIX DE RESTREPO.	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/OBRAS PÚBLICAS/INTERVENTORÍA
48	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	18/08/2022	CCTV-0030-2022	E. PERMISO EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL (O POR QUIEN CORRESPONDA) DONDE SE EXPRESE LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS PROYECTOS SIES (OBRAS CIVILES EN CCM, CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, CONEXIÓN ELÉCTRICA).	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/OBRAS PÚBLICAS/INTERVENTORÍA
49	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	19/08/2022	N/A	Solicitud de desembolso Ítem N3 “CONTRATO SAB 05-004-22”	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
50	CORREO ELECTRONICO	22/08/2022	CCTV-0033-2022	SOLICITUD DE “B. PERMISO DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA DE TERCEROS PARA EL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA.	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/OBRAS PÚBLICAS/INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
51	CORREO ELECTRONICO	29/08/2022	N/A	Entrega del PMT y oficio de aprobación	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
52	CORREO ELECTRONICO	29/08/2022	N/A	Oficio de Permiso de intervención del CCM.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
53	CORREO ELECTRONICO	29/08/2022	N/A	Propuesta de placas para marquilla de fibra óptica aérea	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
54	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	30/08/2022	CCTV-0035-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE INSTALACIÓN DE POSTES EN ESPACIO PÚBLICO DE ACUERDO A “G. DEFINICIÓN DE PUNTOS DE CÁMARA	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/OBRAS PÚBLICAS/INTERVENTORÍA
55	CORREO ELECTRONICO	1/09/2022	N/A	Solicitud de revisión de entregables 1.3, 1.4 y 1.5	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
56	OFICIO	1/09/2022	CCTV-0036-2022	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPIO DE SABANETA	CORREO ELECTRONICO	MOVILIDAD/SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
57	CORREO ELECTRONICO	2/09/2022	N/A	Solicitud de revisión y aprobación de entregables 2. Alcance y Diseños Obras Civiles, 5. diseño Eléctrico y 12. Topología de Red	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
58	CORREO ELECTRONICO	3/09/2022	N/A	Solicitud de revisión y validación de entregables 1.14. Especificaciones de Integración, 1.8. Realización del Site Survey, 1.3. Especificaciones técnicas de la solución.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
59	CORREO ELECTRONICO	3/09/2022	N/A	Solicitud de revisión cálculo de consumo por punto de cámara.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
60	CORREO ELECTRONICO	5/09/2022	N/A	Entrega y solicitud de revisión entregable 1.4. Levantamiento de Cargas Existentes.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
61	OFICIO/CORREO ELECTRONICO	6/09/2022	CCTV-0037-2022	ACLARACIÓN A INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO FASE 1 ESTUDIOS - CONTRATO No SAB 05-004, CONSECUTIVO ICCTV-SAB-0015-2022	CORREO ELECTRONICO	
62	CORREO ELECTRONICO	7/09/2022	N/A	Solicitud de Protocolo de entrega y ubicación de elementos que se desmonten en el proyecto.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
63	CORREO ELECTRONICO	9/09/2022	N/A	ORDEN DE OPERACION N 4	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
64	OFICIO	12/09/2022	CCTV-0040-2022	No conformidades eléctricas encontradas en el Edificio del CAM para subsanar.	CORREO ELECTRONICO	EAPSA/SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
65	OFICIO	14/09/2022	N/A	ORDEN DE OPERACION N 4		
66	CORREO ELECTRONICO	15/09/2022	N/A	Entrega de los Estudios y Diseños del proyecto.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
67	CORREO ELECTRONICO	20/09/2022	N/A	Avance, cuadro de seguimiento de observaciones Estudios y Diseños.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
68	OFICIO	23/09/2022	CCTV-0043-2022	SOLICITUD DE PERMISO DE INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA, EN CELDA ESPECÍFICA DE PARQUEO, EDIFICIO CAM	CORREO ELECTRONICO	OBRAS PÚBLICAS/SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
69	OFICIO	23/09/2022	CCTV-0044-2022	SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN DE ALA SUR PISO 6 DEL EDIFICIO CAM MUNICIPIO DE SABANETA	CORREO ELECTRONICO	PLANEACIÓN/SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA
70	OFICIO	28/09/2022	CCTV-0046-2022	Hallazgo encontrado en revisión de sistema de Apantallamiento en el edificio CAM José Félix De Restrepo.	CORREO ELECTRONICO	INFRAESTRUCTURA/EAPSA/ SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
71	OFICIO	28/09/2022	CCTV-0046-2022	Hallazgo encontrado en revisión de sistema de Apantallamiento en el edificio CAM José Félix De Restrepo.	CORREO ELECTRONICO	INFRAESTRUCTURA/EAPSA/ SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
72	CORREO ELECTRONICO	4/10/2022	N/A	Documento de Ampliación de pólizas del contrato.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
73	CORREO ELECTRONICO	5/10/2022	N/A	Pólizas generadas para el permiso de rotura de vía.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
74	CORREO ELECTRONICO	8/10/2022	N/A	Cronograma proyectado al lunes 10 de Octubre de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
75	CORREO ELECTRONICO	13/10/2022	N/A	NOVEDADES ENCONTRADAS A LA FECHA DURANTE EXCAVACIÓN DE PUNTOS	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
76	OFICIO	18/10/2022	N/A	ORDEN DE DESEMBOLSO “CONTRATO SAB 05-004-22”	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
77	CORREO ELECTRONICO	18/10/2022	N/A	Prefactura de Estudios y Diseños para revisión.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
78	OFICIO	20/10/2022	CCTV-0056-2022	SOLICITUD ASIGANACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO IP Y MÁSCARA DE RED PARA LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE	CORREO ELECTRONICO	EAPSA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
				MONITOREO DE SABANETA.		
79	CORREO ELECTRONICO	21/10/2022	N/A	ORDEN DE OPERACIÓN N 5	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
80	CORREO ELECTRONICO	21/10/2022	N/A	ORDEN DE OPERACIÓN N 6	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
81	CORREO ELECTRONICO	21/10/2022	N/A	ORDEN DE OPERACIÓN N 7	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
82	CORREO ELECTRONICO	21/10/2022	N/A	ORDEN DE OPERACIÓN N 8	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
83	CORREO ELECTRONICO	24/10/2022	N/A	Requerimiento de autorización por parte de la policía mediante acta la fase de implementación.	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
84	OFICIO	28/10/2022	CCTV-0057-2022	RESPUESTA COMUNICADO ICCTV-SAB-0030-2022, CON ASUNTO: SOLICITUD DE ENTRGABLES PARA LA FASE II IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO No. SAB 05-004-22	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
85	CORREO ELECTRONICO	11/11/2022	N/A	Relación pagos fiducia, cuentas de cobro, y correos de OC enviados, proveedores Sabaneta	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
86	CORREO ELECTRONICO	11/11/2022	N/A	Entrega de PMA y PMT	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
87	CORREO ELECTRONICO	11/11/2022	N/A	Documentación del personal en obra	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
88	CORREO ELECTRONICO	15/11/2022	N/A	RESPUESTA REQUERIMIENTO SST-AMBIENTAL EN OBRA	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
89	CORE	18/11/2022	N/A	RESPUESTA DE REQUERIMIENTO SST-AMBIENTAL EN OBRA / INTEVENTORIA UT SABANETA EG2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
90	OFICIO	21/11/2022	CCTV-0063-2022	SOLICITUD CERTIFICADO DE USO DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATO SAB 05-004-22.	CORREO ELECTRONICO	POLICÍA NACIONAL
91	CORREO ELECTRONICO	22/11/2022	N/A	Inspección de nodos para detalle técnico	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
92	CORREO ELECTRONICO	22/11/2022	N/A	RESPUESTA REQUERIMIENTO SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
93	CORREO ELECTRONICO	23/11/2022	N/A	Seguimiento a Solicitud de certificación de Uso o destinación de elementos del contrato.	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
94	OFICIO	26/11/2022	CCTV-0064-2022	RESPUESTA COMUNICADO ICCTV-SAB-0038-2022, CON ASUNTO: ALERTA POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA FASE II IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO No. SAB 05-004-22	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
95	CORREO ELECTRONICO	28/11/2022	N/A	Solicitud de concepto de aprobación facturación Avance 20% de la fase II	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
96	CORREO ELECTRONICO	15/12/2022	N/A	Ubicación de descarga y almacenamiento de postería.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN
97	OFICIO	15/12/2022	CCTV-0067-2022	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN DE CIERRE DE VÍA NOCTURNO.	PQ2022025936	Dirección de Gestión Técnica de Movilidad Municipio de Sabaneta
98	OFICIO	16/12/2022	CCTV-0068-2022	CRONOGRAMA INSTALACIÓN LOTE No.1 DE POSTES	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
99	CORREO ELECTRONICO	17/12/2022	N/A	Programación de hincado de postería para sabado 17 de diciembre 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
100	CORREO ELECTRONICO	19/12/2022	N/A	Programación de Hincado de postería, Diciembre 19 de 2022.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
101	CORREO ELECTRONICO	20/12/2022	N/A	Informe de seguimiento diario para revisión. Viernes 16 y Lunes 19 Diciembre	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
102	CORREO ELECTRONICO	20/12/2022	N/A	Programación de Hincado de postería, Diciembre 20 de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
103	CORREO ELECTRONICO	21/12/2022	N/A	Informe de seguimiento Diario del día martes 20 de Diciembre 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
104	CORREO ELECTRONICO	21/12/2022	N/A	Programación de Hincado de postería, Diciembre 21 de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
105	CORREO ELECTRONICO	22/12/2022	N/A	Informe Diario del Miercoles 21 de Diciembre de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
106	CORREO ELECTRONICO	22/12/2022	N/A	Programación de Hincado de postería, diciembre 22 de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
107	CORREO ELECTRONICO	23/12/2022	N/A	Programación estimada de instalación de postería LPR	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
108	CORREO ELECTRONICO	23/12/2022	N/A	Informe de seguimiento diario, jueves 22 de Diciembre de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
109	CORREO ELECTRONICO	26/12/2022	N/A	Informe de seguimiento Diario: viernes 23 de Diciembre de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
110	OFICIO	27/12/2022	CCTV-0069-2022	RETRASO EN CRONOGRAMA POR FLUJO POR ATRASO EN LOS PAGOS CONTRACTUALES.	PQ2022026603	INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN
111	CORREO ELECTRONICO	27/12/2022	N/A	Programación recámaras, diciembre 27 de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
112	CORREO ELECTRONICO	28/12/2022	N/A	Informe de seguimiento día Lunes 26 de diciembre de 2022 Actividades CCM y Planta Externa	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
113	CORREO ELECTRONICO	28/12/2022	N/A	Informe Actividades a corte de 27 12 2022 Contrato 005 - 04 - 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
114	CORREO ELECTRONICO	28/12/2022	N/A	Procedimiento de registro de dispositivos a Activos Fijos del municipio Sabaneta	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN
115	CORREO ELECTRONICO	29/12/2022	N/A	Informe mensual Octubre	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
116	CORREO ELECTRONICO	29/12/2022	N/A	Informe de actividades del 28 de Diciembre de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
117	CORREO ELECTRONICO	30/12/2022	N/A	Informe de avance 29 de diciembre de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
118	CORREO ELECTRONICO	2/01/2023	N/A	Informe de avance a 30 de diciembre de 2022	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
119	OFICIO	3/05/2023	CE2023030290	Reducción de personal adscrito al contrato de interventoría SAB 06-002-22.	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
120	CORREO ELECTRONICO	5/05/2023	N/A	Radicación de Facturas UT 12 y UT 13, y solicitud de Concepto de solicitud tercer pago recursos Municipio	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
121	CORREO ELECTRONICO	9/05/2023	N/A	Solicitud de autorización para recepción de carretes de fibra óptica en el CAM	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
122	CORREO ELECTRONICO	11/05/2023	N/A	Solicitud de puntos o barrios priorizados. para instalación	CORREO ELECTRONICO	SUPERVISIÓN
123	CORREO ELECTRONICO	11/05/2023	N/A	Certificado de Calibración equipo OTDR (optical time domain reflectometer)	CORREO ELECTRONICO	INTERVENTORÍA
124	CORREO ELECTRONICO	11/05/2023	N/A	Solicitud de autorización personal JYG Contratista	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
125	CORREO ELECTRONICO	16/05/2023	N/A	Documentación de ingreso E&M	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
126	CORREO ELECTRONICO	16/05/2023	N/A	Documentación de ingreso personal UT	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
ID	**OFICIO/ CORREO**	**FECHA DE RADICADO**	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**RADICADO**	**ENTIDAD**
127	CORREO ELECTRONICO	18/05/2023	N/A	Documentación de ingreso Yohany alberto higuita	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
128	CORREO ELECTRONICO	19/05/2023	N/A	Informe Mensual Diciembre 2022.	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
129	CORREO ELECTRONICO	19/05/2023	N/A	ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
130	CORREO ELECTRONICO	20/05/2023	N/A	Actualización pólizas Contrato SAB-05-004-22	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
131	CORREO ELECTRONICO	23/05/2023	N/A	Documentación de ingreso Juan Diego Henao Rivera	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
132	CORREO ELECTRONICO	27/05/2023	N/A	Entrega del PMT para firma.	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
133	CORREO ELECTRONICO	29/05/2023	N/A	DOCUMENTACION DE PERSONAL	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
134	CORREO ELECTRONICO	29/05/2023	N/A	Documentos grúa STS-749	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022
135	CORREO ELECTRONICO	16/06/2023	N/A	Proceso de generación y recolección de escombros.	CORREO ELECTRONICO	UT SEGURIDAD SABANETA EG 2022

Tabla 7. Correspondencia recibida

2.3.3 Reuniones realizadas

El contrato objeto de interventoría esta divido en dos fases, Fase I Estudios y Diseños y Fase II Implementación, es necesario realizar el acta de inicio de cada una de las fases, a continuación, son relacionadas:

Ítem	Numero de acta	Fecha	Convocados	Asunto
1	ISAB-04-01	23/05/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Acta de inicio Fase I ESTUDIOS Y DISEÑOS
2	ISAB-04-02	27/09/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Acta de inicio Fase II Implementación

Tabla 8. Actas inicio de Fase

A la fecha se han realizado las siguientes reuniones con acta de seguimiento:

Ítem	Numero de acta	Fecha	Convocados	Asunto
1	ISAB-03-01	6/06/2022	Policía, Secretaría de Seguridad, EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Novedades estudios y diseños
2	ISAB-03-02	16/06/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
3	ISAB-03-03	21/06/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
4	ISAB-03-04	28/06/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
5	ISAB-03-05	7/05/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
6	ISAB-03-06	7/12/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
7	ISAB-03-07	19/07/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
8	ISAB-03-08	26/07/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
9	ISAB-03-09	04/08/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
10	ISAB-03-10	11/08/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
11	ISAB-03-11	18/08/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta	Seguimiento Estudios y Diseños
12	ISAB-03-12	13/09/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	concepto interventoría TRM
13	ISAB-03-13	16/09/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Acciones a tomar frente a la respuesta a la aseguradora para aseguramiento del otrosí
14	ISAB-03-14	06/10/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
15	ISAB-03-15	13/10/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación

Ítem	Numero de acta	Fecha	Convocados	Asunto
16	ISAB-03-16	27/10/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
17	ISAB-03-17	03/11/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
18	ISAB-03-18	10/11/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
19	ISAB-03-19	17/11/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
20	ISAB-03-20	24/11/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
21	ISAB-03-21	06/12/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
22	ISAB-03-22	14/12/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
23	ISAB-03-23	30/12/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Suspensión de los contratos de implementación e interventoría
24	ISAB-03-24	19/05/2023	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
25	ISAB-03-25	26/05/2023	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
26	ISAB-03-26	02/06/2023	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
27	ISAB-03-27	09/06/2023	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
28	ISAB-03-28	16/06/2023	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación
29	ISAB-03-29	23/06/2023	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Seguimiento fase II de implementación

Tabla 9. Reuniones de seguimiento

Durante la vigencia del contrato se ha realizado mesas de trabajo, como se detalla a continuación:

Ítem	Numero de acta	Fecha	Convocados	Asunto
1	ISAB-16- 01	12/08/2022	Contratista, Interventoría	Mesa de trabajo - Fichas técnicas
2	ISAB-16- 02	19/08/2022	Contratista, Interventoría	Mesa de trabajo- Site Survey
3	No aplica	24/08/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta, Ministerio del Interior	Recomendaciones y observaciones Min Interior
4	No aplica	23/08/2022	EAPSA, Contratista, Interventoría, Municipio de Sabaneta, Ministerio del Interior	Recomendaciones y observaciones Min Interior
5	ISAB-16-03	26/08/2022	Contratista, Interventoría	Mesa de trabajo diseños eléctricos
6	ISAB-16-04	09/09/2022	Contratista, Interventoría	Mesa de trabajo directrices presupuesto y cuadro económico
7	ISAB-16-05	20/10/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Mesa de trabajo comités fiduciarios de los patrimonios autónomos que manejan recursos públicos de acuerdo con directiva presidencial No. 08 de 2022

Ítem	Numero de acta	Fecha	Convocados	Asunto
8	ISAB-16-06	29/12/2022	Contratista, Interventoría, Supervisor del Contrato	Realizar el inventario de los equipos activos del contrato No. SA 05-004-22

Las actas de seguimiento están dispuestas en el Anexo 3. Actas de seguimiento

2.4 GESTION TECNICA

La gestión técnica de Interventoría está encaminada a propiciar el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico; para lo cual se verificó que las actividades y entregables de este tipo, cumplieran con las especificaciones previstas en los estudios previos, pliego(s) de condiciones y contratos; así como en los anexos, adendas, ofrecimientos y requerimientos inherentes a los servicios contratados.

Con base en estas premisas, el equipo de trabajo dispuesto por El Consorcio INTER-CCTV Sabaneta, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y control del Contrato No. SAB 05-004-22, cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 1. Matriz de autocontrol de la Fase II IMPLEMENTACIÓN.

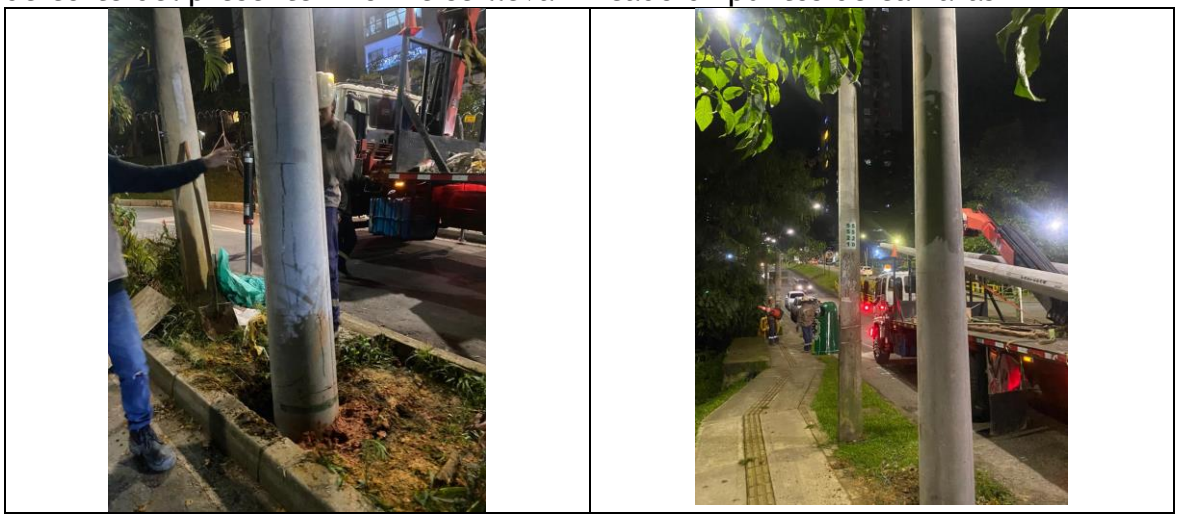
Además de los resultados de gestión técnica previamente expuestos, El Consorcio INTER-CCTV Sabaneta, generó aprobaciones, recomendaciones y/o requerimientos encaminados a velar por el cumplimiento a las obligaciones del contrato de Interventoría y del contrato objeto de ésta, que se materializan mediante los comunicados y/o actividades que se listan a continuación:

- Durante el periodo que comprende entre el 01 y 30 de junio de 2023, la interventoría realizó el acompañamiento a las labores técnicas en planta externa tales como:

  Inspección de postes, es verificada la altura de 14 mts, huecos de entrada a1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la punta, resistencia mínima de 750 kg en placa de proveedor, ductos de 1 pulgada, placa con información del poste, construcción y armazón, así como que no tenga fractura y/o fisuras.



- Verificación de obra civil e hincado de poste, se realiza la inspección en la excavación una vez hincado el poste se revisa su verticalidad, profundidad de hincado, compactado de terreno y/o inconvenientes en la maniobra. A la fecha de corte del presente informe se lleva hincado 61 puntos de cámaras



- Verificación de equipos en poste, Cajas de inspección y obra civil, tanto para cámara PTZ como LPR







- Se realizó el acompañamiento a las instalaciones de proveedor de tableros eléctricos, donde se realizó la inspección de acuerdo con lo aprobado en estudios y diseños

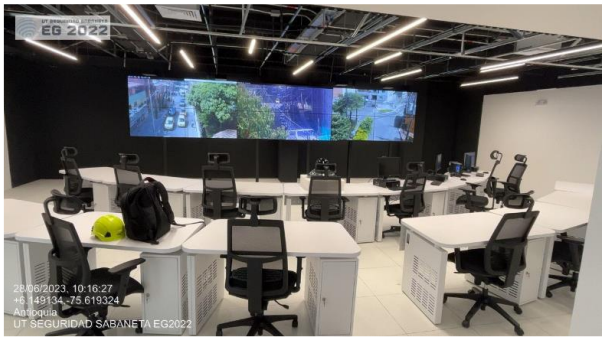






- Frente a las labores en planta interna, a continuación, se detalla mediante evidencia fotográfica los avances de obra civil en planta interna.

AVANCE OBRA CIVIL NUEVA CENTRAL DE MONITOREO	
	
ESCLUSA PRINICIPAL Instalación de pliegues lámina	SALA DE DESCANSO Aire acondicionado instalado
	
SALA DE CRISIS Instalación de vidrio conmutable, mobiliario y acabados	SALA DE CRISIS Instalación de mobiliario

	
SALA DE VISUALIZACIÓN Instalación del video wall, mobiliario puestos de trabajo	SALA DE VISUALIZACIÓN Ductos y/o rejillas de Aire Acondicionado
	
CUARTO DE COMUNICACIONES Instalación de Racks, equipos en rack, piso vinílico, puerta y vidrio	CUARTO ELÉCTRICO Instalación de tablero red Normal y Regular, acometida principal desde tablero principal

	
OFICINA SUPERVISOR DE CCTV Instalación de AA e iluminación	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Instalación de panel de sistema de detección de incendio e iluminación de emergencia

- Conforme a lo anterior y de acuerdo con las actividades establecidas y que lograron avance durante el periodo comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2023, se obtuvo un avance general del 71,1% y frente a las actividades adquiridas y contratadas por el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá fue del 80,4%. A continuación, se muestra el estado general del cronograma.

	AMVA	TODO EL PROYECTO
AVANCE REAL DEL PROYECTO	80%	71%

APORTE FASE (AMVA)	APORTE CC1	APORTE CC1 (MUNIC+AMVA)	APORTE CC2 (AMVA)	APORTE CC2 (MUNIC+AMVA)	APORTE CC3 (AMVA)	APORTE CC3 (MUNIC+AMVA)	APORTE CC4 (AMVA)	APORTE CC4 (MUNIC+AMVA)	APORTE CC5 (AMVA)	CUENTA CONTROL	PROGRAMACION	UNIDAD	CONTRACTUAL (MUNIC+AMVA)	EJECUTADO (MUNIC+AMVA)	CONTRACTUAL (AMVA)	EJECUTADO (AMVA)	PENDIENTE	AVANCE POR ACTIVIDAD (MUNIC+AMVA)	PESO (MUNIC+AMVA)	AVANCE POR ACTIVIDAD AMVA	PESO AMVA	DURACION EN DIAS CALENDARIO	INICIO	TERMINACIÓN
1,00											PROYECTO								71,1%		80,4%	545	6/5/2022	2/11/2023
0,15										FASE 1	FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS								30,0%		15,0%	107	23/5/2022	7/9/2022
	0,10									ID1	ETAPA 1: CONTRACTUAL								10,0%		10,0%	0	23/5/2022	23/5/2022
							1,00	1,00		ID1.1.	Acta de Inicio	Und	1	1	1	1	0	100%	100,0%	100,00%	100,0%	0	23/5/2022	23/5/2022
	0,90									ID2	ETAPA 2: INFORMACION PARA PROCESAMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								90,0%		90,0%	107	23/5/2022	7/9/2022
	0,20									ID3	ETAPA 3: ADQUISICIONES								20,0%		20,0%	158	6/5/2022	11/10/2022
	0,30									ID4	ETAPA 4: OBRAS Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)								14,4%		24,6%	361	27/9/2022	23/9/2023
	0,20									ID5	ETAPA 5: PRECONFIGURACION DE EQUIPOS								16,5%		18,0%	244	28/11/2022	30/7/2023
	0,15									ID6	ETAPA 6: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS EN SITIO								7,8%		14,3%	301	5/12/2022	2/10/2023
	0,15									ID7	ETAPA 7: DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA								0,0%		0,0%	77	17/8/2023	2/11/2023

Tabla 10. Cronograma general del contrato

2.5 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

La gestión financiera y contable de Interventoría, está encaminada al seguimiento del contratista en la gestión presupuestal y financiera, para el manejo de los recursos. Por su parte, las funciones contables han estado enfocadas sobre la apropiación, incorporación y cumplimiento de las normas contables en la ejecución del contrato y administración de los recursos públicos. Con base en esta premisa, el equipo de trabajo dispuesto por El Consorcio INTER-CCTV Sabaneta, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y control del contrato que garantizan el desarrollo de la Fase I estudios y diseños y Fase II Implementación del sistema de emergencia y seguridad del Municipio de Sabaneta, cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 1. Matriz de autocontrol.

2.5.1 Ejecución presupuestal y facturación

A la fecha de cierre de este informe, el estado de ejecución presupuestal y facturación del contrato de Interventoría es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato	$ 755.947.500
B	Valor adición Otro sí No. 1	$ 159.588.917
	Valor adición Otro sí No. 3	$ 585.480.000
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	$ 0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 1.501.016.417
E	Valor ejecutado y causado (antes de este informe)	$ 1.013.116.417
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de este informe	$ 1.013.116.417
G	Valor ejecutado para aprobación de este informe	$ 97.580.000
H	Valor total ejecutado *(incluida este informe)*	$ 1.110.696.417
I	Valor por ejecutar *(después de este informe)*	$ 390.320.000

Tabla 11. Balance general contrato de Interventoría

A continuación, es detallado el seguimiento contable y financiero del contrato de interventoría No. SAB 06-002-22

PAGO REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME							
Informe No.	**N° Factura o cuenta de cobro**	**Valor Factura o cuenta de cobro**	**Comprobante Egreso No.**	**Fecha de Egreso**	**Tipo de pago**	**Valor Desembolsado**	**SALDO DEL INFORME**
1	SB-1	$ 125.991.250	13326	3/08/2023	Electrónico	$ 125.991.250	$ 629.956.250
2	SB-2	$ 125.991.250	14202	25/08/2022	Electrónico	$ 125.991.250	$ 503.965.000
3	SB-3	$ 125.991.250	1737	22/02/2023	Electrónico	$ 125.991.250	$ 377.973.750
4	SB-4	$ 125.991.250	1738	22/02/2023	Electrónico	$ 125.991.250	$ 251.982.500
5	SB-5	$ 125.991.250	1739	22/02/2023	Electrónico	$ 125.991.250	$ 125.991.250
6	SB-7	$ 125.991.250	1740	22/02/2023	Electrónico	$ 125.991.250	$ 0
Valor adición Otro sí No. 1						$ 159.588.917	$ 159.588.917
Valor adición Otro sí No. 3						$ 585.480.000	$ 745.068.917
7	SB-8	$ 159.588.917	9696	08/06/2023	Electrónico	$ 158.588.917	$ 585.480.000
8	SB-9	$97.580.000	Pdt	Pdt	Electrónico	$97.580.000	$ 487.900.000
TOTALES		**$ 1.013.116.417**				**$ 1.013.116.417**	**$ 487.900.000**

Tabla 12. Pagos realizados a la Interventoría

Nota: Los pagos correspondientes a las facturas SB-3-4-5-7, se encuentran en revisión por parte de la oficina contable y tesorería del Municipio de Sabaneta, ya que la interventoría mediante comunicado No. ICCTV-SAB-00048-2022 del 10 de marzo de 2023, solicito aclaración por los descuentos y/o retenciones aplicadas a las facturas; así que estos comprobantes están sujetos a posibles modificaciones y devolución por parte del municipio al contrato de Interventoría.

2.6 GESTION JURIDICA

La gestión jurídica de Interventoría, está encaminada al seguimiento del cumplimiento íntegro de los parámetros legales de las normas colombianas, estándares, mejores prácticas, políticas, procedimientos y guías aplicables de conformidad con los lineamientos definidos por el Municipio de Sabaneta, especialmente lo establecido en las obligaciones contractuales del contrato; verificando también que las actividades y entregables se realicen de tal manera que se cumpla con las especificaciones previstas en los estudios previos realizados, pliego(s) de condiciones y contratos, así como en los anexos, adendas, ofrecimientos y requerimientos inherentes al servicio contratado.

Con base en estas premisas, el equipo de trabajo dispuesto por El Consorcio INTER-CCTV Sabaneta, llevó a cabo las actividades propias de su rol para realizar el seguimiento y

control del Contrato en la Fase I Estudios y diseños, cuyo estado, avance y resultados se presentan en el Anexo 1. Matriz de autocontrol.

2.6.1 Garantías del Contrato de Interventoría

La garantía única de cumplimiento constituida en el marco del Contrato de Interventoría es la que se detalla a continuación, cuyos amparos se encuentran vigentes, se precisa la trazabilidad de las garantías contractuales presentadas, así:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	15-44-101262300 R.C N° 15-40101078703	11/05/2022 al 05/05/2024	$ 183.107.483,40	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Calidad del servicio		11/05/2022 al 05/05/2024	$ 183.107.483,40	
Pago de salarios y prestaciones sociales		11/05/2022 al 05/11/2026	$ 137.330.612,55	
Responsabilidad civil extracontractual		11/05/2022 al 05/11/2023	$ 232.000.000.00	

Tabla 13. Garantías contrato de Interventoría

El 8 de mayo de 2023 se generaron las pólizas de cumplimiento del contrato de interventoría, de acuerdo con el acta de reinicio y Otrosí No. 3 donde se ajusta la vigencia de los amparos según nueva fecha de terminación del 05 de noviembre de 2023

2.7 GESTIÓN AMBIENTAL

Para la prevención y mitigación de impactos ambientales generados en el proyecto se han implementado estrategias para el control y seguimiento de las medidas de prevención, las cuáles se estipulan mediante el Plan de Manejo ambiental, Plan Manejo de tránsito y la disposición final de los residuos generados por las actividades ejecutadas en el periodo comprendido al mes de junio 2023.

Los objetivos y propósitos se disponen a través de la normatividad colombiana mediante herramientas estratégicas a los cuales se les realiza seguimiento como son:

1. Solicitud de disposición final de los residuos generados en la actividad de hincado de postes.

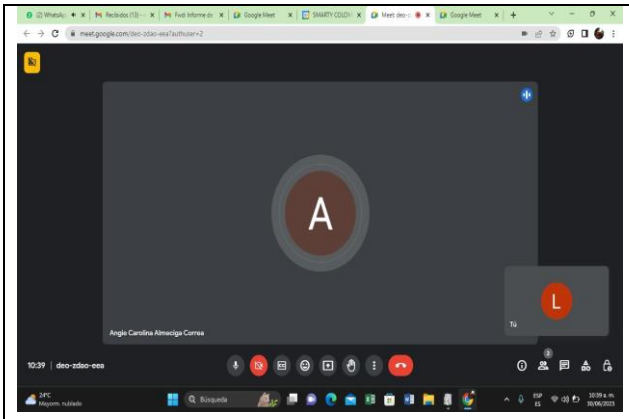
2. Solicitud registros fotográficos a las actividades ejecutadas en el componente de gestión ambiental.
3. Seguimiento y control a las actividades implementadas en el PMA – PMT.
4. Se realiza solicitud de política ambiental, cronograma ambiental para realizar seguimiento a las actividades de prevención y mitigación de impactos ambientales generados en el proyecto.

2.7.1 Gestión SST

Se realiza intervención sobre control y seguimiento a las actividades realizadas por el área SSTA del Contratista Unión Temporal Seguridad Sabaneta hacia los ítems concernientes a la seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de laborales en el proyecto con el fin de prevenir y mitigar accidentes, enfermedades laborales, incidentes, pérdidas materiales, prevención de riesgos psicosociales y todos los asociados que influyen sobre las condiciones físicas y mentales de los colaboradores.

Actividades desarrolladas:

1. Revisión de soportes de seguridad social del personal asociado al proyecto.
2. Revisión documental ingreso de personal a obra (Afiliación, CC, SS, Exámenes ocupacionales, hoja de vida, contrato, condiciones de salud, inducción, entrega de dotación)
3. Revisión de documentación para aprobación de equipos
4. Solicitud a contratista de Gestión SST según Resolución 0312 de 2019: Diligenciamiento ATS, Charla Pretarea, capacitación, Inducción, Preoperacionales, conformación de Brigadas de emergencia, requisitos indispensables para ejecución de obra.
5. Se verifica plan de trabajo anual, donde se evidencia incumplimiento por parte del contratista.
6. Reinducción al personal por reactivación de actividades
7. Seguimiento a actividades de COPASST y Comité de convivencia laboral.
8. Relación base de datos personal aprobado para actividades del proyecto
9. Seguimiento a requisitos contractuales para cumplimiento de normativa colombiana para el SG-SST.
10. El día 02 de junio de 2023 es enviado al contratista mediante correo electrónico comunicado sobre presunto incumplimiento a las actividades programas en Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y componente ambiental, se realiza requerimiento a cumplimiento en la entrega de los ítems dispuestos en el contrato, sobre la normativa colombiana Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 y PMA aprobado para el proyecto.

	
Reunión seguimientos a solicitudes realizadas SST-Ambiental	Mesa de trabajo seguimiento a requisitos SG-SST-Ambiental

3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO SAB-05-004-22 DE 2022

3.1 FICHA GENERAL DEL CONTRATO SAB-05-004-22

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Entidad contratante	Municipio de Sabaneta
Supervisor(a) de contrato:	Mariano de Jesús Atehortúa Osorio – secretario de Gobierno
FIRMA INTERVENTORA	
Razón Social	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SABANETA EG 2022
Contrato No.	SAB 05-004-22
Objeto contrato	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA.
Plazo del contrato	SIETE (7) MESES Y OCHO (8) DÍAS DE EJECUCIÓN DESDE EL INICIO DE ACTIVIDADES PREVISTO EN SECOP II.
Fecha de Inicio	23 de mayo de 2022
Fecha de Terminación	05 de noviembre de 2023
Otro Sí No. 1	Prórroga en Plazo: (1) mes y ocho (8) días
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2022
Otro Sí No. 2	Modificación Forma de pago
Suspensión No. 1	Suspensión del contrato a partir del 30 de diciembre de 2022
Reinicio No. 1	Reinicio del contrato a partir del 05 de mayo de 2023
Fecha de terminación Reinicio No. 1	06 de mayo de 2023
Otro Sí No. 3	Prórroga en Plazo: (6) meses
Representante Legal	Iván Dario Hincapié Giraldo.

Tabla 14. Ficha técnica del contrato de Interventoría

3.2 GESTIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO SAB-05-004-22

Durante el periodo entre el 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023, el Contratista presento una ejecución de 72,01% frente al cronograma general del proyecto. En el anexo 4 – Cronograma de seguimiento se pueden discriminar el estado de cada uno de los ítems objeto de seguimiento declarados en el cronograma contractual.

	PLANEADO	EJECUTADO	VARIACION
PROYECTO	67,07%	72,01%	4,94%
E&D	100,00%	100,00%	0,00%
IMPLEMENTACIÓN	52,96%	60,00%	7,05%

Tabla 15. Estado del cronograma de prorroga Vs Ejecutado SAB-05-004-2022

Se destaca que el contratista se encuentra en su ejecución un avance superior al planeado en el cronograma de prórroga, sin embargo, hay ítems que se encuentran atrasados y otros adelantados, los cuales están discriminados en el anexo 4 – Cronograma de seguimiento.

También se destaca el avance de las actividades en el cuarto de monitoreo, sin embargo, esta interventoría advierte del atraso de las actividades de planta externa. Esta interventoría solicitará en el periodo siguiente al contratista un plan de choque para evitar atrasos en el cronograma de actividades.



3.3 GESTIÓN JURIDICA DEL CONTRATO SAB05-004-22

3.3.1 Garantías del Contrato de Interventoría

La garantía única de cumplimiento constituida en el marco del Contrato SAB-05-004-22 es la que se detalla a continuación, cuyos amparos se encuentran vigentes, se precisa la trazabilidad de las garantías contractuales presentadas, así:

AMPARO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	11-44-101186260	06/05/2022 al 05/03/2024	$ 3.793.794.984.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		06/05/2022 al 05/11/2026	$ 3.793.794.984.00	
Calidad del servicio		06/03/2022 al 05/03/2024	$ 3.793.794.984.00	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		06/05/2022 al 05/11/2024	$ 3.793.794.984.00	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		06/05/2022 al 05/05/2024	$ 5.690.692.476.00	
Responsabilidad civil extra contractual	11-40-101047102	06/05/2022 al 05/11/2023	$ 948.448.745.85	

Tabla 16. Garantías del Contrato SAB-05-004-2022

3.4 GESTIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO SAB-05-004-22

A continuación, se expone los indicadores financieros, contables y presupuestales del contrato en mención:

3.4.1 Planeación financiera y presupuestal del contrato.

CONDICIONES DE CONTRATO	
Fecha acta de inicio	23 de mayo de 2022
Fecha de finalización	05 de noviembre de 2023

CONDICIONES DE CONTRATO		
Tiempo en meses de ejecución	13 meses y 8 días	398 días calendario
Valor inicial del contrato	$18.968.974.917	Incluido IVA
Forma de pago de acuerdo con el Otro sí No. 3	Que el valor por ejecutar vigencia 2023, se cancelará al contratista a través de tres (3) pagos, así: Un primer (1) pago por valor de Dos Mil Seiscientos Setenta Y Ocho Millones Ochocientos Ochenta Y Cinco Mil Setenta Y Dos Pesos ($ 2.678.885.072) asumidos del recurso del crédito, la amortización a aplicar será del 41%, lo anterior con la firma del presente otrosí y dado el cumplimiento del 40% de ejecución de avance del contrato. Para un total neto por pagar de MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($1.580.542.192). Un Segundo (2) pago: Por valor de Cinco Mil Quinientos Diez Y Ocho Millones Once Mil Quinientos Cincuenta Y Nueve Pesos ($ 5.518.011.559), de los cuales Cuatro Mil Diez Y Ocho Millones Trescientos Doce Mil Doscientos Ochenta Y Seis Pesos ($ 4.018.312.286), serán asumidos con recurso del crédito y la amortización a aplicar será del 41%, y Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Seiscientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos ($1.499.699.274), asumidos con recursos del AMVA. Para un total neto por pagar de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($3.870.503.523), a la ejecución del 80%. Un Tercer (3) pago: Por valor de Cinco Mil Quinientos Diez Y Ocho Millones Once Mil Quinientos Cincuenta Y Nueve Pesos ($ 5.518.011.559), de los cuales Cuatro Mil Diez Y Ocho Millones Trescientos Doce Mil Doscientos Ochenta Y Seis Pesos ($ 4.018.312.286), serán asumidos con recurso del crédito y la amortización a aplicar será del 41,65 %, y Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Millones Seiscientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos ($1.499.699.274), asumidos con recursos del AMVA. Para un total neto por pagar de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($3.844.185.378), a la ejecución del 100%.	
Anticipo	El Municipio de Sabaneta concederá al contratista un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato. Para ello deberá constituir fiducia o patrimonio autónomo, con base a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. La amortización del anticipo será en cada pago de forma proporcional al valor entregado en anticipo.	

Tabla 17. Condiciones del contrato SAB-05-004-22

VALOR DEL CONTRATO	$ 18.968.974.917
ANTICIPO 30%	$ 5.690.692.475
Dcto Estampilla Procultura	$ 160.908.000
TOTAL ANTICIPO	$ 5.529.784.475

Al corte del presente informe el contratista ha solicitado el 98% del valor total del anticipo, la ejecución es la que se muestra en la siguiente tabla

				CONCEPTO DE INTERVENTORÍA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR ANTICIPIO**	**% ANTICIPO**	**APROBACIÓN**	**% EJECUTADO**	**PENDIENTE**	**No RADICADO**
1	Adquisición de equipos electrónicos	$ 3.809.092.000	68,9%	$ 3.721.762.336	98%	$ 87.329.664	ICCTV-SAB-0008-2022 - ICCTV-SAB-0024-2022 - ICCTV-SAB-0031-2023
2	Adquisición de infraestructura	$170.692.475	3,1%	$ 170.692.475	100%	$ -	ICCTV-SAB-0034-2023
3	Pago instalación de infraestructura y obra civil	$1.416.488.000	25,6%	$ 1.416.488.000	100%	$ -	ICCTV-SAB-0019-2022
4	Pago nómina administrativa, técnica operativa	$133.512.000	2,4%	$ 133.512.000	100%	$ -	ICCTV-SAB-0017-2022
	TOTAL INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**$5.529.784.475**	**100%**	$ 5.442.454.811	98%	$ 87.329.664	

Tabla 18. Ejecución del anticipo

- La Interventoría emitió concepto a la solicitud de aprobación desembolso no. 1 del anticipo, mediante comunicado No. ICCTV-SAB-008-2022 de 08/07/2022. Se dio concepto de aprobación para el primer desembolso solicitado por el Contratista por $2.300.000.000, de acuerdo a lo estipulado en contrato SAB 05-004-22, La amortización del anticipo será en cada pago de forma proporcional al valor entregado en anticipo.
- La Interventoría emitió concepto a la solicitud de aprobación desembolso no. 2 del anticipo, mediante comunicado No. ICCTV-SAB-017-2022 de 09/08/2022. Se dio concepto de aprobación para el segundo desembolso solicitado por el Contratista por $133.512.000, de acuerdo a lo estipulado en contrato SAB 05-004-22, La amortización del anticipo será en cada pago de forma proporcional al valor entregado en anticipo.
- La Interventoría emitió concepto a la solicitud de aprobación desembolso no. 3 del anticipo, mediante comunicado No. ICCTV-SAB-019-2022 de 30/08/2022. Se dio concepto de aprobación para el tercer desembolso solicitado por el Contratista por $ 1.416.488.000, de acuerdo a lo estipulado en contrato SAB 05-004-22, La amortización del anticipo será en cada pago de forma proporcional al valor entregado en anticipo.
- La Interventoría emitió concepto a la solicitud de aprobación desembolso no. 4 del anticipo, mediante comunicado No. ICCTV-SAB-024-2022 de 14/09/2022. Se

dio concepto de aprobación para el cuarto desembolso solicitado por el Contratista por $ 1.400.000.000, de acuerdo a lo estipulado en contrato SAB 05-004-22, La amortización del anticipo será en cada pago de forma proporcional al valor entregado en anticipo.

- La Interventoría emitió concepto a la solicitud de aprobación desembolso no. 8 del anticipo, mediante comunicado No. ICCTV-SAB-0031-2023 de 21/10/2022. Se dio concepto de aprobación para el octavo desembolso solicitado por el Contratista por $ 21.762.336, de acuerdo a lo estipulado en contrato SAB 05-004-22, La amortización del anticipo será en cada pago de forma proporcional al valor entregado en anticipo.
- La Interventoría emitió concepto a la solicitud de aprobación desembolso no. 5,6 y 7 del anticipo, mediante comunicado No. ICCTV-SAB-0034-2023 de 26/10/2022. Se dio concepto de aprobación para el quinto, sexto y séptimo desembolso solicitado por el Contratista por $ 46.210.464, $ 87.245.440 y $ 46.210.464 respectivamente, de acuerdo a lo estipulado en contrato SAB 05-004-22, La amortización del anticipo será en cada pago de forma proporcional al valor entregado en anticipo.

3.4.2 Ejecución presupuestal y facturación

A la fecha de cierre de este informe, el estado de ejecución presupuestal y facturación del contrato SAB 05-004-22 es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato	$18.968.974.917
B	Valor adición del contrato a la fecha del informe	$0
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	$0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$18.968.974.917
E	Valor ejecutado y causado (antes de este informe)	$ 7.932.951.800
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de este informe	$7.932.951.800

G	Valor ejecutado pendiente de pagar (antes de este informe)	$ 0
H	Valor total ejecutado *(incluida este informe)*	$ 9.432.651.073
I	Valor por ejecutar *(después de este informe)*	$ 9.536.323.844

Tabla 19. Ejecución presupuestal del contrato SAB 05-004-22

3.5 GESTIÓN AMBIENTAL

En el periodo referenciado se realiza solicitud de registros fotográficos y anexos sobre las medidas de mitigación y prevención de mitigación a daños ambientales, quedando pendiente la entrega de disposición final de los residuos generados en el proyecto.

El contratista genera las siguientes actividades:

1. Política medioambiental
2. Charla de código de colores (disposición y clasificación de residuos)

Anexo 6. SST-Ambiental junio 2023 - Registro actividades ambientales.

3.5.1 Gestión SST

En la ejecución e implementación de actividades de seguridad y salud en el trabajo realizadas por la Unión Temporal Seguridad Sabaneta 2022 para el periodo referenciado cumplió con los siguientes requisitos:

1. Entrega de documentación para aprobación de ingreso a obra (Afiliaciones ingreso a obra)
2. Soportes de seguridad social.
3. Inducción reactivación de proyecto
4. charlas de seguridad
5. Registro de entrega de dotación y EPP
6. Registro gestión de Peligros
7. Inspección de obra
8. Examen médico ocupacional de ingreso.
9. Registro auto reportes condiciones de obra.

Anexo 6. SST-Ambiental junio 2023 - Gestión SST

Registro de ausentismo: para el periodo de junio de 2023 no se presentó ausentismo laboral por causa médica y accidente laboral.

A continuación, es presentado el Registro fotográfico

	
Señalización y cubrimiento a excavaciones	**Charlas diarias- Pretarea**
	
Diligenciamiento ATS	**Instalación señalización**

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONSORCIO INTER-CCTV SABANETA, con base en los resultados del contrato de interventoría, así como del contrato objeto de esta, el cual ha sido descrito y soportado en el presente informe, concluye:

1. El contrato de interventoría, con respecto a la ejecución de las actividades propias de su alcance, logró un nivel de ejecución de cien por ciento (100%) en la atención y cumplimiento de sus obligaciones; es decir, la realización de las actividades planeadas para el período corresponde a las ejecutadas durante el mismo, según lo establecido en la Fase II: Implementación.

Por otra parte, se recomienda a las partes interesadas adoptar las acciones pertinentes en los siguientes aspectos:

1. Se recomienda al contratista realizar un plan de choque con el fin de superar los riesgos citados en el numeral anterior.
2. Se recomienda al Contratista implementar un plan de acción con el fin de colocar al día las actividades atrasadas en el cronograma de prorroga a pesar de que el cronograma del proyecto se en encuentre adelantado respecto al cronograma de prorroga planeado.

5 ANEXOS DEL INFORME

Anexo 1. Matriz de autocontrol
Anexo 2. Matriz de control
Anexo 3. Actas de seguimiento
Anexo 4. Cronograma de seguimiento
