ALVARO A. HURTADO O.
INGENIERO CIVIL

Alvaro Antonio Hurtado Osorio
Ingeniero Civil

INFORME DE ACTIVIDADES
CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA, MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO	**CEDULA** 7.523.688	**CORREO DEL CONTRATISTA** Ingenierocivil.alvaro@gmail.com
SUPERVISOR DEL CONTRATO ARQUITECTO MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ	**CEDULA** 4.376.958	**CORREO DEL SUPERVISOR** tecnicopda@gmail.com
CLASE DE CONTRATO, NUMERO Y FECHA: CONTRATO DE OBRA No 004 DEL 2023		**TELEFONO DEL CONTRATISTA** 3117469433
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA, MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		
PERIODO DEL INFORME DEL 10 DE ABRIL AL 15 JUNIO DEL 2023		
SITIO DE EJECUCION: CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA, MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		
El presente informe tiene como función exponer las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato No 004 del 2023 para el pago del acta única y final, Se informan las cantidades ejecutadas durante el desarrollo del contrato		

FOTO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% EJECUCION	% RESTANTE
	1.1.1	Cinta plástica de seguridad cal 6	UND	1	100%	0%
	1.1.3	Cerramiento con guadua y tela poli sombra verde h=2,1 m	ML	15	100%	0%
	2.1	Localización y replanteo	ML	40	100%	0%
	3.1	Excavación material común seco h = 0 - 2 m (Manual)	M3	45.19	100%	0%

Cra 11 No 24N-75 Oficina D1
Cel: 3117469433 Fijo: 7312187
Armenia-Quindio

Powered by CamScanner

ALVARO A. HURTADO O.
INGENIERO CIVIL

Alvaro Antonio Hurtado Osorio
Ingeniero Civil

FOTO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% EJECUCION	% RESTANTE
	3.2	Descapote y limpieza h = 0 - 0,2 m	M2	48	100%	0%
	3.3	Entibado protección zanja	M2	15	100%	0%
	4.1	Lleno compactado manual con material del sitio	M3	50.74.	100%	0%
	5.1	Cargue retiro y disposición final de escombros o material sobrantes de obras, distancia máxima de 25 Km	M3	28.00	100%	0%
	6.1	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado D: 8"	ML	36	100%	0%
	7.1	Excavación pozo (0-2 m) (manual)	M3	4	100%	0%

Cra 11 No 24N-75 Oficina D1
Cel: 3117469433 Fijo: 7312187
Armenia-Quindio

Powered by CamScanner

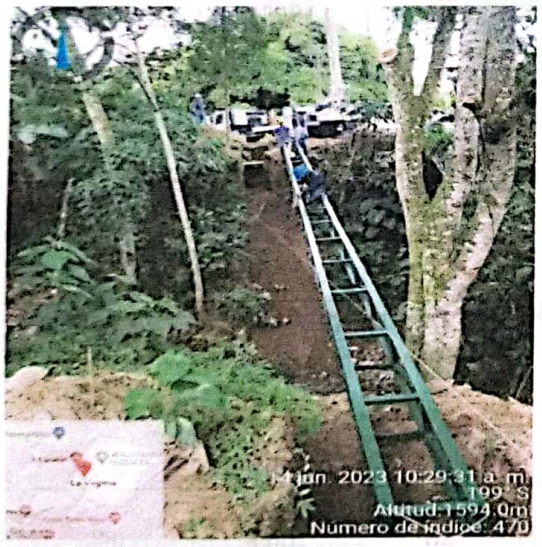
	7.2	Piso y Cuerpo en concreto (paredes) en concreto de 3000psi	M3	1.01	100%	0%
	7.3	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo fy 420 Mpa, corrugado. Viga perimetral pozo de absorción y de corona; malla electro soldada tapa	KG	188.04	100%	0%

FOTO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% EJECUCION	% RESTANTE
	7.4	Base y cañuela en mortero impermeabilizado	M3	0.43	100%	0%
	7.5	Tapa en concreto armado y placa de concreto de soporte	M3	1	100%	0%
	7.6	Tapa normativa con cadena de seguridad	UND	1	100%	0%
	8.1	Localización y control topográfico	ML	36	100%	0%
	8.6	Suministro, Figurado y Amarre Acero de refuerzo 60000PSI para soportes de viaducto (incluye acero escalerillas de acceso a Recamara intermedia)	KG	177.25	100%	0%

Cra 11 No 24N-75 Oficina D1
Cel: 3117469433 Fijo: 7312187
Armenia-Quindio

Powered by CamScanner

	IN-1	Excavación tipo Pilotaje hasta 5 metros de Profundidad para construcción de zapatas y columnas de apoyo al viaducto	M3	15.24	100%	0%
	IN-2	Concreto de 28 Mpa, no incluye acero de refuerzo para zapatas, columnas, vigas, recubrimiento cercha viaducto	M3	6.25	100%	0%

FOTO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% EJECUCION	% RESTANTE
	IN-3	Construcción de Viaducto en cercha de 24 metros de longitud para el Viaducto en ángulos de 3*3*3/16", de 2*2*1/4" y 2½"*2½"*1/4", incluye prefabricación, y montaje de estructuras, soporte, platinas, pernos, anclajes, soldaduras, pinturas y anticorrosivos.	KG	1435.16	100%	0%
	IN-4	Demolición de Muro en Concreto Ciclópeo	M3	1	100%	0%

Cra 11 No 24N-75 Oficina D1
Cel: 3117469433 Fijo: 7312187
Armenia-Quindio

Powered by CamScanner

	INP-5	Especificación Incluye ensayos no destructivos por Inspección Visual y Tintas Penetrantes PT a estructura metálica del Viaducto	UND	1	100%	0%
	IN-6	Empalme de tubería de 8" a Cámaras existentes	UND	2	100%	0%

ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
INGENIERO CIVIL

Cra 11 No 24N-75 Oficina D1
Cel: 3117469433 Fijo: 7312187
Armenia-Quindio

Powered by CamScanner
