
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - LOTE 1.**	**452.78 días**	**lun 9/05/22**	**vie 4/08/23**	
2		**DIAGNOSTICOS**	**452.78 días**	**lun 9/05/22**	**vie 4/08/23**	
3		Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	30 días	lun 9/05/22	mié 8/06/22	
4		FIN DE FASE	0 días	mié 8/06/22	mié 8/06/22	3
5		**EJECUCION**	**422.78 días**	**mié 8/06/22**	**vie 4/08/23**	
6		INCIO	0 días	mié 8/06/22	mié 8/06/22	4
7		**TRAMO 3 - CALLE 8 ENTRE AV 3 Y 5**	**175 días**	**mié 8/06/22**	**mié 30/11/22**	
33		**TRAMO 4 CALLE 20 AV 1 Y 2**	**140.78 días**	**mié 16/11/22**	**mié 5/04/23**	
61		**TRAMO 6 CALLE COMANDO Y COLEGIO SAN MATEO**	**165 días**	**lun 21/11/22**	**vie 5/05/23**	
87		**TRAMO 9 CALLE 0 AV 0**	**47 días**	**lun 20/03/23**	**vie 5/05/23**	
113		**TRAMO 10 CALLE KENNEDY**	**61 días**	**lun 5/06/23**	**vie 4/08/23**	**87FC+30 días**
114		INICIO	0 días	lun 5/06/23	lun 5/06/23	
115		Localizacion y replanteo	25 días	lun 5/06/23	jue 29/06/23	114
116		Excavacion mecanica sin clasificar	25 días	lun 5/06/23	jue 29/06/23	114CC
117		Conformacion y Compactacion de subrasante	15 días	mié 7/06/23	mié 21/06/23	116CC+2 días
118		Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	14 días	jue 8/06/23	mié 21/06/23	117CC+1 día
119		Suministro e Instalacion de recebo arenoso	20 días	jue 8/06/23	mar 27/06/23	118CC
120		Base Granular e=0.2 mts	30 días	jue 29/06/23	vie 28/07/23	118FC+7 días
121		Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	9 días	vie 21/07/23	sáb 29/07/23	120FC-8 días
122		Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	16 días	vie 14/07/23	sáb 29/07/23	121CC-7 días
123		<Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	16 días	vie 14/07/23	sáb 29/07/23	122CC
124		Corte de Pavimento	11 días	mar 25/07/23	vie 4/08/23	122CC+11 días
125		Sellado de Juntas	11 días	mar 25/07/23	vie 4/08/23	124CC
126		Junta de expansion de 10cms contra elementos existententes	11 días	mar 25/07/23	vie 4/08/23	124CC
127		Curado con antisol, Texturizado y acabado para intalacion de concreto MR para pavimento	11 días	mar 25/07/23	vie 4/08/23	124CC
128		Retiro de Escombros	61 días	lun 5/06/23	vie 4/08/23	
129		FIN	0 días	vie 4/08/23	vie 4/08/23	128
130		**TRAMO 8 RESERVAS DE SAN LUIS**	**113 días**	**mar 17/01/23**	**mar 9/05/23**	
156		**ANEXOS**	**422 días**	**mié 8/06/22**	**vie 4/08/23**	**6**

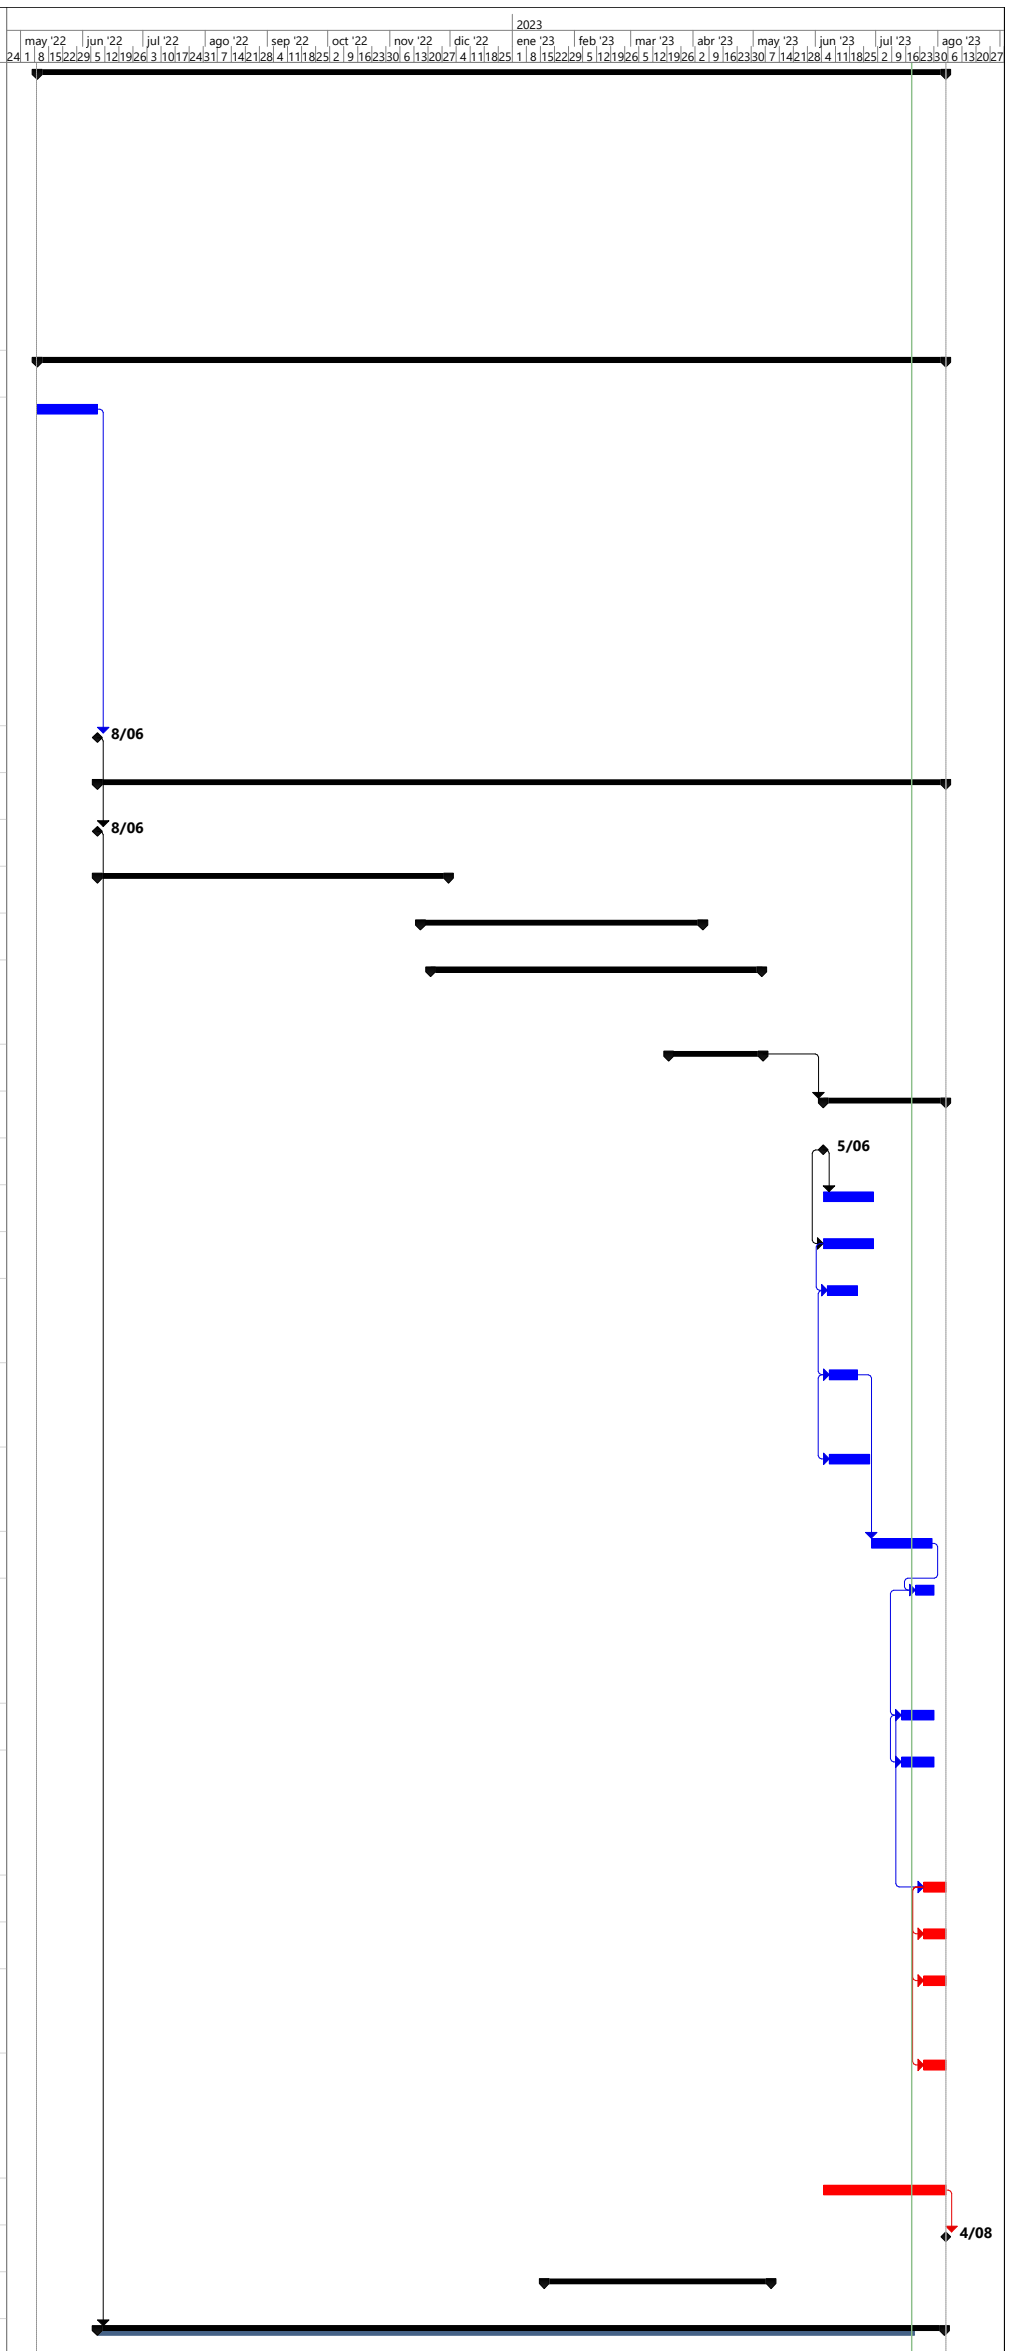

Proyecto: DIAGNOSTICO Y/O E
Fecha: mié 19/07/23

Tarea	Resumen del proyecto	Hito resumido	Tarea inactiva	solo duración	solo fin		
División	Agrupar por síntesis	Progreso resumido	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite		
Hito	Tarea resumida	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Tarea crítica		
Resumen	Tarea crítica resumida	Hito externo	Tarea manual	solo el comienzo	Progreso		
